“INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN, PLAN VIAL RURAL”

CPS COLOMBIA

CONSORCIO VIAS CC

cpt



INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA

Alcaldía de Medellín

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EQUIPO DE TRABAJO

ALVARO LÓPEZ CALLE
Supervisor General

GUSTAVO ALONSO ARENAS ZAPATA
Supervisor Suplente

LEIDY JOHANA CORREA RUEDA
Apoyo Supervisor

YESSICA HERNÁNDEZ RAMOS
Apoyo Administrativo- Financiero y contable

FRANCIA CATALINA TOBÓN ÁNGEL
Apoyo Jurídico

JAVIER RAMIREZ ECHAVARRIA
Supervisor componente Social

DANIELA RESTREPO ARIAS
Supervisor componente Ambiental

INTERVENTORÍA – CONSORCIO VIAS CC

EQUIPO DE TRABAJO

YENY MARCELA PÉREZ VELÁSQUEZ
Director de Interventoría

ANA MARÍA RUÍZ RESTREPO
Residente de Interventoría

CAMILO GARZÓN
Residente de Interventoría

KRIS DAYANA MONTOYA ARBELÁEZ
Residente Ambiental

LUISA FERNANDA RESTREPO GONZALEZ
Residente Social

GERMÁN AGUIRRE RAMIREZ
Profesional seguridad y salud en el trabajo – SST

MELISSA JIMENEZ BENJUMEA
Tecnólogo en Obras civiles

JAIRO ALEJANDRO QUIROZ ROJAS
Tecnólogo en Obras civiles

CAMILO ERNESTO MADRID VELÁSQUEZ
Tecnólogo en Obras civiles

CONTRATISTA

GLOBAL ENGINEERING AND DESIGN S.A.S

EQUIPO DE TRABAJO

CARLOS MARIO PALACIOS CHAMAT
Director de Obra

JUVENAL ALEXANDER PALACIOS CHAMAT
Residente de Obra

JHONATAN DAVID JULIO BARRIENTOS
Residente de Obra

JERALDINE AVENDAÑO YEPES
Residente Ambiental

ALEXANDER CÓRDOBA LUNA
Residente Ambiental

MELISSA GÓMEZ HERNÁNDEZ
Residente Social

KARINA PAOLA LLORENTE GUEVARA
Profesional SST

ESTEFANIA CASTRILLÓN ATHEORTUA
Profesional SST

CORRESPONDIENTE A LAS OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA DURANTE EL PERIODO DEL (25/05/2022) al (31/01/2023)

TABLA DE CONTENIDO:

1. **Información General de la Obra Pública**
   - **1.1.** Descripción general de la Obra Pública
   - **1.2.** Localización de la Obra Pública
   - **1.3.** Información básica de los contratos
     - **1.3.1.** Contrato de Obra
     - **1.3.2.** Contrato de Interventoría

2. **Informe Técnico del Seguimiento al Contrato de Obra Pública**
   - **2.1.** Control de ejecución
     - **2.1.1.** Análisis de cada una de las actividades de obra programadas de conformidad con el cronograma vigente vs actividades de obra efectivamente ejecutadas
   - **2.2.** Control y seguimiento a licencias, permisos, servicios públicos
   - **2.3.** Seguimiento al estado del tiempo
   - **2.4.** Control del material en obra
   - **2.5.** Control de ensayos de laboratorio
   - **2.6.** Control de equipos en obra
   - **2.7.** Control de entrega y cambios de estudios y diseños

3. **Informe de monitoreo y seguimiento social, ambiental y de salud y seguridad en el trabajo, de los contratos de ejecución de Obra Pública**
   - **3.1.** Informe social
     - **3.1.1.** Actividades de la interventoría tendientes al monitoreo y seguimiento social, de los contratos de ejecución de obra pública
     - **3.1.2.** Relación de las actividades del contratista de obra del componente social
     - **3.1.3.** Otras actividades propias de gestión social de la obra
     - **3.1.4.** Consolidado de gestión social
     - **3.1.5.** Observaciones, recomendaciones y conclusiones de la interventoría
   - **3.2.** Informe ambiental
     - **3.2.1.** Programas del Plan de Acción ambiental de la Obra Pública
     - **3.2.2.** Programa de capacitaciones y/o inducciones realizadas
     - **3.2.3.** Plan de monitoreo y seguimiento (Formato indicadores)
     - **3.2.4.** Seguimiento al presupuesto ambiental (Formato vigente)
     - **3.2.5.** Observaciones y recomendaciones de la interventoría
   - **3.3.** Informe de Salud y Seguridad en el Trabajo – SST

3.3.1. Actividades realizadas en el componente de Salud y Seguridad en el Trabajo - SST
3.3.2. Programa de salud y seguridad en el trabajo – SST (contratista de obra)
3.3.3. Programa de salud y seguridad en el trabajo – SST (interventoría de obra)

4. Informe administrativo de seguimiento al contrato de obra pública

4.1. Control del personal del contratista de obra asociado al proyecto (administrativo y técnico) y de su pago de seguridad social integral
4.2. Control del cumplimiento de las responsabilidades del contratista de obra frente a la subcontratación
4.3. Informe de la materialización de riesgos previsibles del contrato de obra y su mitigación
4.4. Control a los compromisos definidos en los comités de obra
4.5. Correspondencia enviada y recibida
4.6. Copia de la Bitácora

5. Informe Financiero y Contable

5.1. Seguimiento financiero a la ejecución del contrato de obra
5.2. Relación de pagos y amortización de anticipo (si aplica) del contrato de obra
5.3. Control de inversión del anticipo y de los rendimientos financieros generados en el contrato de obra (si aplica)

6. Informe Jurídico

6.1. Relación de reclamaciones
6.2. Relación de sanciones
6.3. Control al estado de las garantías del contrato de Obra

7. Registro Fotográfico del avance de la obra

8. Recomendaciones y conclusiones generales de la Interventoría sobre el desarrollo del contrato de Obra

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA OBRA PÚBLICA (personal que perteneció al contrato):

SUPERVISOR TÉCNICO PRINCIPAL	ALVARO LÓPEZ CALLE
SUPERVISOR TÉCNICO SUPLENTE	LEIDY JOHANA CORREA RUEDA
APOYO JURIDICO SUPERVISIÓN	FRANCIA CATALINA TOBÓN ÁNGEL
APOYO FINANCIERO SUPERVISIÓN	YESSICA HERNANDEZ RAMOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	YENY MARCELA PÉREZ VELÁSQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 1	CAMILO ANDRÉS GARZÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 2	ANA MARÍA RUIZ RESTREPO
TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES	JAIRO ALEJANDRO QUIROZ ROJAS
	CAMILO ERNESTO MADRID VELÁSQUEZ
	CRISTIAN ALEJANDRO CORREA BARAHONA
	JUAN GUILLERMO GUARÍN SALAZAR
	OSCAR ANDRÉS PÉREZ
	MELISSA JIMENEZ BENJUMEA
PROFESIONAL AMBIENTAL	KRIS DAYANA MONTOYA ARBELÁEZ
	RAQUEL VANESSA VARGAS BUILES
	JUAN FELIPE HERNÁNDEZ GALVIS
PROFESIONAL SOCIAL	LUISA FERNANDA RESTREPO GONZALEZ
	DORIELA OSPINA MARULANDA
	CECILIA MARÍA MEJÍA MERINO
PROFESIONAL SST	GERMÁN AGUIRRE RAMIREZ
	VÍCTOR HUGO BERMÚDEZ ZULUAGA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO (ASESOR DE TRÁNSITO)	ISABEL CRISTINA GUTIERREZ

1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA PÚBLICA:

Los cinco corregimientos del DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN han venido desarrollándose, exigiendo una mejor infraestructura para suplir las necesidades de las comunidades que allí habitan. Para dar solución a los problemas de movilidad vehicular y peatonal en los corregimientos de San Sebastián de Palmitas, San Cristóbal, Altavista, San Antonio de Prado y Santa Elena se estableció el proyecto de mantenimiento de Vías y demás obras complementarias en los corregimientos del Municipio de Medellín, plan vial rural que será ejecutado principalmente sobre las Vías en pavimento flexible, rígido y rieles. Adicionalmente, se requiere intervenir algunos elementos de la infraestructura asociadas tales como andenes, cordones, cunetas y realces con el fin de

mejorar la movilidad, el drenaje de las vías y lograr una superficie de rodadura más uniforme en cualquier tipo de pavimento y espacio público, contribuyendo al mejoramiento de la movilidad vehicular y peatonal.

En primera instancia, se tienen la información de la BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE REGISTRO DE OBRA “SIRO” programa que permite consultar, priorizar, visualizar, gestionar y presentar alternativas de intervención de acuerdo con los parámetros técnicos y sociales establecidos en las matrices desarrolladas en el sistema, según el tipo de obra; para este caso se estableció para el mantenimiento y mejoramiento, aquellas vías solicitadas por la comunidad.

1.2. LOCALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA:

El proyecto se localiza en el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN en los Corregimientos de Altavista, Santa Elena, San Antonio de Prado, San Cristóbal y Palmitas (Plano, Mapa donde se observa el sitio de ejecución de las obras).



Figura 1. Mapa de corregimientos

A continuación, se presenta el listado de las direcciones que hacían parte del contrato inicialmente para ser intervenidas con la descripción general de las actividades u obras a ejecutar en cada uno de ellos.

SITIOS A INTERVENIR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
Número	**Dirección**	**Barrio / Vereda**	**Comuna**
1	Vereda La Aldea	Aldea Parte Baja	50 - Palmitas
2	Vereda La Aldea	Aldea Parte Alta	50 - Palmitas
3	Vereda El Frisol	Vereda El Frisol	50 - Palmitas
4	Carrera 228 No. 120 - 804	Vereda Teresitas	50 - Palmitas
5	Calle 53D N 123B-49	6084 - Suburbano La Loma (Iglesia)	60 - San Cristóbal
6	Calle 55 # 131 - 116	6084 - Suburbano La Loma(Bellavista)	60 - San Cristóbal
7	Calle 55 # 131 - 182	6084 - Suburbano La Loma(Bellavista)	60 - San Cristóbal
8	Carrera 112 No. 48B - 70	6084 - Suburbano La Loma (B. SanPedro)	60 - San Cristóbal
9	Calle 54 No.121 - 19, La Loma.	6084 - Suburbano La Loma (S. Laloma)	60 - San Cristóbal
10	Calle 54 No.123B-58	6084 - Suburbano La Loma (S. Laloma Hermosa)	60 - San Cristóbal
11	Calle 65 No. 137 - 52 Int 108	6084 - Suburbano La Loma(Travesías)	60 - San Cristóbal
12	Calle 65 No. 137 - 52 Int 108.	6084 - Suburbano La Loma(Travesías)	60 - San Cristóbal
13	Vía vereda El Llano + 274 m.	6084 - Suburbano La Loma (El Llano)	60 - San Cristóbal
14	Vereda El Yolombo	6084 - Suburbano La Loma (ElYolombo)	60 - San Cristóbal
15	Carrera 106 # 106 - 490	6084 - Suburbano La Loma (ElYolombo)	60 - San Cristóbal
16	Calle 5 Sur entre 83-14 y 84-354	7001 - Altavista Sector Central	70 - Altavista
17	Carrera 83 # 5 Sur 50	7001 - Altavista Sector Central	70 - Altavista
18	Calle 5 Sur entre Carrera 80 y 83-14	7001 - Altavista Sector Central	70 - Altavista

19	Tramo de vía en concreto (puentehasta Acueducto La Sociedad).	7001 - Altavista Vereda Manzanillo	70 - Altavista
20	Vereda el Reposo Carrera 82 No. 9 Sur – 450	7001 - Altavista Vereda Manzanillo –Sector El Reposo.	70 – Altavista
21	Calle 34B entre No. 133 - 398	7088 - Altavista Corazón - El CorazónEl Morro	70 – Altavista
22	Calle 34B # 133 - 270 Hasta 133 - 173	7088 - Altavista Corazón - El CorazónEl Morro	70 – Altavista
23	Calle 34C No. 118 - 283	7088 - Altavista Corazón - El CorazónEl Morro	70 – Altavista
24	Carrera 88 X 68B-43 y 68B-140	8000 - Cabecera San Antonio dePrado	80 - San Antonio de Prado
25	Calle 33 Sur entre carreras 54F y62B	8000 - Cabecera San Antonio dePrado – Vereda Laverde	80 - San Antonio de Prado
26	Calle 56 Sur No. 75B-48 y 75-773	8000 - Cabecera San Antonio dePrado – Vereda La Florida	80 - San Antonio de Prado
27	Carrera 85 entre 50C Sur y 50D Sur.	8000 - Cabecera San Antonio dePrado – Vereda La Florida	80 - San Antonio de Prado
28	Carrera 80 No. 42 Sur- 08	8000 - Cabecera San Antonio dePrado	80 - San Antonio de Prado
29	Calle 45B Sur No. 83-177	8000 - Cabecera San Antonio dePrado – Vereda La Florida.	80 - San Antonio de Prado
30	Calle 40 Sur Entre Carreras 75, 76Ay 77	8000 - Cabecera San Antonio dePrado.	80 - San Antonio de Prado
31	Calle 46C Sur Carrera 54F	8000 - Cabecera San Antonio dePrado.	80 - San Antonio de Prado
32	Vereda la Mazo	9000 - Santa Elena	90 - Santa Elena

33	Sector la Patiño	9000 - Santa Elena	90 - Santa Elena
34	Vereda el Cerro	9000 - Santa Elena	90 - Santa Elena
35	Parte Central	9000 - Santa Elena	90 - Santa Elena
36	El Placer - sector Los Nachos	9081 - Suburbano El Placer	90 - Santa Elena

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

- Demoliciones de estructuras de concreto existentes.
- Excavaciones y movimiento de tierras.
- Botada del material proveniente de las excavaciones
- Suministro, transporte y colocación de cordones
- Suministro, transporte y construcción de cordones
- Suministro, transporte y colocación de concreto
- Suministro, transporte y colocación de pasamanos
- Suministro, transporte y colocación de defensas viales
- Suministro, transporte y aplicación de mezcla asfáltica en caliente
- Fresado de Vías
- Demolición de carpeta asfáltica.
- Construcción de cunetas en v
- Construcción de muro-cunetas
- Construcción de andenes
- Construcción de obras hidráulicas y de estabilización
- Suministro, transporte y colocación de acero de refuerzo
- Suministro, transporte y colocación de base granular
- Suministro, transporte y colocación de subbase granular
- Las demás requeridas para cumplir con el objeto del contrato

NOTA: Los sitios o puntos de intervención no son fijos, corresponden a la planeación inicial según su viabilidad y disponibilidad de recursos. Atendiendo el objeto del contrato, la Entidad Contratante podrá modificarlos, adicionarlos o cambiarlos y adelantar intervenciones asociadas con el objeto del contrato en cualquier sitio del Municipio de Medellín según disponibilidad de recursos asociados al proyecto y viabilidad técnica, previa revisión de la supervisión y/o interventoría y aprobación del ordenador del gasto.

De acuerdo a lo anterior, mediante Modificación No. 3 efectuada al contrato la cual fue previamente aprobada por los Comités Internos de Planeación de las Secretarías de Suministros y Servicios y de Infraestructura Física, se relacionan los sitios que fueron excluidos del presente contrato con su respectiva justificación:

Numero	Dirección	Justificación
1	Vereda La Aldea parte Baja	Una vez efectuada la visita técnica para iniciar la ejecución, se pudo constatar que la afectación en estos frentes de intervención aumentó considerablemente, por lo tanto, sobrepasa el alcance técnico y presupuestal.
2	Vereda La Aldea parte Alta	
4	Carrera 228 No. 120-804 Las Teresitas	
32	Vereda La Mazo Santa Elena	
33	Sector La Patiño Santa Elena	
5	Calle 53 D No. 123B-49 Sector de La Iglesia	En la proyección del cronograma de obra estos frentes quedaron para ejecutar en la etapa final, dado que la priorización se efectuó en escala de las intervenciones más a las menos urgentes, por lo tanto, se requiere excluir para trasladar los recursos a los frentes que se adicionaran los cuales poseen mayor necesidad de atención inmediata.
28	Carrera 80 No. 42 Sur-8	
30	Calle 40 Sur entre Carreras 75, 76A y 77	
8	Carrera 112 No. 48B-70 Barrio San Pedro	
11	Calle 65 No. 137-52 Int. 108, Travesías	
12	Calle 65 No. 137-52 Int. 108, Travesías	
13	Vía Vereda El Llano + 274 m.	
14	Vereda El Yolombo	
16	Calle 5 Sur entre 83-14 y 84-354	
18	Calle 5 Sur entre Cra. 80 y 83-14	
23	Calle 34 C No. 118-283	
31	Calle 46C Sur Carrera 54F	
34	Vereda El Cerro Santa Elena	
35	Parte Central Santa Elena	
9	Calle 54 No. 121-19, La Loma	Una vez realizada la visita se encontró que las intervenciones ya no son prioritarias, la afectación fue subsanada posiblemente por la comunidad u otra entidad.
10	Calle 54 No. 123B-58, La Loma	
24	Carrera 88 X 68B-43 y 68B-140	
36	El Placer – Sector Los Nachos	
26	Calle 56 Sur No. 75B-48 y 75-773, Vereda La Florida	De acuerdo con consulta con el líder comunitario esta vía será intervenida próximamente por un contrato de mantenimiento de redes de acueducto y alcantarillado, información validada con EPM.
3	La Frisola	Se realiza levantamiento topográfico, pero no se ejecuta lo proyectado en el contrato por falta de recursos.
20	AltaVista Vereda El Reposo	No se ejecuta este frente ya que después de realizar las visitas de campo y la socialización se informa que este predio es privado.

La exclusión de los frentes No. 3 y No. 20 no obedeció a la Modificación No. 3 hecha al contrato; su exclusión obedeció a otros factores que imposibilitaron su ejecución y cuya justificación se relaciona para cada uno de ellos.

Por los motivos anteriormente expuestos, a continuación, se relacionan los frentes contractuales que se intervinieron mediante el presente contrato:

Número	Dirección	FOTO	Comuna	Descripción de la actividad
6	Calle 55 # 131 – 116- senderos La Loma		60 - San Cristóbal	Demolición de rampla en concreto -Conformación de estructura nueva -Sendero nuevo rampla o escaleras -Acero o malla electro soldada -Construcción de cunetas en V - Instalación de pasamanos
7	Calle 55 # 131 - 182- senderos La Loma		60 - San Cristóbal	Demolición de rampla en concreto -Conformación de estructura nueva -Sendero nuevo rampla o escaleras -Acero o malla electro soldada -Construcción de cunetas en V - Instalación de pasamanos
15	Vereda El Yolombo		60 - San Cristóbal	- Rocería -Instalación de acero para cunetas -Excavación y conformación de cunetas -Construcción de cuneta nueva costado izquierdo bajando -Construcción de cuneta nueva costado derecho bajando

17	Carrera 83 # 5 Sur 50		– Altavista	-Demolición de vía o fresado -Retiro de estructura existente -Conformación vía nueva, instalación de mezcla asfáltica en caliente tipo MSC 19 con fibra.
19	Tramo de vía en concreto (puente hasta Acueducto La Sociedad).		– Altavista	-Demolición de losas puntuales en concreto (afectadas). - Conformación de estructura nueva en base granular. -Instalación de acero de refuerzo (malla electro soldada y dovelas de transferencia de esfuerzos). -Instalación de MR40 con acelerante.
21	Calle 34B entre No. 133 - 398		– Altavista	-Limpieza de superficie y aplicación de mezcla asfáltica en caliente tipo MSC 19 con fibra.
22	Calle 34B # 133 - 270 Hasta 133 - 173		– Altavista	-Limpieza de superficie y aplicación de mezcla asfáltica en caliente tipo MSC 19 con fibra. - Realce de MH, tapa de válvula y construcción de reductor de velocidad existente.

25	Calle 33 Sur entre carreras 54F y 62B		– Cabecera San Antonio de Prado – Vereda Laverde	-Rocería - Llenos en fresado donde lo requería. -Demolición de vía -Retiro de estructura existente -Conformación vía nueva, instalación de mezcla asfáltica en caliente tipo MSC 19 con fibra. -Instalación de obras complementarias donde lo requería (cordones)
27	Carrera 85 entre 50C Sur y 50D Sur.		– Cabecera San Antonio de Prado – Vereda La Florida	-Demolición de vía o fresado -Retiro de estructura existente -Conformación vía nueva, instalación de mezcla asfáltica en caliente tipo MSC 19 con fibra.
29	Calle 45B Sur No. 83-177		– Cabecera San Antonio de Prado – Vereda La Florida	-Demolición de vía. - Nivelación de rasante con fresado. -Conformación vía nueva, instalación de mezcla asfáltica en caliente tipo MSC 19 con fibra. -Instalación de obras complementarias donde lo requería (cordones)

De igual manera, a través de la Modificación No. 3 se aprobó la inclusión de seis nuevos frentes de trabajo para ser intervenidos mediante el presente contrato; estos frentes están localizados principalmente en el corregimiento de San Cristóbal y en el corregimiento de Santa Elena, y requerían de una intervención inmediata, dada las condiciones de inestabilidad que presentaban y el riesgo que suponían para la comunidad en general. A continuación, se relacionan dichos puntos con su respectiva justificación:

Número	Dirección	FOTO	Comuna	Justificación
1	Puente Pajarito – San Cristóbal		60 - San Cristóbal	Se requiere la construcción y reemplazo de puente para la conexión entre zonas del barrio, dado que el existente tuvo un deterioro inminente y fue necesario demoler parte de la estructura que ponía en riesgo a todas las personas que transitaban por él.
2	Vereda El Llano sector Naranjal		60 - San Cristóbal	La necesidad surge por pérdida de banca en la vía de acceso al sector del Naranjal, por lo cual se plantea una intervención consistente en un lleno de material fresado como obra de mitigación.
3	Boquerón después del puente que está en construcción.		60 - San Cristóbal	Se presenta hundimiento y ruptura en la estructura vial de conexión impidiendo el acceso de los vehículos, así mismo causó afectación en la construcción del puente aledaño de Boquerón que se encuentra 400 metros aproximadamente causando así la suspensión del contrato que suscribió para la ejecución de este, dado que es la vía que se usaba para el ingreso del material. Se plantea entonces una estructura en concreto ciclópeo e instalación de la lámina metálica, para proteger el canal y la tubería de red de acueducto.

4	Barro Blanco - Cerca de la Iglesia		90 – Santa Elena	Vía con alto grado de deterioro, configurada de alto impacto dada la gran afluencia de tráfico y la importancia como vía principal en el corregimiento. Se plantea pavimentación de aproximadamente 400 m., construcción de cunetas, bordillos y resaltos dónde se encuentra ubicado el colegio.
5	Santa Elena – Pantanillo		90 – Santa Elena	Se requieren mejorar las condiciones actuales de la vía, ya que es una vía de acceso a varias veredas y a una escuela del sector. Las obras planteadas consisten en demolición de la carpeta asfáltica, pavimentación y obras de manejo de aguas y complementarias requeridas.
6	Santa Elena – Piedras Blancas		90 – Santa Elena	Vía con alto grado de deterioro y en la cual una empresa de transporte público del sector estaría dispuesta a prestar servicio siempre y cuando se mejoren las condiciones actuales. Las obras planteadas consisten en un riego de fresado, pavimento y obras complementarias.

ADICION CONTRATO

En concordancia con lo anterior, mediante Modificación No. 2 efectuada al contrato, la cual fue previamente aprobada por los Comités Internos de Planeación de las Secretarías de Suministros y Servicios y de Infraestructura Física, se aprobó la inclusión de un nuevo frente de trabajo el cual presentaba condiciones topográficas de altas pendientes, sumado a las

situaciones de vulnerabilidad que presenta la población y asociado a las precipitaciones que se esperaban para el segundo semestre del año 2022, lo cual incrementaba el riesgo por movimientos en masa, motivo por el cual se requería la intervención inmediata de este sitio para evitar una afectación mayor debido a las condiciones meteorológicas esperadas.

Consecuencia de dicho aumento en la percepción del riesgo derivado de las situaciones naturales, se hizo necesario realizar un ajuste a los frentes de trabajo a intervenir, incluyendo el frente de intervención ubicado en la Vereda La Palma en el Corregimiento de San Cristóbal, sector Los Maya, dado que se presentaban afectaciones en la vía que podían afectar los derechos de las personas, tanto en su vida e integridad, como su propiedad y movilidad, razón por la cual también se requirió ampliación del plazo contractual para llevar a cabo la ejecución de las obras en el frente se calculó una ampliación de plazo contractual de DOS (2) MESES Y VEINTE (20) DÍAS, contados desde el veinticinco (25) de septiembre hasta el quince (15) de diciembre de dos mil veintidós (2022), así como una adición de recursos por **:** por valor de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M.L. ($2.326.253.542).

A continuación, se relaciona dicho frente de trabajo:

Número	Dirección		FOTO	Comuna	Justificación técnica
	La Palma-Sector Los Maya			60 - San Cristóbal	En este punto se presenta un deslizamiento con pérdida de banca de grandes dimensiones, lo cual dejo completamente incomunicada la vereda, por lo que es necesario realizar obra.

Con la adición de los seis (6) nuevos frentes de intervención, adicionales al anteriormente mencionado, los cuales están acordes con el objeto del contrato, fue necesario realizar una ampliación en el plazo contractual por el término de un mes y quince días contados desde el dieciséis (16) de diciembre de 2022 hasta el treinta y uno (31) de enero de 2023 y una redistribución de recursos por valor de $1.509.056.952.

1.3. INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS CONTRATOS:

1.3.1. CONTRATO DE OBRA:

NÚMERO DEL CONTRATO:	4600094137 DE 2022
OBJETO:	"Mantenimiento de vías y demás obras complementarias en los corregimientos del municipio de Medellín, Plan Vial Rural".
CONTRATISTA: (Si es un consorcio informar las personas o empresas que lo conforman y su % de participación)	GLOBAL ENGINEERING AND DESIGN S.A.S
CÉDULA O NIT:	829002160-7
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:	JORGE LUIS ORTIZ BERMUDEZ
DIRECCIÓN CONTRACTUAL:	Transversal 46 # 46-17 Barrancabermeja VEINTE DE AGOSTO
TELÉFONOS DE CONTACTO:	3102802577
EMAIL:	Notificacionesglobalsas@gmail.com
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	25 DE MAYO DE 2022
PLAZO INICIAL:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2022
AMPLIACIONES A LA FECHA:	2
SUSPENSIONES A LA FECHA	N.A
PLAZO ACTUAL:	8 MESES Y 5 DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	31 DE ENERO DE 2023
VALOR INICIAL:	$4´652.510.815
ADICIONES A LA FECHA:	$2´326.253.542
VALOR ACTUAL:	$ 6´978.764.357
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N.A

1.3.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

NÚMERO DEL CONTRATO:	4600094153 DE 2022
OBJETO:	"Interventoría para el mantenimiento de vías y demás obras complementarias en los corregimientos del municipio de Medellín, plan vial rural".
CONTRATISTA: (Si es un consorcio informar las personas o empresas que lo conforman y su % de participación)	CONSORCIO VIAS CC con formado por: CPS INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA SAS 50% CPT SA 50%
CÉDULA O NIT:	901.580.199-2

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:	FRANCISCO JÓSE CALVO-MANZANO PALACIO
DIRECCIÓN CONTRACTUAL:	Calle 106 N 53-39 Oficina 203, Bogotá D. C
TELÉFONOS DE CONTACTO:	3128344087
EMAIL:	consorcioviascc@gmail.com
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	25 DE MAYO DE 2022
PLAZO INICIAL:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	25 DE OCTUBRE DE 2022
AMPLIACIONES A LA FECHA:	2
SUSPENSIONES A LA FECHA	N.A
PLAZO ACTUAL:	8 MESES Y 15 DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	09 DE FEBRERO DE 2023
VALOR INICIAL:	$800.000.000
ADICIONES A LA FECHA:	$ 342.756.687
VALOR ACTUAL:	$1.142.756.687
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N.A

2. INFORME TÉCNICO DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE LA OBRA PÚBLICA:

2.1. CONTROL DE EJECUCIÓN:

2.1.1. ANÁLISIS DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA PROGRAMADAS DE CONFORMIDAD CON EL CRONOGRAMA VIGENTE VS ACTIVIDADES DE OBRA EFECTIVAMENTE EJECUTADAS:

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO DEL 25 DE MAYO DE 2022 AL 30 DE ENERO DE 2023


Durante la ejecución de las obras que se desarrollaron en el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN en los Corregimientos de Altavista, Santa Elena, San Antonio de Prado, San Cristóbal se realizaron las actividades principales en los siguientes puntos:

CORREGIMIENTO DE SAN CRISTÓBAL

FRENTE N°1 PUENTE PAJARITO CARRERA 118 CON CALLE 64FF (Ampliación de puente vehicular).

1. Localización, trazado y replanteo topográfico para la elaboración de los diseños de la ampliación del puente, por parte de la Secretaría de infraestructura y construcción del mismo.
2. El día 6 de julio se realiza la marcación de las pilas de puente según el diseño estructural actualizado con la ingeniera Jorsay Vanesa Rodríguez Cuello de la SIF.
3. El día 8 de julio se inicia con la instalación de la señalización vertical.
4. El día 13 de julio se inicia con la actividad de instalación de cerramiento provisional del área a intervenir y se construye campamento.
5. El día 22 de julio la Secretaría de infraestructura hace entrega de los diseños estructurales definitivos de la ampliación del puente para la respectiva construcción.
6. El día 28 de julio el Contratista inicia actividades de corte y demolición de pavimento flexible y en concreto para excavación de las pilas N°4 y N°6 del puente.
7. El día 16 de agosto la profundidad de la pila N°6 desde la rasante 9,8m cumple con la profundidad de diseño, por lo que se solicita liberación por parte de la SIF mediante un informe enviado el día 22 de agosto, mismo día que el profesional de la SIF libera la pila confirmando que el suelo encontrando es un material rocoso de mejores características, se considera adecuado para cimentar por lo que se autoriza el armado y vaciado en esta cota.
8. El día 27 de agosto se finaliza la excavación de la pila N°4, con una profundidad de diseño L= 9,80m desde la rasante.
9. El 29 de agosto se inicia con demolición de pavimento en el área de excavación de la pila N°5.
10. El día 9 de septiembre se suspende la excavación de la pila N°5 ya que por estar en medio de las pilas N°4 y N°6, las cuales aún se encontraban abiertas, por tanto, había riesgo de derrumbe al interior de esta.
11. El día 13 de septiembre de acuerdo a la visita de los estructurales de la unidad de diseño de la SIF el Contratista suspende la actividad de instalación de acero en espera de definición de niveles de rasante.
12. El día 14 de septiembre se realizó un recorrido al frente de obra en compañía del diseñador, el cual sugiere anular las pilas internas N°2 y N°15, el vástago y reducir la profundidad de las pilas que hacían falta por excavar, con el fin de optimizar el diseño.
13. El día 16 de septiembre el Contratista hace reenvío de las modificaciones de los diseños realizadas por el calculista los cuales debían ser revisadas y aprobadas. La excavación de las pilas N°2 y N°5 y el vaciado de las pilas N°4 y N°6 se mantiene suspendida mientras se realizan las modificaciones sugeridas a los diseños. Por el momento, solo se avanza en la excavación de la pila N°1.
14. El día 26 de septiembre la Supervisión hace envió de los diseños finales del puente de Pajarito con los ajustes realizados y aprobados por la Unidad de Diseño de la Secretaría de Infraestructura Física. Por lo que el Contratista inicia con las actividades recomendadas: 1) Las dos pilas del borde en la margen derecha (pilas N°4 y N°6) que ya estaban excavadas a 9.80 m, se les debe hacer un lleno en concreto simple de 17.50 MPa como mínimo, por tal razón fue necesario hacer el desmonte de las canastas instaladas. 2) Además las 2 pilas

centrales N°2 y N°5 que estaban en proceso de excavación, se inició hacer un lleno con el material seleccionado de buena calidad de la pila N°1 que se encontraba en excavación. A continuación, se muestra el diseño suministrado por la SIF “Perfil longitudinal del puente”.

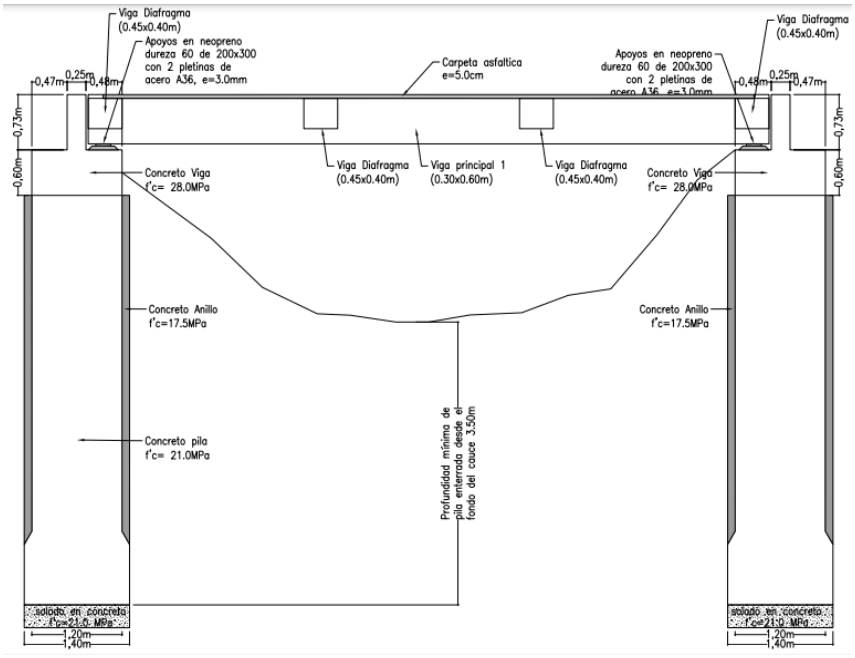

Perfil longitudinal del puente con cauce


15. El día 13 de octubre la actividad de excavación de la pila N°1 finaliza con la profundidad de diseño.
16. La excavación de la pila N°3 se vio afectada en su inicio debido a la falta de paso peatonal el cual es habilitado el día 18 de octubre, dando inicio con la demolición de pavimento y excavación de la pila el día 19 de octubre, misma que termina el día 29 de octubre llegando a la profundidad de diseño.
17. El día 28 de octubre el contratista inicia trabajos para la construcción del puente provisional, se realiza el vaciado de dados en los extremos del puente.
18. El día 9 de noviembre el diseñador realiza visita de campo, el cual el día 11 de noviembre envía medio magnético recomendaciones constructivas que se describen textualmente a continuación:

- En las pilas 1 y 2 ubicadas en la margen derecha de la quebrada construir el puente teniendo en cuenta que la cara superior de la losa o tablero quede aproximadamente a -0.05 m del nivel de rasante existente en esa margen.
- En las pilas ubicadas sobre la margen izquierda y que corresponden a las pilas 3 y 4, el nivel de la cara superior de la losa en la pila 4 estará a -0.15 m del nivel de la rasante existente en ese punto, siendo esta misma cota o nivel de la losa para la pila 3. de esta forma se deberá hacer una demolición de las placas de concreto en la zona de la pila 4, es decir se deberá bajar el nivel para dar continuidad al puente hacia la vía en placas de

concreto y hacer un relleno en la zona de la pila 3 para darle continuidad al puente hacia la vía en pavimento asfáltico, de esta forma se tendrá unos niveles de la placa de concreto del puente, así como de las vigas más uniforme.

- Como sobre la vía en pavimento asfáltico se debe retirar parte de la carpeta asfáltica y mejorar la estructura del pavimento en base granular con un espesor mínimo de 0.25 m al 99 % del PM y luego aplicar la carpeta asfáltica de espesor mínimo de 7.5 cm, se debe construir sobre el muro de concreto existente sobre la margen izquierda de la quebrada donde se ubica la baranda metálica un cordón en concreto de 28.0 Mpa, con anclajes epóxicos de acuerdo al detalle realizado en la obra. antes de la construcción de los anclajes se debe remover mínimo 1.0 cm de la capa de concreto de la superficie de la corona del muro y posteriormente construir los anclajes con personal especializado. Este cordón o realce del muro permitirá confinar el lleno y la carpeta asfáltica del tramo de vía a realzar.
- Es importante anotar que sobre la losa de concreto o tablero del puente, se aplicará una capa de carpeta asfáltica de 0.05 m.
- Se recomienda iniciar con la compra de los apoyos elastoméricos o neoprenos para que antes del vaciado de las vigas estos deben estar instalados. Estos neoprenos pueden ser adquiridos en caucho los Comuneros o en la empresa E&M.
- Durante la construcción del cordón de confinamiento se debe tener sumo cuidado con las tuberías y redes de gas existentes.
- Es importante que en el vaciado de las pilas estas no estén inundadas, por lo que se recomienda que una vez se instale de forma correcta la canasta del acero de refuerzo, se realice la extracción del agua e inmediatamente se realice de forma continua el vaciado del concreto hasta el nivel inferior de la viga cabezal del concreto. Una vez esto se haya realizado de forma continua, no tiene porque el agua volver a ingresar al interior de la pila, así esté por debajo del nivel del lecho del cauce.


19. El día 17 de noviembre se realiza el chequeo de los niveles de las 4 pilas con sus respectivos aceros para proceder con el vaciado. A continuación, se muestra el detalle de la planta de las cimentaciones del puente:

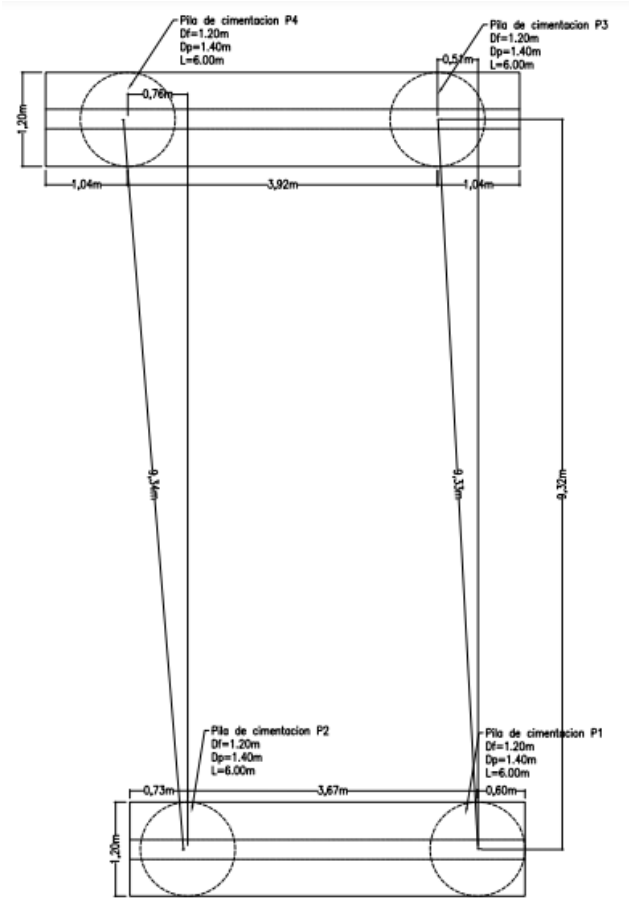

Planta cimentaciones puente

20. El día 18 de noviembre se inicia con la demolición de la estructura del puente existente.
21. El día 21 de noviembre se realiza el vaciado de las cuatro pilas con premezclado.
22. El día 22 de noviembre se inicia con la demolición y excavación en zona de pilas para continuar con la actividad de armado de acero de la viga cabezal.
23. El día 29 de noviembre se inicia con el armado de acero de la viga cabezal de margen sobre pilas N.º 3 y 4.
24. El día 3 de diciembre se realiza el vaciado de la viga cabezal sobre la margen de las pilas Nº3 y 4, en esta margen la tubería de acueducto que se encontraba sobre el alineamiento quedó embebida en la viga cabezal, la cual se referenciará en los planos asbuild.
25. El día 5 de diciembre se realiza la demolición de MH que se encontraba en el alineamiento de la viga cabezal sobre la margen de las pilas Nº1 y 2, el día 6 de diciembre se inicia con el armado de acero de refuerzo y el día 8 de diciembre se vacía la viga cabezal.
26. El día 9 de diciembre se realiza el formaleteo de los estribos.

27. El día 15 de diciembre se realiza el vaciado de las vigas y la losa del puente con concreto preparado en obra. A continuación, se muestra el detalle de la planta losa súper estructura puente entregado por la SIF:

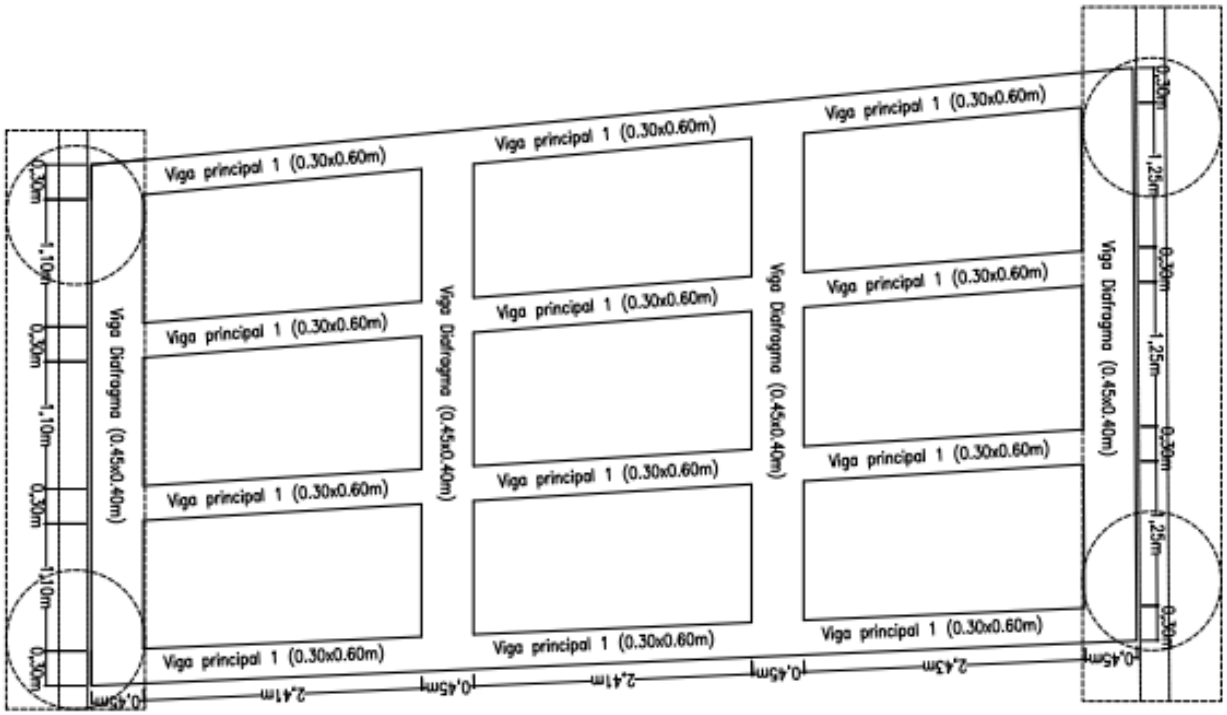

Planta losa súper estructura puente

28. El día 19 de diciembre se instala formaleta del cordón del puente y se realiza el respectivo vaciado.
29. El día 21 de diciembre se realiza desinstalación de pasamanos existente y se inicia con la perforación y anclaje con epóxicos para la construcción del muro realce.
30. El día 29 de diciembre se realiza el retiro de la formaleta de la losa del puente.
31. El 30 de diciembre se realiza vaciado de muro realce
32. El día 3 de enero se retira formaleta de muro realce y se inicia con la construcción del MH ubicado en el costado sur entre las pilas Nº1 y 2, instalación de formaleta y respectivo vaciado.
33. El día 5 de enero se inicia adecuación de zona para construcción de cajas de conexión red de aguas lluvias y red de aguas residuales, se retira material sobrante para instalación de acero de refuerzo y respectiva formaleta, se formaletea cajas para conexión red de aguas lluvias y red de aguas residuales con respectiva tubería y descarga a quebrada como se hallaba.
34. El día 6 de enero se inician con los llenos de los laterales (estribos del puente) con material fresado con respectiva compactación.

35. El día 10 de enero se realiza el retiro del puente peatonal provisional en madera el cual se entrega a la comunidad.
36. El día 12 de enero se inicia la demolición de los empalmes existentes para realizar la nivelación de la rasante con material fresado y respectivo retiro de escombros provenientes de la demolición.
37. El día 17 de enero se arma muro de confinamiento en roca para instalación de fresado en empalme acceso vía en roca existente.
38. El día 18 de enero se realizar nuevamente lleno del lateral (perdida de material por fuertes lluvias durante el día 14 de enero) sobre la margen del pavimento rígido con material fresado con su respectiva compactación.,
39. El día 20 se realizan los llenos con material fresado para llegar al nivel de aplicación de carpeta asfáltica con su respectiva compactación (10cm espesor de pavimento).

El día 21 de enero se realiza la aplicación de carpeta asfáltica, en esta se desarrollan las siguientes actividades:

- Imprimación con emulsión en frio para pavimentos.
- Colocación de mezcla asfáltica en caliente tipo MSC 19 con fibra.
- Compactación de mezcla asfáltica.

40. El día 25 de enero se instala la formaleta y se realiza vaciado de cordón pendiente de empalme que conecta el cordón existente con el cordón del puente (de la vía en pavimento rígido).
41. El día 27 de enero se inicia a realizar las reparaciones (muro y andén) por daños a predios privados durante la ejecución de la obra.
42. El día 27 de enero se realiza recolección de escombro finales para limpieza final y entrega del frente.

El contratista informa que, de acuerdo a los recursos disponibles para culminar las obras, para este frente no se logra ejecutar la instalación de defensas viales y pasamanos razón por la cual no se da por terminadas las labores físicas del contrato sin exonerar al Contratista de su responsabilidad ante cualquier efecto, deterioro o accidente que se presente en la obra ejecutada de este frente, durante el período que cubra la póliza de estabilidad de los trabajos realizados, ya que la omisión de la instalación de defensas viales pasamanos que previenen de una posible caída a la quebrada tanto a los transeúntes como a los vehículos que por allí circulan, situación que puede acarrear inconvenientes funestos. El contratista deja señalización preventiva con pasamanos en madera, tela sarán y/o maletines como acordonamiento preventivo, se deja registro fotográfico del estado en que queda la obra señalizada con maletines.

*Nota: El Contratista no hace entrega a la Interventoría del diseño de mezcla de concretos para verificar y aprobar la existencia de condiciones técnicas necesarias antes de iniciar cualquier actividad que lo requiera.

FRENTE N°2 VEREDA NARANJAL (ESTABILIZACION CON MATERIAL FRESADO)

El día 23 de junio de 2022 se procede a realizar el lleno con material reciclable (fresado suministrado por la Secretaria de Infraestructura), para ello fue necesario realizar:

1. Trasplante de la Palma que se encontraba en la zona de trabajo.
2. Instalación de señalización vertical.
3. Desmonte y limpieza del terreno.
4. Colocación y compactación de material fresado (suministrado por la Secretaría de Infraestructura) en zona de perdida de la banca.

Esta actividad se da por terminada el día 7 de julio por directriz de la Secretaria de Infraestructura, en comité se define lo siguiente: se deja lleno por encima del nivel de la vía aproximadamente de 30 a 40cm, se realiza registro fotográfico para dejar trazabilidad de las condiciones en que queda el frente terminado y así dejar una evidencia de que, si se sigue asentando, se deberá seguir controlando mediante la administración de la Secretaria de Infraestructura.

Se aclara además que la obra ejecutada en el sector fue una obra de MITIGACIÓN, ya que para solucionar la problemática generada por la pérdida de la banca en el sector requiere realizar estudios geotécnicos o estudios de suelos para en base a los resultados definir cuál es la obra adecuada para estabilizar el punto de falla y que posiblemente requiera de una obra de contención. Además, se informa que probablemente en gran parte, la afectación se debe a que en el sector se estaban realizando unas obras que desconfinaron la pata del talud provocando la inestabilidad del terreno.

FRENTE N°3 LA LOMA SAN JAVIER “SENDEROS” (Construcción de sendero escalonado).

1. Levantamiento topográfico de tramo para la construcción de senderos, escalas y pasamanos. Control durante todo el proceso de excavación de las escalas.
2. El día 7 de julio el contratista realiza la instalación de zona de resguardo e inicia actividades de demolición de concreto de sendero existente y excavación de material para conformación de estructura nueva, para ello realiza las siguientes actividades:

   - Excavación y conformación del terreno para construcción de escaleras.
   - Conformación de la estructura del andén con material de fresado.
   - Compactación del material fresado con pisón.
   - Instalación de formaleta para conformación de las escaleras.
   - Instalación de malla electro soldada.

- Instalación de biseles.
- Vaciado de escaleras.
- Acarreo interno de material pétreo (triturado, arena y fresado).
- Recolección y acarreo interno de escombros provenientes de la excavación.

3. El día 13 de agosto se inicia con la actividad de vaciado de escalas del tramo N°2 con mezcla producida en obra (concretadora).
4. Del 1 al 7 de octubre el contratista no realizó vaciados debido la falta de stock de materiales en obra, por lo que solo hasta el 8 de octubre se reactivan los vaciados de escaleras.
5. El día 11 de noviembre se inicia con la instalación de pasamanos, para ello realiza las siguientes actividades:
   - Corte de tubería galvanizada de 1 ½" y ¾" y soldadura,
   - Aplicación de macilla
   - Lijar y pulir
   - Aplicación de anticorrosivo.
   - Aplicación de pintura (dos capas).

A corte del presente informe el contratista no finaliza con la ejecución de la actividad de instalación de pasamanos, presenta un avance en la instalación de pasamanos aprobada del 38,8%.

6. El día 15 de noviembre se realiza el último vaciado de tramo de escaleras. Se ejecuta un total de 263,55 m de escaleras.
7. El día 23 de noviembre el contratista inicia la excavación de brecha para construcción de cuentas en V, incluidas cajas disipadoras donde se requería (por cambios de dirección) para disminuir la velocidad de agua debido al alta pendiente del terreno, solo hasta el día 28 de noviembre se inicia con el vaciado de cunetas en V, para ello realiza las siguientes actividades:
   - Excavación y nivelación de brecha para construcción de cuentas en V.
   - Instalación de formaleta para vaciado de cunetas en V.
   - Instalación de material fresado como conformación de la estructura de la cuneta.
   - Instalación de malla electro soldada.
   - Vaciado de cunetas en V.
   - Instalación de tubería PVC en los tramos donde se requería, debido a las condiciones del terreno (poco ancho disponible para construcción de cuneta V).
   - Construcción de cajas disipadoras tipo desarenadora.
8. El día 27 de enero se termina la construcción de cunetas en V, a cierre del presente informe queda pendiente la instalación de herrajes y tapas de cajas disipadoras.

Pendientes

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

El contratista en el mes de febrero realiza los pendientes que tenía para terminar obra: instalación de pasamanos e instalación de herrajes y tapas de las cajas disipadoras, actividades que finalizan el 9 de febrero de 2023.

*Nota: El Contratista no hace entrega a la Interventoría del diseño de mezcla de concretos para verificar y aprobar la existencia de condiciones técnicas necesarias antes de iniciar cualquier actividad que lo requiera.

FRENTE N°4 VEREDA LA PALMA

1. El día 29 de junio se realiza recorrido en la Vereda la Palma para reconocimiento de los puntos a intervenir en el sector con los profesionales de la Secretaría de Infraestructura Física, el contratista y la Interventoría. Se visitan 6 puntos que requieren de intervención, los cuales necesitan de levantamientos topográficos, ensayos de suelos, diseños de obras, y permisos de propietarios para intervención que se hará en predios privados.
2. El Contratista realiza el levantamiento topográfico solicitado por la SIF en los siguientes puntos:
   Puntos N°1: sobre ancho para recuperación de vía por pérdida de la banca.
   Punto N°2: construcción de muro de contención por pérdida de la banca.
   Punto N°3 mejoramiento de sección hidráulica con la construcción de un Box Coulvert prefabricado.
   Punto N°6 construcción de muro de contención por pérdida de la banca.
3. El contratista presenta una propuesta de sobre ancho de la vía en el punto N°1, a la cual la SIF le realiza algunas observaciones.
4. El Contratista ejecuta las 4 perforaciones de los puntos N°2 y N°6 para realizar los estudios de suelos solicitados por la SIF con el fin de definir los diseños definitivos.
5. El Contratista inicia el día 5 con el polígono de levantamiento topográfico solicitado por la SIF en el punto de los Maya.
6. El día 11 de agosto el Contratista inicia con la actividad de perforación mecánica de roto percusión con una profundidad de L=20m en el punto de los Mayas para realizar los estudios de suelos (ensayo SPT) solicitados por la SIF para definir procesos constructivos en el tramo.
7. El día 15 de agosto el Contratista hace entrega del polígono de levantamiento topográfico en el derrumbe del sector los Mayas vereda la Palma e informe geotécnico de estabilización del talud.
8. El día 24 de agosto el Contratista hace entrega del informe de estudios de suelo y el ensayo de laboratorio realizado en base a la perforación realizada en el Sector los Maya a una profundidad de 20ml, solicitado por la SIF.

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia


9. El día 8 de septiembre la Supervisión realiza solicitud al Contratista de elaboración de la topografía para el diseño de las obras hidráulicas del derrumbe de sector los Maya de la Vereda la Palma en el corregimiento de San Cristóbal.
10. El día 10 de septiembre el Contratista hace entrega del informe de estudios de suelo y el ensayo de laboratorio del sector de los Maya con las correcciones solicitadas por la SIF.
11. El día 14 de septiembre el Contratista hace envío del levantamiento topográfico del área del derrumbe requerida en el sector los mayas.
12. El día 27 de septiembre el Contratista hace envío del levantamiento topográfico para la nueva vía en el sector de los Maya, incluyendo lo solicitado por parte de la supervisión (SIF).
13. El día 28 de septiembre la Supervisión hace envío de la localización, trazado y diseño de las obras de drenaje del sector Los Maya, elaborados por el profesional de la Secretaría de Infraestructura Física, Ingeniero Carlos Alberto Soto Bedoya.
14. La comisión topográfica realiza el trazado de la vía nueva (variante) en el sector de los Maya.
15. El día 5 de octubre se tiene una visita técnica por parte de la SIF, en el cual se trata temas como: canal de desviación de aguas lluvias, movimiento de tubería de acueducto en la zona, construcción de muro en ciclópeo para la realización de llenos en la cárcava, construcción de la vía, perfiles y llenos, compra de predios y filtro para inicio de llenos.
16. El día 18 de octubre el contratista inicia trabajos como: descapote y retiro de material vegetal y orgánico, corte y excavación mecánica de la vía con Bulldozer.
17. El día 20 de octubre se realiza el cierre total de la vía con maletines, y se instala la señalización vertical respectiva. Este mismo día el Jardín Botánico realiza inventario de los arbóreos del predio privado por donde pasa el alineamiento del canal escalonado.
18. Desinstalación de cerco alambrado existente en el predio de los Maya (ya que la vía nueva o variante quedo atravesando predio privado por tal razón se tuvo la necesidad de trasladar el cerco)
19. Reinstalación de cerco alambrado existente en el predio en el límite de la vía por costado izquierdo.
20. Acopio de material proveniente de la excavación, la cual se define con autorización de los dueños del predio de los Maya realizar lleno en su predio.
21. En la parte alta del sector de intervención se presenta falla, en esta zona se realizar mantenimiento constante con material fresado para habilitar el paso vehicular y de volquetas para trabajo interno en sector de los Maya.
22. El día 24 de octubre se tiene una visita técnica por parte de la SIF en la cual se verifican el trazado de la vía nueva y el alineamiento del canal escalonado, recomiendan hacer cierre definitivo de la vía existente con una barrera en Newjersey y hacer cunetas a ambos lados de la vía (solo estaba contemplado por margen izquierda, lindando por predio) para evitar erosiones y que se siguiera socavando la cárcava, por lo que quedan pendientes de enviar diseños de la nueva cuneta, el cual es enviado por el área de diseño de la SIF el día lunes

31 de octubre, mismo día se hace entrega nuevamente de los diseños de la obra hidráulica de la red de aguas lluvias y la descarga a la quebrada la Potreritos.

23. Las actividades de construcción de la vía en el predio de los Maya se suspenden desde el día 4 de noviembre debido a que las aguas lluvias y de escorrentía estaban afectando las obras que se estaban ejecutando, por lo que antes de continuar con los trabajos se requería realizar el manejo de aguas en el sector, por lo que se plantea realizar la instalación de tubería PVC de 36pulg paralela a la vía.
24. El día 9 de noviembre el diseñador realiza visita de campo en la que solicita realizar levantamiento topográfico por parte del contratista, e informa que la tubería se debe encausar por la vía nueva costado derecho subiendo, se deben realizar unas transversales más arriba para disminuir el cauce del agua.
25. El día 24 de noviembre el diseñador hace envío del diseño de la estructura de entrada y salida y red de alcantarillado para la captación y transporte de las aguas de escorrentía del caño afluente de la quebrada San Francisca con detalles adicionales que incluyen sumideros tipo B y detalle de cámara de inspección.
26. El día 1 de diciembre la Secretaria de Infraestructura hace la entrega de los diseños de estructuras hidráulicas, de contención y protección para los tres puntos críticos visitados en el sector los Maya.
27. El contratista reinicia labores el día 6 de diciembre en el sector con la llegada de la tubería novafor PVC especificada en los diseños para proceder con las intervenciones, se desarrollan las siguientes actividades:
    - Construcción de campamentos. (el día 6 de diciembre)
    - Acopio de materiales (tubería novafor PVC para manejo de aguas, la cual llega a obra el día 7 de diciembre).
    - Acarreo interno de materiales de construcción.
    - Mantenimiento de vía para acceso de materiales a la obra.

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia


Perfil de obras a ejecutar en La Verada la Palma "*Diseños de estructuras hidráulicas para el sector los Mayas"*

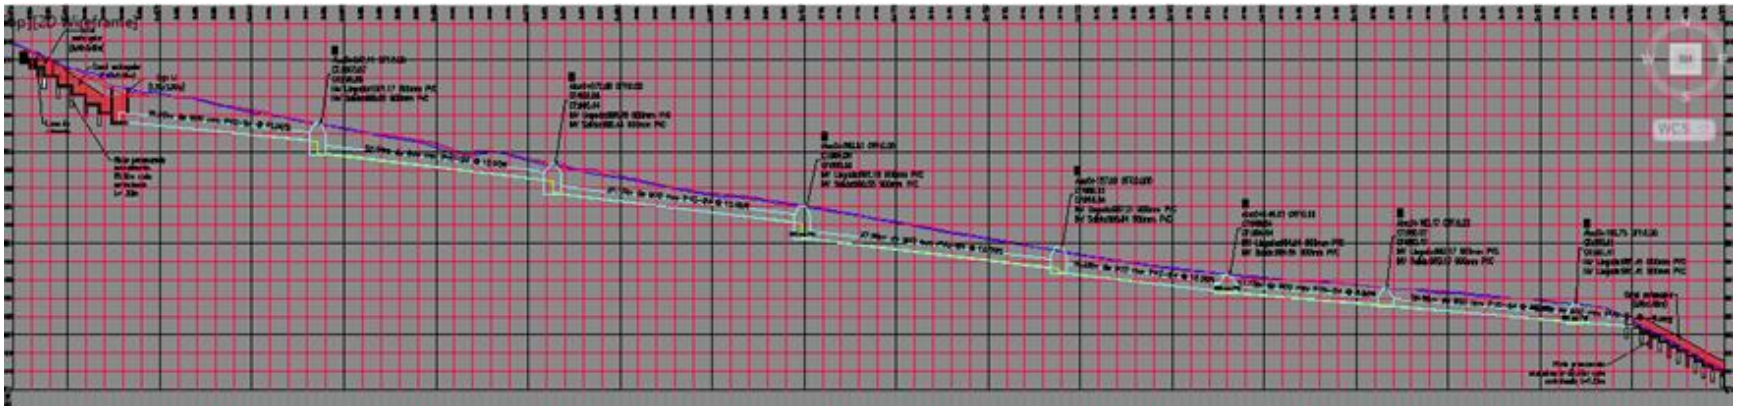


LAS OBRAS QUE SE DESARROLLAN PARA EL MANEJO DE AGUAS EN EL SECTOR SON LAS SIGUINTES:

Canal Rectangular

1. Levantamiento topográfico y marcación del canal rectangular aguas abajo que hacer parte de las estructuras hidráulicas para el manejo de aguas.
2. Rocería en el sector de canal rectangular.
3. Construcción de acceso a construcción de canal con pasamanos aguas abajo.
4. Excavación del canal rectangular.
5. Excavación de pilotes.
6. Armado de acero de refuerzo para pilotes.
7. Vaciado de concreto para pilotes.
8. Vaciado de solado a escalones.
9. Armado de acero de refuerzo losa piso canal y muros.
10. Instalación de formaleta para escalones, muros y cabezote del canal.
11. Vaciado de la losa de piso, muros y cabezote del canal.
12. Corte, figuración e instalación de acero de refuerzo canal rectangular.
13. Acarreo interno de materiales de construcción.

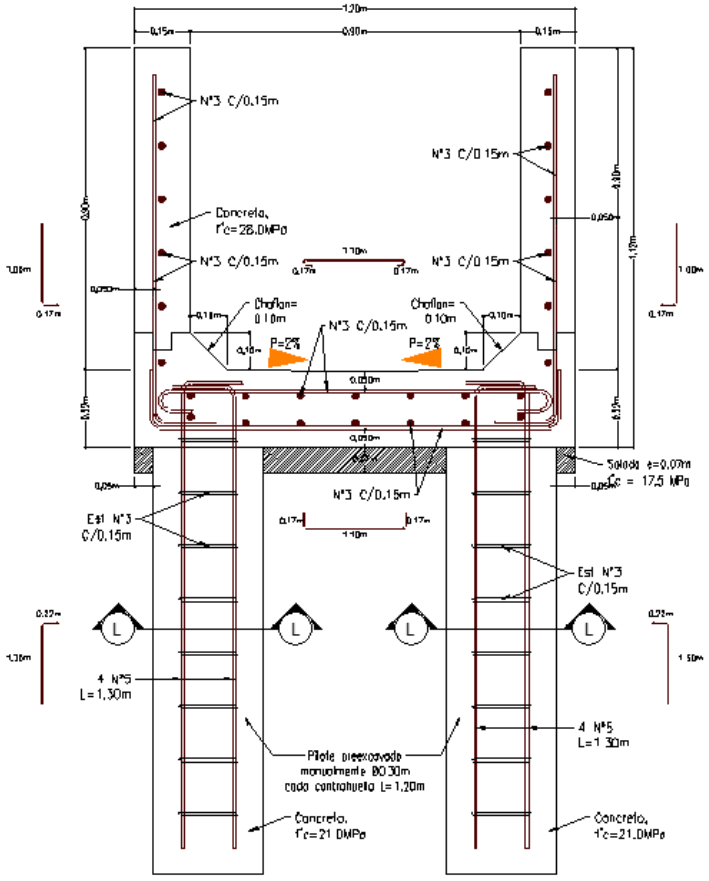

Sección estructural Canal rectangular 0,90x 0,90

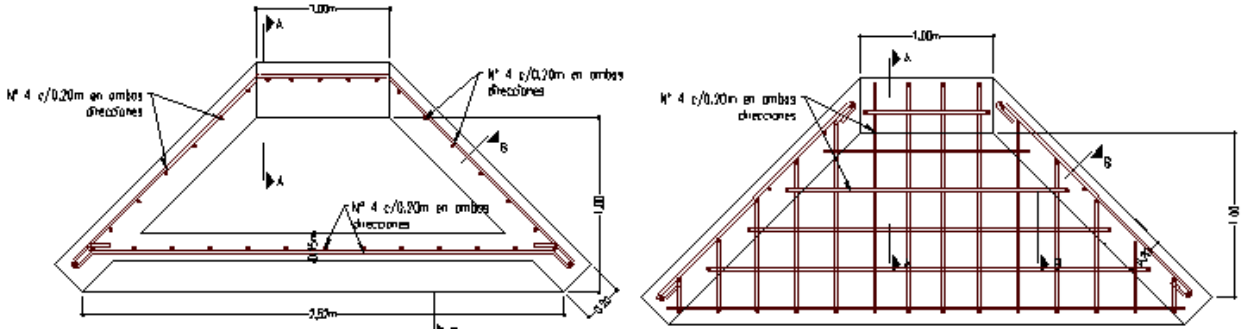

Planta de Cabezote

Tramo Nº1

El día 9 de diciembre se inicia con la excavación del canal rectangular aguas abajo, y el día 13 de diciembre se tuvo que suspender la excavación debido a que se estaban presentando

excavaciones muy profundas, produciendo que la estructura quedara enterrada, por lo que la topografía tuvo que realizar replanteo y localizar el canal de acuerdo al terreno.

El día 26 de diciembre se trabaja en la excavación de los pilotes y se inician a vaciar el 28 de diciembre con su respectivo acero de refuerzo según diseño.

El día 10 de enero se inicia con el vaciado de la losa de piso del canal y el día 17 de enero se finaliza el vaciado de la losa de piso del primer tramo de escaleras y mismo día se inicia la excavación para construcción de losa del cabezote, se realiza la excavación de 4 pilotes y se realiza la respectiva instalación de acero de refuerzo, el día 18 de enero se realiza el vaciado del concreto ciclópeo de la losa del cabezote.

El día 20 de enero se inicia con el vaciado de los muros del canal rectangular y a la fecha de corte falta por vaciar aproximadamente 9m de muro por ambas márgenes, tramo de L=55m.

Entre el tramo Nº1 y Nº2 se instala tubería PVC de 900mm de L= 3m

Tramo Nº2

Entre el día 10 y 27 de diciembre se realizó excavación y conformación intermitentes del segundo tramo del canal rectangular, el cual se suspende y se reactiva el 3 de enero de 2023.
El día 24 se inicia la excavación de los pilotes, instalación de acero de refuerzo y respectivo vaciado.

El día 26 de enero se inicia con el armado de acero de refuerzo de la losa (escalones) y de los muros del canal rectangular.

El día 30 de enero se comienza con el vaciado de la rampa inicial del canal (L=3m) y 5 escalones adicionales, queda pendiente terminar de vaciar los escalones y muros del segundo tramo de L= 35m)

Tramo Nº3

Aguas arriba antes de iniciar la tubería de 900mm el día 23 de enero se inicia excavación del tercer tramo de canal rectangular escalonado de L=6,30m.

El día 30 de enero se realiza vaciado de los escalones del canal rectangular, a la fecha de corte de cierre del presente informe queda pendiente encofre de muros, vaciado de muros y cabezote de entrada con aletas.


Tubería PVC 900mm

1. Levantamiento topográfico y marcación de MH y alineamiento de tubería PVC de 900mm.
2. Excavación de brecha para instalación de tubería PVC de 900mm.
3. Instalación de cama de triturado.
4. Instalación de tubería PVC de 900mm
5. Atraque de tubería con triturado a medio tubo.
6. Lleno de brecha con material proveniente de la excavación y compactación.
7. Acarreo interno de materiales de construcción.

Construcción de cajas de inspección (8 unidades).

1. Excavación mecánica, corte y perfilación del terreno manualmente
2. Corte y armado de acero de refuerzo para construcción de cajas de inspección según diseños.
3. Instalación de formaleta para losa de piso, muros y losa superior de caja de inspección.
4. Vaciado de concreto losas de piso, muros y losa superior de cajas de inspección.
5. Instalación de cono y lleno con material proveniente de las excavaciones con respectiva compactación.


El día 12 de diciembre se inicia con la excavación de brecha para instalación de tubería PVC y el día 13 de enero se finaliza con la excavación e instalación de tubería PVC de 900mm.

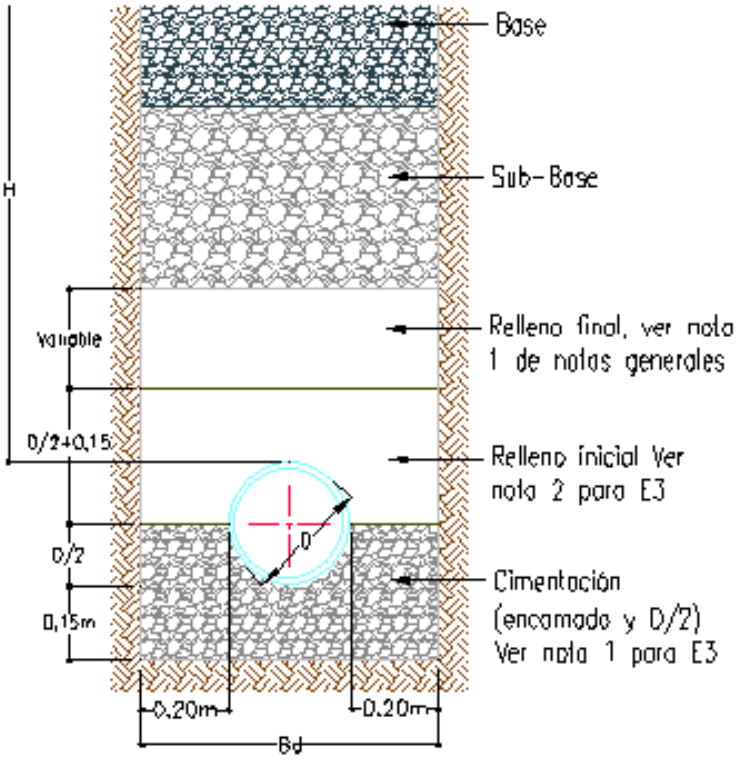

Sección típica de cimentación para tubería PVC 900mm

El día 18 de enero se inicia con la excavación de las cajas de inspección, a la fecha de cierre del presente informe de las 8 cajas de inspección a construir quedan en el siguiente estado:

- Caja de inspección totalmente vaciada con cono instalado y con llenos compactados: 1 unidad.
- Caja de inspección solo tiene excavación: 2 unidades
- Caja de inspección falta por excavar: 1 unidad
- Caja de inspección con losa de piso vaciado y acero de refuerzo de muros: 2 unidades
- Caja de inspección con losa de piso, muros y losa superior vaciada: 1 unidad
- Caja de inspección con losa de piso y muros vaciados: 1 unidad.

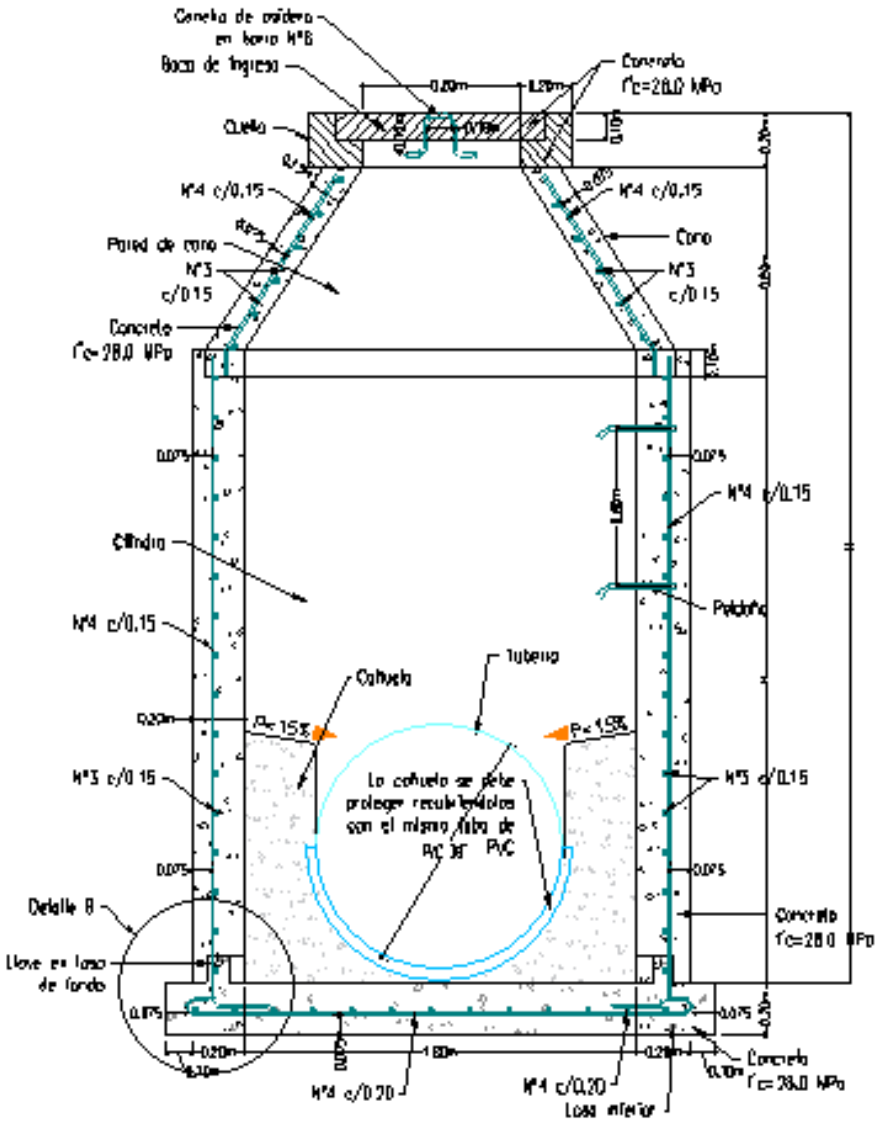

Cámara de inspección concéntrica

Tratamiento Cárcava con Gaviones

1. Excavación mecánica y conformación para acceso zona de intervención de muro en gaviones.
2. Excavación mecánica en zona de construcción fundación de gaviones.
3. Excavación de pilotes.
4. Armada de acero de refuerzo para pilotes.
5. Vaciado de concreto para pilotes.

6. Armado de acero de refuerzo parrilla de placa concreto para apoyo de gaviones.
7. Vaciado de placa concreto para apoyo de gaviones.
8. Acarreo interno de materiales de construcción.
9. Armado de gaviones, incluye instalación de malla para gaviones, tensores longitudinales y transversales por capas de roca, fractura e instalación de rocas y cosido de los módulos de gaviones con alambre.
10. Instalación de geotextil.
11. Lleno en material proveniente de la excavación con respectiva compactación, además el material proveniente de la excavación de la tubería de 900mm se deposita en la cárcava.
12. Adecuación de vía interna para acarreo interno de materiales de construcción.

El día 19 de diciembre se inicia con la excavación mecánica en zona de construcción fundación de gaviones.

El día 21 de diciembre se inicia con la excavación de pilotes y el 23 de diciembre se instala el acero de refuerzo y respectivo vaciado.

El día 26 de diciembre se inicia el armado de acero de refuerzo de la parrilla para la placa de concreto que servirá como apoyo de los gaviones.


El día 28 de diciembre se realiza vaciado de placa concreto para apoyo de gaviones, la cual termina el día 29 de diciembre.

El 30 de diciembre se inicia con la construcción del muro de contención en gaviones, el cual finaliza el día 25 de enero.

El contratista informa que, de acuerdo a los recursos disponibles para culminar las obras, para este frente no se logra ejecutar las 5 hiladas de gaviones que se tenían prevista inicialmente, para el tratamiento de la cárcava en el sector. Por lo que el muro de contención en gaviones queda con un total de 4 hiladas de gaviones.

Los días del 27 al 31 de enero se realiza lleno con material proveniente de excavaciones de la obra en zona de gaviones y se realiza compactación mecánica con rodillo manual en capas.

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

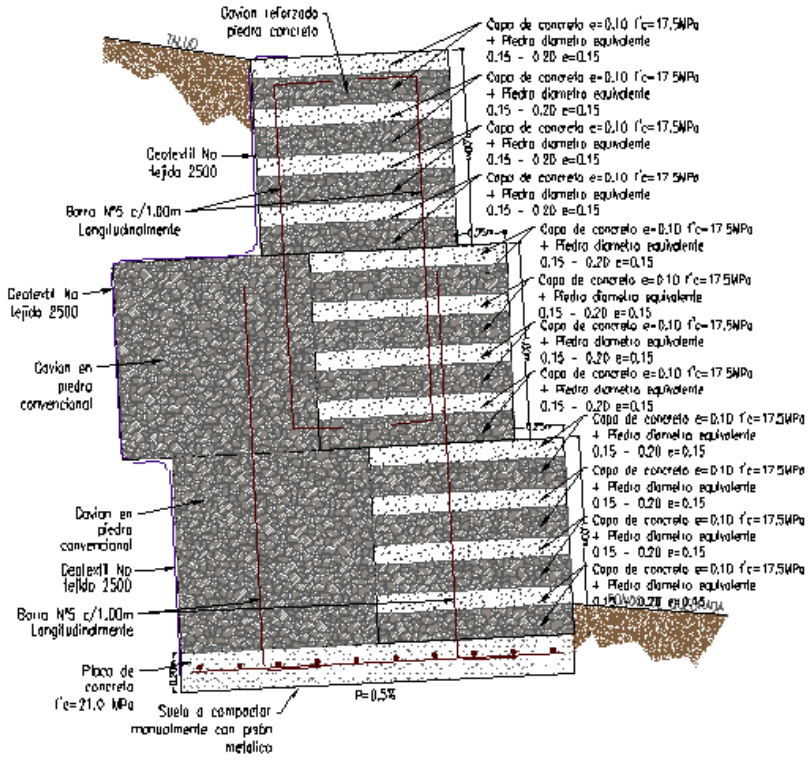

Muro de contención en Gaviones

Pendientes:

El contratista en el mes de enero realiza los pendientes que tenía para terminar obra: la terminación de 7 unidades de cajas de inspección que anteriormente se relacionaron y que estaban en avance de ejecución variable, se finaliza el vaciado de los muros de canal aguas debajo y aguas arriba de la tubería de PVC instalada, y el cabezote de entrada del canal con sus aletas. Dichas actividades pendientes las culminan el 31 de enero de 2023.

*Nota: El Contratista no hace entrega a la Interventoría del diseño de mezcla de concretos para verificar y aprobar la existencia de condiciones técnicas necesarias antes de iniciar cualquier actividad que lo requiera.

FRENTE N°5 VEREDA EL YOLOMBO SECTOR CR 106 # 106-409 (Construcción de cunetas para darle continuidad a las existentes).

Las actividades que se desarrollaron para ejecutar la obra fueron las siguientes:

1. Rocería.

2. Excavación de material heterogéneo para conformación y construcción de cunetas por margen izquierda y derecha.
3. Corte y demolición de pavimento con cincel y barra respectivamente.
4. Instalación de formaleta para conformación de cuneta.
5. Instalación de malla electro soldada.
6. Vaciado de cunetas en concreto.

El día 19 de julio inicia frente de obra con la instalación de señalización vertical. Inicio de descapote y limpieza para conformación y construcción de cunetas, en las zonas donde había existencia de cunetas se realiza la respectiva rocería y limpieza.

El día 1 de agosto se inicia con la instalación de formaleta para conformación de cuneta.

El día 12 de agosto se inicia con la actividad de vaciado de cunetas, con mezcla producida en obra (concretadora), actividad que se finaliza el 29 de octubre.

El día 31 de octubre el Ing. Aníbal Jaramillo de la Secretaria de Infraestructura Fisica realiza recorrido para verificar el estado de las cunetas, el cual no avala la entrega final de las obras hasta no se hagan las correcciones respectivas por malos acabados finales.


Por lo que el día 25 de noviembre el contratista hace entrega a la Interventoría de las reparaciones de las cunetas las cuales se reciben, sin embargo, se informa y se aclara al contratista que se hará un seguimiento al comportamiento de las cunetas ya que el tratamiento que se aplicó tiene un recubrimiento de muy poco espesor que, con el paso de vehículos, los cambios de temperatura y el estar expuesto al sol y al agua puede tender a fracturarse rápidamente.
*Nota: El Contratista no hace entrega a la Interventoría del diseño de mezcla de concretos para verificar y aprobar la existencia de condiciones técnicas necesarias antes de iniciar cualquier actividad que lo requiera.

FRENTE N°6 VEREDA BOQUERÓN (Construcción de estructura en ciclópeo para protección a red de acueducto).

Las actividades que se desarrollaron para ejecutar la obra fueron las siguientes:

1. Excavación de material para limpieza de canal existente por donde pasa la tubería de acueducto.
2. Corte y demolición de pavimento en zona de construcción de estructura en concreto ciclópeo.

3. Excavación de brecha para construcción de estructura en concreto ciclópeo en ambos lados del canal existente.
4. Vaciado de concreto ciclópeo.
5. Instalación de lámina metálica de 5/8”.



Detalle constructivo de protección Red de acueducto

El día 19 de julio inicia frente de obra con el descapote y limpieza de la zona a intervenir.

Los días 10 y 11 de agosto se realiza vaciado de estructura en concreto ciclópeo, quedando pendiente dos tramos por vaciar, en la zona del derrumbe producida por el desconfinamiento de la brecha durante varias semanas y en el tramo final de tubería expuesta.

El día 12 de agosto se suspenden actividades en el frente. Adicionalmente ese mismo día la Secretaría de Infraestructura Física le solicita al contratista darles prioridad a las actividades en el frente de Boquerón de la rehabilitación de un tramo de vía de aproximadamente 60m y a la instalación de las platinas en la zona de protección a la red de acueducto, ya que, se requería para el ingreso de material al puente que se estaba construyendo en la zona. El día 19 de agosto en reunión virtual con el subsecretario aprobó el incremento en los costos por transporte por acceso retirado y mal estado de la vía, solicitados mediante comunicado N°19 el día 13 de agosto.

El día 31 de agosto el contratista reanuda las actividades pendientes en el sector de intervención, con el retiro de material en tramo faltante para continuar con vaciado de estructura en concreto ciclópeo y atención a PQR del predio afectado. El tramo intervenido de canal en concreto ciclópeo fue de 48,40 m.

El día 1 de septiembre se inicia con la mitigación del tramo de vía de aproximadamente de 60 m y en el cual se desarrollaron las siguientes actividades:

- Demolición de pavimento flexible existente.
- Riego de material de fresado suministrado por la Secretaria de Infraestructura.
- Conformación y compactación de material fresado.
- Colocación de mezcla asfáltica en caliente tipo MSC 19 con fibra.

Esta actividad de mitigación para habilitar paso vehicular se da por terminada el día 9 de septiembre. Se aclara que la obra ejecutada en el sector fue una obra de MITIGACIÓN, ya que, para solucionar la problemática, era necesario de un trabajo a fondo que requería de inversión de recursos, los cuales no estaban dentro del alcance del presente contrato.

El día 22 de noviembre el contratista lleva al frente de obra las platinas metálicas de 5/8" para protección a la red de acueducto, las cuales estaban pendientes de instalación desde el 16 de septiembre.
El día 23 de noviembre el contratista inicia labores de soladura para instalación de platinas metálicas de 5/8".

El día 1 de diciembre el contratista finaliza las actividades al 100%.

CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA:

FRENTE N°1 VEREDA BARRO BLANCO (Fresado, pavimento, cunetas y obras complementarias)


1. El día 11 de julio se aprueba la implementación del PMT de Santa Elena.
2. El día 14 de julio se ejecuta desde el área social la socialización puerta a puerta para informar del inicio de las obras, la implementación del PMT, actas de vecindad en las viviendas de la zona a intervenir y recorrido con los líderes de la zona.
3. El día 25 de julio se realiza socialización a la comunidad para informar el inicio de obra y de los cierres que iniciarían el día miércoles 27 de julio hasta el día 2 de agosto de ser necesario, para no afectar las fiestas de feria de flores.
4. El día 26 de julio se realiza la implementación del PMT.
5. Del día 28 de julio al 4 de agosto el contratista realiza la actividad de pavimentos, se ejecutan las siguientes actividades:

- Fresado de la vía de 10 cm para mezclarlo con el material existente (estructura) e instalarlo nuevamente, compactarlo y hacerle un mejoramiento a la estructura del pavimento.
- Imprimación con liga caliente para pavimentos
- Colocación de mezcla asfáltica en caliente tipo MSC 19 con fibra (con finisher).
- Compactación de mezcla asfáltica.
- En los puntos en que se detectan fallos en la estructura se realizan reemplazos con material fresado.
- Instalación de 3 resaltos solicitados por la comunidad.

Debido a que en el tramo intervenido el acabado final del pavimento mostró que la estructura no estaba en las mejores condiciones y que los reemplazos puntuales no estaban funcionando, se

define que el fresado proveniente de la demolición del pavimento no se seguiría llevando para la vereda de Piedras Blancas, sino que se continuaría fresando y con el material existente (estructura) mezclarlo para nuevamente instalarlo, compactarlo y hacerle un mejoramiento a la estructura del pavimento, lo cual fue aprobado por la SIF.

6. El día viernes 05 de agosto de 2022, el contratista realiza limpieza total en el frente de obra Barro Blanco y deja pendiente las obras complementarias en el sector. La cantidad instalada de pavimento flexible en el sector fue de 425 m.
7. El día 7 de septiembre el Contratista realiza la instalación de la señalización vertical informativa de los 3 resaltos construidos en la zona. Quedando pendiente la demolición de los mismo y construcción de resaltos nuevos.
8. El día 6 de octubre el Contratista realiza la demolición pendiente de los 3 reductores de velocidad que se habían construido en el mes de agosto y la respectiva reposición de los 3 resaltos con las especificaciones definidas en el manual de señalización vial.



Resalto Parabólico y circular

9. El día 20 de octubre de 2022 el contratista reactiva el frente y da inicio con las actividades de obras complementarias, las cuales finalizan el día 12 de enero de 2023. La cantidad instalada de cordonería fue de 450m, para ello se realizaron las siguientes actividades:
   - Excavación de material heterogéneo
   - Nivelación de terreno.
   - Instalación y nivelación de cordonería.
   - Rebite de juntas.
   - Ajuste de pavimento
10. El día 18 de enero se inicia la señalización horizontal de los reductores de velocidad construidos desde el 3 de agosto de 2022, debido a que se presentan lluvias en la tarde el día 19 de enero se finaliza con la pintura de los reductores de velocidad. Quedando al 100% ejecutas las obras en el sector.

FRENTE N°2 VEREDA PIEDRAS BLANCAS (Riego de fresado, pavimento y cunetas).

1. El día 28 de julio de 2022 se dispone del fresado proveniente de la demolición del pavimento de la vereda de Barro Blanco, para la conformación de la estructura la cual se

encontraba en regulares condiciones, se riega el material fresado en el sector y se realiza la respectiva compactación.

FRENTE N°3 VEREDA PANTANILLO (Demolición, pavimento y obras complementarias).

1. El día 29 de septiembre el Contratista inicia la actividad de pavimentos en el sector, se ejecutan las siguientes actividades:
- Fresado de pavimento flexible existente.
- Reinstalación del fresado y compactado para dejarlo como soporte de la estructura para mejoramiento de la misma.
- Imprimación de liga en caliente.
- Colocación de mezcla asfáltica en caliente tipo MSC 19 con fibra (con finisher).
- Compactación de mezcla asfáltica.
- Reposición de 2 reductores de velocidad a la atura del colegio de la zona.
- Reparación de filtro existente de obra transversal que se encontraba en malas condiciones.

2. El día 13 de octubre el contratista se retira del frente, quedando pendiente una franja de aproximadamente 25 m (medio carril).
3. El día 14 de octubre el contratista realiza la instalación de señales verticales informativas de los 2 resaltos construidos en la zona escolar. Quedando pendiente la señalización horizontal de los reductores de velocidad.
4. El día 29 de septiembre de 2022 el contratista inicia con el corte y demolición de pavimento para la instalación de obras complementarias (cordonería), deja el frente inactivo.
5. El día 10 de noviembre el Contratista realiza la franja que tenía pendiente por pavimentar de aproximadamente 25 m (medio carril) desde la jornada realizada el 13 de octubre. La cantidad de pavimento que se ejecutó fue de 425 m.
6. El día 8 de diciembre de 2022 el contratista reinicia las actividades de obras complementarias en el sector, las cuales finalizan el día 27 de diciembre. La cantidad instalada de cordonería fue de 250m, para ello se realizaron las siguientes actividades:
    - Demolición de pavimento y cuneta existente.
    - Excavación de material heterogéneo.
    - Nivelación de terreno.
    - Instalación y nivelación de cordonería.
    - Rebite de juntas.
    - Ajuste de pavimento
7. El día 19 de enero se realiza la señalización horizontal de los reductores de velocidad construidos desde el 3 de agosto de 2022. Quedando al 100% ejecutas las obras en el sector.

CORREGIMIENTO DE SAN ANTONIO DE PRADO

FRENTE # 1 Vereda La Florida sector 1. (Fresado y pavimento)

1. Del día 12 al 14 de septiembre el Contratista realiza la actividad de pavimentos en el sector, se ejecutan las siguientes actividades:

- Fresado de la vía. (fue llevado a frente Nº2 Florida parte baja y al frente Nº3 La Verde)
- Imprimación con liga caliente para pavimentos
- Colocación de mezcla asfáltica en caliente tipo MSC 19 con fibra (con finisher).
- Compactación de mezcla asfáltica.
- El Contratista no hace entrega a la Interventoría del diseño de mezcla asfáltica para verificar y aprobar la existencia de condiciones técnicas necesarias antes de iniciar cualquier actividad que lo requiera.

2. El día 23 de septiembre se subsana empoce de agua, se realiza nivelación en batea que el contratista no identificó cuando estaba pavimentando, quedando al 100% ejecutadas todas las actividades del punto de intervención. La cantidad de pavimento que se ejecutó fue de 225 m.

FRENTE # 2 Vereda La Florida sector 2. (Riego de fresado y pavimento)

1. Del día 13 al 15 de septiembre el Contratista realiza la actividad de pavimentos en el sector, se ejecutan las siguientes actividades:

- Excavación de material existente en la zona, se evidencia presencia de tubería de acueducto veredal muy superficial por lo que se define hacer el riego de fresado sobre la estructura existente.
- Riego de fresado proveniente del frente La Florida sector 1.
- Compactación de fresado para conformación de la estructura de la vía.
- Imprimación con liga caliente para pavimentos
- Colocación de mezcla asfáltica en caliente tipo MSC 19 con fibra (con finisher).
- Compactación de mezcla asfáltica.
- Instalación de obras complementarias (cordonería)

En el tramo intervenido el nivel de la rasante quedó en algunos puntos por encima de las entradas a las viviendas y con las fuertes lluvias se les estaba ingresando agua a las viviendas, por tal razón fue necesario la construcción de obras complementarias de cordonería para mitigar la problemática del manejo de aguas lluvias que, si bien era preexistente a la pavimentación, se agudizó con el aumento del nivel de la vía.

2. Por lo que el día 26 de septiembre el Contratista inicia actividades de obras complementarias de cordonería, para ello hicieron las siguientes actividades:

- Corte y demolición de pavimento, cordón y cunetas existentes
- Excavación y conformación del terreno
- Instalación y nivelación de cordonería en los puntos más críticos del sector.
- Rebite de juntas.
- Ajuste de pavimento con cemento

3. El día 20 de octubre se culminaron las obras complementarias. La cantidad instalada de cordonería fue de 75m.

Las actividades de pavimentación y obras complementarias culminaron, quedando al 100% ejecutadas todas las actividades del punto de intervención. La cantidad de pavimento que se ejecutó fue de 115 m.

FRENTE # 3 Vereda La Verde. (Riego de fresado y pavimento)

1. Del día 15 al 19 de septiembre el Contratista realiza la actividad de pavimentos en el sector, se ejecutan las siguientes actividades:

Primer tramo de 113m falla existente.

- Fresado de pavimento flexible existente.
- Rocería.
- Lleno con material fresado para nivelar zona por presencia de falla (material del sitio y proveniente del frente La Florida sector 1).
- Compactación de fresado para conformación de la estructura de la vía.
- Imprimación con liga caliente para pavimentos
- Colocación de mezcla asfáltica en caliente tipo MSC 19 con fibra (con finisher).
- Compactación de mezcla asfáltica.
  Esta actividad se concluye el día 16 de septiembre.
  Segundo tramo de 143m.
- Fresado de pavimento flexible existente.
- Limpieza del área a intervenir.
- Imprimación con liga caliente para pavimentos
- Colocación de mezcla asfáltica en caliente tipo MSC 19 con fibra (con finisher).
- Compactación de mezcla asfáltica.

La actividad de pavimentación se concluye el día 19 de septiembre. Sin embargo, se identificó en una zona que el pavimento no quedó con la presencia del hombro de la cuenta existente (se cubrió con pavimento) cuando se pavimento, la cual había quedado en su mayor parte del

tramo intervenido como bordillo para conducir las aguas de escorrentía, para ese punto fue necesario instalar cordonería nueva y así darle garantía al pavimento aplicado,

3. Por lo que el día 6 de octubre el Contratista inicia actividades de obras complementarias de cordonería, para ello hicieron las siguientes actividades:

- Corte y demolición de pavimento, cordón y cunetas existentes
- Excavación y conformación del terreno
- Instalación y nivelación de cordonería en los puntos más críticos del sector.
- Rebite de juntas.
- Ajuste de pavimento con cemento

4. El día 11 de octubre se culminaron las obras complementarias. La cantidad instalada de cordonería fue de 40m.

Las actividades de pavimentación y obras complementarias culminaron, quedando al 100% ejecutadas todas las actividades del punto de intervención. La cantidad de pavimento que se ejecutó fue de 255 m.

CORREGIMIENTO DE ALTAVISTA

FRENTE # 1 Miradores Parte Baja. (Fresado e instalación de pavimento)

1. Del día 22 al 27 de septiembre el Contratista realiza la actividad de pavimentos en el sector, se ejecutan las siguientes actividades:

- Fresado de pavimento flexible existente.
- Imprimación con liga caliente para pavimentos
- Colocación de mezcla asfáltica en caliente tipo MSC 19 con fibra (con finisher).
- Compactación de mezcla asfáltica.

La actividad de pavimentación culminó, quedando al 100% ejecutadas todas las actividades del punto de intervención. La cantidad de pavimento que se ejecutó fue de 170 m.

*Nota: 1). El Contratista no hace entrega a la Interventoría del diseño de mezcla asfáltica para verificar y aprobar la existencia de condiciones técnicas necesarias antes de iniciar cualquier actividad que lo requiera.

2). Después de las actividades de instalación de mezcla asfáltica se presentó un daño en una red domiciliaria la cual fue reparada en su momento y se realizó el parcheo de punto intervenido. Después de que el contratista se retira del frente se presenta un nuevo daño en otra de las redes domiciliarias, la cual es reparada por EPM al corte del presente informe aun esta sin el parcheo debido.

FRENTE # 2 Morro Corazones (Pavimento)

Primer tramo de 125m

1. El día 2 de noviembre se interviene primer tramo con aplicación de asfalto, se ejecutan las siguientes actividades:

- Limpieza de zona.
- Imprimación con emulsión en frio. (se le solicita al contratista cubrir toda el área con la emulsión, argumenta que no es posible debido al alta pendiente ya que es riesgoso para las volquetas).
- Aplicación de mezcla asfáltica en caliente MSC 19 con fibra.
- Compactación de la mezcla asfáltica en caliente

Segundo tramo de 125m

2. El día 3 de noviembre el segundo tramo con aplicación de asfalto, se ejecutan las siguientes actividades:

- Limpieza de zona.
- Imprimación con emulsión en caliente.
- Aplicación de mezcla asfáltica en caliente MSC 19 con fibra (con finisher).
- Compactación de la mezcla asfáltica en caliente.

En este tramo quedó pendiente el realce de 2 MH y 1 válvula de acueducto y la construcción de un reductor de velocidad existente.

Antes de la aplicación de la mezcla se realiza recorrido con el ingeniero residente de obra y se le solicita realizar los respectivos retiros de fallos existentes en el tramo a intervenir para garantizar la calidad de las obras, en el primer tramo se identificaron 3 fallos y en el segundo tramo un fallo, los cuales no fueron retirados, razón por las cual no cumplieron con los requerimientos de calidad, en caso que se refleje alguno de estos fallos en el pavimento aplicado deberán garantizar la calidad de las obras.

3. El día 17 y 18 de enero se realiza la demolición del pavimento flexible y realce de los 2 MH y 1 válvula de acueducto.
4. El día 23 de enero se realizan las siguientes actividades pendientes:

- Aplicación de pavimento (parcheo) en área demolida a razón de realce de 2 MH y 1 tapa de registro válvula de acueducto.
- Construcción de reductor de velocidad.
- Señalización horizontal provisional mientras cura asfalto.

La actividad de pavimentación culminó, quedando al 100% ejecutadas todas las actividades del punto de intervención. La cantidad de pavimento que se ejecutó en total fue de 250 m.

Queda pendiente la instalación de señales verticales informativas de resalto y la señalización horizontal del reductor de velocidad.

*Nota: El Contratista no hace entrega a la Interventoría del diseño de mezcla asfáltica para verificar y aprobar la existencia de condiciones técnicas necesarias antes de iniciar cualquier actividad que lo requiera.

FRENTE # 2 Vereda Manzanillo. (Instalación de malla sobre pavimento rígido e instalación de pavimento flexible)

1. El día 17 de noviembre el contratista inicia con la ejecución de obras en el sector, a continuación, se enumeran las actividades que se desarrollan durante la pavimentación:


- Demolición de concreto existente.
- Retiro de escombros.
- Reemplazo de estructura con base granular.
- Compactación de base granular.
- Instalación de malla electrosoldada.
- Instalación de dovelas
- Vaciado de concreto tipo MR42 con aditivo acelerante para concretos (Sikaset L).

5. El día 21 de noviembre se inicia con el vaciado de losas en concreto y el día 6 de diciembre se culminaron las obras en el sector. La cantidad instalada de pavimento rígido fue de 95m.

CORREGIMIENTO DE PALMITAS

FRENTE # 1 Vereda La Frisola

1. El día 12 de septiembre el Contratista hace envío del levantamiento topográfico de la quebrada 100 m aguas abajo y 100 m aguas arriba, información necesaria para elaborar diseño de obra hidráulica a solicitud de los profesionales hidráulicos de la SIF.
2. El día 10 de enero de 2023 la Secretaria de Infraestructura Física a cargo de los profesionales hidráulicos de la unidad de diseño, hacen la entrega del diseño del paso vial de la Vereda la Frisola del Corregimiento de San Sebastián de Palmitas. Debido a que la entrega del diseño por parte de la SIF fue tardía, el contratista no logra ejecutar la obra, ya que el tiempo programado o estimado para la de ejecución de la obra diseñada era de aproximadamente de un mes a 1 mes y medio, y el contratista solo tenía hasta el 31 de enero de 2023 fecha de terminación de la segunda adición para ejecutar las obras faltantes, por lo que este tiempo era inferior al de ejecución de la obra diseñada, así como los recursos resultaban insuficientes para ejecutar este frente.

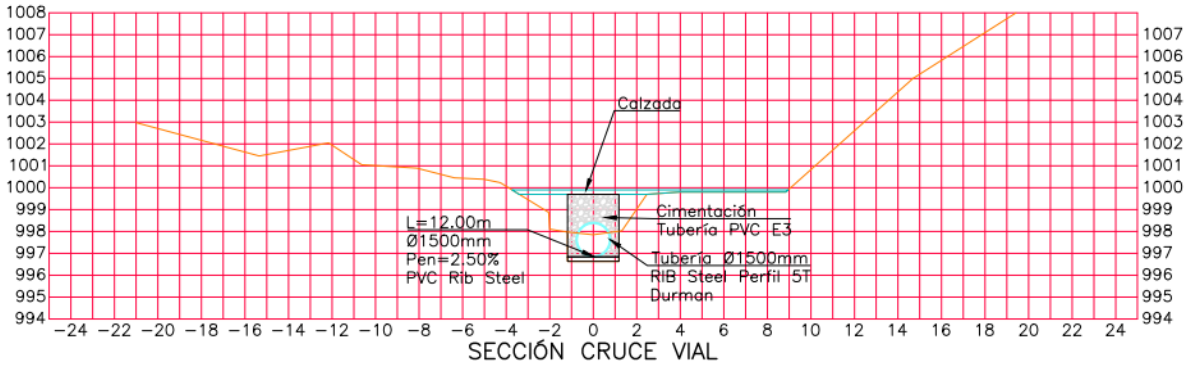

PROGRAMADO VS EJECUTADO

De acuerdo con la programación de obra vigente presentada por el Contratista a 15 de diciembre de 2022 y sin tener en cuenta la fecha de terminación de la segunda adición que vencía el 31 de enero de 2023, venciéndose así el plazo de ejecución de las obras. Al cierre del presente informe se comunica que las actividades que se debían desarrollar en todos los corregimientos del Distrito Especial De Ciencia Tecnología E Innovación De Medellín se encuentran ejecutadas al 100,0%.

Esta Interventoría informa que las actividades de construcción del puente Pajarito-Corregimiento de San Cristóbal ya están concluidas al 100%, por lo que las labores se encuentran terminadas.

Las actividades de construcción de escaleras y obras complementarias de Senderos- La Loma Corregimiento de San Cristóbal ya están concluidas al 100%, por lo que las labores se encuentran terminadas. Durante el mes de febrero se finalizó los pendientes que se tenían al cierre del 31 de enero de 2023, fecha de entrega final de las obras.

Las actividades de los frentes de Naranjal, Boquerón y El Yolombo Corregimiento de San Cristóbal ya están concluidas al 100%, por lo que las labores se encuentran terminadas.

Las actividades de construcción de la Palma Corregimiento de San Cristóbal ya están concluidas al 100%, por lo que las labores se encuentran terminadas. Durante el mes de febrero se finalizó los pendientes que se tenían al cierre del 31 de enero de 2023, fecha de entrega final de las obras

Construcción de canal rectangular (muros tramos Nº2 y Nº3 y cabezote de entrada).

- Construcción de cajas de inspección de la tubería PVC 900mm.
- Riego y nivelación con material fresado, variante construida.

En el sector de Barro Blanco- Corregimiento de Santa Elena las actividades de pavimentación, obras complementarias y señalización horizontal de los reductores de velocidad ya están concluidas al 100%, por lo que las labores se encuentran terminadas.

En el sector de pantanillo- Corregimiento de Santa Elena las actividades de pavimentación, obras complementarias y señalización horizontal de los reductores de velocidad ya están concluidas al 100%, por lo que las labores se encuentran terminadas.

En el sector de Piedras Blancas- Corregimiento de Santa Elena las actividades de riego de fresado ya están concluidas al 100%, por lo que las labores se encuentran terminadas.

En el sector de Miradores Parte Baja- corregimiento de Altavista las actividades de pavimentación ya están concluidas al 100%, por lo que las labores se encuentran terminadas.

En el sector de Morro corazones- corregimiento de Altavista las actividades de pavimentación en los dos tramos intervenidos, realce de MH y válvula de acueducto y la reposición del resalto ya están concluidas al 100%, por lo que las labores se encuentran terminadas. Está pendiente la señalización horizontal del reductor de velocidad construido el 23 de enero, ya que la superficie del asfalto nuevo debe estar adecuadamente curada antes de pintar, requiere mínimo 3 semanas de curado.

En el sector de Manzanillo- corregimiento de Altavista las actividades de pavimentación ya están concluidas al 100%, por lo que las labores se encuentran terminadas.

Las actividades de construcción en la Frisola- corregimiento de San Sebastián de Palmitas ya deberían estar concluidas, siendo la fecha de terminación según programación el 25 de octubre de 2022. Sin embargo, el contratista realizó el levantamiento topográfico de la quebrada para la construcción de una solución hidráulica. El día 10 de enero de 2023 por parte de la Secretaría de Infraestructura Física fue enviado el diseño del paso vial de la Vereda la Frisola del Corregimiento de San Sebastián de Palmitas, sin embargo, no fue posible la intervención del mencionado debido a que el tiempo de ejecución de la obra era mayor al tiempo que se tenía disponible para terminar el plazo de la segunda adición que era el 31 de enero de 2023.

En la siguiente imagen se presenta la programación de obra actualizada:

PROGRAMACION DE OBRA

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	MES 1 MAYO 26 A JUNIO 25	MES 2 JUNIO 26 A JULIO 25	MES 3 JULIO 26 A AGOS 25	MES 4 AGOS.26 A SEPT.25	MES 5 SEPT.26 A OCT 25	MES 6 OCT.26 A NOV. 25	MES 7 NOV.25 A DIC.15
PRELIMINARES (Visitas, proyeccion, gastos administrativos, realizacion de PMT, socializacion con la comunidad, señalizacion)	$ 15.654.000							
TODOS LOS CORREGIMIENTOS TOPOGRAFIA	$ 75.000.000							
SAN CRISTOBAL 14 Y 15 LA LOMA SAN JAVIER (Construccion de senderos, escalas y pasamanos)	$ 415.000.000							
SAN CRISTOBAL PAJARITO (Construccion de puente)	$ 420.000.000							
SANTA ELENA BARRO BLANCO (Fresado, pavimento, cunetas y obras complemtentarias)	$ 810.000.000							
SANTA ELENA PANTANILLO (Demolicion, pavimento y obras complementarias)	$ 395.000.000							
SAN CRISTOBAL Naranjal (Lleno con material de fresado)	$ 280.000.000							
SAN CRISTOBAL Boqueron (Excavacion, concreto, platinas, demolicion pavimento, Instalacion Fresado, cunetas, pavimento)	$ 385.000.000							
SAN ANTONIO 26 LA FLORIDA (Demolicion, parcheo, pavimento y cunetas)	$ 491.000.000							
SAN ANTONIO 25 LA VERDE (Demolicion, pavimento y cunetas)	$ 485.000.000							
SAN ANTONIO CALLEJON (Lleno fresado, pavimento)	$ 185.000.000							
ALTAVISTA 4 VEREDA MANZANILLO (Demolicion, pavimento, anden, pasamanos)	$ 170.000.000							
ALTAVISTA 5 VEREDA EL REPOSO (Demolicion, pavimento, cunetas, transversales anden y cordon)	$ 530.000.000							
ALTAVISTA 6 BELENCITO (Demolicion, pavimento, cunetas y cordon)	$ 113.000.000							
ALTAVISTA 7 BELENCITO (Demolicion, pavimento, cunetas y cordon)	$ 100.000.000							
ALTAVISTA 2 MIRADOR PARTE BAJA (Demolicion, pavimento)	$ 167.000.000							
PALMITAS SOLUCION HIDRAULICA LA FRISOLA	$ 88.827.000							
SAN CRISTOBAL Vereda LA Palma	$ 1.500.000.000							
SAN CRISTOBAL 23 YOLOMBO (Cunetas)	$ 70.000.000							
MENSUAL	$ 6.695.481.000	$ 50.023.200	$ 1.870.130.800	$ 1.489.200.000	$ 1.242.235.000	$ 750.000.000	$ 693.892.000	$ 600.000.000
ACUMULADO		$ 50.023.200	$ 1.920.154.000	$ 3.409.354.000	$ 4.651.589.000	$ 5.401.589.000	$ 6.095.481.000	$ 6.695.481.000

En el ANEXO N°1 -PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA se puede apreciar con más detalle la programación y avance del proyecto.

2.2. CONTROL Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO Y VIGENCIA DE LICENCIAS, PERMISOS Y USO DE SERVICIOS PÚBLICOS:

En el siguiente cuadro se realiza el control a la vigencia de las licencias y permisos otorgados (EPM, AMVA, Movilidad; Seguridad, Contraloría; Salud; ICANH…Etc.); Además se realizar el seguimiento al cumplimiento de lo establecido en dichas licencias, permisos y uso de servicios públicos.


CONTROL DE LICENCIAS, PERMISOS, SERVICIOS PÚBLICOS			
DESCRIPCIÓN DE LICENCIA, PERMISO Y/O SERVICIO PÚBLICO	**RADICADO**	**FECHA RADICADO**	**DEPENDENCIA**
Plan de manejo de tránsito San Cristóbal	202210219829	29/06/2022	APROBADO
Plan de manejo de tránsito Santa Elena	202210226267	05/07/2022	APROBADO
Plan de manejo de tránsito Santa Elena	202230290952	11/07/2022	APROBADO
Plan de manejo de tránsito San Antonio de prado	202210239572	14/07/2022	RECHAZADO
Plan de manejo de tránsito San Antonio de prado	202210250141	22/07/2022	APROBADO
Plan de manejo de tránsito San AltaVista	202210254340	26/07/2022	APROBADO
Plan de manejo de tránsito AltaVista-Tramos de los Miradores.	202230324677	30/07/2022	APROBADO
Plan de manejo de tránsito San Antonio de prado- La verde y La Florida	202230329161	03/08/2022	APROBADO
Plan de manejo de tránsito prórroga Santa Elena	202210271942	09/08/2022	APROBADO
Plan de manejo de tránsito prórroga San Antonio de Prado	202210271541	09/08/2022	APROBADO
Plan de manejo de tránsito prórroga Santa Elena	202230341307	11/08/2022	APROBADO
Plan de manejo de tránsito prórroga San Antonio de Prado	202230341302	11/08/2022	APROBADO
Plan de manejo de tránsito Santa Elena- Vereda Pantanillo- el Cerro	202210294172	29/08/2022	APROBADO
Plan de manejo de tránsito prórroga San Antonio de Prado _Calle 45B Sur	202230377553	06/09/2022	APROBADO

CONTROL DE LICENCIAS, PERMISOS, SERVICIOS PÚBLICOS			
DESCRIPCIÓN DE LICENCIA, PERMISO Y/O SERVICIO PÚBLICO	**RADICADO**	**FECHA RADICADO**	**DEPENDENCIA**
con calle 48 Sur Vereda La Florida			
Plan de manejo de tránsito prórroga Santa Elena Vía Pantanillo- el cerro entre las calles 6A y 6	202230377543	06/09/2022	APROBADO
Plan de manejo de tránsito prórroga Santa Elena- vía pantanillo-el cerro	202230397747	19/09/2022	APROBADO
Plan de manejo de tránsito prórroga San Cristóbal- La Loma y Pajarito	202230409137	26/09/2022	APROBADO
Plan de manejo de tránsito prórroga Santa Elena- vía pantanillo-el cerro	202210330671	29/09/2022	APROBADO
Plan de manejo de tránsito prórroga Santa Elena- vía pantanillo-el cerro	202230424808	04/10/2022	NEGADO
Plan de manejo de tránsito prórroga San Cristóbal de la Carrera 118 con calle 64FF y la Calle 55 entre carreras 131 y 131A	202230474240	02/11/2022	APROBADO

2.3. SEGUIMIENTO AL ESTADO DEL TIEMPO:

Durante el mes de junio de 2022 en promedio se presentó mayor intensidad de precipitaciones con respecto a los otros meses y el mes de diciembre fue el mes con menor intensidad de precipitaciones. Sin embargo, durante todo el tiempo de ejecución de las obras se lograron adelantar actividades en los diferentes puntos intervenidos en el corregimiento de San Cristóbal, San Antonio de Prado, Altavista y Santa Elena.

En la siguiente gráfica se presenta la precipitación promedio de cada mes en los que se ejecutaron obra, (valores diarios tomados del reporte de la página del IDEAM). Adicionalmente se presenta tabla con el estado del tiempo en la mañana, medio día y tarde para cada día de cada mes con su respectivo promedio.

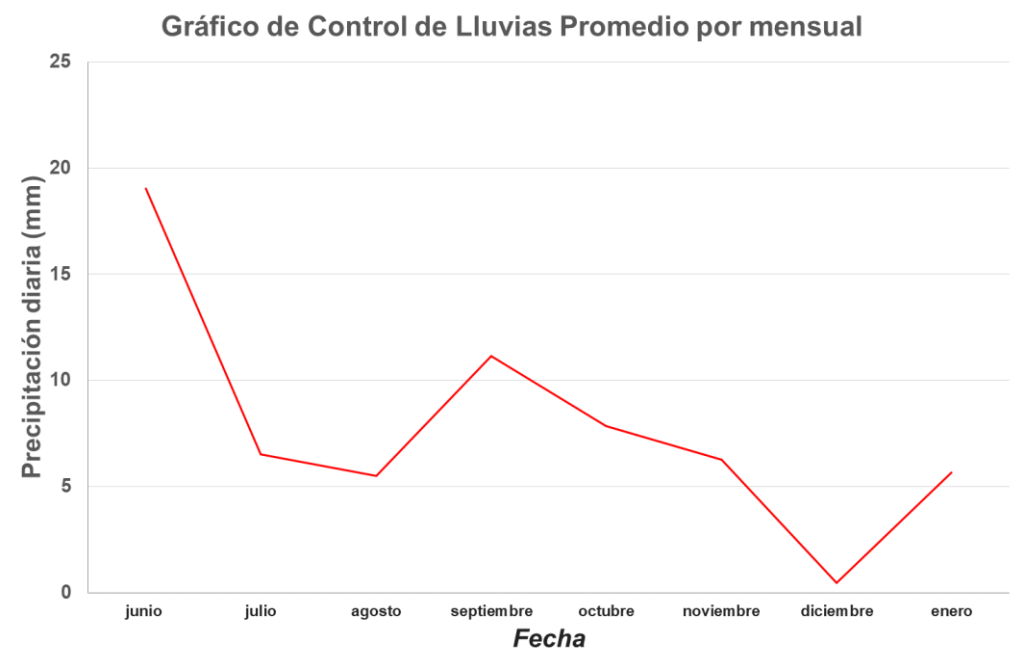

Se relaciona en el ANEXO N°6-CONTROL DE LLUVIAS el cuadro del estado del tiempo de los frentes de obra intervenidos correspondiente al periodo de junio de 2022 a enero de 2023.

2.4. CONTROL DEL MATERIAL EN OBRA:

En el periodo de interés del presente informe el Contratista reporta el uso de un total de 341,4 m³ de materiales pétreos compuestos por arena de concreto y triturado ¾ provistos por la empresa Sociedad Agregados el Tonusco LTDA autorizada para su funcionamiento por la Resolución 130 HX4121 del 3 de abril del 2009.

Durante el mes de diciembre no se realizaron actividades de pavimentación en ninguno de los frentes activos del proyecto, así mismo, las actividades de vaciado fueron realizadas por medio de concretadora en el área de intervención por lo cual, el proveedor del cemento fue la empresa Cementos Argos S.A.S.

A continuación, se presentan las respectivas cantidades recibidas de materiales pétreos a lo largo del mes de diciembre:

ITEM	TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD (m³)	PROVEEDOR

1	Arena de Concreto	208,5	El Tonusco S.A.S.
2	Triturado 3/4	132,9	El Tonusco S.A.S.

Para la verificación de este material se relaciona en el ANEXO N°11-CONTROL DE CALIDAD cuadro del control de material en obra correspondiente al periodo del 01 al 31 de diciembre de 2022.

2.5. CONTROL DE ENSAYOS DE LABORATORIO:

Durante la ejecución del proyecto el Contratista suministra resultados de ensayos de los concretos de estructuras construidas, como se detalla en el siguiente cuadro:

CILINDRO No.	UBICACIÓN	FECHA VACIADO	FECHA ENSAYO	EDAD	RESISTENCIA (kg/cm²)	
					Requerida	Medida
1	Escalera, Sendero	12/09/2022	10/10/2022	28	210	233
2	Escalera, Sendero	12/09/2022	10/10/2022	28	210	259
3	Escalera, Sendero	16/09/2022	14/10/2022	28	210	252
4	Escalera, Sendero	16/09/2022	14/10/2022	28	210	266
5	Cuneta, Yolombo	21/09/2022	12/10/2022	21	280	281
6	Cuneta, Yolombo	21/09/2022	12/10/2022	21	280	275
7	Cuneta, Yolombo	21/09/2022	19/10/2022	28	280	-
8	Cuneta, Yolombo	21/09/2022	19/10/2022	28	280	-
9	Cuneta, Yolombo	22/09/2022	13/10/2022	21	280	293
10	Cuneta, Yolombo	22/09/2022	13/10/2022	21	280	310
11	Cuneta, Yolombo	22/09/2022	20/10/2022	28	280	-
12	Cuneta, Yolombo	22/09/2022	20/10/2022	28	280	-

CILINDRO No.	UBICACIÓN	FECHA VACIADO	FECHA ENSAYO	EDAD	RESISTENCIA (kg/cm²)	
					Requerida	Medida
13	Escalera, Sendero	30/09/2022	21/10/2022	21	210	-
14	Escalera, Sendero	30/09/2022	21/10/2022	21	210	-
15	Escalera, Sendero	30/09/2022	28/10/2022	28	210	-
16	Escalera, Sendero	30/09/2022	28/10/2022	28	210	-
17	Cunetas, Yolombo	8/10/2022	22/10/2022	14	210	255
18	Cunetas, Yolombo	8/10/2022	5/11/2022	28	280	299
19	Escaleras, Sendero	8/10/2022	5/11/2022	28	280	248
20	Escaleras, Sendero	8/10/2022	5/11/2022	28	210	249
21	Escaleras, Sendero	8/10/2022	5/11/2022	28	210	255
22	Escaleras, Sendero	8/10/2022	5/11/2022	28	210	254
23	Escaleras, Sendero	10/10/2022	24/10/2022	14	210	194
24	Escaleras, Sendero	10/10/2022	24/10/2022	14	210	190
25	Escaleras, Sendero	10/10/2022	8/11/2022	29	210	225
26	Escaleras, Sendero	10/10/2022	8/11/2022	29	210	226
27	Cunetas, Yolombo	12/10/2022	9/11/2022	28	280	283
28	Cunetas, Yolombo	12/10/2022	9/11/2022	28	280	286
29	Pilas Pajarito	21/11/2022	28/11/2022	7	210	210
30	Pilas Pajarito	21/11/2022	28/11/2022	7	210	232
31	Pilas Pajarito	21/11/2022	19/12/2022	28	210	-
32	Pilas Pajarito	21/11/2022	19/12/2022	28	210	-
33	Escaleras,	31/10/2022	28/11/2022	28	210	231

CILINDRO No.	UBICACIÓN	FECHA VACIADO	FECHA ENSAYO	EDAD	RESISTENCIA (kg/cm²)	
					Requerida	Medida
	Sendero					
34	Escaleras, Sendero	31/10/2022	28/11/2022	28	210	248
35	Escaleras, Sendero	5/11/2022	3/12/2022	28	210	227
36	Escaleras, Sendero	5/11/2022	3/12/2022	28	210	223

Los anteriores son resultados de ensayos hasta el 25 de noviembre de 2022 de los cilindros de concretos de los frentes de obras El Yolombo – cunetas, San Javier La Loma – escaleras y Pajarito- Puente, algunos resultados de las muestras quedaron pendiente por entregar. Para la verificación de estos ensayos se relaciona en el ANEXO N°11-CONTROL DE CALIDAD.

2.6. CONTROL DE EQUIPOS EN OBRA:

En el mes de diciembre el Contratista presentó falencias en la entrega oportuna de la documentación necesaria para su aprobación de ingreso a los frentes de obra. Sin embargo, en cumplimiento de sus obligaciones la Interventoría continúo con la respectiva solicitud, revisión y validación de la documentación correspondiente a la maquinaria y equipos para ingreso a obra.

Durante el periodo de interés del presente informe se continuó usando el mini cargador y el compresor usado en las actividades de demolición de pavimento en el frente de obra Manzanillo – Altavista. En el frente de obra de la Palma en el corregimiento de San Cristóbal el Contratista reportó el ingreso de una retroexcavadora y una excavadora.

A continuación, se relaciona la maquinaria y equipos usados por el Contratista en las actividades de demolición, cargue y descargue de material en los frentes de obra activos del proyecto durante el mes de diciembre:

Maquinaria GD&I				
Tipo	**Marca**	**N° Registro**	**Modelo**	**N° Identificación**
Mini cargador	BOB CAT	MC038746	2010	BOBCAT S185
Compresor	SAK 53	C37932	2015	N/A
Excavadora	HITACHI	MC034103	2005	Equipo 102
Retroexcavadora	JCB	MC034872	2012	816772

Con respecto al uso y control de volquetas y vehículos en el mes de diciembre el Contratista continuó con el uso de las volquetas aprobadas por Interventoría para las actividades de cargue y transporte de materiales pétreos y RCD. Actualmente se encuentran autorizadas un total 13 volquetas afiliadas al Contratista para su funcionamiento, sin embargo, durante el mes de diciembre solo realizó uso de 2 de estas volquetas en las actividades de cargue, descargue y transporte del material de obra, las cuales cuentan con la documentación vigente cumpliendo a cabalidad con lo establecido en la norma aplicable. A continuación, se relacionan las volquetas:

Parque Automotor GD&I					
Ítem	**PLACA**	**Tipo**	**Modelo**	**SOAT**	**Tecno**
1	TAU 932	Volqueta	2012	17/03/2023	15/03/2023
2	KED 029	Volqueta	1981	09/06/2023	05/07/2023

El Contratista anexa en su informe la respectiva documentación correspondiente a la maquinaría y vehículos usados en obra, que soporta lo registrado anteriormente a lo largo de la ejecución del proyecto durante el mes de diciembre. Ver *Anexo N°3(1) Informe Contratista.*

2.7. CONTROL DE ENTREGA Y CAMBIOS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

DISEÑO Y ESTUDIO	UBICACIÓN	SUMINISTRO DE	FECHA ENTREGA
1. Planos estructurales Puente vehicular Pajarito.	San Cristóbal.	Secretaría de Infraestructura	20/05/2022
1. Detalles de conformación de muro en pavimento reciclado reforzado con geotextil. 2. Protección de red de acueducto.	Vía naranjal (Perdida de banca). Vereda Boquerón. (Corregimiento de San Cristóbal)	Secretaría de Infraestructura	06/06/2022
1. Diseños definitivos del puente vehicular de Pajarito.	San Cristóbal-Pajarito.	Secretaría de Infraestructura	22/07/2022
1. Diseños del canal escalonado para construir en el punto 5. 2. Geometría de las cunetas para la vía y para los puntos 1 y 2. 3. Box coulvert para el punto	Vereda La Palma- San Cristóbal.	Secretaría de Infraestructura	25/07/2022

DISEÑO Y ESTUDIO	UBICACIÓN	SUMINISTRO DE	FECHA ENTREGA
3.			
1. Diseños finales del puente de Pajarito con los ajustes del diseñador externo.	San Cristóbal-Pajarito.	Secretaría de Infraestructura	26/09/2022
1. Diseño Canal Los Maya	Vereda La Palma- San Cristóbal.	Secretaría de Infraestructura	28/09/2022
1. Diseño horizontal de la vía de Los Maya	Vereda La Palma- San Cristóbal.	Secretaría de Infraestructura	04/10/2022
2. Planos finales del puente de Pajarito en PDF.	San Cristóbal-Pajarito.	Secretaría de Infraestructura	06/10/2022
1. Diseño estructural del canal y caja de inspección del Sector Los Maya	Vereda La Palma- San Cristóbal.	Secretaría de Infraestructura	12/10/2022
2. Detalle cuneta vía nueva los mayas	Vereda La Palma- San Cristóbal.	Secretaría de Infraestructura	21/10/2022
1. Diseño red aguas Lluvias sector La Palma	Vereda La Palma- San Cristóbal.	Secretaría de Infraestructura	31/10/2022
1. Estructura hidráulica manejo de aguas de escorrentía en estabilización de talud sector Los Mayas	Vereda La Palma- San Cristóbal.	Secretaría de Infraestructura	24/11/2022
1. Diseños estructuras hidráulicas y obras de contención sector Los Mayas Vereda La Palma.	Vereda La Palma- San Cristóbal.	Secretaría de Infraestructura	01/12/2022
1. Diseño paso vial Vereda La Frisola	Vereda la Frisola del Corregimiento de San Sebastián de Palmitas	Secretaría de Infraestructura	10/01/2023

3. INFORME DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, DE LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA:

3.1. INFORME SOCIAL:

3.1.1. ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA TENDIENTES AL MONITOREO Y SEGUIMIENTO SOCIAL, DE LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA:

Se brinda constantemente acompañamiento y apoyo a las profesionales sociales del contratista, en la ejecución de las actividades que se enmarcan en la gestión social, según la guía socio. - ambiental.
Se revisan las diferentes piezas de divulgación y comunicación, generadas por el contratista, con el fin de mantener informada a la comunidad.
Se verifican la instalación de las piezas de divulgación y comunicación en los frentes activos.
Se revisa y se realiza el informe semanal de las actividades que hacen parte de la gestión social
Se revisa y se organiza el cronograma de las actividades a ejecutar desde el componente social.
Se acompaña al contratista al cierre de actas de vecindad
De igual forma se revisa y se elabora el informe mensual que se envía a la supervisión social SIF.
Se realizó recorrido con el profesional Social de la Secretaría de Infraestructura física, con el fin de conocer los avances de obra.

3.1.2. RELACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA DE OBRA DEL COMPONENTE SOCIAL:

Recorrido en los diferentes frentes de trabajo.
Recorrido actas de vecindad
Recorrido de actas de entorno
Reuniones de inicio, avance y final
Inducción al personal.
Capacitación al personal
Atención de PQRS
Información a la comunidad permanente
Instalación de piezas de comunicacionales.
Socializaciones puerta a puerta avance de obra.
Contacto con los líderes de los diferentes frentes de trabajo.
Elaboración de cierre de actas de entorno
Elaboración de cronograma e informe semanal y mensual de las actividades ejecutadas durante el mes.
Actualización de piezas comunicacionales.
Actualización de cartelera informativa.
Revisión buzón de sugerencias.

- **Programa de información y comunicación a la comunidad**:

El programa de comunicación e información estableció un contacto directo con las comunidades de las diferentes zonas de influencia, organizaciones de base y fuerzas vivas, implementando estrategias de divulgación e información, en las cuales se presente una comunicación efectiva y clara.
Durante la ejecución del proyecto PLAN VIAL RURAL, se emplearon las siguientes piezas comunicaciones:

PIEZA	CANTIDAD	FRENTE DE TRABAJO
Pasacalles	10	2 fijos en el frente de trabajo Pajarito – San Cristóbal. 8 rotativos (empleados durante jornadas de pavimentación en los frentes de trabajo para los cuales fueron contratadas este tipo de obras).
Valla Tijera	6	3 fijas correspondientes a los frentes de trabajo Pajarito, Senderos y La Palma – San Cristóbal. 3 rotativas (empleados durante jornadas de pavimentación en los frentes de trabajo para los cuales fueron contratadas este tipo de obras).
Cartelera informativa	5	2 fijas en los frentes de trabajo La Palma y Senderos La Loma. 3 rotativas (empleados durante jornadas de pavimentación en los frentes de trabajo para los cuales fueron contratadas este tipo de obras).
Buzones de sugerencias	6	3 fijos correspondientes a los frentes de trabajo Pajarito, Senderos y La Palma – San Cristóbal. 3 rotativos (empleados durante jornadas de pavimentación en los frentes de trabajo para los cuales fueron contratadas este tipo de obras).
Circulares informativas y volantes	5.900 piezas aprox.	Empleados en todos los frentes de trabajo del contrato para informar cierres viales, visitas domiciliarias, novedades o avances en obras; y convocar a reuniones comunitarias de avance, inicio o finalización; actividades

		de sostenibilidad y capacitaciones comunitarias.

 Pasacalles La Verde, San Antonio de Prado.	 Pasacalles Pajarito, San Cristóbal.
 Pasacalles	 Pasacalles

Barro Blanco, Santa Elena	Barro Blanco, Santa Elena.
 Buzón de sugerencias Pajarito, San Cristóbal.	 Buzón de sugerencias. Senderos, San Cristóbal.
 Buzón de sugerencias. Barro Blanco, Santa Elena.	 Valle tijera. La Florida, San Antonio de Prado.



Valla tijera.
La Verde, San Antonio de Prado.



Valla tijera.
Pajarito, San Cristóbal.



Valla tijera
Mirador parte baja, AltaVista.



Valla tijera.
Barro Blanco, Santa Elena.

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia



Cartelera informativa
Pajarito, San Cristóbal.



Cartelera informativa y buzón de sugerencias
La Palma, San Cristóbal.


MEDELLÍN EN OBRA

Plan vial rural, mantenimiento de vías y demás obras complementarias en los corregimientos de Medellín.

Convocatoria

La alcaldía de Medellín a través de la Secretaría de Infraestructura Física, en compañía del contratista Global Engineering and Design, invitan a la población aledaña al frente de trabajo "Puente Pajarito" del corregimiento de San Cristóbal, a participar de la primera capacitación comunitaria, en la cual se dará desarrollo al tema "Apropiación de las obras de infraestructura y cuidado del espacio público".

Esperamos contar con su participación

Fecha: Viernes 30 de septiembre de 2022


Lugar: JAC, Calle 67 No. 98D - 54, Pajarito, San Cristóbal.

Hora: 4:00 p.m.

Para más información
Correo electrónico: planrural7g7social@gmail.com
Celular: 3137577355

www.medellin.gov.co

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

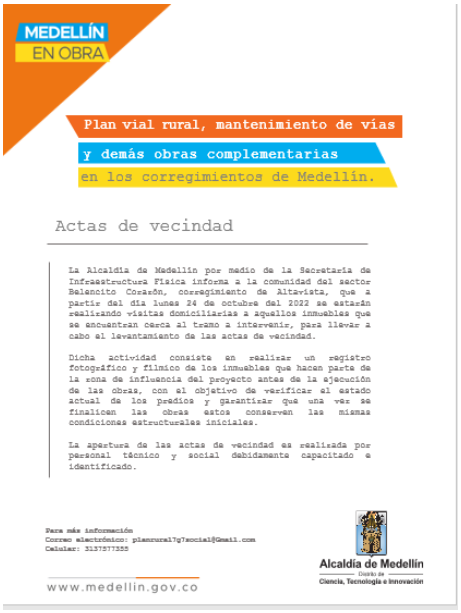
MEDELLÍN EN OBRA

Plan vial rural, mantenimiento de vías y demás obras complementarias en los corregimientos de Medellín.

Actas de vecindad

La Alcaldía de Medellín por medio de la Secretaría de Infraestructura Física informa a la comunidad del sector Belencito Corazón, corregimiento de Altavista, que a partir del día lunes 24 de octubre del 2022 se estarán realizando visitas domiciliarias a aquellos inmuebles que se encuentran cerca al tramo a intervenir, para llevar a cabo el levantamiento de las actas de vecindad.


Dicha actividad consiste en realizar un registro fotográfico y fílmico de los inmuebles que hacen parte de la zona de influencia del proyecto antes de la ejecución de las obras, con el objetivo de verificar el estado actual de los predios y garantizar que una vez se finalicen las obras estos conserven las mismas condiciones estructurales iniciales.

La apertura de las actas de vecindad es realizada por personal técnico y social debidamente capacitado e identificado.

Para más información
Correo electrónico: planrural7g7social@Gmail.com
Celular: 3137577355

www.medellin.gov.co

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
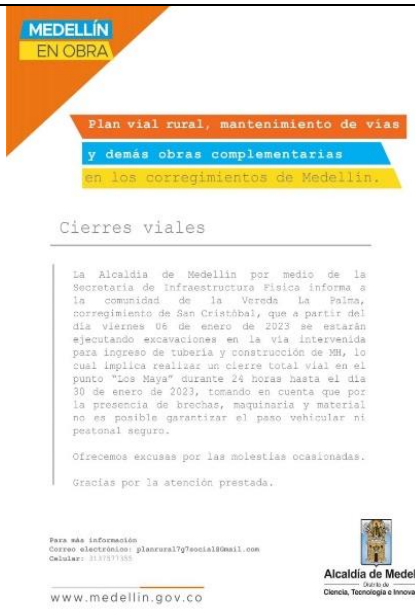
<table>
<tr>
<td>
MEDELLÍN EN OBRA

Plan vial rural, mantenimiento de vías y demás obras complementarias en los corregimientos de Medellín.

Cierres viales

La Alcaldía de Medellín por medio de la Secretaría de Infraestructura Física informa a la comunidad de la Vereda La Palma, corregimiento de San Cristóbal, que a partir del día viernes 06 de enero de 2023 se estarán ejecutando excavaciones en la vía intervenida para ingreso de tubería y construcción de MH, lo cual implica realizar un cierre total vial en el punto "Los Maya" durante 24 horas hasta el día 30 de enero de 2023, tomando en cuenta que por la presencia de brechas, maquinaria y material no es posible garantizar el paso vehicular ni peatonal seguro.

Ofrecemos excusas por las molestias ocasionadas.

Gracias por la atención prestada.

Para más información
Correo electrónico: planrural17g7social@gmail.com
Celular: 3137577355

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

www.medellin.gov.co</td>
<td>
MEDELLÍN EN OBRA

Plan vial rural, mantenimiento de vías y demás obras complementarias en los corregimientos de Medellín.

Convocatoria

La alcaldía de Medellín a través de la Secretaría de Infraestructura Física, en compañía del contratista Global Engineering and Design, invitan a la población aledaña al frente de trabajo "Puente Pajarito" del corregimiento de San Cristóbal, a participar de la primera capacitación comunitaria, en la cual se dará desarrollo al tema "Apropiación de las obras de infraestructura y cuidado del espacio público".

Esperamos contar con su participación

Fecha: Viernes 30 de septiembre de 2022

Lugar: JAC, Calle 67 No. 98D - 54, Pajarito, San Cristóbal.

Hora: 4:00 p.m.

Para más información
Correo electrónico: planrural17g7social@gmail.com
Celular: 3137577355

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

www.medellin.gov.co</td>
</tr>
<tr>
<td>

Entrega circulares
Pajarito, San Cristóbal.</td>
<td>

Entrega circulares
Pajarito, San Cristóbal</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

 Entrega circulares La Florida, San Antonio de Prado.	

.

- **SUBPROGRAMA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS**

Durante la ejecución del proyecto PLAN VIAL RURAL, fueron recibidas 19 PQRS comunitarias, las cuales, a la fecha de entrega de este informe, se encuentran cerradas en su totalidad.

A continuación, se presenta cuadro resumen.

No. PQRS	NOMBRE CIUDADANO	ASUNTO	ESTADO
1	LUZ DARY RAMOS	Evaluar la posibilidad de realizar obras de mitigación en ingreso a predio "La Colina" Vereda Barro Blanco, dado que el aumento del nivel de la vía afectó el ángulo de apertura de la puerta del parqueadero.	CERRADO EN VISITA TÉCNICA CON ENTREGA DE INFORMACIÓN.
2	LUIS FERNANDO CAPOTE	Solicitud de ubicar pare y siga en ingreso a Vereda Barro Blanco, si las obras en dicho sector se extendían hasta después de la feria de las flores.	CERRADO TRAS CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS.

3	ALBA DEL ROCÍO SEVILLA	Solicitud construcción y señalización de reductores de velocidad, sector Colegio Juan Andrés Patiño. Se da respuesta afirmativa.	CERRADO TRAS CONSTRUCCIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE RESALTOS.
4	JUAN RAMÓN MORA	Solicitud de realizar obras de mitigación en deslizamiento de tierra y ruptura de tubería en predio ubicado en Senderos La Loma, consecuencia de las obras adelantadas.	CERRADO TRAS CONSTRUCCIÓN DE MURO Y REEMPLAZO DE TUBERÍA.
5	HÉCTOR AMADO CANO	Solicitud de atender daños ocasionados en predio colindante con las obras adelantadas en Boquerón, dado que con las mismas se ha afectado el cerramiento del predio.	CERRADO TRAS CONSTRUCCIÓN DE MURO CON DESAGÜES.
6	SANTIAGO CARBAJAL	Solicitud de realizar reparaciones en riel metálico y andén que fueron afectados por volqueta que realizaba retiro de material de obra.	CERRADO TRAS REPARACIÓN DE ANDÉN Y REINSTALACIÓN DE RIEL METÁLICO.
7	PRESIDENTE JAC LA FLORIDA	Solicitad de realizar inspección técnica para verificar piscina de agua que se reflejó tras la pavimentación del tramo.	CERRADO TRAS CORRECCIÓN DE ESPEJO DE AGUA.
8	PQRS COMUNIDAD LA FLORIDA.	Solicitud de realizar obras complementarias para mitigar problemática de inundación de predios con aguas lluvia generada por aumento de nivel de la vía.	CERRADO TRAS INSTALACIÓN DE BORDILLOS EN LA VÍA.
9	CLAUDIA RESTREPO	Solicitud de atender daño en marco de baño por vibración de maquinaria.	CERRADO TRAS RESANE DE PARED.

10	ANONIMO	Solicitud de demoler bordillo construido, para facilitar acceso de moto a vivienda.	CERRADO CON TESTIGO TRAS ENTREGA DE INFORMACIÓN.
11	CARLOS PINEDA	Solicitud ampliación de tramo pavimentado en la vereda el Cerro (incluir los 120m restantes para llegar a la vía principal de Santa Elena - tramo en malas condiciones).	CERRADO CON INFORMACIÓN. OBRAS REALIZADAS POR MALLA VIAL.
12	DUVER ÁLVAREZ	Solicitud telefónica de realizar obras de mitigación en punto La Batea, para garantizar movilidad vehicular de residentes del sector.	CERRADO TRAS CUMPLIMIENTO DE ACUERDO.
13	LUISA FERNANDA ROMERO.	Solicitud telefónica de realizar apoyo con lavado de vía por presencia de material de la obra realizada en Los Maya - La Palma, el cual estaba siendo arrastrado por aguas lluvias.	CERRADO TRAS JORNADA CONJUNTA DE LIMPIEZA DE VÍA; Y CONSTRUCCIÓN DE TRINCHO PARA DESVIAR AGUAS.
14	ARTURO ÁLVAREZ.	Solicitud de donación de cuescos de concreto.	CERRADO TRAS ACUERDOS.
15	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL PAJARITO - LIBARDO CORREA	Solicitud donación de puente provisional empleado durante construcción de Puente en vereda.	CERRADO TRAS ENTREGA DE PUENTE PROVISIONAL.

16	NÉSTRO TANGARIFE	Solicitud de realizar obras complementarias para mitigar reducción en calzada de ingreso a predio que impedía paso de vehículos.	CERRADO TRAS AMPLIACIÓN DE VÍA DE ACCESO A PREDIO.
17	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL PAJARITO - LIBARDO CORREA	Solicitud telefónica de realizar dragado en quebrada la García, por presencia de material rocoso.	CERRADO CON COMUNICADO DE INTERVENTORÍA.
18	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL PAJARITO - LIBARDO CORREA	Queja por reflejo de agua tras pavimentación de calzada de puente construido.	CERRADO CON REEMPLAZO Y DESVIACIÓN DE MANGUERA AFECTADA.
19	DUVER ÁLVAREZ	Solicitud de recorrido para revisar daños en predios ocasionados por volqueta de contrato. Se acoge arreglo de cárcamo.	CERRADO CON REPARACIÓN DE CÁRCAMO.

 Muro construido en predio de Ramón Mora. Senderos, San Cristóbal.	 Muro con desagües, Héctor Cano. Boquerón, San Cristóbal.

 Jornadas de mitigación en “La Batea” La Palma, San Cristóbal.	 Reparación de andén y reinstalación de riel. Pajarito, San Cristóbal.
 Construcción bordillo para manejo de aguas. La Florida – San Antonio de Prado.	 Resane de marco vivienda La Florida – San Antonio de Prado

- **Programa participación comunitaria:**

Durante la ejecución del contrato se llevaron a cabo aproximadamente 51 reuniones, discriminadas de la siguiente manera:

MOTIVO	CANTIDAD	No. ASISTENTES	DETALLES
Caracterización social para implementación de Plan de Manejo de Tránsito.	20: San Cristóbal 6. Altavista 5. Santa Elena 5. San Antonio de Prado 4.	120 aproximadamente.	Reuniones con Corregidores, Juntas Administradoras Locales, Juntas de Acción Comunal o Líderes Comunitarios; y empresas de transporte:
Reuniones centrales de inicio, avance y finalización.	8: Altavista 1 Santa Elena 3 San Cristóbal 4	190 aproximadamente.	**Reunión de inicio:** Puente Pajarito y La Palma – San Cristóbal; Reunión con Junta Administradora Local de Altavista; Reunión con enlace de corregimiento, Junta Administradora Local y Junta de Acción Comunal de Barro Blanco – Santa Elena. **Reunión de Avance**: Puente Pajarito – San Cristóbal y Barro Blanco – Santa Elena. **Reunión Final:** Barro Blanco – Santa Elena y La Palma – San Cristóbal.
Socializaciones puerta a Puerta (inicio, avance y/o finalización de obra).	22: San Cristóbal 8. Santa Elena 4. Altavista 6. San Antonio de Prado 4.	350 aproximadamente.	Socialización en las viviendas ubicadas a lo lardo de los frentes de trabajo, de las obras a realizar, la duración, las fechas y los cierres viales a implementar; así como los avances y novedades y la finalización de las mismas.
Comités	2	28	Solo se conformó CCO en Puente Pajarito, San

Ciudadanos de Obra.		aproximadamente.	Cristóbal. (Obra trasversal al proyecto).

<table>
<tr>
<td>

Reunión de inicio.
Puente Pajarito, San Cristóbal.</td>
<td>

Reunión de inicio.
Barro Blanco – Santa Elena.</td>
</tr>
<tr>
<td>

Reunión de inicio.
La Palma – San Cristóbal.</td>
<td>

Reunión con comité Ciudadano de Obra.
Puente Pajarito – San Cristóbal.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

 Reunión de inicio Junta Administradora Local - Altavista	 Socialización puerta a puerta. Barro Blanco – Santa Elena.
 Socialización puerta a puerta. Senderos, San Cristóbal.	 Reunión acuerdos PMT Cootrasana - San Antonio de Prado.

 Socialización puerta a puerta. La Verde – San Antonio de Prado.	 Acuerdos PMT. La Florida – San Antonio de Prado.
 Socialización inicio de obras. El Yolombo – San Cristóbal.	 Acuerdos PMT. Corregiduría – Santa Elena.

 Socialización puerta a puerta. El Cerro – Santa Elena.	 Reunión de avance. Puente Pajarito – San Cristóbal.
 Socialización puerta a puerta. Puente Pajarito – San Cristóbal.	 Reunión final. Barro Blanco – Santa Elena.

	
Socialización puerta a puerta. Senderos – San Cristóbal.	Reunión final. La Palma – San Cristóbal.

- **Programa contratación de mano de obra local**.

- Durante la ejecución del contrato fueron recepcionadas por el área social 30 hojas de vida de personal del área de influencia, de los cuales fueron contratados 27. Del personal que fue vinculado al proyecto, el 70% aproximadamente correspondía a residentes de las áreas de influencia, en especial del corregimiento de San Cristóbal.
-
- El área social brindó inducción a todo el personal que ingresó al proyecto, con el fin de dar a conocer las generalidades del mismo y las actividades realizadas por el componente social.

N°	NOMBRE	DIRECCIÓN	CONTRATADA
1	James Alberto Loaiza	Km 8 vereda Pajarito	SI
2	Alejandro Andrés Vasquez	Cra 98 D con Calle 67 - Pajarito	SI
3	William Orlando Reyes	Cra 144 # 65 - 56	SI
4	Sergio Andrés Pérez	Cra 96 # 70d 50	SI
5	Gregorio José García	Cra 97 con calle 68	SI
6	Cristian Camilo Cartagena	Cra 96 # 70d 50	SI
7	Jaime Alberto Ramírez	Carrera 55F # 51A 191 - Barro Blanco	NO
8	Santiago Andrés Patiño	Santa Elena- vereda Barro blanco.	NO

8	Jermin Armando Higuita Campiño	Calle 55 # 131 B 35	SI
9	Victor Manuel Rivera Alvarez	Carrera 131 B # 55 BB - 32	SI
10	Sebastian Isaza Álvarez	Cra 131 # 55b - 11	SI
11	Juan Pablo Uribe Marin	Vereda Boquerón	SI
12	Jorge Omar Alvarez	Cra 131 b # 55 - 148	SI
13	Luis Fdo Pineda Isaza	Cra 131b # 55 - 62	SI
14	Dilan Alonso Álvarez	Cra 131 # 52 - 09	SI
15	Roman Norbey López	Cra 131 a # 233 - 115	SI
16	Nelson Dario Muriel	Robledo Pajarito	SI
17	Mario Urdante	Calle 66f # 97 - 107	NO
18	Carlos Eduardo Duque Garcìa	Km 8 Vereda Pajarito	SI
19	Santiago Alonso Ramirez	Cr. 96 70d 70	SI
20	Wilson Manuel Tordecilla Berrio	Cr. 94cd 67-43 intb103	SI
21	Luis Alfredo Cardona Usage	Carrera 94# 65c 7	SI
22	Carlos Andrés Posada Vásquez	Cr. 133d 62 67	SI
23	Daniel Felipe Herrera Álvarez	Cr. 39b 39c 41	SI
24	Braiyan Cano Vargas.	Vereda La Palma	SI
25	Juan Carlos Gómez	Vereda La Palma	SI
26	Andrey Cano Valencia	Vereda La Palma	SI
27	Jaime Alberto Piezo	Vereda La Palma	SI
28	Juan Guillermo Argaez	Calle 60c # 152c - 441 La Palma	SI
29	Duvan Esteban Sanchez	Clle 61 # 152c - 128 La Palma	SI
30	Jhosy Esteban Hernández	Clle 65a # 144 - 56 San Cristóbal	SI

 Inducción personal operativo Senderos, San Cristóbal.	 Inducción de personal operativo. Naranjal – San Cristóbal.
 Inducción a personal operativo. La Florida – San Antonio de Prado.	 Inducción a personal operativo. Barro Blanco – Santa Elena.

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

	
Inducción a personal operativo. Pajarito – San Cristóbal.	Inducción a personal operativo. La Palma – San Cristóbal.

- **Programa de Formación y Capacitación**:

Durante la ejecución del contrato, se brindaron 3 capacitaciones comunitarias y 14 capacitaciones a personal operativo de obra. A continuación, se presentan detalles de las mismas.

TIPO	CANTIDAD	TEMA	No. ASISTENTES
COMUNITARIA.	3: San Cristóbal 2. San Antonio de Prado 1.	- Apropiación de las obras y cuidado del espacio público. - Importancia de mano de obra no calificada en la ejecución de proyectos de infraestructura. - Clasificación de residuos sólidos en Colombia.	32
PERSONAL OPERATIVO.	14: San Cristóbal	- Comunicación asertiva y resolución de conflictos. - Trabajo en equipo.	124

	13 Santa Elena 1	- Cuidado del espacio público. - Liderazgo y compañerismo.	



Capacitación comunitaria.
La Florida – San Antonio de Prado.



Capacitación personal operativo.
Yolombo – San Cristóbal.



Capacitación personal operativo.
Senderos, San Cristóbal.



Capacitación a personal operativo.
El Cerro – Santa Elena.

 Capacitación personal operativo. Boquerón, San Cristóbal.	 Capacitación personal operativo. Puente Pajarito – San Cristóbal.
 Capacitación personal operativo. La Palma – San cristóbal.	 Capacitación personal operativo. Senderos – San Cristóbal.

Programa de sostenibilidad:

Dentro del proyecto Plan Vial Rural, fueron realizadas 6 actividades de sostenibilidad, descritas en el siguiente cuadro.

TEMA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIADOS / No. ASISTENTES	FRENTE DE TRABAJO

Clasificación de residuos según código de colores.	Se brindó capacitación sobre el tema de referencia y se realizó donación de punto ecológico portátil.	19	La Florida – San Antonio de Prado.
Clasificación de residuos según código de colores.	Se brindó capacitación sobre el tema de referencia y se realizó donación de punto ecológico portátil.	25	Barro Blanco – Santa Elena.
Cuidado del entorno.	Se brindó charla y se realizó donación de libros a hogar de paso.	16	Manzanillo – AltaVista.
Importancia de la señalización vertical.	Se realizó la donación e instalación de 2 señales verticales que indican la capacidad máxima de carga del puente construido.	Población de Pajarito.	Puente Pajarito – San Cristóbal.

	
Actividad de sostenibilidad. La Florida – San Antonio de Prado.	Actividad de sostenibilidad. Barro Blanco – Santa Elena.

 Actividad de sostenibilidad Manzanillo – Altavista.	 Actividad de sostenibilidad. La Palma – San Cristóbal.
 Actividad de sostenibilidad. Puente Pajarito – San Cristóbal.	 Actividad de sostenibilidad Senderos – San Cristóbal.

3.1.3. CONSOLIDADO DE GESTIÓN SOCIAL:

GESTION SOCIAL EN OBRA - APLICACIÓN GMSA															
PERIODO DEL INFORME	CARTELERA	BUZÓN	PIEZAS COMUNICACIONALES	REUNIÓN INICIO	REUNIÓN AVANCE	REUNIÓN FINAL	COMITÉ CIUDADANO DE OBRA – CCO	RECORRIDOS CON COMUNIDAD	PQRS ATENDIDAS	PQRS X ATENDER	CONTRATACIÓN DE M.O.	CONTRATACIÓN DE M.O. LOCAL	CAPACITACIONES	ACTIVIDADES DE SOSTENIBILIDAD	INFORMES

				# Reuniones	# Asistentes	# Reuniones	# Asistentes	# Reuniones	# Asistentes	# CCO	# Asistentes	# Recorridos	# Asistentes					# Recorridos	# Asistentes	# Actividades	# Asistentes	
Mes 1	0	0	50	1	62	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	32	95	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Mes 2	0	3	6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10	40	0	0	16	8	3	21	0	0	2
Mes 3	1	3	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	62	8	21	6	4	14	8	2	11	0	0	3
Mes 4	1	2	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	15	4	4	32	6	3	31	0	0	4
Mes 5	1	2	4	1	12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	18	1	0	0	6	3	27	1	2	5
Mes 6	1	2	2	8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	11	1	2	12	7	2	41	2	41	6
Mes 7	2	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	2	0	0	0	9	0		2	36	N/A	N/A	7
Mes 8	2	3	7	N/A	N/A	N/A	N/A	50		N/A	N/A	2	16	5	0	0	0	N/A	N/A	4	50	8

Instructivo para diligenciar el Consolidado de gestión social:

- **Periodo del informe:** Indicar el periodo que se está diligenciando, el consolidado es acumulativo, es decir, cada periodo se debe incluir una fila adicional para diligenciar los nuevos datos del periodo, conservando los periodos anteriores.
- **Carteleras:** Indicar el # de carteleras utilizadas en el periodo.
- **Buzón:** Indicar el # de buzones utilizados en el periodo.
- **Piezas Comunicacionales:** Indicar el # de volantes, plegables y otras piezas entregadas para la divulgación de la obra en el periodo.
- **Reunión de Inicio:** Indicar el # de reuniones realizadas y # de asistentes en el periodo.
- **Reunión de Avance:** Indicar el # de reuniones realizadas y # de asistentes en el periodo.
- **Reunión Final:** Indicar el # de reuniones realizadas y # de asistentes en el periodo.
- **Comité Ciudadano de Obra – CCO:** Indicar el # de reuniones realizadas y # de asistentes en el periodo.
- **Recorridos con Comunidad:** Indicar el # de recorridos y asistentes en el periodo.
- **PQRS Atendidas:** Indicar el # de PQRS atendidas en el periodo.
- **PQRS por Atender:** Indicar el # de PQRS que están en trámite y/o resolución en el periodo.

- **Contratación de Mano de Obra:** Indicar el # de mano de obra vinculada al contrato durante el periodo.
- **Contratación de Mano de Obra Local:** Indicar el # de mano de obra de la zona vinculada al contrato durante el periodo.
- **Capacitaciones**: Indicar el # de capacitaciones desarrolladas con la comunidad y # de asistentes durante el periodo.
- **Actividades de Sostenibilidad:** Indicar el # de actividades realizadas (eventos con comunidad) y # de asistentes en el periodo.
- **Informes:** Indicar el # del mes de obra en que se encuentra el proyecto.

3.1.4. OTRAS ACTIVIDADES PROPIAS DE GESTIÓN SOCIAL DE LA OBRA:

- Durante el mes de enero de 2023 se acompañó el cierre de las actas de vecindad y entorno de los frentes de trabajo Barro Blanco y El Cerro, Santa Elena; Manzanillo, Mirador Parte Baja y Belencito, corregimiento de AltaVista; Senderos La Loma, Puente Pajarito, La Palma, corregimiento de San Cristóbal.
- El 23 de enero de 2023 se acompañó recorrido de Supervisor de Obra, Álvaro López, con 4 representantes de la familia “Los Maya” en el frente de trabajo de La Palma.
- Durante el período de tiempo al que hace referencia este informe, se remitieron a la supervisión 4 reportes semanales de las actividades del área social adelantadas en obra, así como los cronogramas semanales y los cuadros de resumen de la gestión social realizada semanalmente.

3.1.5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES DE LA INTERVENTORÍA:

En el tiempo que se ejecutó el proyecto, se llevaron a cabo diferentes actividades permitiendo el acercamiento y la divulgación sobre el proyecto de **Plan Vial Rural en los corregimientos del Municipio de Medellín** a iniciar. Para este periodo se realizó contacto con diferentes líderes de los corregimientos de Santa Elena, San Cristóbal, y AltaVista ejecutando y definiendo frentes de trabajo en los cuales se desarrollaron los diferentes programas desde el componente social.

Después de que se realizaron los diferentes contactos con líderes y con la comunidad en general, podemos decir que se recibió el proyecto con una gran acogida, siendo receptivos con la información y las recomendaciones que se les brindó.

ANEXOS:

Anexo 1 Programa de información y comunicación
Anexo 2 Programa de participación comunitaria
Anexo 3 Programa de contratación de mano de obra local
Anexo 4 Programa de manejo de contratación de mano de obra local
Anexo 5 Programa de formación y capacitación

3.2. INFORME AMBIENTAL:

En cumplimiento de las exigencias del contrato de obra y de acuerdo con los lineamientos ambientales establecidos en los programas de manejo ambiental contenidos en el Plan de Acción Socioambiental en obra "PASAO" se realizó un seguimiento continuo, control y verificación a cada una de las actividades ejecutadas por el Contratista Global Engineering and Design S.A.S., para lograr la protección y conservación de un ambiente sano para los habitantes de las áreas de influencia directas e indirectas del proyecto, en pro de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por el Contratista, bajo las condiciones adecuadas de acuerdo a las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones, la Guía de Manejo Socio ambiental y demás disposiciones correspondientes.

El presente informe pretende dar cuenta de la verificación de la implementación de los diferentes programas de gestión ambiental contemplados en el plan de acción socio ambiental en obra – SST (PASAO) a lo largo de la ejecución del proyecto "Mantenimiento de vías y demás obras complementarias en los corregimientos del municipio de Medellín, Plan Vial Rural"

3.2.1. PROGRAMAS DEL PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL DE LA OBRA PÚBLICA:

Actividades de obra

- Reconocimiento de frentes de trabajo e identificación de características especiales de cada área a intervenir con respecto a la necesidad de implementación de actividades específicas de gestión ambiental.

- Revisión de Plan de Manejo Socio ambiental para obras de infraestructura pública PASAO entregado por el Contratista y cada una de sus actualizaciones, así como él envió de las respectivas observaciones a este.

- Acompañamiento semanal a los comités técnicos de obra, llevados a cabo en la secretaria de Infraestructura Física en compañía del grupo interdisciplinar de profesionales.

- Revisión, actualización y validación de la documentación entregada por el Contratista referente maquinaria y vehículos nuevos en obra, que ejecutaron actividades durante el periodo de interés en los frentes activos del contrato.

- Realización de recorridos en los frentes de obra con el fin de verificar las condiciones de los espacios de trabajo y el respectivo cumplimiento de los planes y programas contenidos en el Plan de Manejo Socio ambiental para obras de infraestructura pública PASAO.

- Notificación y envío de comunicaciones escritas y verbales al Contratista sobre los hallazgos realizados en los recorridos de obra, con el fin de que se subsanen las de observaciones de los diferentes programas contenidos en el PASAO.

- Revisión de información aportada por el Contratista en los respectivos informes semanales, así mismo, desarrollo de informes semanales correspondientes a la interventoría.

- Reporte interno sobre los incumplimientos recurrentes de las obligaciones contractuales por parte del Contratista inherentes al componente ambiental en obra.

- Aplicación de listas de chequeo de carácter semanal, teniendo en cuenta los hallazgos generados en los recorridos de obra.

- Revisión y conciliación de cantidades de obra en relación a la inversión ambiental aplicada por el Contratista en la ejecución de las actividades de gestión ambiental.

Plan de Manejo Ambiental en Obra			
Programa	**Gestión de la Interventoría**	**Soporte**	**Anexo o Formatos**
Programa para el manejo de los residuos sólidos (comunes, especiales y peligrosos)	Con el fin de implementar procesos ambientales sostenibles que contribuyan a la disminución de los residuos y propicien una adecuada disposición final y aprovechamiento. La Interventoría verificó la adecuada instalación de los puntos limpios en los tres frentes de obra activos en el proyecto. En el frente de obra Pajarito durante las actividades de vaciado de concreto se usaron algunos de los recipientes del punto limpio para el almacenamiento en agua de los cilindros de concreto, se realizó el respectivo llamado de atención al Contratista con respecto a esto, a lo cual este responde de forma asertiva, devolviendo el recipiente a su lugar. De acuerdo a la información aportada por el Contratista durante el mes de diciembre se dio una generación de 49,9 kg de residuos ordinarios y 32 kg de residuos aprovechables entre los frentes de trabajo de Senderos, Pajarito y La Palma. A la fecha el Contratista reporta un total de 105,7 m³ de RCD, generados principalmente en actividades de demolición y excavación en los 3 frentes activos en el corregimiento de San Cristóbal y el frente de Manzanillo ubicado en Altavista, lo cuales fueron dispuestos en la escombrera Tierra Grata la cual se encuentra debidamente autorizada para su funcionamiento por la autoridad ambiental competente.	    	• Anexo N°3(1) y 3(2) Informe Contratista. - Residuos RCD • Anexo N°3(2). Evaluación socio ambiental Interventoría

Plan de Manejo Ambiental en Obra			
Programa	**Gestión de la Interventoría**	**Soporte**	**Anexo o Formatos**
Programa para el control de emisiones atmosféricas	Con el fin de dar cumplimiento a las estrategias planteadas en este programa y ejecutar las medidas necesarias para prevenir y mitigar la alteración de la calidad del aire, la Interventoría realiza seguimiento a la protección de materiales pétreos acopiados en los frentes de obra, adicional a los escombros que se encuentran acopiados en los frentes de trabajo, por lo cual se continua con la solicitud y respectivo seguimiento al Contratista con la mejoría en el manejo de estas condiciones y la protección de este material con plástico negro de modo que se evite su dispersión por corrientes de aire o acción de las aguas lluvias. Debido a las condiciones atmosféricas de altas precipitaciones presentadas en el periodo comprendido por este informe, se ha hecho innecesario el humedecer el terreno con el fin de evitar que partículas de polvo o material seco puedan ser emitidas a la atmosfera. De igual forma, la Interventoría verificó que las volquetas que realizan el cargue y descargue de materiales en obra, cuenten con la respectiva cubierta para carpado mecánico del platón y que el mismo tenga libres 30 centímetros en su parte superior para que no se presentes riesgos en su tránsito, así mismo, se continúa realizando la respectiva verificación de la técnico mecánica, para los vehículos que ingresaron a obra.	    	• Anexo N°3(1). Informe Contratista. - Vehículos, maquinaria y equipos. • Anexo N°3(2). Evaluación socio ambiental.

Plan de Manejo Ambiental en Obra			
Programa	**Gestión de la Interventoría**	**Soporte**	**Anexo o Formatos**
Programa para el uso y almacenamiento adecuado de materiales de construcción	Con la implementación de este programa la Interventoría busca verificar que todo el material pétreo utilizado durante la obra provenga de canteras autorizadas y que el almacenamiento sea el adecuado dependiendo de las características de los materiales. En el periodo de interés del presente informe el Contratista reporta el uso de un total de 341,4 m³ de materiales pétreos compuestos por arena de concreto y triturado ¾ provistos por la empresa Sociedad Agregados el Tonusco LTDA autorizada para su funcionamiento por la Resolución 130 HX4121 del 3 de abril del 2009. Durante el mes de diciembre no se realizaron actividades de pavimentación en ninguno de los frentes activos del proyecto, así mismo, las actividades de vaciado fueron realizadas por medio de concretadora en el área de intervención por lo cual, el proveedor del cemento fue la empresa Cementos Argos S.A.S. Con respecto al almacenamiento de los materiales de playa la Interventoría realiza un activo seguimiento para la correcta señalización, delimitación, contención y orden de los diferentes acopios de material de playa dispuestos en los frentes de trabajo, así mismo, que estos materiales se encuentren debidamente cubiertos con plástico negro para su protección contra el viento y las aguas lluvias, y de esta forma la conservación de su calidad.	    	• Anexo N°3(1). Informe Contratista. • Materiales Pétreos • Anexo N°3(2). Evaluación socio ambiental.

Plan de Manejo Ambiental en Obra			
Programa	**Gestión de la Interventoría**	**Soporte**	**Anexo o Formatos**
Programa para la protección del suelo	Para actividades de mezclas de concretos manuales se inspecciono que estas fueran realizadas sobre plástico, siempre protegiendo el suelo descubierto evitando así alteraciones en las propiedades fisicoquímicas de este. De evidenciarse el no cumplimiento de esta actividad, se realizó un llamado de atención al Contratista para su inmediata corrección y limpieza del suelo. Se continúa insistiendo al Contratista que, aunque la mezcla se realice en un suelo duro, se debe proteger igualmente la superficie con la intención de evitar que esta sea dañada o modificada por la mezcla de concreto. Hasta la fecha de cierre del informe no se ha registrado ningún tipo de derrame de combustible, pintura o sustancia química.	  	• Anexo N°3(2). Evaluación socio ambiental.

Plan de Manejo Ambiental en Obra			
Programa	**Gestión de la Interventoría**	**Soporte**	**Anexo o Formatos**
Programa para el manejo de sustancias químicas peligrosas en obra	Se verificó por parte de Interventoría las correspondientes rotulaciones de los productos químicos que ingresaron durante el transcurso del mes. En el frente de obra de La Palma se solicitó al Contratista realizar el acondicionamiento de un acopio de sustancias químicas ya que cuenta con presencia permanente de maquinaria en el frente de obra, por lo cual se evidencia presencia de varios bidones de ACPM y aceite. El Contratista recibe la instrucción de forma asertiva e inicia oportunamente su construcción.	 	• Anexo N°3(1). Informe Contratista • Formato control de sustancias químicas. • Anexo N°3(2). Evaluación socio ambiental.

Plan de Manejo Ambiental en Obra			
Programa	**Gestión de la Interventoría**	**Soporte**	**Anexo o Formatos**
Programa para el manejo de maquinaria, vehículos y equipos en la obra	Con la implementación de este programa se buscó mitigar la presencia de gases y partículas en la atmósfera, del derrame de grasas y aceites por escapes y/o mantenimiento, así como, la contaminación de las aguas y suelos por derrames de aceites y combustibles. En el mes de diciembre el Contratista presentó falencias en la entrega oportuna de la documentación necesaria para su aprobación de ingreso a los frentes de obra. Sin embargo, en cumplimiento de sus obligaciones la Interventoría continúo con la respectiva solicitud, revisión y validación de la documentación correspondiente a la maquinaria y equipos para ingreso a obra. Durante el periodo de interés del presente informe se continuó usando el mini cargador y el compresor usado en las actividades de demolición de pavimento en el frente de obra Manzanillo – Altavista. En el frente de obra de la Palma en el corregimiento de San Cristóbal el Contratista reporto el ingreso de una retroexcavadora y una excavadora. De igual forma, inspeccionó que todos los vehículos que ingresaron a la obra contaran con la documentación (tecno mecánica, SOAT) vigente, para la maquinaria y equipos se evidencia la ficha técnica, registro de mantenimiento y SOAT siempre y cuando aplique.	    	• Anexo N°3(1). Informe de Contratista. • Vehículos, Maquinaria y Equipos. • Anexo N°3(2). Evaluación socio ambiental

Plan de Manejo Ambiental en Obra			
Programa	**Gestión de la Interventoría**	**Soporte**	**Anexo o Formatos**
Programa de prevención de la Contaminación de Cuerpos de Agua y Redes de Servicios Públicos	Con el fin garantizar la correcta disposición de desechos líquidos y evitar el deterioro de las fuentes hídricas, se verifico el correcto uso y limpieza de las unidades sanitarias móviles ubicadas en los frentes de obra, estos mantenimientos fueron realizados por la empresa Sanimovil y la disposición de sus aguas residuales fue realizada en la planta de tratamiento autorizada para dicha actividad por la autoridad competente. En el frente de obra de Senderos se solicitó la Contratista realizar la limpieza de las cajas disipadoras construidas junto a los canales, ya que por el alto número de lluvias presentadas estas se empozaban. En el frente de obra Pajarito la Interventoría realizó un seguimiento activo al estado del cauce de la quebrada, donde en periodos anteriores se observó acumulación de escombros, el Contratista realizó el retiro de todo este material en su totalidad y actualmente se conserva este canal en buenas condiciones. Así mismo, se solicitó al Contratista realizar limpieza de las aguas empozadas en las excavaciones realizadas en el frente de obra, entre tanto se realizaba la construcción de cajas y acondicionamiento de MH en el área de trabajo. En el frente de obra de la Palma se realizó la instalación de una unidad sanitaria móvil adicional, con el fin de prestar servicio al personal femenino que se encuentra en el frente.	    	• Anexo N°3(1). Informe Contratista. -Sanimóvil • Anexo N°3(2). Evaluación socio ambiental. • Anexo N°3(3). Lista de verificación campamentos. Informe Interventoría • Anexo N°3(4). Manejo sumideros en el Frente de Obra. Informe Interventoría

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Plan de Manejo Ambiental en Obra			
Programa	**Gestión de la Interventoría**	**Soporte**	**Anexo o Formatos**
Programa para la gestión de la fauna y flora	Debido al inicio de actividades en el frente de La Palma – San Cristóbal y a la necesidad de movilizar la maquinaria pesada a través del follaje de la montaña, se realizaron actividades de la rocería y descapote del área de tránsito de esta. Por lo anterior, la Interventoría solicitó al Contratista la ejecución inmediata de estrategias que garantizarán la protección de los individuos arbóreos que persisten en el lugar Intervenido y la contención de aquellos que se encuentren en riesgo por la cercanía a las excavaciones. De este modo, el Contratista realizó la protección en tela sarán de los individuos arbóreos más cercanos al paso de la maquinaria y del perímetro que rodea la vía de transito de esta, con el fin de proteger el material vegetal presente. Así mismo, la Interventoría en cumplimiento de sus obligaciones continuó realizando el respectivo seguimiento al estado de los individuos arbóreos identificados en la zona de intervención. Durante el mes no diciembre no se evidencio en ningún frente de trabajo la interacción con fauna silvestre.	    	• Anexo N°3(1). Informe Contratista. • Anexo N°3(2). Evaluación socio ambiental.

Plan de Manejo Ambiental en Obra			
Programa	**Gestión de la Interventoría**	**Soporte**	**Anexo o Formatos**
Programa para el ahorro y uso eficiente de agua y energía	Con el fin de promover el uso racional de energía, agua y prevenir la contaminación del recurso hídrico, la Interventoría continua con el seguimiento al suministro de agua y energía en los frentes de trabajo, que en su mayoría fueron provistos por casas aledañas de habitantes del sector, esto, a través de la verificación de las diferentes cuentas de servicio generadas en los frentes de trabajo que cuentan con bodega en inmuebles de las diferentes zonas. El Contratista reporta para el periodo de interés un consumo de 282 kwh de energía eléctrica entre los tres frentes activos del corregimiento de San Cristóbal y 70 m³ de agua entre los frentes de Senderos y Pajarito, el uso de este recurso incremento debido a las actividades de mezcla de concreto en los vaciados de cunetas y el puente.	  	• Anexo N°3(1). Informe de Contratista. • Consumo de agua y energía. • Anexo N°3(2). Evaluación socio ambiental. Informe interventoría.

Plan de Manejo Ambiental en Obra			
Programa	**Gestión de la Interventoría**	**Soporte**	**Anexo o Formatos**
Programa para el manejo de campamentos e instalaciones temporales	Con el fin de mantener las instalaciones de los campamentos y áreas temporales en buen estado, realizar una señalización adecuada y generar los menores impactos posibles sobre el medio ambiente. La Interventoría verificó la instalación de campamento en el frente de obra de la Palma – San Cristóbal, se verificó que este estuviera provisto con vestier, zona de descanso, almacén y unidades sanitarias móviles, así mismo, cuenta con el respecto acopio de residuos sólidos. En todos los frentes de obra activos se verificó que los campamentos contaran con los elementos correspondientes de emergencias. En su mayoría estas instalaciones se encontraban en buen estado y condiciones de orden y aseo. En el frente de obra de Pajarito en san Cristóbal, se verificó el buen estado del cerramiento de obra y del puente provisional para el paso peatonal, de mismo modo se realizó seguimiento continuo al estado del cerramiento de los materiales pétreos y la zona de almacenamiento de materiales de construcción. Con la finalización de las actividades en los frentes de obra de Manzanillo, Yolombo y Boquerón se solicitó al Contratista realizar la limpieza general del área intervenida, la recolección de todos los residuos generados y el retorno del tránsito vehicular a su normalidad.	    	• Anexo N°3(1). Informe Contratista. • Sanimóvil • Capacitación • Anexo N°3(2). Evaluación Socio Ambiental

Plan de Manejo Ambiental en Obra			
Programa	**Gestión de la Interventoría**	**Soporte**	**Anexo o Formatos**
Programa para el manejo de campamentos e instalaciones temporales	En el frente de obra La Palma – san Cristóbal se realiza la verificación de la instalación de la señalización del PMT y del estado de los elementos de cerramiento de vía.	 	• Anexo N°3(3). Lista de verificación campamentos. • Anexo N°3(5). Orden y Limpieza de la Obra

3.2.2. PROGRAMA DE CAPACITACIONES Y/O INDUCCIONES REALIZADAS

Con el fin de prevenir riesgos de accidentalidad o afectación al medio ambiente por falta de conocimiento y aplicación de las normas por parte del personal de obra, el Contratista Global Engineering and Design S.A.S. tiene programadas una serie de capacitaciones dictadas por el residente ambiental que pretenden desarrollar temas claramente identificados en el plan de acción socio ambiental de obra.

A continuación, se observa el cronograma de capacitaciones de gestión ambiental programado por el Contratista a lo largo de la ejecución del proyecto:

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN OBRA

TODO EL PERSONAL	TEMA	RESPONSABLE	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	Capacitar en el programa de orden y aseo	Residente Ambiental y SST							
	Capacitar en Plan de Manejo Integral de Residuos Solidos	Residente Ambiental							
	Adecuación centros de acopio materiales construcción y RCDs.	Residente Ambiental							
CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS	Protección de árboles (cuidado de fauna y flora)	Residente Ambiental							
MANEJO DE MAQUINARÍA, VEHÍCULOS Y EQUIPO EN OBRA	Divulgación del PMT	Residente Ambiental							
MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS EN OBRA	Gestión integral de las sustancias quimicas peligrosas	Residente Ambiental							
USO EFICIENTE Y EL AHORRO DE ENERGÍA Y AGUA	Uso eficiente y ahorro de energía y agua	Residente Ambiental							
MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES	Demarcación y cerramiento de campamentos con zaran, balizas, cintas, señalización, senderos peatonales y otros elementos.	Residente Ambiental							

A continuación, se enuncian las capacitaciones sobre gestión ambiental dictadas por el Contratista a lo largo de la ejecución de las actividades de obra en el proyecto:

Capacitaciones de Gestión Ambiental Dictadas en Obra	
Mes	**Tema**
Julio-22	Presentación del componente ambiental, separación en la fuente y limpieza de baño móvil.
Agosto-22	Manejo de Residuos Sólidos
	Cuidado de Suelo
Septiembre-22	Manejo de Residuos de Construcción y Demolición (RCDs)
Octubre-22	Gestión integral de residuos de construcción y demolición (RCDs)
Noviembre-22	Gestión de las sustancias químicas
	Ahorro y uso eficiente de la energía en el frente de obra
Diciembre-22	*No se realizó capacitación*
Enero-23	Uso de kit anti derrames
	Cuidado de los individuos arbóreos
	Orden y aseo en frentes de obra

Sí bien el Contratista presento falencias en el cumplimiento del cronograma de capacitaciones de gestión ambiental propuesto en el Plan de Acción Socio ambiental de Obra, procuró realizar las capacitaciones mensualmente y exponer en ellas temas contemplados en la guía socio ambiental de para la construcción de obras de infraestructura pública. Así mismo, adjunta como anexos los correspondientes soportes del cumplimiento de este programa en su informe. *Ver Anexo N°1. Informe Contratista.*

3.2.3. PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO (FORMATO INDICADORES)

Con el propósito de brindar un control y seguimiento de las actividades de gestión ambiental en obra que se ejecutan de acuerdo a lo estipulado en el plan de acción socio-ambiental de obra PASAO aprobado para el presente contrato, la Interventoría llevo a cabo el diligenciamiento de la lista de chequeo semanal presentada en el formato "*Evaluación Socio Ambiental*" del cual reportó mensualmente una calificación de desempeño del Contratista. A continuación, se enuncias las calificaciones mensuales obtenidas a lo largo de la ejecución del proyecto:

MES	Porcentaje de Desempeño
Junio-22	91%
Julio-22	85%
Agosto-22	88%
Septiembre-22	83%
Octubre-22	91%
Noviembre-22	85%
Diciembre-22	85%
Enero-23	86%
PROMEDIO GLOBAL DE DESEMPEÑO	**87%**

De acuerdo a lo evaluado en este formato el porcentaje promedio de desempeño en la implementación de los planes y programas de gestión ambiental a lo largo de la ejecución del proyecto fue de 87% cifra superior al porcentaje mínimo de cumplimiento que se establece en el decreto 1382 de 2014, por lo cual la gestión ambiental de obra se cataloga como aceptable.

Así mismo, se realizó la respectiva validación del formato "*Indicadores Gestión Ambiental*" reportado por el Contratista de forma mensual, en el cual da cuenta del porcentaje de cumplimiento de cada uno de los programas de gestión ambiental en obra. A lo largo de la ejecución del proyecto se verificó que ninguno de los indicadores reportados por el Contratista presentará una calificación por debajo del 85%, lo cual es consecuente con el promedio obtenido en la evaluación de desempeño de este.

Por otro lado, la Interventoría diligenció de forma semanal, con calificación mensual, los formatos solicitados por la secretaria de Infraestructura para el reporte del estado de los campamentos, sumideros y demás condiciones de orden y aseo a tener en cuenta durante la

ejecución de las actividades constructivas. A continuación, se enuncian en resumen los resultados de dichos.

Formatos de seguimiento y control			
MES	**Verificación de Campamentos**	**Manejo de Sumideros**	**Orden y Limpieza en Obra**
Junio-22	100%	NA	100%
Julio-22	71%	100%	79%
Agosto-22	81%	100%	85%
Septiembre-22	84%	80%	81%
Octubre-22	86%	75%	88%
Noviembre-22	74%	100%	70%
Diciembre-22	93%	NA	85%
Enero-23	93%	N/A	83%
PROMEDIO GLOBAL DE DESEMPEÑO	**85%**	**94%**	**84%**

3.2.4. SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO AMBIENTAL (FORMATO VIGENTE)

El presupuesto de inversión socio ambiental y SST contemplado para la ejecución del proyecto “Mantenimiento de vías y demás obras complementarias en los corregimientos del municipio de Medellín, Plan Vial Rural” fue de un total de $124.775.349, los cuales fueron destinados para la ejecución de los programas de gestión ambiental en obra.

A lo largo de la ejecución del proyecto entre los días 25 de mayo de 2022 y 31 de enero de 2023, se realizó la inversión para la implementación de los planes y programas de gestión ambiental de obra civil. Por lo que se concluye que el Contratista ejecutó el 100% del total del presupuesto para la inversión social, ambiental y SST.

Con el presente informe se relaciona el formato de seguimiento al presupuesto ambiental a lo largo de la ejecución del proyecto. Ver *Anexo N°3. Seguimiento Presupuesto Ambiental*

3.2.5. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

En general a lo largo de la ejecución del proyecto los frentes de obra presentaron condiciones aceptables en la ejecución de actividades de gestión ambiental. Lo anterior se evidencia en su nivel de cumplimiento de acuerdo al formato de Evaluación Socio ambiental de Obra que en promedio fue de 87%. Es de anotar que, en el mes de septiembre la calificación estuvo por debajo del porcentaje mínimo aceptado, sin embargo, el Contratista se mantuvo atento a las recomendaciones y solicitudes realizadas por la Interventoría, por lo cual logró recuperar dicho porcentaje.

En su mayoría el Contratista presentó una actitud pasiva con respecto a la implementación de acciones de mejora lo cual fue subsanado con los requerimientos constantes de la interventoría. Así mismo, el descuido por parte de este en la aplicación de los programas de gestión ambiental, principalmente en los frentes de obra donde se estaban finalizando actividades o se ejecutaban obras complementarias era completamente evidente, así como la falta de recursos tanto de maquinaria como de personal para llevarlos a cabo.

El Contratista presentó retraso recurrente en la ejecución de algunas actividades de gestión ambiental durante el desarrollo del proyecto como lo fueron la recolección de residuos de construcción y demolición (RCDs), la señalización de los frentes de obra y el montaje de las instalaciones temporales, por lo cual fue necesario realizar por parte de Interventoría constantes llamados de atención por medio de comunicaciones oficiales.

De igual forma se identificó como dificultad la comunicación y coordinación entre los profesionales del Contratista Global Engineering and Design S.A.S. con los diferentes subcontratistas que participaron en el proyecto, ya que estos se desligaban unos de otros y se evidenció una priorización de la obra civil sobre las necesidades expresas de la gestión ambiental en los frentes de obra, actividades necesarias para la prevención, control y mitigación de los impactos ambientales generados por estas actividades.

Por parte de Interventoría no se presentan recomendaciones en el presente informe ya que se dan por finalizadas las actividades de gestión ambiental en obra, dado el término del contrato el día 31 de enero del año 2023.

Aunque a lo largo de la historia y desarrollo de los principales núcleos poblacionales, la obra civil se ha constituido como uno de los principales factores de mayor impacto y degradación del medio ambiente y sus recursos naturales, es, por tanto, que por parte de esta Interventoría quiere resaltar algunos de los beneficios con respecto al componente ambiental, que se obtienen con la ejecución de obras de infraestructura viales, como las desarrolladas en el presente contrato.

Debido a la expansión urbana que se ha venido dando en estos sectores del distrito, la creación de nuevas vías trae una serie de beneficios tanto para el medio ambiente, como para las comunidades que los habitan, entre estos están:

- Una mejor conectividad en el tránsito de sus habitantes, evitando el paso constante de estos por zonas verdes, generando la creación de trochas o caminos de herraduras que llevan a la compactación y posible degradación del suelo debido al cambio en su uso.

- Junto a la construcción de estas vías se encuentra ligada la instalación de cunetas y otros sistemas de drenaje y conducción de aguas lluvias, lo cual represente un gran beneficio en el manejo de estas, previniendo la erosión y lavado del suelo por grandes cantidades de escorrentía, sin encausar.

- La creación y reparación de las vías ayuda a una disminución notable en el material particulado emitido por el paso de los vehículos, ya que este es levantado a partir de los fragmentos del pavimento o concreto que se encuentran sobre las vías en mal estado.

Por último, se deben de resaltar los avances en seguridad vial y bienestar de las comunidades, puesto que se evidencia la reducción de los accidentes de tránsito y se mejora la accesibilidad a los diferentes sectores, generando así un aumento en la calidad de vida, fomentando el dinamismo con un comercio más activo al favorecer la entrada y salida de los productos agrícolas y de manufactura que ofrece el sector.

3.3. INFORME DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO - SST:

La Interventoría verificó que el contratista cumpliera con la normatividad y requisitos legales vigentes asociados a la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución de las obras.

Como soporte del cumplimiento de dicha verificación se diligencian los siguientes ítems.

DATOS GENERALES	
Contratista: GLOBAL ENGINEERING AND DESING	**Contrato de Obra:** 4600094137 de 2022
Interventoría: CONSORCIO VIAS CC	**Contrato de Interventoría:** 4600094153 de 2022
Periodo reportado: FINAL DE CONTRATO	FEBRERO 2023

Objeto del Proyecto: MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLENTARIAS DE LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PLAN VIAL RURAL

INTRODUCCIÓN:

La seguridad y salud en el trabajo es una disciplina encargada de proteger la salud física, mental y social de la población trabajadora en los frentes de trabajo o en todas aquellas locaciones donde se ve obligado a realizar sus funciones o atareas laborales. Es también una de sus finalidades que las condiciones del lugar de trabajo estén bien adaptadas, garantizando de manera permanente que la integridad física de los trabajadores no se vea afectada a causa de cualquier condición insegura, Se ocupa también de identificar y controlar los riesgos presentes tanto en el entorno como en la maquinaria que se maneje en el lugar de trabajo. La normatividad vigente en Riesgos laborales invita a todos las empresas y empleadores a generar condiciones óptimas de trabajo donde la finalidad sea la prevención y presencia tanto de accidentes Laborales como enfermedades de tipo profesional.

OBJETIVO GENERAL:

Controlar de manera integral los riesgos presentes en las actividades propias del desarrollo de las obras ejecutad durante la duración del contrato, enfocado siempre en la no ocurrencia de accidentes laborales, presencia de enfermedades laborales o algún tipo de contingencia ambiental o social que se puedan presentar en los frentes de trabajo situados en cada uno de los Corregimientos intervenidos.

1. IMPLEMETACIÓN DEL CAPITULO VI PLAN DE RIESGO LABORALES:

Herramienta a través de la cual se integra la actividad preventiva de la empresa en un sistema general de gestión de acuerdo al Plan de Acción socio –Ambiental en obra “PASAO”, El cual fue estructurado en consecuencia con el Decreto 1382 de 2014, Guía de Manejo Socio Ambiental, el cual durante todo el contrato fue subsanado en algunas falencias en este componente S.S.T.

Por todo lo anterior, no se evidenció una política de prevención de riesgos concreta, que apuntara constantemente a este objetivo, siempre se realizaban actividades y no en todos los casos, el control de los riesgos de la manera como se manifestaban en el momento y hora de la actividad.

1.1 IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES:

Ítem contemplado en la normatividad vigente en Riesgos laborales como lo es la Resolución 0312 de estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que a la actividad económica de obras de construcción es aplicable en sus 62 ítems, además de todas las normas desde decretos hasta leyes aplicables y de estricto cumplimiento a hoy día, Incluyendo la Resolución 4272 de 2019 de Trabajo Seguro en Alturas, la cual se viene tratando de cumplir a cabalidad en los frentes de trabajo donde ha sido necesario.

Este aspecto se subsanó en la última sugerencia de correcciones, adhiriendo normas y actualizando las ya existentes y en cumplimiento, emitidas por los ministerios de trabajo y salud.

Conocer y aplicar estas normas vigentes, siempre fue el objetivo para un buen desarrollo de las actividades y ejecución del contrato al blindar los recursos, los actores del contrato como fueron el contratista, la interventoría, los trabajadores y la misma Secretaría de Infra estructura.

1.2 PLAN DE TRABAJO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

Documento con actividades propuestas, responsables e indicadores de cumplimiento, siempre enfocadas en dar bienestar laboral a los trabajadores, estas son programadas para un periodo bien sea anual, semestral o para un periodo de desarrollo de las actividades ya sabidas de su principio a fin.
El cronograma del contratista se desarrolló de manera normal dando cobertura a la gran mayoría de sus colaboradores y ejecutando las actividades de prevención en Riesgos laborales, medicina preventiva y del trabajo, Higiene y seguridad industrial.
Se presentaron casos en que las actividades debieron ser suspendidas por el incumplimiento, como fueron los casos de no tener los EPP suficientes y apropiados, los documentos de afiliaciones al sistema de seguridad social no llegaban adecuados o a tiempo, la dotación fue un elemento que fue bastante álgido pues a veces no fue la suficiente o no era utilizada de manera correcta en los frentes de trabajo.

1.2.1 **COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:** Es el organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de la empresa a través de actividades de promoción,

información y divulgación. El contratista constituye este comité al interior de su empresa, presentó el acta de conformación de manera paritaria, o sea con partes iguales tanto del empleador como de los trabajadores; en algunas ocasiones no presentaron las actas de reunión de manera cumplida por presentarse alguna rotación del personal y este aspecto complicaba el quorum periódico, pero si se evidenció ejecución de los rolles de sus miembros.

1.2.2 COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL:

Esta herramienta sistemática creada bajo la resolución 1010 de 2006, para velar por todos aquellos trabajadores, mandos medios y empleadores, que de alguna u otra manera sufren de persecución y acoso por alguna de las partes de la relación laboral.

El contratista Conformó el comité al interior de su organización presentando el acta inicial y sus actas trimestrales, sin ningún caso constituido y que se debiera reportar a las entidades gubernamentales; las actas de reunión trimestrales fueron entregadas y evaluadas, sin encontrarse dificultad alguna.

1.2.3 INSPECCIÓN DE SEGURIDAD La inspección Rutinaria y programada de las instalaciones, frentes de trabajo, equipos, herramientas, elementos de protección personal y todo aquello que es usado por el trabajador, ayuda considerablemente a la no ocurrencia de accidentes laborales por el mal estado de los mismos y por no realizar el respectivo mantenimiento o el cambio oportuno, Inspeccionar es chequear lo que está bien y lo que no está.

El cumplimiento del contratista en este aspecto fue intermitente, pues algunas veces no se hicieron o entregaron fichas de mantenimiento en el periodo requerido, así como los pre operacionales a los equipos, se laboró en campo con equipos un poco deteriorados, además de en ocasiones no contar con los documentos actualizados como pólizas de seguros, fichas de mantenimiento de maquinaria pesada; que después eran entregados en el informe mensual.

1.2.4 PLANILLA INTEGRADA DE LIQUIDACIÓN DE APORTES documento donde se consolida la información de pago a la seguridad social integral de todos los colaboradores de la organización la cual debe estar siempre actualizada en pago, niveles de riesgo e ingresos base de cotización, o sea correcto salario; con respecto a esto se tuvieron algunas observaciones con el nivel del riesgo a ARL, lo cual fue subsanado de manera inmediata o al periodo siguiente

Se recibieron las planillas de pago de la seguridad social integral y los parafiscales, en algunos periodos se tuvieron moras de pago sin repercusiones en la atención de los trabajadores y su núcleo familiar; ya que se cubría su pago en el mes.

Se hizo la observación de esta extemporaneidad de pagos y se retro alimentó al

contratista con respecto a las repercusiones adversas que esto podría tener de volverse a presentar.

1.2.5 PLAN DE EMERGENCIAS Conjunto de acciones ordenadas a realizar por las personas que se han unido a la causa o que han sido escogidos por su empleador para constituir o formar una brigada de emergencia para ser activada cuando se requiera, así mismo con elementos que constituyen una estación de emergencias con equipos como (Camilla, botiquín, kit de derrames, extintor, rutas de evacuación, punto de encuentro). El contratista presentó la conformación de esta brigada de emergencias con algunas disfuncionalidades, aunque si tiene los equipos en sitio y señalizados,
Se recomendó al contratista tener una persona con capacitación de primeros auxilios, por si llegara a presentarse un accidente grave o que requiriera atención de más alto nivel de los ya presentados.
El documento fue anexado al PASAO, pero no fueron muy constantes en el desarrollo de las actividades intrínsecas que apuntan a la correcta atención de eventos de tipo laboral o natural
La brigada de emergencias contaba con recursos, dotación y distintivos, pero no le dedicaron tiempo necesario a su fortalecimiento interior.

1.2.6 INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES LABORALES:

Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión de trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte
Durante el contrato se registran dos accidentes laborales, uno ocurrido en el frente de La Palma, el cual fue reportado y atendido oportunamente y del cual se tienen todos los soportes documentales como Furat, incapacidades, atenciones, fórmulas y recomendaciones; en el frente de Senderos se reportó otro accidente laboral el cual no se documentó pues durante el tiempo de recoger las versiones para su investigación el trabajador confesó que la lesión presentada no correspondía con la versión inicial.

1.3 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN:

Son todos aquellos temas que hacen parte de la formación técnico-profesional del individuo y que se convierten en oportunidades de aprendizaje, estas capacitaciones son programadas en el tiempo laboral y realizadas en campo como se hizo en el periodo transcurrida en la duración del contrato y en los corregimientos donde se hizo presencia como fueron;

San Cristóbal (Pajarito, La Palma, Senderos) Santa Elena (Pantanillo, Barro Blanco), Alta Vista (Manzanillo), San Antonio De Prado (Florida alta y Baja)

1.3.1 PAUSAS ACTIVAS:

Es una de las actividades más significativas en campo de la medicina preventiva y del trabajo, reduce el stress, disminuye la rutina, se cambia la actividad laboral y ayuda a la salud mental del trabajador
El contratista realiza calistenia y gimnasia pre ocupacional después de la charla de seguridad, a media mañana y tarde se efectúa un descanso como para la hidratación y estiramiento de las partes corporales más usadas y fatigadas.
En específico el contratista no presentó un programa de pausas activas con líderes responsables, enfoque, horarios y lugares; sin embargo se realizan en todos los frentes de obra; es de anotar que lo anterior hace parte del sub programa de medicina preventiva y del trabajo contenido en el SG-SST.

1.4 PROGRAMA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Cualquier equipo o dispositivo destinado para ser utilizado o sujetado por el trabajador, para protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su seguridad y salud en el trabajo, es una manera de controlar los riesgos en la persona.
El contratista entregó los EPP básicos como son casco, gafas, guantes, pero aún no fue eficiente a la hora de entregar los elementos de protección personal específicos como la careta para humos metálicos y material particulado, además de los barbiquejos para la realización de trabajo en alturas.
Para la actividad de Trabajo seguro en alturas el contratista entrega los equipos como arnés, eslinga y adecua los puntos de anclaje para la respectiva instalación de las líneas de vida en excavaciones.

1.5 ACTIVIDADES CRITICAS

Aquella que, por su complejidad y nivel de riesgo, representan una amenaza más crítica para las personas que las ejecutan, además requieren de controles más avanzados para mitigar la consecuencia y severidad en caso de algún evento de tipo laboral.
En el frente de La Palma y Pajarito se realizaron excavaciones para instalar tubería y se realizan también excavaciones para vaciar los disipadores construcción de pilas, trabajo a diferente nivel en el lecho de la quebrada debiéndose activar el procedimiento y protocolo de trabajo en alturas según la nueva resolución 4272 de 2019, realizándose las siguientes actividades con el ánimo de disminuir el riesgo de ocurrencia de algún evento que se pueda

presentar:

-Solicitud de la seguridad social para verificar correcto porcentaje de cotización.
-Verificación de los conceptos médicos favorables para trabajo las alturas.
-Inspección diaria de equipos para trabajo en alturas.
-Inspección de elementos de protección personal específicos para la tarea.
-Realización del Análisis de Trabajo Seguro Antes de iniciar la labor.
-Elaboración diaria del permiso para trabajo en alturas.
Acompañamiento permanente del personal S.S.T del contratista.
Instalación de escaleras metálicas como medida para las salidas de emergencia.
También se realizaron durante el desarrollo del contrato trabajo de excavaciones en los terrenos de La palma, donde se hicieron los disipadores de agua y entrega en el descole del manejo de aguas.

También en el contrato se realizaron las actividades de instalación de pasa manos y platinas en el sector de Senderos y Boquerón respectivamente, la cual tuvo trabajos de corte de materiales ferrosos y trabajos de soldadura Eléctrica con electrodo revestido, para lo cual se hizo necesario la realización del permiso de trabajo en caliente y la utilización de EPP Específicos como la mascarilla para humos metálicos y material particulado.

En las actividades de soldadura eléctrica presentes en Senderos y Boquerón, las instalaciones eléctricas fueron adecuadas desde los mismos postes o cableados eléctricos de uso Público, generándose riesgos adicionales a la tarea por no ser las más normalizadas y seguras.

2. **ANALISIS DE TRABAJO SEGURO** Método para Identificar, controlar y valorar los riesgos presentes en las tareas diarias bien sean rutinarias o no rutinarias, se genera la cultura del evidenciar riesgos latentes y no realizar tareas que pongan en peligro su integridad física, se procuró que este documento fuera realizado tanto para las actividades rutinarias como no rutinarias, lo anterior con el ánimo de identificar y controlar los riesgos propios y cambiantes en la tarea, el documento siempre se diligenció para todas las actividades.

3. **INDICADORES:** Valor medible que demuestra la eficacia con la que una empresa está logrando sus objetivos empresariales.

   El contratista llevó Indicadores de ausentismo y accidentalidad, los cuales fueron reportados cada mes con sus respectivos anexos como son las incapacidades

médicas por enfermedad general, accidentes laborales.

3.3.1. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL COMPONENTE DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO – SST

INFORME MENSUAL SST			
Programa	**Gestión de la Interventoría**	**Soporte**	**Anexo o Formatos**

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia


INFORME MENSUAL SST			
Programa	**Gestión de la Interventoría**	**Soporte**	**Anexo o Formatos**
Reglamento de higiene y seguridad industrial	Se verificó la existencia del documento como anexo del PASAO, de igual manera fue divulgado a todos los niveles, asegurando su comprensión y aplicabilidad, tipos de riesgos y su exposición en la actividad laboral.	     	**Anexo 2 y 6 registro de inducción y capacitación**

INFORME MENSUAL SST			
Programa	**Gestión de la Interventoría**	**Soporte**	**Anexo o Formatos**
Medicina preventiva y del trabajo	Durante el contrato se revisaron los conceptos médicos del personal que ingreso para el frente de trabajo no evidenciando recomendaciones o restricciones laborales, Se realizaron Pausas Activas con el personal laboral con el fin de recuperar energía, mejorar el desempeño laboral y prevenir problemas osteomusculares. Se realizaron capacitaciones al personal	   	**Anexos 2, 6 y 8 de condiciones de salud y ausentismo- Inducción inicial.**



INFORME MENSUAL SST			
Programa	**Gestión de la Interventoría**	**Soporte**	**Anexo o Formatos**
Entrega de dotación y elementos de protección personal	El contratista realizó la entrega de EPP del personal previo al inicio de las actividades y la reposición de los EPP deteriorados en los diferentes frentes de trabajo de obras en Intervención	   	Anexos 4 entrega de dotación personal



INFORME MENSUAL SST			
Programa	**Gestión de la Interventoría**	**Soporte**	**Anexo o Formatos**
Plan de Inducciones y Capacitaciones	Realización de charlas de seguridad diarias donde se divulgaron los riesgos a presentarse según actividad laboral, capacitaciones programadas	  	Anexos 2 y 6 registro de capacitaciones E Inducciones
Programa de Inspecciones	Los frentes de trabajo fueron revisados de manera diaria, la maquinaria y equipos de emergencia también se realizó su preoperacional para identificar condiciones y estado óptimo	  	Anexos 3, 5, 7 y 9 de inspecciones Rutinarias y programadas- pre operacionales- permisos de trabajo


Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

INFORME MENSUAL SST			
Programa	**Gestión de la Interventoría**	**Soporte**	**Anexo o Formatos**
Orden y aseo frentes de trabajo	Diariamente se verificaron las condiciones de orden y aseo en los frentes de trabajo Al terminar las jornadas laborales se realizaron jornadas de recolección de desechos y se dispusieron en los puntos ecológicos	   	Anexos 10 almacenamiento de sustancias químicas Registro fotográfico, Condiciones de aseo general de obra

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

INFORME MENSUAL SST			
Programa	**Gestión de la Interventoría**	**Soporte**	**Anexo o Formatos**
Accidentes de trabajo – Ausentismo laboral	En el transcurso del contrato se presentaron dos accidentes laborales, uno tramitado y otro no por encontrar que el origen de la lesión no era de carácter laboral si no general, si se reportan las condiciones y actos inseguros del frente de trabajo.	 12.2 Causas Básicas Factores Personales: (304) Rutina, monotonía Factores del Trabajo: (401) Evaluación deficiente de las necesidades y los riesgos 13. Acciones Acciones a Tomar: Capacitación autocuidado — Marcar con una X: Individuo; Responsables: Área SST; Fecha de Ejecución: ; Fecha de Verificación: Cambio de guante de agarre por vaqueta o carnaza — Marcar con una X: Medio; Responsables: Área SST, Gerencia; Fecha de Ejecución: 21-dic.-2022; Fecha de Verificación: 30-dic.-2022 Identificar los riesgos antes de iniciar labores — Marcar con una X: Individuo; Responsables: Trabajadores; Fecha de Ejecución: Todos los días; Fecha de Verificación: Todos los días 14. Datos del Equipo Investigador Nombre; Cargo en la Empresa; Cargo dentro del Equipo Investigador; FIRMA  EPS SURA EPS SURAMERICANA S.A. CERTIFICADO DE INCAPACIDAD / LICENCIA No. 0 - 31304931  	Anexos 8 de indicadores y ausentismo e Incapacidades

INFORME MENSUAL SST			
Programa	**Gestión de la Interventoría**	**Soporte**	**Anexo o Formatos**
Afiliaciones sistema Seguridad Social	Se verificaron de manera física y sistemática la veracidad de los documentos de afiliación, nivel de riesgo y correcta cotización al sistema integral de seguridad social.	 	Anexos 1 planilla de seguridad social contratista y sub contratistas

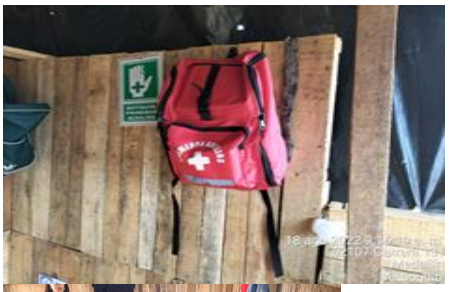INFORME MENSUAL SST			
Programa	**Gestión de la Interventoría**	**Soporte**	**Anexo o Formatos**
Protocolo de Bioseguridad COVID - 19	Mientras se cumplía el levantamiento de la emergencia sanitaria, se debía cumplir con el uso de la tapa bocas en el trasporte público y en lugares de mucha fluencia de personas, reporte oportuno de síntomas asociados al COVID 19, reporte de condiciones de salud		Anexos fotográficos de los equipos para atender contingencias, reporte de condiciones de salud

3.3.2. PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO – SST (CONTRATISTA DE OBRA)

Para hacerle seguimiento al programa de salud y seguridad en el trabajo – SST, es necesario diligenciar los siguientes formatos:

Durante la ejecución de las actividades de interventoría y del contrato iniciado en el mes de junio Con sus respectivas calificaciones, en algunos meses no se cumplió con lo indicado del 85%, en otros si se cumplió y en otros se cumplió con lo justo.
Dado lo anterior se entrega en este informe final, un promedio de las calificaciones obtenidas mes a mes, dando como resultado en No cumplimiento en general de la verificación general del componente.

VERIFICACIÓN FINAL PROMEDIADA
REQUISITOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS

N° del contrato:	**40600094137**	**Empresa Contratista:**	**GLOBAL ENGINEERING AND DESING**
Objeto de contrato:	**MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLENTARIAS DE LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PLAN VIAL RURAL**		
Nombre del responsable:	**Melisa Buriticá-Profesional SST**		
Fecha de verificación:	08-2-23	**N° Licencia en SST:**	2019060048771

Verificación previa ingreso del trabajador	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**		**DESCRIPCION**	**RESPONSABLE**	**FECHA PROGRAMADA**	**SEGUIMIENTO**
	SI= 5 - 3	**NO= 0**	**NA= 5**					
El contratista tiene afiliados al Sistema de Seguridad Social, en la clase de riesgo que corresponda a todos sus trabajadores. (Se debe verificar el pago	**5**							

PLAN DE ACCION (Cuando no cumple)

por el periodo trabajado)								
El personal cuenta con inducción en SST, para el contrato especifico (Según las normas y entrenamiento para el oficio). Y la respectiva evaluación.	**5**							
Se cuenta con examen médico de ingreso, periódico para el cargo a ocupar realizado por un profesional competente.	**3**			Algunos administrativos faltaron por exámenes médicos, conceptos errados				
Cuando deba ejecutar tareas de alto riesgo Alturas, se	**5**							

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

cuenta con la certificación de competencias del personal para ejecutar dicha actividad Nota: En el caso de alturas, la entidad/persona natural que expide el certificado debe contar con resolución aprobada y expedidas por el ministerio. En caso de actividades de alturas se debe contar con el certificado de aptitud médica para dicha actividad.								
En caso de ejecutar tareas de alto riesgo (Soldadura, Espacios Confinados, Eléctricos) se cuenta con la certificación de competencias del personal para ejecutar dicha actividad. En caso de actividades de	**5**							

espacios confinados se debe contar con el certificado de aptitud médica para dicha actividad.								
Solicitar registro de entrega de EPP. Se evidencia entrega y Uso de elementos de protección personal en las tareas a ejecutar (Ficha técnica del fabricante o proveedor).	**5**							
Cuenta con contrato laboral y fotocopia de la cédula. Nota: No se permitirá la subcontratación a través de cooperativas, empresas temporales, o personas naturales	**2**			Aun faltan algunos contratos administrativos, si hubo sub contratistas				
Verificación de ejecución del contrato								
Realiza oportunamente el reporte, la investigación de los accidentes y casi accidentes	**5**			Se presentó uno, se realizó reporte				

de trabajo conforme a la Resolución 1401 de 2007, define y monitorea los planes de acción				e investigación				
Cuenta con personal formado en SST según las especificaciones del contrato y la resolución 0312 de 2019.	**2**			tecnólogos SST cumplen				
Matriz de Peligros actualizada que identifique los peligros y riesgos relacionados con la tarea a realizar, su valoración y control implementado.		**0**		No entregaron en el PASAO				
Realiza seguimiento al cronograma o plan anual de actividades de seguridad y salud en el trabajo (debe incluir actividades de control para los riesgos prioritarios) y encontrarse acorde y	**2**			Charlas diarias y capacitaciones en campo, No SG-SST				

aplicable para las actividades desarrolladas en el contrato)								
Cuenta con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y este se encuentra publicado en lugares visibles en donde los trabajadores lo identifiquen fácilmente en la obra.	**2**			Sin documento definitivo firmado Ya hay carteleras informativas				
Se consolidan indicadores de ausentismo, accidentalidad y mortales durante la ejecución de la obra. Se realiza el análisis estadístico.	**5**							
Se cuenta con control adecuado de vehículos que ingresan a la obra (Seguridad social, soat, licencias de operación según aplique)	**3**			Algunos sin Pólizas contra todo riesgo no fueron sub sanados				
Asiste a las actividades convocadas por	**5**			Comité de obra				

la alcaldía en el tema de SST.								
Los frentes de Obra cuentan orden y aseo de manera adecuada	**5**							
El programa de inspecciones de seguridad definido según los riesgos prioritarios (Maquinas, herramientas, materiales, equipos, instalaciones locativas, equipo de protección personal), se define e implementa en la obra.	**5**			Si hay inspecciones				
El programa de mantenimiento preventivo de las herramientas y equipos que se usan en desarrollo del contrato se implementa de manera adecuada.	**5**			Pudo ser más riguroso				
Están señalizados y rotulados los recipientes que contienen sustancias o	**5**			Si, gasolina y ACPM-actividad de				

productos químicos incluyendo los envases donde se realicen transvases y se tiene establecido e identificar un sitio de almacenamiento seguro para los mismos.				pavimento				
Si requiere el uso de sustancias químicas, deberá Mantener disponibles las Fichas Técnicas u Hojas de Seguridad de las Sustancias o Productos Químicos. Y el respectivo registro de uso y manipulación.	**5**			se evidencia hojas de seguridad de La gasolina y ACPM				
Las condiciones de seguridad para el almacenamiento de líquidos inflamables (gasolina y ACPM), es suficiente y adecuado y cuanta con la matriz de compatibilidad.	**5**			Diques en La palma				

El plan de emergencia para el proyecto cumple con lo requerido (se evidencia la capacitación de la brigada, procedimientos en caso de emergencia, señalización adecuada, etc.)	**3**			No se evidenció constitución de brigada y comité de emergencias				
Se tiene el registro de la socialización al personal del plan de emergencia	**5**			registro - inducción				
Las conexiones eléctricas, cuenten con protección y están debidamente instaladas.	**2**			Conexiones inseguras en soldadura y tableros				
Cuentan con botiquín de primeros auxilios dotado de acuerdo con los riesgos y la cantidad adecuada.	**5**			Si hubo en los frentes				
En la obra el contratista tiene el control de los extintores y están ubicados estratégicamente de acuerdo con	**5**							

la obra.								
Tareas de Alto Riesgo - Tareas críticas								
Existen los procedimientos y los permisos para tareas de alto riesgo y/o críticas, identificadas, visibles y diligenciados acorde con las tareas rutinarias y no rutinarias, firmados. Se cuenta con el registro del personal según actividad a realizar.	**5**			Se realizaron ATS Diarios de las actividades				
Cuenta con la capacitación, entrenamiento y certificación de las personas que realizan tareas de alto riesgo: Para trabajos en alturas y espacios confinados capacitación y concepto de aptitud médica según Resolución 1409 de 2012.	**5**			Certificados de alturas				

Los equipos y EPP para las tareas de alto riesgo están certificados y cumplen con lo establecido en la Norma. Realizan inspecciones.	**5**			Certificados y seriales				
Cuenta con el programa de protección contra caídas y lo implementa.	**5**			En la práctica si, falta documento	Presentar documento	Residente SST	Inmediato	Interventoría
Los andamios o estructuras para trabajar en alturas estén en perfecto estado de seguridad; anclados sobre una superficie sólida y segura y que estén certificados.	**5**			Cuando los Hubo cumplieron				
Actividades post retiro de personal								
Cuentan con paz y salvo de salarios, liquidaciones y prestaciones sociales del personal.	**5**							
Puntaje Obtenido								


PUNTAJE FINAL	**136**	**PTOS**	**PORCENTAJE FINAL**	**80%**	**%**	**CONV**

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

						ENCIONES > 80% OPTIMO ENTRE 50-80% MEDIO < 50% NOCUM

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

						P L E

Nombre del Supervisor German Aguirre	**Nombre del Contratista o Responsable Melissa Buriticá- Profesional SST**
cc 9970414 **firma**	**c.c 43268642** **firma**
 	
Fecha: 08-2-23	

3.3.3. PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO – SST (INTERVENTORÍA DE OBRA)

Durante la ejecución del contrato de obra, se realizó acompañamiento continuo a las actividades de alto riesgo, siendo la más predominante el trabajo en alturas presente en las actividades del corregimiento de San Cristóbal y La Palma.
Dichas actividades fueron la construcción de pilas y trabajo a diferente nivel en el lecho de la quebrada Los García en Pajarito.
En el frente de trabajo de La Palma se realizaron excavaciones profundas para la construcción de los MH, Instalación de tubería de 36 pulgadas, construcción de escaleras disipadoras de corriente y caudal de aguas lluvias y escorrentía

En esta actividad se tuvo en cuenta la nueva resolución 4272 de 2019, de trabajo seguro en alturas, la cual entró en vigencia y aplicación el 27 de junio del presente año.

La revisión por parte del contratista y posterior la de la interventoría fueron las siguientes, acogiéndonos a la nueva normatividad:

- Revisión de la seguridad social del subcontratista para verificar vigencia, nivel de riesgo y correcta cotización.
- Revisión de los conceptos médicos ocupacionales para esta labor y su aptitud médica, en este periodo se encontró que un sub contratista ingreso a pilas una persona sin el concepto de alturas.
- Revisión del contrato laboral entre las partes.
- Revisión de los certificados de competencia laboral en Trabajo seguro en Alturas.
- Revisión de los equipos y accesorios a utilizar en la tarea.
- Supervisión permanente por parta del personal SST del contratista e interventoría.
- Charlas diarias enfocadas al riesgo de la actividad en alturas.
- Inspecciones rutinarias al centro de trabajo.
- Levantamiento de los ATS de manera grupal y en sitio, se espera que este procedimiento documental se haga antes de iniciar las labores de campo.
- Permisos de trabajo en alturas.
- Instalación de equipos de emergencia como escaleras, líneas de vida, vigía permanente afuera de las excavaciones.

  Para la actividad de alto riesgo como la aplicación de soldadura y utilización de equipos electromecánicos generadoras de corriente eléctrica y chispa en los frentes de Senderos y Boquerón, se realizaron actividades previas y durante la ejecución como s fueron:

  Permisos de trabajo en caliente.
  Realización de los A.T.S.
  Instalación en sitio de equipos contra incendio.
  Uso de los EPP específicos necesarios para salva guardar la salud de los operarios.
  Pre operacionales de equipos y herramientas.
  Competencia laboral certificada de los operarios.

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

4. INFORME ADMINISTRATIVO DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA:

4.1. CONTROL DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA ASOCIADO AL PROYECTO (ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO) Y DE SU PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:

En el siguiente cuadro se muestran, las novedades laborales del personal de la obra presentadas durante el mes diciembre 2022 - enero 2023, verificando el estado de pagos al Sistema de Seguridad Social Integral:

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total, pagado en el periodo
DICIEM-ENERO	7867018117	$ 198.100	$ 792.200	345.300	$ 1.335.600
DICIEM-ENERO	9445546960	$ 1.247.100	$ 5.127.300	$ 2.170.400	$ 8.544.800
DICIEM-ENERO	7866879984	$ 54.200	$ 216.600	$ 94.300	$ 365.100
NOVIE-DICIEM	7863359033	$ 385.400	$ 1.541.400	670.600	$ 2.597.400
NOVIE-DICIEM	9444033017	$ 1.268.000	$ 5.211.000	$ 2.206.700	$ 9.953.700
NOVIE-DICIEM	7863363847	$ 423.000	$ 1.691.000	$ 736.100	$ 2.850.100
OCTUBR-NOVIE	7858954594	$ 352.000	$ 88.000	$ 153.200	$ 593.200
OCTUBR-NOVIE	9442661173	$ 1.268.000	$ 5.211.000	$ 2.206.700	$ 8.685.700
OCTUBR-NOVIE	7857429038	$ 1.193.400	$ 4.773.400	$ 2.073.700	$ 8.040.500
SEPTIE-OCTUBR	7855924521	$ 88.000	$ 88.000	$ 153.200	$ 681.200
SEPTIE-OCTUBR	9441443774	$ 1.271.500	$ 5.224.900	$ 2.212.800	$ 9.980.700
SEPTIE-OCTUBR	7855919453	$ 1.425.600	$ 5.540.800	$ 2.480.700	$10.872.700
AGOSTO-SEPTIE	7852917344	$ 133.100	$ 531.900	$ 231.400	$ 1.029.300
AGOSTO-SEPTIE	440652876	$ 1.344.800	$ 5.519.700	$ 2.340.500	$ 10.549.800
AGOSTO-SEPTIE	7852919061	$ 1.225.500	$ 4.739.000	$ 2.131.900	$ 9.321.800
JULIO-AGOSTO	9438826440	$ 1.590.600	$ 6.501.500	$ 2.767.800	$ 10.859.900
JUNIO-JULIO	9437889931	$706. 300	$ 2.824.700	$ 1.229.300	$ 5.466.600

Ver Anexo. Seguridad Social Contratista

Tabla Relación del personal administrativo en obra Contratista Global Engineering and Design S.A.S

NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO	CARGO	FECHA DE INGRESO
Melissa Gomez Hernandez	1.059.812.959	Social	21/05/2022
Johnathan David Julio Barrientos	1.038.099.996	Residente Civil	21/05/2022
Geraldine Avendaño Yepes	1.216.720.956	Ambiental	21/05/2022
Ana Maria Gomez Cortes	1.128.392.482	Residente Civil	21/05/2022
Melba Rocio Ramirez Ogaza	43.052.843	Social	15/06/2022
Shirly Vanesa Valencia Rendon	1.017.215.422	SST	21/05/2022
Carlos Mario Palacios Chamat	15.435.479	Director de Obra	21/05/2022
Juvenal Alexander Palacios Chamat	71.774.893	Ingeniero Civil	21/05/2022
Juan Guillermo Vallejos	98.569.274	Ingeniero Civil	21/05/2022
Santiago Vallejos	1.152.187.494	Ingeniero Civil	21/05/2022
Melisa Andrea Buriticá Marin	43.268.642	SST	22-/06/2022
Karina Paola Llorente Guevara	1.037.597.618	SST	08/07/2022
Enith Liliana Henao Londoño	1,010,187,805	SST	5/08/2022
Alexander Córdoba Luna	1.152.696.985	Ingeniero Civil	18/08/2022

Estephanie Castrillon Atehortua	1.040.748.695	SST	23-/08/2022

El contratista realizó el pago de la seguridad social de manera normal para su personal de supervisión y operativos, de igual manera los sub contratistas como GUIBENZA, INGESTEEL, JAIRO ALVAREZ, TOPOGRAFIA, KARINA LLORENTE, PAVIMENTAR, JL CONSTRUCCIONES, realizaron sus aportes al sistema de manera normal y ajustada en fechas y valores.

4.2. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA DE OBRA FRENTE A LA SUBCONTRATACIÓN:

Durante la ejecución del proyecto no existe autorización firmada por parte del ordenador del gasto para la Subcontratación, por tal motivo no se realiza el control.

4.3. INFORME DE LA MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO DE OBRA Y SU MITIGACIÓN:

A la fecha de corte del presente informe el contrato de obra No. 4600094137 DE 2022 no se presentó ningún riesgo relevante.

4.4. CONTROL A LOS COMPROMISOS DEFINIDOS EN LOS COMITÉS DE OBRA:

A continuación, se muestran los comités realizados durante la ejecución del proyecto y las respectivas fechas en que se realizaron para el seguimiento del avance del contrato y a los compromisos adquiridos por cada uno de los intervinientes.

Comité N°	Fecha	Medio
1	27/05/2022	Secretaría de Infraestructura
2	10/06/2022	Secretaría de Infraestructura

Comité N°	Fecha	Medio
3	16/06/2022	Secretaría de Infraestructura
4	24/06/2022	Secretaría de Infraestructura
5	05/07/2022	Secretaría de Infraestructura
6	19/07/2022	Secretaría de Infraestructura
7	08/08/2022	Secretaría de Infraestructura
8	01/09/2022	Secretaría de Infraestructura
9	06/09/2022	Secretaría de Infraestructura
10	19/09/2022	Secretaría de Infraestructura
11	10/10/2022	Secretaría de Infraestructura
12	21/10/2022	Secretaría de Infraestructura
13	08/11/2022	Secretaría de Infraestructura
14	02/12/2022	Secretaría de Infraestructura

Ver comités de obra en el ANEXO 12-COMITÉS Y ACTAS DE RECORRIDO.

Consolidado de los Comités de obra

TAREAS ASIGNADAS EN LA REUNION	RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO	ESTADO A LA FECHA
Entrega del PASAO	Contratista	Junio 08/2022	Cumplido
Realizar recorrido de obra	Contratistas, interventorías, Supervisores.	Junio 16/2022	Cumplido
Llamar a líder Libardo de pajarito – San Javier la Loma.	Interventoría social	De inmediato	Cumplido
Consultar por líder de San Javier la loma	Supervisión social SIF	De inmediato	Cumplido
Visita a la propietaria del predio puente	Supervisión SIF	Junio 12/2022	Cumplido
Priorización frentes de trabajo	Contratista	Junio 12/2022	Cumplido
Reunión de inicio en el sector de pajarito	Contratista	Junio 21/2022	Cumplido
Localización topográfica en sector sendero	Contratista	Junio 21/2022	Cumplido
Inicio de instalación de señalización en el sector de pajarito	Contratista	Junio 22/2022	Cumplido
Entrega de radicado de PMT para agilizar proceso con secretaria de Movilidad	Contratista	Junio 24/2022	Cumplido
Recorrido a corregimiento de Palmitas para definición de si se va a ejecutar sector.	Supervisión	Junio 24/2022	Cumplido
Continua pendiente entrega de radicado de PMT de Santa Elena para agilizar proceso con secretaria de Movilidad	Contratista	Junio 24/2022	Cumplido
Recorrido para realizar permiso de intervención de los predios que intervienen en la construcción de pila puente pajarito.	Supervisión	Junio 28/2022	Cumplido
Entrega de programación de obra	Contratista	Junio 28/2022	Cumplido
Recorrido a la Vereda la Palma para definición	Supervisión	Junio 29/2022	Cumplido

Limpieza de cunetas y obra transversal en la vereda naranjal.	Contratista	Julio 06/2022	Cumplido
Inicio de frentes de senderos, pajarito y Yolombo	Contratista	Julio 06/2022	Cumplido
Entrega de informe mensual	Interventoría	Julio 10/2022	Cumplido
Entrega del formato de la sabana	Interventoría	Julio 10/2022	Cumplido
Definir si se puede intervenir vía en San Antonio de Prado	Supervisión	Julio 19/2022	Cumplido
Entrega de cantidades de obra del muro de contención del punto N°6 para elaboración de presupuesto.	Supervisión	Julio 19/2022	Cumplido
Entrega de resultados de perforaciones en Vereda la Palma	Contratista	Julio 21/2022	Cumplido
Entrega de diseños puente pajarito	Supervisión	Julio 22/2022	Cumplido
Instalación de señalización vertical informativa de resalto en Corregimiento Santa Elena.	Contratista	Agosto 11/2022	Cumplido
Realizar visita de campo entre contratista e Interventoría para plantear solución al traslado de MH para inicio de construcción de la pila N°2 en el puente pajarito	Contratista e Interventoría	Agosto 12/2022	Cumplido
Terminar el frente de Boquerón con la protección de la red de acueducto.	Contratista	Agosto 13/2022	Cumplido
Realizar comunicados notificando al contratista de las novedades	Interventoría	Septiembre 2/2022	Cumplido
Convocar nuevamente comité de obra N°9.	Supervisión	Septiembre 6/2022	Cumplido
Envío de presupuesto adición, cronograma de obra hasta el 15 de diciembre y APUS de obra extra.	Contratista	Septiembre 6/2022	Cumplido
Envío de presupuesto adición, informe mensual N°2 corregido, antecedentes penales	Interventoría	Septiembre 6/2022	Cumplido

y carta solicitando adición para contrato de Interventoría			
Instalación de señales verticales informativas en zona de resaltos_ corregimiento de Santa Elena vereda Barro Blanco	Contratista	Septiembre 7/2022	Cumplido
Ejecutar actividades de recolección de los residuos de demolición y construcción (RCD) acumulados en los frentes de obra activos en el corregimiento de San Cristóbal.	Contratista	Septiembre 16/2022	Cumplido
Realizar recorrido a los sectores de manzanillo y el reposo_ Altavista para definir las losas de concreto puntuales a intervenir y tramos en pavimento respectivamente.	Contratista e Interventoría	octubre/2022	Cumplido
Reactivar frente de pajarito	Contratista	Octubre 11/2022	Cumplido
Entrega del certificado de disposición final de los RCD generados en el mes de agosto.	Contratista	Octubre 12/2022	Cumplido
Instalación de platinas metálicas en el sector de Boquerón	Contratista	Octubre /2022	Cumplido
Socialización con el área técnica en el sector de Pajarito.	Contratista	Octubre 12/2022	Cumplido
Tramitar solicitud de tala de arboles	Supervisión	octubre/2022	Cumplido
Definir si se interviene el reposo_ Altavista	Supervisión	Noviembre 09/2022	Cumplido
Verificar si los diseños de la Frisola están listos.	Supervisión	Noviembre 09/2022	Cumplido
Visita a La Palma para verificar como dar solución al manejo de aguas	Supervisión	Noviembre 09/2022	Cumplido
Visita al puente Pajarito para definir niveles de acabado del puente respecto a la rasante existente.	Supervisión	Noviembre 09/2022	Cumplido
Terminar pendientes de pavimentos en el corregimiento de Santa Elena	Contratista	Noviembre 09/2022	Cumplido

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA:

A continuación, se muestra la relación de la correspondencia cruzada entre Contratista, Interventoría y Supervisión durante la ejecución del proyecto.

Correspondencia enviada

CONSORCIO VIAS CC	CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA	Código	SGI-FOR-ADM-007	
		Fecha	06/07/2022	
		Versión	2	Página 1 de 1

PROYECTO:	CONTRATO N 4600094153 INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN. PLAN VIAL RURAL

CONSECUTIVO	FECHA DE RADICADO	TIPO DE COMUNICADO	REMITENTE	DIRIGIDO A	ASUNTO	ENVIADO A	ESTADO	OBSERVACIONES	LOCALIZACION DEL ARCHIVO
AT-CVCC-024-E-001-22	6/6/2022	ADMINISTRATIVO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	APROBACIÓN HOJAS DE VIDA PERSONAL DEL CONTRATISTA	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO		AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-E-002-22	6/6/2022	ADMINISTRATIVO	Francisco José Calvo-Manzano Palacios	Liliana Bautista Alvare	INFORMACIÓN REQUERIDA PARA INICIO DE CONTRATO	Representante Legal de Global	ENVIADO		AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-E-003-22	9/6/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Carlos Palacio Chamat	SOLICITUD PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE	Director de contratista	ENVIADO		AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-E-004-22	9/6/2022	ADMINISTRATIVO	Francisco José Calvo-Manzano Palacios	Liliana Bautista Alvare	APROBACIÓN SUBCONTRATACIÓN	Representante Legal de Global	ENVIADO		AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-E-005-22	13/6/2022	AMBIENTAL	Kris Dayana Montoya Arbeláez	Jeraldin Avendaño	OBSERVACIONES AL PASAO	Profesional Ambiental	ENVIADO		AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-E-006-22	13/6/2022	TRANSITO	Yeny Marcela Pérez	Carlos Palacio Chamat	APROBACIÓN PMT SAN CRISTOBAL (La loma) y Pajarito	Director de contratista	ENVIADO		AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-E-007-22	15/6/2022	TRANSITO	Isabel Cristina Gutierrez Yepes	Carlos Palacio Chamat	APROBACIÓN PMT SANTA ELENA	Profesional Ambiental	ENVIADO		AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-SC-001-22	16/6/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Actas de reunión N°1 y 2	Alvaro Lopez Calle	CONTESTADO	correo: adjunto actas de reunión realizadas los días 27 de Mayo y 10 de Junio para su revisión y observaciones	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-002-22	16/6/2022	AMBIENTAL	Yeny Marcela Pérez	Jeraldin Avendaño	PMT - PAJARITO - SAN JAVIER LA LOMA	Jeraldine Avendaño	CONTESTADO	correo: respuesta 21 de junio adjunta PMT revisado con las firmas del especialista.	AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-E-008-22	22/6/2022	ADMINISTRATIVO	Francisco José Calvo-Manzano Palacios	Liliana Bautista Alvare	REITERACION SOLICITUD DE INFORMACIÓN REQUERIDA PARA INICIO DE CONTRATO	Representante Legal de Global	ENVIADO		AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-E-009-22	22/6/2022	TRANSITO	Isabel Cristina Gutierrez Yepes	Carlos Palacio Chamat	NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN SOCIOAMBIENTAL EN OBRA, PASAO	Representante Legal de Global	ENVIADO		AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-E-010-22	22/6/2022	AMBIENTAL	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	ENTREGA DEL PLAN DE ACCIÓN SOCIOAMBIENTAL EN OBRA. PASAO APROBADO.	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO		AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-003-22	23/6/2022	SST	German Aguirre Ramírez	Vanessa Valencia	Re_ Seguridad social Vibro Compactador_	Vanessa Valencia	ENVIADO	correo: informa que no se evidencian el total de documentos para inicio de actividades del equipo. 23/6/22	AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-SC-004-22	24/6/2022	SST	German Aguirre Ramírez	Vanessa Valencia	Re_ Certificado de afiliación Subcontratista mano de obra	Vanessa Valencia	ENVIADO	corre: informando no se evidencia información necesaria para el correcto ingreso e inicio de labores. 24/6/22	AT-024-02-03-02

CONSORCIO VIAS CC	**CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA**	**Código**	SGI-FOR-ADM-007	
		Fecha	06/07/2022	
		Versión	2	**Página 1 de 1**

PROYECTO:	**CONTRATO N 4600094153 INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN. PLAN VIAL RURAL**

CONSECUTIVO	FECHA DE RADICADO	TIPO DE COMUNICADO	REMITENTE	DIRIGIDO A	ASUNTO	ENVIADO A	ESTADO	OBSERVACIONES	LOCALIZACION DEL ARCHIVO
AT-CVCC-024-SC-005-22	24/6/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Actas de Comité N.3 Plan Vial Rural - OBSERVACIONES	Alvaro Lopez Calle	CONTESTAD	correo: adjunto 23 de junio acta de reunión N°3 para revisión , y 24 de junio responde con observaciones supervisor. 24/6/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-006-22	25/6/2022	SST	German Aguirre Ramírez	Vanessa Valencia	Validacion de personal	Vanessa Valencia	ENVIADO	correo: anexo de tabla para seguimiento de personal contratista ingresado a los frentes de trabajo. 25/6/22	AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-SC-007-22	26/6/2022	AMBIENTAL	Kris Dayana Montoya Arbeláez	Secretaria de Infraestructura Física	Informe Semanal del 20 al 25 de junio de 2022	Daniela Restrepo	ENVIADO	correo: adjunto informe semanal de los componentes social, ambiental y SST .26/6/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-008-22	28/6/2022	AMBIENTAL	Kris Dayana Montoya Arbeláez	Contratista	Observaciones Componente Ambiental - Frente Naranjal	Jeraldine Avendaño	CONTESTAD	correo: envio de observaciones que son contestadas el 30 de junio. 28/6/22	AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-SC-008A-22	30/6/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Análisis de precios unitarios APU_Obra extra	Alvaro Lopez Calle	CONTESTAD	correo: el 13 de julio supervisor envia observaciones realizadas por el profesional de la SIF. de la entrega de los APU de obra extra revisados y ajustados por el contratista de acuerdo con las observaciones de la interventoría, enviados el 30/06/22.	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-S-011-22	30/6/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Entrega de Análisis de precios unitarios APU. Obra extra	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO		AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-009-22	30/6/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Informe Semanal N.2	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: envio de informe semanal N°2. 30/6/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-010-22	30/6/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Bajo rendimiento en obra por retrasos en suministro de material (Fresado)_Plan vial rural	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: remitiendo a la supervisión comunicado 009 del contratista informando situación del asunto. 30/6/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-011-22	30/6/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Formato Generación de empleo Semana 20-26 Junio 2022	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: envio de formato generación de empleo. 30/6/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-S-012-22	5/7/2022	ADMINISTRATIVO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	ENTREGA POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO		AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-012-22	5/7/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Actas de Comité N.4 Plan Vial Rural	Alvaro Lopez Calle	CONTESTAD	correo: adjunto acta del comité N.4 para revisión y observaciones	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-013-22	5/7/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Actas de comitè. Plan Vial Rural	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: envio de actas de comitè N°1; 2 y 3 en PDF. 5/7/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-014-22	5/7/2022	AMBIENTAL	Kris Dayana Montoya Arbeláez	Secretaria de Infraestructura Física	Informe Semanal del 28 de junio al 02 de julio de 2022	Daniela Restrepo	ENVIADO	correo: envio de informe semanal ambiental. 5/7/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-015-22	5/7/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	PROYECCIÓN ACTAS INTERVENTORÍA	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: envio de cuadro con proyección actas interventoría. 5/7/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-016-22	6/7/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Informes Semanales y generación de empleo del N°1 al N°6	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: envio de formato generación de empleo. 6/7/22	AT-024-02-01-02

CONSORCIO VIAS CC	**CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA**	**Código**	SGI-FOR-ADM-007	
		Fecha	06/07/2022	
		Versión	2	**Página 1 de 1**

PROYECTO:	**CONTRATO N 4600094153 INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN. PLAN VIAL RURAL**

CONSECUTIVO	FECHA DE RADICADO	TIPO DE COMUNICADO	REMITENTE	DIRIGIDO A	ASUNTO	ENVIADO A	ESTADO	OBSERVACIONES	LOCALIZACION DEL ARCHIVO
AT-CVCC-024-SC-017-22	6/7/2022	SOCIAL	Doriela Ospina	Secretaria de Infraestructura Física	Fwd_ Informe Semanal del 30 de mayo al 18 de junio social	Javier Ramirez	ENVIADO	correo: remite correo enviado a supervisor social informe semanal. 6/7/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-018-22	7/7/2022	AMBIENTAL	Kris Dayana Montoya Arbeláez	Secretaria de Infraestructura Física	Informe mensual ambiental Interventoría PVR	Daniela Restrepo	CONTESTAD	correo: remite correo con aprobación y archivo del informe mensual ambiental mes de junio. 7/7/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-S-013-22	8/7/2022	ADMINISTRATIVO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Entrega Informe Mensual de Interventoría 4600094153_Versión 0.	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO		AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-S-014-22	11/7/2022	SST	German Aguirre Ramírez	Carlos Palacio Chamat	Incumplimiento normas de seguridad Industrial.	Director de contratista	ENVIADO		AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-SC-019-22	11/7/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Informe Mensual N.1 de Interventoría	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: envio de informe mensual N°1. 11/7/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-020-22	11/7/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Informe semanal N.7 Del 04 al 10 de Julio 2022	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: envio de informe semanal N°7. 11/7/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-020A-22	13/7/2022	AMBIENTAL	Kris Dayana Montoya Arbeláez	Jeraldin Avendaño	Observaciones Componente Ambiental- Recorrido 12/07/2022	Jeraldine Avendaño	ENVIADO	correo: observaciones ambientales de recorrido. 13/7/22	AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-SC-021-22	13/7/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Informe semanal N.7 Del 04 al 10 de Julio 2022 y formato Generación de empleo_correcciones	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: envio de informe semanal N°7. con correciones solicitadas 13/7/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-022-22	14/7/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Actas de Comité N.5 Plan Vial Rural	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: envio acta del comité N.5 para revisión y observaciones 14/7/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-023-22	14/7/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Informe Parcial N.1 de supervisión	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: adjunto informe con la información solicitada para informe de supervisión 14/7/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-024-22	14/7/2022	ADMINISTRATIVO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	ACTA N.1 DE INTERVENTORÍA PLAN VIARL RURAL_4600094153	Yessica Hernandez	CONTESTAD	correo: enviando el acta N°1 a la cual el dia 15 de julio se le hacen unas observaciones, que son resueltas el 18 de julio y aprobadas el 19 de julio. 14/7/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-025-22	15/7/2022	ADMINISTRATIVO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Solicitud de información - respuesta al radicado 202220072296	Alvaro Lopez Calle	CONTESTAD	correo: dando respuesta a solicitud de supervisor. El dia 18 de julio se adjunta cuadro con la información requerida. 15/7/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-026-22	15/7/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	PERFORACIONES LA PALMA	Alvaro Lopez Calle	CONTESTAD	correo: dando respuesta a solicitud de información del supervisor del estado en que se encuentra el avence de las perforaciones de la Palma. 15/7/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-026A-22	16/7/2022	AMBIENTAL	Kris Dayana Montoya Arbeláez	Secretaria de Infraestructura Física	Informe Semanal Socio ambiental y SST del 11 al 16 de julio de 2022	Daniela Restrepo	ENVIADO	correo: adjunto el informe semanal de los componentes social, ambiental y SST. 16/7/22	AT-024-02-01-02

CONSORCIO VIAS CC	CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA	Código	SGI-FOR-ADM-007	
		Fecha	06/07/2022	
		Versión	2	Página 1 de 1

PROYECTO:	CONTRATO N 4600094153 INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN. PLAN VIAL RURAL

CONSECUTIVO	FECHA DE RADICADO	TIPO DE COMUNICADO	REMITENTE	DIRIGIDO A	ASUNTO	ENVIADO A	ESTADO	OBSERVACIONES	LOCALIZACION DEL ARCHIVO
AT-CVCC-024-SC-027-22	18/7/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Definición en senderos	Carlos Palacio Chamat	CONTESTAD	correo: respuesta a solicitud de definición de senderos, recordando envio de propuesta que a la fecha no habia sido enviada. 18/7/22	AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-SC-028-22	18/7/2022	SST	German Aguirre Ramírez	Contratista	Re: Ingreso de personal	Vanessa Valencia	CONTESTAD	correo: dando respuesta, con observaciones al area de SST contratista	AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-SC-029-22	18/7/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	ACTAS DE COMITÉ DE LA N°1 A N°5 PLAN VIAL RURAL	Daniela Restrepo	ENVIADO	correo: adjunto las actas de comité de la N.1 a la N.5. 19/7/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-030-22	21/7/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Informe semanal N.8 Del 11 al 17 de Julio 2022	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: entrega de informe semanal N°8. 21/7/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-031-22	21/7/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Cuadro pendiente para el informe de supervisión	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: envio de cuadro pendiente del informe de supervisión y el certificado firmado por el representante legal. 21/7/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-032-22	21/7/2022	ADMINISTRATIVO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	FACTURAS. ACTA N. 1 PLAN VIAL RURAL	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: adjunto facturas correspondiente al acta N.1	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-033-22	21/7/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Contratista	APUs de OBRA EXTRA	Carlos Palacio Chamat	ENVIADO	correo: reenvio correo enviado por el supervisor con la proyección de los ítems de obra extra para revisión y entrega de los APU. 21/7/22	AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-S-015-22	22/7/2022	ADMINISTRATIVO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Confirmación número de cuenta para consignación	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO		AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-033A-22	23/7/2022	AMBIENTAL	Kris Dayana Montoya Arbeláez	Secretaria de Infraestructura Física	Informe Semanal Socio ambiental y SST del 18 al 23 de julio de 2022	Daniela Restrepo	ENVIADO	Correo: adjunto el informe semanal de los componentes social, ambiental y SST del 18 al 23 de julio. 23/7/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-033B-22	23/7/2022	AMBIENTAL	Kris Dayana Montoya Arbeláez	Jeraldin Avendaño	Observaciones Componente Ambiental - Recorridos 21 y 22 de julio de 2022.	Jeraldine Avendaño	ENVIADO	correo: observaciones ambientales del recorrido. 23/7/22	AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-SC-034-22	22/7/2022	ADMINISTRATIVO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Certificado de Cuenta bancaria consorcio VIAS CC	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: envio de certificación bancaria por relacion de facturas con nuemero de cuenta errado. 22/7/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-034A-22	25/7/2022	SST	German Aguirre Ramírez	Vanessa Valencia	Re: Personal Para Ingreso	Vanessa Valencia	ENVIADO	correo: Requisitos actividad de Pileros. 25/7/22	AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-SC-035-22	25/7/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Informe semanal N°9 Del 18 al 24 de Julio 2022 y formato Generación de empleo	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: entrega de informe semanal N°9. 25/7/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-036-22	25/7/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	PRESUPUESTO DE OBRA PARA ADICIÓN PLAN VIAL RURAL	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: envio de presupuesto de obra ajustado con los puntos visitados y aprobados para ejecución y con la proyección de los puntos para la adición. 26/7/22	AT-024-02-01-02

CONSORCIO VIAS CC	CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA	Código	SGI-FOR-ADM-007	
		Fecha	06/07/2022	
		Versión	2	Página 1 de 1

PROYECTO:	CONTRATO N 4600094153 INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN. PLAN VIAL RURAL

CONSECUTIVO	FECHA DE RADICADO	TIPO DE COMUNICADO	REMITENTE	DIRIGIDO A	ASUNTO	ENVIADO A	ESTADO	OBSERVACIONES	LOCALIZACION DEL ARCHIVO
AT-CVCC-024-S-016-22	26/7/2022	AMBIENTAL	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Observaciones Ambientales frentes de obra	Representante Legal de Global	ENVIADO		AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-SC-037-22	26/7/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	PRESENTACIÓN PARA ADICIÓN AL CONTRATO DE OBRA Y DE INTERVENTORÍA	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: se adjunta presentación para la adición de los contratos de obra y de interventoría. 26/7/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-037A-22	27/7/2022	SST	German Aguirre Ramírez	Vanessa Valencia	Re: Documentación compresor	Vanessa Valencia	ENVIADO	correo: Recomendaciones de Induccion personal . 27/7/22	AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-SC-037B-22	27/7/2022	SST	German Aguirre Ramírez	Vanessa Valencia	Re: Personal pavimentar	Vanessa Valencia	ENVIADO	correo: Recomendaciones de Induccion personal . 27/7/22	AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-SC-037C-22	27/7/2022	SST	German Aguirre Ramírez	Vanessa Valencia	Documentación operador pajarita	Vanessa Valencia	ENVIADO	correo: solicitud de documentación faltante antes de iniciar actividades. 27/7/22	AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-SC-038-22	28/7/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Documentación interventoría para adición	Leidy Johana Correa Rueda	ENVIADO	correo: envio de documentación interventoría para adición 28/7/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-038A-22	28/7/2022	AMBIENTAL	Kris Dayana Montoya Arbeláez	Jeraldin Avendaño	Ingreso de maquinaria y vehículos a frentes de obra.	Jeraldine Avendaño	ENVIADO	correo: inicio de actividades con maquinaria sin documentación en santa elena. 28/7/22	AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-SC-038B-22	28/7/2022	AMBIENTAL	Kris Dayana Montoya Arbeláez	Jeraldin Avendaño	Fwd: DOCUMENTACION PAVIMENTAR	Jeraldine Avendaño	CONTESTAI	correo: respuesta con relación de la maquina de pavimentar y faltantes de documentación. 28/7/22	AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-SC-038C-22	29/7/2022	AMBIENTAL	Kris Dayana Montoya Arbeláez	Jeraldin Avendaño	Solicitud de documentación - Actividades de pavimentación.	Jeraldine Avendaño	ENVIADO	correo: solicitando documentación de la empresa que realiza la provisión de la mezcla asfáltica. enviado el 26 de julio. 29/7/22	AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-SC-038D-22	30/7/2022	AMBIENTAL	Kris Dayana Montoya Arbeláez	Secretaria de Infraestructura Física	Informe Semanal Socio ambiental y SST del 25 al 30 de julio de 2022	Daniela Restrepo	ENVIADO	correo: adjunto informe semanal de los componentes social, ambiental y SST del 25 al 30 de julio, 30/7/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-S-017-22	1/8/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Análisis de precios unitarios. Obra extra.	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO		AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-039-22	1/8/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Documentos Contratista para adición	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: envio de documentación contratista para adición 1/8/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-040-22	1/8/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Informe semanal N°10 Del 25 al 31 de Julio 2022 y formato Generación de empleo	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: entrega de informe semanal N°10. 1/8/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-041-22	1/8/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	OBSERVACIONES INF. PARCIAL SUPERV	Alvaro Lopez Calle	CONTESTAI	correo: envio de correciones al Informe de supervición 1/8/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-042-22	1/8/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Analisis de precios unitarios_Obra extra Plan Vial Rural	Mario vanegas	CONTESTAI	correo:: envio de Apu obra extra para revisión por parte de presupuestos SIFy devolución con observaciones el 3 de agosto. 1/8/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-043-22	1/8/2022	SST	German Aguirre Ramírez	Contratista	Faltantes emergencias	Vanessa Valencia	ENVIADO	correo: envio solicitando equipos de emergencia en pajarito por desarrollo de actividades de alto riesgo. 1/8/22	AT-024-02-03-02

CONSORCIO VIAS CC	**CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA**	**Código**	SGI-FOR-ADM-007	
		Fecha	06/07/2022	
		Versión	2	**Página 1 de 1**

PROYECTO:	**CONTRATO N 4600094153 INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN. PLAN VIAL RURAL**

CONSECUTIVO	FECHA DE RADICADO	TIPO DE COMUNICADO	REMITENTE	DIRIGIDO A	ASUNTO	ENVIADO A	ESTADO	OBSERVACIONES	LOCALIZACION DEL ARCHIVO
AT-CVCC-024-SC-044-22	1/8/2022	SST	German Aguirre Ramírez	Contratista	Presencia SST en campo	Vanessa Valencia	ENVIADO	correo: envio solicitando profesional de SST en frentes de santa elena y pajarito permanente por el riestgo de actividades. 1/8/22	AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-S-018-22	2/8/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Información cambio de representante Legal Global	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO		AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-045-22	2/8/2022	AMBIENTAL	Kris Dayana Montoya Arbeláez	Contratista	Observaciones Componente Ambiental - Recorrido 01_08_2022 Frente Boqueron	Jeraldin Avendaño	ENVIADO	correo: envio de observaciones ambientales de recorrido. 2/8/22	AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-S-019-22	3/8/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Respuesta a los Oficios GLO-MVC-014-2022 (Precios pactados de obra extra del 1 al 5) y GLO-MVC-015-2022 (Solicitud Modificación de Contrato- Inclusión Ítems de Obras extras-Contrato de Obra No. 4600094137 DE 2022)	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO		AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-S-019-22 V2	3/8/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Concepto a comunicado GLO-MVC-015-2022 Solicitud de modificación de contrato – inclusión de ítems de obra extra	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	Por solicitud del supervisor se debia ampliar el concepto emitido en el oficio 024-S-019-22 pero desde contratación solicitan mantener el radicado con consecutivo y fecha original, ya que el 11 de agosto se habia procedido con la solicitud y se envio con el consecutivo AT-CVCC-024-S-023-22, por tal motivo atendiendo solicitud se deja en la trazabiliadad como CVCC-024-S-019-22 V2. anulando el enviado el 3 de agosto.	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-S-019-22 V3	3/8/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Concepto a comunicado GLO-MVC-015-2022 Solicitud de modificación de contrato – inclusión de ítems de obra extra	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	Por solicitud del CIP fue necesario ajustar el contenido con algunas observaciones, se envia el 17/8/22 y se deja en la trazabiliadad como CVCC-024-S-019-22 V3. anulando el enviado el 11 de agosto.	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-046-22	3/8/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Formatos diligenciados para tramite de Modificación y Obra extra	Leidy Johana Correa Rueda	ENVIADO	correo: envio de formatos diligenciados para el trámite de la obra de la obra extra.. 3/8/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-S-020-22	4/8/2022	AMBIENTAL	Kris Dayana Montoya Arbeláez	Carlos Palacio Chamat	Solicitud de actividades de limpieza en el frente de obra Barro Blanco.	Director de contratista	ENVIADO		AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-SC-047-22	4/8/2022	ADMINISTRATIVO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	PROYECCIÓN ACTAS INTERVENTORÍA_ Plan de pagos Interventoría	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: envio de plan de pagos mensual de interventoría 4/8/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-048-22	5/8/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Actas de Comité N.6 Plan Vial Rural	Alvaro Lopez Calle	CONTESTADO	correo: envio de acta del comité N.6 para revisión y observaciones. la secretaria hace observaciones ese mismo dia.5/8/22	AT-024-02-01-02

CONSORCIO VIAS CC	**CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA**	**Código**	SGI-FOR-ADM-007	
		Fecha	06/07/2022	
		Versión	2	**Página 1 de 1**

PROYECTO:	**CONTRATO N 4600094153 INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN. PLAN VIAL RURAL**

CONSECUTIVO	FECHA DE RADICADO	TIPO DE COMUNICADO	REMITENTE	DIRIGIDO A	ASUNTO	ENVIADO A	ESTADO	OBSERVACIONES	LOCALIZACION DEL ARCHIVO
AT-CVCC-024-SC-049-22	5/8/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	COSTOS OBRA EXTRA VS OBRA QUE NO SE EJECUTA	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: adjunto cuadro excel con el costo de la obra a ejecutar Vs. la que no se va a ejecutar. 5/8/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-050-22	6/8/2022	OTRO	Kris Dayana Montoya Arbeláez	Secretaria de Infraestructura Física	Informe Semanal Socio ambiental y SST del 01 al 06 de agosto de 2022	Daniela Restrepo	ENVIADO	correo: entrega de informe semanal ambiental, social y SST. 6/8/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-051-22	8/8/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Informe semanal N°11 Del 01 al 07 de Agosto 2022 y formato Generación de empleo	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: entrega de informe semanal N°11. 8/8/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-052-22	8/8/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	SEGUIMIENTO A LA EJECUCION MENSUAL	Alvaro Lopez Calle	CONTESTADO	correo: respuesta a solicitud envio de cuadro seguimiento a la ejecución mensual.8/8/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-S-021-22	10/8/2022	SOCIAL	Doriela Ospina	Carlos Palacio Chamat y Melissa Go	Respuesta a Queja señor Hector Cano Sector Boqueron. hector	Director de contratista	ENVIADO		AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-S-022-22	10/8/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Entrega informe Mensual N. 2 de Interventoría 4600094153_Versión 0.	Director de contratista	ENVIADO		AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-SC-053-22	10/8/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	INFORMACION X INF. PARCIAL SUPERVISIÓN	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: adjunto informe con la información de la interventoría solicitada para elaboración de informe supervisión. 10/8/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-S-023-22	11/8/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Respuesta a los Oficios GLO-MVC-014-2022 (Precios pactados de obra extra del 1 al 5) y GLO-MVC-015-2022 (Solicitud Modificación de Contrato- Inclusión Ítems de Obras extras- Contrato de Obra No. 4600094137 DE 2022)		BORRADOR	nota: desde contratación solicitan que el oficio con radicado CVCC-024-S-023-22 debido a modificación del comunicado CVCC-024-S-019-22, por tanto se debia mantener el radicado con consecutivo y fecha original, por tal motivo atendiendo solicitud se deja en la trazabiliadad como CVCC-024-S-019-22 V2	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-S-024-22	11/8/2022	AMBIENTAL	Yeny Marcela Pérez	Carlos Palacio Chamat y Jeraldine A	Observaciones componente ambiental recorridos 09 y 11 de agosto	Director de contratista	CONTESTADO		AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-S-025-22	11/8/2022	SOCIAL	Yeny Marcela Pérez	MELISSA GOMEZ HERNANDEZ	Aclaración argumento presentado a respuesta del oficio AT – CVCC-024-S-021-22	MELISSA GOMEZ HERNANDEZ	CONTESTADO		AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-SC-054-22	11/8/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Definición de ganchos para pilas	Alvaro Lopez Calle	CONTESTADO	correo: remite solicitud de contratista de definición ganchos acero pilas pajarito. 11/8/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-055-22	11/8/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	RV: Polígono requerida topografía los Maya	Alvaro Lopez Calle	CONTESTADO	correo: respuesta el 12 de agosto a solicitud de revisión del levantamiento topografico a realizar en la vereda la Plama . 11/8/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-S-026-22	12/8/2022	AMBIENTAL	Kris Dayana Montoya Arbeláez	Secretaria de Infraestructura Física	Informe semanal Interventoría socioambiental - SST del 08 al 13 de agosto de 2022	Daniela Restrepo Arenas y Javier Ramírez Echavarría	ENVIADO		AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-056-22	12/8/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	INFORME ESTADO ACTUAL FRENTE DE BOQUERON	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: adjunto informe del estado actual del frente de Boquerón. 12/8/22	AT-024-02-01-02

CONSORCIO VIAS CC	**CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA**	**Código**	SGI-FOR-ADM-007	
		Fecha	06/07/2022	
		Versión	2	**Página 1 de 1**

PROYECTO:	**CONTRATO N 4600094153 INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN. PLAN VIAL RURAL**

CONSECUTIVO	FECHA DE RADICADO	TIPO DE COMUNICADO	REMITENTE	DIRIGIDO A	ASUNTO	ENVIADO A	ESTADO	OBSERVACIONES	LOCALIZACION DEL ARCHIVO
AT-CVCC-024-S-027-22	16/8/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Estado actual de la actiivdades ejecutadas	Director de contratista	ENVIADO		AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-057-22	16/8/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Informe semanal N°12 Del 08 al 14 de Agosto 2022 y formato Generación de empleo	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: entrega de informe semanal N°12. 16/8/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-058-22	16/8/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	ACTA N.2 DE INTERVENTORÍA PLAN VIAL RURAL_4600094153	Alvaro Lopez Calle	CONTESTADO	correo: adjunto certificado de parafiscales con fecha y el soporte de nómina realizada al personal mediante transferencia electrónica de Bancolombia y colillas de pago. Respuesta a la solicitud requerida para continuar con revisión del acta N°2 enviada el 10 de agosto. 16/8/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-059-22	16/8/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	INFORMES SEMANALES	Alvaro Lopez Calle	CONTESTADO	correo: aclaración de informes semanales, respecto al reporte de generación de empleos en la Palma	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-060-22	18/8/2022	ADMINISTRATIVO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	ACTA N.2 DE INTERVENTORÍA PLAN VIAL RURAL_4600094153	Alvaro Lopez Calle	CONTESTADO	correo: aclaraciones a observaciones realizadas por la SIF referente al acta de pago N°2. enviada el 10 de agosto. 18/8/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-061-22	19/8/2022	ADMINISTRATIVO	Yeny Marcela Pérez	Contratista	Acta de comité N.7	Carlos Palacio Chamat	ENVIADO	correo: adjunto acta de comité N.7 para revisión por parte de contratista.	AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-S-028-22	20/8/2022	AMBIENTAL	Kris Dayana Montoya Arbeláez	Secretaria de Infraestructura Física	Entrega de informe semanal socioambiental y SST de Interventoría del 16 al 20 de agosto de 2022.	Daniela Restrepo Arenas y Javier Ramírez Echavarría	ENVIADO		AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-062-22	22/8/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	ACTA N.1 _Contrato_4600094137	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: adjunto Acta N.1 del contratista revisada, con los respectivos soportes a las cantidades en el archivo de Preacta.. 22/8/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-063-22	22/8/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Informe excavación Pila N.6 Puente Pajarito	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: adjunto informe con registro fotográfico de la Pila N.6 del puente Pajarito para liberación y proceder con el armado de acero y vaciado. 22/8/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-064-22	22/8/2022	ADMINISTRATIVO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Facturas Acta N.2 de Interventoria	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: adjunto facturas correspondientes al Acta N.2 de interventoría.. 22/8/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-065-22	22/8/2022	SST	German Aguirre Ramírez	Contratista	Profesional Sst Contratista	Vanessa Valencia	ENVIADO	correo: requerimiento de sst adicional. 22/8/22	AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-SC-066-22	22/8/2022	SOCIAL	social Interventoría	Contratista	Piezas cartelera	MELISSA GOMEZ HERNANDEZ	CONTESTADO	correo: realiza observación a pieza carteleras enviadas por el contratista. 22/8/22	AT-024-02-03-02

CONSORCIO VIAS CC	CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA	Código	SGI-FOR-ADM-007	
		Fecha	06/07/2022	
		Versión	2	Página 1 de 1

PROYECTO:	CONTRATO N 4600094153 INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN. PLAN VIAL RURAL

CONSECUTIVO	FECHA DE RADICADO	TIPO DE COMUNICADO	REMITENTE	DIRIGIDO A	ASUNTO	ENVIADO A	ESTADO	OBSERVACIONES	LOCALIZACION DEL ARCHIVO
AT-CVCC-024-SC-067-22	23/8/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Informe semanal N°13 Del 15 al 21 de Agosto 2022 y formato Generación de empleo	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: entrega de informe semanal N°13. 23/8/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-S-029-22	25/8/2022	SST	German Aguirre Ramírez	Contratista	Condiciones Inseguras graves	Director de contratista	ENVIADO		AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-S-030-22	25/8/2022	AMBIENTAL	Kris Dayana Montoya Arbeláez	Contratista	Solicitud de recolección de residuos de construcción y demolición (RCD) en frentes de obra.	Director de contratista	ENVIADO		AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-SC-068-22	25/8/2022	ADMINISTRATIVO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Cuadro pendiente para el informe de supervisión	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: adjunto cuadro pendiente en el informe de supervisión y el documento firmado por el representante legal. 25/8/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-069-22	25/8/2022	ADMINISTRATIVO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Citacion infraestructura (JAL ALTAVISTA)	Alvaro Lopez Calle	CONTESTADO	correo: adjunto cuadro con las actividades y costos (proyectado) de las direcciones en el corregimiento de Altavista, para responder a solicitud del supervisor del 23 de agosto. 25/8/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-070-22	25/8/2022	AMBIENTAL	Kris Dayana Montoya Arbeláez	Contratista	Vibrocompactador 2	Jeraldin Avendaño	CONTESTADO	correo: aceptando maquinaria para frentes de obra boqueron y pajarito. 25/8/22	AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-SC-071-22	26/8/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Acta de Comité N.7 Plan Vial Rural	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: djunto acta del comité N.7 para revisión y observaciones. 26/8/22.	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-072-22	26/8/2022	ADMINISTRATIVO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Citacion infraestructura (JAL ALTAVISTA)	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: adjunto cuadro con información más complementada.a la enviada el 25 de agosto. 26/8/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-S-031-22	27/8/2022	OTRO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Informe semanal Interventoría socioambiental - SST	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	informe socioambiental y SST	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-073-22	29/8/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Informe semanal N°14 Del 22 al 28 de Agosto 2022 y formato Generación de empleo	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: adjunto archivos que hacen parte del informe semanal N°14. 29/8/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-074-22	29/8/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Hoja de vidas para revisión y aprobación	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: envio relación de personal que no continuara en contrato y hojas de vida nuevo personal para reemplazo y aprobación. 29/08/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-S-032-22	30/8/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Entrega de Apu de obra extra	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO		AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-075-22	30/8/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Acta de recibo Naranjal	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: envio de acta recibo frente naranja para revisión. 30/8/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-076-22	30/8/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	APU DE OBRA EXTRA	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: adjunto APU de obra del N.6 al N.24, para revisión. 30/8/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-077-22	2/9/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Apoyo a Comunicaciones	Alvaro Lopez Calle	CONTESTADO	correo: adjunto documento solicitado con información actualizada del proyecto. 2/9/22.	AT-024-02-01-02

CONSORCIO VIAS CC	**CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA**	**Código**	SGI-FOR-ADM-007	
		Fecha	06/07/2022	
		Versión	2	**Página 1 de 1**

PROYECTO:	**CONTRATO N 4600094153 INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN. PLAN VIAL RURAL**

CONSECUTIVO	FECHA DE RADICADO	TIPO DE COMUNICADO	REMITENTE	DIRIGIDO A	ASUNTO	ENVIADO A	ESTADO	OBSERVACIONES	LOCALIZACION DEL ARCHIVO
AT-CVCC-024-SC-078-22	2/9/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Estado direcciones a ejecutar en el contrato PVR	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: adjunto archivo con las direcciones del contrato, especificando las que se van a ejecutar, las que no y las que ya se ejecutaron. 2/9/22.	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-S-033-22	2/9/2022	AMBIENTAL	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Incumplimiento reiterativo de las obligaciones con respecto al componente ambiental.	Contratista	ENVIADO		AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-S-034-22	2/9/2022	SST	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Condiciones Inseguras graves, incumplimientos reiterativos en el área de Seguridad y Salud en el trabajo, Ausencia del profesional S.S.T en el contrato.	Contratista	ENVIADO		AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-S-035-22	3/9/2022	AMBIENTAL	Kris Dayana Montoya Arbeláez	Secretaria de Infraestructura Física	Entrega de informe semanal socioambiental y SST de Interventoría del 29 de agosto al 03 de septiembre.	Daniela Restrepo Arenas y Javier Ramírez Echavarría	ENVIADO		AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-079-22	3/9/2022	AMBIENTAL	Kris Dayana Montoya Arbeláez	Contratista	Informe Ambiental Agosto	Jeraldin Avendaño	CONTESTADO	correo: informando al contratista de los entregables pendientes para el informe del mes de agosto de acuerdo a la información enviada el dia 2 de sept. 3/9/22	AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-SC-080-22	5/9/2022	SOCIAL	Cecilia Maria Mejia	Secretaria de Infraestructura Física	Informe social Mensual Agosto	Supervisor social	ENVIADO	correo: adjunto informe mensual social, para su revisión y aprobación, 5/9/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-081-22	5/9/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Informe (formato) contratación estatal	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: adjunto formato diligenciado, con corte al 31 de agosto. 5/9/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-082-22	5/9/2022	AMBIENTAL	Kris Dayana Montoya Arbeláez	Secretaria de Infraestructura Física	Informe mensual Interventoría PVR - Agosto 2022	Daniela Restrepo Arenas	ENVIADO	correo: adjunto informe mensual de gestión ambiental de Interventoría correspondiente al mes de agosto. 5/9/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-083-22	6/9/2022	AMBIENTAL	Kris Dayana Montoya Arbeláez	Contratista	Solicitud Certificación RCD - Agosto	Jeraldin Avendaño	ENVIADO	correo: solicita sea relacionada la respectiva certificación de disposición de los residuos emitida por la empresa prestadora del servicio, al contratista. 6/9/22	AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-SC-084-22	7/9/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Informe semanal N°15 Del 28 de agosto al 04 de Septiembre 2022 y formato Generación de empleo	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: envio de informe semanal N°15 tecnico. 7/9/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-085-22	7/9/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Observaciones informe de interventoria contrato 4600094153 de 2022	leidy johana Correa	CONTESTADO	correo: adjunto informe N.2 de interventoría con las correcciones solicitadas.7/9/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-086-22	7/9/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Propuesta económica_Adición interventoría	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: adjunto propuesta económica para la adición de la interventoría.	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-S-036-22	7/9/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	APU DE OBRA EXTRA N.6-N.28 Y PORYECCIÓN DE OBRA PARA ADICIÓN	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO		AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-S-037-22	7/9/2022	ADMINISTRATIVO	Francisco José Calvo-Manzano Palacios	Secretaria de Infraestructura Física	Prorroga y Adición Contrato de Interventoría	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO		AT-024-02-01-02

CONSORCIO VIAS CC	CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA	Código	SGI-FOR-ADM-007	
		Fecha	06/07/2022	
		Versión	2	Página 1 de 1

PROYECTO:	CONTRATO N 4600094153 INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN. PLAN VIAL RURAL

CONSECUTIVO	FECHA DE RADICADO	TIPO DE COMUNICADO	REMITENTE	DIRIGIDO A	ASUNTO	ENVIADO A	ESTADO	OBSERVACIONES	LOCALIZACION DEL ARCHIVO
AT-CVCC-024-SC-087-22	7/9/2022	ADMINISTRATIVO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Documentos Contratista para adición	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: adjunto los antecedentes penales del contratista,, documentos para la adición. 7/9/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-088-22	7/9/2022	AMBIENTAL	Kris Dayana Montoya Arbeláez	Contratista	Fwd: Documentos volquetas y equipos restantes	Jeraldin Avendaño	CONTESTADO	correo: respuesta aprobación de maquinaria. 7/9/22	AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-SC-089-22	7/9/2022	AMBIENTAL	Kris Dayana Montoya Arbeláez	Contratista	OTRAS VOLQUETAS SAN ANTONIO DE PRADO	Jeraldin Avendaño	CONTESTADO	correo:respuesta aprobación de volquetas. 7/9/22	AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-SC-090-22	8/9/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	PRESENTACIÓN PARA ADICIÓN AL CONTRATO DE OBRA Y DE INTERVENTORÍA	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: adjunto presentación actualizada para la adición de los contratos de obra y de interventoría.8/9/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-091-22	9/9/2022	ADMINISTRATIVO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Certificados contraloría, procuraduría y policía nacional	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: envio de certificados para adición.9/9/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-092-22	9/9/2022	ADMINISTRATIVO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	CONTRALORIA CPT.pdf	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: envio de certificados para adición.9/9/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-093-22	9/9/2022	ADMINISTRATIVO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Procuraduria	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: envio de certificados para adición.9/9/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-S-038-22	9/9/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Informe Mensual N.3 de Interventoria	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO		AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-094-22	10/9/2022	ADMINISTRATIVO	Kris Dayana Montoya Arbeláez	Contratista	DOCUMENTOS PAJARITA Y OPERADOR PARA BOQUERON	Jeraldin Avendaño	CONTESTADO	correo: responde a correo con documentación de pajarita enviadapor contratista el 8 de sept de que no se acepta equipo sin subsanar el faltante de poliza. 9/9/22	AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-S-039-22	10/9/2022	OTRO	Kris Dayana Montoya Arbeláez	Secretaria de Infraestructura Física	Informe semanal Interventoría socioambiental - SST	Daniela Restrepo Arenas y Javier Ramírez Echavarría	ENVIADO	correo: entrega del informe semanal socioambiental y SST de Interventoría del 05 al 10 de septiembre. 10/9/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-095-22	10/9/2022	AMBIENTAL	Kris Dayana Montoya Arbeláez	Contratista	Solicitud Certificación RCD - Agosto	Jeraldin Avendaño	PENDIENTE	correo: Se recuerda al contratista el envío de la documentación solicitada en el correo del 6 de sept. 10/9/22	AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-SC-096-22	10/9/2022	SST	German Aguirre Ramírez	Contratista	Re: Documentacion cuadrilla San Antonio de prado	Karina LLorente	CONTESTADO	correo: observaciones a la documentación enviada por el contratista, para ingresar el dia lunes al frente de san Antonio de Prado.10/9/22	AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-S-040-22	12/9/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	APU DE OBRA EXTRA N°6-28 Y PROYECCIÓN DE OBRA PARA ADICIÓN PLAN VIAL RURAL	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO		AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-097-22	12/9/2022	ADMINISTRATIVO	Kris Dayana Montoya Arbeláez	Contratista	Vibro - La Florida Tramo 2	Jeraldin Avendaño	CONTESTADO	correo: solicitando sea enviada la respectiva póliza para la aprobación de Vibrocompactador JBC modelo 2013. 12/9/22	AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-SC-098-22	13/9/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Informe semanal N°16 Del 05 al 11 de Septiembre 2022 y formato Generación de empleo	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: envio de informe semanal N°16. 13/9/22	AT-024-02-01-02

CONSORCIO VIAS CC	CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA	Código	SGI-FOR-ADM-007	
		Fecha	06/07/2022	
		Versión	2	Página 1 de 1

PROYECTO:	CONTRATO N 4600094153 INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN. PLAN VIAL RURAL

CONSECUTIVO	FECHA DE RADICADO	TIPO DE COMUNICADO	REMITENTE	DIRIGIDO A	ASUNTO	ENVIADO A	ESTADO	OBSERVACIONES	LOCALIZACION DEL ARCHIVO
AT-CVCC-024-SC-099-22	13/9/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	ACTA N.3 DE INTERVENTORÍA PLAN VIARL RURAL_4600094153	Alvaro Lopez Calle y Yessica.	ENVIADO	correo: adjunto acta de cobro N.3 para el contrato de interventoría con anexos, para la respectiva revisión. 13/9/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-100-22	14/9/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Actas de comité N.8 y N.9	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: Adjunto actas de comité N.8 (Sin contratista) y N.9 para revisión. 14/9/22.	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-101-22	14/9/2022	ADMINISTRATIVO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	ACTA N.3 DE INTERVENTORÍA PLAN VIARL RURAL_4600094153	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: adjunto soporte de pago de seguridad social pendiente. para acta. 14/9/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-102-22	15/9/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Justificación APU obra extra del 6-28	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: justificación a cada ítem de obra extra. 15/9/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-103-22	15/9/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Reprogramacion de obra_Adicion	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: adjunto reprogramacion de obra para la adición. 15/9/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-104-22	15/9/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	ACTA DE PAGO No. 2	Alvaro Lopez Calle	CONTESTADO	correo: adjunto acta N°2 en pdf firmada.15/9/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-S-041-22	15/9/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Aprobación a solicitud de modificación de contrato – inclusión de ítems de obra extra – ampliación de plazo, adición de recursos y la inclusión de ala formula de reajuste al contrato de obra	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO		AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-105-22	16/9/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Informe estado actual de las actividades de Boquerón	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: adjunto informe del estado actual de las obras de Boquerón. 16/9/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-S-042-22	16/9/2022	AMBIENTAL	Kris Dayana Montoya Arbeláez	Contratista	Condiciones de orden y aseo en frentes de obra activos del corregimiento de San Cristóbal.	Contratista	ENVIADO		AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-SC-106-22	16/9/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	ACTA DE OBRA N.2 Contrato de obra 4600094137	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: adjunto el acta de obra N.2 del contrato con anexos. 16/9/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-107-22	16/9/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Informe estado actual de las actividades de Boquerón	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: adjunto informe ajustado del estado actual de las obras de Boquerón. 16/9/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-S-043-22	17/9/2022	AMBIENTAL	Kris Dayana Montoya Arbeláez	Secretaria de Infraestructura Física	Entrega de informe semanal socioambiental y SST de Interventoría del 12 al 17 de septiembre.	Daniela arenas y javier ramirez	ENVIADO		AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-108-22	19/9/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Informe Parcial de Supervisión N.3	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: adjunto el informe N.3 de Supervisión con la inclusión de la información de la interventoría, y la planilla de pago del Consorcio.19/9/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-S-044-22	20/9/2022	AMBIENTAL	Kris Dayana Montoya Arbeláez	Contratista	Disposición final inadecuada de residuos de construcción y demolición (RCD).	Contratista Y Alvaro Lopez Calle	ENVIADO		AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-SC-109-22	21/9/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Prorroga y Adición al contrato de Interventoría N°4600094153	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: adjunto comunicado para revisión. 21/9/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-110-22	21/9/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Acta de visitas de campo para verificación de direcciones	Alvaro Lopez Calle y Leidy johana	ENVIADO	correo: adjunto actas de visitas de campo antes de iniciar contrato para revisar y si estan bien proceder con la incorporación de las firmas.	AT-024-02-01-02

CONSORCIO VIAS CC	CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA	Código	SGI-FOR-ADM-007	
		Fecha	06/07/2022	
		Versión	2	Página 1 de 1

PROYECTO:	CONTRATO N 4600094153 INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN. PLAN VIAL RURAL

CONSECUTIVO	FECHA DE RADICADO	TIPO DE COMUNICADO	REMITENTE	DIRIGIDO A	ASUNTO	ENVIADO A	ESTADO	OBSERVACIONES	LOCALIZACION DEL ARCHIVO
AT-CVCC-024-SC-111-22	21/9/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Informe semanal N°17 Del 12 al 18 de Septiembre 2022 y formato Generación de empleo	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: adjunto archivos que hacen parte del informe semanal: N°17._ 21/9/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-112-22	21/9/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Balance de obras a no ejecutar vs a ejecutar.	Alvaro Lopez Calle y Leidy johana	ENVIADO	correo: adjunto balance para revisión. en excel y word 21/9/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-113-22	21/9/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Actas de visitas de campo para verificación de direcciones	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo. adjunto actas firmadas por el contratista e Interventoría 21/9/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-S-045-22	21/9/2022	SOCIAL	Yeny Marcela Pérez	Contratista	Atención a PQR calle 45 b sur 83-105San Antonio de Prado	Carlos Palacio Chamat	ENVIADO		AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-S-041-22_ V2	21/9/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	RV: Solicitud MOD1 4600094153	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: adjunto comunicado AT-CVCC-024-S-041-22; con inclusión de párrafo solicitado. versión 2. _ 21/9/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-114-22	21/9/2022	SST	German Aguirre Ramírez	Contratista	Re: personal para altavista	Karina LLorente	CONTESTADO	correo: Solicitud de realizar examen de ingreso ingeniero de obra con un laboratorio o centro de salud avalado para estos fines y no con médicos particulares. 21/9/22	AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-SC-115-22	21/9/2022	AMBIENTAL	Kris Dayana Montoya Arbeláez	Contratista	Re: ACTAS 2 MEMORIAS AMBIENTALES	Jeraldin Avendaño	CONTESTADO	correo: observaciones a lo reportado en la memorias de cálculo ambientales. 21/09/22	AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-SC-116-22	22/9/2022	SST	German Aguirre Ramírez	Contratista	Planillas seguridad social	Contratista	ENVIADO	correo: solicitud planillas de seguridad social de las empresas que desarrollan actividades al interior del contrato. 22/9/22	AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-S-037-22_ V2	22/9/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	CORRECCION OFICIO 024	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	corrección a oficio N°37.	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-117-22	22/9/2022	SST	German Aguirre Ramírez	Contratista	seguridad social.	Karina LLorente	CONTESTADO	correo: informando que la seguridad social no está siendo pagada de manera puntual	AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-SC-118-22	22/9/2022	SST	German Aguirre Ramírez	Contratista	Re: ingreso de personal	Karina LLorente	CONTESTADO	correo: informa que el ingreso no es aprobado por evidenciarse por faltantes.	AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-SC-119-22	22/9/2022	SST	German Aguirre Ramírez	Contratista	Re: personal para altavista	Karina LLorente	CONTESTADO	correo: informa que el ingreso no es aprobado por evidenciarse por faltantes.	AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-S-046-22	23/9/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Incumplimientos del Contratista con respecto a los componentes técnico, ambiental y SST durante actividades de pavimentación en los frentes de obra Vereda La Verde – San Antonio de Prado y Mirador parte Baja – Altavista.	Contratista	ENVIADO		AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-SC-120-22	23/9/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Proyección adición	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: adjunto proyección adición	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-121-22	23/9/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Obras que se ejecutan Vs. Las que no se ejecutas	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: adjunto Obras que se ejecutan Vs. Las que no se ejecutas	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-S-041-22_ V3	23/9/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	MODIFICAR CARTA	Alvaro Lopez Calle	CONTESTADO		AT-024-02-01-02

CONSORCIO VIAS CC	CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA	Código	SGI-FOR-ADM-007	
		Fecha	06/07/2022	
		Versión	2	Página 1 de 1

PROYECTO:	CONTRATO N 4600094153 INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN. PLAN VIAL RURAL

CONSECUTIVO	FECHA DE RADICADO	TIPO DE COMUNICADO	REMITENTE	DIRIGIDO A	ASUNTO	ENVIADO A	ESTADO	OBSERVACIONES	LOCALIZACION DEL ARCHIVO
AT-CVCC-024-S-048-22	24/9/2022	OTRO	Kris Dayana Montoya Arbeláez	Secretaria de Infraestructura Física	Entrega de informe semanal socioambiental y SST de Interventoría del 19 al 24 de septiembre.	Daniela arenas y javier ramirez	ENVIADO		AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-122-22	24/9/2022	SST	German Aguirre Ramírez	Contratista	Re: Documentación para aprobación	Karina LLorente	CONTESTADO	correo: solicitud de documentación de personal individualmente.	AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-SC-123-22	25/9/2022	SST	German Aguirre Ramírez	Contratista	Re: Aprobación Personal	Karina LLorente	CONTESTADO	correo: solicitud de actualizar certificado de afiliación a ARL	AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-S-047-22	26/9/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Contratista	Solicitud de diseño de mezclas y ensayos de calidad mezcla asfáltica en caliente tipo MSC 19 con fibra.	Contratista	ENVIADO		AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-S-049-22	26/9/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Contratista	Observaciones al componente técnico en los frentes de trabajo.	Contratista	ENVIADO		AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-S-050-22	27/9/2022	SST	German Aguirre Ramírez	Contratista	Mora pago de Seguridad social Integral.	Contratista	ENVIADO		AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-SC-124-22	28/9/2022	SOCIAL	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	PQR SAN ANTONIO DE PRADO	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: adjunto respuesta a la PQR de la Calle 45B SUR. N 83-105 San Antonio de Prado._ Florida parte baja	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-125-22	28/9/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Informe semanal N°18 Del 19 al 25 de Septiembre 2022 y formato Generación de empleo	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: envio de informe semanal N°18	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-126-22	30/9/2022	ADMINISTRATIVO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	ACTAS DE PAGO	Alvaro Lopez Calle	CONTESTADO	correo: adjunto acta N.2 del contratista y el acta N.3 de la interventoría.	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-127-22	30/9/2022	ADMINISTRATIVO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Informes de seguimiento de ejecución y liquidación	Alvaro Lopez Calle	CONTESTADO	correo: adjunto informe de seguimiento N.4 con corte al 30 de septiembre	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-S-051-22	1/10/2022	AMBIENTAL	Kris Dayana Montoya Arbeláez	Secretaria de Infraestructura Física	Entrega de informe semanal socioambiental y SST de Interventoría del 19 al 24 de septiembre.	Daniela arenas y javier ramirez	ENVIADO		AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-128-22	4/10/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	19-09-2022 Acta De Reunión N.10_SIF	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: adjunto acta de comité N.10 para revisión por parte del supervisor..	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-129-22	4/10/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Informe semanal N°19 Del 26 de Septiembre al 02 de octubre 2022 y formato Generación de empleo	Alvaro Lopez Calle y Leidy johana	ENVIADO	correo: adjunto informe semanal N°19 para revisión por parte del supervisor..	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-IS-001-22	5/10/2022	AMBIENTAL	Kris Dayana Montoya Arbeláez	ejecutivo.comercial1@conasfaltos.co	Solicitud de verificación	Hernan Cordoba	CONTESTADO	correo: solicitu de informe si la empresa GLOBAL ENGINEERING AND DESING S.A.S. identificada con Nit: 829.002.160-7 ha realizado la disposición final de escombros en la escombrera perteneciente a la empresa Conasfaltos, durante los meses de agosto y septiembre del presente año., mismo dia responde	AT-024-02-02
AT-CVCC-024-S-052-22	5/10/2022	AMBIENTAL	Kris Dayana Montoya Arbeláez	Contratista	Incumplimiento reiterativo en la entrega de certificación de disposición final de residuos de construcción y demolición (RCD)	Contratista	ENVIADO		AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-SC-130-22	6/10/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Acta Visita a la Palma_Corregimiento San Cristobal	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: adjunto acta de la visita realizada el día 5 de oct a La Palma-Corregimiento de San Cristóbal.	AT-024-02-01-02

CONSORCIO VIAS CC	CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA	Código	SGI-FOR-ADM-007	
		Fecha	06/07/2022	
		Versión	2	Página 1 de 1

PROYECTO:	CONTRATO N 4600094153 INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN. PLAN VIAL RURAL

CONSECUTIVO	FECHA DE RADICADO	TIPO DE COMUNICADO	REMITENTE	DIRIGIDO A	ASUNTO	ENVIADO A	ESTADO	OBSERVACIONES	LOCALIZACION DEL ARCHIVO
AT-CVCC-024-SC-131-22	6/10/2022	AMBIENTAL	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Informe mensual Interventoría PVR - Septiembre 2022	Alvaro Lopez Calle	CONTESTADO	correo: envio de ultima comunicación al contratista de la situación e informa que se enviara un comunicado al representante legal ya que el director y resindete amb no han gestionado.	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-S-053-22	8/10/2022	AMBIENTAL	Kris Dayana Montoya Arbeláez	Contratista	Incumplimiento reiterativo en la entrega de certificación de disposición final de residuos de construcción y demolición (RCD)	Representante legal contratista	ENVIADO		AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-S-054-22	8/10/2022	OTRO	Kris Dayana Montoya Arbeláez	Secretaria de Infraestructura Física	Informe semanal Interventoría socioambiental - SST	Daniela arenas y javier ramirez	ENVIADO		AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-132-22	12/10/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Informe semanal N°20 Del 03 al 09 de octubre 2022 y formato Generación de emple	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: envio de informe semanal N°20	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-133-22	12/10/2022	SOCIAL	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Formato confidencialidad	Alvaro Lopez Calle	CONTESTADO	correo: envio de formato de acuerdo de confidencialidad del area social solicitado por la supervisión.	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-134-22	12/10/2022	SOCIAL	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Acuerdo de confidencialidad solicitado	Alvaro Lopez Calle	CONTESTADO	correo: adjunto acuerdo de confidencialidad del contratista.	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-S-055-22	13/10/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Informe Mensual N.4 de Interventoria	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO		AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-135-22	13/10/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	ACTA N.4 DE INTERVENTORÍA PLAN VIARL RURAL_4600094153	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: adjunto acta N.4 de interventoría con sus respectivos anexos, para la respectiva revisión.	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-S-056-22	13/10/2022	ADMINISTRATIVO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Entrega de Pólizas actualizadas del contrato de obra 4600094137.	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO		AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-136-22	13/10/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Informe Parcial de Supervisión N.4	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: adjunto el informe N.4 de Supervisión con la inclusión de la información de la Interventoría, adicionalmente la planilla de pago del Consorcio.	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-S-057-22	15/10/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Requrimientos al contrato de obra	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO		AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-137-22	18/10/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Informe semanal N°21 Del 10 al 16 de octubre 2022 y formato Generación de empleo	Alvaro Lopez Calle y Leidy johana	ENVIADO	correo: enrega de informe semanal N°21	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-138-22	18/10/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Informe de Avances Intervenciones Varias - San Cristóbal	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: entrega de informe detallado acerca de las obras que se han ejecutado en el Corregimiento a través del contrato de Plan Vial Rural, así como los avances en los frentes que están actualmente en ejecución para responder oficio adjunto de la Secretaria de Infraestructura Física,	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-S-057-22	18/10/2022	AMBIENTAL	Kris Dayana Montoya Arbeláez	Secretaria de Infraestructura Física	Informe semanal Interventoría socioambiental - SST	Daniela arenas y javier ramirez	ENVIADO		AT-024-02-01-02

CONSORCIO VIAS CC	CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA	Código	SGI-FOR-ADM-007	
		Fecha	06/07/2022	
		Versión	2	Página 1 de 1

PROYECTO:	CONTRATO N 4600094153 INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN. PLAN VIAL RURAL

CONSECUTIVO	FECHA DE RADICADO	TIPO DE COMUNICADO	REMITENTE	DIRIGIDO A	ASUNTO	ENVIADO A	ESTADO	OBSERVACIONES	LOCALIZACION DEL ARCHIVO
AT-CVCC-024-SC-139-22	19/10/2022	SST	Yeny Marcela Pérez	Contratista	Hoja de vida Ingeniera en Higiene y Seguridad Ocupacional (SST).	Contratista	ENVIADO	correo: reenvio adjunto hoja de vida de profesional SST recomendada por la secretaría, de acuerdo con su solicitud de envió de hojas de vida para vinculación de profesional.	AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-SC-140-22	20/10/2022	ADMINISTRATIVO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Factura acta 4	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: envio factura de electronica de venta acta N°4.	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-141-22	21/10/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Acta de comité N.11-Plan Vial rural	Alvaro Lopez Calle	CONTESTADO	correo: envio de acta de comite N°11 para revisón	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-S-058-22	22/10/2022	AMBIENTAL	Kris Dayana Montoya Arbeláez	Secretaria de Infraestructura Física	Informe semanal Interventoría socioambiental - SST	Daniela arenas y javier ramirez	ENVIADO		AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-142-22	24/10/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	ACTAS N.3 Y N.4_Contrato_4600094137	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: adjunto acta N.3 correspondiente al reajuste con los índices de camacol, y el acta de obra N.4	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-143-22	25/10/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Informe semanal N°22 Del 17 al 23 de octubre 2022 y formato Generación de empleo	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: envio de informe semanal N°22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-S-059-22	25/10/2022	ADMINISTRATIVO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Actualización de Pólizas de la adición al contrato de Interventoría 4600094153	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO		AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-S-060-22	27/10/2022	ADMINISTRATIVO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Respuesta a comunicado GLO-MVC-027-2022 solicitud de ampliacion de plazo	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO		AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-144-22	22/10/2022	AMBIENTAL	Kris Dayana Montoya Arbeláez	Contratista	RETROEXCAVADORA LA PALMA	Jeraldin Avendaño	CONTESTADO	correo: donde se informa que el equipo relacionado no evidencia que encuentre cubierta por la póliza adjunta en el correo, por lo cual se solicita que esta sea enviada para su respectiva aprobación,	AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-S-061-22	29/10/2022	AMBIENTAL	Kris Dayana Montoya Arbeláez	Secretaria de Infraestructura Física	Informe semanal Interventoría socioambiental - SST	Daniela arenas y javier ramirez	ENVIADO		AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-145-22	1/11/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	SEGUIMIENTO PLAN INDICATIVO CON CORTE A OCTUBRE 31 DE 2022	Alvaro Lopez Calle	CONTESTADO	correo: adjunto informe solicitado con corte al 31 de octubre.	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-146-22	1/11/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Informe semanal N°23 Del 24 al 30 de octubre 2022 y formato Generación de empleo	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: envio de informe semanal tecnico n°23	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-S-062-22	1/11/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Alerta por incumplimiento en la señalización vial definitiva de los frentes de obra del corregimiento de Santa Elena.	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO		AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-147-22	1/11/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Propuesta adición Interventoría_45 días.	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: adjunto la propuesta económica de la interventoría para los 45 días adicionales, ajustada al valor solicitado.	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-148-22	1/11/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	PLAN INDICATIVO	Alvaro Lopez Calle	CONTESTADO	correo: adjunto cuadro con la información solicitada.	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-149-22	2/11/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	PLAN INDICATIVO	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo:adjunto registro fotográfico de los frentes de obra activos en PVR.	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-S-063-22	2/11/2022	ADMINISTRATIVO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Solicitud de Prorroga y Adición N.2 al contrato de Interventoría N°4600094153	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO		AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-150-22	3/11/2022	ADMINISTRATIVO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Documentos para adicion de tiempo	Alvaro Lopez Calle y Leidy johana	CONTESTADO	correo: adjunto aceptación de cambio de alcance y la cámara de comercio actualizada de Global	AT-024-02-01-02

CONSORCIO VIAS CC	**CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA**	**Código**	SGI-FOR-ADM-007	
		Fecha	06/07/2022	
		Versión	2	**Página 1 de 1**

PROYECTO:	**CONTRATO N 4600094153 INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN. PLAN VIAL RURAL**

CONSECUTIVO	FECHA DE RADICADO	TIPO DE COMUNICADO	REMITENTE	DIRIGIDO A	ASUNTO	ENVIADO A	ESTADO	OBSERVACIONES	LOCALIZACION DEL ARCHIVO
AT-CVCC-024-SC-152-22	3/11/2022	ADMINISTRATIVO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	INFORME SEGUIMIENTO A LA EJECUCION MENSUAL	Alvaro Lopez Calle	CONTESTADO	correo: adjunto Informe de Seguimiento a la Ejecución Mensual con corte a 31 de octubre	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-153-22	3/11/2022	ADMINISTRATIVO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Documentos pendientes para ampliacion y adicion	Alvaro Lopez Calle y Leidy johana	ENVIADO	correo: adjunto carta de aceptación del contratista de cambio de alcance y redistribución de recursos.	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-154-22	3/11/2022	ADMINISTRATIVO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	ACTA DE PAGO	Alvaro Lopez Calle	CONTESTADO	correo: adjunto acta N.4 de interventoría, en PDF y firmada.	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-155-22	3/11/2022	ADMINISTRATIVO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Archivo redistribucion de recursos	Alvaro Lopez Calle y Leidy johana	ENVIADO	correo: adjunto archivo con la distribución de recursos ajustado	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-156-22	3/11/2022	AMBIENTAL	Kris Dayana Montoya Arbeláez	Contratista	Re: ACTA 2 - AMBIENTAL	Jeraldin Avendaño	CONTESTADO	correo: respuesta a las memorias de cálculo, se realizan observaciones	AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-SC-157-22	4/11/2022	AMBIENTAL	Kris Dayana Montoya Arbeláez	Contratista	VIBRO - BELENCITO	Jeraldin Avendaño	CONTESTADO	correo: se informa que la interventoría esta presta a revisar documentació pese a que se envio despues del tiempo, pero se hace un llamado al contratista a respetar dichos tiempos.	AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-S-064-22	5/11/2022	OTRO	Kris Dayana Montoya Arbeláez	Secretaria de Infraestructura Física	Informe semanal Interventoría socioambiental - SST	Daniela arenas y javier ramirez	ENVIADO		AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-158-22	6/11/2022	AMBIENTAL	Kris Dayana Montoya Arbeláez	Secretaria de Infraestructura Física	Informe mensual Interventoría PVR - Octubre 2022	Daniela arenas	ENVIADO	correo: envio de informe mensual N°5 ambiental para revisión	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-159-22	8/11/2022	SST	German Aguirre Ramírez	Contratista	Re: Documentación para aprobación	Vanessa Valencia	CONTESTADO	correo: de la documentación entregada se le solicita documentación faltante.	AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-SC-160-22	10/11/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	VISITA DISEÑADOR PUENTE PAJARITO	Alvaro Lopez Calle ,Leidy johana y contratista	ENVIADO	correo: conclusiones de la visita realizada por el diseñador Carlos Vasquez al Puente Pajarito.	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-161-22	10/11/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Informe semanal N°24 Del 31 de octubre al 06 de noviembre 2022 y formato Generación de empleo	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: adjunto archivos que hacen parte del informe semanal	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-162-22	10/11/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	ACTA N.3 Y 4 CONTRATISTA	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: adjunto acta N.3 y N.4 del contratista firmada y en PDF.	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-S-065-22	10/11/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Informe Mensual N.5 de Interventoria	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO		AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-163-22	11/11/2022	ADMINISTRATIVO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	RV: Deducción por contribución Especial	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: solicitud de información acerca de descuento por contribución de cto que se aplicó en ultima factura, descuento que no se habia aplicado en las anteriores facturas.	AT-024-02-01-02

CONSORCIO VIAS CC	**CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA**	**Código**	SGI-FOR-ADM-007	
		Fecha	06/07/2022	
		Versión	2	**Página 1 de 1**

PROYECTO:	**CONTRATO N 4600094153 INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN. PLAN VIAL RURAL**

CONSECUTIVO	FECHA DE RADICADO	TIPO DE COMUNICADO	REMITENTE	DIRIGIDO A	ASUNTO	ENVIADO A	ESTADO	OBSERVACIONES	LOCALIZACION DEL ARCHIVO
AT-CVCC-024-SC-164-22	11/11/2022	ADMINISTRATIVO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	ACTA N.5 DE INTERVENTORÍA PLAN VIARL RURAL_4600094153	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: adjunto acta N.5 con sus respectivos anexos, para la respectiva revisión.	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-165-22	11/11/2022	SST	German Aguirre Ramírez	Contratista	Re: PERSONAL PARA PASAMANOS SENDEROS	Karina LLorente	CONTESTADO	correo reenviado: observaciones a la documentación enviada por el contratista para el ingreso del personal, las cuales deben ser subsanadas antes de iniciar labores.	AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-SC-166-22	11/11/2022	SST	German Aguirre Ramírez	Contratista	Re: SEGURIDAD SOCIAL	Karina LLorente	CONTESTADO	correo reenviado: solicitar tener presente el pago oportuno de acuerdo a las fechas límites de pago de la seguridad del personal que falta.	AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-S-066-22	11/11/2022	OTRO	Yeny Marcela Pérez	Contratista	Observaciones a la actualización del plan de acción socioambiental en obra (PASAO).	Contratista	ENVIADO		AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-S-067-22	12/11/2022	OTRO	Kris Dayana Montoya Arbeláez	Secretaria de Infraestructura Física	Informe semanal Interventoría socioambiental - SST	Daniela arenas y javier ramirez	ENVIADO		AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-167-22	16/11/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	INFORMACION INF. PARC. SUPERVISION	Alvaro Lopez Calle	CONTESTADO	correo: adjunto informe parcial de supervisión N.5 con la información de la interventoría.	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-168-22	16/11/2022	ADMINISTRATIVO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	ACTA N.5 DE INTERVENTORÍA PLAN VIARL RURAL_4600094153	Alvaro Lopez Calle	CONTESTADO	correo: atención a observación de la profesional Yessica Hernández en cuanto al acta de pago 5	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-169-22	16/11/2022	ADMINISTRATIVO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Solicitud Información San Antonio de Prado	Alvaro Lopez Calle	CONTESTADO	correo: adjunto respuesta a lo solicitado dentro del alcance del contrato	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-170-22	16/11/2022	AMBIENTAL	Kris Dayana Montoya Arbeláez	Contratista	MEMORIAS 2 PARA FIRMA AMBIENTAL	Jeraldin Avendaño	CONTESTADO	correo: envía el archivo de memorias ambientales con la correspondiente firma de aprobación,	AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-S-068-22	17/11/2022	ADMINISTRATIVO	Francisco José Calvo-Manzano Palacios	Secretaria de Hacienda	Reclamación por retencion realizada a factura FC07	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO		AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-171-22	17/11/2022	ADMINISTRATIVO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	SOLICITUD INFORMACION PROFESIONAL SOCIAL	Alvaro Lopez Calle	CONTESTADO	correo: hace entrega de la renuncia de la profesional social de interventoría	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-172-22	17/11/2022	ADMINISTRATIVO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Acta de comité N.13-Plan Vial rural	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: envio de acta de comite para revisión y abrobación por supervisor.	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-173-22	18/11/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Informe semanal N°25 Del 07 al 13 de noviembre 2022 y formato Generación de empleo	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: adjunto archivos que hacen parte del informe semanal N°25	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-174-22	19/11/2022	AMBIENTAL	Kris Dayana Montoya Arbeláez	Contratista	COMPRESOR PAJARITO	Jeraldin Avendaño	CONTESTADO	correo: solicita los documento del equipo ya que en campo se verifico que los documentos enviados no corresponden al equipo en obra.	AT-024-02-03-02

CONSORCIO VIAS CC	CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA	Código	SGI-FOR-ADM-007	
		Fecha	06/07/2022	
		Versión	2	Página 1 de 1

PROYECTO:	CONTRATO N 4600094153 INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN. PLAN VIAL RURAL

CONSECUTIVO	FECHA DE RADICADO	TIPO DE COMUNICADO	REMITENTE	DIRIGIDO A	ASUNTO	ENVIADO A	ESTADO	OBSERVACIONES	LOCALIZACION DEL ARCHIVO
AT-CVCC-024-SC-175-22	19/11/2022	SST	German Aguirre Ramírez	Contratista	Re: Documentos Compresor y Operador	Karina LLorente	CONTESTADO	correo: se verifica la documentación, la cual no concuerda el serial y modelo, se deben pasar los documentos del equipo que va para campo.	AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-SC-176-22	19/11/2022	SST	German Aguirre Ramírez	Contratista	Re: DOCUMENTOS DEL PERSONAL	Karina LLorente	CONTESTADO	correo: informa que Juan Guilllermo Vallejo no cuenta con contrato laboral y exámenes médicos, la documentación debe estar completa y revisada antes de enviarse a la interventoría.	AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-S-069-22	19/11/2022	OTRO	Kris Dayana Montoya Arbeláez	Secretaria de Infraestructura Física	Informe semanal Interventoría socioambiental - SST	Daniela arenas y javier ramirez	ENVIADO		AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-177-22	19/11/2022	AMBIENTAL	Kris Dayana Montoya Arbeláez	Contratista	BOBCAT - MANZANILLO	Jeraldin Avendaño	CONTESTADO	correo: se informa que la póliza anexada no corresponde a la maquinaría que se solicita sea aprobada	AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-SC-178-22	19/11/2022	AMBIENTAL	Kris Dayana Montoya Arbeláez	Contratista	Compresor Manzanillo	Jeraldin Avendaño	CONTESTADO	correo: se aprueba equipo relacionado.	AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-SC-179-22	21/11/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Informe semanal N°26 Del 14 al 20 de noviembre 2022 y formato Generación de empleo	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: adjunto archivos que hacen parte del informe semanal N°26	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-180-22	21/11/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	ACTAS N.5 Y N.6_Contrato de Obra_460009413-PLAN VIAL RURAL	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: adjunto acta de obra N.5 y Acta N.6 correspondiente al reajuste del acta de obra N.4.	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-S-070-22	23/11/2022	SST	German Aguirre Ramírez	Contratista	Incumplimientos S.S.T.	Carlos Palacio Chamat	ENVIADO	comunicado con fecha del 21 de nov	AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-S-071-22	23/11/2022	AMBIENTAL	Kris Dayana Montoya Arbeláez	Contratista	Solicitud de recolección de residuos de demolición en cauce de quebrada.	Carlos Palacio Chamat	ENVIADO		AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-S-072-22	25/11/2022	OTRO	Yeny Marcela Pérez	Contratista	Observaciones a los componentes técnico, ambiental y SST en los frentes de obra en el corregimiento de Santa Elena.	Carlos Palacio Chamat	ENVIADO		AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-S-073-22	26/11/2022	OTRO	Kris Dayana Montoya Arbeláez	Secretaria de Infraestructura Física	Entrega de informe semanal socioambiental y SST de Interventoría del 21 al 26 de noviembre.	Daniela arenas y javier ramirez	ENVIADO		AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-181-22	28/11/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Informe semanal N°27 Del 21 al 27 de noviembre 2022 y formato Generación de empleo	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: adjunto archivos que hacen parte del informe semanal N°27	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-182-22	1/12/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	SEGUIMIENTO A PROYECTOS EN PLATAFORMA SPI - CORTE A NOVIEMBRE 30 DE 2022	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: adjunto informe solicitado con corte al 30 de Noviembre.	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-183-22	1/12/2022	SST	German Aguirre Ramírez	Contratista	Re: Ingreso de personal 2-12-2022	Vanessa Valencia	CONTESTADO	correo: aprobaciòn del personal para ingreso.	AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-SC-184-22	2/12/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	APU de obra extra N.29-33 Plan Vial Rural	Mario Vanegas	ENVIADO	correo: adjunto APU de obra extra del N.29 al 33 revisados; con la respectiva cotización y para revisión y visto bueno.	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-S-074-22	3/12/2022	OTRO	Kris Dayana Montoya Arbeláez	Secretaria de Infraestructura Física	Informe semanal Interventoría socioambiental - SST	Daniela arenas y javier ramirez	ENVIADO		AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-185-22	6/12/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	INFORME SEGUIMIENTO A LA EJECUCION N°6 4600094137-22_Noviembre	Alvaro Lopez Calle	CONTESTADO	correo: adjunto informe de seguimiento N.6 correspondiente al mes de Noviembre	AT-024-02-01-02

CONSORCIO VIAS CC	**CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA**	**Código**	SGI-FOR-ADM-007	
		Fecha	06/07/2022	
		Versión	2	**Página 1 de 1**

PROYECTO:	**CONTRATO N 4600094153 INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN. PLAN VIAL RURAL**

CONSECUTIVO	FECHA DE RADICADO	TIPO DE COMUNICADO	REMITENTE	DIRIGIDO A	ASUNTO	ENVIADO A	ESTADO	OBSERVACIONES	LOCALIZACION DEL ARCHIVO
AT-CVCC-024-SC-186-22	6/12/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Informe semanal N°28 Del 28 de noviembre al 04 de Diciembre 2022 y formato Generación de empleo	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: adjunto informe semanal Nº28	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-187-22	6/12/2022	ADMINISTRATIVO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	ACTA DE PAGO No. 5	Alvaro Lopez Calle	CONTESTADO	correo: *envio de acta firmada 1/12/22 *informa que la factura fue montada en el secop. 6/12/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-188-22	6/12/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Redistribución de recursos	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: adjunto archivo trabajado para la redestribucion de recursos	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-189-22	9/12/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	CUADRO REDESTRIBUCIÓN DE RECURSOS	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: adjunto archivo cuadro de redestribucion de recursos	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-190-22	9/12/2022	ADMINISTRATIVO	Yeny Marcela Pérez	Contratista	CAMBIO OFICIO CONTRATISTA OBRA	Carlos Palacio Chamat	ENVIADO	correo: solicita atender solicitud del cambio de oficio	AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-SC-191-22	9/12/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	ACTA N.5 Y N.6_FIRMADAS	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: adjunto Acta N.5 (obra) y N.6 (reajuste) del contratista con firma.	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-192-22	9/12/2022	ADMINISTRATIVO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	MODIFICACION 4600094153	Alvaro Lopez Calle	CONTESTADO	correo: adjunto cuadro con la firma del representante legal para reemplazar en el formato 161 página N.6	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-193-22	9/12/2022	ADMINISTRATIVO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	FORMATO DE DISTRIBUCION DE RECURSOS_Versión N.1	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: adjunto formato de distribucion con los ajustes solicitados.	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-S-075-22	9/12/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Informe Mensual N.6 de Interventoria	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO		AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-194-22	9/12/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	ACTA N.6 DE INTERVENTORÍA PLAN VIARL RURAL_4600094153	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: adjunto se encuentra el acta N.6 para el contrato del asunto con sus respectivos anexos, para la respectiva revisión.	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-S-076-22	10/12/2022	OTRO	Kris Dayana Montoya Arbeláez	Secretaria de Infraestructura Física	Entrega de informe semanal socioambiental y SST de Interventoría del 05 al 10 de diciembre.	Daniela arenas y javier ramirez	ENVIADO		AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-195-22	12/12/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	INFORME PARCIAL DE SUPERVISÓN N.6 NOVIEMBRE 2022	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: djunto el informe parcial de supervisión con la información correspondiente al mes de Noviembre.	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-196-22	12/12/2022	ADMINISTRATIVO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Modificación de comunicados	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: adjunto la modificación de los comunicados solicitados para continuar con el trámite de la adición y ampliación de los contratos de obra e interventoría.	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-197-22	12/12/2022	ADMINISTRATIVO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	AT-CVCC-024-S-063-22_Solicitud de Adición N.2 Contrato 4600094153	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: adjunto comunicado modificado y cuadro de plan de pagos	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-198-22	12/12/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Porcentajes	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: envio de porcentajes de obra.	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-199-22	12/12/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Contratista	APU OBRA EXTRA 29-31 Y COTIZACION PLAN VIAL RURAL	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: adjunto APU de obra extra con las modificaciones solicitadas por el ingeniero Mario en reunión con el contratista y cotización.	AT-024-02-01-02

CONSORCIO VIAS CC	**CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA**	**Código**	SGI-FOR-ADM-007	
		Fecha	06/07/2022	
		Versión	2	**Página 1 de 1**

PROYECTO:	**CONTRATO N 4600094153 INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN. PLAN VIAL RURAL**

CONSECUTIVO	FECHA DE RADICADO	TIPO DE COMUNICADO	REMITENTE	DIRIGIDO A	ASUNTO	ENVIADO A	ESTADO	OBSERVACIONES	LOCALIZACION DEL ARCHIVO
AT-CVCC-024-SC-200-22	12/12/2022	ADMINISTRATIVO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Proyección de pagos contratista	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: envio de proyeccion de pagos del contratista.	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-201-22	12/12/2022	ADMINISTRATIVO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	DOCUMENTOS ANTECEDENTES CONSORCIO VIAS CC	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: adjunto documentos de antecedentes del Consorcio	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-202-22	12/12/2022	AMBIENTAL	Kris Dayana Montoya Arbeláez	Contratista	Documentación maquinaría - La Palma	Jeraldin Avendaño.	CONTESTADO	correo: de la documentacion enviada de la maquinaria la interventoria informa que no se encuentra aprobada para el uso en la actividades constructivas en el frente de obra, es por tanto que, se solicita que la documentación faltante sea enviada en el menor tiempo posible, para su respectiva revisión y validación,	AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-SC-203-22	12/12/2022	SST	German Aguirre Ramírez	Contratista	Re: SST PALMAS	Karina LLorente	CONTESTADO	correo: se aprueba SST para realizar las labores de supervisión SST, por favor realizar Inducción general en riesgos laborales, entrega de dotación y EPP, solicita envio de registros y documentos	AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-SC-204-22	12/12/2022	SST	German Aguirre Ramírez	Contratista	Re: ingreso personal senderos	Karina LLorente	CONTESTADO	correo: se solicita realizar las correcciones sugeridas vía telefónica, por lo pronto personal no están autorizados para iniciar labores.	AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-SC-205-22	13/12/2022	ADMINISTRATIVO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Documentos solicitados_Adición	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: adjunto documentos solicitados para adicion	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-206-22	13/12/2022	ADMINISTRATIVO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Propuesta económica ajustada	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: adjunto propuesta ajustada en el tiempo del auxilio de transporte.	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-207-22	13/12/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Informe semanal N°29 Del 29 del 04 al 11 de Diciembre 2022 y formato Generación de empleo	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: adjunto se encuentran los archivos que hacen parte del informe semanal Nº29.	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-208-22	14/12/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Redistribución de recursos	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: adjunto formato con la redistribucion de recursos.	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-209-22	14/12/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Contratista	Redistribución de recursos	Carlos Palacio Chamat	ENVIADO	correo: adjunto formato con la redistribucion de recursos.	AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-SC-210-22	14/12/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	3317_JT QBDA PALMITAS-SECCIONES FINALE.dwg	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: reenvio de correo de contratista con el levantamiento topográfico en el corregimiento Palmitas , sector vereda la frisola 100ml aguas arriba y 100ml aguas abajo de la quebrada.	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-211-22	14/12/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	ACTA DE VIABILIDAD TECNICA SEIS PUNTOS NUEVOS	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: adjunto acta para firma del supervisor.	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-212-22	14/12/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	ANTECEDENTES CONSORCIO 14 DE DICIEMBRE	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	Correo: adjunto los antecedentes del consorcio.	AT-024-02-01-02

CONSORCIO VIAS CC	CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA	Código	SGI-FOR-ADM-007	
		Fecha	06/07/2022	
		Versión	2	Página 1 de 1

PROYECTO:	CONTRATO N 4600094153 INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN. PLAN VIAL RURAL

CONSECUTIVO	FECHA DE RADICADO	TIPO DE COMUNICADO	REMITENTE	DIRIGIDO A	ASUNTO	ENVIADO A	ESTADO	OBSERVACIONES	LOCALIZACION DEL ARCHIVO
AT-CVCC-024-SC-213-22	14/12/2022	SST	German Aguirre Ramírez	Contratista	Re:	Vanessa Valencia	CONTESTADO	correo: se informa que el personal se aprueba para iniciar labores, del Sr Darisnel no se recibió el resto de papelería, por lo tanto no se aprueba.	AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-SC-214-22	15/12/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	ACTA N.7 DE INTERVENTORÍA PLAN VIAL RURAL_460009415	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: adjunto Acta N.7 de interventoria proyectada con el pago de la seguridad social.	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-215-22	15/12/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Presupuesto adicion N.2 Interventoría	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: adjunto archivo presupuesto ajustado al valor de la adición.	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-216-22	16/12/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	ACTAS N.7 Y N.8_Contrato de Obra_460009413-PLAN VIAL RURAL	Alvaro Lopez Calle y Contratista	ENVIADO	correo: adjunto acta de obra N.7 (obra) Y N.8 (reajustes) del contratista, memorias de cálculo y seguridad social.	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-216A-22	16/12/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Acta N.8 reajuste	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: adjunto nuevamente soporte del acta N.8, por error de revisión.	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-S-077-22	17/12/2022	OTRO	Kris Dayana Montoya Arbeláez	Secretaria de Infraestructura Física	Entrega de informe semanal socioambiental y SST de Interventoría del 12 al 17 de diciembre.	Daniela arenas y javier ramirez	ENVIADO		AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-217-22	18/12/2022	SST	German Aguirre Ramírez	Contratista	Re: personal senderos soldador	Vanessa Valencia	CONTESTADO	correo: se solicita realizar inducción a riesgos laborales , entrega de epp y dotacion y enviar soportes	AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-SC-218-22	18/12/2022	SST	German Aguirre Ramírez	Contratista	Re: afiliaciones jairo	Vanessa Valencia	CONTESTADO	correo: se informa que el personal se aprueba para iniciar labores, aún quedan pendientes de aprobación los demás que a la fecha no presentan examen	AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-SC-219-22	18/12/2022	SST	German Aguirre Ramírez	Contratista	Re: DOCUMENTOS PERSONAL SENDEROS	Vanessa Valencia	CONTESTADO	correo: se informa que el personal de senderos se aprueba para iniciar labores	AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-S-078-22	20/12/2022	ADMINISTRATIVO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Renuncia a intereses factura Noviembre	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO		AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-S-079-22	20/12/2022	ADMINISTRATIVO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Renuncia a intereses factura Diciembre	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO		AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-220-22	20/12/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Informe semanal N°31 Del 19 al 25 de Diciembre 2022 y formato Generación de empleo	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: adjunto se encuentran los archivos que hacen parte del informe semanal Nº31	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-221-22	20/12/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Informes mensuales de interventoría N.5 y N.6	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: adjunto informes Mensuales de interventoría N.5 y N.6 en PDF y firmados.	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-222-22	22/12/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Avance a Diciembre 31_2022 PLAN VIAL RURAL	Alvaro Lopez Calle	CONTESTADO	correo: envio de archivos solicitados avances a 31 de diciembre.	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-S-080-22	24/12/2022	OTRO	Kris Dayana Montoya Arbeláez	Secretaria de Infraestructura Física	Entrega de informe semanal socioambiental y SST de Interventoría del 18 al 24 de diciembre.	Daniela arenas y javier ramirez	ENVIADO		AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-223-22	26/12/2022	SST	German Aguirre Ramírez	Contratista	Re: PERSONAL INGRESO	Vanessa Valencia	CONTESTADO	correo: aprobaciòn de personal para ingreso a la obra.	AT-024-02-03-02

CONSORCIO VIAS CC	CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA	Código	SGI-FOR-ADM-007	
		Fecha	06/07/2022	
		Versión	2	Página 1 de 1

PROYECTO:	CONTRATO N 4600094153 INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN. PLAN VIAL RURAL

CONSECUTIVO	FECHA DE RADICADO	TIPO DE COMUNICADO	REMITENTE	DIRIGIDO A	ASUNTO	ENVIADO A	ESTADO	OBSERVACIONES	LOCALIZACION DEL ARCHIVO
AT-CVCC-024-SC-224-22	26/12/2022	SST	German Aguirre Ramírez	Contratista	Re: personal para la palma	Vanessa Valencia	CONTESTADO	correo: aprobaciòn de personal para ingreso a la obra la Palma.	AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-SC-225-22	30/12/2022	ADMINISTRATIVO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	INFORME SEGUIMIENTO A LA EJECUCION N°7 4600094137-22_Diciembre	Alvaro Lopez Calle	CONTESTADO	correo: envio de archivo solicitado mes tras mes.	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-225-22	30/12/2022	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Informe semanal N°30 Del 29 del 12 al 18 de Diciembre 2022 y formato Generación de empleo				
AT-CVCC-024-S-081-22	31/12/2022	OTRO	Kris Dayana Montoya Arbeláez	Secretaria de Infraestructura Física	Informe semanal Interventoría socioambiental - SST	Daniela arenas y javier ramirez	ENVIADO		AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-227-22	4/1/2023	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Control Semanal Frentes contractuales_Plan Vial Rural_Semana No.32	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: adjunto archivos que hacen parte del informe semanal Nº32	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-S-082-22	5/1/2023	AMBIENTAL	Kris Dayana Montoya Arbeláez	Contratista	Llamado de atención por afectación a individuo arbóreo en el frente La Palma	Carlos Palacio Chamat	ENVIADO		AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-S-083-22	5/1/2023	SST	German Aguirre Ramírez	Contratista	Incumplimientos SST al contrato de obra 4600094137	Carlos Palacio Chamat	ENVIADO		AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-SC-228-22	6/1/2023	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Contratos 4600094137 y 4600094153 Plan Vial Rural	Margarita Montoya	CONTESTADO	correo: relacion de información solicitada en ausencia del supervisor.	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-S-084-22	7/1/2023	OTRO	Kris Dayana Montoya Arbeláez	Secretaria de Infraestructura Física	Informe semanal Interventoría socioambiental - SST	Daniela arenas y javier ramirez	ENVIADO		AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-229-22	10/1/2023	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Contratos profesionales sociales Plan Vial Rural	Johana Correa	ENVIADO	correo: adjunto contratos de los profesionales sociales de la interventoría y contratista.	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-330-22	11/1/2023	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Informe semanal N°33 del 02 al 08 de Enero 2023 y formato Generación de empleo	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: adjuntoarchivos que hacen parte del informe semanal Nº33	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-331-22	11/1/2023	ADMINISTRATIVO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Fwd: Acuerdos Confidencialidad - Plan Vial Rural	Johana Correa	CONTESTADO	correo: dando respuesta a la solicitud para aclarar el tema sobre firmas de contratos y acuerdos de confidencialidad.	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-332-22	11/1/2023	SST	German Aguirre Ramírez	Contratista	Re: DOCUMENTOS PERSONAL SENDEROS	Vanessa Valencia	CONTESTADO	correo: aprobacion de personal	AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-S-085-22	14/1/2023	OTRO	Kris Dayana Montoya Arbeláez	Secretaria de Infraestructura Física	Entrega de informe semanal socioambiental y SST de Interventoría del 10 al 14 de enero de 2023.	Daniela arenas y javier ramirez	ENVIADO		AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-333-22	16/1/2023	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	INFORMACION INF. PARC. SUPERVISION N.7	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: adjunto informe con corte del 01 al 30 de diciembre de 2022..	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-S-085-22	16/1/2023	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Informe Mensual N.7 de Interventoria	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO		AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-S-086-22	16/1/2023	AMBIENTAL	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Concepto de Interventoría sobre solicitud de dragado de la quebraba "La García" sector Pajarito - San Cristóbal.	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO		AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-334-22	17/1/2023	SST	German Aguirre Ramírez	Contratista	Re: personal la palma	Vanessa Valencia	CONTESTADO	correo: aprobacion de personal	AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-SC-335-22	18/1/2023	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Informe semanal N°34 del 09 al 15 de Enero 2023 y formato Generación de empleo	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: adjuntoarchivos que hacen parte del informe semanal Nº34.	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-336-22	18/1/2023	AMBIENTAL	Kris Dayana Montoya Arbeláez	Secretaria de Infraestructura Física	Formato Contraloría	Daniela arenas	ENVIADO	correo: adjunto de formato solicitado con la información correspondiente a la inversión socioambiental del proyecto	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-337-22	20/1/2023	ADMINISTRATIVO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Acuerdo de confidencialidad Cecilia Mejía	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: adjunto acuerdo de confidencialidad de Cecilia Mejía.	AT-024-02-01-02

CONSORCIO VIAS CC	CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA	Código	SGI-FOR-ADM-007	
		Fecha	06/07/2022	
		Versión	2	Página 1 de 1

PROYECTO:	CONTRATO N 4600094153 INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN. PLAN VIAL RURAL

CONSECUTIVO	FECHA DE RADICADO	TIPO DE COMUNICADO	REMITENTE	DIRIGIDO A	ASUNTO	ENVIADO A	ESTADO	OBSERVACIONES	LOCALIZACION DEL ARCHIVO
AT-CVCC-024-SC-338-22	20/1/2023	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	SOPORTES ACTA N.7 INTERVENTORÍA PLAN VIAL RURAL	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: adjunto los soportes del acta N.7 correspondiente al mes de Diciembre de 2022	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-339-22	20/1/2023	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	SOLICITUD ACTAS DE PAGO-SECOP II	Alvaro Lopez Calle	CONTESTADO	correo: adjunto Actas de Pago No. 6 y No. 7 del contrato de Interventoría No. 4600094153 de 2022 en PDF debidamente firmadas	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-340-22	21/1/2023	SST	German Aguirre Ramírez	Contratista	Re: afi.jairoac@gmail.com te ha enviado AFILIACIONES	Vanessa Valencia	CONTESTADO	correo: no se aprueba ingreso de personal ya que examen medico no coincide con nombre del trabajador.	AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-S-087-22	23/1/2023	AMBIENTAL	Kris Dayana Montoya Arbeláez	Secretaria de Infraestructura Física	Entrega de informe semanal socioambiental y SST de Interventoría del 16 al 21 de enero de 2023.	Daniela arenas y javier ramirez	ENVIADO	observaciòn: fecha del comunicado del 21 de enero.	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-341-22	24/1/2023	TECNICO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	Informe semanal N°35 del 16 al 22 de Enero 2023 y formato Generación de empleo	Alvaro Lopez Calle	ENVIADO	correo: adjunto archivos que hacen parte del informe semanal Nº35.	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-SC-342-22	25/1/2023	SST	German Aguirre Ramírez	Contratista	Re: PERSONAL PARA LA PALMA	Vanessa Valencia	CONTESTADO	correo: aprobacion de personal para la palma.	AT-024-02-03-02
AT-CVCC-024-SC-343-22	26/1/2023	ADMINISTRATIVO	Yeny Marcela Pérez	Secretaria de Infraestructura Física	ACTUALIZACION POLIZAS MODIFICACION 2	Alvaro Lopez Calle	CONTESTADO	correo: envio de polizas actualizadas modificacion de contrato Nº2.	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-S-088-22	28/1/2023	AMBIENTAL	Kris Dayana Montoya Arbeláez	Secretaria de Infraestructura Física	Entrega de informe semanal socioambiental y SST de Interventoría del 22 al 28 de enero de 2023.	Daniela arenas y javier ramirez	ENVIADO	observaciòn: fecha del comunicado del 28 de enero.	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-S-089-22	30/1/2023	SST	German Aguirre Ramírez	Contratista	Condición insegura puente pajarito	Carlos Palacio Chamat	ENVIADO	observaciòn: fecha del comunicado del 29 de enero.	AT-024-02-01-02

Correspondencia recibida:

CONSORCIO VIAS CC	CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA	Código	SGI-FOR-ADM-006	
		Fecha	06/07/2022	
		Versión	2	Página 1 de 1

PROYECTO:	CONTRATO N 4600094153 INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN. PLAN VIAL RURAL

CONSECUTIVO	FECHA DE RECIBIDO	QUIEN ENVIA	COMPONENTE	ASUNTO	ENVIADO A	ESTADO	OBSERVACIONES	LOCALIZACION DEL ARCHIVO
GLO-MVC-001-2022	7/6/2022	CONTRATISTA	**TECNICO**	Entrega calculo AIU	Yeny Marcela Pérez Velázquez	EN REVISIÓN		AT-024-02-03-01
GLO-MVC-004-2022	7/6/2022	CONTRATISTA	**ADMINISTRATIVO**	Solicitud de aprobación de subcontratación	Yeny Marcela Pérez Velázquez	EN REVISIÓN		AT-024-02-03-01
N.A	8/6/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	Entrega del Plan de Acción Socio Ambiental de Obra PASAO	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	Enviado por Global, no tiene consecutivo	AT-024-02-03-01
GLO-MVC-006-2022	15/6/2022	CONTRATISTA	**TECNICO**	Entrega APU Obra Extra 01 a 06	Yeny Marcela Pérez Velázquez	EN REVISIÓN		AT-024-02-03-01
GLO-MVC-007-2022	23/6/2022	CONTRATISTA	**TECNICO**	Entrega APU Obra Contractual	Yeny Marcela Pérez Velázquez	EN REVISIÓN		AT-024-02-03-01
GLO-MVC-005-2022	28/6/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	Informe de trasplante de Palma	Kris Dayana Montoya Arbeláez	EN REVISIÓN		AT-024-02-03-01
GLO-MVC-009-202	29/6/2022	CONTRATISTA	**TECNICO**	Bajo rendimiento en obra por retrasos en suministro de material (Fresado)	Yeny Marcela Pérez Velázquez	EN REVISIÓN	La supervisión responde mediante correo: informa que tiene total disponibilidad para suministrarles el material de fresado necesario para ejecutar las obras en el sector conocido como El Naranjal del Corregimiento de San Cristóbal.	AT-024-02-03-01
GLO-MVC-012-2022	28/7/2022	CONTRATISTA	**TECNICO**	Entrega APU Obra Extra 01 a 05 conciliados con interventoría y SIF	Yeny Marcela Pérez Velázquez	EN REVISIÓN		AT-024-02-03-01
N.A	30/7/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	Fwd: OFICIO AT-CVCC-024-S-016-22	Consorcio Vias CC 2022	CONTESTADO	Enviado por Global, no tiene consecutivo, respuesta a oficio de interventoría	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-E-001-22	13/5/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	OBSERVACIONES SITIOS VISITADOS	Consorcio Vias CC 2023	EN REVISIÓN	correo enviado por supervisor para conocimiento del contratista el 13/05/22	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-002-22	20/5/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	PLANOS PUENTE PAJARITO	Contratista	EN REVISIÓN	correo enviado por supervisor para conocimiento del contratista el 13/05/22	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-003-22	23/5/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	Observaciones frentes de trabajo Contrato No. 4600094137 de 2022, Plan Vial Rural.	Contratista	EN REVISIÓN	correo enviado por supervisor para conocimiento del contratista el 23/05/22	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-004-22	27/5/2022	SUPERVISIÓN	**ADMINISTRATIVO**	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Consorcio Vias CC 2023	EN REVISIÓN	correo:envío de formato para elaborar actas de comité y un ejemplo de cómo las elaborarlas el 27/05/22	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-005-22	27/5/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	Topografía Pajarito	Contratista	CONTESTADO	correo: observaciones del Ingeniero Luis Sebastian Cano a la topografía recibida por contratista. 27/05/22	AT-024-02-01-01

CONSORCIO VIAS CC	**CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA**	**Código**	SGI-FOR-ADM-006	
		Fecha	06/07/2022	
		Versión	2	**Página 1 de 1**

PROYECTO:	**CONTRATO N 4600094153 INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN. PLAN VIAL RURAL**

CONSECUTIVO	FECHA DE RECIBIDO	QUIEN ENVIA	COMPONENTE	ASUNTO	ENVIADO A	ESTADO	OBSERVACIONES	LOCALIZACION DEL ARCHIVO
AT-CVCC-024-E-006-22	31/5/2022	SUPERVISIÓN	**ADMINISTRATIVO**	Formato Informes Contrato No. 4600094153 de 2022	Consorcio Vias CC 2023	EN REVISIÓN	correo: envío de formatos Informes para presentar semanal y mensualmente. 31/05/22	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-007-22	31/5/2022	SUPERVISIÓN	**ADMINISTRATIVO**	FORMATO CONTROL SEMANAL FRENTES	Consorcio Vias CC 2023	EN REVISIÓN	correo: envío de formato para llevar control efectivo de la obra y de cada uno de sus frentes. 31/05/22	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-008-22	6/6/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	Detalles Vía Naranjal Boquerón	Contratista	EN REVISIÓN	correo: envío de detalles constructivos de los dos puntos a intervenir en la vía Naranjal Boquerón del Corregimiento de San Cristóbal, 6/06/22	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-009-22	15/6/2022	SUPERVISIÓN	**JURIDICO**	Ocupación de Cauce Puente Pajarito	Contratista	EN REVISIÓN	correo: comunicación de argumento de porque no es necesario la solicitud de ocupación de cauce 15/06/22	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-010-22	16/6/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	Actas de reunión N°1 y N°2	Consorcio Vias CC 2023	CONTESTADO	correo: aprobación de actas de comite 1 y 2. 16/06/22	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-011-22	24/6/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	Actas de Comité N.3 Plan Vial Rural - OBSERVACIONES	Consorcio Vias CC 2023	CONTESTADO	correo: observación realizada al actas de comite N°3. 24/06/22	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-012-22	30/6/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	Bajo rendimiento en obra por retrasos en suministro de material (Fresado)	Contratista	CONTESTADO	correo: la Secretaría informa que tiene total disponibilidad para suministrar al contratista el material fresado necesario para ejecutar las obras. 30/06/22	AT-024-02-01-01
GLO-MVC-010-2022	1/7/2022	CONTRATISTA	**ADMINISTRATIVO**	Entrega Actualización de pólizas con acta de inicio	Yeny Marcela Pérez Velázquez	EN REVISIÓN		AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-E-013-22	6/7/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	Informes Semanales y generación de empleo	Consorcio Vias CC 2023	CONTESTADO	correo: observaciones de la supervisora para correcciones a los informes semanales presentados hasta la fecha. 6/7/22	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-014-22	7/7/2022	SUPERVISIÓN	**AMBIENTAL**	Informe mensual ambiental Interventoría PVR - Junio 2022	Consorcio Vias CC 2023	CONTESTADO	correo: supervisora aprueba informe mensual presentado por la interventoría. 7/7/22	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-015-22	15/7/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	Perforaciones en el sector La Palma del corregimiento de San Cristóbal.	Consorcio Vias CC 2023	CONTESTADO	correo: solicitud información sobre avance de perforaciones en San Cristobal La Palma. 15/7/22	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-016-22	15/7/2022	SUPERVISIÓN	**ADMINISTRATIVO**	Solicitud de información - respuesta al radicado 202220072296	Consorcio Vias CC 2023	CONTESTADO	correo: solicitud de diligenciamiento de formato de acuerdo a radicado 202220072296, de la Secretaría de Seguridad y Convivencia. 15/7/22	AT-024-02-01-01

CONSORCIO VIAS CC	**CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA**	**Código**	SGI-FOR-ADM-006	
		Fecha	06/07/2022	
		Versión	2	**Página 1 de 1**

PROYECTO:	**CONTRATO N 4600094153 INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN. PLAN VIAL RURAL**

CONSECUTIVO	FECHA DE RECIBIDO	QUIEN ENVIA	COMPONENTE	ASUNTO	ENVIADO A	ESTADO	OBSERVACIONES	LOCALIZACION DEL ARCHIVO
AT-CVCC-024-E-017-22	18/7/2022	SUPERVISIÓN	**ADMINISTRATIVO**	Formato Facturación Electrónica	Consorcio Vias CC 2023	CONTESTADO	correo: envío de circular para tener en cuenta al momento de facturar, 18/7/22	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-018-22	21/7/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	APUs de OBRA EXTRA	Consorcio Vias CC 2023	CONTESTADO	correo: información de los ítems de obra extra que se generarían en las intervenciones de La Palma para compartir con el contratista, 21/7/22	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-019-22	22/7/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	Planos estructurales - Puente Pajarito		EN REVISIÓN	correo: entrega de diseños definitivos puente vehicular pajarito. 22/7/22	
AT-CVCC-024-E-020-22	25/7/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	CANAL ESCALONADO FRENTE A MURO		EN REVISIÓN	correo: informando la entrega de los diseños de canal escalonado punto 5, diseño de cunetas vía y box coulvert punto 3. 25/7/22	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-ECO-000-22	24/5/2022	CONTRATISTA	**TECNICO**	Levantamiento topografico quebrada puente pajarito 3309_JT PAJARITO # 2.dwg	Jorsay Rodriguez	EN REVISIÓN	correo: enviado por contratista, levantamiento topográfico de la quebrada. 24/5/22	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-ECO-001-22	27/5/2022	CONTRATISTA	**TECNICO**	Topografía Pajarito	SUPERVISOR	CONTESTADO	correo: levantamiento topográfico con las observaciones resueltas. 27/05/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-002-22	4/6/2022	CONTRATISTA	**TRANSITO**	PMT PAJARITO - LA LOMA	Consorcio Vias CC 2022	CONTESTADO	correo: envio y ajustes del PMT de san cristobal. 4/6/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-003-22	9/6/2022	CONTRATISTA	**TECNICO**	Coordenadas o ubicación de pilas reales	Supervisión de diseño.	EN REVISIÓN	correo:solicitan apoyo para marcación de pilas. 9/6/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-004-22	13/6/2022	CONTRATISTA	**TECNICO**	PUENTE DISEÑO PAJARITO_2.dwg	Supervisión de diseño.	EN REVISIÓN	correo: solicitando acompañamiento o verificación en campo para aprobación o recomendaciones de levantamiento topografico puente pajarito. 13/6/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-005-22	16/6/2022	CONTRATISTA	**TRANSITO**	PMT - PAJARITO - SAN JAVIER LA LOMA	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: adjunta observaciones realizada por la Secretaria de Movilidad, 16/6/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-006-22	17/6/2022	CONTRATISTA	**TECNICO**	PAJARITO DEFINITO PILAS.dwg	Supervisión de diseño.	EN REVISIÓN	correo: envío del diseño y planta por parte del contratista para aprobación por la SIF. 17/6/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-007-22	17/6/2022	CONTRATISTA	**TECNICO**	Actividades a partir del 21 junio	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: informando inicio de actividades de topografia en senderos. 17/6/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-008-22	21/6/2022	CONTRATISTA	**TRANSITO**	PMT SANTA ELENA	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: adjunto informe y los planos del PMT del corregimiento de Santa Elena. 21/6/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-009-22	28/6/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	Observaciones Componente Ambiental - Frente Naranjal	Consorcio Vias CC 2022	CONTESTADO	correo: En respuesta a las observaciones. enviadas el 28 de junio. 30/6/22	AT-024-02-03-01

CONSORCIO VIAS CC	**CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA**	**Código**	SGI-FOR-ADM-006	
		Fecha	06/07/2022	
		Versión	2	**Página 1 de 1**

PROYECTO:	**CONTRATO N 4600094153 INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN. PLAN VIAL RURAL**

CONSECUTIVO	FECHA DE RECIBIDO	QUIEN ENVIA	COMPONENTE	ASUNTO	ENVIADO A	ESTADO	OBSERVACIONES	LOCALIZACION DEL ARCHIVO
AT-CVCC-024-ECO-010-22	29/6/2022	CONTRATISTA	**TECNICO**	ENTREGA PROGRAMACION DE OBRA INICIAL	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: adjunto programación de obra inicial de acuerdo a los puntos autorizado por la SIF. 29/6/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-012-22	30/6/2022	CONTRATISTA	**TECNICO**	Notificación de trabajos topográficos	SUPERVISOR CONTRAT	EN REVISIÓN	correo: comunicando inician actividades Topograficas en la vereda la palma. 30/6/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-013-22	1/7/2022	CONTRATISTA	**SOCIAL**	Piezas de divulgacion plan vial rural, con ajustes acogidos	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo:remite piezas del plan de divulgación del proyecto con ajustes. 1 /7/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-014-22	1/7/2022	CONTRATISTA	**TRANSITO**	INFORME Y PLANOS ACTUALIZADOS SEGUN OBSERVACIONES MOVILIDAD	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: informe y planos actualizados PMT santa elena para revisión y aprobación interventoría	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-015-22	1/7/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	Informe Semanal Ambiental - 1 de julio	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo:relacion del informe semanal ambiental correspondiente del 21 de junio al 1 de julio de 2022. contratista. 1/7/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-016-22	4/7/2022	CONTRATISTA	**TECNICO**	lleno y compactación ejecutado -.sector naranjal	SUPERVISOR CONTRAT	EN REVISIÓN	correo: entrega de informe de estado en que queda frente de naranjal. 4/7/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-017-22	5/7/2022	CONTRATISTA	**SOCIAL**	Informe mensual área social	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: entrega del 1r informe mensual del área social, contratista. 5/7/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-018-22	5/7/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	Informe Ambiental Junio	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: entrega del 1r informe mensual del área ambiental, contratista. 5/7/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-019-22	7/7/2022	CONTRATISTA	**SOCIAL**	Ajustes informe mensual área social	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: entrega de ajuste informe mensual del área social, contratista. 7/7/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-020-22	7/7/2022	CONTRATISTA	**TRANSITO**	PMT SAN ANTONIO DE PRADO	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: Adjunto PMT para San Antonio de Prado. 7/7/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-021-22	7/7/2022	CONTRATISTA	**SOCIAL**	Informe social semanal y cronograma de actividades	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: remitir informe semanal y cuadro de gestión social actualizado, correspondientes a las actividades realizadas entre el 30 de junio y el 06 de julio de 2022. 7/7/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-E-021-22	11/7/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	SOLICITUD INFORMACION PLAN VIAL RURAL	Consorcio Vias CC 2022	CONTESTADO	correo: solicitud de información para elaboración de Informe Parcial de Supervisión No. 1. 11/7/22	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-ECO-021A-22	12/7/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	APROBACIÓN PMT SANTA ELENA	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo:Adjunto documentos de aprobación PMT Santa Elena. 12/7/22	AT-024-02-03-01

CONSORCIO VIAS CC	**CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA**	**Código**	SGI-FOR-ADM-006	
		Fecha	06/07/2022	
		Versión	2	**Página 1 de 1**

PROYECTO:	**CONTRATO N 4600094153 INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN. PLAN VIAL RURAL**

CONSECUTIVO	FECHA DE RECIBIDO	QUIEN ENVIA	COMPONENTE	ASUNTO	ENVIADO A	ESTADO	OBSERVACIONES	LOCALIZACION DEL ARCHIVO
AT-CVCC-024-ECO-021B-22	12/7/2022	CONTRATISTA	**SOCIAL**	Ajustes pasacalles	Consorcio Vias CC 2022		correo: Adjunto pasacalles con ajustes solicitados desde el área de comunicaciones de la Secretaría de Infraestructura Física, para su revisión y aprobación. 12/7/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-021C-22	12/7/2022	CONTRATISTA	**SOCIAL**	Ajustes al Plan de comunicación y divulgación PMT Santa Elena	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN		AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-E-022-22	13/7/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	Análisis de precios unitarios APU_Obra extra	Contratista	CONTESTADO	correo. Envío revisión de los APUs de OE con las observaciones por parte del profesional encargado de revisarlos y aprobarlos, para corrección pertinente por el contratista. 13/7/22	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-ECO-021D-22	13/7/2022	CONTRATISTA	**TRANSITO**	Fwd: PMT CORREGIMIENTO SAN ANTONIO DE PRADO	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: Adjunto el PMT del corregimiento de San Antonio de Prado para su revisión y aprobación. y el 14 de julio Adjunto radicación del PMT San Antonio de Prado. 13/7/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-021E-22	14/7/2022	CONTRATISTA	**SOCIAL**	Reporte semanal área social, y cronograma de actividades	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: adjunto informe semanal y cuadro de gestión social actualizado, del 07 al 13 de julio de 2022. 14/7/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-E-024-22	15/7/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	Propuesta sobre ancho vía punto 1 la palma	Contratista y Consorcio vias CC	CONTESTADO	correo: Envío de observaciones de la profesional Lily Yohana Grajales Gallego en cuanto a la propuesta enviada por el contratista el dia 9 de julio para el sobre ancho del punto N°1 de la Palma. 15/7/22	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-025-22	15/7/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	RV: Actas de Comité N.5 Plan Vial Rural	Consorcio Vias CC 2022	CONTESTADO	correo: no hay observaciones sobreel acta. 15/7/22	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-ECO-021F-22	15/7/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	Informe Semanal Ambiental al 9 de julio	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: adjunto informe ambiental correspondiente a la semana entre el 9 al 15 de julio de 2022. 15/7/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-022-22	15/7/2022	CONTRATISTA	**TECNICO**	PERFORACIONES LA PALMA	SUPERVISOR CONTRAT	CONTESTADO	correo: respuesta el 18 de julio informando lo solicitado respecto a las perforaciones de la palma. 15/7/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-023-22	18/7/2022	CONTRATISTA	**TECNICO**	Definición en senderos	SUPERVISOR CONTRAT	CONTESTADO	correo: solicita definición de obra a ejecutar en zona de alto riego , que se presenta socavación aledaño a vivienda. 18/7/22	AT-024-02-03-01

CONSORCIO VIAS CC	**CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA**	**Código**	SGI-FOR-ADM-006	
		Fecha	06/07/2022	
		Versión	2	**Página 1 de 1**

PROYECTO:	**CONTRATO N 4600094153 INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN. PLAN VIAL RURAL**

CONSECUTIVO	FECHA DE RECIBIDO	QUIEN ENVIA	COMPONENTE	ASUNTO	ENVIADO A	ESTADO	OBSERVACIONES	LOCALIZACION DEL ARCHIVO
AT-CVCC-024-ECO-024-22	18/7/2022	CONTRATISTA	**TRANSITO**	PMT CORREGIMIENTO ALTAVISTA	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: adjunto PMT de Altavista para revisión. 18/7/22	AT-024-02-03-01
GLO-MVC-011-2022	18/7/2022	CONTRATISTA	**TECNICO**	Solicitud de diseños definitivos para intervención en frente de trabajo “Puente Pajarito”.	Yeny Marcela Pérez Veláz	EN REVISIÓN		AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-025-22	19/7/2022	CONTRATISTA	**TECNICO**	PERFIL SAN CRITOBAL.dwg, PERFIL SAN CRITOBAL.dwg	SUPERVISOR CONTRAT	EN REVISIÓN	correo: envío de propuesta solicitada por la SIF, con levantamiento topográfico vereda la palma. 19/7/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-026-22	21/7/2022	CONTRATISTA	**TECNICO**	APUs de OBRA EXTRA	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: respuesta el 22 de julio donde el contratista solicita que le den información que le sirva para realizar presupuesto solicitado para la vereda la palma.21/7/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-027-22	21/7/2022	CONTRATISTA	**SOCIAL**	DIRECTORIO CORREGIMIENTOS DEL MUNCIPIO DE MEDELLIN	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: Adjunta directorio de los corregimientos y plan de comunicación y divulgación del PMT de San Antonio de Prado. 22/7/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-E-026-22	22/7/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	Planos estructurales - Puente Pajarito	Consorcio Vias CC 2022 y Contratista	EN REVISIÓN	correo: Envío de diseños definitivos del puente de Pajarito. 22/7/22	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-ECO-027A-22	22/7/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	Informe Semanal Ambiental al 22 de julio	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: informe ambiental correspondiente a la semana entre el 16 al 22 de julio de 2022. 22/7/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-E-027-22	22/7/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	PRESUPUESTO ADICION	Consorcio Vias CC 2022 y Contratista	EN REVISIÓN	correo: envío de formatos para elaborar presupuesto aproximado y poder armar la carpeta para la adición. 22/7/22	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-028-22	22/7/2022	SUPERVISIÓN	**AMBIENTAL**	Informe visita apoyo a la supervisión componente ambiental 14 de Julio 2022 _Plan Vial Rural	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: adjunto informe recorrido supervisión ambiental. 22/7/22	AT-024-02-01-01
RV_CORREO	22/7/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	Fwd: Informe visita apoyo a la supervisión componente ambiental 14 de Julio 2022 _Plan Vial Rural	Consorcio Vias CC 2022	CONTESTADO	correo: adjunta comunicado de la subsanación de las observaciones realizadas por la Supervisión ambiental durante el recorrido realizado el 14 de julio de 2022. 23/7/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-E-029-22	25/7/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	CANAL ESCALONADO FRENTE A MURO	Consorcio Vias CC 2022 y Contratista	EN REVISIÓN	correo: Envío de diseño del canal escalonado para construir en el punto 5 de La Palma, así como la geometría de las cunetas para la vía, 25/7/22	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-030-22	25/7/2022	SUPERVISIÓN	**ADMINISTRATIVO**	Formato Registro de Proveedores y Contratistas	Consorcio Vias CC 2022 y Contratista	EN REVISIÓN	correo: adjunto formulario paradiligenciar y quedar inscrito como proveedores en el Municipio de Medellin. 25/7/22	AT-024-02-01-01

CONSORCIO VIAS CC	**CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA**	**Código**	SGI-FOR-ADM-006	
		Fecha	06/07/2022	
		Versión	2	**Página 1 de 1**

PROYECTO:	**CONTRATO N 4600094153 INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN. PLAN VIAL RURAL**

CONSECUTIVO	FECHA DE RECIBIDO	QUIEN ENVIA	COMPONENTE	ASUNTO	ENVIADO A	ESTADO	OBSERVACIONES	LOCALIZACION DEL ARCHIVO
AT-CVCC-024-E-031-22	25/7/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	Observaciones La Palma - San Cristobal	Consorcio Vias CC 2022 y Contratista	EN REVISIÓN	correo: Envío correo de la Ingeniera Geóloga Lizeth Andrea Beltrán Jiménez, respecto a unas observaciones que hace en cuanto a la topografía y las perforaciones realizadas por el contratista de obra para diferentes sitios del sector La Palma, corregimiento de San Cristóbal. 25/7/22	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-ECO-027B-22	25/7/2022	CONTRATISTA	**TECNICO**	PROYECCION EN EXCELL	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN		AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-027C-22	26/7/2022	CONTRATISTA	**TECNICO**	ACTIVIDADES EN VEREDA LA PALMA	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: envio de resumen de lo realizado en vereda la palma. 26/7/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-027D-22	28/7/2022	CONTRATISTA	**TECNICO**	Puntos para pavimento aprobados	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: adjunto puntos para pavimento con fibra. 28/7/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-027E-22	28/7/2022	CONTRATISTA	**SOCIAL**	Reporte semanal área social, y cronograma de actividades	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: adjunto informe semanal y cuadro de gestión social actualizado, del 21 al 27 de julio de 2022. 28/7/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-027F-22	28/7/2022	CONTRATISTA	**SST**	Re: Documentación pileros	Consorcio Vias CC 2022	CONTESTADO	correo: adjunto documentación de pileros . 26/7/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-027G-22	28/7/2022	CONTRATISTA	**SST**	Fwd: DOCUMENTACION PAVIMENTAR	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: adjunto documentación de pavimentar . 26/7/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-027H-22	28/7/2022	CONTRATISTA	**TECNICO**	3313_JT PERFILES QBDA VEREDA LA PALMA.dwg	SUPERVISOR CONTRAT	CONTESTADO	correo: envío de levantamientos topográficos Sector la palma punto # 3 , boxculvert. Y quebrada. envia el 25 de julio.	AT-024-02-03-01
GLO-MVC-012-2022	28/7/2022	CONTRATISTA	**ADMINISTRATIVO**	Entrega APU Obra Extra 01 a 05 conciliados con interventoría y SIF	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN		AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-E-032-22	28/7/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	3313_JT PERFILES QBDA VEREDA LA PALMA.dwg	Contratista y Consorcio vias CC	CONTESTADO	correo: solicitando atender lo antes posible la información requerida de levantamiento topografico para ajustar los diseños a realizar en la vereda La Palma. 28/7/22	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-ECO-027I-22	29/7/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	Informe Semanal Ambiental al 29 de julio	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: adjunto informe ambiental correspondiente a la semana entre el 23 al 29 de julio de 2022. 29/7/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-E-033-22	29/7/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PENDIENTES	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: solicitando información pendiente. 29/7/22	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-ECO-027J-22	29/7/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	Solicitud de documentación - Actividades de pavimentación.	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: relación de información solicitada por interventoria el 26 de julio. 29/7/22	AT-024-02-03-01
RV_13julio	30/7/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	Respuesta correo 13 de julio de 2022	Consorcio Vias CC 2022	CONTESTADO		AT-024-02-03-01

CONSORCIO VIAS CC	**CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA**	**Código**	SGI-FOR-ADM-006	
		Fecha	06/07/2022	
		Versión	2	**Página 1 de 1**

PROYECTO:	**CONTRATO N 4600094153 INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN. PLAN VIAL RURAL**

CONSECUTIVO	FECHA DE RECIBIDO	QUIEN ENVIA	COMPONENTE	ASUNTO	ENVIADO A	ESTADO	OBSERVACIONES	LOCALIZACION DEL ARCHIVO
RV_23dejulio	30/7/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	Respuesta correo 23 de julio de 2022	Consorcio Vias CC 2022	CONTESTADO		AT-024-02-03-01
RV_CORREO26DEJULIO	30/7/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	Fwd: OFICIO AT-CVCC-024-S-016-22	Consorcio Vias CC 2022	CONTESTADO		AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-E-034-22	1/8/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	Analisis de precios unitarios_Obra extra Plan Vial Rural		CONTESTADO	correo: donde la interventoria hace el puente entre la SIF area de presupuestos y el contratista para definir y llegar a un acuerdo final de APUs presentados por el contratista. 1/08/22	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-035-22	1/8/2022	SUPERVISIÓN	**ADMINISTRATIVO**	Documentos Contratista para adición	Consorcio Vias CC 2022	CONTESTADO	correo: la supervición informa que la solicitud de cambio de representación legal es a través de comunicado, 1/8/22	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-ECO-028-22	1/8/2022	CONTRATISTA	**TECNICO**	Analisis de precios unitarios_Obra extra Plan Vial Rural	Consorcio Vias CC 2022	CONTESTADO	correo: respuesta 1 de agosto contratista acepta observaciones a los apu de obra extra 01 y 04, y adjunta el analisis del subproducto mortero 1:3	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-029-22	2/8/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	APROBACIÓN PODA SANTA ELENA	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: adjunta orden de policia aprobando la poda de arboreos. 2/8/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-E-036-22	2/8/2022	SUPERVISIÓN	**ADMINISTRATIVO**	FORMATOS DOCUMENTOS OBRA EXTRA	Consorcio Vias CC 2023	EN REVISIÓN	correo: supervisor hace entrega de los formatos para solicitud de ora extra. 2/8/22	AT-024-02-01-01
GLO-MVC-013-2022	2/8/2022	CONTRATISTA	**ADMINISTRATIVO**	Información del cambio de Representante Legal	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN		AT-024-02-03-01
GLO-MVC-014-2022	3/8/2022	CONTRATISTA	**TECNICO**	Precios pactados de obra extra del 1 al 5	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN		AT-024-02-03-01
GLO-MVC-015-2022	3/8/2022	CONTRATISTA	**TECNICO**	Solicitud de modificación de contrato– Inclusión de Items de obra extra	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN		AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-E-037-22	3/8/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	Análisis de precios unitarios. Obra extra Plan Vial Rural	Consorcio Vias CC 2023	EN REVISIÓN	correo: aprobación definitivas a los APUs de obra extra presentados por el contratista, 3/8/22	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-038-22	3/8/2022	SUPERVISIÓN AMBIENTAL	**AMBIENTAL**	Informe visita apoyo a la supervisión componente ambiental 02 de agosto 2022 _Plan Vial Rural	SUPERVISOR CONTRAT	EN REVISIÓN	correo: informe recorrido supervición 3/8/22.	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-039-22	3/8/2022	SUPERVISIÓN SOCIAL	**SOCIAL**	Información prioritaria .	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: información sobre generar y actualizar las bases de datos de los actores involucrados en el proceso y ejecución de los proyectos. 3/8/22	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-ECO-030-22	3/8/2022	CONTRATISTA	**SOCIAL**	INFORME SOCIAL JULIO	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: Adjunto informe mensual del área social con sus respectivos anexos, correspondiente entre el 01 y el 31 de julio de 2022. 3/8/22	AT-024-02-03-01

CONSORCIO VIAS CC	**CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA**	**Código**	SGI-FOR-ADM-006	
		Fecha	06/07/2022	
		Versión	2	**Página 1 de 1**

PROYECTO:	**CONTRATO N 4600094153 INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN. PLAN VIAL RURAL**

CONSECUTIVO	FECHA DE RECIBIDO	QUIEN ENVIA	COMPONENTE	ASUNTO	ENVIADO A	ESTADO	OBSERVACIONES	LOCALIZACION DEL ARCHIVO
AT-CVCC-024-ECO-031-22	3/8/2022	CONTRATISTA	**TECNICO**	ACTA DE OBRA 1	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: adjunto acta de obra numero 1 con sus respectivas memorias de obra civil. 3/8/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-032-22	3/8/2022	CONTRATISTA	**SOCIAL**	memorias y acta social 1	Consorcio Vias CC 2022	CONTESTADO	correo: adjunto memorias del componente social para el acta de costos presentada por el contratista. 3/8/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-033-22	3/8/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	memorias ambientales	Consorcio Vias CC 2022	CONTESTADO	correo: anexo acta y memorias ambientales del acta 1	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-E-040-22	4/8/2022	SUPERVISIÓN	**ADMINISTRATIVO**	Cuadro de Información Plan Vial Rural	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: adjunto cuadro de información para Unidad de Comunicaciones Secretaría de Infraestructura Física de Medellín. 4/8/22	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-ECO-034-22	5/8/2022	CONTRATISTA	**SOCIAL**	Plan de comunicaciones San Antonio de Prado, con ajustes acogidos	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: adjunta Plan de Comunicaciones a implementar en San Antonio de Prado. 5/8/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-035-22	5/8/2022	CONTRATISTA	**SOCIAL**	Cuadro de gestión social en obra, formato actualizado	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo:Adjunto cuadro de Gestión Social en Obra del mes de Julio de 2022, contratista. 5/8/22.	AT-024-02-03-01
GLO-MVC-016-2022	5/8/2022	CONTRATISTA	**ADMINISTRATIVO**	PLAN DE PAGOS CONTRATO 4600094137	SUPERVISOR CONTRAT	EN REVISIÓN		AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-036-22	5/8/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	INFORME AMBIENTAL JULIO	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: envios información contratista para informe mensual N°2. 5/8/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-037-22	5/8/2022	CONTRATISTA	**SOCIAL**	Reporte semanal y cronograma de actividades componente social	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: remitir informe semanal y cuadro de gestión social actividades realizadas entre el 28 de julio y el 04 de agosto de 2022 contratista. 5/8/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-038-22	5/8/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	INFORME COMPLETO JULIO AMBIENTAL	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: informe ambiental completo correspondiente al mes de julio de 2022. 5/8/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-E-041-22	5/8/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	Actas de Comité N.6 Plan Vial Rural	Consorcio Vias CC 2022	CONTESTADO	correo. respuesta Envío de Acta de Comité No. 6 con algunas observaciones en cuanto al componente técnico. 5/8/22	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-042-22	8/8/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	SEGUIMIENTO A LA EJECUCION MENSUAL	Consorcio Vias CC 2022	CONTESTADO	correo: Envío de formato SEGUIMIENTO A LA EJECUCION MENSUAL. 8/8/22	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-ECO-039-22	8/8/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	Informe Semanal Ambiental al 6 de agosto	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: adjunto informe ambiental correspondiente a la semana entre el 30 de julio al 6 de agosto de 2022.	AT-024-02-03-01

CONSORCIO VIAS CC	**CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA**	**Código**	SGI-FOR-ADM-006	
		Fecha	06/07/2022	
		Versión	2	**Página 1 de 1**

PROYECTO:	**CONTRATO N 4600094153 INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN. PLAN VIAL RURAL**

CONSECUTIVO	FECHA DE RECIBIDO	QUIEN ENVIA	COMPONENTE	ASUNTO	ENVIADO A	ESTADO	OBSERVACIONES	LOCALIZACION DEL ARCHIVO
RV_CORREO04 AGOSTO	8/8/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	Actividades finales en frente de obra - Barro Blanco	Consorcio Vias CC 2022	CONTESTADO	RV_CORREO04 AGOSTO. Respuesta a correo observaciones echas 4 de agosto por interventoría.	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-040-22	8/8/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	APROBACIÓN PMT SAN ANTONIO DE PRADO	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: relacion de la aprobación del PMT correspondiente al corregimiento de San Antonio de Prado. 8/8/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-041-22	8/8/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	PMT ALTAVISTA	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: relacion de la aprobación del PMT correspondiente al coreegimiento de Altavista solo del tramo de los miradores. Los demás tramos se harán las correcciones pertinentes.8/8/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-042-22	8/8/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	Observaciones Componente Ambiental - Recorrido 01_08_2022 Frente Boqueron	Consorcio Vias CC 2022	CONTESTADO	correo: respuesta el 8 de agosto a las observaciones realizadas por interventoría el 2/8/22.	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-043-22	8/8/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	Solicitud de reporte de residuos de excavación y demolición mes de julio	Consorcio Vias CC 2022	CONTESTADO	correo: respuesta a requerimiento realizado por interventoria se adjunta el informe completo y subsanado. 8/8/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-E-043-22	9/8/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	INFORMACION X INF. PARCIAL SUPERVISIÓN	Consorcio Vias CC 2022	CONTESTADO	correo: solicitud de información para elaborar Informe Parcial de Supervisión No. 2, 9/8/22	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-ECO-044-22	9/8/2022	CONTRATISTA	**SOCIAL**	SOPORTES SOCIALES PMT PENDIENTES SAN CRISTÓBAL Y ALTAVISTA	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: adjuntando soportes sociales requeridos para la radicación de los PMT de los frentes de trabajo "El Llano" y "La Palma" Y "belencito corazón" san cristobal. 9/8/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-045-22	9/8/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	RADICADO PRORROGA N°1 PMT SANTA ELENA - SAN ANTONIO DE PRADO	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: adjuntan los radicados con la petición de prórrogas para los frentes de obra Santa Elena y San Antonio de Prado. 9/8/22	AT-024-02-03-01
GLO-MVC-017-2022	10/8/2022	CONTRATISTA	**TECNICO**	FORMULA DE REAJUSTE	SUPERVISOR CONTRAT	EN REVISIÓN		AT-024-02-03-01
GLO-MVC-018-2022	10/8/2022	CONTRATISTA	**OTRO**	SOLICITUD PRESTAMO DE PUENTE PROVISIONAL	SUPERVISOR CONTRAT	EN REVISIÓN		AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-046-22	10/8/2022	CONTRATISTA	**TECNICO**	ESTUDIO DE SUELOS SAN CRISTOBAL	SUPERVISOR CONTRAT	CONTESTADO	correo: enviando 8 de agosto informe de estudios de suelo en las perforaciones de la palma. 10/8/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-E-044-22	10/8/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	ESTUDIO DE SUELOS SAN CRISTOBAL	Contratista	CONTESTADO	correo: Remite observaciones hechas por la profesional Andrea Beltrán respecto al Informe de estudio de suelos enviado por contratista para el sitio de La Palma, 10/8/22	AT-024-02-01-01

CONSORCIO VIAS CC	**CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA**	**Código**	SGI-FOR-ADM-006	
		Fecha	06/07/2022	
		Versión	2	**Página 1 de 1**

PROYECTO:	**CONTRATO N 4600094153 INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN. PLAN VIAL RURAL**

CONSECUTIVO	FECHA DE RECIBIDO	QUIEN ENVIA	COMPONENTE	ASUNTO	ENVIADO A	ESTADO	OBSERVACIONES	LOCALIZACION DEL ARCHIVO
AT-CVCC-024-ECO-047-22	11/8/2022	CONTRATISTA	**TECNICO**	Definición de ganchos para pilas	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: Se solicita más detalladamente la definición del acero de las pilas de puente pajarito y diseños en autocad. 11/8/22	AT-024-02-03-01
GLO-MVC-015-2022	11/8/2022	CONTRATISTA	**TECNICO**	Solicitud de modificación de contrato– Inclusión de Items de obra extra_ Corrección	Consorcio Vias CC 2022	CONTESTADO	contratista realiza corrección al comunicado enviado el 3/8/22. y es contestado con AT-CVCC-024-S-023-22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-048-22	11/8/2022	CONTRATISTA	**SOCIAL**	Re: Observaciones informe Mensual	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: remite observaciones del supervisor social realizadas al informe mensual de junio. 11/8/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-049-22	11/8/2022	CONTRATISTA	**OTRO**	NUEVAS VOLQUETAS CORREGIMIENTOS	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: relación de nuevas volquetas para los frentes de obra. 11/8/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-050-22	12/8/2022	CONTRATISTA	**TRANSITO**	Prórrogas PMT	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: Adjunto prórrogas para los PMT Santa Elena y San Antonio de Prado. 12/8/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-051-22	12/8/2022	CONTRATISTA	**SOCIAL**	Reporte semanal, cuadro de gestión social y cronograma de actividades sociales.	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: adjunto informe semanal y cuadro de gestión social actualizado de la semana del 15 al 20 de agosto. 12/8/22	AT-024-02-03-01
GLO-MVC-019-2022	12/8/2022	CONTRATISTA	**TECNICO**	DEFINICION INTERVENCION PUNTO DE OBRA BOQUERON	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN		AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-051-22	13/8/2022	CONTRATISTA	**TECNICO**	PROGRAMACION DE OBRA CON TRAMOS DEFINIDOS	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: adjunto programación de obra de acuerdo con los tramos definidos a la fecha. 13/8/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-052-22	15/8/2022	CONTRATISTA	**TECNICO**	ANEXO ENSAYOS DE LABORATORIO, INFORME GEOTECNICO ESTABILIZACIÓN TALUD, SAN CRISTOBAL.	SUPERVISOR CONTRAT	EN REVISIÓN	correo: adjunto estudio de suelos con correcciones solicitadas de la palma y anexos de laboratorio. 15/8/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-053-22	15/8/2022	CONTRATISTA	**TECNICO**	LEVANTAMIENTO DERRUMBE VIA PALMAS -SAN CRITOBAL	SUPERVISOR CONTRAT	EN REVISIÓN	correo: Adjunto levantamiento topográfico Sector los mayas (Punto # 5) con el área solicitada.15/8/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-E-045-22	16/8/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	INFORMES SEMANALES	Consorcio Vias CC 2022	CONTESTADO	correo: solicitando información sobre observación respecto al reporte de generación de empleos. respondido 16/8/22	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-ECO-054-22	16/8/2022	CONTRATISTA	**SOCIAL**	Bases de datos actores sociales	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: adjunto base de datos de actores sociales, solicitada por el supervisor social del contrato. 16/8/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-E-046-22	17/8/2022	SUPERVISIÓN	**OTRO**	AUTORIZACION PUENTE METÁLICO	Contratista	EN REVISIÓN	correo: informan que se puede retirar el puente metalico de las instalaciones de la planta de La Iguaná. 17/8/22	AT-024-02-01-01

CONSORCIO VIAS CC	**CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA**	**Código**	SGI-FOR-ADM-006	
		Fecha	06/07/2022	
		Versión	2	**Página 1 de 1**

PROYECTO:	**CONTRATO N 4600094153 INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN. PLAN VIAL RURAL**

CONSECUTIVO	FECHA DE RECIBIDO	QUIEN ENVIA	COMPONENTE	ASUNTO	ENVIADO A	ESTADO	OBSERVACIONES	LOCALIZACION DEL ARCHIVO
AT-CVCC-024-E-047-22	17/8/2022	SUPERVISIÓN	**ADMINISTRATIVO**	Solicitud MOD1 4600094137 SIF	Consorcio Vias CC 2022	CONTESTADO	correo: remitido para hacer corrección a oficio AT-CVCC-024-S-019-22, el cual se corrige y se envia mismo día. 17/8/22	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-048-22	18/8/2022	SUPERVISIÓN	**ADMINISTRATIVO**	ACTA N.2 DE INTERVENTORÍA PLAN VIARL RURAL_4600094153	Consorcio Vias CC 2022	CONTESTADO	correo: observaciones realizadas por la SIF referente al acta de pago N°2. enviada el 10 de agosto. 18/8/22	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-ECO-055-22	18/8/2022	CONTRATISTA	**SOCIAL**	Reporte semanal, cuadro de gestión social y cronograma de actividades sociales.	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: adjunto informe semanal y cuadro de gestión social actualizado de la semana del 22 al 27 de agosto. 18/8/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-056-22	19/8/2022	CONTRATISTA	**SOCIAL**	Circular actividades constructivas - Robledo Pajarito.	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: adjunto circular informativa sobre las actividades constructivas adelantadas a la fecha en el frente de trabajo "Robledo Pajarito" para revisón y aprobación. 19/8/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-057-22	19/8/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	Informe Semanal Ambiental al 19 de agosto	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: adjunto informe ambiental del 12 al 19 de agosto. 19/8/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-058-22	22/8/2022	CONTRATISTA	**TECNICO**	ANEXO 1 MEMORIA OBRA CIVIL	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: adjunto anexo memoria de obra civil. 22/8/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-059-22	22/8/2022	CONTRATISTA	**ADMINISTRATIVO**	ANEXOS PARA ACTA No. 1	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: Adjunto anexos para el acta de obra No 1 (Memorias ambientales, certificado parafiscales, planillas profesionales, trabajadores y soportes de pago de salud). 22/8/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-060-22	22/8/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	Anexo 3 memoria ambientales	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: adjunto anexos memorias de calculo actividades ambientales para el acta 1. 22/8/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-061-22	22/8/2022	CONTRATISTA	**SOCIAL**	ANEXO 4 ACTA Y MEMORIAS AREA SOCIAL Y FACTURA DE COBRO COMPONENTE SOCIOAMBIENTALES	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: adjunto anexos para Acta 1 (Memoria, acta y facturar socioambiental). 22/8/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-E-049-22	22/8/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	Informe excavación Pila N.6 Puente Pajarito	Consorcio Vias CC 2022	CONTESTADO	correo: el ing CARLOS GIOVANNI PEREZ autoriza el armado y vaciado en cota. 22/8/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-062-22	22/8/2022	CONTRATISTA	**SOCIAL**	Piezas cartelera	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: adjunto piezas a publicar en cartelera informativa de frente de trabajo "Puente Pajarito". 22/8/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-E-050-22	23/8/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	Definición de ganchos para Pilas	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: reenvía correo de la diseñadora respecto a las dudas que se tenían con los ganchos de las pilas de Pajarito. 23/8/22	AT-024-02-01-01

CONSORCIO VIAS CC	**CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA**	**Código**	SGI-FOR-ADM-006	
		Fecha	06/07/2022	
		Versión	2	**Página 1 de 1**

PROYECTO:	**CONTRATO N 4600094153 INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN. PLAN VIAL RURAL**

CONSECUTIVO	FECHA DE RECIBIDO	QUIEN ENVIA	COMPONENTE	ASUNTO	ENVIADO A	ESTADO	OBSERVACIONES	LOCALIZACION DEL ARCHIVO
AT-CVCC-024-E-050-22	23/8/2022	SUPERVISIÓN	**OTRO**	Citacion infraestructura (JAL ALTAVISTA)	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: Adjunto cuestionario para diligenciar lo de alcance, 23/8/22	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-051-22	23/8/2022	SUPERVISIÓN	**ADMINISTRATIVO**	DOCUMENTOS ARCHIVO OBRA	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: adjunto de formatos de obra a tener en cuenta. 23/8/22	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-052-22	23/8/2022	SUPERVISIÓN	**ADMINISTRATIVO**	DOCUMENTOS ARCHIVO INTERVENTORIA	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: adjunto de formatos de interventoría a tener en cuenta. 23/8/22	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-053-22	23/8/2022	SUPERVISIÓN	**ADMINISTRATIVO**	MODIFICACION OBRA EXTRA	Consorcio Vias CC 2022 y contratista	EN REVISIÓN	correo: Adjunto Minuta de Modificación de Obra Extra	
AT-CVCC-024-ECO-063-22	23/8/2022	CONTRATISTA	**TECNICO**	Estudio de suelos los mayas (vereda la palma)	SUPERVISOR CONTRAT	EN REVISIÓN	correo: Adjunto ensayos Laboratorio.pdf, Estudios de suelos pdf. Sector los mayas a profundidad de 20ml..24/8/22	AT-024-02-03-01
RV_CORREO16DEAGOSTO	24/8/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	Fwd: AT-CVCC-024-S-027-22 Respuesta a observaciones componente técnico y ambiental en los frentes de trabajo	SUPERVISOR CONTRATO y Consorcio Vias CC	CONTESTADO	correo: En respuesta al oficio del 16 de agosto, desde el componente ambiental. 24/8/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-E-054-22	25/8/2022	SUPERVISIÓN	**ADMINISTRATIVO**	SECOP II – Modificación a contrato aprobada	Consorcio Vias CC 2022 y contratista	EN REVISIÓN	correo: informa La modificación del Contrato CO1.CTRMOD.9044711, relacionado para el Contrato 4600094137, el Proceso 70007287 (Fase de Selección (Presentación de ofertas)) fue aprobada. 25/8/22	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-ECO-064-22	25/8/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	Documentos Minicargador	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: envio de documentación minicargador para pajarito 25/8/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-065-22	25/8/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	VOLQUETA PAJARITO	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: envio de documentación volqueta que ingresa al frente de obra Pajarito TAW100. 25/8/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-066-22	25/8/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	Vibrocompactador 2	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: Relacion de maquinaria para el frente Boqueron. 25/8/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-067-22	26/8/2022	CONTRATISTA	**SOCIAL**	PLAN COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN PMT EL LLANO Y SAN PEDRO	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: adjunto el Plan de Divulgación para los Planes de Manejo de Tránsito a implementar en los frentes de trabajo de las veredas "El Llano" y "San Pedro", corregimiento de San Cristóbal. 26/8/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-068-22	26/8/2022	CONTRATISTA	**SOCIAL**	Reporte semanal y cronograma de actividades, área social	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: adjunto informe social del 19 al 25 de agosto de 2022. 26/8/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-069-22	26/8/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	Informe Semanal Ambiental al 26 de agosto	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: adjunto informe ambiental correspondiente a la semana entre el 20 y el 26 de agosto de 2022. 26/8/22	AT-024-02-03-01

CONSORCIO VIAS CC	**CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA**	**Código**	SGI-FOR-ADM-006	
		Fecha	06/07/2022	
		Versión	2	**Página 1 de 1**

PROYECTO:	**CONTRATO N 4600094153 INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN. PLAN VIAL RURAL**

CONSECUTIVO	FECHA DE RECIBIDO	QUIEN ENVIA	COMPONENTE	ASUNTO	ENVIADO A	ESTADO	OBSERVACIONES	LOCALIZACION DEL ARCHIVO
GLO-MVC-020-2022	29/8/2022	CONTRATISTA	**TECNICO**	Diseño Solucion Vereda La Palma	SUPERVISOR CONTRATO y Consorcio Vias CC	EN REVISIÓN	adjunto propuesta para los diseños del sector la palma con la respectiva descripción de los trabajos a realizar	AT-024-02-03-01
GLO-MVC-021-2022	30/8/2022	CONTRATISTA	**TECNICO**	Entrega APU Obra Extra 06 a 24	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	adjunto apu de obra extra de la 6 a la 24 con las correcciones solicitadas	AT-024-02-03-01
GLO-MVC-022-2022	30/8/2022	CONTRATISTA	**TECNICO**	Entrega Proyección	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	adjunto proyección de obra incluyendo los tramos que fueron incluidos y que no hacían parte del proyecto original (Puente pajarito. Boquerón, Naranjal, Los maya (Vereda La Palma), teniendo en cuenta los apu de obra extra a la espera que sean aprobados por la Slf.	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-070-22	30/8/2022	CONTRATISTA	**SOCIAL**	ACTA RECORRIDO TRAVESÍAS	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: adjunto acta levantada durante el recorrido del 29 de agosto en el frente de trabajo "Travesías" del corregimiento de San Cristóbal. 30/8/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-E-055-22	31/8/2022	SUPERVISIÓN	**ADMINISTRATIVO**	INFORME A LA EJECUCION MENSUAL	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: informando la entrega del Informe de Seguimiento a la Ejecución Mensual con corte a 31 de agosto, a más tardar este próximo viernes 2 de septiembre. 31/8/22	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-ECO-071-22	31/8/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	Infome word-Mensual Agosto Ambiental	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: adjunto informe correspondiente al mes de agosto del área ambiental. 31/8/22.	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-072-22	31/8/2022	CONTRATISTA	**SST**	Excavadora Boqueron	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: adjunto documentación de la miniexcavadora para frente de obra Boqueron. 31/8/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-E-056-22	1/9/2022	SUPERVISIÓN	**ADMINISTRATIVO**	Apoyo a Comunicaciones	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: adjunto archivo del Grupo de Comunicaciones de la Secretaría, para actualizar y poderl suministrar información real a 31 de agosto, 1/9/22	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-057-22	1/9/2022	SUPERVISIÓN	**ADMINISTRATIVO**	CARTA ACEPTACION CONTRATISTA	Consorcio Vias CC 2022 y contratista	EN REVISIÓN	Envío carta con la solicitud de adición y ampliación al contrato 4600094137 de 2022 para su contestación	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-058-22	2/9/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	OBSERVACIONES APUs OBRA EXTRA PLAN VIAL RURAL	Consorcio Vias CC 2022 y contratista	EN REVISIÓN	correo: reenvio de correo de los APUs con las observaciones hechas por parte del profesional Mario Andrés Vanegas.2/9/22	AT-024-02-01-01

CONSORCIO VIAS CC	**CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA**	**Código**	SGI-FOR-ADM-006	
		Fecha	06/07/2022	
		Versión	2	**Página 1 de 1**

PROYECTO:	**CONTRATO N 4600094153 INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN. PLAN VIAL RURAL**

CONSECUTIVO	FECHA DE RECIBIDO	QUIEN ENVIA	COMPONENTE	ASUNTO	ENVIADO A	ESTADO	OBSERVACIONES	LOCALIZACION DEL ARCHIVO
AT-CVCC-024-ECO-073-22	2/9/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	Informe Ambiental Agosto	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: adjunto anexos informe mensual agosto. 2/9/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-074-22	2/9/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	Informe Semanal Ambiental al 2 de septiembre	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: adjunto informe ambiental del 27 de agosto al 2 de septiembre de 2022. 2/9/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-075-22	2/9/2022	CONTRATISTA	**TECNICO**	Actividades a ejecutar el 03 de septiembre del 2022	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: informa actividades que se realizarán el 03 de septiembre en los frentes de obra. 2/9/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-076-22	3/9/2022	CONTRATISTA	**SOCIAL**	INFORME MENSUAL ÁREA SOCIAL AGOSTO	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo; Adjunto informe mensual del componente social con sus respectivos anexos. 3/9/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-E-059-22	5/9/2022	SUPERVISIÓN	**ADMINISTRATIVO**	Hoja de vidas para revisión y aprobación	Consorcio Vias CC 2022	CONTESTADO	correo: con apruebación de profesionales propuestos por interventoría.	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-060-22	5/9/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	Observaciones informe de interventoria contrato 4600094153 de 2022	Consorcio Vias CC 2022	CONTESTADO	correo: Remito informe de interventoría N° 2 con algunas revisiones y observaciones para que sean ajustadas. 5/9/22	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-ECO-077-22	5/9/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	Informe Ambiental Agosto	Consorcio Vias CC 2022	CONTESTADO	correo: Relaciono el informe de agosto con las correcciones solicitadas.5/9/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-078-22	5/9/2022	CONTRATISTA	**SOCIAL**	Informe social agosto con ajustes acogidos	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: adjunto informe social del mes de agosto, con las sugerencias acogidas. 5/9/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-E-061-22	6/9/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	Exploración geotécnica Los Mayas	Consorcio Vias CC 2022 y contratista	EN REVISIÓN	correo: re envío correo del especialista en Geotecnia respecto a las perforaciones hechas por el contratista en el sitio Los Maya, 6/9/22	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-062-22	6/9/2022	SUPERVISIÓN	**AMBIENTAL**	Informe mensual Interventoría PVR - Agosto 2022	Consorcio Vias CC 2022	CONTESTADO	correo: aprobación del informe mensual de interventoría y se realizan algunas observaciones para ser ajustadas. 6/9/22	AT-024-02-01-02
AT-CVCC-024-ECO-079-22	6/9/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	APROBACIÓN PMT PANTANILLO Y TRAMO NUEVO SAN ANTO	Precios pactados de obra	EN REVISIÓN	correo: adjunto aprobaciones de PMT. 6/9/22	AT-024-02-03-01
GLO-MVC-024-2022	6/9/2022	CONTRATISTA	**TECNICO**	Precios pactados de obra extra del 6 al 28 para tramite de adición del contrato	Yeny Marcela Perez	EN REVISIÓN		AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-080-22	6/9/2022	CONTRATISTA	**TECNICO**	PROYECCION DE LA OBRA PARA SOLICITUD DE ADICION	Consorcio Vias CC 2022 y supervisión	EN REVISIÓN	correo: adjunto la proyección de obra con los tramos definidos. 7/9/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-E-063-22	7/9/2022	SUPERVISIÓN	**ADMINISTRATIVO**	CARTA MODELO INTERVENTORIA	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: adjunto carta modelo para Prorroga y Adición Contrato de Interventoría	AT-024-02-01-01

CONSORCIO VIAS CC	**CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA**	**Código**	SGI-FOR-ADM-006	
		Fecha	06/07/2022	
		Versión	2	**Página 1 de 1**

PROYECTO:	**CONTRATO N 4600094153 INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN. PLAN VIAL RURAL**

CONSECUTIVO	FECHA DE RECIBIDO	QUIEN ENVIA	COMPONENTE	ASUNTO	ENVIADO A	ESTADO	OBSERVACIONES	LOCALIZACION DEL ARCHIVO
AT-CVCC-024-ECO-081-22	7/9/2022	CONTRATISTA	**ADMINISTRATIVO**	Fwd: Documentos personal San Antonio	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo:Relacion de maquinas y personal para San Antonio de Prado.	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-082-22	7/9/2022	CONTRATISTA	**ADMINISTRATIVO**	Fwd: Documentos Brainer Rodríguez - Pare-siga	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: documentos, certificación de pare-siga	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-083-22	7/9/2022	CONTRATISTA	**TECNICO**	Presupuesto solo adicion	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: adjunto presupuesto solo del valor a adicionar.. 7/9/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-084-22	7/9/2022	CONTRATISTA	**ADMINISTRATIVO**	Fwd: Documentos volquetas y equipos restantes	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: 2do paquete de documentos de maquinaria y volquetas para San Antonio de Prado. 7/9/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-085-22	7/9/2022	CONTRATISTA	**TRANSITO**	SEÑALES RESALTOS SANTA ELENA				
AT-CVCC-024-ECO-086-22	7/9/2022	CONTRATISTA	**ADMINISTRATIVO**	OTRAS VOLQUETAS SAN ANTONIO DE PRADO				
AT-CVCC-024-ECO-087-22	8/9/2022	CONTRATISTA	**TECNICO**	APU OBRA EXTRA 6 AL 28 CONVENIDOS EN EXCELL INCLUYE CANTIDADES	Supervisión y Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: adjunto analisis de precios de obra extra convenidos incluyendo cantidades de obra aproximadas 8/9/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-088-22	8/9/2022	CONTRATISTA	**SOCIAL**	Reporte semanal y cronograma de actividades, área social	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: informe social correspondiente a la semana del 02 al 08 de septiembre de 2022, 8/9/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-E-064-22	8/9/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	SOLICITUD TOPOGRAFIA SECTOR LOS MAYA	Consorcio Vias CC 2022 y contratista	EN REVISIÓN	corre:remite correo de la profesional Katherine Patiño, de la Secretaría de Infraestructura Física, con una solicitud para el sector Los Maya vereda La Palma, del corregimiento de San Cristóbal. 8/9/22	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-065-22	9/9/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	Cotización Lámina de Acero para Boquerón	Consorcio Vias CC 2022 y contratista	EN REVISIÓN	correo: remite correo de prof presupuestos de las SIF con respecto a las observaciones echas a los APUS de contratista. 7/9/22	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-ECO-089-22	9/9/2022	CONTRATISTA	**TECNICO**	APU INCLUYE MODIFICACIONES SOLICITADAS	Supervisión y Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: envio de apus con modificaciones solicitadas por la SIF. 9/9/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-090-22	9/9/2022	CONTRATISTA	**ADMINISTRATIVO**	ANTECEDENTES GLOBAL Y REPRESENTANTE LEGAL	Supervisión y Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: adjunto antecedentes de la empresa y el representante legal de global. 9/9/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-091-22	9/9/2022	CONTRATISTA	**TECNICO**	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y COTIZACIONES	Supervisión y Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: adjunto apu con las correcciones y los soportes completo. 9/9/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-E-066-22	9/9/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y COTIZACIONES	Consorcio Vias CC 2022 y contratista	CONTESTADO	correo: Se envían los APUs de OE avalados por el equipo de presupuestos con sus respectivas firmas. 9/9/22	AT-024-02-01-01

CONSORCIO VIAS CC	**CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA**	**Código**	SGI-FOR-ADM-006	
		Fecha	06/07/2022	
		Versión	2	**Página 1 de 1**

PROYECTO:	**CONTRATO N 4600094153 INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN. PLAN VIAL RURAL**

CONSECUTIVO	FECHA DE RECIBIDO	QUIEN ENVIA	COMPONENTE	ASUNTO	ENVIADO A	ESTADO	OBSERVACIONES	LOCALIZACION DEL ARCHIVO
AT-CVCC-024-ECO-092-22	9/9/2022	CONTRATISTA	**ADMINISTRATIVO**	DOCUMENTOS PAJARITA Y OPERADOR PARA BOQUERON	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: enviado el 8 de sept por el contratista con documentación pero ante solicitud por interventoria el 9 de sept de faltante de poliza de equipo el contratista reponde el 10 de sept que el equipo no ingresa a obra. 10/9/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-093-22	10/9/2022	CONTRATISTA	**TECNICO**	Visita Técnica “Puente Pajarito”, corregimiento de San Cristóbal.	Supervisión y Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: solicitando se realice una visita técnica urgente por parte de la unidad de diseños de la entidad contratante para definir los niveles de la rasante de la vía y el empalme entre los estribos norte y sur en el Puente en construcción ubicado en Pajarito, 10/9/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-094-22	10/9/2022	CONTRATISTA	**TECNICO**	Ensayos Laboratorio.pdf, ESTUDIO DE SUELOS LOTE LOS MAYAS.pdf, REGISTRO DE PERFORACIÓN.pdf	Supervisión y Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: envío de estudio de suelo por parte del contratista, con las correcciones solicitadas por la SIF. 10/9/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-095-22	12/9/2022	CONTRATISTA	**TECNICO**	3317_JT QBDA PALMITAS-SECCIONES FINALE.dwg	Supervisión y Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: adjunto levantamiento topográfico en el corregimiento Palmitas , sector vereda la frisola 100ml aguas arriba y 100ml aguas abajodolicitado por los profesionales hidráulicos de la SIF. 12/9/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-096-22	12/9/2022	CONTRATISTA	**ADMINISTRATIVO**	Vibrocompactador #2 - San Antonio de Prado	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: envio de documentación equipo. 12/9/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-E-067-22	12/9/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	INFORMACION INF. PARC. SUPERVISION	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: solicita información para elaborar el Informe Parcial de Supervisión No. 3. 12/9/22	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-ECO-097-22	12/9/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	Informe Semanal Ambiental al 9 de septiembre	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: adjunto informe ambiental correspondiente a la semana entre el 2 y el 9 de septiembre de 2022. 12/9/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-098-22	12/9/2022	CONTRATISTA	**ADMINISTRATIVO**	Vibro - La Florida Tramo 2	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: adjunto documentación para La Florida Tramo 2. 12/9/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-E-068-22	14/9/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	ACTA N.3 DE INTERVENTORÍA PLAN VIARL RURAL_4600094153	Consorcio Vias CC 2022	CONTESTADO	correo: reenvio de correo por la profesional Yessica Ramos, observaciones en cuanto a la documentación aportada para el Acta de Pago No. 3_14/9/22	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-069-22	14/9/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	Actas de comité N.8 y N.9	Consorcio Vias CC 2022	CONTESTADO	correo: aprobando las actas de comite. 14/9/22	AT-024-02-01-01

CONSORCIO VIAS CC	**CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA**	**Código**	SGI-FOR-ADM-006	
		Fecha	06/07/2022	
		Versión	2	**Página 1 de 1**

PROYECTO:	**CONTRATO N 4600094153 INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN. PLAN VIAL RURAL**

CONSECUTIVO	FECHA DE RECIBIDO	QUIEN ENVIA	COMPONENTE	ASUNTO	ENVIADO A	ESTADO	OBSERVACIONES	LOCALIZACION DEL ARCHIVO
AT-CVCC-024-ECO-099-22	14/9/2022	CONTRATISTA	**TECNICO**	DERRUMBE LOS MAYAS SAN CRITOBAL.FINAL	Supervisión y Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	corro: adjunto levantamiento topográfico del área requerida , sector los mayas. 14/9/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-E-070-22	15/9/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	ACTA DE PAGO No. 2	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: Solicita acta de Pago No. 2 en PDF firmada por interventoria, para subir al Secop.15/9/22	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-ECO-100-22	15/9/2022	SUPERVISIÓN	**ADMINISTRATIVO**	SOLICITUD MODIFICACION 2 DEL CONTRATO	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	envio de comunicados 17 y 25	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-E-071-22	16/9/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	PROGRAMAR COMITE	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: solicitud de programar comité de obra para el próximo martes 20 de septiembre a las 10:00 a.m. 16/9/22	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-072-22	16/9/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	Aceptada: Comité de obra N.10 PLAN VIAL RURAL	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN		AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-073-22	16/9/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	INFORME BOQUERON	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: informe de alcadia del frente boquerón 12-08-22.	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-ECO-101-22	16/9/2022	CONTRATISTA	**TECNICO**	ACTA 2 Y PLANILAS DE PROFESIONALES Y TRABAJADORES	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: adjunto acta Nro 2 de obra revisada.16/9/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-102-22	16/9/2022	CONTRATISTA	**TECNICO**	Anexo memoria de calculo acta 2	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: adjunto memoria de calculo de acta 2. 16/9/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-103-22	16/9/2022	CONTRATISTA	**TECNICO**	ACTA 3 REAJUSTE AL ACTA 1	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: adjunto acta de reajuste al acta 1 y los índices de camacol de marzo (Fecha de presentación de la propuesta y Agosto fecha de entrega de la factura.16/9/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-E-074-22	16/9/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	Solicitud ampliación topografía Sector Los Maya, La Palma	Consorcio Vias CC 2022 y contratista	EN REVISIÓN	correo: reenvio de solicitud que en días pasados (exactamente el 8 de septiembre) había hecho la profesional Katherine Patiño en cuanto a la topografía de La Palma. se requiere atender las recomendaciones cuanto antes con el fin de no generar retrasos con el inicio de la ejecución de las intervenciones. 16/9/22	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-075-22	16/9/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	RV: ACTA N.3 DE INTERVENTORÍA PLAN VIARL RURAL_4600094153	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: informando que se puede proceder a facturar lo correspondiente al Acta de Pago No. 3. 16/9/22	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-ECO-104-22	17/9/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	Informe Semanal Ambiental al 17 de septiembre	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: adjunto informe ambiental correspondiente a la semana entre el 10 al 17 de septiembre de 2022._ 17/9/22	AT-024-02-03-01

CONSORCIO VIAS CC	**CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA**	**Código**	SGI-FOR-ADM-006	
		Fecha	06/07/2022	
		Versión	2	**Página 1 de 1**

PROYECTO:	**CONTRATO N 4600094153 INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN. PLAN VIAL RURAL**

CONSECUTIVO	FECHA DE RECIBIDO	QUIEN ENVIA	COMPONENTE	ASUNTO	ENVIADO A	ESTADO	OBSERVACIONES	LOCALIZACION DEL ARCHIVO
RV_CORREO19SEPT	19/9/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	Condiciones de orden y aseo en frentes de obra activos del corregimiento de San Cristóbal.	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: Adjunto respuesta a correo del 16 de sept. 19/9/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-105-22	20/9/2022	CONTRATISTA	**TECNICO**	DERRUMBE LOS MAYAS SAN CRISTOBAL PERFILES..FINALES.dwg	Supervisión y Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: adjunto levantamiento topográfico sector los mayas con los puntos requeridos. 20/9/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-E-076-22	20/9/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	PROPUESTA ALINEAMIENTO VIAL	Consorcio Vias CC 2022 y contratista	EN REVISIÓN	correo: donde solicita omitir correos enviados con anterioridad. 20/9/22	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-077-22	20/9/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	DIRECCIONES PARA ACTA DE VISITA	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: envio de cuadro para elaboración de actas de recorridos de direcciones contractuales con justificación de las que no se van a intervenir. 20/9/22	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-078-22	20/9/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	SOLICITUD SECRETARIA AL CONTRATISTA			correo: adjunto carta de solicitud de la Secretaria al contratista atendiendo las observaciones de la Abogada de Suministros y Servicios. 20/9/22	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-ECO-106-22	20/9/2022	CONTRATISTA	**TRANSITO**	APROBACION PMT PANTANILLO	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: adjunto documento con aprobación PMT pantanillo santa elena. 20/9/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-E-079-22	21/9/2022	SUPERVISIÓN	**SOCIAL**	PQR SAN ANTONIO DE PRADO	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: solicitud de apoyo con respuesta para poder contestarle la PQR a la comunidad dentro de los términos establecidos por la ley. 21/9/22.	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-ECO-107-22	21/9/2022	CONTRATISTA	**TECNICO**	PUENTE PAJARITO.21072022-Plano 3.pdf, PUENTE PAJARITO.21072022-Plano 1.pdf, PUENTE PAJARITO.21072022-Plano 2.pdf	Supervisión y Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: remiten plano de modificación diseño estructural por calculista para revisión por parte de la SIF. 21/9/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-E-080-22	21/9/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	RV: Solicitud MOD1 4600094153	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: solitud de ajuste cambioa al comunicado de la Interventoria de fecha 15 de septiembre y radicado AT-CVCC-024-S-041-22. 21/9/22	AT-024-02-01-01
GLO-MVC-023-2022	21/9/2022	CONTRATISTA	**TECNICO**	ACEPTACION ADICION	Natalia Urrego_ Secretaria de Infraestructura	EN REVISIÓN		AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-108-22	21/9/2022	CONTRATISTA	**TECNICO**	Aprobación de diseños pajarito	Supervisión y Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: informando en espera de aprobación nuevos diseños y solicitud de respuestas a dudas sobre el nuevo diseño. 21/9/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-E-081-22	21/9/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	OBRA QUE SE EJECUTA	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo. adjunto formato de la alcadia de como se debe presentar la obra que se ejecuta 21/09/22	AT-024-02-01-01

CONSORCIO VIAS CC	**CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA**	**Código**	SGI-FOR-ADM-006	
		Fecha	06/07/2022	
		Versión	2	**Página 1 de 1**

PROYECTO:	**CONTRATO N 4600094153 INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN. PLAN VIAL RURAL**

CONSECUTIVO	FECHA DE RECIBIDO	QUIEN ENVIA	COMPONENTE	ASUNTO	ENVIADO A	ESTADO	OBSERVACIONES	LOCALIZACION DEL ARCHIVO
AT-CVCC-024-ECO-109-22	21/9/2022	CONTRATISTA	**OTRO**	PAJARITA - MIRADOR PARTE BAJA	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: información documentación pajarita. 21/9/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-E-082-22	22/9/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	CORRECCION OFICIO 024	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: solicitud de corrección a oficio N°37 Prorroga y Adición al contrato de Interventoría N°4600094153.	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-083-22	22/9/2022	SUPERVISIÓN	**ADMINISTRATIVO**	ACTAS DE PAGO FIRMADAS	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: solicitud de actas de Pago en PDF debidamente firmadas para subir al Secop.	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-084-22	23/9/2022	SUPERVISIÓN	**ADMINISTRATIVO**	MODIFICAR CARTA	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: solicitud de modificación de comunicado AT-CVCC-024-S-041-22	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-ECO-110-22	23/9/2022	CONTRATISTA	**SOCIAL**	Reporte semanal actividades sociales, y cronograma	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: Adjunto informe social correspondiente a la semana del 16 al 22 de septiembre de 2022.	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-111-22	23/9/2022	CONTRATISTA	**TECNICO**	Distribucion de recursos	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: adjunto cuadro con la distribución de recursos de la adición.	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-112-22	24/9/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	Informe Semanal Ambiental al 24 de septiembre	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: adjunto informe ambiental correspondiente a la semana entre el 19 al 24 de septiembre de 2022.	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-113-22	24/9/2022	CONTRATISTA	**SOCIAL**	informe y cronograma social	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: Adjunto cronograma de la semana del 26 al 1 de octubre y el informe social de la semana del 16 al 22 de septiembre .	AT-024-02-03-01
RV_CORREO23SEPT	24/9/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	Incumplimientos del Contratista con respecto a los componentes técnico, ambiental y SST durante actividades de pavimentación en los frentes de obra	Consorcio Vias CC 2022	CONTESTADO	correo: respuesta a comunicado desde componente ambiental del Contratista.	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-114-22	24/9/2022	CONTRATISTA	**SOCIAL**	Cronograma de actividades semanales	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: Adjunto cronograma de actividades semanales	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-E-085-22	26/9/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	PUENTE PAJARITO.21072022-Plano 3.pdf, PUENTE PAJARITO.21072022-Plano 1.pdf, PUENTE PAJARITO.21072022-Plano 2.pdf	Consorcio Vias CC 2022 y contratista	EN REVISIÓN	correo: diseños finales del puente de Pajarito con los ajustes a los diseños, los cuales fueron avaladas y aprobadas por la Unidad de Diseño de la SIF.	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-ECO-115-22	27/9/2022	CONTRATISTA	**TECNICO**	VIA NUEVA LOS MAYAS - DISEÑO.dwg	Supervisión y Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: envío del levantamiento topográfico, incluyendo lo solicitado por parte de la supervisión (SIF) el día de hoy en campo sector los mayas.	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-116-22	27/9/2022	CONTRATISTA	**SOCIAL**	Circular convocatoria y presentación para capacitación-	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: Adjunto presentación para Capacitación con la comunidad del frente de trabajo "Puente Pajarito" sobre "Apropiación de las obras y cuidado del espacio público".	AT-024-02-03-01

CONSORCIO VIAS CC	**CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA**	**Código**	SGI-FOR-ADM-006	
		Fecha	06/07/2022	
		Versión	2	**Página 1 de 1**

PROYECTO:	**CONTRATO N 4600094153 INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN. PLAN VIAL RURAL**

CONSECUTIVO	FECHA DE RECIBIDO	QUIEN ENVIA	COMPONENTE	ASUNTO	ENVIADO A	ESTADO	OBSERVACIONES	LOCALIZACION DEL ARCHIVO
AT-CVCC-024-ECO-117-22	27/9/2022	CONTRATISTA	**SOCIAL**	Circular actividades constructivas - Senderos La Loma	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: Adjunto circular informativa propuesta para socializar las actividades constructivas realizadas a la fecha en el frente de trabajo Senderos La Loma.	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-E-086-22	28/9/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	Informes de seguimiento de ejecución y liquidación	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo:adjunto comunicación envida por la jefe en la cual solicita la entrega de Informes Ejecutivos de Seguimiento a la Ejecución Mensual a más tardar el próximo martes 4 de octubre antes del mediodía.	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-087-22	28/9/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	VIA NUEVA LOS MAYAS - DISEÑO.dwg	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: reenvio de correo enviado por el contratista al area de diseño de la SIF.	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-088-22	28/9/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	Diseño Canal Los Maya	Consorcio Vias CC 2022 y Contratista	EN REVISIÓN	correo: envio de localización, trazado y diseño de las obras de drenaje del sector Los Maya, para realizar replanteo en campo,hacer una visita y tomar una decisión definitiva al respecto.	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-089-22	28/9/2022	Carlos Alberto Vásquez Vásquez	**TECNICO**	Aprobación de diseños pajarito	Consorcio Vias CC 2022 y Contratista	CONTESTADO	correo: Definición por parte del calculista de dudas del contrista.	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-090-22	29/9/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	Aprobación de Diseños Pajarito	Consorcio Vias CC 2022 y Contratista	CONTESTADO	correo: reenvio de correo del calculista a definición de dudas del contratista	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-091-22	29/9/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	MODIFICACION CONTRATO DE OBRA	Consorcio Vias CC 2022 y Contratista	EN REVISIÓN	correo: adjunto modificación al contrato 4600094137 de 2022 la cual ya está debidamente publicada en el Secop II	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-ECO-118-22	29/9/2022	CONTRATISTA	**SOCIAL**	Reporte semanal y cronograma de actividades	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: Adjunto reporte de actividades realizadas durante la semana del 23 al 29 de octubre de 2022, así como el cuadro de gestión social actualizado.	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-E-092-22	30/9/2022	SUPERVISIÓN	**ADMINISTRATIVO**	ACTAS DE PAGO	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: solicitud de acta de debidamente firmada por Interventoría y contratista para subirla al Secop.	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-ECO-119-22	30/9/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	Informe Semanal Ambiental al 30 de septiembre	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: adjunto informe ambiental correspondiente a la semana entre el 25 al 30 de septiembre de 2022.	AT-024-02-03-01

CONSORCIO VIAS CC	**CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA**	**Código**	SGI-FOR-ADM-006	
		Fecha	06/07/2022	
		Versión	2	**Página 1 de 1**

PROYECTO:	**CONTRATO N 4600094153 INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN. PLAN VIAL RURAL**

CONSECUTIVO	FECHA DE RECIBIDO	QUIEN ENVIA	COMPONENTE	ASUNTO	ENVIADO A	ESTADO	OBSERVACIONES	LOCALIZACION DEL ARCHIVO
AT-CVCC-024-ECO-120-22	3/10/2022	CONTRATISTA	**SOCIAL**	INFORME SOCIAL SEPTIEMBRE CON ANEXOS	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: Adjunto informe social del mes de septiembre con sus respectivos anexos.	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-E-093-22	4/10/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	ALTERNATIVA VIAL LOS MAYA	Consorcio Vias CC 2022 y Contratista	EN REVISIÓN	correo: Adjunto diseño horizontal de la vía de Los Maya elaborado por la Ingeniera Mary Luz Montoya Rochel, para localizarlo en obra por favor,	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-ECO-121-22	4/10/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	Informe Ambiental Septiembre	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: adjunto informe mensual ambiental del mes de septiembre. enviado desde el 03/09/22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-E-094-22	4/10/2022	SUPERVISIÓN	**SOCIAL**	Visita comunicaciones SIF 6 de octubre	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: en la vereda Pantanillo, del corregimiento de Santa Elena se va a realizar una toma de comunicaciones de la SIF, con presencia de la Secretaria de infraestructura, se solicita por favor estar en el frente de trabajo.	AT-024-02-01-01
	5/10/2022	SUPERVISIÓN	**OTRO**	Aceptada: COMITÉ N.11 PLAN VIAL RURAL				
AT-CVCC-024-E-095-22	6/10/2022	SUPERVISIÓN	**AMBIENTAL**	RV: Informe mensual Interventoría PVR - Septiembre 2022	Consorcio Vias CC 2022 y Alvaro Lopez	EN REVISIÓN	correo: dando a conocer la situción que se esta presentando con el contratista en cuanto a la evaluación mensual amb y la entrega de certificados de escobrera.	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-096-22	6/10/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	PDF PLANTA PAJARITO	Consorcio Vias CC 2022 y Contratista	EN REVISIÓN	correo: planos finales del puente de Pajarito planta en PDF.	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-097-22	10/10/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	INFORMACION INF. PARC. SUPERVISION	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: con el informe de supervisión para actualizarlo.	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-098-22	10/10/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	Formulario Sistema de Caracterización-Infraestructura	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: renvio de formato para sociales para registro de los profesionales en el portal medellin.gov.co y la Suscripción del acuerdo de confidencialidad por cada uno de los denominados gestores de los contratos nominados.	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-ECO-122-22	10/10/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	Informe Semanal Ambiental al 8 de octubre	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: informe ambiental correspondiente a la semana entre el 3 y el 8 de octubre de 2022.	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-123-22	11/10/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	ANEXO 2. RCD - CORRECCION	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: adjunto certificado de recolección de escombros correspondiente al mes de agosto de 2022.	AT-024-02-03-01

CONSORCIO VIAS CC	**CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA**	**Código**	SGI-FOR-ADM-006	
		Fecha	06/07/2022	
		Versión	2	**Página 1 de 1**

PROYECTO:	**CONTRATO N 4600094153 INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN. PLAN VIAL RURAL**

CONSECUTIVO	FECHA DE RECIBIDO	QUIEN ENVIA	COMPONENTE	ASUNTO	ENVIADO A	ESTADO	OBSERVACIONES	LOCALIZACION DEL ARCHIVO
AT-CVCC-024-ECO-124-22	11/10/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	Pajarita para Santa Elena	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: documentación de nueva retroexcavadora que hará presencia en el frente de obra Pantanillo.	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-125-22	12/10/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	VOLQUETA KED029	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: Relacion de volqueta de obra nueva para los frentes San Cristobal.	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-E-099-22	12/10/2022	SUPERVISIÓN	**SOCIAL**	Formulario Sistema de Caracterización-Infraestructura	Consorcio Vias CC 2022	CONTESTADO	correo: enviado el día 10 de oct solicitando al area social realizar gestión de acuerdo de confidencialidad por parte de la Interventoria y del contratista	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-ECO-126-22	12/10/2022	CONTRATISTA	**SOCIAL**	Propuesta actividades de sostenibilidad.	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: Adjunto propuesta para las actividades de sostenibilidad a realizar dentro de la ejecución del contrato para su revisión.	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-127-22	12/10/2022	CONTRATISTA	**SOCIAL**	Acuerdo de confidencialidad solicitado	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: adjunto Acuerdo de confidencialidad solicitado por parte del contratista.	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-E-100-22	12/10/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	DISEÑO ESTRUCTURAL LA PALMA	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: Envío archivos con el diseño estructural del canal y caja de inspección del Sector Los Maya del Corregimiento de San Cristóbal,	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-101-22	12/10/2022	SUPERVISIÓN	**SST**	Hoja de vida Ingeniera en Higiene y Seguridad Ocupacional (SST).	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: De acuerdo a la solicitud del contratista, envío hoja de vida de profesional SST para su revisión por favor,	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-102-22	13/10/2022	SUPERVISIÓN	**ADMINISTRATIVO**	MODIFICACION CONTRATO DE OBRA	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: solicitud de redistribución de recursos y cambio de frentes Contrato No. 4600094137 de 2022, mediante el presupuesto de cada uno de estos frentes excluidos e incluidos para hacer un balance de los recursos.	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-ECO-128-22	14/10/2022	CONTRATISTA	**SOCIAL**	Reporte semanal y cronograma de actividades sociales	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: Adjunto cronograma de actividades para la semana del 17 al 22 de octubre de 2022, y el reporte de actividades de la semana del 07 al 13 de octubre de 2022	AT-024-02-03-01

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

CONSORCIO VIAS CC	**CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA**	**Código**	SGI-FOR-ADM-006	
		Fecha	06/07/2022	
		Versión	2	**Página 1 de 1**

PROYECTO:	**CONTRATO N 4600094153 INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN. PLAN VIAL RURAL**

CONSECUTIVO	FECHA DE RECIBIDO	QUIEN ENVIA	COMPONENTE	ASUNTO	ENVIADO A	ESTADO	OBSERVACIONES	LOCALIZACION DEL ARCHIVO
AT-CVCC-024-E-103-22	14/10/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	Informe de Avances Intervenciones Varias - San Cristóbal	Consorcio Vias CC 2022	CONTESTADO	correo: solicitud de responder oficio adjunto de la Secretaria de Infraestructura Física, mediante informe detallado acerca de las obras que se han ejecutado en el Corregimiento a través del contrato de Plan Vial Rural, así como los avances en los frentes que están actualmente en ejecución. contestada el 18 de oct.	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-ECO-129-22	14/10/2022	CONTRATISTA	**SOCIAL**	ACTA REUNIÓN PAJARITO 12-10-22.	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: adjunto acta de reunión de puente pajarito con la comunidad para despejar dudas sobre rediseños y atrazos de la obra.	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-130-22	16/10/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	Informe Semanal Ambiental al 15 de octubre	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: envio de informe semanal ambiental.	AT-024-02-03-01
	18/10/2022			Aceptada: COMITÉ N.12 PLAN VIAL RURAL				
AT-CVCC-024-E-104-22	18/10/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	ACTA No. 4 DE INTERVENTORÍA PLAN VIARL RURAL_4600094153	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: reenvio de correo solicitando tener en cuenta para el próximo cobro las recomendaciones de la compañera Yessica Hernández,	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-105-22	19/10/2022	SUPERVISIÓN	**ADMINISTRATIVO**	ACTUALIZACION VIGENCIAS PÓLIZAS	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: informaciónsobre modificación del contrato 4600094153 de 2022, consistente en adición de recursos y ampliación de plazo, publicada en el Secop. Por lo tanto, se requiere actualizar las vigencias y valores de las pólizas, de acuerdo a la modificación hecha,	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-ECO-131-22	19/10/2022	CONTRATISTA	**SOCIAL**	Presentación y circular de convocatoria, actividad de sostenibilidad San Antonio de Prado.	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: adjunto circular de convocatoria y presentación a emplear en la actividad de sostenibilidad a realizar el día viernes 21 de octubre de 2022 en el frente de trabajo "La Florida Parte Baja" corregimiento de San Antonio de Prado.	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-132-22	19/10/2022	CONTRATISTA	**SOCIAL**	Cuadro de gestión social actualizado a la fecha	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: adjunto cuadro del consolidado de gestión social en obra actualizado a la fecha.	AT-024-02-03-01

CONSORCIO VIAS CC	**CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA**	**Código**	SGI-FOR-ADM-006	
		Fecha	06/07/2022	
		Versión	2	**Página 1 de 1**

PROYECTO:	**CONTRATO N 4600094153 INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN. PLAN VIAL RURAL**

CONSECUTIVO	FECHA DE RECIBIDO	QUIEN ENVIA	COMPONENTE	ASUNTO	ENVIADO A	ESTADO	OBSERVACIONES	LOCALIZACION DEL ARCHIVO
AT-CVCC-024-ECO-133-22	20/10/2022	CONTRATISTA	**TECNICO**	TC_00413.JPG, TC_00419.JPG, TC_00442.JPG y 2 más	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: el contratista informa del inicio de los trabajos en la palma en la variantea a construir y solicita diseños de la vía y su respectiva estructura para dar agilidad a el proceso de construcción de la misma.	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-E-106-22	21/10/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	DETALLE CUNETA VIA NUEVA LOS MAYAS	Consorcio Vias CC 2022 y Contratista	EN REVISIÓN	correo: Adjunto detalle de la cuneta para la vía nueva de Los Mayas	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-107-22	21/10/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	Acta de comité N.10-Plan Vial rural	Consorcio Vias CC 2022	CONTESTADO	correo: informa que no hay observaciones sobre el acta adjunta.	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-108-22	21/10/2022	SUPERVISIÓN	**ADMINISTRATIVO**	ACTA DE PAGO FIRMADA	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: solicitud de acta de pago interventoría debidamente firmada para montar en SECOP	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-ECO-134-22	24/10/2022	CONTRATISTA	**SOCIAL**	Presentación reunión de inicio La Palma	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: adjunto presentación a emplear en reunión de inicio de La Palma (La cual ya se encontraba aprobada por Comunicaciones de la Alcaldía) y la circular que se empleó para la convocatoria.	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-135-22	24/10/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	Informe Semanal Ambiental al 22 de octubre	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: adjunto informe ambiental correspondiente a la semana entre el 18 y 22	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-E-109-22	25/10/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	RECOMENDACIONES VIA LOS MAYA VISITA 24/10/2022	Consorcio Vias CC 2022 y Contratista	EN REVISIÓN	correo: Adjunto recomendaciones de la profesional Mary Luz Montoya Rochel derivadas de la visita efectuada el día 24 de oct al sector Los Maya	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-ECO-136-22	26/10/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	VIBROCOMPACTADOR LA PALMA	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: relacion de la documentación del vibrocompactador que ingresará al frente de obra La Palma - San Cristobal.	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-E-110-22	26/10/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	RECOMENDACIONES VIA LOS MAYA VISITA 24/10/2022	Consorcio Vias CC 2022 y Contratista	EN REVISIÓN	correo: Adjunto el detalle de la cuneta para la vía en La Palma.	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-111-22	26/10/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	SEGUIMIENTO PLAN INDICATIVO CON CORTE A OCTUBRE 31 DE 2022	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: solicitud de información que les relaciono en el adjunto con corte a 31 de octubre, envío plantilla para evaluación para su diligenciamiento	AT-024-02-01-01
GLO-MVC-027-2022	27/10/2022	CONTRATISTA	**TECNICO**	SOLICITUD AMPLIACION DE PLAZO	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN		AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-137-22	27/10/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	RETROEXCAVADORA LA PALMA	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: relacion de la documentación de retroexcavadora que ingresará al frente de obra La Palma - San Cristobal.	AT-024-02-03-01

CONSORCIO VIAS CC	**CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA**	**Código**	SGI-FOR-ADM-006	
		Fecha	06/07/2022	
		Versión	2	**Página 1 de 1**

PROYECTO:	**CONTRATO N 4600094153 INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN. PLAN VIAL RURAL**

CONSECUTIVO	FECHA DE RECIBIDO	QUIEN ENVIA	COMPONENTE	ASUNTO	ENVIADO A	ESTADO	OBSERVACIONES	LOCALIZACION DEL ARCHIVO
AT-CVCC-024-ECO-138-22	28/10/2022	CONTRATISTA	**TECNICO**	Programación de trabajo día 29 de octubre	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: informa que el día 29 de octubre se programará ejecución de Obra en Los frentes de trabajo	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-139-22	31/10/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	Informe Semanal Ambiental al 29 de octubre	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: Relacion de informe ambiental correspondiente a la semana entre el 24 y 29 de octubre de 2022.	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-E-112-22	31/10/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	Diseño red aguas Lluvias sector La Palma	Consorcio Vias CC 2022 y Contratista	EN REVISIÓN	correo: reenvio Adjunto diseño de la red de aguas lluvias y la descarga a la quebrada la Potreritos. Así mismo adjunto los detalles constructivos y las memorias de cálculo.	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-113-22	31/10/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	INFORME SEGUIMIENTO A LA EJECUCION MENSUAL	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: solicitud de Informe de Seguimiento a la Ejecución Mensual con corte a 31 de octubre, a más tardar este próximo viernes 4 de noviembre	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-114-22	1/11/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	PLAN INDICATIVO	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: solicitud de Información sobre el contrato a 31 de octubre.	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-115-22	1/11/2022	SUPERVISIÓN	**ADMINISTRATIVO**	INCUMPLIMIENTO INFORMACION PARA MODIFICACIÓN	contratista	EN REVISIÓN	correo: solicitando el presupuesto de los frentes con sus respectivas actividades para poder sustentar modificación a los comités de seguimiento de Infraestructura Física y de Suministros y Servicios.	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-ECO-140-22	2/11/2022	CONTRATISTA	**ADMINISTRATIVO**	INCUMPLIMIENTO INFORMACION PARA MODIFICACIÓN	supervisión	CONTESTADO	correo: envio de presupuesto para la redistribución de recursos e inclusión de frentes de obra nuevos.	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-141-22	2/11/2022	CONTRATISTA	**ADMINISTRATIVO**	DOCUMENTOS PARA ADICION	Consorcio Vias CC 2022 y supervisión	EN REVISIÓN	correo: Adjunto documentos de la empresa global y del representante legal para la adición No 2 de tiempo y el cronograma de trabajo hasta el día 30 de enero de 2023.	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-142-22	3/11/2022	CONTRATISTA	**SOCIAL**	Informe mes octubre, área social	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: adjunto indorme social del mes de octubre. con sus respectivos anexos.	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-143-22	3/11/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	ESCRITO INFORME AMB OCTUBRE	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: adjunto indorme ambiental del mes de octubre.	AT-024-02-03-01

CONSORCIO VIAS CC	**CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA**	**Código**	SGI-FOR-ADM-006	
		Fecha	06/07/2022	
		Versión	2	**Página 1 de 1**

PROYECTO:	**CONTRATO N 4600094153 INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN. PLAN VIAL RURAL**

CONSECUTIVO	FECHA DE RECIBIDO	QUIEN ENVIA	COMPONENTE	ASUNTO	ENVIADO A	ESTADO	OBSERVACIONES	LOCALIZACION DEL ARCHIVO
AT-CVCC-024-ECO-144-22	3/11/2022	CONTRATISTA	**ADMINISTRATIVO**	Documentos para adicion de tiempo	Consorcio Vias CC 2022 y supervisión	EN REVISIÓN	correo: adjunto aceptación de cambio de alcance y distribución de recursos; y la cámara de comercio actualizada de Global, pero no relaciona los archivos.	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-E-116-22	3/11/2022	SUPERVISIÓN	**ADMINISTRATIVO**	ACTAS DE PAGO FIRMADAS	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: solicitud de las Actas de Pago No. 3 y No. 4 de obra debidamente firmadas por contratista e interventoría	AT-024-02-01-01
GLO-MVC-028-2022	3/11/2022	CONTRATISTA	**ADMINISTRATIVO**	Respuesta a solicitud de cambio de alcance y redistribución de recurso	Consorcio Vias CC 2022 y supervisión	EN REVISIÓN		AT-024-02-01-01
	3/11/2022			Aceptada: COMITÉ N.13 PLAN VIAL RURAL				
AT-CVCC-024-ECO-145-22	3/11/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	AUXILIARES PARE/SIGA	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: relación de los certificados para auxiliar pare/siga.	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-146-22	4/11/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	VIBRO - BELENCITO	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo. Relacion de documentos del vibrocompactador que realizó trabajos en Belencito Corazon.	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-147-22	4/11/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	INFORME MENSUAL AMBIENTAL OCTUBRE	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: relacion del informe mensual ambiental correspondiente al mes de octubre.	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-148-22	6/11/2022	CONTRATISTA	**SOCIAL**	Reporte semanal y cronograma de actividades	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: relacion del informe semanal de actividades y cronograma social.	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-149-22	6/11/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	Informe Semanal Ambiental al 05 de Noviembre	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: Relacion de informe ambiental correspondiente a la semana entre el 31 de octubre y el 05 de noviembre de 2022.	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-150-22	8/11/2022	CONTRATISTA	**SST**	Re: Documentación para aprobación	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: informa que el señor es subcontratista por ende no cuenta con estos documentos. No se mantendrá en los frentes de obra sólo pasará a realizar supervision extemporaneamente.	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-151-22	9/11/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	PRORROGAS PMT SAN CRISTOBAL	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: Adjunto prorroga de PMT Pajarito y Senderos.	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-E-117-22	9/11/2022	SUPERVISIÓN	**ADMINISTRATIVO**	Solicitud Información San Antonio de Prado.	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: Solicitud de Información San Antonio de Prado para responder un cuestionario	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-ECO-152-22	9/11/2022	CONTRATISTA	**OTRO**	PASAO V3 GLOBAL	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: Adjunto actualización del PASAO V3 del contrato.para la adición	AT-024-02-03-01

CONSORCIO VIAS CC	**CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA**	**Código**	SGI-FOR-ADM-006	
		Fecha	06/07/2022	
		Versión	2	**Página 1 de 1**

PROYECTO:	**CONTRATO N 4600094153 INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN. PLAN VIAL RURAL**

CONSECUTIVO	FECHA DE RECIBIDO	QUIEN ENVIA	COMPONENTE	ASUNTO	ENVIADO A	ESTADO	OBSERVACIONES	LOCALIZACION DEL ARCHIVO
AT-CVCC-024-E-118-22	11/11/2022	SUPERVISIÓN	**AMBIENTAL**	Informe mensual Interventoría PVR - Octubre 2022	Consorcio Vias CC 2022	CONTESTADO	correo: observaciones frente al informe mensual ambiental , se observa un déficit dentro de la inversión en algunos puntos, sugiere que se evalúen los ítems y ver la manera de balancear y se realice ajuste con supervisión del contrato.	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-119-22	11/11/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	INFORMACION INF. PARC. SUPERVISION	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: solicitud de suministro de información para elaborar Informe Parcial de Supervisión No. 5, para el período comprendido entre el 01 y el 31 de Octubre de 202	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-120-22	11/11/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	VISITA DISEÑADOR PUENTE PAJARITO	Consorcio Vias CC 2022 y contratista	EN REVISIÓN	correo: envío de recomendaciones complementarias del Ingeniero Carlos Alberto Vásquez respecto a la visita realizada al puente de Pajarito	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-ECO-153-22	11/11/2022	CONTRATISTA	**TECNICO**	VIA NUEVA LOS MAYAS - DISEÑO.dwg	Consorcio Vias CC 2022 y supervisión	EN REVISIÓN	correo: envío de levantamiento general actualizado incluyendo la parte arbórea , vía y pesebrera, como se acordó en recorrido.	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-E-121-22	11/11/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	VIA NUEVA LOS MAYAS - DISEÑO.dwg	Consorcio Vias CC 2022 y contratista	EN REVISIÓN	correo: solicitud de topografia en AUTOCAD CIVIL, diseño geométrico del tramo de vía construido e información adicional.	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-ECO-154-22	11/11/2022	CONTRATISTA	**TECNICO**	Alternativa3_losmayas (1).zip	Consorcio Vias CC 2022 y supervisión	EN REVISIÓN	correo: envío de diseño geométrico de la vía y área sector los mayas.	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-155-22	12/11/2022	CONTRATISTA	**SOCIAL**	Reporte semanal y cronograma de actividades	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: cronograma de actividades para la semana del 14 al 19 de noviembre, y reporte semanal de actividades sociales del 04 al 10 de noviembre de 2022 con cuadro de gestión social actualizado.	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-156-22	13/11/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	Informe Semanal Ambiental al 12 de Noviembre	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo:adjunto informe ambiental correspondiente a la semana entre el 08 y el 12 de noviembre de 2022.	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-E-122-22	16/11/2022	SUPERVISIÓN	**ADMINISTRATIVO**	ACTA N.5 DE INTERVENTORÍA PLAN VIAL RURAL_4600094153	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: solicitando atender la observación de la profesional Yessica Hernández en cuanto al acta de pago 5.	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-123-22	16/11/2022	SUPERVISIÓN	**ADMINISTRATIVO**	PRESUPUESTO ADICION 1	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: adjunto presupuesto de la adición con las cantidades respectivas	AT-024-02-01-01

CONSORCIO VIAS CC	**CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA**	**Código**	SGI-FOR-ADM-006	
		Fecha	06/07/2022	
		Versión	2	**Página 1 de 1**

PROYECTO:	**CONTRATO N 4600094153 INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN. PLAN VIAL RURAL**

CONSECUTIVO	FECHA DE RECIBIDO	QUIEN ENVIA	COMPONENTE	ASUNTO	ENVIADO A	ESTADO	OBSERVACIONES	LOCALIZACION DEL ARCHIVO
AT-CVCC-024-ECO-157-22	16/11/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	MEMORIAS 2 PARA FIRMA AMBIENTAL	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: adjunto memorias ambientas para firma.	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-E-124-22	16/11/2022	SUPERVISIÓN	**ADMINISTRATIVO**	ACTA N.5 DE INTERVENTORÍA PLAN VIARL RURAL_4600094153	Consorcio Vias CC 2022	CONTESTADO	correo: aprobación para proceder a facturar lo referente el Acta de Pago No. 5,	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-ECO-158-22	16/11/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	Compresor Manzanillo	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: relación documentación del compresor que trabajara en el frente de obra Manzanillo.	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-E-125-22	17/11/2022	SUPERVISIÓN	**ADMINISTRATIVO**	INFORME PARCIAL SUPERVISION No. 5	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: solicitud de aportar para verificación, la planilla de seguridad social y la certificación de que el contratista se encuentra al día en el pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-126-22	17/11/2022	SUPERVISIÓN	**ADMINISTRATIVO**	SOLICITUD INFORMACION PROFESIONAL SOCIAL	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: Información relación laboral de la profesional Social CECILIA MARIA MEJÍA MERINO en desarrollo del Contrato No. 4600094153 de 2022.	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-127-22	17/11/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	Acta de comité N.13-Plan Vial rural	Consorcio Vias CC 2022	CONTESTADO	correo: confirma que no tiene observaciones acerca del acta	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-128-22	17/11/2022	SUPERVISIÓN	**SOCIAL**	CORRECCION ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: solicitud de corregir el Acuerdo de Confidencialidad que se envió en días pasados, de acuerdo a las observaciones del correo.	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-129-22	18/11/2022	SUPERVISIÓN	**SOCIAL**	Solicitud profesional social residente de interventoría Plan Vial Rural.	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: solicitud de contratación de un social, con el fin de continuar ejecutando la guía de manejo socioambiental y de intervenir en el componente social a través de la interventoría	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-ECO-159-22	18/11/2022	CONTRATISTA	**SOCIAL**	Reporte semanal y cronograma de actividades	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: reporte de actividades correspondiente a la semana del 11 al 17 de noviembre de 2022 con el cuadro de gestión social actualizado; y el cronograma de actividades propuesto para la semana del 21 al 26 de noviembre de 2022.	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-160-22	18/11/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	COMPRESOR PAJARITO	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: entrega de documentos del compresor para el frente de obra Pajarito.	AT-024-02-03-01

CONSORCIO VIAS CC	**CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA**	**Código**	SGI-FOR-ADM-006	
		Fecha	06/07/2022	
		Versión	2	**Página 1 de 1**

PROYECTO:	**CONTRATO N 4600094153 INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN. PLAN VIAL RURAL**

CONSECUTIVO	FECHA DE RECIBIDO	QUIEN ENVIA	COMPONENTE	ASUNTO	ENVIADO A	ESTADO	OBSERVACIONES	LOCALIZACION DEL ARCHIVO
AT-CVCC-024-ECO-161-22	18/11/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	BOBCAT - MANZANILLO	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: relacion de la documentación del bobcat para el frente de obra Manzanillo.	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-162-22	19/11/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	ESTACION DE BOMBEO - PAJARITO	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: entrega de documentos de la bomba de concreto para el frente de obra Pajarito el día lunes.	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-163-22	19/11/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	Compresor Manzanillo	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: Relacion de la documentación del compresor que trabajara el dia 17 de nov en el frente de obra Manzanillo. enviado el 16 /11/2022.	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-E-130-22	22/11/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	PLATINA BOQUERÓN	Consorcio Vias CC 2022 y contratista	EN REVISIÓN	correo: solicitando información acerca de la instalación de platinas en boqueron	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-ECO-164-22	22/11/2022	CONTRATISTA	**TECNICO**	INFORME PRELIMNAR OC-7790 (1).pdf, INFORME PRELIMNAR OC-7790 (2).pdf	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: envio de de resultados de cilindros de concretos , frente de obras (Yolombo - cunetas) y (san Javier la loma - escaleras)	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-165-22	22/11/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	Informe Semanal Ambiental al 19 de Noviembre	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: Relacion de informe ambiental correspondiente a la semana entre el 14 y el 19 de noviembre de 2022.	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-166-22	22/11/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	BOBCAT - MANZANILLO	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: Adjunto nuevamente póliza.	AT-024-02-03-01
RV_CORREO23NOVIEMBRE	23/11/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	Fwd: Solicitud de recolección de residuos de demolición en cauce dequebrada.	Consorcio Vias CC 2022	CONTESTADO		AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-E-131-22	24/11/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	Estructura hidráulica manejo de aguas de escorrentía en estabilización de talud sector Los Mayas	Consorcio Vias CC 2022 y contratista	EN REVISIÓN	correo: envío el diseño de la estructura de entrada y salida y red de alcantarillado para la captación y transporte de las aguas de escorrentía	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-132-22	24/11/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	Estructura hidráulica manejo de aguas de escorrentía en estabilización de talud sector Los Mayas	Consorcio Vias CC 2022 y contratista	EN REVISIÓN	correo: reajuste a los diseños entregados	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-ECO-167-22	26/11/2022	CONTRATISTA	**SOCIAL**	Reporte semanal y cronograma de actividades	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: reporte de actividades correspondiente a la semana del18 al 24 de noviembre de 2022 con el cuadro de gestión social actualizado; y el cronograma de actividades para la semana del 28 de noviembre al 03 de diciembre de 2022.	AT-024-02-03-01

CONSORCIO VIAS CC	**CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA**	**Código**	SGI-FOR-ADM-006	
		Fecha	06/07/2022	
		Versión	2	**Página 1 de 1**

PROYECTO:	**CONTRATO N 4600094153 INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN. PLAN VIAL RURAL**

CONSECUTIVO	FECHA DE RECIBIDO	QUIEN ENVIA	COMPONENTE	ASUNTO	ENVIADO A	ESTADO	OBSERVACIONES	LOCALIZACION DEL ARCHIVO
AT-CVCC-024-E-133-22	28/11/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	SEGUIMIENTO A PROYECTOS EN PLATAFORMA SPI - CORTE A NOVIEMBRE 30 DE 2022	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: solicitando información sobre avances de las obras a 30 de noviembre	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-ECO-168-22	29/11/2022	CONTRATISTA	**SOCIAL**	Programación social	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: adjunto programación de actividades sociales de cierre hasta diciembre 20 de 2022	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-169-22	29/11/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	Informe Semanal Ambiental al 26 de Noviembre	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: adjunto informe ambiental correspondiente a la semana entre el 21 y el 26 de noviembre de 2022.	AT-024-02-03-01
	30/11/2022			Aceptada: COMITÉ N.14 PLAN VIAL RURAL				
AT-CVCC-024-E-134-22	1/12/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	Diseños estructuras hidraulicas y obras de contencion sector Los Mayas Vereda La Palma	Consorcio Vias CC 2022 y contratista.	EN REVISIÓN	correo: envío de los diseños de estructuras hidráulicas, de contención y protección para los tres puntos críticos visitados en el sector los Mayas, vereda la Palma.	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-ECO-170-22	1/12/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	WORD - AVANCE INFORME AMBIENTAL NOVIEMBRE	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: relacion de word correspondiente al informe mensual ambiental de noviembre.	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-E-135-22	2/12/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	INFORME SEGUIMIENTO A LA EJECUCION MENSUAL	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: solicitud de informe de Seguimiento a la Ejecución Mensual con corte a 30 de noviembre.	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-136-22	5/12/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	INFORMACION INF. PARC. SUPERVISION	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: solicitud de informe Parcial de Supervisión No. 6, para el período comprendido entre el 01 y el 30 de Noviembre de 2022.	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-ECO-171-22	5/12/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	Informe Semanal Ambiental al 3 de diciembre	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: relacion de informe ambiental correspondiente a la semana entre el 28 de noviembre y el 3 de diciembre de 2022.	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-E-137-22	5/12/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	APU de obra extra N.29-33 Plan Vial Rural	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo; solicita reunión para revisar estos APUs y envio de observaciones.	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-138-22	5/12/2022	SUPERVISIÓN	**ADMINISTRATIVO**	ACTA DE PAGO No. 5	Consorcio Vias CC 2022	CONTESTADO	correo: *solicitud de acta Nº 5 debidamente firmada para montar en secop. 1/12/22 *solicitud de montar factura correspondiente en el secop para generar codigo de autorizaciòn. 5/12/22	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-ECO-172-22	6/12/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	EXCAVADORA PARA LA PALMAS	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: Relacion de papelería de nueva máquina.	AT-024-02-03-01

CONSORCIO VIAS CC	**CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA**	**Código**	SGI-FOR-ADM-006	
		Fecha	06/07/2022	
		Versión	2	**Página 1 de 1**

PROYECTO:	**CONTRATO N 4600094153 INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN. PLAN VIAL RURAL**

CONSECUTIVO	FECHA DE RECIBIDO	QUIEN ENVIA	COMPONENTE	ASUNTO	ENVIADO A	ESTADO	OBSERVACIONES	LOCALIZACION DEL ARCHIVO
AT-CVCC-024-ECO-173-22	6/12/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	INFORME MENSUAL AMBIENTAL NOVIEMBRE	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: Adjunto informe, con las correcciones solicitadas.	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-E-139-22	6/12/2022	SUPERVISIÓN	**ADMINISTRATIVO**	EJEMPLO REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS 4600094372	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo; envio de formato ejemplo para conocimiento.	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-140-22	7/12/2022	SUPERVISIÓN	**ADMINISTRATIVO**	OBSERVACIONES MODIFICACIÓN	Consorcio Vias CC 2022 y contratista.	EN REVISIÓN	correo: para realizar la modificación correspondiente al contrato 4600094137 de 2022, de Suministros y Servicios se solicitan algunos documentos.	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-141-22	9/12/2022	SUPERVISIÓN	**ADMINISTRATIVO**	REDESTRIBUCIÓN DE RECURSOS	Consorcio Vias CC 2022	CONTESTADO	correo: envío de solicitud de modificación del contrato de obra y vr de la redistribucion.	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-142-22	9/12/2022	SUPERVISIÓN	**ADMINISTRATIVO**	CAMBIO OFICIO CONTRATISTA OBRA	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: solicitado pedir el favor al contratista la modificación del oficio de acuerdo a lo propuesto.	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-143-22	9/12/2022	SUPERVISIÓN	**ADMINISTRATIVO**	MODIFICACION 4600094153	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: Adjunto documentos para modificar el oficio que se relacionan y se solicite que se envíen la proyección de pagos	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-ECO-174-22	12/12/2022	CONTRATISTA	**SOCIAL**	Reporte semanal de actividades y cronograma.	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: Adjuntos cronograma de actividades sociales para la semana del 12 al 17 de diciembre,e informe de la semana del 02 al 09 de diciembre de 2022 con el cuadro de gestión .actualizado.	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-175-22	12/12/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	Retro excavadora La Palma	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: Adjunto documentos para maquinaria.	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-176-22	12/12/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	COMUNICADOS MODIFICADOS Y PROYECCION DE PAGOS	Consorcio Vias CC 2022 y contratista.	EN REVISIÓN	correo: adjunto comunicados y proyeccion de pagos	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-E-144-22	12/12/2022	SUPERVISIÓN	**ADMINISTRATIVO**	RV: AT-CVCC-024-S-063-22_Solicitud de Adición N.2 Contrato 4600094153				AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-145-22	12/12/2022	SUPERVISIÓN	**ADMINISTRATIVO**	ACTUALIZAR ANTECEDENTES	Consorcio Vias CC 2022 y contratista.	EN REVISIÓN	correo: solicitud envio de los certificados actualizados a la fecha de antecedentes de consulta de Responsables Fiscales, Inhabilidades e Incompatibilidades de la Procuraduría y Contraloría y el de Antecedentes Judiciales de la Policía Nacional.	AT-024-02-01-01

CONSORCIO VIAS CC	**CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA**	**Código**	SGI-FOR-ADM-006	
		Fecha	06/07/2022	
		Versión	2	**Página 1 de 1**

PROYECTO:	**CONTRATO N 4600094153 INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN. PLAN VIAL RURAL**

CONSECUTIVO	FECHA DE RECIBIDO	QUIEN ENVIA	COMPONENTE	ASUNTO	ENVIADO A	ESTADO	OBSERVACIONES	LOCALIZACION DEL ARCHIVO
AT-CVCC-024-E-146-22	12/12/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	APU OBRA EXTRA 29-31 Y COTIZACION PLAN VIAL RURAL	Consorcio Vias CC 2022 y contratista.	EN REVISIÓN	correo: solicita responder a las observaciones del profesional Mario Vanegas para proceder con las firmas y la aprobación definitiva de los APUs,	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-ECO-177-22	12/12/2022	CONTRATISTA	**ADMINISTRATIVO**	Proyeccion de pagos	Consorcio Vias CC 2022 y supervision	EN REVISIÓN	correo: Adjunto proyección de pagos,	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-178-22	12/12/2022	CONTRATISTA	**ADMINISTRATIVO**	certificados para adicion tiempo global	Consorcio Vias CC 2022 y supervision	EN REVISIÓN	correo adjunto certificados de antecedentes de globar y de representante legal.	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-179-22	12/12/2022	CONTRATISTA	**ADMINISTRATIVO**	Modificacion Comunicado 28	Consorcio Vias CC 2022 y supervision	EN REVISIÓN	correo: adjunto comunicado modificado. Nº28.	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-180-22	13/12/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	Informe Semanal Ambiental al 10 de diciembre	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: adjunto informe ambiental correspondiente a la semana entre el 05 y el 10 de diciembre de 2022.	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-181-22	13/12/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	MAQUINARIA ACTUALIZADA - LA PALMA	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: relación actualizada de la maquinaria en La Palma.	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-E-147-22	13/12/2022	SUPERVISIÓN	**ADMINISTRATIVO**	RV: DOCUMENTOS MODIFICACION 4600094153	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: remite correccion el presupuesto de la adición en Excel, del contrato de Interventoría	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-148-22	13/12/2022	SUPERVISIÓN	**ADMINISTRATIVO**	PROPUESTA ECONOMICA FIRMADA	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: envio de la propuesta economica firmada por el supervisor.	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-149-22	13/12/2022	SUPERVISIÓN	**ADMINISTRATIVO**	EJEMPLOS PRESUPUESTOS	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: ejemplos de presupuestos de redistribucion final.	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-ECO-182-22	14/12/2022	CONTRATISTA	**TECNICO**	Redistribucion	Consorcio Vias CC 2022 y supervision	EN REVISIÓN	correo: adjunto redistribucion con las correciones	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-E-150-22	14/12/2022	SUPERVISIÓN	**ADMINISTRATIVO**	RV: SOLICTUD DE MODIFICACIÓN 4600094137 PLAN VIAL RURAL	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: con la solicitud de modificacion.	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-ECO-183-22	14/12/2022	CONTRATISTA	**TECNICO**	Correcion	Consorcio Vias CC 2022 y supervision	EN REVISIÓN	correo: adjunto Redistribución de recursos sobre archivo devuelto.	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-183-22	14/12/2022	CONTRATISTA	**TECNICO**	Modificacion	Consorcio Vias CC 2022 y supervision	EN REVISIÓN	correo: adjunto Redistribución de recursos modificado.	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-E-151-22	16/12/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	LLENO TUBERÍA - VEREDA LA PALMA	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: reenvio de correo de diseñados, dando recomendaciones sobre el lleno de la tuberia en la vereda la Palma.	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-152-22	16/12/2022	SUPERVISIÓN	**ADMINISTRATIVO**	CAMBIO DE SUPERVISOR POR VACACIONES	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: informando el cambio de supervisor por reemplazo de vacaciones	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-ECO-184-22	16/12/2022	CONTRATISTA	**SOCIAL**	Reporte semanal de actividades sociales, y cronograma	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: Adjuntos cronograma de actividades para la semana del 19 al 24 de diciembre de 2022, reporte de actividades realizadas entre el 09 y el 15 de diciembre de 2022 con el cuadro de gestión social actualizado.	AT-024-02-03-01

CONSORCIO VIAS CC	**CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA**	**Código**	SGI-FOR-ADM-006	
		Fecha	06/07/2022	
		Versión	2	**Página 1 de 1**

PROYECTO:	**CONTRATO N 4600094153 INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN. PLAN VIAL RURAL**

CONSECUTIVO	FECHA DE RECIBIDO	QUIEN ENVIA	COMPONENTE	ASUNTO	ENVIADO A	ESTADO	OBSERVACIONES	LOCALIZACION DEL ARCHIVO
AT-CVCC-024-ECO-185-22	19/12/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	Informe Semanal Ambiental al 17 de diciembre	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: Relacion de informe ambiental correspondiente a la semana entre el 12 y el 17 de diciembre de 2022.	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-186-22	19/12/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	FICHAS MTO- LA PALMA	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: Relaciono fichas de mantenimiento. de la excavadora Hitachi.	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-187-22	19/12/2022	CONTRATISTA	**ADMINISTRATIVO**	Facturas 24 y 25	Consorcio Vias CC 2022 y supervision	EN REVISIÓN	correo: adjunto las facturas de las actas 7 y 8.	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-E-153-22	21/12/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	SEGUIMIENTO A PROYECTOS EN PLATAFORMA SPI Y PLAN INDICATIVO - CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2022	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: suministrar información que se relaciona en el adjunto con corte a 31 de diciembre.	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-154-22	22/12/2022	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	INFORME EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: solicitud de envio informe ejecutivo de seguimiento con corte a 31 de diciembre	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-ECO-188-22	30/12/2022	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	Informe Semanal Ambiental al 23 de diciembre	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: Relacion de informe ambiental correspondiente a la semana entre el 13 y el 23 de diciembre de 2022.	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-189-22	4/1/2023	CONTRATISTA	**SOCIAL**	Informe social diciembre	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: Adjunto informe del mes de diciembre del área social	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-E-155-22	4/1/2023	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	Contratos 4600094137 y 4600094153 Plan Vial Rural	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: solicitud de informes e informacion en ausencia del supervisor por periodo de vacaciones.	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-ECO-190-22	4/1/2023	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	Informe Semanal Ambiental al 30 de diciembre	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: Relacion de informe ambiental correspondiente a la semana entre el 26 y el 30 de diciembre de 2022.	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-E-156-22	5/1/2023	Municipio de Medellín	**ADMINISTRATIVO**	Documento - 202330003553	Consorcio Vias CC 2022	CONTESTADO	correo: respuesta a radicado N° 202330003553 presentado el 05 de Enero de 2023, solicitando devolucion de la contribucion especial descontada en FV07.	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-ECO-191-22	5/1/2023	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	INFORME MENSUAL AMBIENTAL DICIEMBRE 2022	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: relacion de informe mensual ambiental correspondiente al mes de diciembre de 2022.	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-192-22	5/1/2023	CONTRATISTA	**SOCIAL**	ANEXOS INFORME SOCIAL DICIEMBRE	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: Adjunto archivo comprimido con los anexos generados durante el mes de diciembre.	AT-024-02-03-01

CONSORCIO VIAS CC	**CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA**	**Código**	SGI-FOR-ADM-006	
		Fecha	06/07/2022	
		Versión	2	**Página 1 de 1**

PROYECTO:	**CONTRATO N 4600094153 INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN. PLAN VIAL RURAL**

CONSECUTIVO	FECHA DE RECIBIDO	QUIEN ENVIA	COMPONENTE	ASUNTO	ENVIADO A	ESTADO	OBSERVACIONES	LOCALIZACION DEL ARCHIVO
AT-CVCC-024-ECO-193-22	5/1/2023	CONTRATISTA	**SOCIAL**	Reporte semanal y cronograma de actividades	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: Adjuntos 1. Reporte semanal del 23 al 29 de diciembre de 2022. 2. Cronograma de actividades del 02 al 07 de enero de 2023. 3. Reporte semanal del 30-12-22 al 05-01-23. 4. Cronograma de actividades del 09 al 14 de enero de 2023.	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-194-22	5/1/2023	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	NUEVA RETRO - LA PALMA	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: relacion de la documentación para el ingreso de la Retroexcavadora Hitachi 120.	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-195-22	10/1/2023	CONTRATISTA	**TECNICO**	Informe resultados de cilindros	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: envío de resultados de cilindros De los frentes de Obra , Yolombo , pajarito y senderos	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-E-157-22	10/1/2023	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	Diseño paso vial Vereda La Frisola	Consorcio Vias CC 2022 y contratista.	EN REVISIÓN	correo: envío el diseño del paso vial de la Vereda la Frisola del Corregimiento de San Sebastián de Palmitas.	AT-024-02-01-01
	11/1/2023	SUPERVISIÓN		Aceptada: Revisión estado del contrato Plan Vial Rural				
AT-CVCC-024-E-158-22	11/1/2023	Municipio de Medellín	**ADMINISTRATIVO**	Documento - 202330000177	Consorcio Vias CC 2022	CONTESTADO	correo: El Municipio de Medellín en atención al asunto de la referencia, da respuesta al radicado N° 202210389895 presentado el 18 de noviembre de 2022, la cual se encuentra como documento adjunto en el correo.	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-159-22	12/1/2023	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	INFORMACION INF. PARC. SUPERVISION	Consorcio Vias CC 2022 y contratista.	EN REVISIÓN	correo: solicitud de suministrar información con corte a 31 de diciembre para elaboracion de informe de supervision.	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-160-22	12/1/2023	SUPERVISIÓN	**TECNICO**	Fwd: Acuerdos Confidencialidad - Plan Vial Rural	Consorcio Vias CC 2022 y contratista.	CONTESTADO	correo: Aclara que con el Sistema de Caracterización Ciudadana, los acuerdos deben estar firmados por los representantes legales y no director de obra.	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-ECO-196-22	12/1/2023	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	COMPRESOR INGERSOLL - PAJARITO	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: relacion de nuevo compresor para el frente de obra Pajarito.	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-197-22	12/1/2023	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	VOLQUETA DBA482	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: relacion de volqueta que está realizando ingreso al frente de obra La Palma.	AT-024-02-03-01

CONSORCIO VIAS CC	**CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA**	**Código**	SGI-FOR-ADM-006	
		Fecha	06/07/2022	
		Versión	2	**Página 1 de 1**

PROYECTO:	**CONTRATO N 4600094153 INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN. PLAN VIAL RURAL**

CONSECUTIVO	FECHA DE RECIBIDO	QUIEN ENVIA	COMPONENTE	ASUNTO	ENVIADO A	ESTADO	OBSERVACIONES	LOCALIZACION DEL ARCHIVO
AT-CVCC-024-ECO-198-22	13/1/2023	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	Informe Semanal Ambiental al 7 de enero de 2023	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo:Relacion de informe ambiental correspondiente a la semana entre el 2 y el 7 de enero de 2023.	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-199-22	16/1/2023	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	Informe Semanal Ambiental al 14 de enero de 2023	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo:Relacion de informe ambiental correspondiente a la semana entre el 10 y el 14 de enero de 2023.	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-200-22	17/1/2023	CONTRATISTA	**SOCIAL**	Reporte de actividades y cronograma social	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: Adjunto reporte semanal y cronograma de actividades sociales pendiente.	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-E-161-22	18/1/2023	SUPERVISIÓN	**ADMINISTRATIVO**	ACTUALIZACION POLIZAS MODIFICACION 2	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: informativo de que la modificación del contrato 4600094153 de 2022, (adición de recursos No. 2 y ampliación de plazo No. 2), ya fue publicada en el Secop desde el mes de diciembre de 2022. Por lo tanto, se puede proceder a actualizar las vigencias y valores de las pólizas, de acuerdo a la modificación hecha y enviárlas al supervisor.	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-E-162-22	20/1/2023	SUPERVISIÓN	**ADMINISTRATIVO**	SOLICITUD ACTAS DE PAGO-SECOP II	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: solicitud de envio de las Actas de Pago No. 6 y No. 7 del contrato de Interventoría No. 4600094153 de 2022 en PDF debidamente firmadas , con el fin de poder subir toda la documentación al SECOP II,	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-ECO-201-22	20/1/2023	CONTRATISTA	**SOCIAL**	Reporte semanal de actividades y cronograma social	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: Adjunto reporte de actividades sociales realizadas entre el 13 y el 19 de enero de 2023 y cronograma de actividades para la semana del 23 al 28 de enero de 2023.	AT-024-02-03-01
AT-CVCC-024-ECO-202-22	23/1/2023	CONTRATISTA	**AMBIENTAL**	Informe Semanal Ambiental al 20 de enero de 2023	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: Relacion de informe ambiental correspondiente a la semana entre el 16 y el 20 de enero de 2023.	AT-024-02-03-01

CONSORCIO VIAS CC	**CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA**	**Código**	SGI-FOR-ADM-006	
		Fecha	06/07/2022	
		Versión	2	**Página 1 de 1**

PROYECTO:	**CONTRATO N 4600094153 INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN. PLAN VIAL RURAL**

CONSECUTIVO	FECHA DE RECIBIDO	QUIEN ENVIA	COMPONENTE	ASUNTO	ENVIADO A	ESTADO	OBSERVACIONES	LOCALIZACION DEL ARCHIVO
AT-CVCC-024-E-163-22	26/1/2023	SUPERVISIÓN	**ADMINISTRATIVO**	ACTUALIZACION POLIZAS MODIFICACION 2	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: solicita nuevamente el envio de las pólizas con la actualización de las vigencias y valores de las pólizas de acuerdo a la modificación No. 2, consistente en adición de recursos No. 2 y ampliación de plazo No. 2,	AT-024-02-01-01
AT-CVCC-024-ECO-203-22	31/1/2023	CONTRATISTA	**SOCIAL**	Reporte actividades semanales y cronograma social	Consorcio Vias CC 2022	EN REVISIÓN	correo: Adjuntos reporte de actividades desarrolladas entre el 20 y el 26 de enero de 2023 con el cuadro de gestión social actualizado; y el cronograma social para la semana del 30 de enero al 04 de febrero de 2023	AT-024-02-03-01

Ver correspondencia en el ANEXO N°7-CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

4.5. COPIA DE LA BITÁCORA:

Se anexa fotocopia auténtica, foliada y legible de la bitácora que se lleva en cada frente de obra; correspondiente al periodo del 21 de junio de 2022 (inicio de obra) hasta el 31 de enero de 2023 en la carpeta ANEXO N°2 -BITÁCORA DE OBRA

4.6. INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA:

Para el período del 25 de mayo de 2022 al 31 de enero de 2023, la Interventoría presentó un total de treinta y seis (36) Informes Semanales a la Supervisión:

Informe Semanal N°	Fecha de Informe
1	25 al 29 de mayo
2	30 de mayo al 5 de junio
3	6 al 12 de junio
4	13 al 19 de junio
5	20 al 26 de junio
6	27 de junio al 3 de julio
7	4 al 10 de julio
8	11 al 17 de julio
9	18 al 24 de julio
10	25 al 31 de julio
11	01 al 07 de agosto
12	08 al 14 de agosto
13	15 al 21 de agosto
14	22 al 28 de agosto
15	29 de agosto al 4 de septiembre
16	05 al 11 de septiembre
17	12 al 18 de septiembre
18	19 al 25 de septiembre
19	26 de septiembre al 2 de octubre
20	3 al 9 de octubre de 2022
21	10 al 16 de octubre de 2022
22	17 al 23 de octubre de 2022
23	24 al 30 de octubre de 2022
24	31 de oct al 6 de nov de 2022
25	7 al 13 de noviembre de 2022
26	14 al 20 de noviembre de 2022
27	21 al 27 de noviembre de 2022

Informe Semanal N°	Fecha de Informe
28	28 de nov al 4 de diciembre de 2022
29	5 al 11 de diciembre de 2022
30	18 al 19 de diciembre de 2022
31	19 al 25 de diciembre de 2022
32	26 al 31 de diciembre de 2022
33	2 al 8 de enero de 2023
34	9 al 15 de enero de 2023
35	16 al 22 de enero de 2023
36	23 al 29 de enero de 2023

Ver ANEXO 8-INFORMES SEMANALES, también se incluyen los informes semanales de las áreas ambiental, social y de SST.

5. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

5.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA

Valor del Contrato	$4.652.510.815
Adiciones	$2.326.253.542
Contrato más adiciones	$6.978.764.357
Pagos realizados (Acumulado)	$6.572.697.491
Saldo por pagar contra Liquidación	$ 406.066.866
Recursos No Ejecutados	$ 0
Porcentaje de Ejecución Financiera	94.18%

INTERVENTORÍA

Valor del Contrato	$ 800.000.000
Adiciones	$ 342.756.687
Contrato más adiciones	$1.142.756.687
Pagos realizados (Acumulado)	$1.085.496.090
Saldo por pagar contra Liquidación	$ 57.260.597
Recursos No Ejecutados	$ 0
Porcentaje de Ejecución financiera	94.99%

5.2. RELACIÓN DE PAGOS Y AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO (SI APLICA) DEL CONTRATO DE OBRA:

El contrato de obra No. 4600094137 de 2022 no tuvo anticipo.

5.3. CONTROL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO Y DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL CONTRATO DE OBRA:

El contrato de obra No. 4600094137 de 2022 no tiene anticipo.

5.4. RELACIÓN DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES:

Descripción Indicador	Valor Retención
Deducción Contribución Vías Especial 5,0%	$ 331.486.907
Estampilla Bienestar Adulto Mayor 2,0%	$ 132.594.762
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	$ 33.148.692
Estampilla Universidad de Antioquia 1,0%	$ 66.297.379
Retención Renta Construcción 2.0%	$ 132.594.762
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuerdo 64/12	$ 13.258.000
Tasa Pro deporte y Recreación 1.3%	$ 86.186.595
Total general	**$ 795.567.097**

5.5. RELACIÓN DE LOS IMPREVISTOS CAUSADOS, DEMOSTRADOS Y FACTURADOS

Durante el desarrollo del contrato no se presentaron imprevistos.

6. INFORME JURÍDICO:

6.1. RELACIÓN DE RECLAMACIONES:

A la fecha del presente Informe no se presentaron reclamaciones al Contrato de Obra.

6.2. RELACION DE SANCIONES:

A la fecha del presente Informe no se presentó ni se adelanta ningún proceso de multa y/o sanción.

6.3. CONTROL AL ESTADO DE LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA:

A continuación, se muestra cuadro acumulativo que refleja los datos identificativos del estado de todas y cada una de las coberturas que amparan a la entidad relacionada con la ejecución del contrato de obra y de Interventoría.

POLIZA CONTRATO INICIAL						
Nombre Aseguradora	**N° Póliza**	**Tipo de Amparo**	**Cobertura de la Póliza**		**Fecha de Aprobación de la Garantía**	**Valor Amparado**
			Desde	**Hasta**		
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	96-44-101171579 Anexo 0	Cumplimiento	23/03/2022	23/01/2023	28/04/2022	$ 465.251.081,50
		Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	23/03/2022	23/07/2025		$ 232.625.540,75
		Estabilidad y Calidad de la obra.	Sí, ampara 5 años, 0 meses y 0 días.			$ 465.251.081,50
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL						
SEGUROS DEL ESTADO S.A	96-40-101060630 Anexo 0	Predios labores y operaciones	23/03/2022	23/07/2022	28/04/2022	$500.000.000,00
		Contratistas y subcontratistas	23/03/2022	23/07/2022		$500.000.000,00
		Vehículos propios y no	23/03/2022	23/07/2022		$500.000.000,00

		propios				

POLIZA INICIO VIGENCIA						
Nombre Aseguradora	**N° Póliza**	**Tipo de Amparo**	**Cobertura de la Póliza**		**Fecha de Aprobación de la Garantía**	**Valor Amparado**
			Desde	**Hasta**		
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	96-44-101171579 Anexo 2	Cumplimiento	25/05/2022	27/03/2023		$ 465.251.081,50
		Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	25/05/2022	24/09/2025		$ 232.625.540,75
		Estabilidad y Calidad de la obra.	Sí, ampara 5 años, 0 meses y 0 días.			$ 465.251.081,50
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL						
SEGUROS DEL ESTADO S.A	96-40-101060630 Anexo 2	Predios labores y operaciones	25/05/2022	24/09/2022		$500.000.000,00
		Contratistas y subcontratistas	25/05/2022	24/09/2022		$500.000.000,00
		Vehículos propios y no propios	25/05/2022	24/09/2022		$500.000.000,00

POLIZA MODIFICACIÓN 01: ADICIÓN No. 1 – AMPLIACIÓN No. 1						
Nombre Aseguradora	**N° Póliza**	**Tipo de Amparo**	**Cobertura de la Póliza**		**Fecha de Aprobación de la Garantía**	**Valor Amparado**
			Desde	**Hasta**		
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	96-44-101171579 Anexo 4	Cumplimiento	25/05/2022	15/06/2023	19/10/2022	$ 697.876.435,70
		Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	25/05/2022	15/12/2025		$ 348.938.217,85
		Estabilidad y Calidad de la obra.	Sí, ampara 5 años, 0 meses y 0 días.			$ 697.876.435,70
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL						
SEGUROS DEL ESTADO S.A	96-40-101060630 Anexo 3	Predios labores y operaciones	25/05/2022	15/12/2022	19/10/2022	$500.000.000,00
		Contratistas y subcontratistas	25/05/2022	15/12/2022		$500.000.000,00
		Vehículos propios y no propios	25/05/2022	15/12/2022		$500.000.000,00

POLIZA MODIFICACIÓN 02: AMPLIACIÓN No. 2						
Nombre Aseguradora	**N° Póliza**	**Tipo de Amparo**	**Cobertura de la Póliza**		**Fecha de Aprobación de la Garantía**	**Valor Amparado**
			Desde	**Hasta**		
SEGUROS	96-44-101171579	Cumplimiento	25/05/2022	31/07/2023	15/03/2023	$ 848.782.130,90
		Pago de	25/05/202	31/03/202		$

DEL ESTADO S.A.	Anexo 6	salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	2	6		424.391.065,45
		Estabilidad y Calidad de la obra.	Sí, ampara 5 años, 0 meses y 0 días.			$ 848.782.130,90
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL						
SEGUROS DEL ESTADO S.A	96-40-101060630 Anexo 4	Predios labores y operaciones	25/05/2022	31/01/2023	15/03/2023	$500.000.000,00
		Contratistas y subcontratistas	25/05/2022	31/01/2023		$500.000.000,00
		Vehículos propios y no propios	25/05/2022	31/01/2023		$500.000.000,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DE LA OBRA:

A continuación, se muestra registro fotográfico de las principales actividades que se ejecutaron en el periodo de ejecuciones de las obras del proyecto comprendido entre el 22 de junio de 2022 que dio inicio la obra al 31 de enero de 2023.

CONSORCIO VIAS CC	**CONSORCIO VIAS CC**
	INTERVENTORÍA
	Proyecto: **PLAN VIAL RURAL**
	REGISTRO FOTOGRÁFICO

INFORME FINAL- CORREGIMIENTO SAN CRISTOBAL FRENTE Nº1 PAJARITO

	
FECHA DE FOTOGRAFÍA: 16/06/2022	FECHA DE FOTOGRAFÍA: 30/07/2022
UBICACIÓN: Frente N°1 Puente Pajarito	UBICACIÓN: Frente N°1 Puente Pajarito
Foto N°1. Vista panorámica estado puente inicial.	**Foto N°2.** Entibado de pilas para construcción cimentación de puente.

	
FECHA DE FOTOGRAFÍA: 24/08/2022	FECHA DE FOTOGRAFÍA: 31/10/2022
UBICACIÓN: Frente N°1 Puente Pajarito	UBICACIÓN: Frente N°1 Puente Pajarito
Foto N°3. Excavación y demolición de roca en pila.	**Foto N°4.** Instalación de canasta de acero de refuerzo de la pila de cimentación.

CONSORCIO VIAS CC	**CONSORCIO VIAS CC**
	INTERVENTORÍA
	Proyecto: **PLAN VIAL RURAL**

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
INFORME FINAL- CORREGIMIENTO SAN CRISTOBAL FRENTE Nº1 PAJARITO	
	
FECHA DE FOTOGRAFÍA: 14/12/2022	FECHA DE FOTOGRAFÍA: 15/12/2022
UBICACIÓN: Frente N°1 Puente Pajarito	UBICACIÓN: Frente N°1 Puente Pajarito
Foto N°5. Instalación de poliestireno expandido para aligerar losa del puente.	**Foto N°6.** Vaciado concreto losa de puente vehicular.

	
FECHA DE FOTOGRAFÍA: 21/01/2023	FECHA DE FOTOGRAFÍA: 03/02/2023
UBICACIÓN: Frente N°1 Puente Pajarito	UBICACIÓN: Frente N°1 Puente Pajarito
Foto N°7. Compactación de mezcla asfáltica con rodillo mixto.	**Foto N°8.** Vista final de ampliación de puente vehicular.

	INTERVENTORÍA
	Proyecto: **PLAN VIAL RURAL**
	REGISTRO FOTOGRÁFICO
INFORME FINAL- CORREGIMIENTO SAN CRISTOBAL FRENTE Nº2 NARANJAL	

	
FECHA DE FOTOGRAFÍA: 23/06/2022	FECHA DE FOTOGRAFÍA: 28/06/2022
UBICACIÓN: Frente N°2 Vereda Naranjal	UBICACIÓN: Frente N°2 Vereda Naranjal
Foto N°9. Vista panorámica de perdida de banca de la vía como consecuencia de deslizamientos producidos por falla geológica y constantes lluvias. Foto inicial sin intervención.	**Foto N°10.** Riego de material fresado para lleno, estabilización y conformación de banca para recuperación de vía.

	
FECHA DE FOTOGRAFÍA: 06/07/2022	FECHA DE FOTOGRAFÍA: 07/07/2022
UBICACIÓN: Frente N°2 Vereda Naranjal	UBICACIÓN: Frente N°2 Vereda Naranjal
Foto N°11. Compactación de material de fresado para realizar lleno por perdida de la	**Foto N°12.** Entrega de obra de mitigación, recuperación de banca con lleno en material

banca.	fresado.

CPS COLOMBIA / cpt / CONSORCIO VIAS CC	**CONSORCIO VIAS CC**
	INTERVENTORÍA
	Proyecto: **PLAN VIAL RURAL**
	REGISTRO FOTOGRÁFICO
INFORME FINAL- CORREGIMIENTO SAN CRISTOBAL FRENTE Nº3 SENDEROS LA LOMA	

	
FECHA DE FOTOGRAFÍA: 23/06/2022	FECHA DE FOTOGRAFÍA: 12/07/2022
UBICACIÓN: Frente N°3. Senderos La Loma	UBICACIÓN: Frente N°3. Senderos La Loma
Foto N°13. Vista panorámica del sendero. Foto inicial del frente.	**Foto N°14.** Demolición de concreto de sendero existente.

FECHA DE FOTOGRAFÍA: 30/07/2022	FECHA DE FOTOGRAFÍA: 24/08/2022
UBICACIÓN: Frente N°3. Senderos La Loma	UBICACIÓN: Frente N°3. Senderos La Loma
Foto N°15. Instalación de formaleta para conformación de escaleras.	**Foto N°16.** Vaciado de escalas del tramo N°12.

CPS COLOMBIA cpt CONSORCIO VIAS CC	**CONSORCIO VIAS CC**
	INTERVENTORÍA
	Proyecto: **PLAN VIAL RURAL**
	REGISTRO FOTOGRÁFICO
INFORME FINAL- CORREGIMIENTO SAN CRISTOBAL FRENTE Nº3 SENDEROS LA LOMA	

	
FECHA DE FOTOGRAFÍA: 14/09/2022	FECHA DE FOTOGRAFÍA: 26/10/2022
UBICACIÓN: Frente N°3. Senderos La Loma	UBICACIÓN: Frente N°3. Senderos La Loma
Foto N°17. Excavación para conformación de terreno tramo N°19	**Foto N°18.** Vista panorámica de construcción de escalas.

	
FECHA DE FOTOGRAFÍA: 28/12/2022	FECHA DE FOTOGRAFÍA: 03/02/2023
UBICACIÓN: Frente N°3. Senderos La Loma	UBICACIÓN: Frente N°3. Senderos La Loma
Foto N°19. Vaciado de concreto tramo de cunetas en V.	**Foto N°20.** Vista panorámica de tramo terminado con escalas, cunetas y pasamanos.

CPS COLOMBIA cpt CONSORCIO VIAS CC	**CONSORCIO VIAS CC**	
	INTERVENTORÍA	
	Proyecto:	**PLAN VIAL RURAL**
	REGISTRO FOTOGRÁFICO	
INFORME FINAL- CORREGIMIENTO SAN CRISTOBAL FRENTE Nº4 LA PALMA		

	
FECHA DE FOTOGRAFÍA: 11/01/2023	FECHA DE FOTOGRAFÍA: 17/01/2023
UBICACIÓN: Frente N°4. Vereda La Palma	UBICACIÓN: Frente N°4. Vereda La Palma

Foto N°21. Instalación de formaleta para vaciado de escalones de canal rectangular tramo Nº1.	**Foto N°22.** Vaciado concreto de escaleras canal rectangular.

	
FECHA DE FOTOGRAFÍA: 31/01/2023	FECHA DE FOTOGRAFÍA: 03/02/2023
UBICACIÓN: Frente N°4. Vereda La Palma	UBICACIÓN: Frente N°4. Vereda La Palma
Foto N°23. Losa de piso, escalas canal rectangular vaciado. E instalación de acero de refuerzo muros canal rectangular tramo Nº3.	**Foto N°24.** Vista de construcción de canal rectangular y cabezote de descarga a la quebrada.

CPS COLOMBIA cpt CONSORCIO VIAS CC	**CONSORCIO VIAS CC**
	INTERVENTORÍA
	Proyecto: **PLAN VIAL RURAL**
	REGISTRO FOTOGRÁFICO
INFORME FINAL- CORREGIMIENTO SAN CRISTOBAL FRENTE Nº4 LA PALMA	

	
FECHA DE FOTOGRAFÍA: 29/10/2022	FECHA DE FOTOGRAFÍA: 12/12/2022
UBICACIÓN: Frente N°4 Vereda La Palma	UBICACIÓN: Frente N°4. Vereda La Palma
Foto N°25. Construcción de variante sector los maya, compactación de material fresado para conformación de la estructura.	**Foto N°26.** Instalación de tubería PVC de 900mm.

	
FECHA DE FOTOGRAFÍA: 31/01/2023	FECHA DE FOTOGRAFÍA: 31/01/2023
UBICACIÓN: Frente N°4. Vereda La Palma	UBICACIÓN: Frente N°4. Vereda La Palma
Foto N°27. Construcción de caja de inspección.	**Foto N°28.** Llenos con material seleccionado cajas de inspección con su respectiva compactación.

	Proyecto:	**PLAN VIAL RURAL**
	REGISTRO FOTOGRÁFICO	
INFORME FINAL- CORREGIMIENTO SAN CRISTOBAL FRENTE Nº4 LA PALMA		

	
FECHA DE FOTOGRAFÍA: 08/08/2022	FECHA DE FOTOGRAFÍA: 23/12/2022
UBICACIÓN: Frente N°4. Vereda la Palma	UBICACIÓN: Frente N°4. Vereda La Palma
Foto N°29. Levantamiento topográfico solicitado por la SIF en el punto de los maya.	**Foto N°30.** Armado de acero de refuerzo para placa en concreto en zona de construcción muro de contención en gaviones.

	
FECHA DE FOTOGRAFÍA: 13/01/2023	FECHA DE FOTOGRAFÍA: 24/01/2023
UBICACIÓN: Frente N°4. Vereda La Palma	UBICACIÓN: Frente N°4. Vereda La Palma
Foto N°31. Instalación de geotextil para aumentar la resistencia del lleno, es separador y sirve como filtro de los gaviones.	**Foto N°32.** Vista panorámica de construcción de muro contención en gaviones.

CPS COLOMBIA cpt CONSORCIO VIAS CC	**CONSORCIO VIAS CC**
	INTERVENTORÍA
	Proyecto: **PLAN VIAL RURAL**
	REGISTRO FOTOGRÁFICO
INFORME FINAL- CORREGIMIENTO SAN CRISTOBAL FRENTE Nº5 EL YOLOMBO	

	
FECHA DE FOTOGRAFÍA: 08/05/2022	FECHA DE FOTOGRAFÍA: 19/07/2022
UBICACIÓN: Frente N°5. Vereda El Yolombo	UBICACIÓN: Frente N°5. Vereda El Yolombo
Foto N°33. Recorrido para verificar estado de la dirección de intervención. Foto inicial.	**Foto N°34.** Rocería y descapote para conformación de cunetas a ambos lados de la vía

	
FECHA DE FOTOGRAFÍA: 12/08/2022	FECHA DE FOTOGRAFÍA: 16/11/2022
UBICACIÓN: Frente N°5. Vereda El	UBICACIÓN: Frente N°3. Senderos La Loma

Yolombo	
Foto N°35. Vista panorámica de formaleta y vaciado para la construcción de cunetas.	**Foto N°36.** Vista panorámica de construcción de cunetas finales.

CPS COLOMBIA cpt CONSORCIO VIAS CC	**CONSORCIO VIAS CC**	
	INTERVENTORÍA	
	Proyecto:	**PLAN VIAL RURAL**
	REGISTRO FOTOGRÁFICO	
INFORME FINAL- CORREGIMIENTO SAN CRISTOBAL FRENTE Nº6 BOQUERON		

	
FECHA DE FOTOGRAFÍA: 21/06/2022	FECHA DE FOTOGRAFÍA: 21/07/2022
UBICACIÓN: Frente N°6. Vereda Boquerón	UBICACIÓN: Frente N°6. Vereda Boquerón
Foto N°37. Vista panorámica de frente inicial, sin intervención.	**Foto N°38.** Excavación y limpieza para construcción de obra para protección de red de acueducto.

	
FECHA DE FOTOGRAFÍA: 03/08/2022	FECHA DE FOTOGRAFÍA: 12/08/2022
UBICACIÓN: Frente N°6. Vereda Boquerón	UBICACIÓN: Frente N°6. Vereda Boquerón
Foto N°39. Excavación de brecha para construcción de estructura en concreto ciclópeo.	**Foto N°40.** Vaciado de estructura en concreto ciclópeo para protección de acueducto.

CONSORCIO VIAS CC	**CONSORCIO VIAS CC**
	INTERVENTORÍA
	Proyecto: **PLAN VIAL RURAL**
	REGISTRO FOTOGRÁFICO
INFORME FINAL- CORREGIMIENTO SAN CRISTOBAL FRENTE Nº6 BOQUERON	

	
FECHA DE FOTOGRAFÍA: 30/11/2022	FECHA DE FOTOGRAFÍA: 24/08/2022
UBICACIÓN: Frente N°6. Vereda Boquerón	UBICACIÓN: Frente N°6. Vereda Boquerón
Foto N°41. Vista panorámica estado de protección a red de acueducto terminada.	**Foto N°42.** Estado inicial de la vía.

	
FECHA DE FOTOGRAFÍA: 09/09/2022	FECHA DE FOTOGRAFÍA: 16/09/2022
UBICACIÓN: Frente N°6. Vereda Boquerón	UBICACIÓN: Frente N°6. Vereda Boquerón
Foto N°43. Compactación de mezcla asfáltica.	**Foto N°44.** Vista panorámica de mitigación de tramo de vía.

CPS COLOMBIA cpt CONSORCIO VIAS CC	**CONSORCIO VIAS CC**
	INTERVENTORÍA
	Proyecto: **PLAN VIAL RURAL**
	REGISTRO FOTOGRÁFICO
INFORME FINAL- CORREGIMIENTO SANTA ELENA FRENTE Nº1 BARRO BLANCO	
	
FECHA DE FOTOGRAFÍA: 02/07/2022	FECHA DE FOTOGRAFÍA: 28/07/2022

UBICACIÓN: Frente N°1. Vereda Barro Blanco	UBICACIÓN: Frente N°1. Vereda Barro Blanco
Foto N°45. Vista panorámica de frente inicial, sin intervención.	**Foto N°46.** Instalación y compactación de mezcla asfáltica en caliente tipo MSC 19 con fibra.
	
FECHA DE FOTOGRAFÍA: 29/07/2022	FECHA DE FOTOGRAFÍA: 1/08/2022
UBICACIÓN: Frente N°1. Vereda Barro Blanco	UBICACIÓN: Frente N°1. Vereda Barro Blanco
Foto N°47. Imprimación con liga caliente para pavimentos.	**Foto N°48.** Fresado de pavimento flexible.

CPS COLOMBIA cpt CONSORCIO VIAS CC	**CONSORCIO VIAS CC**	
	INTERVENTORÍA	
	Proyecto:	**PLAN VIAL RURAL**
	REGISTRO FOTOGRÁFICO	
INFORME FINAL- CORREGIMIENTO SANTA ELENA FRENTE Nº1 BARRO BLANCO		

	
FECHA DE FOTOGRAFÍA: 3/08/2022	FECHA DE FOTOGRAFÍA: 24/11/2022
UBICACIÓN: Frente N°1. Vereda Barro Blanco	UBICACIÓN: Frente N°1. Vereda Barro Blanco
Foto N°49. Instalación de mezcla asfáltica en caliente tipo MSC 19 con fibra segunda capa.	**Foto N°50.** Rebite de juntas cordones.

	
FECHA DE FOTOGRAFÍA: 18/01/2023	FECHA DE FOTOGRAFÍA: 25/01/2023
UBICACIÓN: Frente N°1. Vereda Barro Blanco	UBICACIÓN: Frente N°1. Vereda Barro Blanco
Foto N°51. Construcción de reductores de velocidad y señalización horizontal de acuerdo al manual de señalización vial.	**Foto N°52.** Vista final de instalación de carpeta asfáltica y obras complementarias de cordonería.

CPS COLOMBIA cpt CONSORCIO VIAS CC	**CONSORCIO VIAS CC**
	INTERVENTORÍA
	Proyecto: **PLAN VIAL RURAL**
	REGISTRO FOTOGRÁFICO
INFORME FINAL- CORREGIMIENTO SANTA ELENA FRENTE Nº2 PIEDRAS BLANCAS	

	
FECHA DE FOTOGRAFÍA: 28/07/2022	FECHA DE FOTOGRAFÍA: 28/07/2022
UBICACIÓN: Frente N°2. Piedras Blancas	UBICACIÓN: Frente N°2. Piedras Blancas
Foto N°53. Disposición de material fresado proveniente de la demolición del pavimento de la vereda Barro Blanco para conformación de estructura	**Foto N°54.** Disposición de material fresado proveniente del pavimento de la vereda Barro Blanco para conformación de estructura

	
FECHA DE FOTOGRAFÍA: 28/07/2022	FECHA DE FOTOGRAFÍA: 28/07/2022
UBICACIÓN: Frente N°2. Piedras Blancas	UBICACIÓN: Frente N°2. Piedras Blancas
Foto N°55. Riego y nivelación de fresado.	**Foto N°56.** Compactación de material fresado.

CPS COLOMBIA cpt CONSORCIO VIAS CC	**CONSORCIO VIAS CC**
	INTERVENTORÍA
	Proyecto: **PLAN VIAL RURAL**
	REGISTRO FOTOGRÁFICO
INFORME FINAL- CORREGIMIENTO SANTA ELENA FRENTE Nº3 PANTANILLO	

	
FECHA DE FOTOGRAFÍA: 29/09/2022	FECHA DE FOTOGRAFÍA: 30/09/2022
UBICACIÓN: Frente N°2. Vereda Pantanillo	UBICACIÓN: Frente N°2. Vereda Pantanillo
Foto N°57. Vista inicial de estado de pavimento.	**Foto N°58.** Compactación de material fresado para conformación de la estructura.

	
FECHA DE FOTOGRAFÍA: 03/10/2022	FECHA DE FOTOGRAFÍA: 04/10/2022
UBICACIÓN: Frente N°2. Vereda Pantanillo	UBICACIÓN: Frente N°2. Vereda Pantanillo

Foto N°59. Compactación de mezcla asfáltica.	**Foto N°60.** Colocación de mezcla asfáltica en caliente tipo MSC 19 con fibra con finisher.

CPS COLOMBIA cpt CONSORCIO VIAS CC	**CONSORCIO VIAS CC**
	INTERVENTORÍA
	Proyecto: **PLAN VIAL RURAL**
	REGISTRO FOTOGRÁFICO
INFORME FINAL- CORREGIMIENTO SANTA ELENA FRENTE Nº3 PANTANILLO	
	
FECHA DE FOTOGRAFÍA: 29/09/2022	FECHA DE FOTOGRAFÍA: 30/12/2022
UBICACIÓN: Frente N°2. Vereda Pantanillo	UBICACIÓN: Frente N°2. Vereda Pantanillo
Foto N°61. Vista inicial de estado de pavimento.	**Foto N°62.** Vista panorámica de obras complementarias (cordonería).

	
FECHA DE FOTOGRAFÍA: 25/01/2023	FECHA DE FOTOGRAFÍA: 25/01/2023
UBICACIÓN: Frente N°2. Vereda Pantanillo	UBICACIÓN: Frente N°2. Vereda Pantanillo
Foto N°63. Vista final y estado de carpeta asfáltica aplicada.	**Foto N°64.** Señalización horizontal de reductores de velocidad

CPS COLOMBIA cpt CONSORCIO VIAS CC	**CONSORCIO VIAS CC**
	INTERVENTORÍA
	Proyecto: **PLAN VIAL RURAL**
	REGISTRO FOTOGRÁFICO
INFORME FINAL- CORREGIMIENTO SAN ANTONIO DE PRADO FRENTE Nº1 LA FLORIDA	

	
FECHA DE FOTOGRAFÍA: 12/07/2022	FECHA DE FOTOGRAFÍA: 13/09/2022
UBICACIÓN: Frente N°1. La Florida parte alta	UBICACIÓN: Frente N°1. La Florida parte alta

Foto N°65. Vista panorámica del estado inicial del pavimento.	**Foto N°66.** Imprimación con liga en caliente para pavimentos.
	
FECHA DE FOTOGRAFÍA: 13/09/2022	FECHA DE FOTOGRAFÍA: 19/09/2022
UBICACIÓN: Frente N°1. La Florida parte alta	UBICACIÓN: Frente N°1. La Florida parte alta
Foto N°67. Colocación de mezcla asfáltica en caliente tipo MSC 19 con fibra con finisher.	**Foto N°68.** Vista final de instalación de carpeta asfáltica.

CPS COLOMBIA cpt CONSORCIO VIAS CC	**CONSORCIO VIAS CC**
	INTERVENTORÍA
	Proyecto: **PLAN VIAL RURAL**
	REGISTRO FOTOGRÁFICO
INFORME FINAL- CORREGIMIENTO SAN ANTONIO DE PRADO FRENTE Nº2 LA FLORIDA	

	
FECHA DE FOTOGRAFÍA: 27/08/2022	FECHA DE FOTOGRAFÍA: 14/09/2022
UBICACIÓN: Frente N°2. La Florida parte baja.	UBICACIÓN: Frente N°2. La Florida parte baja.
Foto N°69. Vista panorámica de obras complementarias (cordonería).	**Foto N°70.** Compactación de estructura en fresado para conformación de la vía.

	
FECHA DE FOTOGRAFÍA: 14/09/2022	FECHA DE FOTOGRAFÍA: 08/10/2022
UBICACIÓN: Frente N°2. La Florida parte baja	UBICACIÓN: Frente N°2. La Florida parte baja
Foto N°71. Colocación de mezcla asfáltica en caliente tipo MSC 19 con fibra con finisher.	**Foto N°72.** Vista final de instalación de carpeta asfáltica y obras complementarias de cordonería.

CPS COLOMBIA cpt CONSORCIO VIAS CC	**CONSORCIO VIAS CC**
	INTERVENTORÍA
	Proyecto: **PLAN VIAL RURAL**
	REGISTRO FOTOGRÁFICO
INFORME FINAL- CORREGIMIENTO SAN ANTONIO DE PRADO FRENTE Nº3 LA VERDE	

	
FECHA DE FOTOGRAFÍA: 13/09/2022	FECHA DE FOTOGRAFÍA: 15/09/2022
UBICACIÓN: Frente N°3. Vda La Verde tramo 1	UBICACIÓN: Frente N°3. Vda La Verde tramo 1
Foto N°73. Vista inicial de tramo a intervenir.	**Foto N°74.** Fresado y demolición del pavimento flexible existente de e=0,10cm.

	
FECHA DE FOTOGRAFÍA: 16/09/2022	FECHA DE FOTOGRAFÍA: 16/09/2022
UBICACIÓN: Frente N°3. Vda La Verde tramo 1	UBICACIÓN: Frente N°3. Vda La Verde tramo 1
Foto N°75. Compactación de fresado de nivelación por fallo en sitio.	**Foto N°76.** Vista de acabado tramo intervenido.

CPS COLOMBIA cpt CONSORCIO VIAS CC	**CONSORCIO VIAS CC**
	INTERVENTORÍA
	Proyecto: **PLAN VIAL RURAL**
	REGISTRO FOTOGRÁFICO
INFORME FINAL- CORREGIMIENTO SAN ANTONIO DE PRADO FRENTE Nº3 LA VERDE	

	
FECHA DE FOTOGRAFÍA: 15/09/2022	FECHA DE FOTOGRAFÍA: 19/09/2022
UBICACIÓN: Frente N°3. Vda La Verde tramo 2	UBICACIÓN: Frente N°3. Vda La Verde tramo 2
Foto N°77. Vista inicial de tramo a intervenir.	**Foto N°78.** Demolición y retiro de pavimento que no logró intervenir la fresadora por condiciones del terreno.

FECHA DE FOTOGRAFÍA: 19/09/2022	FECHA DE FOTOGRAFÍA: 08/10/2022
UBICACIÓN: Frente N°3. Vda La Verde tramo 2	UBICACIÓN: Frente N°3. Vda La Verde tramo 2
Foto N°79. Compactación de estructura existente.	**Foto N°80.** Vista final de instalación de carpeta asfáltica e Instalación de cordonería.

CPS COLOMBIA cpt CONSORCIO VIAS CC	**CONSORCIO VIAS CC**
	INTERVENTORÍA
	Proyecto: **PLAN VIAL RURAL**
	REGISTRO FOTOGRÁFICO
INFORME FINAL- CORREGIMIENTO ALTAVISTA FRENTE Nº1 MIRADORES	

	
FECHA DE FOTOGRAFÍA: 22/09/2022	FECHA DE FOTOGRAFÍA: 22/09/2022
UBICACIÓN: Frente N°1. Miradores parte baja	UBICACIÓN: Frente N°1. Miradores parte baja
Foto N°81. Vista inicial del tramo a intervenir. Fresado de pavimento flexible existente.	**Foto N°82.** Imprimación con liga en caliente.

	
FECHA DE FOTOGRAFÍA: 22/09/2022	FECHA DE FOTOGRAFÍA: 26/09/2022
UBICACIÓN: Frente N°1. Miradores parte baja	UBICACIÓN: Frente N°1. Miradores parte baja
Foto N°83. Instalación de mezcla asfáltica en caliente y compactación de la misma.	**Foto N°84.** Vista final de instalación de carpeta asfáltica

CPS COLOMBIA cpt CONSORCIO VIAS CC	**CONSORCIO VIAS CC**
	INTERVENTORÍA
	Proyecto: **PLAN VIAL RURAL**
	REGISTRO FOTOGRÁFICO
INFORME FINAL- CORREGIMIENTO ALTAVISTA FRENTE Nº2 MORRO CORAZONES 1	

	
FECHA DE FOTOGRAFÍA: 31/08/2022	FECHA DE FOTOGRAFÍA: 02/11/2022
UBICACIÓN: Frente N°2. Morro Corazones 1	UBICACIÓN: Frente N°2. Morro Corazones 1
Foto N°85. Vista panorámica de tramo inicial sin intervenir.	**Foto N°86.** Aplicación de mezcla asfáltica en caliente tipo MSC 19 con fibra sobre pavimento antiguo.

	
FECHA DE FOTOGRAFÍA: 02/11/2022	FECHA DE FOTOGRAFÍA: 02/11/2022
UBICACIÓN: Frente N°2. Morro Corazones 1	UBICACIÓN: Frente N°2. Morro Corazones 1

Foto N°87. Compactación de mezcla asfáltica en caliente tipo MSC 19 con fibra.	**Foto N°88.** Vista final de instalación de carpeta asfáltica

CPS COLOMBIA cpt CONSORCIO VIAS CC	**CONSORCIO VIAS CC**
	INTERVENTORÍA
	Proyecto: **PLAN VIAL RURAL**
	REGISTRO FOTOGRÁFICO
INFORME FINAL- CORREGIMIENTO ALTAVISTA FRENTE Nº2 MORRO CORAZONES 2	

	
FECHA DE FOTOGRAFÍA: 31/08/2022	FECHA DE FOTOGRAFÍA: 03/11/2022
UBICACIÓN: Frente N°2. Morro Corazones 2	UBICACIÓN: Frente N°2. Morro Corazones 2
Foto N°89. Vista panorámica de tramo inicial sin intervenir.	**Foto N°90.** Imprimación de liga en caliente con carro irrigador.

FECHA DE FOTOGRAFÍA: 03/11/2022	FECHA DE FOTOGRAFÍA: 23/01/2023
UBICACIÓN: Frente N°2. Morro Corazones 2	UBICACIÓN: Frente N°2. Morro Corazones 2
Foto N°91. Compactación de mezcla asfáltica en caliente tipo MSC 19 con fibra.	**Foto N°92.** Realce de MH y construcción de reductor de velocidad.

CPS COLOMBIA cpt CONSORCIO VIAS CC	**CONSORCIO VIAS CC**
	INTERVENTORÍA
	Proyecto: **PLAN VIAL RURAL**
	REGISTRO FOTOGRÁFICO
INFORME FINAL- CORREGIMIENTO ALTAVISTA FRENTE Nº3 MANZANILLO	

	
FECHA DE FOTOGRAFÍA: 22/09/2022	FECHA DE FOTOGRAFÍA: 22/11/2022
UBICACIÓN: Frente N°3. Vereda Manzanillo	UBICACIÓN: Frente N°3. Vereda Manzanillo
Foto N°93. Tramo de losas puntuales para reparar.	**Foto N°94.** Vibrado de concreto.

	
FECHA DE FOTOGRAFÍA: 22/11/2022	FECHA DE FOTOGRAFÍA: 30/11/2022
UBICACIÓN: Frente N°3. Vereda Manzanillo	UBICACIÓN: Frente N°3. Vereda Manzanillo
Foto N°95. Instalación de dovelas para transferencia de esfuerzos.	**Foto N°96.** Demolición, cajeo y limpieza de zona para instalación de MR42.

	
FECHA DE FOTOGRAFÍA: 23/11/2022	FECHA DE FOTOGRAFÍA: 06/12/2022
UBICACIÓN: Frente N°3. Vereda Manzanillo	UBICACIÓN: Frente N°3. Vereda Manzanillo
Foto N°97. Corte de juntas para dilatación.	**Foto N°98.** Vista de zona intervenida de pavimento rígido.

INFORME FINAL- CORREGIMIENTO DE PALMITA FRENTE Nº1 LA FRISOLA	
	
FECHA DE FOTOGRAFÍA: 23/08/2022	FECHA DE FOTOGRAFÍA: 25/08/2022
UBICACIÓN: Frente N°1. Vereda La Frisola	UBICACIÓN: Frente N°1. Vereda La Frisola
Foto N°99. Levantamiento topográfico de la quebrada 100 m aguas abajo y arriba.	**Foto N°100.** Levantamiento topográfico de la quebrada 100 m aguas abajo y arriba.

7. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES GENERALES DE LA INTERVENTORÍA SOBRE EL DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA:

- La Interventoría informa que las obras contractuales (10), las obras que se incluyeron (6) y la adición (1), en total 17 frentes fueron intervenidos y ejecutados en un 100%. Se logró suplir algunas de las necesidades de la comunidad que habitan en los sectores intervenidos en los corregimientos de San Cristóbal, Santa Elena, San Antonio de Prado y Altavista, en su mayoría se intervinieron vías en pavimento flexible y rígido que requirieron la construcción de andenes, cordones, cunetas y realces con el fin de mejorar la movilidad, el drenaje de las vías y lograr una superficie de rodadura más uniforme, contribuyendo al mejoramiento de la movilidad vehicular y peatonal. Adicionalmente, también se intervino la ampliación del puente Pajarito, la construcción de la variante en la Vereda la Palma con inicio en las obras hidráulicas, la cuales se requerían por causa de deslizamiento con pérdida de banca de grandes dimensiones, lo cual dejo la vereda completamente incomunicada.

FRENTES	CORREGIMIENTO	ESTADO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	ENTREGADOS A LA COMUNIDAD

FRENTES	CORREGIMIENTO	ESTADO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	ENTREGADOS A LA COMUNIDAD
Frente N°1. Puente Vehicular Pajarito Cr118 con Calle 64FF.	San Cristóbal	Incluido	Puente	
Frente N°2. Naranjal_ Estabilización Con Material Fresado	San Cristóbal	Incluido	Lleno con fresado (mitigación)	x
Frente N°3. Senderos “La Loma” Calle 55 #131- 116 Y Calle 55 #131- 182	San Cristóbal	Contractual	Anden (escaleras con cunetas y pasamanos)	x
Frente N°4. Vereda La Palma	San Cristóbal	Adición	Estructuras hidráulicas y Tratamiento cárcava	x
Frente N°5. Vereda El Yolombo Sector Cr 106 # 106-409.	San Cristóbal	Contractual	Cunetas	x
Frente N°6. Boquerón	San Cristóbal	Incluido	Pavimento Flexible (mitigación) y Protección Red De Acueducto.	x
Frente N°7. Barro Blanco	Santa Elena	Incluido	Pavimento Flexible y Cordones	x
Frente N°8. Piedras Blancas	Santa Elena	Incluido	Riego de fresado	
Frente N9. Vía Pantanillo	Santa Elena	Incluido	Pavimento Flexible	x

FRENTES	CORREGIMIENTO	ESTADO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	ENTREGADOS A LA COMUNIDAD
Frente N°10. Florida Parte Alta	San Antonio de Prado	Contractual	Pavimento Flexible	x
Frente N°11. Florida Parte Baja	San Antonio de Prado	Contractual	Pavimento Flexible y Cordones	x
Frente N°12. La Verde	San Antonio de Prado	Contractual	Pavimento Flexible y Cordones	x
Frente N°13. Miradores Parte Baja	Altavista	Contractual	Pavimento Flexible	x
Frente N°14. Morro Corazones Tramo 1	Altavista	Contractual	Pavimento Flexible	x
Frente N°15. Morro Corazones Tramo 2	Altavista	Contractual	Pavimento Flexible	x
Frente N°16. Manzanillo	Altavista	Contractual	Pavimento Rígido	x

- La Interventoría informa que el contratista no realizó la entrega de la programación actualizada hasta el plazo de la segunda adición para la ejecución de las obras, la cual caducaba el día 31 de enero de 2023, a la fecha de cierre del presente informe siendo 9 de febrero de 2023 el contratista termina los detalles los frentes contractuales que tenía pendiente al corte del 31 de enero de 2023, Por otro lado, para el frente de la adición en la Vereda la Palma en el corregimiento de San Cristóbal, también se logró dar cumplimiento con la entrega de las obras, estaba pendiente por finalizar la construcción de las estructuras hidráulicas las cuales el día 9 de febrero se culminan: la construcción de cajas de inspección de la tubería PVC de 900 mm, el canal rectangular y riego de fresado de la vía construida para dejar las obras en condiciones óptimas para el beneficio de la comunidad.

- Las actividades del frente Pajarito - San Cristóbal se ejecutar pese a las dificultades que se presentaron desde el inicio de la construcción, inicialmente con la elaboración de los diseños del puente que fueron entregados el 20 de mayo de 2022 y que después durante el proceso dado que una vez en campo técnicamente fue necesario ajustar los diseños en varias ocasiones por parte de la Secretaría de Infraestructura Física los cuales fueron entregados:

el 22 de julio de 2022 y los diseños finales el 26 de septiembre de 2022. El día 15 de diciembre de 2022 se logra vaciar la súper estructura del puente y el día 21 de enero de 2023 se culmina la construcción de puente con la pavimentación y la instalación de defensas viales del puente

- Las actividades de construcción de escaleras y obras complementarias ejecutar; función del acarreo interno de materiales de construcción que debían realizar los trabajadores con un terreno de difícil acceso, alta pendiente, lo cual hacía que el rendimiento de las actividades fuera menor. El contratista logra ejecutar al 100% las obras definidas inicialmente.

- Se realizaron los vaciados de estructuras y actividades de pavimentación en los frentes de trabajo de los corregimientos de San Cristóbal, Santa Elena, San Antonio de Prado y Altavista y durante toda la ejecución de proyecto no realizó la debida entrega del diseño de mezclas de concretos y el diseño de mezclas asfáltica a la Interventoría de ninguno de los frentes intervenidos, es una de las funciones por parte de la Interventoría que se verifique y apruebe la existencia de condiciones técnicas necesarias antes de iniciar cualquier actividad que lo requiera. Por lo que se deja constancia que el contratista en muchas ocasiones no atendió oportunamente los requerimientos técnicos durante la ejecución de la obra.

- Con base a que no se hizo la entrega oficial de los diseños de mezclas de concreto, era importante y una obligación del contratista realizar la toma de muestras de cilindros de concretos periódicamente a las estructuras construidas para obtener los resultados de los ensayos y poder determinar el cumplimiento de la resistencia especificada (definida en el presupuesto). A la fecha de cierre del presente informe se logró recibir una parte de los resultados de resistencias.

- Se lograron subsanar los pendientes que se tenían en los frentes de trabajo de los corregimientos de Santa Elena y Altavista, dejando las obras en condiciones óptimas para el beneficio de la comunidad.

- Durante la ejecución de las obras es importante contar con un personal idóneo y suficiente, un personal profesional que supervise las actividades de construcción y procesos constructivos, una persona que pueda controlar, dar solución y tomar decisiones en campo, para que no se presenten pérdidas de tiempo y retrocesos de las actividades.

- El control de seguridad, las capacitaciones, las revisiones periódicas y los simulacros fueron vitales para controlar el índice de accidentalidad en los colaboradores del contrato de obra.

Atentamente,



YENY MARCELA PEREZ VELASQUEZ
Interventor
Matrícula profesional: 05202162695 ANT
Fecha de elaboración: 30 de marzo 2023

ANEXOS

ANEXO 1-PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA
ANEXO 2-BITÁCORA DE OBRA
ANEXO 3-COMPONENTE AMBIENTAL
ANEXO 4-COMPONENTE SOCIAL
ANEXO 5-COMPONENTE SST
ANEXO 6-CONTROL DE LLUVIAS
ANEXO 7-CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA
ANEXO 8-INFORMES SEMANALES
ANEXO 9-REGISTRO FOTOGRAFICO
ANEXO 10-ACTAS DE VECINDAD (NO SE PRESENTAN DURANTE EL PERIODO)
ANEXO 11-CONTROL DE CALIDAD
ANEXO 12-COMITÉS Y ACTAS DE RECORRIDO
