ALCALDIA MAYOR DE TUNJA	**ALCALDIA DE TUNJA**	**FECHA: 10/06/2022**
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	**VERSION: 02**
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA	**CODIGO: GIN-F- 031**
	FORMATO:INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO



INFORME No.	1	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	08 de JUNIO de 2023	AL	04 de AGOSTO de 2023
OBJETO	SIT-75 SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO INCLUYE TRANSPORTE, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE TUNJA.				
LOCALIZACIÓN	MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ				


CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**		
CONTRATO No.:	NA	CONTRATO No.:		1145
CONTRATISTA:	NA	CONTRATISTA:		EDWIN HANDER LA ROTTA GARCIA
PLAZO INICIAL:	NA	PLAZO INICIAL:		SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	NA	FECHA DE INICIACIÓN:		08 DE JUNIO DE 2023
*FECHA DE SUSPENSIÓN:	NA	*FECHA DE SUSPENSIÓN:		N/A
*FECHA DE REINICIACIÓN:	NA	*FECHA DE REINICIACIÓN:		N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	NA	FECHA DE TERMINACIÓN:		08 DE DICIEMBRE 2023
PLAZO ACTUALIZADO:	NA	PLAZO ACTUALIZADO:		N/A
VALOR INICIAL :	NA	VALOR INICIAL :	$	450.000.000,00
VALOR ADICION(ES):	NA	VALOR ADICION(ES):		N/A
VALOR ACTUALIZADO:	NA	VALOR ACTUALIZADO:		N/A
VALOR PAGADO:	NA	VALOR PAGADO:		$ 0
VALOR POR PAGAR:	NA	VALOR POR PAGAR:	$	450.000.000,00

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

3. INFORME DE ACTIVIDADES

No.	LUGAR				ACTIVIDAD REALIZADA	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES	% AVANCE FISICO	SOPORTES / REGISTRO FOTOGRAFICO	
	SECTOR	BARRIO	DIRECCION					ANTES	DESPUES
1	7	VEREDA PORVENIR			Entrega MATERIAL AFIRMADO	Entrega 76 VIAJES de afirmado para ser extenido y compactadio con la maquinaria del municipio.	0,52	**N.A**	
2	2	VEREDA TRAS DEL ALTO			Entrega MATERIAL AFIRMADO	Entrega 35 VIAJES de afirmado para ser extenido y compactadio con la maquinaria del municipio.	0,52	**N.A**	

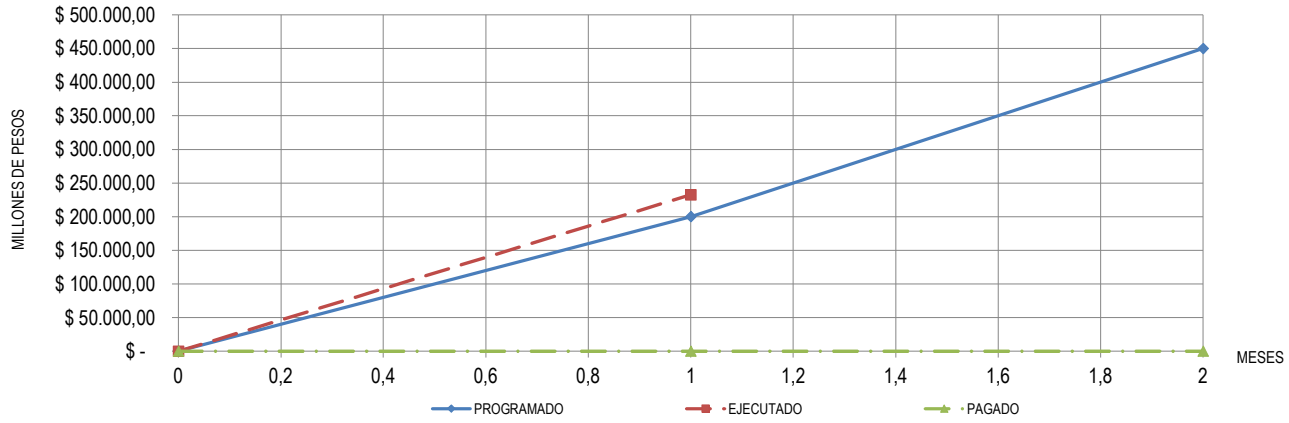
		PLAZA MERCADO SUR			Entrega MATERIAL AFIRMADO	Entrega 14 VIAJES de afirmado para ser extenido y compactadio con la maquinaria del municipio.	0,52	**N.A**	 
		CIUDAD JARDIN SECTOR CABAÑA			Entrega MATERIAL AFIRMADO	Entrega 18 VIAJES de afirmado para ser extenido y compactadio con la maquinaria del municipio.	0,52	**N.A**	 
		VEREDA RUNTA ARRIBA			Entrega MATERIAL AFIRMADO	Entrega 11 VIAJES de afirmado para ser extenido y compactadio con la maquinaria del municipio.	0,52	**N.A**	 
		LIBERTADOR			Entrega MATERIAL AFIRMADO	Entrega 8 VIAJES de afirmado para ser extenido y compactadio con la maquinaria del municipio.	0,52	**N.A**	 

		VEREDA FLORENCIA				Entrega MATERIAL AFIRMADO	Entrega 16 VIAJES de afirmado para ser extenido y compactadio con la maquinaria del municipio.	0,52	**N.A**	 
		MANZANARE				Entrega MATERIAL AFIRMADO	Entrega 9 VIAJES de afirmado para ser extenido y compactadio con la maquinaria del municipio.	0,52	**N.A**	 
		VEREDA FLORENCIA SECTOR EL CANGAREJO				Entrega MATERIAL AFIRMADO	Entrega 15 VIAJES de afirmado para ser extenido y compactadio con la maquinaria del municipio.	0,52	**N.A**	 
3	2	VEREDA PRGUA				Entrega MATERIAL AFIRMADO	Entrega 13 VIAJES de afirmado para ser extenido y compactadio con la maquinaria del municipio.	0,52	**N.A**	 
								5,20		

4. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE OBRA		
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
N.A			Cunta de cobro parcial 1	EN TRAMITE	$ 232.605.919,68

5. CURVA "S"



PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoria.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago).

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

En tramite adicion del contrato

7. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA SUPERVISIÓN

SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISION
PEDRO ALEJANDRO RODRIGUEZ AVILA
