ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVÁ

BOGOTÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 499 DE 2022:

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No.6

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACION, REMODELACION, MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y ENSERES PARA EL EDIFICIO CENTRO ADMINISTRATIVO LOCAL (CALE) Y EDIFICACIONES DE PROPIEDAD O TENENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA"

CONTRATISTA: WRUSSY INGENIEROS S.A.S.
INTERVENTORIA: CONSULTORIA, INTERVENTORIA Y CONTRUCCION ENTERPRISE S.A.S.


PERIODO: DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2023
BOGOTA D.C.

FECHA: 15/JULIO/2023

Interventor: **CONSULTORIA, INTERVENTORIA Y CONTRUCCION ENTERPRISE S.A.S.– CICE S.A.S.** CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 499 DE 2022 Cuyo Objeto Es: Realizar La Interventoría Técnica, Legal, Administrativa, Financiera Y Ambiental Al Contrato Que Tiene Por Objeto: "Realizar Las Obras De Adecuación, Remodelación, Mantenimiento De La Infraestructura Física Y Suministro E Instalación De Mobiliario, Equipos Y Enseres Para El Edificio Centro Administrativo Local (Cale) Y Edificaciones De Propiedad O Tenencia Del Fondo De Desarrollo Local De Engativá

TABLA DE CONTROL

COPIA CONTROLADA	X	COPIA NO CONTROLADA	

	Nombre	Cargo	Firma
ELABORÓ	Arq. Sonia Constanza Peñaranda	Residente de Interventoría	
REVISÓ Y APROBÓ	Ing. Iván Pardo	Director de Interventoría	

BOGOTA, D.C.

Original: FDLE

Copia 1: Archivo físico.

Copia 2: N.A.

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN. 4

2. OBJETIVOS DEL PRESENTE INFORME 5

3. ASPECTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS 6

3.1 LOCALIZACION 6

3.2 INFORMACION DEL PROYECTO 6

3.3 INFORMACION FINANCIERA 8

3.4 ACTIVIDADES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 14

3.5 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO: 15

3.6 CONTROL DE PROGRAMACIÓN MENSUAL 15

3.7 REUNIONES DE SEGUIMIENTO 16

3.8 CORTES REALIZADOS 17

3.9 RELACIÓN DE PERSONAL CONTRACTUAL 17

3.10 CUMPLIMIENTO DE FACTORES PONDERABLES Y DE CALIDAD 18

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 19

1. INTRODUCCIÓN.

El presente informe mensual elaborado por **CONSULTORIA, INTERVENTORIA Y CONTRUCCION ENTERPRISE S.A.S.** describe las principales actividades resultantes de la ejecución del contrato de interventoría:

- CONTRATO No. 499 DE 2022: Suscrito entre el **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA** y el **CONSULTORIA, INTERVENTORIA Y CONTRUCCION ENTERPRISE S.A.S.**, cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACION, REMODELACION, MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y ENSERES PARA EL EDIFICIO CENTRO ADMINISTRATIVO LOCAL (CALE) Y EDIFICACIONES DE PROPIEDAD O TENENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA

El presente informe de Interventoría hace una descripción general del desarrollo del contrato durante el periodo comprendido entre el 16 de junio al 15 de julio de 2022.

Dando cumplimiento a las obligaciones contractuales la cual define realizar el registro, seguimiento, control y aval de las labores a cargo del contratista **WRUSSY INGENIEROS S.A.S.**,

De acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato 499 de 2022, el presente informe contiene en consecuencia, un recuento de las actividades adelantadas por esta interventoría concernientes a los aspectos básicos y que tienen que ver con el estado y avance físico y presupuestal, análisis de aspectos relevantes, recomendaciones y conclusiones.

2. OBJETIVOS DEL PRESENTE INFORME

1. Realizar el reporte del avance y curso de las actividades del Contrato dentro del periodo del 16 de junio al 15 de julio de 2023

2. Informar de forma continua y periódica, el avance del proyecto, los problemas y las posibles soluciones.

3. Controlar que la ejecución y desarrollo del proyecto, se ejecute dentro del plazo contractual y dando cumplimiento a cada una de las especificaciones requeridas por la entidad.


4. Supervisar y controlar el cumplimiento de las obligaciones de pagos de salud, pensión. ARP y aportes a caja de compensación familiar, ICBF y Sena.

5. Llevar el registro de las actividades en los informes semanales.

6. Llevar un estricto control en el balance financiero, administrativo y ambiental del contrato, entre otros aspectos

3. ASPECTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS

3.1 LOCALIZACION

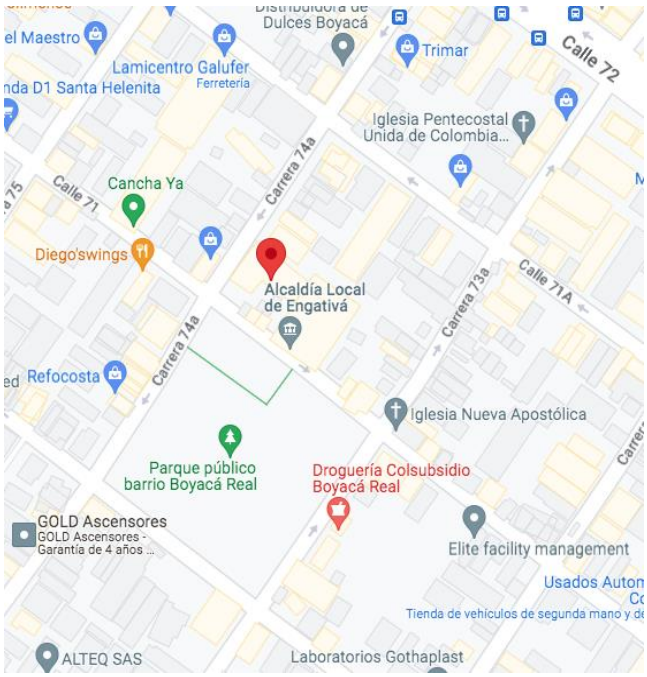

El **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA**, se encuentra ubicado en la calle 71 No. 73 A – 44, en el barrio BOYACA REAL. De igual forma el fondo es tenedor de otros inmuebles que hacen parte del presente del objeto del contrato, como lo son:

- **CASA GARCES NAVAS:** carrera 109 A No. 74-45
- **CASA LA CLARITA:** Calle 71 No. 81 A – 30
- **BODEGA:** Calle 71 A No. 72 A – 61

3.2 INFORMACION DEL PROYECTO

Generalidades del contrato de obra No.494 de 2022

CONTRATO No.	494 de 2022
CONTRATISTA:	WRUSSY INGENIEROS S.A.S.
PLAZO DE EJECUCION:	SEIS (6) MESES
NIT.	901.109.885-1
REPRESENTANTE LEGAL	WILVER RUSSY
FECHA DE INICIO:	16 DE ENERO DE 2023

FECHA DE TERMINACION:	15 DE JULIO DE 2023
VALOR DEL CONTRATO:	$ 605.206.115
FORMA DE PAGO:	1. ACTAS PACIALES DE AVANCE DE OBRA: mediante actas de recibo parcial de obra hasta alcanzar el 90% del valor del valor total de las obras a precios unitarios.
	2. PAGO FINAL: 10% del valor total de contrato que se pagará con el recibo final de las obras y liquidación del contrato.

Pólizas

Póliza de cumplimiento No. 11-44-101194996

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101050654

DESCRIPCION	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/01/2023	16/01/2024	$ 121.041.223
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	16/01/2023	17/07/2026	$ 30.260.306
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	16/01/2023	3 AÑOS, 6 MESES	$ 181.561.835
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	16/01/2023	3 AÑOS, 6 MESES	$ 181.561.835
R.C.E.	12/01/2023	17/07/2023	$ 200.000.000

Generalidades del contrato de Interventoría No.499 de 2022

CONTRATO No.	499 de 2022
CONTRATISTA:	CONSULTORIA, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION ENTERPRISE S.A.S.
NIT.	900.114.635-1
REPRESENTNATE LEGAL	SANDRA MARTELO PÉREZ
PLAZO DE EJECUCION:	CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIO:	16 DE ENERO DE 2023
FECHA INICIAL DE TERMINACION:	15 DE JUNIO DE 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 59.745.942
PRORROGA No. 1:	UN (1) MES
ADICION No. 1:	$ 11. 949. 188
FECHA DE TEMRINACION ACTUAL:	15 DE JULIO DE 2023
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 71. 695. 130
FORMA DE PAGO:	1. FIJO: Corresponde al pago del 90% del valor de la Interventoría. Dicho valor será dividido entre el número de meses de ejecución en sumas de igual valor. Pago mes

	vencido.
	2. ULTIMO PAGO: corresponde al 10% del valor de la interventoría. Dicho valor será pagado tras la suscripción del acta de liquidación del contrato de obra y del contrato de interventoría.

Pólizas

Póliza de cumplimiento No. 11-44-101169363

DESCRIPCION	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/01/2023	23/09/2023	$ 11.949.188,40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	16/01/2023	23/09/2026	$ 2.987.297,10
CALIDAD DEL SERVICIO	16/01/2023	23/07/2028	$ 11.949.188,40

3.3 INFORMACION FINANCIERA

El contrato de obra fue definido por un valor de SEISCIENTOS CINCO MILLLONES DOSCIENTOS SEIS MIL CIENTO QUINCE PESOS M/L ($605.206.115 pesos M/L), con el objeto de realizar obras de mantenimiento y adecuación a la infraestructura física para el edificio **CALE** y las demás edificaciones de tenencia por el FONDO DE DESARROLLO LOCLA DE ENGATIVÁ, a monto agotable, por lo cual a continuación se relacionan los ítems contratados de ejecución, los cuales son resultado de la proyección de los **Análisis de Precios Unitarios**, presentados durante el proceso precontractual. Las cantidades a ejecutar han sido verificadas durante el proceso de diagnóstico.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**MANTENIMIENTO PERIODICO**				
1.1	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**				
1.1.1	LIMPIEZA Y DESINFECCION TANQUE (2 VECES) INLCUYE TOMA DE MUESTRAS FISICO QUIMICAS Y BACTERIOLOGICAS EN CADA LIMPIEZA (MEDIDAS 6X3X3m)	UND	1	$3.453.197,00	$3.453.197,00
1.1.2	REVISIÓN, DESTAPONAMIENTO, REPARACIÓN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CAJAS DE INSPECCION	UND	1	$621.876,00	$621.876,00
1.1.3	REVISIÓN, DESTAPONAMIENTO Y REPARACIÓN PUNTOS SANITARIOS, INLCUYE SONDEO, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO A BOTADERO	UND	1	$572.648,00	$572.648,00

1.1.4	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE GRIFERIAS LAVAMANOS, SANITARIOS, ORINALES, LAVAPLATOS. INCLUYE REPOSICIÓN ACCESORIOS Y/O EMPAQUETADURAS.	UND	1	$405.837,00	$405.837,00
1.1.5	REVISION Y REPARACIÓN DE ESCAPES Y/O FILTRACIONES DE AGUA EN PUNTOS HIDRAULICOS, APARATOS SANITARIOS Y LAVAPLATOS. INCLUYE REPOSICIÓN ACCESORIOS Y/O EMPAQUETADURAS.	UND	1	$293.992,00	$293.992,00
1.1.6	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	ML	1	$90.346,00	$90.346,00
1.1.7	TUBERIA BOMBA	ML	1	$199.163,00	$199.163,00
1.2	**ILUMINACION**				
1.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED CUADRADA 60X60 48W 6000	UND	1	$157.181,00	$157.181,00
1.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBILLO AHORRADOR EN ESPIRAL DE 27 W	UND	1	$35.760,00	$35.760,00
1.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED CIRCULAR DE 24W TIPO SOBREPONER Y/O INCRUSTAR	UND	1	$54.901,00	$54.901,00
1.3	**EQUIPOS**				
1.3.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTO GENERADOR MARCA PERKINS, INCLUYE PRUEBAS DE AUTONOMIA, TRANSFERENCIA, ESTADO DE ALTERNADOR, FILTROS Y NIVELES DE LUBRICANTE. ADICIONALMENTE LECTURAS DE VOLTAJES DE SALIDA Y SINCRONISMO.	UND	1	$1.291.677,00	$1.291.677,00
1.3.2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOMBAS DE AGUAS, INCLUYE (AJUSTE SELECTORES ELECTRICOS, CIRCUITOS ELECTRICOS, REVISION DE PROGRAMADOR, CALIBRACION ACUMULADOR Y DETECCION DE FUGAS Y LAS DEMAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND	1	$1.884.889,00	$1.884.889,00
2	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO**				
2.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS - RED VOZ Y DATOS**				
2.1.1	TRASLADO DE PUNTO DE VOZ, DATOS, ELECTRICO NORMAL Y REGULADO.	UND	1	$308.139,00	$308.139,00
2.1.2	PUNTO ELECTRICO NORMAL Y REGULADO	UND	1	$84.502,00	$84.502,00
2.1.3	PUNTO ELECTRICO REGULADO	UND	1	$80.897,00	$80.897,00
2.1.4	PUNTO NUEVO, VOZ, DATOS, ELECTRICO NORMAL Y REGULADO	UND	1	$509.951,00	$509.951,00
2.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION SENSORES ILUMINACION ESCALERA	UND	1	$114.686,00	$114.686,00
2.1.6	SENSOR SANITARIO Y BOTÓN DE CORTESÍA, INCRUSTADO EN EL MURO, BOTÓN DE DESCARGA, FUNCIONAL CON CORRIENTE ELÉCTRICA A 110V Y PILAS DE SOPORTE EN AUSENCIA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA IMPORTADO AYA	UND	1	$1.949.170,00	$1.949.170,00
2.1.7	REUBICACIÓN DE PUNTO DE VOZ, DATOS ELÉCTRICO REGULADO Y NORMAL	UND	1	$283.050,00	$283.050,00
2.1.8	PUNTO NUEVO DE VOZ Y DATOS INCLUYE TOMA NORMAL Y REGULADA	UND	1	$509.951,00	$509.951,00
2.1.9	MANTETNIMIENTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO (PEINADOS DE RACK DE DATOS)	UND	1	$1.538.120,00	$1.538.120,00

2.1.10	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	UND	1	$1.456.934,00	$1.456.934,00
2.2	**APARATOS Y EQUIPOS**				
2.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTRACTOR BAÑOS Y COCINA	UND	1	$795.830,00	$795.830,00
2.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION SECADOR DE MANOS	UND	1	$1.269.911,00	$1.269.911,00
2.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION DISPENSADOR DE JABON ACERO INOXIDABLE	UND	1	$484.677,00	$484.677,00
2.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO ACERO INOXIDABLE	UND	1	$389.470,00	$389.470,00
2.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL MEDIANO PARA FLUXÓMETRO	UND	1	$559.139,00	$559.139,00
2.2.6	FLUXÓMETRO PARA ORINAL CON SENSOR, INCRUSTADO AL MURO, FUNCIONA CON CORRIENTE ELÉCTRICA A 110V Y PILAS DE SOPORTE EN AUSENCIA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA IMPORTADO AYA	UND	1	$1.761.663,00	$1.761.663,00
2.2.7	LAVAMANOS CON PEDESTAL ACUACER COLOR BLANCO CORONA, EQUIVALENTE O CALIDAD SUPERIOR. (INCLUYE GRIFERÍA, SIFÓN, DESAGÜE, ACOPLE).	UND	1	$526.459,00	$526.459,00
2.2.8	LAVAMANOS MARSELLA BLANCO CORONA CON GRIFERÍA PUSH CORONA O SIMILAR. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UND	1	$508.425,00	$508.425,00
2.2.9	SANITARIO ACUAPLUS ULTRA BLANCO CORONA, IGUAL O CALIDAD SUPERIOR. CAPACIDAD 6 LITROS POR DESCARGA. ALTO 59.8 CM X ANCHO 36.5 CM. (INCLUYE VÁLVULA, SIFÓN, ACOPLE).	UND	1	$363.884,00	$363.884,00
2.2.10	ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, REFERENCIA CORONA GOTTAS ANTIBACTERIAL O SIMILAR. (INCLUYE GRIFERIA TIPO PUSH ANTIVANDALICO) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UND	1	$1.606.652,00	$1.606.652,00
2.2.11	MONTAJE DE APARATOS- LAVAMANOS - SANITARIOS - LAVAPLATOS - LAVADEROS (NUEVOS O USADOS)	UND	1	$88.684,00	$88.684,00
2.2.12	GRIFERÍA LAVAMANOS DE SENSOR AGUA FRÍA DE INSTALACIÓN EN MESÓN, CUELLO BAJO, FUNCIONA CON CORRIENTE ELÉCTRICA 110V Y PILAS DE SOPORTE EN AUSENCIA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA METÁLICA CROMADA, IMPORTADA TIPO AYA	UND	1	$1.007.825,00	$1.007.825,00
2.2.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLOTADOR PARA TANQUE DE AGUA POTABLE.	UND	1	$205.344,00	$205.344,00
2.3	**CARPINTERIA EN ALUMINIO**				
2.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION EN VIDRIO 5MM TEMPLADO Y LAMINADO INCLUYE FROST	M2	1	$731.576,00	$731.576,00
2.3.2.	DESMONTE, TRASLADO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO Y VIDRIO	UND	1	$254.304,00	$254.304,00
2.3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO MARCA INPAL REF. 38-31, TIPO PROYECTANTE, SILLAR Y CABEZAL REF. 173 LATERALES AUTORROSCANTE REF, 174, PISA VIDRIO REF 177, EMPAQUE NEOPRENO TIPO ESPAGUETI, TORNILLERIA 2" X #10	M2	1	$443.112,00	$443.112,00
2.3.4	SUMINISTRO E NSTALACION DE MANIJA PARA VENTANA Y/O PUERTA EN ALUMINIO	UND	1	$84.018,00	$84.018,00
2.4	**SEÑALIZACION**				

2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BIDIRECCIONAL ELECTRO MECANICA INCLUYE TARJETA DE CONTROL PARA ACCESO PMR	UND	1	$9.631.949,00	$9.631.949,00
2.5	**MOBILIARIO Y OFICINA ABIERTA**				
2.5.1	MONTAJE Y DESMONTE DE PANELEARÍA 1,60X1,10 MTS	ML	1	$52.030,00	$52.030,00
2.5.2	DESMONTE DE DIVISIÓN PISO TECHO H=2,20	ML	1	$108.339,00	$108.339,00
2.5.3	MOVIMIENTO DE PUESTOS DE TRABAJO CUARTO DE CONTROL	UND	1	$146.871,00	$146.871,00
2.5.4	TRASLADO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN PISO TECHO H=2,20	ML	1	$91.072,00	$91.072,00
2.5.5	DESMONTE DE PUERTA, TRASLADO E INSTALACIÓN	UND	1	$195.141,00	$195.141,00
2.5.6	SUMINISTRO E INSTALACION MESA DE SALA DE JUNTAS REDONDA 4 PUESTOS	UND	1	$1.079.789,00	$1.079.789,00
2.5.7	SUMINISTRO E INSTALACIÒN MUEBLE ARCHIVADOR METALICO CON PUERTAS 190X85X45	UND	1	$1.232.619,00	$1.232.619,00
2.5.8	DIVISIÓN NUEVA PISO TECHO H=2,20	ML	1	$192.950,00	$192.950,00
2.5.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUESTO EN L DIMENSIONES 1,50 X 1,50 MTS FORMICA GRIS, CANTO GRIS, PASA CABLES GRIS, ESTRUCTURA GRIS ENTAMBORADO EN LAMINA INCLUYE SILLA Y CAJONERA	UND	1	$2.798.908,00	$2.798.908,00
2.5.10	SUMINISTRO E INSTALACIÒN MUEBLE ORGANIZADOR DE CORRESPONDENCIA - CDI	UND	1	$1.476.899,00	$1.476.899,00
2.5.11	SUMINISTRO E INSTALACIÒN COUNTER DE ATENCION (ESCRITORIO MAS CAJONERAS CON VIDRIO), TOMAS ELECTRICAS EN CADA PISO	UND	1	$3.555.065,00	$3.555.065,00
2.5.12	SUMINISTRO E INSTALACIÒN LOCKERS 4 PUESTOS	UND	1	$1.162.914,00	$1.162.914,00
2.5.13	MANTENIMIENTO Y REPARACION ARCHIVO RODANTE MANUAL METALICO, INCLUYE LIMPIEZA AJUSTE ARME Y DESARME, DE PARALES, ENTREPAÑOS, TENSORES, RIEL Y CARRO MECANICO.	UND	1	$1.133.647,00	$1.133.647,00
2.7	**VARIOS**				
2.7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE BLACKOUT ENRROLLABLE	M2	1	$205.923,00	$205.923,00
2.7.2	ALISTADO DE MUROS PARA ENCHAPE (INCLUYE PICADA)	M2	1	$42.915,00	$42.915,00
2.7.3	ENCHAPE DE MESÓN EN GRANITO PULIDO FUNDIDO EN SITIO PARA INSTALACIÓN DE ESTUFA TIPO INDUSTRIAL.	ML	1	$311.407,00	$311.407,00
2.7.4	MESONES BAÑOS GRANITO NEGRO SAN GABRIEL DE 20MM SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA INCLUYE SALPICADERO Y BABERO DE 20 CM	ML	1	$928.334,00	$928.334,00
2.7.5	ENCHAPE CERÁMICA PARED COCINA REF.: MACEDONIA BLANCO, 25 CM X 35 CM, IGUAL O CALIDAD SUPERIOR. GARANTÍA 10 AÑOS.	M2	1	$83.849,00	$83.849,00
2.7.6	ENCHAPE CERÁMICO PARED BAÑO REF.: PARED ALBANIA CORONA (COLOR A ELEGIR BEIGE O GRIS), 25 CM X 35 CM, IGUAL O CALIDAD SUPERIOR. GARANTÍA 10 AÑOS.	M2	1	$83.849,00	$83.849,00

2.7.7	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA Y MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 H= 1,50 Y 2M, ANCHO ENTRE 0,70 Y 1,05 M	M2	1	$402.641,00	$402.641,00
2.7.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y/O DIVISIÓN PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL 20 ANCLADO A PARED, CON ESTRUCTURA INTERNA EN PERFIL TUBULAR CUADRADO, LÍNEA INSTITUCIONAL O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR, INSTALADO CON ANCLAJES, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE SUMINISTRO, MONTAJE	M2	1	$848.325,00	$848.325,00
2.7.9	PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA 80 Y 90 CM CON ALTURA ENTRE 180 CM Y 200 CM. TIPO INTERDOORS LÍNEA ESTAMBUL O EQUIVALENTE. IGUAL O SUPERIOR CALIDAD. INCLUYE MARCO Y ACCESORIOS.	UND	1	$718.736,00	$718.736,00
2.7.10	LAMINAS CIELO RASOS EN FIBRA MINERAL 60X60	UND	1	$47.084,00	$47.084,00
2.7.11	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	1	$53.482,00	$53.482,00
2.7.12	PAÑETE LISO CULATAS 1:3	M2	1	$46.406,00	$46.406,00
2.7.13	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	M2	1	$45.520,00	$45.520,00
2.7.14	PAÑETE LISO DE MURO, MORTERO 1:3 E= 2 CM	M2	1	$44.771,00	$44.771,00
2.7.15	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4 E=0,02 M	M2	1	$47.050,00	$47.050,00
2.7.16	ESTUCO SOBRE PAÑETE Y VINILO BLANCO 3 MANOS	M2	1	$30.425,00	$30.425,00
2.7.17	VINILO TIPO 1 PARA MURO INTERIOR - 3 CAPAS (COLOR BLANCO)	M2	1	$23.811,00	$23.811,00
2.7.18	VINILO TIPO 1 PARA MURO INTERIOR 3 CAPAS (COLOR A ELEGIR)	M2	1	$25.342,00	$25.342,00
2.7.19	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	1	$28.662,00	$28.662,00
2.7.20	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	1	$23.869,00	$23.869,00
2.7.21	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA	M2	1	$41.885,00	$41.885,00
2.7.22	PINTURA ACRILICA TRES (3) MANOS COLOR	M2	1	$38.246,00	$38.246,00
2.7.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PINTURA ACRÍLICA MODIFICADA PARA DEMARCACIÓN HORIZONTAL, CON EXCELENTE VISIBILIDAD DIURNA Y NOCTURNA.	ML	1	$26.291,00	$26.291,00
2.7.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PINTURA ACRÍLICA MODIFICADA PARA DEMARCACIÓN HORIZONTAL, CON EXCELENTE VISIBILIDAD DIURNA Y NOCTURNA.	M2	1	$30.593,00	$30.593,00
2.7.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO EN TABLILLA PVC	M2	1	$71.536,00	$71.536,00
2.7.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNIZA BLANCA EN PVC	ML	1	$27.088,00	$27.088,00
2.7.27	VIDRIO INCOLORO DE 4 MM (PUERTAS, VENTANAS)	M2	1	$82.747,00	$82.747,00
2.7.28	ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E=4MM (INCLUYE DESMONTE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	1	$148.828,00	$148.828,00
2.7.29	MURO EN SUPERBOARD UNA CARA INCLUYE ESTRUCTURA	M2	1	$110.012,00	$110.012,00
2.7.30	DESMOMTE, TRASLADO Y REUBICACION DE LAMINA DE CIELO 60X60 FIBRA MINERAL	M2	1	$52.216,00	$52.216,00

2.7.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLUXÓMETRO DE PALANCA PARA SANITARIO	UND	1	$1.064.707,00	$1.064.707,00
2.7.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLUXÓMETRO DE PALANCA PARA ORINAL	UND	1	$1.181.479,00	$1.181.479,00
2.7.33	SUMINITRO E INSTALACION GRIFERIA TIPO PUSH PARA LAVAMANOS	UND	1	$442.158,00	$442.158,00
2.7.34	ENCHAPE EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO 6 CM TERRACOTA TIPO SANTA FE 24.5X12X6	M2	1	$93.011,00	$93.011,00
2.7.35	CONCRETO DE 3000 PSI e=7cm ACELERADO CON SIKASET L CON FIBRA Y GEOMALLA	M2	1	$399.505,00	$399.505,00
2.7.36	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA METALICA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2". CON CONTRAMARCO EN ANGULO, PINTURA EN ESMALTE, MEDIDAS	M2	1	$191.628,00	$191.628,00
2.7.37	PIRLAN EN ALUMINIO PARA ESCALERA	ML	1	$27.106,00	$27.106,00
2.7.38	IMPERMEABILIZACION DE FOSO CON XYPEX CONCENTRADO GRIS	M2	1	$71.516,00	$71.516,00
2.7.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA DE DIÁMETROS 2", 3" Y 4"	ML	1	$58.124,00	$58.124,00
2..7.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESION DE DIÁMETROS 1/2", 1" Y 3/4" – 150 PSI	ML	1	$26.671,00	$26.671,00
2.7.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC SANITARIOS DE DIÁMETROS 2", 3" Y 4"	UND	1	$63.803,00	$63.803,00
2.7.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC PRESION DE DIÁMETROS 1/2", 1" Y 3/4" – 150 PSI	UND	1	$20.643,00	$20.643,00
2.8	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES**				
2.8.1	**IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS**				
2.8.1	AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M2	1	$55.395,00	$55.395,00
2.8.2	IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO	M2	1	$66.646,00	$66.646,00
2.8.3	IMPERMEABILIZACION CUBIERTA PERMA PLY FGLASS - 3 CAPAS Y/O SIMILAR	M2	1	$129.624,00	$129.624,00
2.8.4	MEDIA CAÑA MORTERO DE PENDIENTE	ML	1	$41.302,00	$41.302,00
2.8.2	**CUBIERTAS**				
2.8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO).	M2	1	$156.804,00	$156.804,00
2.8.2	ESTRUCTURA METÁLICA, PERFIL EN C	KG		$19.833,00	$ -
2.8.3	TEJA TERMOACUSTICA UPVC FORTE O SIMILAR INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN	M2	1	$104.714,00	$104.714,00

2.8.4	ELEMENTO METÁLICO PARA FLANCHE, ELEMENTO DE CUMBRERA O REMATE LATERAL PARA CUBIERTA EN ACERO GALVANIZADO DE 0,42 M DE DESARROLLO, LÁMINA CALIBRE 16. FIJACIÓN A MURO MEDIANTE SISTEMA DE REGATA Y/O CON SISTEMA DE TORNILLO AUTOPERFORANTE Y SELLE CON MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 SEGÚN EL USO.	ML	1	$67.299,00	$67.299,00
2.8.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA CALIBRE 26	ML	1	$33.456,00	$33.456,00
2.8.6	CABALLETE PARA TEJA TERMOACÚSTICA, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	ML	1	$116.552,00	$116.552,00
SUBTOTAL					$58.920.019,00
A				**25%**	$14.730.004,75
I				**1%**	$589.200,19
U				**5%**	$2.946.000,95
			IVA	**19%**	$559.740,18
TOTAL INCLUIDO AIU					$77.744.965,07

3.4 ACTIVIDADES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Se realizan las actividades de pintura en el primer piso, Enel acceso a la registraduría, oficinas de contratación 4° piso, sala de juntas jurídica 5° piso.
- Se realiza mantenimiento de sifones y cajas de sótano
- Revisión, cargue de refrigerante y puesta en funcionamiento aire acondicionado vive digital edificio CALE.
- Instalación y cambio láminas de fibra mineral cielo raso.
- Enchape muro recepción.
- Lavado terraza 5° piso ala sur.
- Relavado muros punto fijo
- Instalación de flanches en cubierta
- Demolición y alistado enchape piso terraza 5° piso ala norte
- Reparación filtración área de bombas eyectoras sótano

- Anclaje, ajuste y brillada de bandas de punto fijo.
- Lavado y desinfección final tanque de reserva
- Lavado enchape muro sótano.
- Recorrido de verificación de funcionamiento de todas las áreas a las que se realizó mantenimiento durante la ejecución del contrato.

3.5 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO:

Durante el periodo del presente informe, se realizaron las siguientes actividades administrativas:

- Realización de comités de seguimiento semanales. En donde se han realizado los seguimientos pertinentes a la programación y reprogramación de actividades a causa de la variación de las actividades priorizadas para mantneimiento.
- Se realizó trámite de pago del corte No. 5, en donde la Interventoría revisó, verifico y avalo las cantidades ejecutadas y la documentación anexa.
- Se realizó seguimiento al diligenciamiento diario de la bitácora de obra.

Se anexa registro fotográfico de las actividades realizadas durante el presente periodo. **(Ver anexo No. 2)** así como copia de la correspondencia enviada **(Ver anexo No. 3),** de la correspondnecia recibida **(Ver anexo No. 4)** y de la Bitácora de obra. **(Ver anexo No. 7)**

3.6 CONTROL DE PROGRAMACIÓN MENSUAL

Durante el presente periodo, se realizó el ajuste contractual y barrido de las actividades que se requerían ejecutar y que fueron programadas para la etapa final de ejecución.



Durante el desarrollo de esta etapa, se cierran las actividades programadas y se llega a un cierre total programado y financiero. En la imagén se indica que el porcentaje programado para el cierre del presente periodo corresonde al 100% y el ejecutado al 100%.

Se adjunta el seguimiento a la programación que se realiza semanalmente. **(Ver Anexo No. 6)**

3.7 REUNIONES DE SEGUIMIENTO

Durante el periodo del presente informe se realizaron las siguientes reuniones de seguimiento:

Reunión No.	Fecha	Producto
Reunión No. 18	16/06/2023	Acta No. 18
Reunión No. 19	30/06/2023	Acta No. 19
Reunión No. 20	07/07/2023	Acta No. 20
Reunión No. 21	14/07/2023	Acta No. 21

Se adjuntan copias de las actas de reunión realizadas durante el presente periodo. **(Ver anexo No. 1)**

3.8 CORTES REALIZADOS

Durante el presente periodo se tramitó el corte No. 5 de obra y de Inteventoría

CONTRATO DE OBRA 494 DE 2022

VALOR CONTRATO	$605.206.115
Corte No. 1	$84.673.842
Corte No. 2	$199.709.093
Corte No. 3	$81.522.114
Corte No. 4	$80.795.016
Corte No. 5	$88.643.956
Acumulado	$535374022
Por Ejecutar al 90%	$9.311.482

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 499 DE 2022

VALOR CONTRATO	$71.695.130
Corte No. 1	$10.754.269
Corte No. 2	$10.754.269
Corte No. 3	$10.754.269
Corte No. 4	$10.754.269
Corte No. 5	$10.754.269
Acumulado	$53.771.345
Por Ejecutar al 90%	$10.754.269

3.9 RELACIÓN DE PERSONAL CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA 494 DE 2022

NOMBRE	CARGO	% DEDICACIÓN
Ing. Wilver Russy	Director de Obra	10%
Arq. Edgar Mancera	Residente de Obra	80%
Ing. Stefani González	Profesional SST	90%

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 499 DE 2022

NOMBRE	CARGO	% DEDICACIÓN
Ing. Iván Pardo	Director de Obra	10%
Arq. Sonia Peñaranda	Residente de Obra	100%
Ing. Yeimmi Neuta	Profesional SST	20%

3.10 CUMPLIMIENTO DE FACTORES PONDERABLES Y DE CALIDAD

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
Apoyo a la Industria nacional	X		Durante el periodo del presente informe el contratista ha cumplido con el 40% de personal nacional ofrecido
Vinculación trabajadores con discapacidad	X		Se adjunta certificación actualizada y planillas de aportes de seguridad.
Vinculación de mujeres a nivel directivo más del 50% de los cargos	X		Se aportan planillas de aportes a seguridad. Ing. Nubia Suarez – Directora de licitaciones Ing. Karen Lisseth Salamanca – directora HSEQ Natalia Montes - Directora Administrativa y Contable.

Se adjuntan copias de las planillas de aportes a seguridad social que constatan la permanencia del personal ofrecido durante el presente periodo. **(Ver anexo No. 8)**

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta que la ejecución del contrato finalizó durante el presente periodo; hemos encontrado un balance satisfactorio en términos de ejecución, tiempos programados, actividades ejecutadas y calidad de los materiales utilizados. El contratista cumplió sus compromisos contractuales de manera adecuada y sin contratiempos. En general las actividades desarrolladas han sido objeto de seguimiento y control por parte de la interventoría, toda vez que el contratista ha acatado de la mejor manera las observaciones propuestas.

RECOMENDACIONES

- Teniendo en cuenta lo requerido por el área de gestión documental se recomienda celeridad en el proceso de foliación y entrega de carpetas debidamente diligenciadas.
- Se recomienda actualizar de acuerdo con los pagos la plataforma SECOP II
- Se recomienda realizar de manera inmediata el cierre del PIN ambiental.
