Fecha: 2 de agosto 2023**.**	**Acta No:**	**Hora Inicio:** 10:20 a.m.	**Hora Fin:** 11:30 a.m.
Tema: Visita Técnica a la Planta de Tratamiento de potable COMPACTA (PTAP), con el fin de ver su estado y las actividades que se encuentra realizando el acueducto de la Bananera como administrador de esta.			
Responsable: Equipo proyectos S.D.R.G.A.		**Elaborado por:** Mario Fernando Giraldo Castrillon.	
Proceso / Subproceso / Actividad: *Promoción del Desarrollo Económico / Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental / Dirección de Gestión del Desarrollo Rural.*			
Lugar: Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) La Bananera.			

AGENDA	1.	Visita Planta de Tratamiento de (PTAP)**.**
	2.	Revisión funcionamiento PTAP
	3.	Realización acta de reunión.
	4.	
	5.	
	6.	
	7.	
	8.	
	9.	
	10.	
	11.	
	12.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ACTA DE REUNIÓN

Fecha: 2 de agosto 2023**.**	**Acta No:**	**Hora Inicio:** 10:20 a.m.	**Hora Fin:** 11:30 a.m.

Tema: Visita Técnica a la Planta de Tratamiento de potable COMPACTA (PTAP), con el fin de ver su estado y las actividades que se encuentra realizando el acueducto de la Bananera como administrador de esta.

En instalaciones de la Planta de Tratamiento de potable COMPACTA de La Bananera, se lleva a cabo visita técnica de inspección de funcionamiento, con presencia del señor Reinaldo Naranjo Valencia, fontanero del acueducto La Bananera, y técnicos de la Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental (S.D.R.G.A.), identificándose los siguientes aspectos:

1. Se identifican las estructuras principales así:

Se realiza una verificacion del manejo de las valvulas en el manejo de la PLANTA COMPACTA, donde, por el bajo caudal se observa que la planta no esta siendo operada correctamente.
BATIMETRIA Y calculo de caudal de entrada al Tanque de la PTAP
Formulas Q= V * A ; S= v*t **Q= 0,13 * 0,2= 0,026 m3/seg**


Volumen de agua que sale de la PTAP= 10 lts/6,99Sgs = 1,4 lts/sg

-

2. Se visualizo lo siguiente:



Las valvulas del sistema son colocadas, para un optimo desempeño, se encuentra una de las purgas en mal estado, se recomienda purgas automaticas

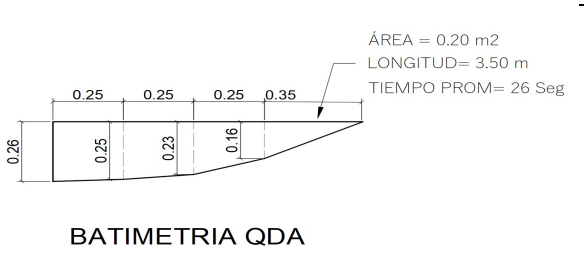

BATIMETRIA QDA

Se realiza una batimetria antes de la BOCATOMA, con el fin de conocer el caudal que aporta la quebrada







Se realizaron actividades de batimetria e inspeccion de almacenamiento adicional, como condicion importante de almacenamiento por emergencias del fenomeno del niño.

Se evidencia la necesidad toma de datos de un macromedidor, para hacer un balance de perdidas con la micomedicion que aun no se implementa.

ALCALDÍA DE PEREIRA

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO Ejecutado Si/No	
				SI	NO
1	Realización Acta Visita	Mario Giraldo	2 de agosto 2023.		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Tema: Visita de Seguimiento al acueducto La Bananera, en Compañía del Fontanero del Acueducto.			Fecha: 02/08/2023		Acta No:	
	NOMBRE	PROCESO O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO OFICINA/ CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Reinaldo Naranjo Valencia,	Acueducto La Bananera.	Fontanero Acueducto	3117837546	—	
2	Miguel Angel Ríos Jimenez	S.D.R.G.A	Contratista.	3135013052.	mar10000@gmail.com.	
3	Luis A. Monteiro.	SDRGA	Contratista	3137602658	ing_lubeto@hotmail.com	
4	JOHANN GABRIEL RAMIREZ SIERRA	SDRGA	CONTRATISTA	313 3692649	JGRAMIREZSIERRA@GMAIL.COM	
5	Mario F. Giraldo	SDRGA	Contratista	313 7167160	jubelhit.	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
