MUNICIPIO DE ARMENIA	**REQUISITOS PAGO FINAL CONTRATO DE OBRA** Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-014 Fecha: 30/09/2019 Versión: 007 Página 1 de 1

CONTRATO No.: Contrato de obra No. 002 2023

No.	DOCUMENTO	SI	NO	OBSERVACIONES
1	FOTOCOPIA ADICIONAL EN CASO DE TENERLO. (Sello de Legalización – Estampillas).	✓		
2	FOTOCOPIA POLIZA.	✓		
3	INFORME FINAL DE INTERVENTORIA O SUPERVISOR (FORMATO) (2).	✓		
4	BITACORA (FORMATO) ORIGINAL.	✓		
5	RUT (Registro Único Tributario).	✓		
6	INFORME DE OBRA Y FOTOGRAFÍAS ANTES Y DESPUES DE LA OBRA (CD E IMPRESO).	✓		
7	PAZ Y SALVO DE PARAFISCALES (Original).	✓		
8	PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL	✓		
9	ACTA FINAL DE OBRA (2) ORIGINALES	✓		
10	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE OBRA (FORMATO) (2) ORIGINALES	✓		
11	ACTA DE LIQUIDACION (2).ORIGINALES	✓		
12	FACTURA O CUENTA DE COBRO (Original y copia).	✓		
13	INFORMACIÓN DE CONTRATO FORMATO (2) ORIGINALES	✓		
14	FOTOCOPIA REGISTRO PRESUPUESTAL (2)	✓		
15	CARTA AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO DE ESTAMPILLAS (2) ORIGINALES	✓		
16	ACTA DE MANEJO AMBIENTAL			
17	ACTAS DE CONTROL SEÑALIZACIÓN VIAL DE OBRA			
18	CERTIFICACIÓN BANCARIA	✓		
19	PREACTAS			
20	ACTUALIZAZIÓN DE POLIZAS			
21	ANEXO DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES			
22	CONTROL DE DOCUMENTOS PREVIOS-PLAN DE CALIDAD			
23	PERFIL DE PROFESIONALES REQUERIDOS EN LA OBRA			
24	PLAN DE CALIDAD CONTRATOS DE OBRA			
25	CUADRO CONTROL A MODIFICACIONES			

Nathalia Valencia Giraldo.
FIRMA DE QUIEN RECIBE
23/08/23 5:00 pm.

FIRMA DE QUIEN ENTREGA

MUNICIPIO DE ARMENIA

Departamento Administrativo Jurídico

CONTRATO MODIFICATORIO No. 001 AL CONTRATO DE OBRA No. 2023-002, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE ARMENIA Y JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO

OBJETO	CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ARMENIA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE ARMENIA
NIT:	890.000.464-3
CONTRATISTA	JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	7.550.995 de Armenia
VALOR DEL CONTRATO :	SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS MLCTE ($65.939.900).
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN :	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
PRORROGA:	VEINTE (20) DIAS CALENDARIO
PLAZO DE EJECUCION TOTAL	SESENTA Y CINCO (65) DIAS

Entre los suscritos a saber: **BEATRIZ LORENA LONDOÑO RODRÍGUEZ**, mayor y vecina de Calarcá Quindío, identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.582.795 de Calarcá Q. obrando en nombre y representación del Municipio de Armenia, en calidad de Subdirectora del Departamento Administrativo Jurídico, nombrada mediante Decreto No. 004 de 2022, debidamente autorizado para celebrar el presente contrato de conformidad con el artículo 11 numeral 3, literal b) de la ley 80 de 1993, el artículo 121 del Acuerdo Nº 181 del 05 de diciembre del 2020, emanado del Concejo Municipal de Armenia, en concordancia con la delegación conferida por el Alcalde del Municipio de Armenia a través del Decreto No. 059 del 20 de mayo de 2013, "Por medio del cual se delegan funciones y se desconcentran actividades para adelantar procesos precontractuales, celebrar contratos, procesos postcontractuales y se dictan otras disposiciones", modificado mediante Decreto 283 de 2020; y quien para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATANTE**, de una parte; y de la otra el señor **JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO,** identificado con cédula de ciudadanía Nº 7.550.995 de Armenia Q, quien para el efecto se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos acordado modificar el CONTRATO DE OBRA No. 2023-002, teniendo como fundamento las siguientes consideraciones: **A)** Que entre el **MUNICIPIO DE ARMENIA** y **JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO**, celebraron el CONTRATO DE OBRA No. 2023-002, cuyo objeto es: "CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ARMENIA" suscrito el día 3 de abril del 2023. **B)** Que el día 16 de mayo de 2023, se firmó acta de inicio del CONTRATO DE OBRA No. 2023-002. **C)** Que a la fecha, se ha venido ejecutando el objeto del contrato y las obligaciones estipuladas en el mismo, cumplidamente y a cabalidad. **D)** Que el Supervisor del Contrato y la Secretaria de Infraestructura mediante acta manifiestan: *(...) "Dentro del alcance contractual del contrato se encontraban incluidos unos ítems para ejecutar en el puente que comunica la cafetería del piso principal y el concejo municipal con los cuales se pretendía canalizar las aguas lluvias para evitar la filtración de agua al concejo municipal, en visita realizada con el contratista de obra se determinó que la mejor alternativa para la canalización de aguas lluvias era la realización de un cárcamo.(...) En virtud a lo antes citado durante la ejecución del contrato, se encontraron imprevistos y circunstancias que no se hallaban descritas en los Ítems contratados, los cuales se justifican a continuación para que con los recursos liberados por la alternativa acordada del Cárcamo y se puedan incluir sin que se vea modificado el valor inicial del contrato. con la ejecución de estos nuevos Ítems se culmina la obra dando en su totalidad el alcance al objeto contractual:* ***SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN PVC DE 3":*** *Es necesario recoger las aguas de la cubierta instalada en la zona espejo de agua, para evitar que el piso de este sector sufra empozamiento;* ***BAJANTE A. LLUVIAS 3" PVC:*** *Una vez recogidas las aguas de la cubierta y conducidas a la canal en PVC es necesario que a través del bajante estas sean llevadas a los canales colectores para su posterior evacuación;* ***MURO EN CONCRETO E=.10 HASTA H=1.00 M S/H:*** *Debido a la ubicación de la rampa a realizar se hace necesario la construcción del muro para servir como soporte de la misma;* ***ANCLAJES DE 1/2":*** *En aras de brindar mayor rigidez y garantizar la estabilidad de la rampa a construir en voladizo, se requiere anclar las misma al muro en concreto existente;* ***BARANDA 1 1/2" TRES TUBOS HORIZ INC. INST:*** *Al encontrarse un desnivel entre la rampa nueva y la placa existente y en aras de garantizar la seguridad de las personas que circularan por el sector, es de obligatoria ejecución el ítem en mención;* ***FLANCHE EN LAMINA DE ZINC C.16:*** *Para evitar la filtración de aguas entre la cubierta instalada en la zona espejo de agua y las paredes existentes en el lugar, se requiere instalar el flanche que conduzca las aguas al tejado;* ***IMPERMEABILIZACION COLECTOR DE AGUAS:*** *Puesto que la canal colectora a construir para el flujo de aguas se encuentra sobre la placa de contrapiso se hace necesario impermeabilizar esta, para de esta manera evitar y garantizar la no filtración de agua hacia el nivel inferior;* ***DESMONTE CIELO RASO Inc. Desmonte de la estructura del cielo raso y el acarreo horizontal:*** *En aras de cambiar el cielo raso actual que se encuentra en mal estado o con gran deterioro por uno nuevo, es necesario llevar a cabo el desmonte de las láminas y estructuras existentes; Como se había citado dichos ítems o actividades no requieren recursos adicionales, ya que con la alternativa utilizada en el puente se optimizaron los recursos para realizar las actividades mencionadas anteriormente. (...) Por otro lado, ya que los recursos utilizados son del Concejo Municipal, los Honorables Concejales solicitaron demoler los muros existentes al interior del recinto y realizar las adecuaciones necesarias, para de esta manera garantizar el acceso de personas con movilidad reducida o limitación para acceder a espacios o moverse dentro de los mismos. A la fecha no se ha contado con la disponibilidad de las áreas a intervenir debido a las sesiones realizadas diariamente para los proyectos de acuerdo de la ciudad, situación que ha atrasado el normal desarrollo de la obra y por ende afectado el tiempo de ejecución contemplado inicialmente. (...)* **G)** Que se constata que el contrato se encuentra vigente en su plazo de ejecución, el mismo puede ser Prorrogado. **H)** Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, se realiza el presente contrato modificatorio del Contrato de Obra No. **2023-002,** de conformidad con las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA.** Modificar el numeral 4. Del Contrato de Obra No. **2023-002** en el sentido de adicionar las obligaciones antes citadas para dar cumplimiento al objeto contractual, el cual quedara así: **NUMERAL 4** VALOR DEL CONTRATO: El valor que se tendrá en cuanta para la ejecución del contrato corresponde al establecido en la oferta económica que de conformidad propuesta detallada por precios unitarios, los valores que a continuación se estipulan: BALANCE DE LA OBRA

MUNICIPIO DE ARMENIA

Departamento Administrativo Jurídico

ITEM	Actividad	BALANCE			
		Un	CANT	Valor Unitario	VR/TOTAL
	OBRA CONTRATADA EJECUTADA				
	SECTOR CONCEJO MUNICIPAL				
1	**CUBIERTA**				
1,1	DESMONTE DE CUBIERTA EN VIDRIO	M2	$ 47,19	$ 13.538,46	$ 638.842,02
1,2	CUBIERTA EN TEJA POLICARBONATO INC. Tornillos de fijación y accesorios	M2	$ 47,95	$ 93.615,38	$ 4.489.044,70
1,3	IMPERMEABILIZACION CULATA CON REFUERZO EN TELA DE POLIESTER NO TEJIDO	M2	$ 122,58	$ 29.461,54	$ 3.611.248,27
2	**HIDROSANITARIOS**				
2,1	PUNTO DESAGUE PVC SANITARIO 4" INC. ACCESORIOS Y TRAMO DE TUBERIA	UND	$ 8,00	$ 129.692,31	$ 1.037.538,48
2,2	REJILLA - SIFON DE PISO 3"	UND	$ 0,00	$ 41.461,54	$ 0,00
2	**INSTALACIÓN VENTANAS**				
2,1	CORTE DE MUROS CON DISCO	ML	$ 46,06	$ 7.923,08	$ 364.937,06
2,2	DEMOLICION MUROS ,15 SIN RETIRO	M2	$ 8,02	$ 6.538,46	$ 52.422,76
2,3	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN ALUMINIIO SECC. 1,5*1,5 Inc. Perfiles y herrajes necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	UND	$ 0,00	$ 314.230,77	$ 0,00
3	**MANTENIMIENTO PUERTAS**				
3,1	REPARACION Y REINSTALACION DE PUERTA	UND	$ 1,00	$ 67.307,69	$ 67.307,69
4	**CIELO RASO**				
4,1	CIELO RASO EN DRYWALL PANEL YESO (Inc. Encintada, resane, listo para pintura)	M2	$ 22,00	$ 45.615,39	$ 1.003.538,58
4,2	PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS INC. RESANES, FILOS Y DILATACIONES	M2	$ 22,00	$ 16.307,69	$ 358.769,18
	PUENTE CONCEJO				
1	**CUBIERTA**				
1,2	CUBIERTA EN TEJA POLICARBONATO INC. Tornillos de fijación y accesorios	M2	$ 0,00	$ 93.615,38	$ 0,00
1,4	ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	M2	$ 0,00	$ 38.307,69	$ 0,00
2	**HIDROSANITARIOS**				
2,3	REJILLA CARCAMO PEATONAL DESAGUE LINEAL	ML	$ 3,00	$ 294.307,70	$ 882.923,10
5	**DEMOLICIONES**				
5,1	DEMOLICION ACABADO DE PISO INC. DEMOL DE ALISTADO DE PISO ESPESOR HASTA 4 CM, ACARREO HORIZONTAL HASTA 100 m, no inc retiro de obra	M2	$ 0,00	$ 12.769,24	$ 0,00
6	**INSTALACIÓN LETRAS**				
6,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRAS FLOTANTES PARA FACHADA EN ACEROINOXIDABLE	UND	$ 5,00	$ 146.076,92	$ 730.384,60
7	**RETIRO DE SOBRANTES**				
7,1	RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES DISTANCIA HASTA DE 40 KM	M3	$ 1,89	$ 64.769,23	$ 122.231,45
	SECTOR NOR - OCCIDENTAL CAM				
1	**CUBIERTA**				
1,2	CUBIERTA EN TEJA POLICARBONATO INC. Tornillos de fijación y accesorios	M2	$ 40,00	$ 93.615,38	$ 3.744.615,20
1,4	ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	M2	$ 40,00	$ 38.307,69	$ 1.532.307,60
2	**HIDROSANITARIOS**				
2,1	PUNTO DESAGUE PVC SANITARIO 4" INC. ACCESORIOS Y TRAMO DE TUBERIA	UND	$ 0,00	$ 129.692,31	$ 0,00
2,2	REJILLA - SIFON DE PISO 3"	UND	$ 0,00	$ 41.461,54	$ 0,00

	AMPLIACIÓN ZONA ESPEJO DE AGUA				
5	**DEMOLICIONES**				
5,1	DEMOLICION ACABADO DE PISO INC. DEMOL DE ALISTADO DE PISO ESPESOR HASTA 4 CM, ACARREO HORIZONTAL HASTA 100 m, no inc retiro de obra	M2	$ 10,00	$ 12.769,24	$ 127.692,40
8	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				
8,1	EXCAVACION A MANO MATERIAL COMUN 0-2 MTS, SIN RETIRO	M3	$ 0,00	$ 13.153,84	$ 0,00
2	**HIDROSANITARIOS**				
2,3	REJILLA CARCAMO PEATONAL DESAGUE LINEAL	ML	$ 30,01	$ 294.307,70	$ 8.832.174,08
9	**ESTRUCTURALES**				
9,1	RAMPA EN CONCRETO 21 Mpa. A=0.90 M DN=0.20M	ML	$ 7,00	$ 185.153,85	$ 1.296.076,95
9,2	ESCALERAS S/HIERRO	M3	$ 3,00	$ 1.418.230,77	$ 4.254.692,31
9,3	ACERO DE REFUERZO Inc. Alambre de amarra y figurado	KG	$ 100,00	$ 8.923,08	$ 892.308,00
9,4	VIGA CIMENTACION 20*20 EN CONCRETO DE 21 MPa S/H (con formaleta)	ML	$ 0,00	$ 83.307,69	$ 0,00
10	**CARPINTERIA METALICA**				
10,1	REJA CERRAMIENTO TUBO RECTANGULAR/ANTI-PINTADA	ML	$ 35,92	$ 246.615,39	$ 8.858.424,81
6	**INSTALACION LETRAS**				
6,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRAS FLOTANTES PARA FACHADA EN ACEROINOXIDABLE	UND	$ 0,00	$ 146.076,92	$ 0,00
7	**RETIRO DE SOBRANTES**				
7,1	RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES DISTANCIA HASTA DE 40 KM	M3	$ 4,00	$ 64.769,23	$ 259.076,92
	OBRA NO CONTRATADA				
NP1	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE CANAL EN PVC DE 3"	ML	$ 4,90	$ 72.920,00	$ 357.308,00
NP2	BAJANTE A. LLUVIAS 3" PVC	ML	$ 9,00	$ 35.950,00	$ 323.550,00
NP3	MURO EN CONCRETO E=.10 HASTA H=1.00 M S/H	M3	$ 1,21	$ 1.083.708,45	$ 1.308.333,36
NP4	BARANDA 1 1/2" TRES TUBOS HORIZ INC. INST	ML	$ 8,00	$ 204.643,20	$ 1.637.145,60
NP5	ANCLAJES DE 1/2"	UND	$ 90,00	$ 16.338,00	$ 1.470.420,00
	CORTE CON DISCO	ML	$ 68,96	$ 7.923,08	$ 546.375,60
NP6	DESMONTE CIELO RASO Inc. Desmonte de la estructura del cielo raso y el acarreo horizontal	M2	$ 19,92	$ 4.379,00	$ 87.229,68
NP7	FLANCHE EN LAMINA DE ZINC C.16	ML	$ 41,80	$ 17.112,00	$ 715.281,60
NP8	IMPERMEABILIZACION COLECTOR DE AGUAS	ML	$ 32,00	$ 35.025,00	$ 1.120.800,00
COSTO DIRECTO					$ 50.723.000,00
A.I.U					$ 15.216.900,00
VALOR TOTAL					$ 65.939.900,00

CLÁUSULA SEGUNDA: Prorrogar el plazo de ejecución establecido en el numeral 5, del contrato de obra 2023-002, en 20 días calendario, quedando del siguiente forma: Numeral 5 **PLAZO DE EJECUCIÓN** quedando de la siguiente forma: PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución del contrato producto del presente proceso es de Sesenta y Cinco (65) días calendario, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio. **CLÁUSULA TERCERA: GARANTIA.** El contratista se obligará a Ampliar en tiempo, los amparos descritos en la garantía única establecida en **EL NUMERAL**

SEPTIMO: GARANTÍAS, de acuerdo con la presente modificación. **CLÁUSULA CUARTA:** Las demás cláusulas del contrato que no fueron modificadas en el presente documento, seguirán tal cual como el contrato inicial y permanecen vigentes al igual que su exigibilidad. **CLÁUSULA QUINTA PERFECCIONAMIENTO.** El presente modificatorio se perfecciona con la suscripción del mismo por las partes, en la plataforma SECOP II.

NOTA: Firma electrónica: La Plataforma del SECOP II maneja para los Procesos de Contratación y los contratos celebrados la firma electrónica. El SECOP II se rige por las normas del Sistema de Compra Pública y por aquellas que rigen el comercio electrónico, de esta manera dentro de la plataforma quien se inscribe obtiene una firma electrónica con su usuario y contraseña, el cual es personal e intransferible, y obliga por medio de esta firma a quien suscriba el contrato, o a la persona a la que el firmante representa. La firma electrónica que manejan los usuarios del SECOP II cumple con los requisitos de confiabilidad de las firmas electrónicas exigidos por el Decreto 2364 de 2012 artículo 4, como que los datos de creación de la firma corresponden exclusivamente al firmante y es posible detectar cualquier alteración no autorizada del mensaje de datos, hecha después del momento de la firma gracias al sello de tiempo de la plataforma.

Concepto de Colombia Compra Eficiente https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/concepto_firma_y_contrato_electronico_0.pdf

Proyecto: Paulo Andrés Pino Álvarez- Abogado Contratista D.A.J.

Revisó: Lina Paola Hernández Jaramillo - Profesional Especializada D.A.J.

Aprobó: Beatriz Lorena Londoño Rodríguez – Subdirectora D.A.J

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4838954
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	3/04/2023 5:50:39 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO DE OBRA 002-2023
Objeto del contrato	CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Si ☑No
Duración del contrato	45 Días
Fecha de inicio de contrato	1 minuto para terminar *(16/05/2023 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	29/06/2023 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Si ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Si ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Si ☑No *
Reversión	☐Si ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE ARMENIA QUINDIO

COLOMBIA, Armenia

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

JHON SANDOVAL

Número de documento 7550995

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JHON SANDOVAL			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Jhon Jairo Sandoval Galindo* *Fecha de aprobación:* *4/04/2023 4:31:02 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *BEATRIZ LORENA LONDOÑO RODRIGUEZ* *Fecha de aprobación:* *10/04/2023 11:54:17 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4838954_Confirmed
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Si ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Si ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Si ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Si ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Si ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Si ☑No

Seriedad de la oferta ☑Si ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

Cumplimiento ☑Si ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato 30,00 Fecha de vigencia (desde) 29/03/2023 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 13/09/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios

☑% del valor del contrato 5,00 Fecha de vigencia (desde) 29/03/2023 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 29/03/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Estabilidad y calidad de la obra

☑% del valor del contrato 30,00 Fecha de vigencia (desde) 29/03/2023 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 29/03/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Si ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha limite para entrega de garantías: 4/04/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 12/04/2023 8:28:07 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.11458614	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	232.000.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	10 días para terminar *(25/05/2023 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.11458322	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	42.860.935,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	26/05/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.11416923	Seriedad de la oferta	-	7.496.756,50 COP	-	10/07/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Si ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Efectivo

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4838954
Proveedor JHON SANDOVAL
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 17 No. 16-00
Ubicación CO-QUI-63001 - Armenia
País COLOMBIA
Departamento Quindío
Municipio Armenia
Dirección CARRERA 17 No. 16-00
Código postal 630001

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 17 NRO 16-00	COLOMBIA > Quindío > Armenia

1 CO1.PCCNTR.4838954

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							74.967.565,00	65.939.900,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72102900	CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	1,00	UN	74.967.565,00	65.939.900,00	74.967.565,00	65.939.900,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ACEPTACION DE OFERTA.pdf	ACEPTACION DE OFERTA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	BEATRIZ LORENA LON	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	24582795	Guardar y notificar
Supervisor	DAVID ESTIVEN ACEVE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1097038678	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	DAVID ESTIVEN ACEVEDO OSORIO	10/04/2023 11:54:18 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	BEATRIZ LORENA LONDONO RODRIGUEZ
Expenditure Approver	BEATRIZ LORENA LONDONO RODRIGUEZ	10/04/2023 11:54:18 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	BEATRIZ LORENA LONDONO RODRIGUEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Si ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	65.939.900
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	65.939.900

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Si ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2122	CDP	No validado	75.000.000 COP	65.939.900 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 75.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 65.939.900 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	20233009	Presupuestal (CDP)	-	No validado	65.939.900 COP	65.939.900 COP		- -	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 65.939.900 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 65.939.900 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5804191897

PÓLIZA No: 580-47-994000078813 ANEXO: 3

AGENCIA EXPEDIDORA: **PEREIRA** COD. AGENCIA: 580 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
27	07	2023	27	07	2023

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO** IDENTIFICACIÓN: CC **7.550.995**

DIRECCIÓN: CONJ LA ARCADIA MZ 18 CA 3 CIUDAD: ARMENIA, QUINDIO TELÉFONO: 6067474132

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **MUNICIPIO DE ARMENIA** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.000.464-3**

BENEFICIARIO: **MUNICIPIO DE ARMENIA** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.000.464-3**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	16/05/2023	29/11/2023	19,781,970.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	16/05/2023	29/07/2026	3,296,995.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	19,781,970.00

BENEFICIARIOS
NIT 890000464 - MUNICIPIO DE ARMENIA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA
EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA No 2023-002, RELATIVO A EJECUCION ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

*** NOTA ACLARATORIA ***
EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE (05) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

****ANEXO DE MODIFICACION***
SEGUN ACTA DE SUSPENSION No. 01 DE JULIO 17-2023 Y ACTA DE REINICIO No. 01 DE JULIO 27/2023 AL CONTRATO DE OBRA 2023-002, SE MODIFICA LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS AMPARADAS EN LA POLIZA ARRIBA CITADA, QUEDANDO SEGUN SE REGISTRA.

FECHA INICIO: 16/05/2023 / FECHA TERMINACION: 29/07/2023 / VALOR CONTRATO: $65.939.900.00
TODAS LAS DEMAS CONDICIONES NO MODIFICADAS EN EL PRESENTE CERTIFICADO CONTINUAN IGUAL.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ****42,860,935.00	$ ****************0	$*********0.00	$ ***********0	$ ****************0

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
JOHN JAIRO LONDOÑO RIVERA	5302	100.00			

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

(415)7701861000019(8020)000000000007000580419189

FIRMA ASEGURADOR **FIRMA TOMADOR**

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CBD0207C0D09F57858

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * **Dirección:** Carrera 13 # 29-21 Oficina 221, Bogotá * **Teléfono:** (601) 458 7174
Fax: (601) 458 7174 * **Celular:** 312 342 6229 * **Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5804191970

PÓLIZA No: 580 -74 - 994000022355 ANEXO:3

AGENCIA EXPEDIDORA: **PEREIRA** COD. AGE: 580 RAMO: 74 PAP:

DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO	HORAS		DIA	MES	AÑO	HORAS		DIA	MES	AÑO
27	07	2023	VIGENCIA DE LA PÓLIZA	20	07	2023	23:59		29	07	2023	23:59	9	27	07	2023
FECHA DE EXPEDICIÓN				VIGENCIA DESDE			A LAS		VIGENCIA HASTA			A LAS	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN		

MODALIDAD FACTURACIÓN: **ANUAL** TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO PRORROGA

	DIA	MES	AÑO	HORAS		DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS
VIGENCIA DEL ANEXO	20	07	2023	23:59		29	07	2023	23:59	9
	VIGENCIA DESDE			A LAS		VIGENCIA HASTA			A LAS	

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: **JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO** IDENTIFICACIÓN: CC **7.550.995**

DIRECCIÓN: CONJ LA ARCADIA MZ 18 CA 3 CIUDAD: ARMENIA, QUINDIO TELÉFONO: 6067474132

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **MUNICIPIO DE ARMENIA** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.000.464-3**

DIRECCIÓN: LUGAR CAM CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CIUDAD: **ARMENIA, QUINDIO** TELÉFONO: 0

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: MUNICIPIO DE ARMENIA NIT : 890000464

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: QUINDIO CIUDAD: ARMENIA

DIRECCION: CONCEJO MUNICIPAL Y CAM

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: ESTATAL MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 232,000,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232,000,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 20,000,000.00 $ en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA No 2023-002, RELATIVO A EJECUCION ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS.

ANEXO DE MODIFICACION
SEGUN ACTA DE SUSPENSION No. 01 DE JULIO 17-2023 Y ACTA DE REINICIO No. 01 DE JULIO 27/2023 AL CONTRATO DE OBRA 2023-002, SE MODIFICA LA VIGENCIA DE LA POLIZA ARRIBA CITADA.

VIGENCIA GLOBAL RCE (PLO) DESDE 16/05/2023 HASTA 29/07/2023 SUMA ASEGURADA 200 SMMLV AÑO 2023
TODAS LAS DEMAS CONDICIONES NO MODIFICADAS EN EL PRESENTE CERTIFICADO CONTINUAN IGUAL.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***232,000,000.00	$ **********0	$*********0.00	$ **********0	$ **********0

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
JOHN JAIRO LONDOÑO RIVERA	5302	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000580419197

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

DISALAS 0

CBD0207C0D09F57958 CLIENTE

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 # 29-21 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 458 7174
Fax: (601) 458 7174 * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601. ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL
CONTRATO DE OBRA No. 002 DE 2023

SUPERVISOR: ING. DAVID ESTIVEN ACEVEDO OSORIO

CONTRATISTA: JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO

OBJETO: "CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ARMENIA"

1. DATOS GENERALES	
Modalidad de Contratación	MÍNIMA CUANTÍA
No. Proceso	DAJ-SMIC-2023-003
Tipo de Contrato	CONTRATO DE OBRA
No. Del contrato	002 DE 2023
Fecha de suscripción del contrato	03 DE ABRIL DE 2023
Contratista	JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO
NIT / CC	7.550.995
Valor Inicial del Contrato	$65.939.900
Forma de pago (ídem al contrato)	La Entidad cancelara al Contratista el valor del contrato en pagos parciales por avance de obra o con el acta final de terminación de la obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervisión hasta el 90% del valor del contrato. El 10% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago. de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Caias de Compensación Familiar, cuando corresponda.
Plazo Inicial del contrato	45 DIAS
Fecha de inicio:	16 DE MAYO DE 2023
Fecha de terminación:	27 DE JULIO DE 2023
Fecha de suspensión No. 1:	17 DE JULIO DE 2023
Fecha de reinicio No. 1:	27 DE JULIO DE 2023
Adicional en tiempo:	20 DÍAS
Fecha de terminación inicial:	29 DE JULIO DE 2023
Supervisor	ING. DAVID ESTIVEN ACEVEDO OSORIO

2. DATOS FINANCIEROS	
No. y Valor del Certificado de Disponibilidad Presupuestal	N°2122 DEL 17 DE FEBRERO DE 2023 POR UN VALOR DE $75.000.000,00

No. Rubro CDP N° 20223046	1302.21202020053290.001 RECURSOS PROPIOS otras obras de ingeniería civil
Valor Total del Contrato	$ 65.939.900,00

3. BALANCE FINANCIERO

NUMERO ACTA	VALOR TOTAL	VALOR ACTA	VALOR ACUMULADO	SALDO
1	$ 65,939,900.00	$ 42,851,336.20	$ 42,851,336.20	$ 23,088,563.80
2	$ 65,939,900.00	$ 23,088,563.80	$ 65,939,900.00	$ -
TOTALES	**$ 65,939,900.00**	**$ 65,939,900.00**	**$ 65,939,900.00**	**$ -**

4. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO

NOMBRE	CARGO
DIEGO FERNANDO BOTERO QUICENO	Ing. Residente de obra
MARIA DEL PILAR GONZALEZ HERNANDEZ	Profesional SISO

5. MODO DE PAGO (Marcar con una X):

CHEQUE	
TRANSFERENCIA	X

En el caso de que el pago se realice a través de transferencia se deberá diligenciar la siguiente información:

Nombre del banco	Tipo de cuenta	No. de cuenta	Titular de la cuenta
Banco CAJA SOCIAL	Cuenta Ahorros	24121412575	JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO

Nota: para el pago de cuentas con recursos nacionales, la forma de pago no puede efectuarse mediante cheque.

6. BALANCE DE OBRA


Las obras ejecutadas se describen a continuación, en donde se describen las cantidades ejecutadas y valores contratados:

ITEM	Actividad	Un	CANT	Valor Unitario	Valor Total
	OBRA CONTRATADA EJECUTADA				
	SECTOR CONCEJO MUNICIPAL				
1	**CUBIERTA**				
1,1	DESMONTE DE CUBIERTA EN VIDRIO	M2	54,63	$ 13.538,46	$ 739.590,37
1,2	CUBIERTA EN TEJA POLICARBONATO INC. Tornillos de fijación y accesorios	M2	54,63	$ 93.615,38	$ 5.114.099,66
1,3	IMPERMEABILIZACION CULATA CON REFUERZO EN TELA DE POLIESTER NO TEJIDO	M2	122,58	$ 29.461,54	$ 3.611.248,27
2	**HIDROSANITARIOS**				
2,1	PUNTO DESAGUE PVC SANITARIO 4" INC. ACCESORIOS Y TRAMO DE TUBERIA	UND	8,00	$ 129.692,31	$ 1.037.538,48


2,2	REJILLA - SIFON DE PISO 3"	UND	0,00	$ 41.461,54	$ 0,00
2	**INSTALACIÓN VENTANAS**				
2,1	CORTE DE MUROS CON DISCO	ML	46,06	$ 7.923,08	$ 364.937,06
2,2	DEMOLICION MUROS ,15 SIN RETIRO	M2	8,02	$ 6.538,46	$ 52.422,76
2,3	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN ALUMINIIO SECC. 1,5*1,5 Inc. Perfiles y herrajes necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	UND	0,00	$ 314.230,77	$ 0,00
3	**MANTENIMIENTO PUERTAS**				
3,1	REPARACION Y REINSTALACION DE PUERTA	UND	0,00	$ 67.307,69	$ 0,00
4	**CIELO RASO**				
4,1	CIELO RASO EN DRYWALL PANEL YESO (Inc. Encintada, resane, listo para pintura)	M2	19,92	$ 45.615,39	$ 908.658,57
4,2	PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS INC. RESANES, FILOS Y DILATACIONES	M2	226,60	$ 16.307,69	$ 3.695.266,71
	PUENTE CONCEJO				
1	**CUBIERTA**				
1,2	CUBIERTA EN TEJA POLICARBONATO INC. Tornillos de fijación y accesorios	M2	0,00	$ 93.615,38	$ 0,00
1,4	ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	M2	0,00	$ 38.307,69	$ 0,00
2	**HIDROSANITARIOS**				
2,3	REJILLA CARCAMO PEATONAL DESAGUE LINEAL	ML	1,73	$ 294.307,70	$ 509.152,32
5	**DEMOLICIONES**				
5,1	DEMOLICION ACABADO DE PISO INC. DEMOL DE ALISTADO DE PISO ESPESOR HASTA 4 CM, ACARREO HORIZONTAL HASTA 100 m, no inc retiro de obra	M2	0,00	$ 12.769,24	$ 0,00
6	**INSTALACIÓN LETRAS**				
6,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRAS FLOTANTES PARA FACHADA EN ACEROINOXIDABLE	UND	0,00	$ 146.076,92	$ 0,00
7	**RETIRO DE SOBRANTES**				
7,1	RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES DISTANCIA HASTA DE 40 KM	M3	2,31	$ 64.769,23	$ 149.829,94
	SECTOR NOR - OCCIDENTAL CAM				
1	**CUBIERTA**				
1,2	CUBIERTA EN TEJA POLICARBONATO INC. Tornillos de fijación y accesorios	M2	39,20	$ 93.615,38	$ 3.669.722,90
1,4	ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	M2	39,20	$ 38.307,69	$ 1.501.661,45
2	**HIDROSANITARIOS**				
2,1	PUNTO DESAGUE PVC SANITARIO 4" INC. ACCESORIOS Y TRAMO DE TUBERIA	UND	0,00	$ 129.692,31	$ 0,00
2,2	REJILLA - SIFON DE PISO 3"	UND	0,00	$ 41.461,54	$ 0,00
	AMPLIACIÓN ZONA ESPEJO DE AGUA				
5	**DEMOLICIONES**				
5,1	DEMOLICION ACABADO DE PISO INC. DEMOL DE ALISTADO DE PISO ESPESOR HASTA 4 CM, ACARREO HORIZONTAL HASTA 100 m, no inc retiro de obra	M2	7,00	$ 12.769,24	$ 89.410,22
8	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				
8,1	EXCAVACION A MANO MATERIAL COMUN 0-2 MTS, SIN RETIRO	M3	0,00	$ 13.153,84	$ 0,00
2	**HIDROSANITARIOS**				
2,3	REJILLA CARCAMO PEATONAL DESAGUE LINEAL	ML	28,28	$ 294.307,70	$ 8.323.021,76

9	**ESTRUCTURALES**				
9,1	RAMPA EN CONCRETO 21 Mpa. A=0.90 M DN=0.20M	ML	7,00	$ 185.153,85	$ 1.296.076,95
9,2	ESCALERAS S/HIERRO	M3	0,58	$ 1.418.230,77	$ 826.119,42
9,3	ACERO DE REFUERZO Inc. Alambre de amarra y figurado	KG	90,71	$ 8.923,08	$ 809.412,59
9,4	VIGA CIMENTACION 20*20 EN CONCRETO DE 21 MPa S/H (con formaleta)	ML	0,00	$ 83.307,69	$ 0,00
10	**CARPINTERIA METALICA**				
10,1	REJA CERRAMIENTO TUBO RECTANGULAR/ANTI-PINTADA	ML	35,92	$ 246.615,39	$ 8.858.424,81
6	**INSTALACION LETRAS**				
6,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRAS FLOTANTES PARA FACHADA EN ACEROINOXIDABLE	UND	0,00	$ 146.076,92	$ 0,00
7	**RETIRO DE SOBRANTES**				
7,1	RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES DISTANCIA HASTA DE 40 KM	M3	0,91	$ 64.769,23	$ 58.956,84
	OBRA NO CONTRATADA Y EJECUTADA		0,00		
NP1	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE CANAL EN PVC DE 3"	ML	4,90	$ 72.920,00	$ 357.308,00
NP2	BAJANTE A. LLUVIAS 3" PVC	ML	8,50	$ 35.950,00	$ 305.575,00
NP3	MURO EN CONCRETO E=.10 HASTA H=1.00 M S/H	M3	0,23	$ 1.083.708,45	$ 251.420,36
NP4	BARANDA 1 1/2" TRES TUBOS HORIZ INC. INST	ML	8,00	$ 204.643,20	$ 1.637.145,60
NP5	ANCLAJES DE 1/2"	UND	95,00	$ 16.338,00	$ 1.552.110,00
	CORTE CON DISCO	ML	68,96	$ 7.923,08	$ 546.375,60
NP6	DESMONTE CIELO RASO Inc. Desmonte de la estructura del cielo raso y el acarreo horizontal	M2	19,92	$ 4.379,00	$ 87.229,68
NP7	FLANCHE EN LAMINA DE ZINC C.16	ML	0,00	$ 17.112,00	$ 0,00
NP8	IMPERMEABILIZACION COLECTOR DE AGUAS	ML	30,01	$ 35.025,00	$ 1.051.100,25
NP9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LETRAS ALUMINIO CON CALIBRE 6MM	UND	6,00	$ 409.960,00	$ 2.459.760,96
NP10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4MM INC. SELLANTE EN POLIURETANO	M2	2,76	$ 54.135,00	$ 149.412,60
NP11	MARCO EN MADERA VENTANA	ML	9,40	$ 56.145,00	$ 527.763,00
NP12	FILOS Y DILATACIONES	ML	12,80	$ 11.114,00	$ 142.259,20
NP13	DEMOLICION ENCHAPE PARED INC. ACARREO HORIZONTAL HASTA 100 M.	M2	2,76	$ 14.489,00	$ 39.989,64
	COSTO DIRECTO				$ 50.723.000,00
	A.I.U				$ 15.216.900,00
	VALOR TOTAL				**$ 65.939.900,00**


7. REGISTRO FOTOGRAFICO

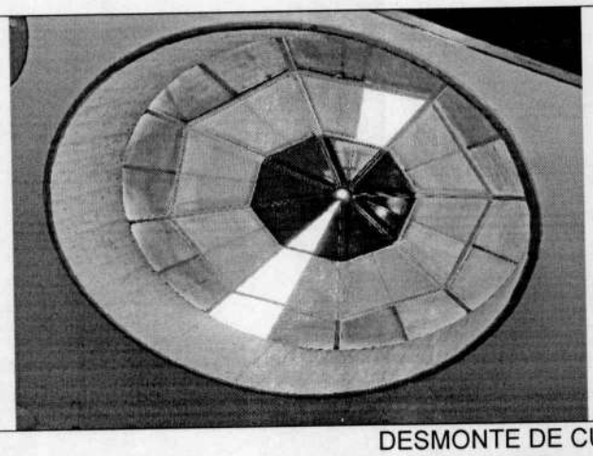


DESMONTE DE CUBIERTA EN VIDRIO

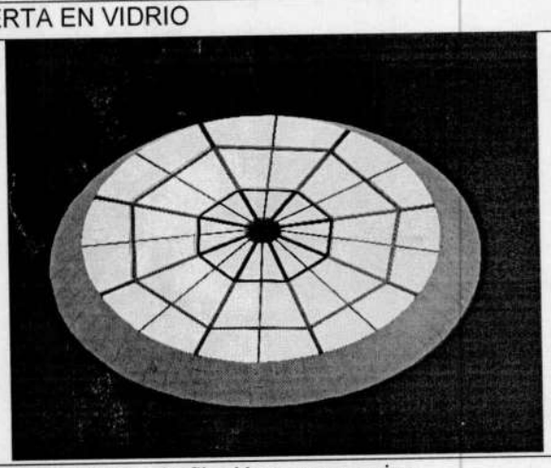



CUBIERTA EN TEJA POLICARBONATO INC. Tornillos de fijación y accesorios

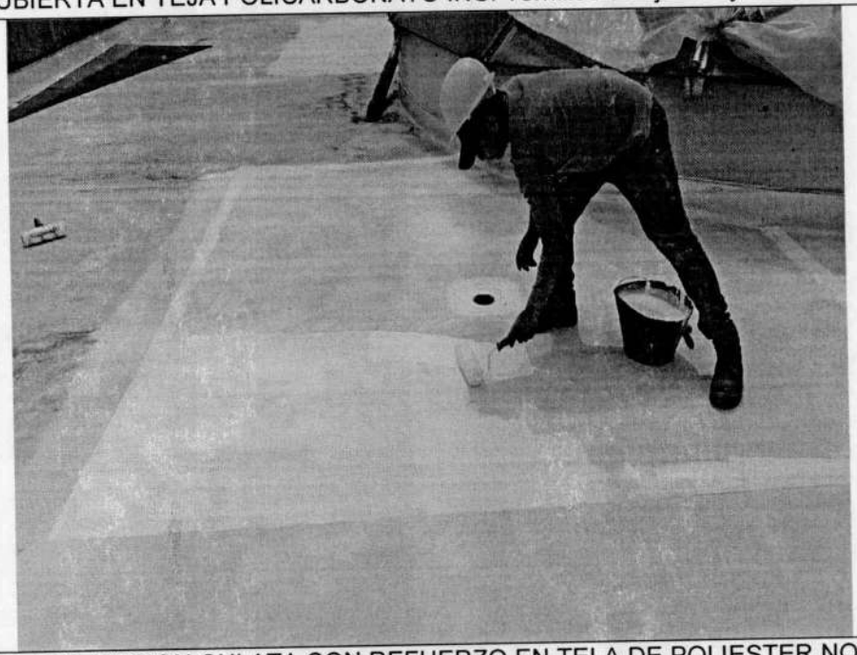



IMPERMEABILIZACION CULATA CON REFUERZO EN TELA DE POLIESTER NO TEJIDO



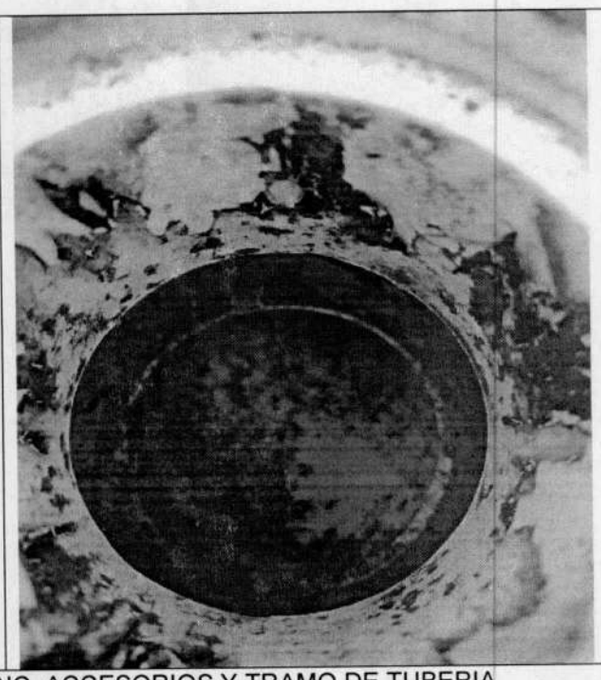



PUNTO DESAGUE PVC SANITARIO 4" INC. ACCESORIOS Y TRAMO DE TUBERIA

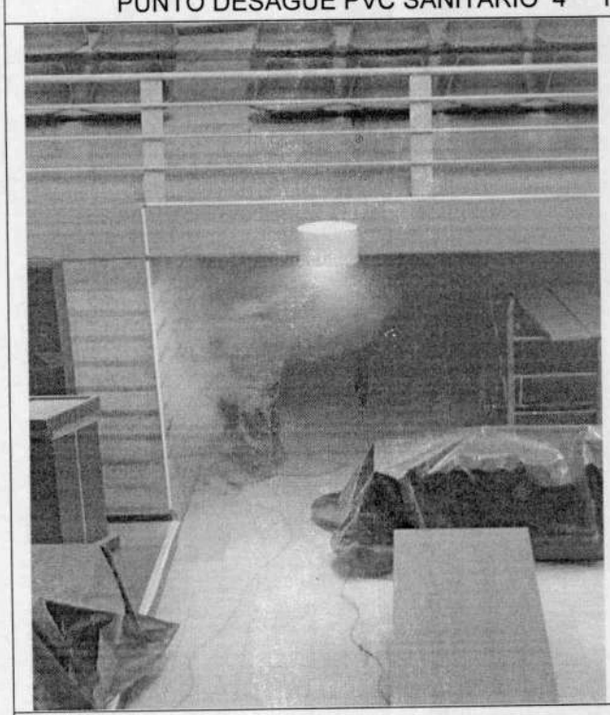

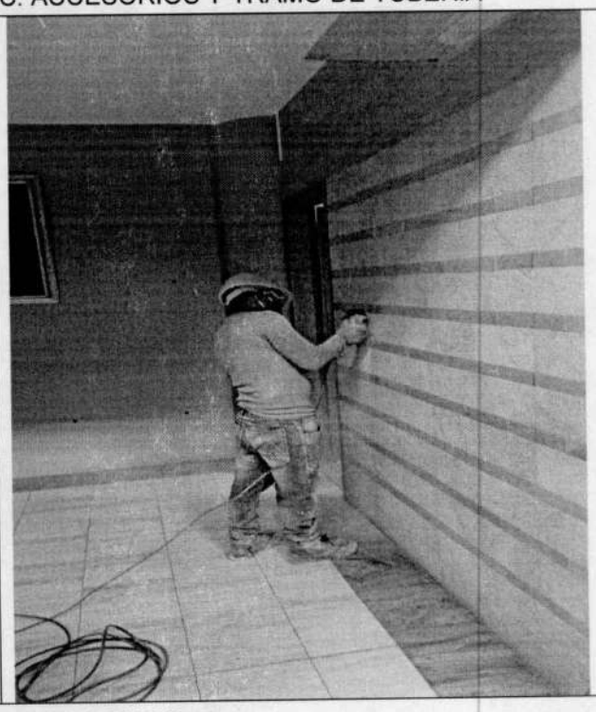



CORTE DE MUROS CON DISCO

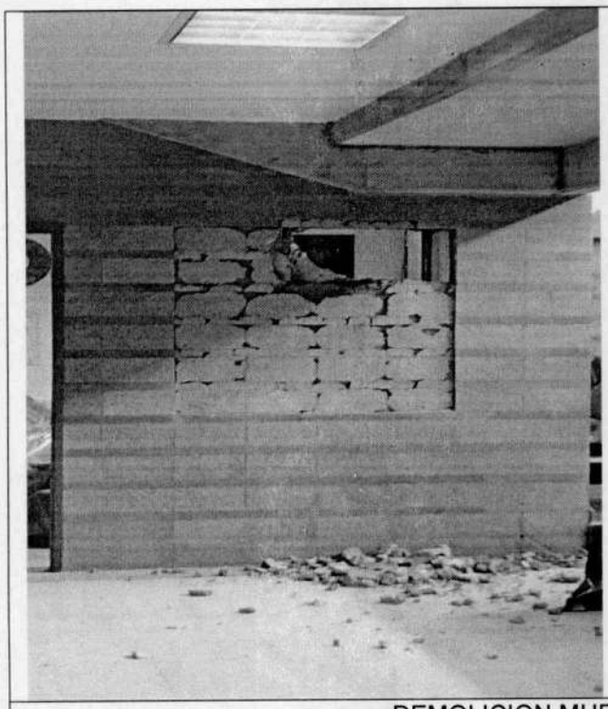

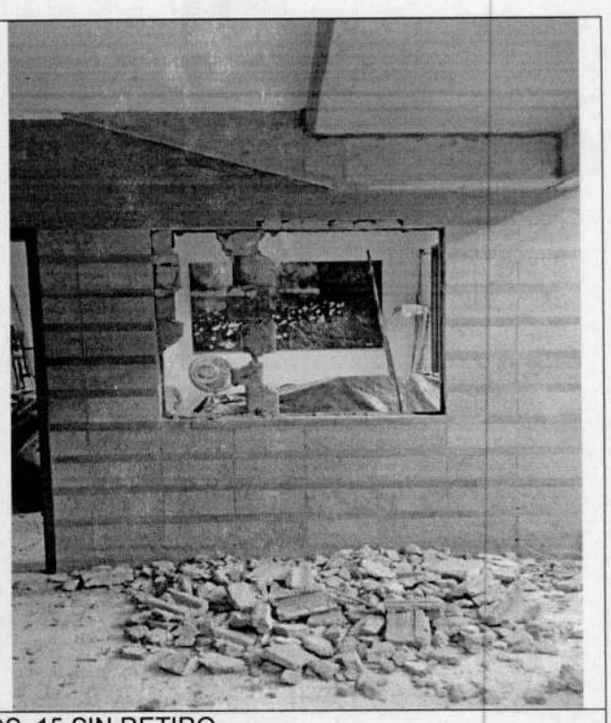



DEMOLICION MUROS ,15 SIN RETIRO

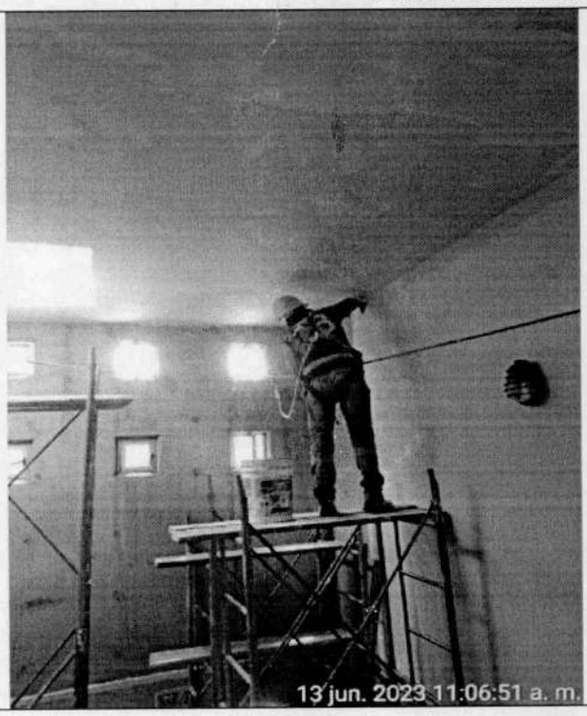

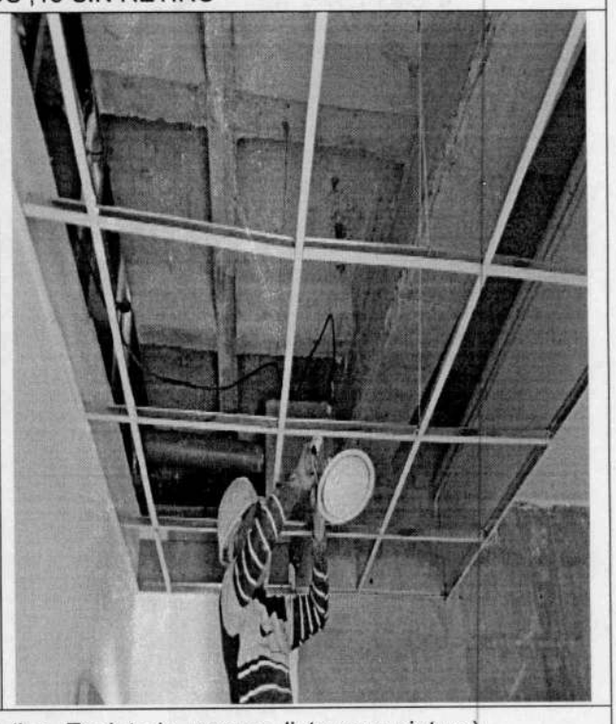


CIELO RASO EN DRYWALL PANEL YESO (Inc. Encintada, resane, listo para pintura)

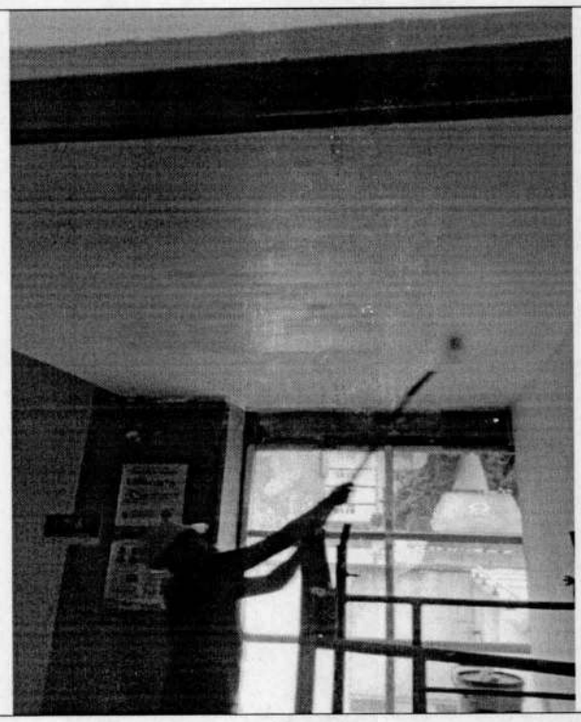


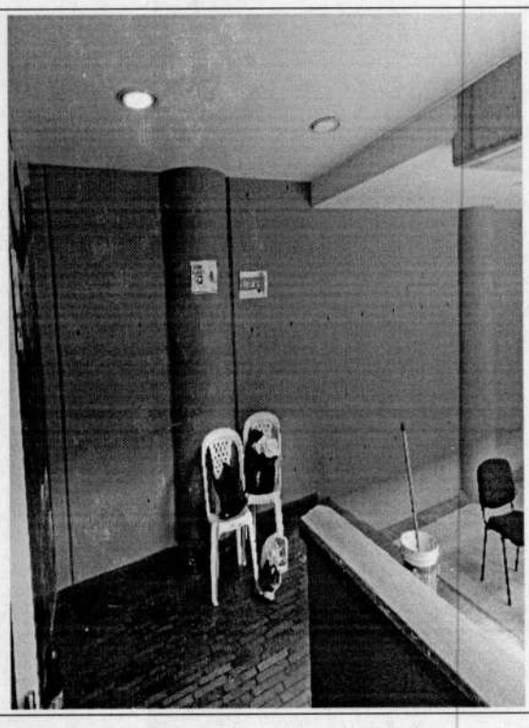

PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS INC. RESANES, FILOS Y DILATACIONES

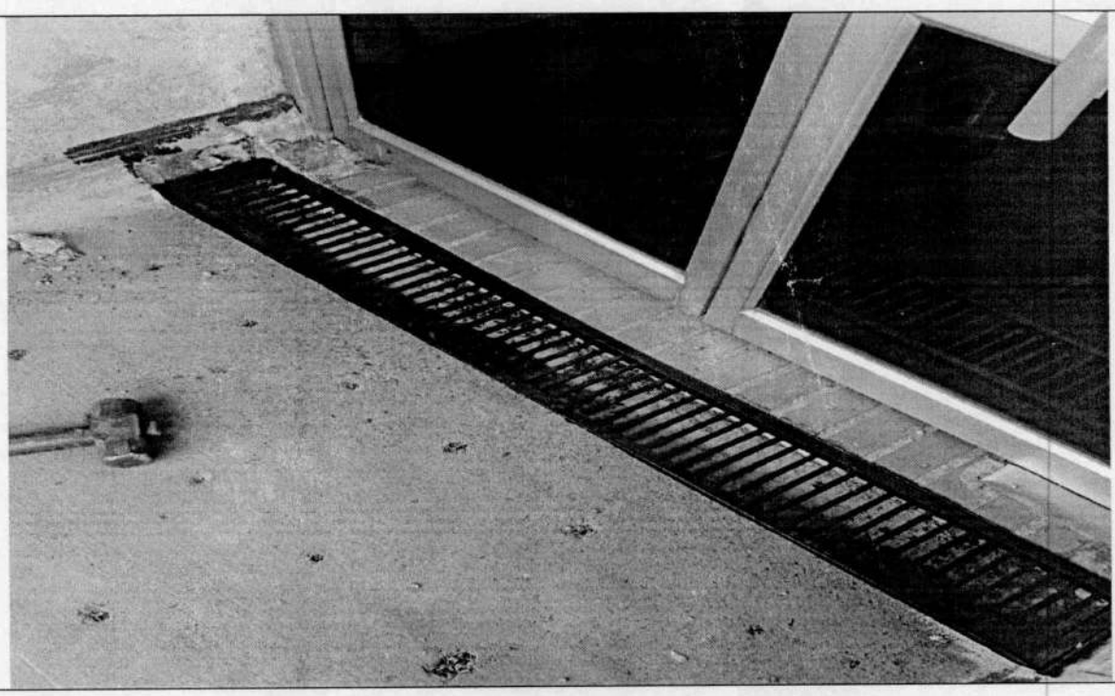


REJILLA CARCAMO PEATONAL DESAGUE LINEAL

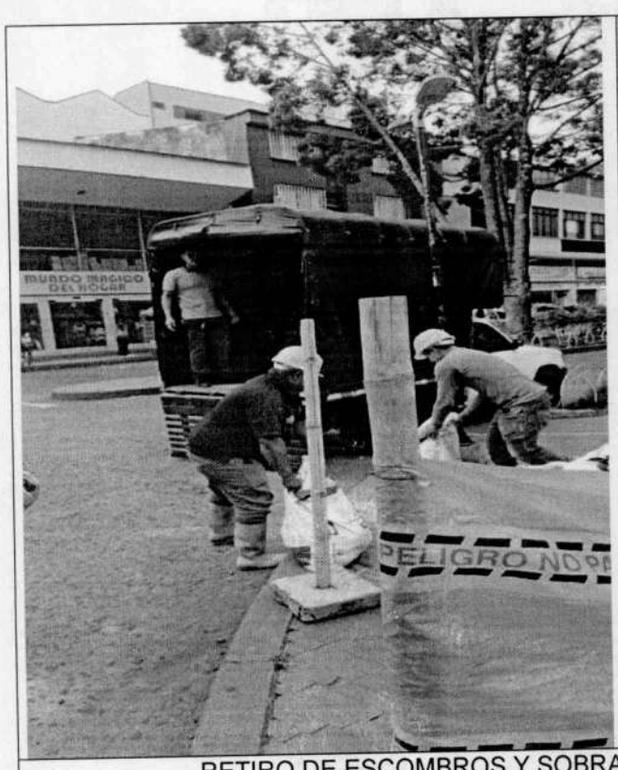




RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES DISTANCIA HASTA DE 40 KM



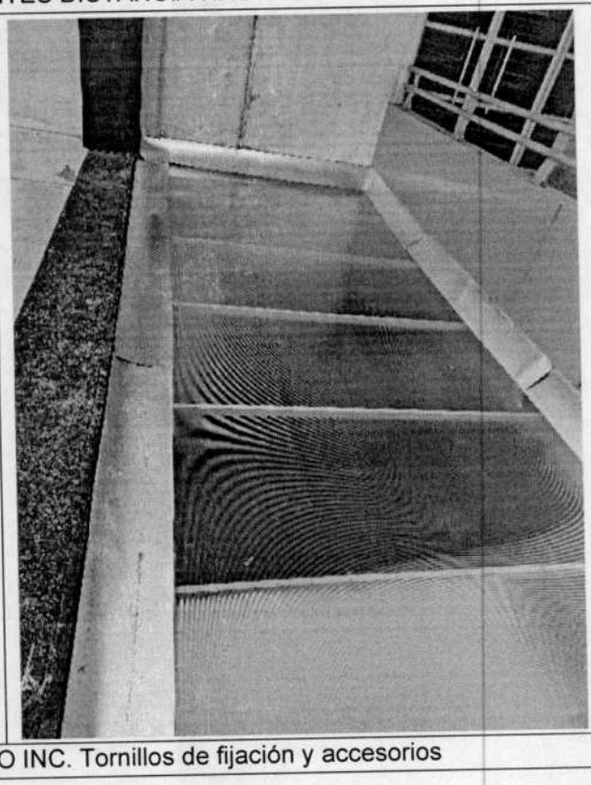



CUBIERTA EN TEJA POLICARBONATO INC. Tornillos de fijación y accesorios

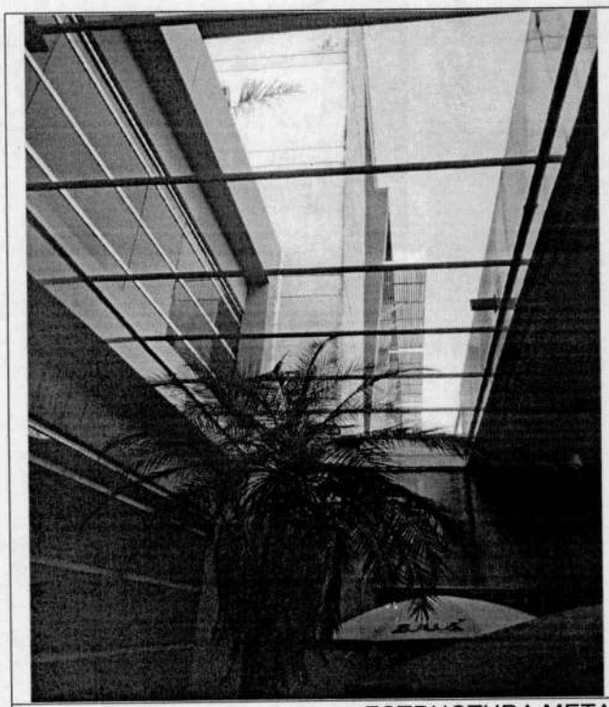




ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA

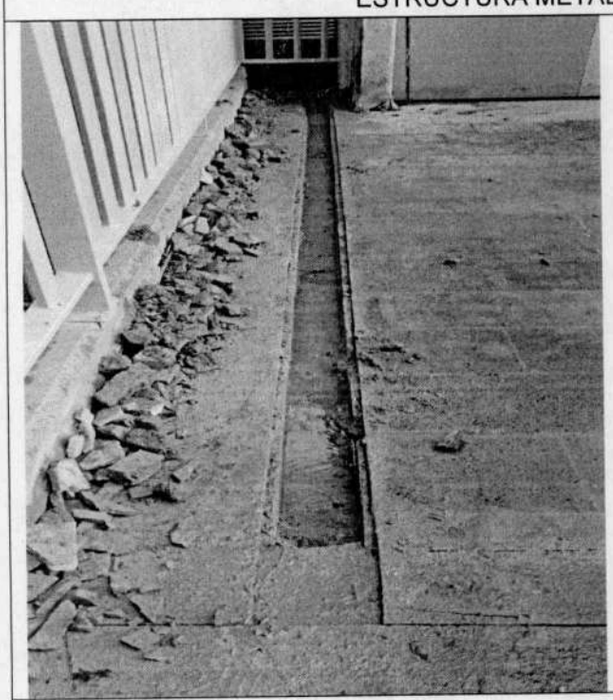

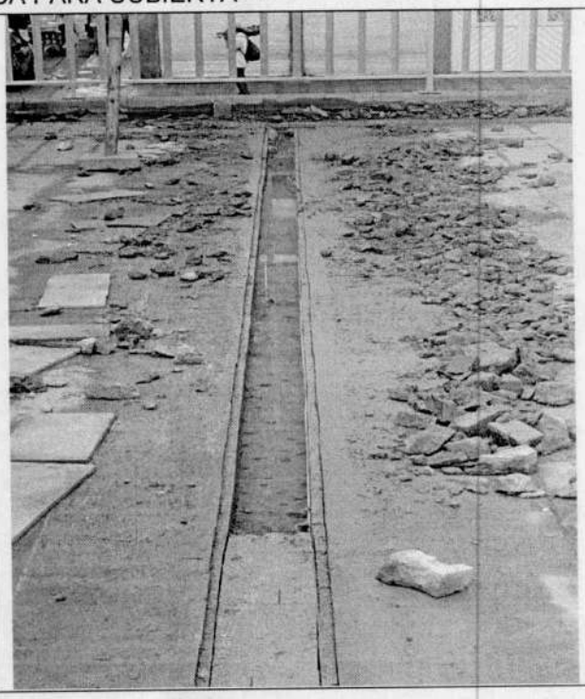


DEMOLICION ACABADO DE PISO INC. DEMOL DE ALISTADO DE PISO ESPESOR HASTA 4 CM, ACARREO HORIZONTAL HASTA 100 m, no inc retiro de obra



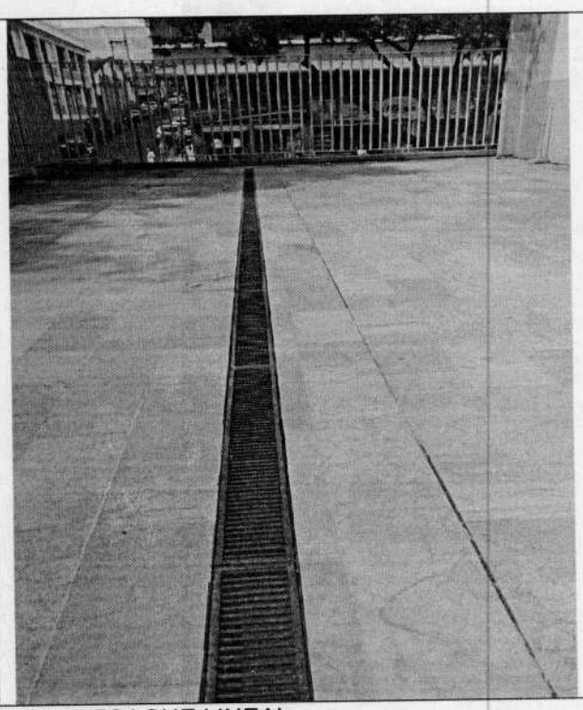


REJILLA CARCAMO PEATONAL DESAGUE LINEAL

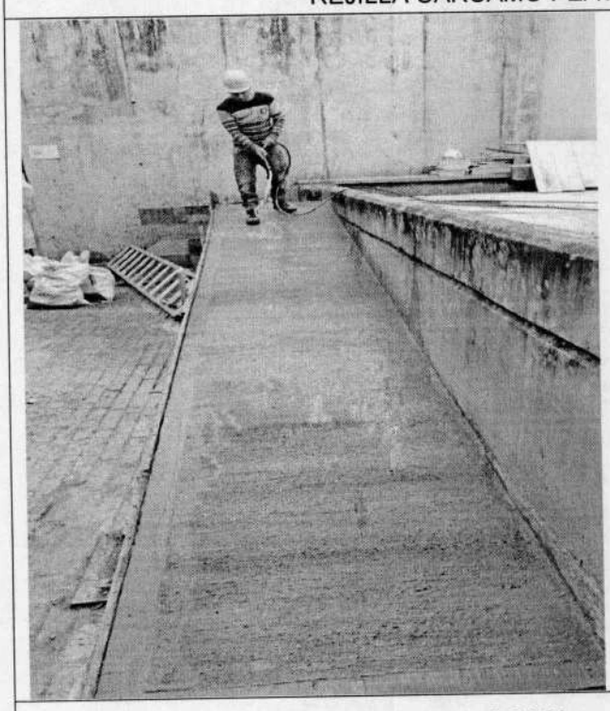


RAMPA EN CONCRETO 21 Mpa. A=0.90 M
DN=0.20M




ESCALERAS S/HIERRO

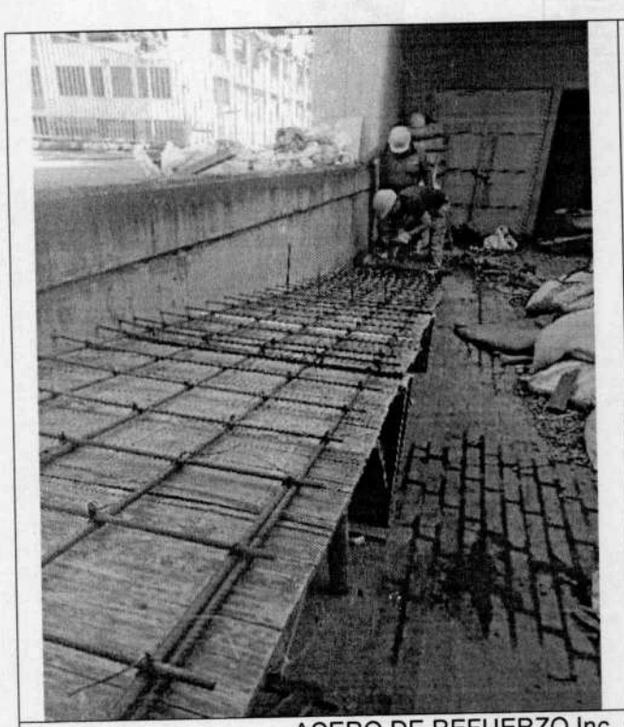


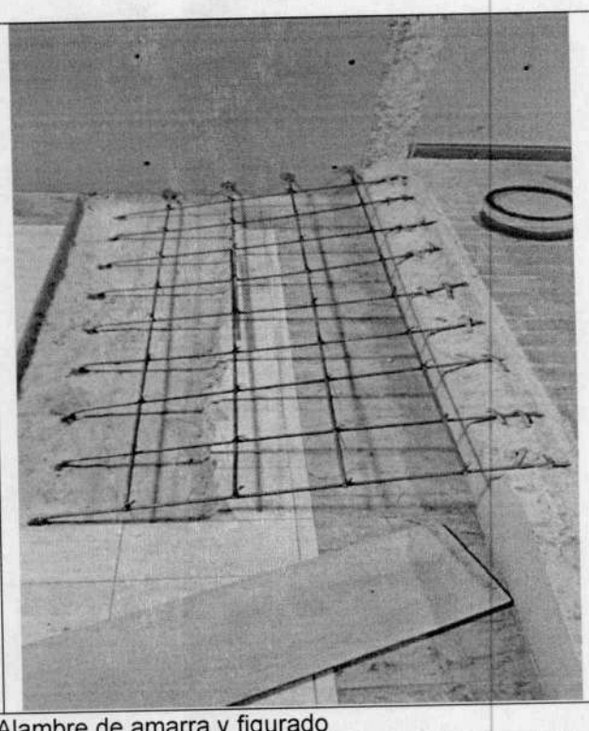


ACERO DE REFUERZO Inc. Alambre de amarra y figurado





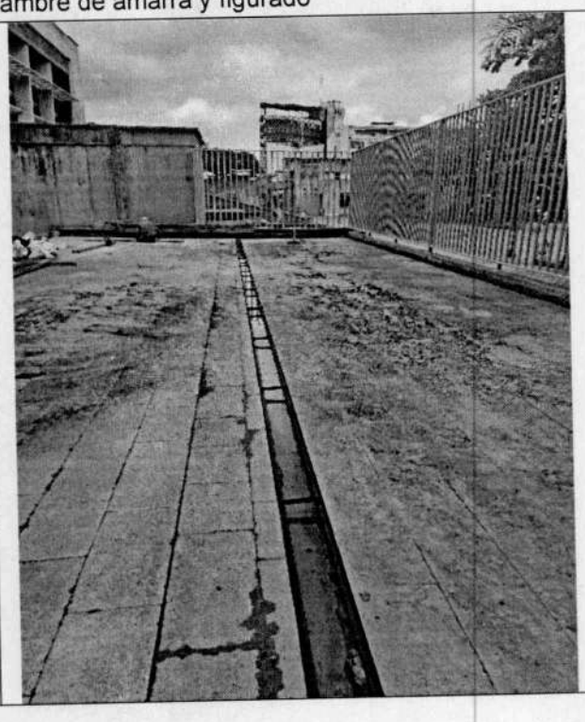


REJA CERRAMIENTO TUBO RECTANGULAR/ANTI-PINTADA

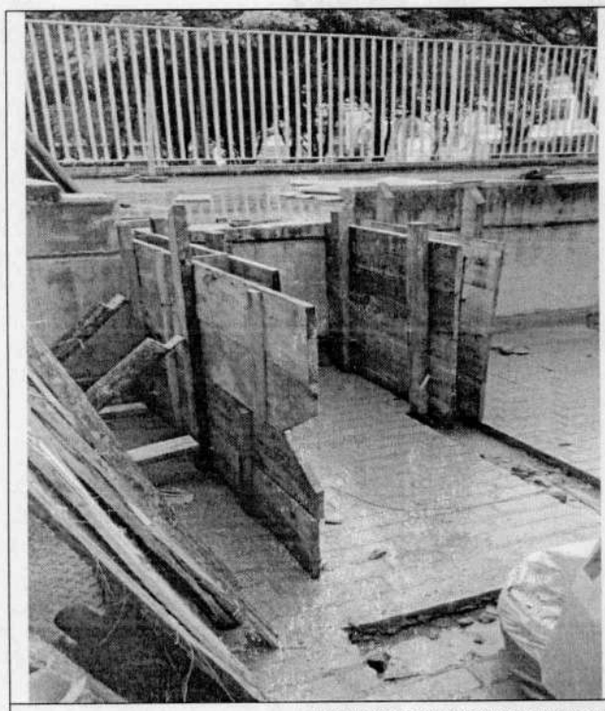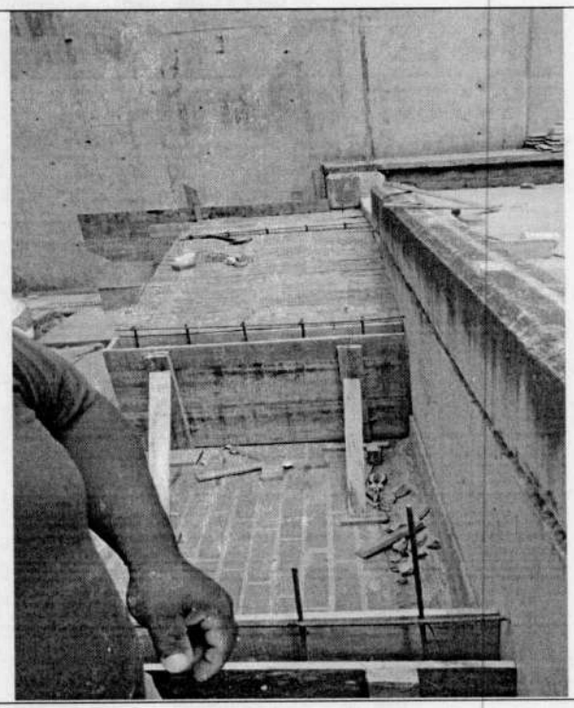



MURO EN CONCRETO E=.10 HASTA H=1.00 M S/H

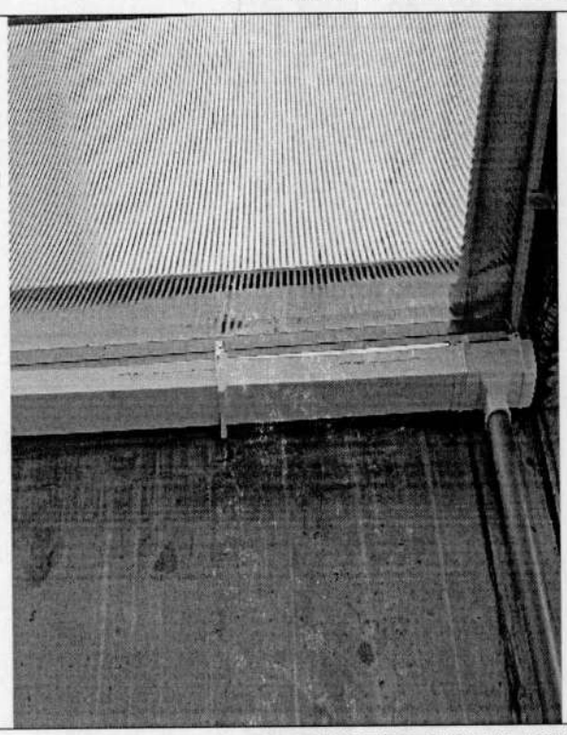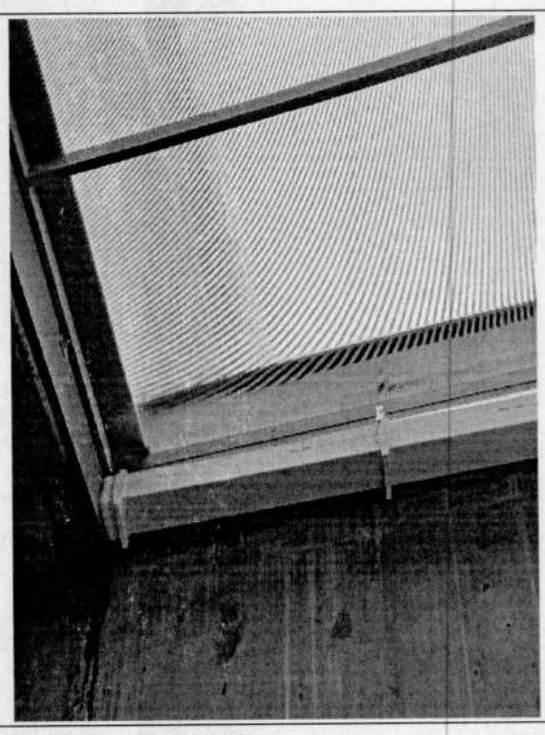SUMINISTRO E INTALACIÓN DE CANAL EN PVC DE 3"



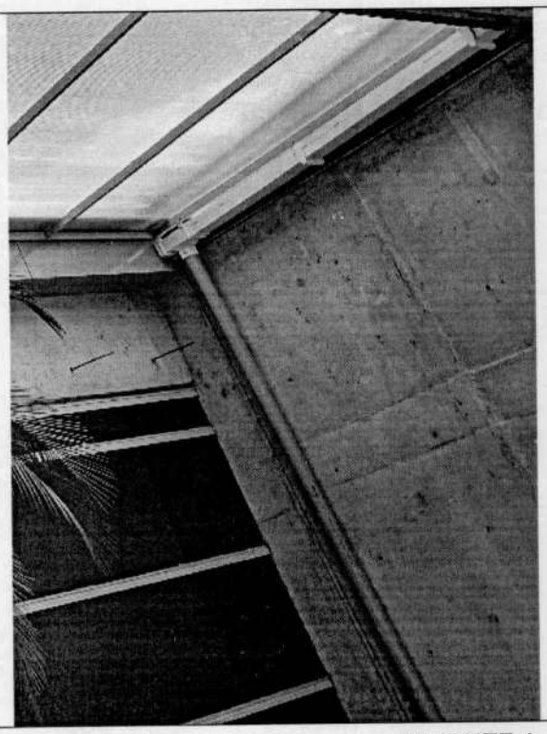

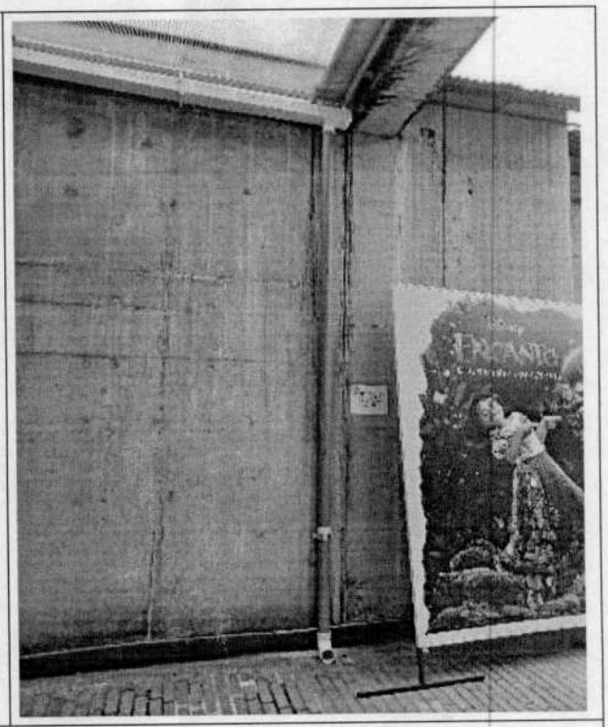BAJANTE A. LLUVIAS 3" PVC




BARANDA 1 1/2" TRES TUBOS HORIZ INC. INST







ANCLAJES DE 1/2"

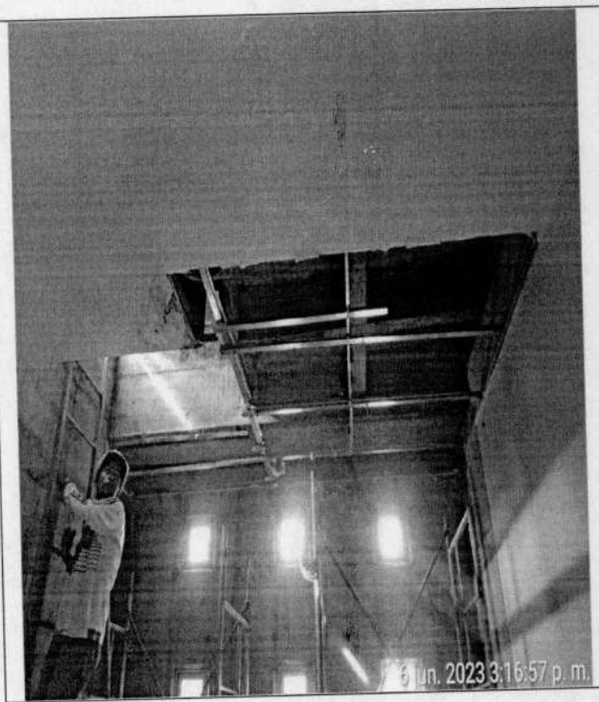


DESMONTE CIELO RASO Inc. Desmonte de la estructura del cielo raso y el acarreo horizontal

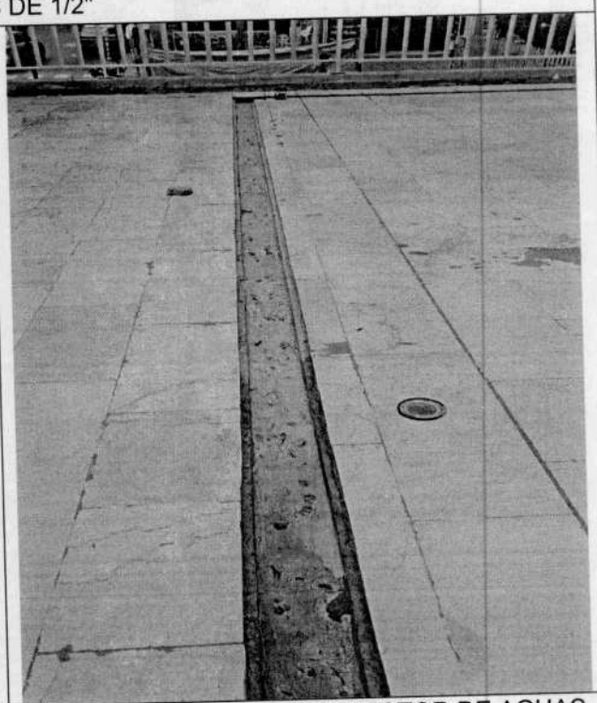





IMPERMEABILIZACION COLECTOR DE AGUAS

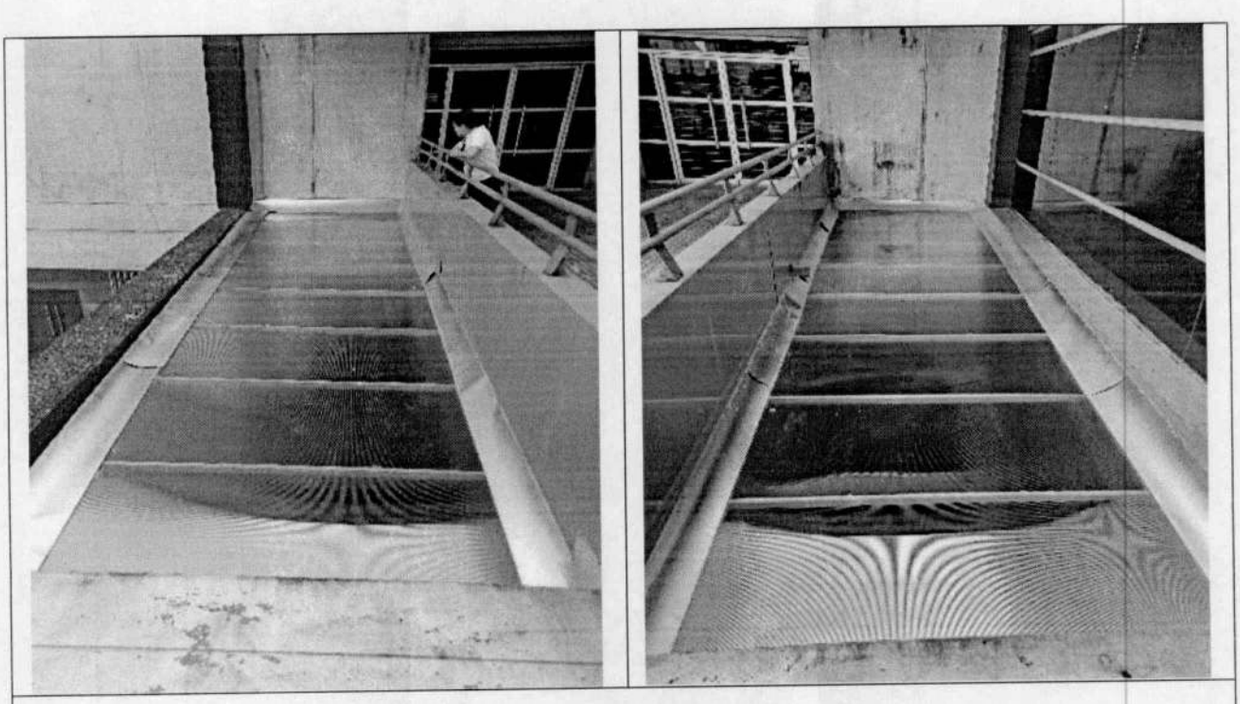

FLANCHE EN LAMINA DE ZINC C.16

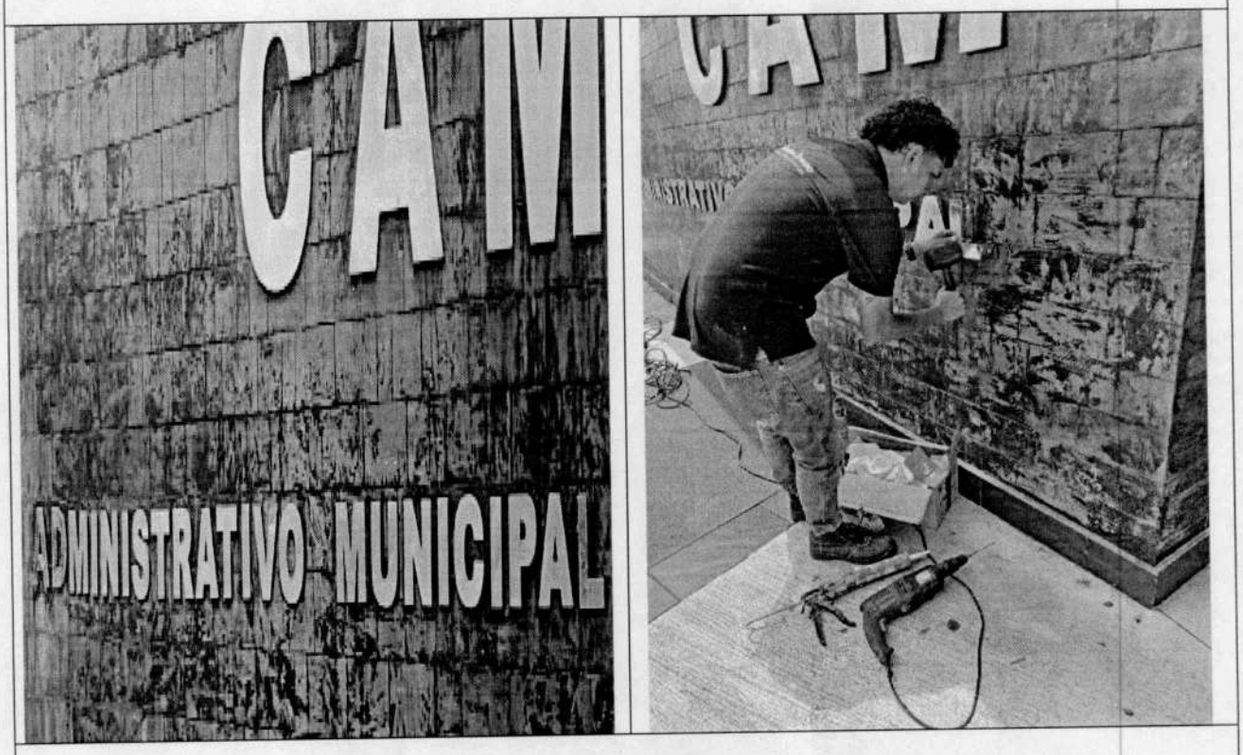

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LETRAS ALUMINIO CON CALIBRE 6MM

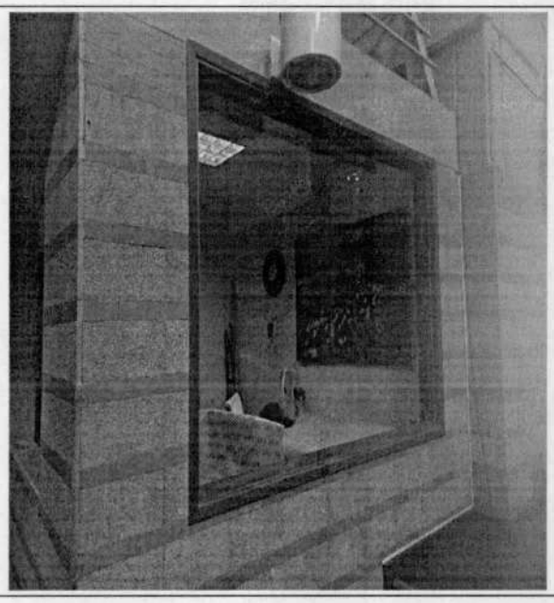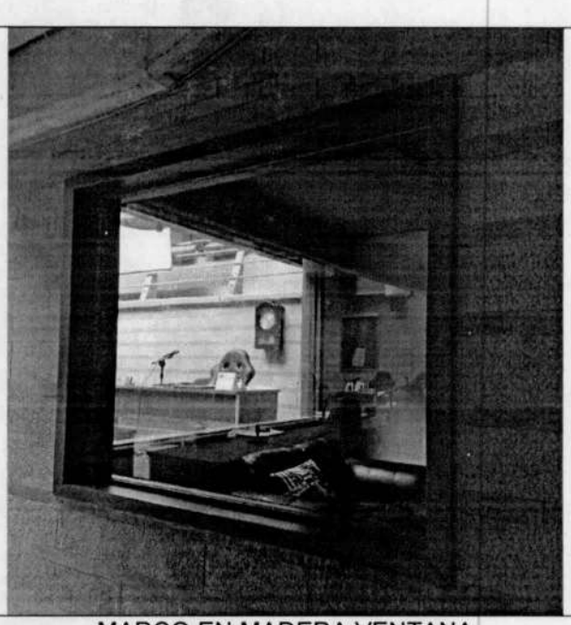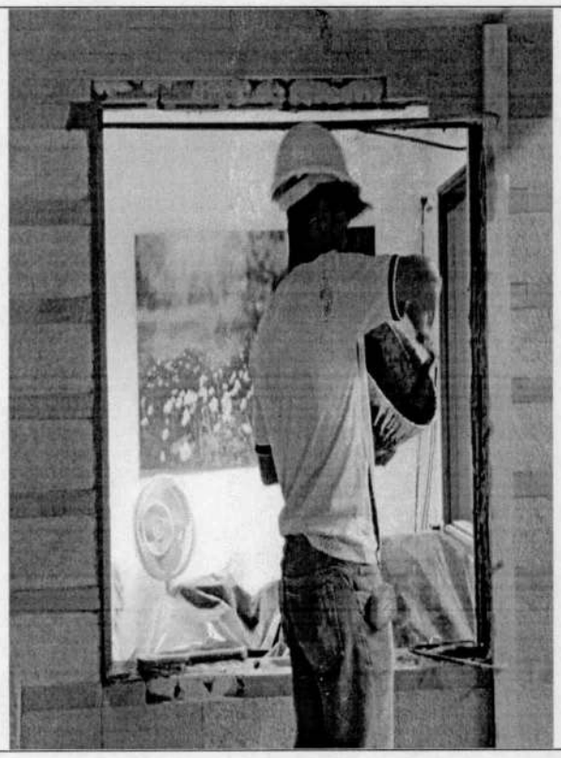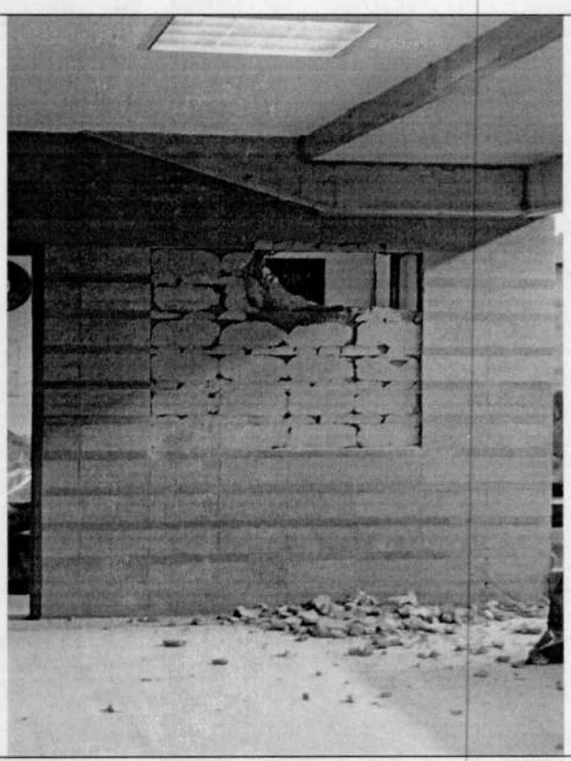	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4MM INC. SELLANTE EN POLIURETANO	MARCO EN MADERA VENTANA
	
FILOS Y DILATACIONES	DEMOLICION ENCHAPE PARED INC. ACARREO HORIZONTAL HASTA 100 M.

8. CONTROL POLIZAS

RIESGO AMPARADO	ASEGURADOR O GARANTE	TIPO DE GARANTÍA	# DE GARANTÍA	% AMPARADO	VALOR GARANTIZADO	VIGENCIA	
						DESDE	HASTA
Amparo de Cumplimiento del Contrato	ASEGURADORA SOLIDARIA	Póliza de Garantía	580-74-994000022355	20	$19.781.970,00	16/05/2023	29/11/2023
Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	ASEGURADORA SOLIDARIA	Póliza de Garantía	580-74-994000022355	5	$3.296.995,00	16/05/2023	29/07/2026
Amparo de Estabilidad y calidad de la obra	ASEGURADORA SOLIDARIA	Póliza de Garantía	580-74-994000022355	20	$19.781.970	16/05/2023	16/05/2028

Para constancia, se firma en el Municipio de Armenia Departamento del Quindío, a los treinta (30) días del mes de agosto del 2023.

ING. DAVID ESTIVEN ACEVEDO OSORIO
Supervisor del contrato de obra No. 002 de 2023
Municipio de Armenia

Proyectó y elaboró: Natalia Valencia Giraldo – Ingeniera Contratista Secretaria de Infraestructura Natalia Valencia G.

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 1

FECHA 16 de Mayo de 2023 HORA:

CONTRATO DE OBRA No: 002 FECHA: 2023

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing Residente	1	Maestro	1	Oficiales		Ayudantes	2	Otros:	5:30

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA:

Se realiza firma del acta de inicio, se recorre el lugar por parte del contratista de obra en compañia del personal.

Firma

Nombre: Jhon Jairo Sandoval Galindo

CONTRATISTA

INTERVENTOR O SUPERVISOR

Nota: si se requiere mas espacio usar la parte posterior del formato.

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 1

FECHA 17 de Mayo de 2023 HORA:

CONTRATO DE OBRA No: 002 FECHA: 2023

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

Herramienta Menor.

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing Residente	1	Maestro	1	Oficiales		Ayudantes	2	Otros:	Sisu

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA:

Se realiza recorrido por el sector Nor-Occidental de CAM en compañia de la supervisión en la cual se determinan las labores a realizar en este sector. Se inician labores de cerramiento para aislar el lugar de ejecución

Firma

Nombre Jhon Fredy Ramirez Cardona

CONTRATISTA

INTERVENTOR O SUPERVISOR

Nota: si se requiere mas espacio usar la parte posterior del formato.

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 1

FECHA 18 de Mayo de 2023 HORA:

CONTRATO DE OBRA No: 002 FECHA: 2023

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

Herramienta Menor.

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing Residente	1	Maestro	1	Oficiales		Ayudantes	2	Otros:	5:30

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA:

Se realizo recorrido por el concejo, definiendo intervenciones a realizar en este lugar y el modo en el cual se podran ejecutar. Se culmino el cerramiento de la zona Nor-Occidental del CAM.

Firma

Nombre: Jhon Jairo Sandoval Gallado

CONTRATISTA

INTERVENTOR O SUPERVISOR

Nota: si se requiere mas espacio usar la parte posterior del formato.

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 1

FECHA 19 de Mayo de 2023 HORA:

CONTRATO DE OBRA No: 002 FECHA: 2023

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

Cortadora con disco.

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing Residente	1	Maestro	1	Oficiales		Ayudantes	2	Otros:	5:30

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA:

Se inician labores de corte con disco para la realizacion del colector de aguas en el sector Noroccidental del CAM previa autorizacion de la supervision.

Firma

Nombre: Jhon Jairo Sandoval Galindo

CONTRATISTA

INTERVENTOR O SUPERVISOR

Nota: si se requiere mas espacio usar la parte posterior del formato.

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 1

FECHA 20 de Mayo de 2023 HORA:

CONTRATO DE OBRA No: 002 FECHA: 2023

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		X																						

EQUIPO UTILIZADO

Cortadora con disco

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing Residente	1	Maestro	1	Oficiales		Ayudantes	2	Otros:	3:50

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA:

Se continuan labores de corte con disco en la zona Noroccidental, las labores son suspendidas debido a la presencia de lluvias.

Firma

Nombre: Jhon Jairo Sandoval Gallodo

CONTRATISTA

INTERVENTOR O SUPERVISOR

Nota: si se requiere mas espacio usar la parte posterior del formato.

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 1

FECHA 23 de Mayo de 2023 HORA:

CONTRATO DE OBRA No: 002 FECHA: 2023

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo	1	2	3	X	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

Corte con disco, Herramienta Menor.

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing Residente	1	Maestro	1	Oficiales		Ayudantes	2	Otros:	5:50

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA:

Se continuan labores de corte con disco y se inicia la demolicion de acabado de Piso en la zona Noroccidental del CAM. Se inicia la preparación en fabrica de la reja de cerramiento para esta zona. Presencia de lluvias a hora de la tarde lo que impide la realización de labores.

Firma

Nombre: Jhon Jairo Sandoval Galindo

CONTRATISTA

INTERVENTOR O SUPERVISOR

Nota: si se requiere mas espacio usar la parte posterior del formato.

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 1

FECHA 24 de Mayo de 2023 HORA:

CONTRATO DE OBRA No: 002 FECHA: 2023

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

Cortadora con disco, herramienta menor.

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing Residente	1	Maestro	1	Oficiales		Ayudantes	2	Otros: Piso

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA:

Debido a las lluvias presentadas el día de ayer, se interfiere el normal desarrollo de labores puesto que es necesario evacuar el agua del lugar. Luego de esto se continua con labores de corte con disco y demolición de acabo de piso. Se continua fabricación de cerramiento en reja

Firma

Nombre Jhon Jairo Bandera Galindo

CONTRATISTA

INTERVENTOR O SUPERVISOR

Nota: si se requiere mas espacio usar la parte posterior del formato.

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 1

FECHA 25 de Mayo de 2023 HORA:

CONTRATO DE OBRA No: 002 FECHA: 2023

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

Cortadora con disco, Herramienta Menor.

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing Residente	1	Maestro	1	Oficiales		Ayudantes	2	Otros: 5:30

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA:

Se continua lubores de corte con disco, demolición de acabado de piso y elaboración del cerramiento en reja en fabrica.

Firma

Nombre: Jhon Jairo Sandoval Galindo

CONTRATISTA

INTERVENTOR O SUPERVISOR

Nota: si se requiere mas espacio usar la parte posterior del formato.

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 1

FECHA 26 de Mayo de 2023 HORA:

CONTRATO DE OBRA No: 002 FECHA: 2023

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

Cortadora con disco, Herramienta Menor.

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing Residente	1	Maestro	1	Oficiales		Ayudantes	2	Otros:	Disco

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA:

Se culminan las labores de corte con disco y la demolición de encachado de piso en la zona Noroccidental del CAM, además se culmina la elaboración del cerramiento en Reja en fabrica, quedando pendiente la instalación.

Firma

Nombre: Jhon Jairo Sandoval Galindo.

CONTRATISTA

INTERVENTOR O SUPERVISOR

Nota: si se requiere mas espacio usar la parte posterior del formato.

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 1

FECHA 27 de Mayo de 2023 HORA:

CONTRATO DE OBRA No: 002 FECHA: 2023

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			X																					

EQUIPO UTILIZADO

Herramienta Menor, Volqueta.

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing Residente	1	Maestro	1	Oficiales		Ayudantes	2	Otros:	5:30

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA:

Debido a las lluvias presentadas no se pudo laborar a temprana hora, se realizo acopio y retiro de sobrantes producto de la demolición de piso. Se inicia en fabrica la construcción de la rejilla para el cárcamo.

Firma

Nombre: Jhon Jairo Sandoval Galindo

CONTRATISTA

INTERVENTOR O SUPERVISOR

Nota: si se requiere mas espacio usar la parte posterior del formato.

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 1

FECHA 24 de Mayo de 2023 HORA:

CONTRATO DE OBRA No: 002 FECHA: 2023

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

Soldador, Herramienta Menor.

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing Residente	1	Maestro	1	Oficiales		Ayudantes	2	Otros:	SISO

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA:

Se inicia la instalación de la reja de cerramiento a tubo rectangular para la zona Noroccidente del CAM, esta actividad se realiza durante todo el día, se continua fabricación del cerramiento (rejilla).

Firma

Nombre: Jhon Jairo Sandoval Galindo

CONTRATISTA

INTERVENTOR O SUPERVISOR

Nota: si se requiere mas espacio usar la parte posterior del formato.

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 1

FECHA 30 de Mayo de 2023 HORA:

CONTRATO DE OBRA No: 002 FECHA: 2023

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo	1	2	X	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

Soldadura, Herramienta Menor.

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing Residente	1	Maestro	1	Oficiales		Ayudantes	2	Otros:	5 3 0

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA:

Debido a las lluvias presentadas en la mañana, se retoma la continuación de la reja de cerramiento en tubo rectangular, pero en la tarde se continua con esta actividad. Continuan la fabricación de la rejilla para el cargamo.

Firma

Nombre: Jhon Jairo Sandoval Galindo

CONTRATISTA

INTERVENTOR O SUPERVISOR

Nota: si se requiere mas espacio usar la parte posterior del formato.

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 1

FECHA 31 de Mayo de 2023 HORA:

CONTRATO DE OBRA No: 002 FECHA: 2023

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo	1	2	X	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing Residente	1	Maestro	1	Oficiales		Ayudantes	2	Otros:	S.S.V

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA:

Se finaliza la instalación de la totalidad de la reja del cerramiento en tubo rectangular en el sector Noroccidental del CAM. Se finaliza la fabricación de la rejilla para el cerramiento.

Firma

Nombre: Jhon Jairo Sandoval Giraldo

CONTRATISTA

INTERVENTOR O SUPERVISOR

Nota: si se requiere mas espacio usar la parte posterior del formato.

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 1

FECHA 01 de Junio de 2023 HORA:

CONTRATO DE OBRA No: 002 FECHA: 2023

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo	1	2	3	X	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

Soldadura, Herramienta Menor, Taladro

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing Residente		Maestro	1	Oficiales	1	Ayudantes	2	Otros:	S.S.O.

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA:

Se inicia la instalación de la rejilla para el cárcamo y las perforaciones necesarias para los anclajes necesarios para poder realizar la rampa. Se suspende labores en la tarde debido a la presencia de lluvias

Firma

Nombre: Jhon Jairo Sandoval Galindo

CONTRATISTA

INTERVENTOR O SUPERVISOR

Nota: si se requiere mas espacio usar la parte posterior del formato.

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 1

FECHA 02 de Junio de 2023 HORA:

CONTRATO DE OBRA No: 002 FECHA: 2023

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

Soldador, Herramienta Menor, Taladro

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing Residente	1	Maestro	1	Oficiales	1	Ayudantes	2	Otros:	5,50

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA:

Se continua con la instalación de la rejilla para el carcamo y las perforaciones necesarias para los anclajes de la rampa en la zona Noroccidental del CAM.

Firma

Nombre: Jhon Jairo Sandoval Galindo

CONTRATISTA

INTERVENTOR O SUPERVISOR

Nota: si se requiere mas espacio usar la parte posterior del formato.

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 1

FECHA 03 de Junio de 2023 HORA:

CONTRATO DE OBRA No: 002 FECHA: 2023

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

Soldadora, taladro, Herramienta Menor.

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing Residente	1	Maestro	1	Oficiales	1	Ayudantes	2	Otros:	5150

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA:

Se finalizan tanto la instalacion de la rejilla para el cercamo, como las perforaciones necesarias para la realizacion de anclajes propuesto de la construccion de la rampa en el sector Noroccidental del CAM

Firma

Nombre: Jhon Jairo Sandoval Galindo

CONTRATISTA

INTERVENTOR O SUPERVISOR

Nota: si se requiere mas espacio usar la parte posterior del formato.

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 1

FECHA 05 de Junio de 2023 HORA:

CONTRATO DE OBRA No: 002 FECHA: 2023

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

Herramienta Menor.

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing Residente	1	Maestro	1	Oficiales	1	Ayudantes	2	Otros:	5;30

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA:

Se inicia la realizacion de anclajes con su respectivo epoxico y el armado de acero necesario para el muro soporte de la rampa de la zona Noroccidente del CAM.

Firma

Nombre: Jhon Jairo Sandoval Galindo

CONTRATISTA

INTERVENTOR O SUPERVISOR

Nota: si se requiere mas espacio usar la parte posterior del formato.

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 1

FECHA 06 de Junio de 2023 HORA:

CONTRATO DE OBRA No: 002 FECHA: 2023

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

Herramienta Menor.

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing Residente	1	Maestro	1	Oficiales	1	Ayudantes	2	Otros:	S.S.O

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA:

Se continua con la realizacion de Anclajes con epoxico, se continua la instalacion de vidrio y se procede al armado de formaleta para la fundicion del nuevo soporte de la rampa del sector Noroccidental del CAM

Firma

Nombre: Jhon Jairo Sandoval Galindo

CONTRATISTA

INTERVENTOR O SUPERVISOR

Nota: si se requiere mas espacio usar la parte posterior del formato.

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 1

FECHA 07 de Junio de 2023 HORA:

CONTRATO DE OBRA No: 002 FECHA: 2023

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

Concretadora, vibrador de concreto, herramienta Menor.

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing Residente	1	Maestro	1	Oficiales	1	Ayudantes	2	Otros:	S.S.O.

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA:

Se realizo el vaciado del muro soporte de la rampa y se continua con la realizacion de anclajes para la rampa y escalera del sector Noroccidental del CAM. Se plantea exposicion el dia de mañana al honorable concejo de Armenia. para definir horarios y metodo de trabajo en este sector.

Firma

Nombre

CONTRATISTA

INTERVENTOR O SUPERVISOR

Nota: si se requiere mas espacio usar la parte posterior del formato.

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 1

FECHA 08 de Junio de 2023 HORA:

CONTRATO DE OBRA No: 002 FECHA: 2023

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

Herramienta Menor.

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing Residente	1	Maestro	1	Oficiales	4	Ayudantes	2	Otros:	Sisu

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA:

Se realiza exposición ante el honorable concejo en compañía de la supervisión, se define como color crista la teja a instalar en el domo, además de esto la no realización de labores varias los concejales realizan cesiones, lo cual repercutirá en un mayor tiempo de ejecución. Se culmina la realización de anclajes y se continua con la acomodación para la fundición de la rampa y escalera.

Firma

Nombre: Jhon Jairo Sandoval Galindo

CONTRATISTA

INTERVENTOR O SUPERVISOR

Nota: si se requiere mas espacio usar la parte posterior del formato.

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 1

FECHA 09 de Junio de 2023 HORA:

CONTRATO DE OBRA No: 002 FECHA: 2023

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo	1	2	3	X	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

Herramienta Menor

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing Residente	1	Maestro	1	Oficiales	1	Ayudantes	2	Otros:	S.S.V.

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA:

Debido a la presencia de lluvias en horas de la mañana se imposibilita labores en horas de la tarde se culmina la demolición de acero y formaletas para la rampa del sector Noroccidental del CAM.

Firma

Nombre: Jhon Jairo Sandoval Galindo

CONTRATISTA

INTERVENTOR O SUPERVISOR

Nota: si se requiere mas espacio usar la parte posterior del formato.

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 1

FECHA 10 de Junio de 2023 HORA:

CONTRATO DE OBRA No: 002 FECHA: 2023

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

Mezcladora, vibrador de concreto, Herramienta Menor.

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing Residente	1	Maestro	1	Oficiales	4	Ayudantes	7	Otros:	SSV.

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA:

Se realiza la fundicion total de la rampa y escalera necesarias para la circulación en la Zona Nor-Occidental del CAM.

Firma

Nombre: Jhon Jairo Sandoval Galindo

CONTRATISTA

INTERVENTOR O SUPERVISOR

Nota: si se requiere mas espacio usar la parte posterior del formato.

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 1

FECHA 13 de Junio de 2023 HORA:

CONTRATO DE OBRA No: 002 FECHA: 2023

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

Herramienta Menor.

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing Residente	1	Maestro	1	Oficiales	1	Ayudantes	2	Otros:	S.S.V.

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA:

Se inician labores de impermeabilizacion de la cubierta del concejo con tela en poliester, presencia de lluvias en horas de la tarde lo que retrazo esta actividad.

Firma

Nombre: Jhon Jairo Sandoval Galindo

CONTRATISTA

INTERVENTOR O SUPERVISOR

Nota: si se requiere mas espacio usar la parte posterior del formato.

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 1

FECHA 14 de Junio de 2023 HORA:

CONTRATO DE OBRA No: 002 FECHA: 2023

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

Herramienta Menor.

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing Residente	1	Maestro	1	Oficiales	1	Ayudantes	1	Otros:	Sisu.

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA:

Se continuan las labores de impermeabilizacion con felu en poliester de la cubierta del Concejo. Se inicia produccion en fabrica de la barra de pvc para la rampa en la zona Noroccidental del CAM.

Firma

Nombre: Jhon Jairo Sandoval Galindo

CONTRATISTA

INTERVENTOR O SUPERVISOR

Nota: si se requiere mas espacio usar la parte posterior del formato.

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 1

FECHA 19 de Junio de 2023 HORA:

CONTRATO DE OBRA No: 002 FECHA: 2023

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

Herramienta Menor.

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing Residente	1	Maestro	1	Oficiales	1	Ayudantes	2	Otros: Sisa

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA:

Se continua con la impermeabilizacion con tela poliester de la cubierta del concejo, se inician los trabajos en los desagües de 4", se continua la fabricacion de la baranda para la rampa de la zona Noroccidental del CAM

Firma

Nombre Jhon [illegible]

CONTRATISTA

INTERVENTOR O SUPERVISOR

Nota: si se requiere mas espacio usar la parte posterior del formato.

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 1

FECHA 16 de Junio de 2023 HORA:

CONTRATO DE OBRA No: 002 FECHA: 2023

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

Herramienta Menor.

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing Residente	1	Maestro	1	Oficiales	1	Ayudantes	2	Otros:	Sisu

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA:

Se finaliza la adecuacion de los desagues de 4" y se continua con la impermeabilizacion con tela poliester de y la cubierta del concejo, se finaliza la produccion en fabrica de la barandas para la rampa del sector Noroccidental del CAM

Firma

Nombre: Jhon Jairo Sandoval Salcedo

CONTRATISTA

INTERVENTOR O SUPERVISOR

Nota: si se requiere mas espacio usar la parte posterior del formato.

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 1

FECHA 17 de Junio de 2023 HORA:

CONTRATO DE OBRA No: 002 FECHA: 2023

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

Herramienta Menor.

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing Residente	1	Maestro	1	Oficiales		Ayudantes	2	Otros:	Siso

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA:

Se finaliza la impermeabilización con Tela poliester del sector Noroccidental del CAM, se realiza limpieza de este lugar. Se inicia producción de la estructura para la cubierta del sector Nor-occidental del CAM

Firma

Nombre: Jhon Jairo Sandoval Galindo

CONTRATISTA

INTERVENTOR O SUPERVISOR

Nota: si se requiere mas espacio usar la parte posterior del formato.

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 1

FECHA 20 de Junio de 2023 HORA:

CONTRATO DE OBRA No: 002 FECHA: 2023

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

Soldador, Herramienta Menor.

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing Residente	1	Maestro	1	Oficiales		Ayudantes	2	Otros:	S;SO

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA:

Se realiza la instalación total de la baranda sobre la rampa del sector Nor-occidental. En aras de garantizar un buen funcionamiento del cercano se inicia la impermeabilización del mismo. Se continua con la producción en fabrica de la estructura metalica para la cubierta.

Firma

Nombre: Jhon Jairo Sandoval Galindo

CONTRATISTA

INTERVENTOR O SUPERVISOR

Nota: si se requiere mas espacio usar la parte posterior del formato.

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 1

FECHA 21 de Junio de 2023 HORA:

CONTRATO DE OBRA No: 002 FECHA: 2023

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

Soldador, Herramienta Menor.

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing Residente	1	Maestro	1	Oficiales		Ayudantes	2	Otros:	Siso.

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA:

Se ultiman detalles y finaliza la instalacion de la bateria para el sector Noroccidental del CAM. Se continua con la implementacion del circuito colector de aguas y la produccion en fabrica de la estructura metalica para la cubierta.

Firma

Nombre: Jhon Jairo Sandoval Galindo

CONTRATISTA

INTERVENTOR O SUPERVISOR

Nota: si se requiere mas espacio usar la parte posterior del formato.

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 1

FECHA 22 de Junio de 2023 **HORA:**

CONTRATO DE OBRA No: 002 **FECHA: 2023**

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

Herramienta Menor.

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing Residente	1	Maestro	1	Oficiales		Ayudantes	2	Otros: Siso

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA:

Debido a la imposibilidad de tubear al interior del Concejo por las secciones se viene presentado retraso en la ejecución. Se culmina la impermeabilización del cárcamo colector de la zona Noroccidental del CAM. Se continua con la producción de la estructura metalica para cubierta.

Firma

Nombre: Jhon Jairo Sandoval Galindo

CONTRATISTA **INTERVENTOR O SUPERVISOR**

Nota: si se requiere mas espacio usar la parte posterior del formato.

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 1

FECHA 23 de Junio de 2023 HORA:

CONTRATO DE OBRA No: 002 FECHA: 2023

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

Cortadora con disco y andamios, herramienta menor.

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing Residente	1	Maestro	1	Oficiales		Ayudantes	2	Otros:	Siso.

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA:

Se inicia labores tarde debido a las secimes del concejo municipal, se realiza armado de andamios, se inicia corte con disco para la instalacion de las ventanas solicitadas. Se finaliza en fabrica la elaboracion de la estructura metalica para la cubierta de la zona Noroccidental del CAM.

Firma

Nombre: Jhon Jairo Sandoval Galindo

CONTRATISTA

INTERVENTOR O SUPERVISOR

Nota: si se requiere mas espacio usar la parte posterior del formato.

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 1

FECHA 24 de Junio de 2023 HORA:

CONTRATO DE OBRA No: 002 FECHA: 2023

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

Cortadora con Disco, Andamios, Herramienta Menor.

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing Residente	1	Maestro	1	Oficiales		Ayudantes	2	Otros:	Fisa.

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA:

Se inician labores tarde debido a las sesiones del concejo municipal, se inicia con el desmonte de cielo raso y se continua labor de corte con disco para las ventanas en el Concejo y demolicion de enchape ef.

Firma

Nombre: Jhon Jairo Sandoval Galindo

CONTRATISTA

INTERVENTOR O SUPERVISOR

Nota: si se requiere mas espacio usar la parte posterior del formato.

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 1

FECHA 26 de Junio de 2023 HORA:

CONTRATO DE OBRA No: 002 FECHA: 2023

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

Soldador, Herramienta Menor.

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing Residente	1	Maestro	1	Oficiales		Ayudantes	2	Otros:	S.S.V.

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA:

Debido a la imposibilidad de trabajar el dia de hoy en el concejo por la sesion, se inicia la instalación de la estructura para la cubierta de la zona Noroccidental del CAM.

Firma

Nombre: Jhon Jairo Sandoval Galindo

CONTRATISTA

INTERVENTOR O SUPERVISOR

Nota: si se requiere mas espacio usar la parte posterior del formato.

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 1

FECHA 27 de Junio de 2023 HORA:

CONTRATO DE OBRA No: 002 FECHA: 2023

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

Soldador, Herramienta Menor, Andamios

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing Residente	1	Maestro	1	Oficiales		Ayudantes	2	Otros:	S/SO.

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA:

Se culmina el corte con disco y demoliciones necesarias para las ventanas del concejo, además de esto se desmonta una sección de cielo raso. Paralelo a esto se continua trabajando en la instalación de la estructura metalica para la cubierta de la zona Noroccidental del CAM

Firma

Nombre: Jhon Jairo Sandoval Galindo

CONTRATISTA

INTERVENTOR O SUPERVISOR

Nota: si se requiere mas espacio usar la parte posterior del formato.

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 1

FECHA 29 de Junio de 2023 HORA:

CONTRATO DE OBRA No: 002 FECHA: 2023

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

Soldadura, Andamios, Vulgueta, Herramienta Menor.

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing Residente	1	Maestro	1	Oficiales		Ayudantes	7	Otros:	Siso.

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA:

Se culmina la instalación de la estructura metalica para la cubierta de la Zona Noroccidental del CAM. Se culmina el desmonte del cielo raso a reemplazar y se realiza la entrega de los entregables producto de las labores realizadas en el Concejo.

Firma

Nombre: Jhon Jairo Sandoval Gallindez

CONTRATISTA

INTERVENTOR O SUPERVISOR

Nota: si se requiere mas espacio usar la parte posterior del formato.

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 1

FECHA 29 de Junio de 2023 HORA:

CONTRATO DE OBRA No: 002 FECHA: 2023

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

Andamios, Herramienta Menor.

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing Residente	1	Maestro	1	Oficiales		Ayudantes	2	Otros: S.J.U.

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA:

Se realiza la instalación de 70% del cielo raso en panel yeso en el Concejo debido al inicio de labores, ya para finalizar el producto de los recintos del concejo municipal.

Firma

Nombre: Jhon Jairo Sandoval Galindo

CONTRATISTA

INTERVENTOR O SUPERVISOR

Nota: si se requiere mas espacio usar la parte posterior del formato.

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 1

FECHA 30 de Junio de 2023 HORA:

CONTRATO DE OBRA No: 002 FECHA: 2023

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

Andamios y Herramienta Menor.

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing Residente	1	Maestro	1	Oficiales		Ayudantes	2	Otros: Sisa

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA:

Nuevamente se inicia labores, luego que se cierre del concejo municipal, que asi se culmina la instalacion de cielo raso en placa de yeso y se inicia con los resanes y pintura necesarios para darle acabado final.

Firma

Nombre: Jhon Jairo Sandoval Galindo

CONTRATISTA

INTERVENTOR O SUPERVISOR

Nota: si se requiere mas espacio usar la parte posterior del formato.

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 1

FECHA 01 de Julio de 2023 HORA:

CONTRATO DE OBRA No: 002 FECHA: 2023

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

Andamios, Herramienta Menor.

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing Residente	1	Maestro	1	Oficiales		Ayudantes	2	Otros:	Siso.

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA:

Se culminan los resanes y pintura con vinilo del cielo raso en panel yeso del Concejo, dandole finalidad asi a esta actividad.

Firma

Nombre: Jhon Jairo Santoyal Galindo

CONTRATISTA

INTERVENTOR O SUPERVISOR

Nota: Si se requiere mas espacio usar la parte posterior del formato.

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 1

FECHA 04 de Julio de 2023 HORA:

CONTRATO DE OBRA No: 002 FECHA: 2023

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

Herramienta menor.

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing Residente	1	Maestro	1	Oficiales	1	Ayudantes	1	Otros:	SISO.

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA:

Se inicia la adecuación para la realización de la rampa y escalera en reciclaje dentro del recinto del concejo, es importante resaltar que los trabajos se inician tarde debido a la sesiones del concejo municipal. Se realizan la demolición de enchape en la zona donde se va a realizar la ventana y el faltubo.

Firma

Nombre: Jhon Jairo Sandoval Gallardo

CONTRATISTA

INTERVENTOR O SUPERVISOR

Nota: si se requiere mas espacio usar la parte posterior del formato.

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 1

FECHA 05 de Julio de 2023. HORA:

CONTRATO DE OBRA No: 002 FECHA: 2023

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

Cortadora con disco, herramienta Menor.

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing Residente	1	Maestro	1	Oficiales	1	Ayudantes	1	Otros:	Sisu

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA:

Se realizan los cortes necesarios para delimitar la zona de intervencion dentro del concejo con ayuda de una cortadora y unidad de esmeril. Se inician tareas de labores debido a los lecinos del concejo municipal

Firma

Nombre: Jhon Jairo Sandoval Gallindo

CONTRATISTA

INTERVENTOR O SUPERVISOR

Nota: si se requiere mas espacio usar la parte posterior del formato.

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 1

FECHA 06 de Julio de 2023 **HORA:**

CONTRATO DE OBRA No: 002 **FECHA:** 2023

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing Residente		Maestro	1	Oficiales	1	Ayudantes	1	Otros:	Silo.

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA:

Luego de las socidades del concejo, se inicio el trabajo tarde y se realizo la demolicion y adecuacion necesaria para fundicion y dejo el acabado necesario el dia de mañana.

Firma

Nombre: Jhon Jairo Sandoval Galindo

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR O SUPERVISOR

Nota: si se requiere mas espacio usar la parte posterior del formato.

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 1

FECHA 07 de Julio de 2023 **HORA:**

CONTRATO DE OBRA No: 002 **FECHA: 2023**

OBJETO DEL CONTRATO: **CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL**

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

Herramienta Menor.

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing Residente	1	Maestro	1	Oficiales	1	Ayudantes	1	Otros:	Sisa.

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA:

Se realiza la fundicion y obras necesarias para darle el acabado a la rampa y vereda al interior del concejo municipal.

Firma

Nombre: Jhon Jairo Sandoval Galindo

CONTRATISTA

INTERVENTOR O SUPERVISOR

Nota: si se requiere mas espacio usar la parte posterior del formato.

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 1

FECHA 06 de Julio de 2023 **HORA:**

CONTRATO DE OBRA No: 002 **FECHA: 2023**

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

Andamios, Herramienta Menor.

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing Residente		Maestro	1	Oficiales	1	Ayudantes	1	Otros:	Siso.

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA:

Se realiza limpieza luego de las obras realizadas y se realiza el armado de andamios necesarios para trabajar en la cupula, todo al interior del concejo municipal.

Firma

Nombre: Jhon Jairo Sandoval Galindo

CONTRATISTA

INTERVENTOR O SUPERVISOR

Nota: si se requiere mas espacio usar la parte posterior del formato.

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 1

FECHA 20 de Julio de 2023 HORA:

CONTRATO DE OBRA No: 002 FECHA: 2023

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

Andamios, Herramienta menor.

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing Residente	1	Maestro	1	Oficiales	1	Ayudantes	1	Otros:	SISO,

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA:

Se continua con el armado de andamios y se colocan el aseguramiento de lineas de vida para poder iniciar con la instalacion de la teja en policarbonato.

Firma

Nombre: Jhon Jairo Sandoval Galindo

CONTRATISTA

INTERVENTOR O SUPERVISOR

Nota: si se requiere mas espacio usar la parte posterior del formato.

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 1

FECHA 27 de Julio de 2023 HORA:

CONTRATO DE OBRA No: 002 FECHA: 2023

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

Andamios, Herramienta Menor.

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing Residente	1	Maestro	1	Oficiales	1	Ayudantes	1	Otros:	SISO.

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA:

Se realiza la instalación de 3 secciones de teja en la cubierta del concejo posterior a su desmonte. Se realizan los filos y dilataciones necesarios para las ventanas.

Firma

Nombre: Jhon Jairo Sandoval Galindo C.C.

CONTRATISTA

INTERVENTOR O SUPERVISOR

Nota: si se requiere mas espacio usar la parte posterior del formato.

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 1

FECHA 12 de Julio de 2023 **HORA:**

CONTRATO DE OBRA No: 002 **FECHA: 2023**

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

Andamios, Herramienta Menor.

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing Residente	1	Maestro	1	Oficiales	1	Ayudantes	1	Otros:	5:30

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA:

Se realiza el desmonte y posterior instalacion de 5 lecciones de teja en la cupula del concejo.

Firma

Nombre: Jhon Jairo Sandoval Garrido

CONTRATISTA

INTERVENTOR O SUPERVISOR

Nota: si se requiere mas espacio usar la parte posterior del formato.

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 1

FECHA 13 de Julio de 2023 **HORA:**

CONTRATO DE OBRA No: 002 **FECHA: 2023**

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

Andamios, Herramienta Menor.

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing Residente		Maestro	1	Oficiales	1	Ayudantes	1	Otros:	5.50.

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA:

Se realiza el desmonte y posterior instalación de 5 secciones de teja en la cúpula del concejo. Se realiza la instalación del marco en madera para las 2 ventanas.

Firma

Nombre: Jhon Jairo Sandoval Galindo

CONTRATISTA

INTERVENTOR O SUPERVISOR

Nota: si se requiere mas espacio usar la parte posterior del formato.

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 1

FECHA 14 de Julio de 2023 **HORA:**

CONTRATO DE OBRA No: 002 **FECHA: 2023**

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

Andamios y Herramienta Menor.

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing Residente		Maestro	1	Oficiales	1	Ayudantes	1	Otros:	Sijo

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA:

Se realiza el desmonte e instalación de las 3 secciones faltantes en la cupula del concejo y se inicia el desmonte de andamios y limpieza del lugar. Se realiza la instalación de los vidrios en foam para las ventanas.

Firma

Nombre: Jhon Jairo Sandoval Galindo

CONTRATISTA

INTERVENTOR O SUPERVISOR

Nota: si se requiere mas espacio usar la parte posterior del formato.

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 1

FECHA 25 de Julio de 2023 HORA:

CONTRATO DE OBRA No: 002 FECHA: 2023

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

Andamios y Herramienta Menor.

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing Residente		Maestro	1	Oficiales	1	Ayudantes	1	Otros:	Sin.

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA:

Se termina de desmontar los andamios y se realiza la limpieza total de las zonas donde se laboro en el concejo.

Firma

Nombre: Jhon Jairo Sandoval Galindo

CONTRATISTA

INTERVENTOR O SUPERVISOR

Nota: si se requiere mas espacio usar la parte posterior del formato.

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 1

FECHA 17 de Mayo de 2023 **HORA:**

CONTRATO DE OBRA No: 002 **FECHA: 2023**

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing Residente	1	Maestro		Oficiales		Ayudantes		Otros:	Solo.

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA:

Debido a la falta de suministro de los tipos en policarbonato y las letras en aluminio se realiza la suspension del contrato por un termino de 10 dias.

Firma

Nombre: Jhon Jairo Sandoval Galindo

CONTRATISTA

INTERVENTOR O SUPERVISOR

Nota: si se requiere mas espacio usar la parte posterior del formato.

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 1

FECHA 27 de Julio de 2023 HORA:

CONTRATO DE OBRA No: 002 FECHA: 2023

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

Escalera, Herramienta Menor.

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing Residente	1	Maestro	1	Oficiales	1	Ayudantes	1	Otros: Eslinga

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA:

Se realiza la instalacion de la cubierta en policarbonato, con su respectiva canal amarillas y sus bajantes en la zona Nor-occidental del centro Administrativo, Ademas de esto se realiza la instalacion de las letras en el CAM y en el Concejo. Se inicia pintura al interior del Concejo.

Firma

Nombre: Jhon Jairo Sandoval Galindo

CONTRATISTA

INTERVENTOR O SUPERVISOR

Nota: si se requiere mas espacio usar la parte posterior del formato.

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 1

FECHA 29 de Julio de 2023 **HORA:**

CONTRATO DE OBRA No: 002 **FECHA: 2023**

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

Herramienta Menor.

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing Residente	1	Maestro		Oficiales		Ayudantes	1	Otros:	5.30

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA:

Se realiza limpieza, se recogen las herramientas y se entregan los sitios intervenidos, siendo recibidos y a satisfacción por la supervisión. Se da por culminado el contrato. Se continua pintura al interior del concejo.

Firma

Nombre: Jhon Jairo Sandoval Galindo

CONTRATISTA

INTERVENTOR O SUPERVISOR

Nota: si se requiere mas espacio usar la parte posterior del formato.

	BITACORA DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-004 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 1

FECHA 24 de Julio de 2023 **HORA:**

CONTRATO DE OBRA No: 002 **FECHA: 2023**

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

NOTA: Realizar anotaciones dia a dia, en el total de tiempo de ejecucion del contrato.

Horas de lluvia (señale con una X)

Estado del tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

EQUIPO UTILIZADO

Herramienta Menor

CANTIDAD DE PERSONAL

Director de obra		Ing Residente		Maestro	1	Oficiales	1	Ayudantes	1	Otros:	5.3.U.

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DIA:

Se culmina la pintura al interior del concejo y se realiza limpieza en todos los lugares donde se realizaron labores. Se da por culminado el contrato.

Firma

Nombre: Jhon Jairo Sandoval Galindo.

CONTRATISTA

INTERVENTOR O SUPERVISOR

Nota: si se requiere mas espacio usar la parte posterior del formato.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14744800522

(415)7707212489984(8020) 000001474480052 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 5 5 0 9 9 5	8	Impuestos y Aduanas de Armenia 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 5 5 0 9 9 5	1 9 8 4 1 2 1 7

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Quindío 6 3	Armenia 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
SANDOVAL	GALINDO	JHON	JAIRO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Quindío 6 3	Armenia 0 0 1

41. Dirección principal
CON LA ARCADIA MZ 18 CA 3

42. Correo electrónico jhonsandoval333@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7 4 1 0 9 2 6	3 2 1 8 1 5 8 1 2 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 1 0 1 0 1						2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código 5 1 4 2 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
62 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 03 - 01 / 22 : 06: 43

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre SANDOVAL GALINDO JHON JAIRO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14744800522

(415)7707212489984(8020) **000001474480052 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 5 5 0 9 9 5	8	Impuestos y Aduanas de Armenia 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase		
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	%
83. Nacional público	%
84. Nacional privado	%
85. Extranjero	%
86. Extranjero público	%
87. Extranjero privado	%

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 7	2 0 0 9 0 6 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica


93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO



INFORME FINAL

CONTRATO DE OBRA No. 002 DE 2023

JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO

"CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL"

PERIODO:

16 DE MAYO DE 2023 AL 29 DE JULIO DE 2023





TABLA DE CONTENIDO


1. INTRODUCCION 3
2. INFORMACION DEL CONTRATO 4
3. LOCALIZACION GENERAL DEL PROYECTO 5
   3.1 RESUMEN OBRAS EJECUTADAS 6
4. INFORME TÉCNICO 9
   4.1 GESTIONES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 9
   4.2 REGISTRO FOTOGRAFICO 9
5. INFORME FINANCIERO 23
   5.1 DETALLE POR CAPITULOS DE LOS COSTOS DEL CONTRATO DE OBRA 23
   5.2 RESUMEN DE PAGOS AL CONTRATISTA 24
   5.3 SEGUIMIENTO Y CONTROL CUMPLIMIENTO Y SANCIONES 24
6. INFORME ADMINISTRATIVO 25
   6.1 CONTROL PERSONAL DE OBRA 25
   6.2 CONTROL PAGO DE APORTES PARAFISCALES 25
   6.3 CONTROL EQUIPO DE OBRA 25
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 26



1. INTRODUCCION


La Alcaldía Municipal de Armenia es la encargada de garantizar el bien común del municipio, dentro de las cuales se destacan, el mantenimiento de las edificaciones propiedad del ente municipal donde uno de estos es el Centro Administrativo Municipal (CAM), donde se desarrollan todas las actividades administrativas de atención al público y toma de decisiones para desarrollo social y económico.

El ingeniero **JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO**, llevo a cabo el contrato de obra pública 002 de 2023, cuyo objeto es **"CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL"** y debido a este se estructura el presente informe denominado **INFORME FINAL,** que corresponde al resultado físico y financiero de ejecución de obra comprendido en el periodo entre el 16 de mayo de 2023 al 29 de julio de 2023.




2. INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.	002 de 2023
OBJETO	""CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL""
CONTRATISTA	JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO
VALOR CONTRATO	$ 42.851.336,20
PLAZO DE EJECUCIÓN	45 Días
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	10 de Abril de 2023
FECHA DE LEGALIZACIÓN	11 de Abril de 2023
FECHA DE INICIACIÓN	16 de Mayo de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	29 de Junio de 2023
PRORROGA	20 Días
FECHA DE SUSPENSIÓN 1	17 de Julio de 2023
FECHA DE REINICIO 1	27 de Julio de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	29 de Julio de 2023




3. LOCALIZACION GENERAL DEL PROYECTO

La ejecución del contrato de obra pública se lleva a cabo en las instalaciones del Concejo Municipal y en el Costado Nor- Occidental Centro Administrativo Municipal-CAM

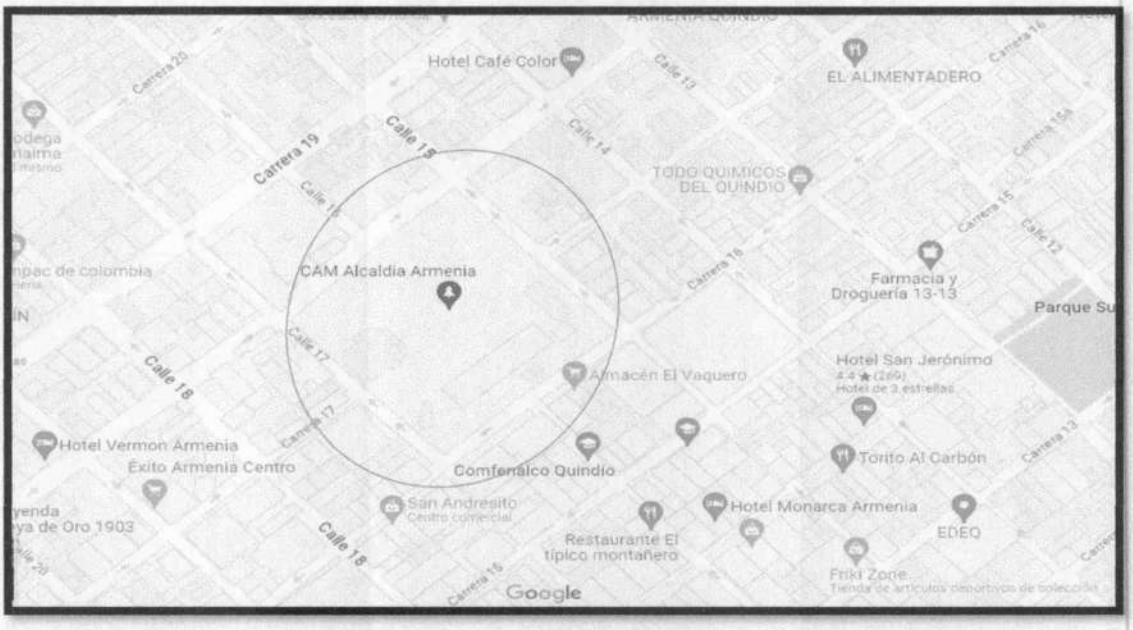







3.1 RESUMEN OBRAS EJECUTADAS

Las obras ejecutadas hasta el momento se describen en el cuadro presentado a continuación, el cual fue obtenido de las cantidades ejecutadas y los valores contratados:

ITEM	Actividad	Un	CANT	Valor Unitario	Valor Total
	OBRA CONTRATADA EJECUTADA				
	SECTOR CONCEJO MUNICIPAL				
1	**CUBIERTA**				
1,1	DESMONTE DE CUBIERTA EN VIDRIO	M2	54,63	$ 13.538,46	$ 739.590,37
1,2	CUBIERTA EN TEJA POLICARBONATO INC. Tornillos de fijación y accesorios	M2	54,63	$ 93.615,38	$ 5.114.099,66
1,3	IMPERMEABILIZACION CULATA CON REFUERZO EN TELA DE POLIESTER NO TEJIDO	M2	122,58	$ 29.461,54	$ 3.611.248,27
2	**HIDROSANITARIOS**				
2,1	PUNTO DESAGUE PVC SANITARIO 4" INC. ACCESORIOS Y TRAMO DE TUBERIA	UND	8,00	$ 129.692,31	$ 1.037.538,48
2,2	REJILLA - SIFON DE PISO 3"	UND	0,00	$ 41.461,54	$ 0,00
2	**INSTALACIÓN VENTANAS**				
2,1	CORTE DE MUROS CON DISCO	ML	46,06	$ 7.923,08	$ 364.937,06
2,2	DEMOLICION MUROS ,15 SIN RETIRO	M2	8,02	$ 6.538,46	$ 52.422,76
2,3	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN ALUMINIIO SECC. 1,5*1,5 Inc. Perfiles y herrajes necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	UND	0,00	$ 314.230,77	$ 0,00
3	**MANTENIMIENTO PUERTAS**				
3,1	REPARACION Y REINSTALACION DE PUERTA	UND	0,00	$ 67.307,69	$ 0,00
4	**CIELO RASO**				
4,1	CIELO RASO EN DRYWALL PANEL YESO (Inc. Encintada, resane, listo para pintura)	M2	19,92	$ 45.615,39	$ 908.658,57
4,2	PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS INC. RESANES, FILOS Y DILATACIONES	M2	226,60	$ 16.307,69	$ 3.695.266,71
	PUENTE CONCEJO				
1	**CUBIERTA**				
1,2	CUBIERTA EN TEJA POLICARBONATO INC. Tornillos de fijación y accesorios	M2	0,00	$ 93.615,38	$ 0,00
1,4	ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	M2	0,00	$ 38.307,69	$ 0,00
2	**HIDROSANITARIOS**				



2,3	REJILLA CARCAMO PEATONAL DESAGUE LINEAL	ML	1,73	$ 294.307,70	$ 509.152,32
5	**DEMOLICIONES**				
5,1	DEMOLICION ACABADO DE PISO INC. DEMOL DE ALISTADO DE PISO ESPESOR HASTA 4 CM, ACARREO HORIZONTAL HASTA 100 m, no inc retiro de obra	M2	0,00	$ 12.769,24	$ 0,00
6	**INSTALACIÓN LETRAS**				
6,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRAS FLOTANTES PARA FACHADA EN ACEROINOXIDABLE	UND	0,00	$ 146.076,92	$ 0,00
7	**RETIRO DE SOBRANTES**				
7,1	RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES DISTANCIA HASTA DE 40 KM	M3	2,31	$ 64.769,23	$ 149.829,94
	SECTOR NOR - OCCIDENTAL CAM				
1	**CUBIERTA**				
1,2	CUBIERTA EN TEJA POLICARBONATO INC. Tornillos de fijación y accesorios	M2	39,20	$ 93.615,38	$ 3.669.722,90
1,4	ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	M2	39,20	$ 38.307,69	$ 1.501.661,45
2	**HIDROSANITARIOS**				
2,1	PUNTO DESAGUE PVC SANITARIO 4" INC. ACCESORIOS Y TRAMO DE TUBERIA	UND	0,00	$ 129.692,31	$ 0,00
2,2	REJILLA - SIFON DE PISO 3"	UND	0,00	$ 41.461,54	$ 0,00
	AMPLIACIÓN ZONA ESPEJO DE AGUA				
5	**DEMOLICIONES**				
5,1	DEMOLICION ACABADO DE PISO INC. DEMOL DE ALISTADO DE PISO ESPESOR HASTA 4 CM, ACARREO HORIZONTAL HASTA 100 m, no inc retiro de obra	M2	7,00	$ 12.769,24	$ 89.410,22
8	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				
8,1	EXCAVACION A MANO MATERIAL COMUN 0-2 MTS, SIN RETIRO	M3	0,00	$ 13.153,84	$ 0,00
2	**HIDROSANITARIOS**				
2,3	REJILLA CARCAMO PEATONAL DESAGUE LINEAL	ML	28,28	$ 294.307,70	$ 8.323.021,76
9	**ESTRUCTURALES**				
9,1	RAMPA EN CONCRETO 21 Mpa. A=0.90 M DN=0.20M	ML	7,00	$ 185.153,85	$ 1.296.076,95
9,2	ESCALERAS S/HIERRO	M3	0,58	$ 1.418.230,77	$ 826.119,42
9,3	ACERO DE REFUERZO Inc. Alambre de amarra y figurado	KG	90,71	$ 8.923,08	$ 809.412,59
9,4	VIGA CIMENTACION 20*20 EN CONCRETO DE 21 MPa S/H (con formaleta)	ML	0,00	$ 83.307,69	$ 0,00
10	**CARPINTERIA METALICA**				
10,1	REJA CERRAMIENTO TUBO RECTANGULAR/ANTI-PINTADA	ML	35,92	$ 246.615,39	$ 8.858.424,81



ESPACIOS PARA TODOS
Alcaldía de Armenia

6	**INSTALACION LETRAS**				
6,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRAS FLOTANTES PARA FACHADA EN ACEROINOXIDABLE	UND	0,00	$ 146.076,92	$ 0,00
7	**RETIRO DE SOBRANTES**				
7,1	RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES DISTANCIA HASTA DE 40 KM	M3	0,91	$ 64.769,23	$ 58.956,84
	OBRA NO CONTRATADA Y EJECUTADA		0,00		
NP1	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE CANAL EN PVC DE 3"	ML	4,90	$ 72.920,00	$ 357.308,00
NP2	BAJANTE A. LLUVIAS 3" PVC	ML	8,50	$ 35.950,00	$ 305.575,00
NP3	MURO EN CONCRETO E=.10 HASTA H=1.00 M S/H	M3	0,23	$ 1.083.708,45	$ 251.420,36
NP4	BARANDA 1 1/2" TRES TUBOS HORIZ INC. INST	ML	8,00	$ 204.643,20	$ 1.637.145,60
NP5	ANCLAJES DE 1/2"	UND	95,00	$ 16.338,00	$ 1.552.110,00
	CORTE CON DISCO	ML	68,96	$ 7.923,08	$ 546.375,60
NP6	DESMONTE CIELO RASO Inc. Desmonte de la estructura del cielo raso y el acarreo horizontal	M2	19,92	$ 4.379,00	$ 87.229,68
NP7	FLANCHE EN LAMINA DE ZINC C.16	ML	0,00	$ 17.112,00	$ 0,00
NP8	IMPERMEABILIZACION COLECTOR DE AGUAS	ML	30,01	$ 35.025,00	$ 1.051.100,25
NP9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LETRAS ALUMINIO CON CALIBRE 6MM	UND	6,00	$ 409.960,00	$ 2.459.760,96
NP10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4MM INC. SELLANTE EN POLIURETANO	M2	2,76	$ 54.135,00	$ 149.412,60
NP11	MARCO EN MADERA VENTANA	ML	9,40	$ 56.145,00	$ 527.763,00
NP12	FILOS Y DILATACIONES	ML	12,80	$ 11.114,00	$ 142.259,20
NP13	DEMOLICION ENCHAPE PARED INC. ACARREO HORIZONTAL HASTA 100 M.	M2	2,76	$ 14.489,00	$ 39.989,64
	COSTO DIRECTO				$ 50.723.000,00
	A.I.U				$ 15.216.900,00
	VALOR TOTAL				$ 65.939.900,00


4. INFORME TÉCNICO

4.1 GESTIONES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El contratista conto con el equipo y el recurso humano necesario para desarrollar el objeto del contrato, de acuerdo con la programación y especificaciones técnicas exigidas; trabajando de la mano con la Secretaria de Infraestructura de la Alcaldía de Armenia para gestionar la parte técnica del proyecto y llevar a cabo la obra de la mejor manera.


4.2 REGISTRO FOTOGRAFICO


A continuación, se anexa el registro fotográfico de las actividades ejecutadas hasta el momento en el desarrollo de la obra.

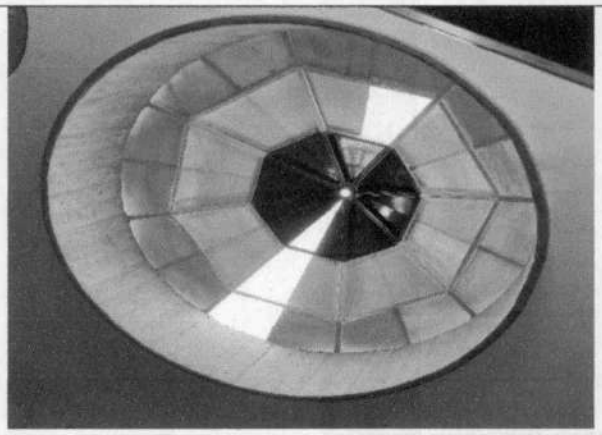




DESMONTE DE CUBIERTA EN VIDRIO

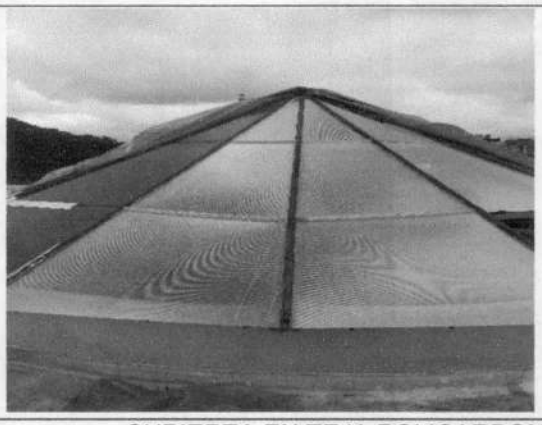

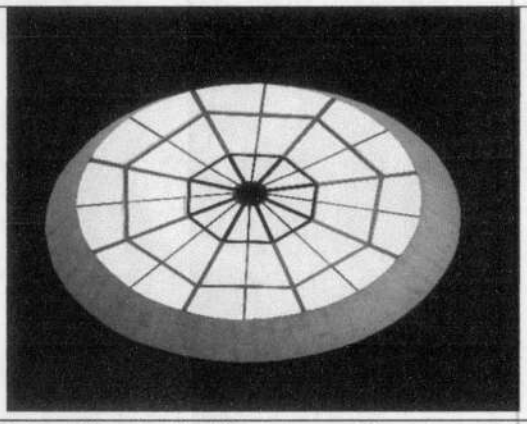

CUBIERTA EN TEJA POLICARBONATO INC. Tornillos de fijación y accesorios






IMPERMEABILIZACION CULATA CON REFUERZO EN TELA DE POLIESTER NO TEJIDO






PUNTO DESAGUE PVC SANITARIO 4" INC. ACCESORIOS Y TRAMO DE TUBERIA







CORTE DE MUROS CON DISCO

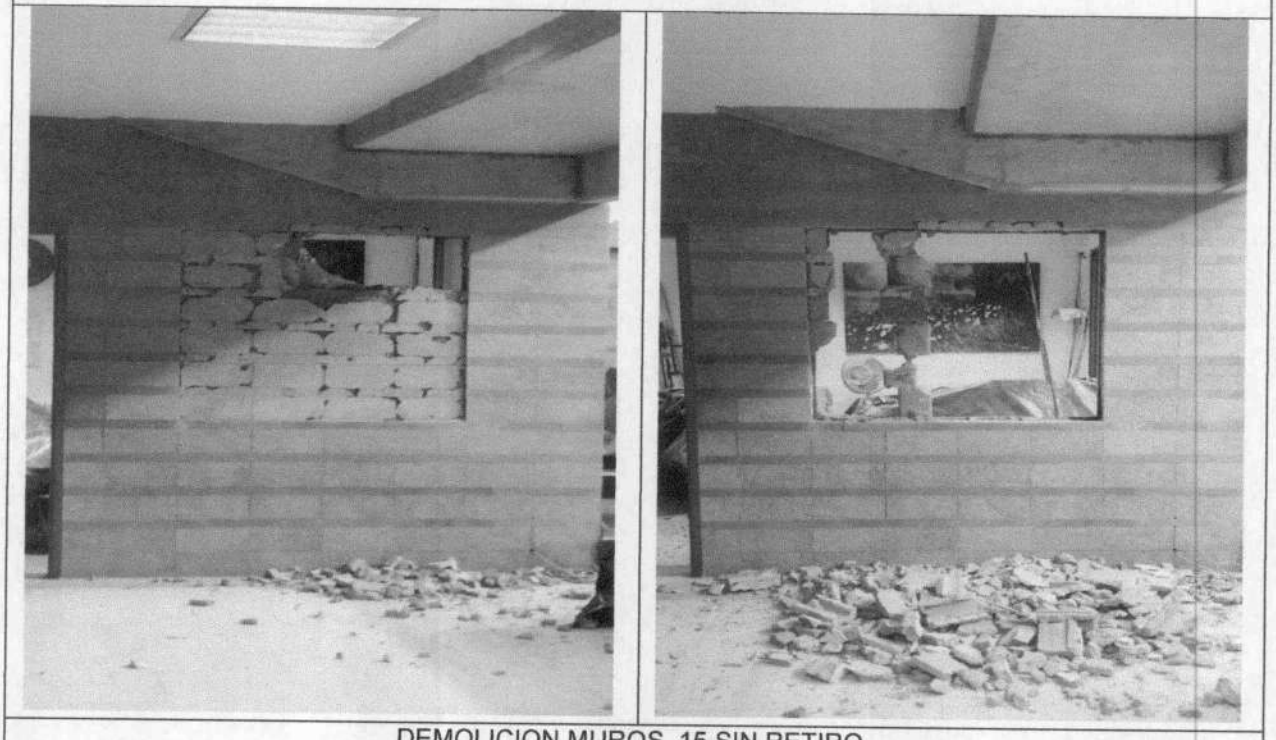


DEMOLICION MUROS ,15 SIN RETIRO




ESPA TODOS
Alcaldía de Armenia

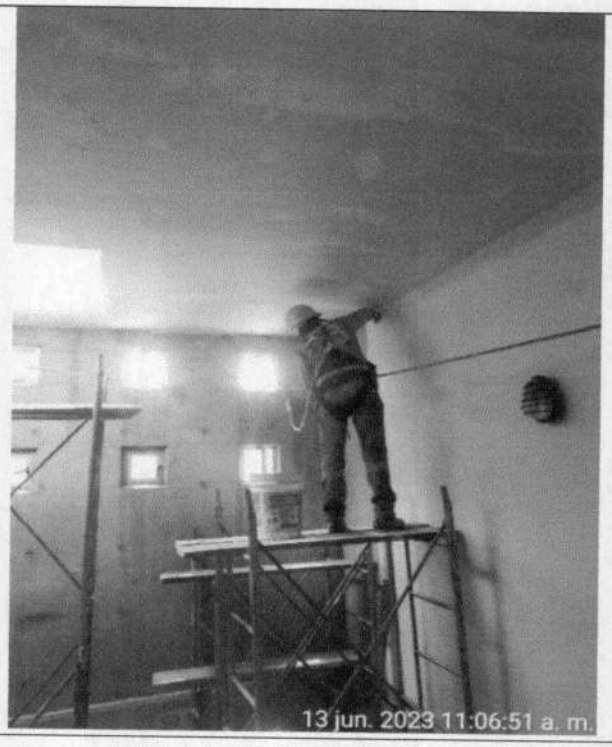

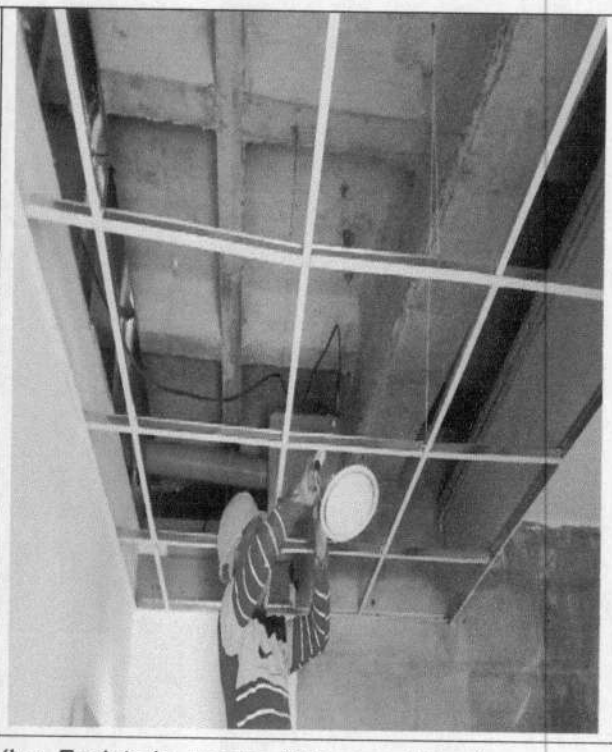


CIELO RASO EN DRYWALL PANEL YESO (Inc. Encintada, resane, listo para pintura)

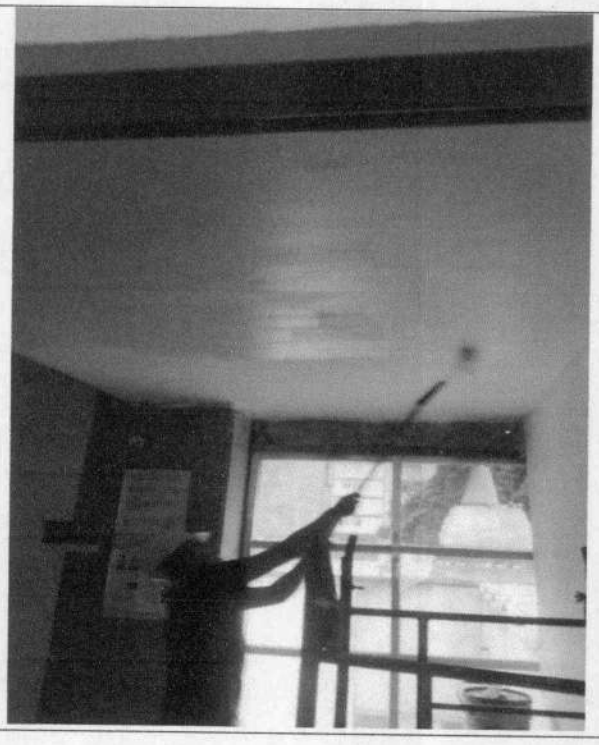




PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS INC. RESANES, FILOS Y DILATACIONES







REJILLA CARCAMO PEATONAL DESAGUE LINEAL

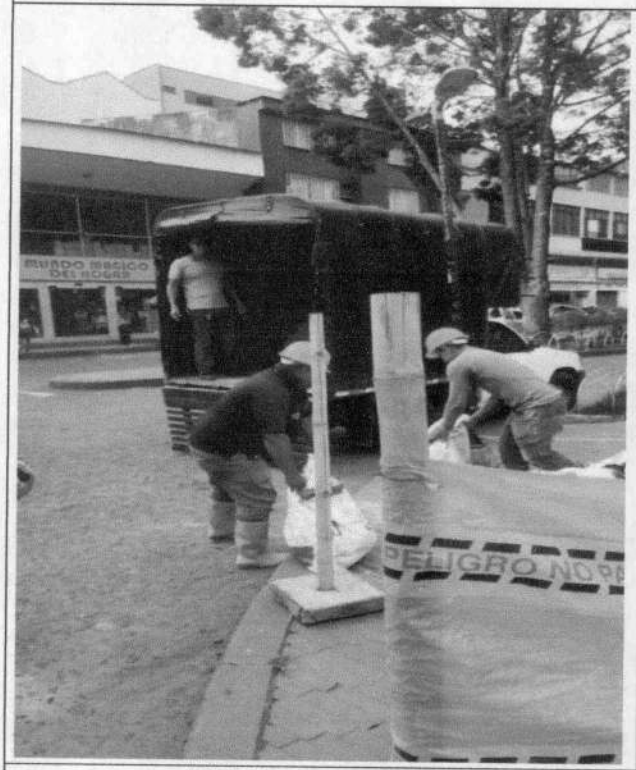




RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES DISTANCIA HASTA DE 40 KM




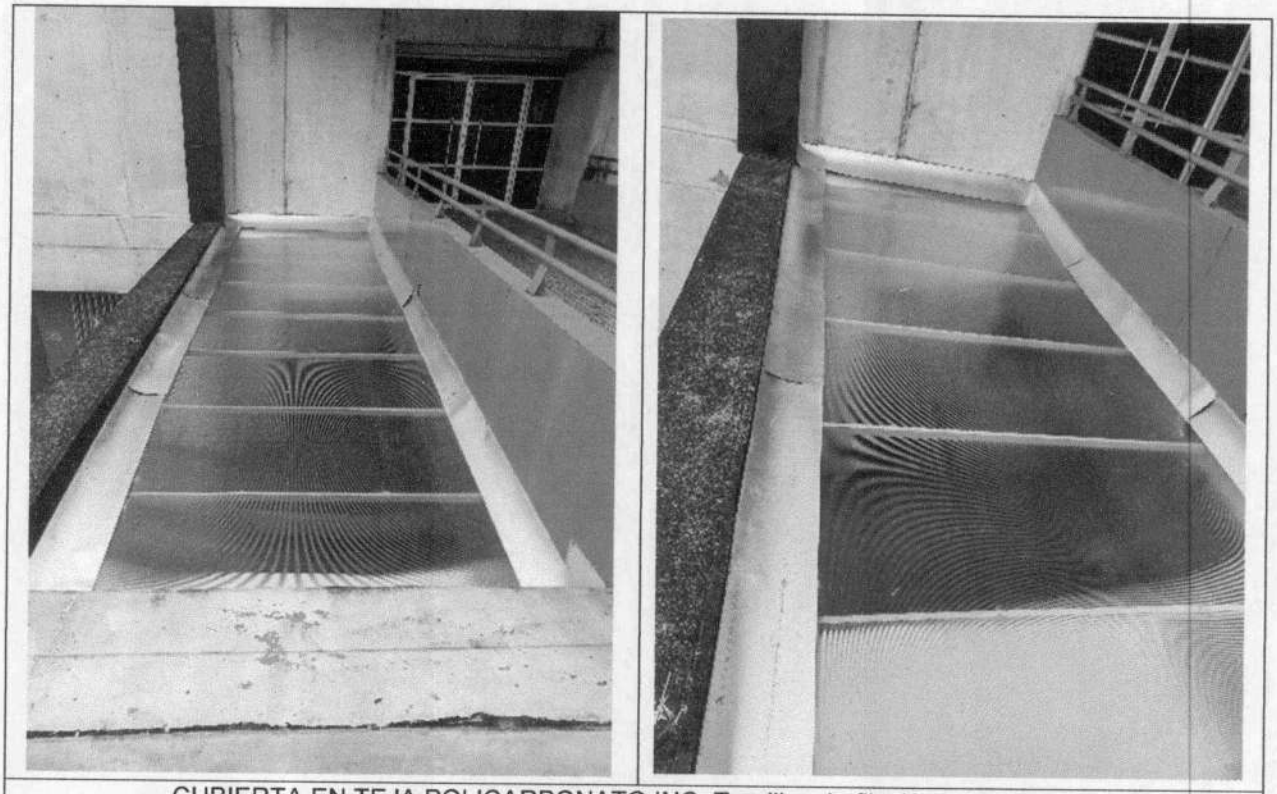

CUBIERTA EN TEJA POLICARBONATO INC. Tornillos de fijación y accesorios

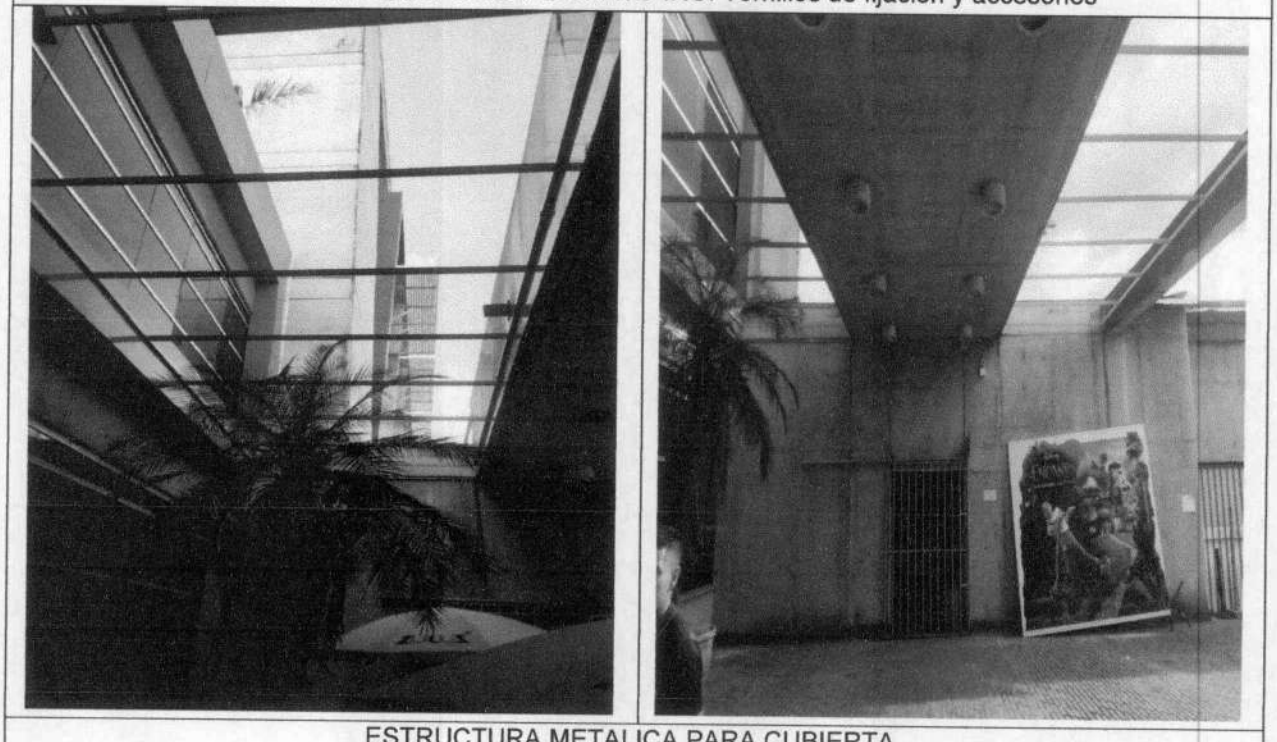

ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA









DEMOLICION ACABADO DE PISO INC. DEMOL DE ALISTADO DE PISO ESPESOR HASTA 4 CM, ACARREO HORIZONTAL HASTA 100 m, no inc retiro de obra




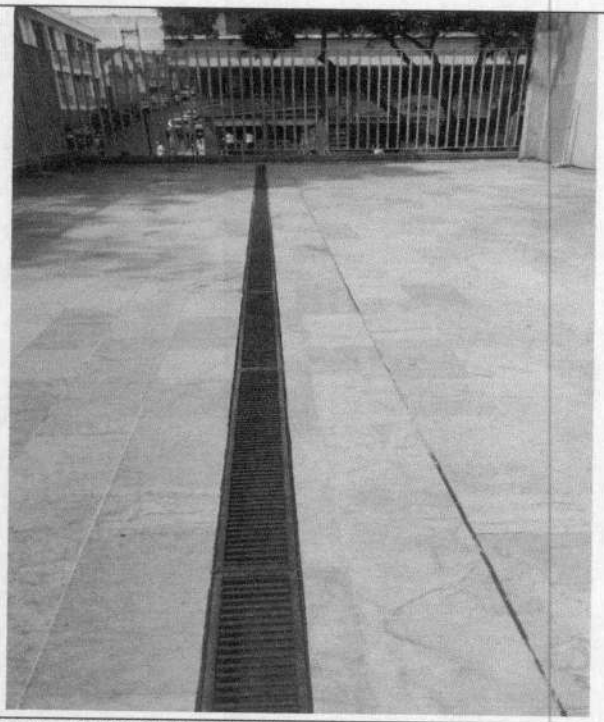

REJILLA CARCAMO PEATONAL DESAGUE LINEAL




ESPA TODOS
Alcaldía de Armenia

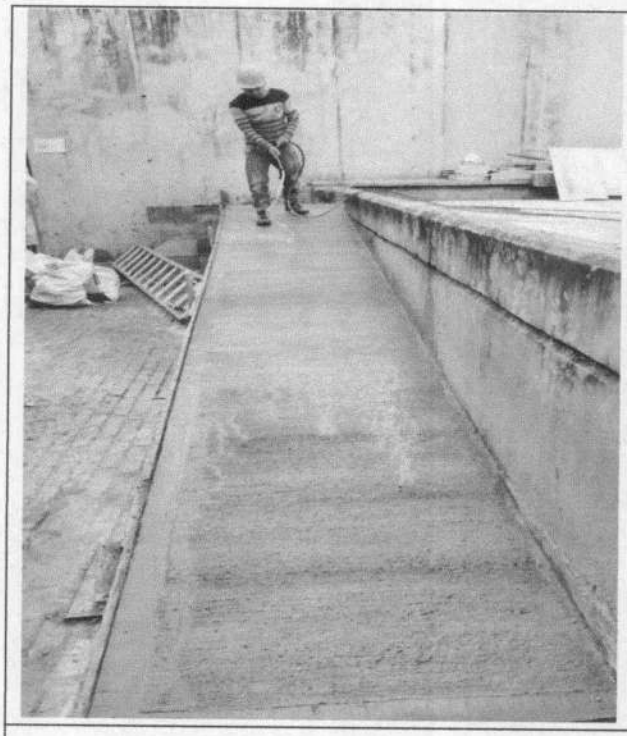


RAMPA EN CONCRETO 21 Mpa. A=0.90 M
DN=0.20M




ESCALERAS S/HIERRO

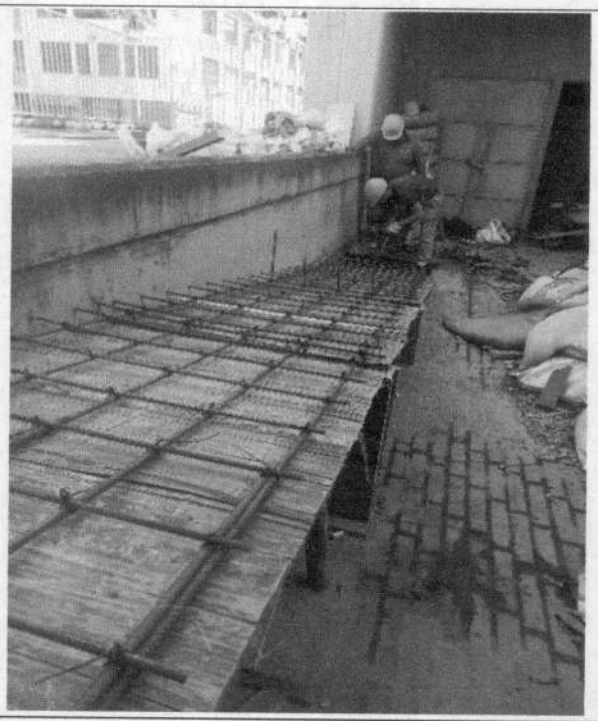

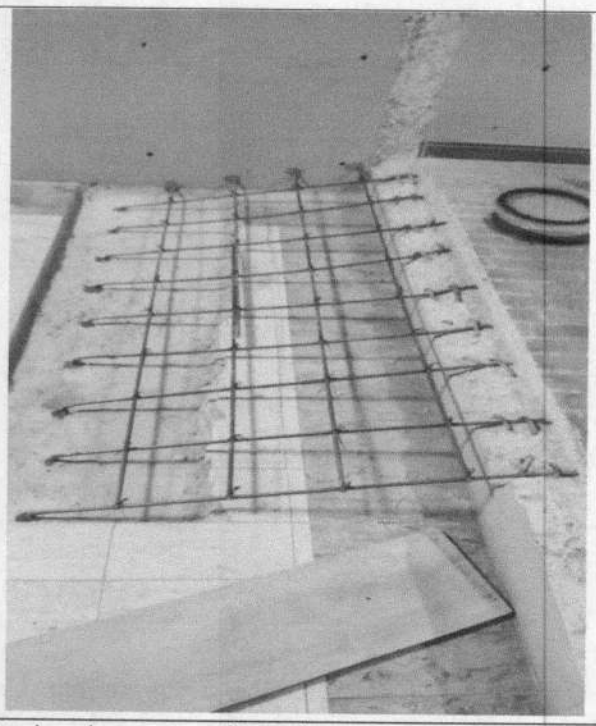

ACERO DE REFUERZO Inc. Alambre de amarra y figurado



ESPA TODOS
Alcaldía de Armenia






REJA CERRAMIENTO TUBO RECTANGULAR/ANTI-PINTADA







MURO EN CONCRETO E=.10 HASTA H=1.00 M S/H





ESPACIOS PARA TODOS
Alcaldía de Armenia

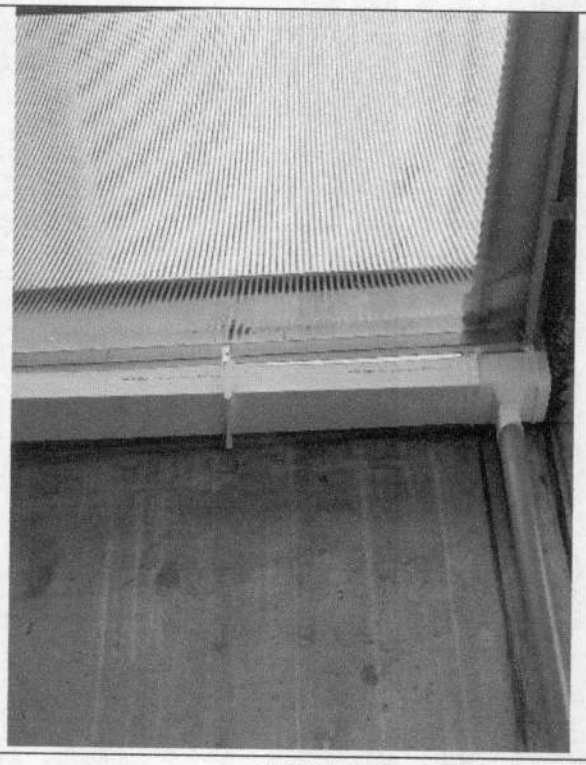

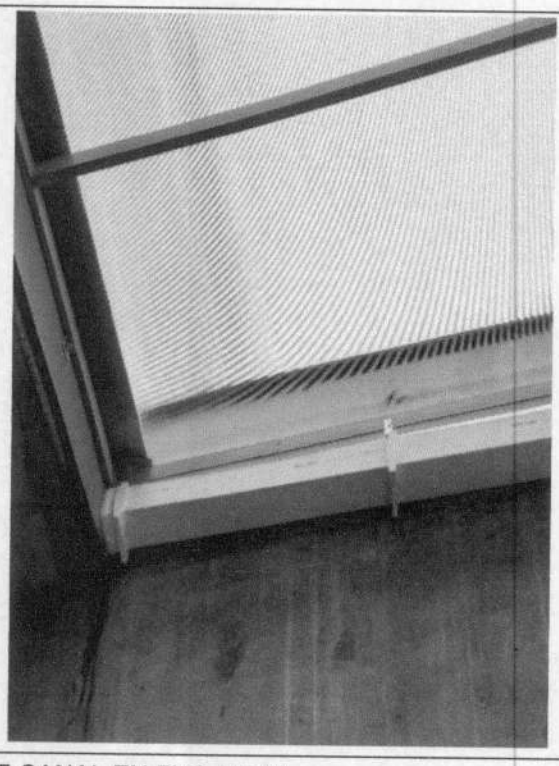


SUMINISTRO E INTALACIÓN DE CANAL EN PVC DE 3"

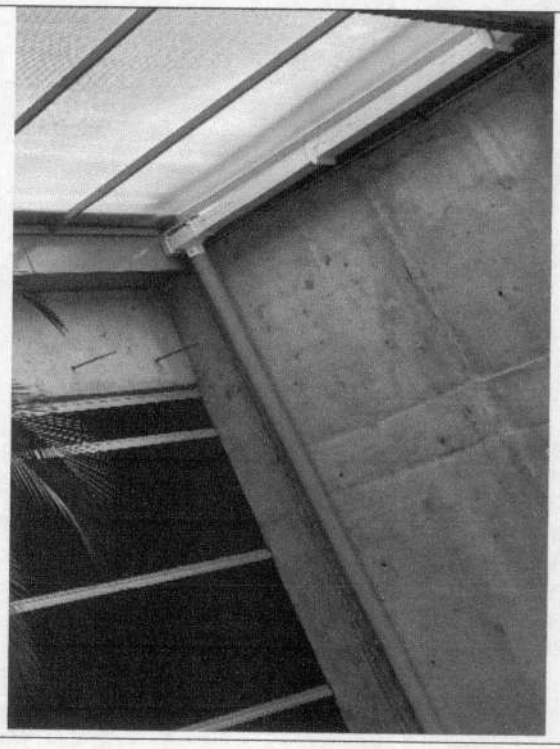

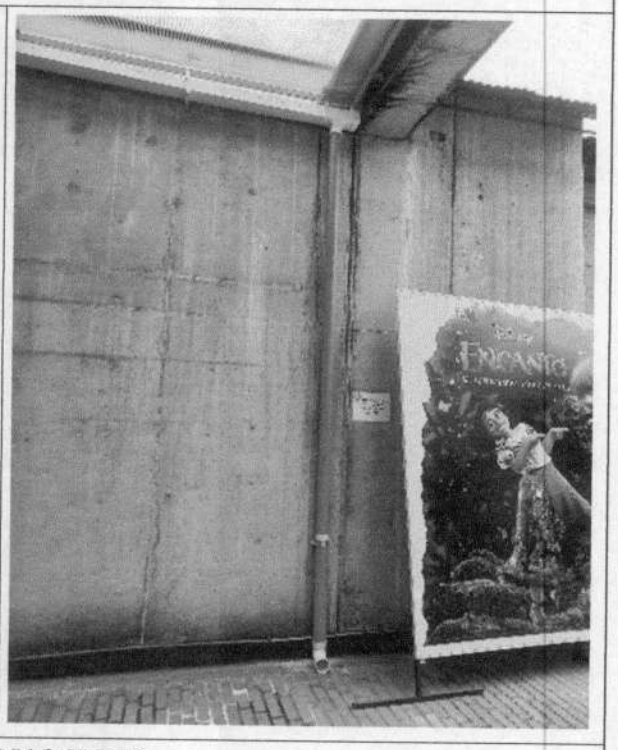


BAJANTE A. LLUVIAS 3" PVC






BARANDA 1 1/2" TRES TUBOS HORIZ INC. INST



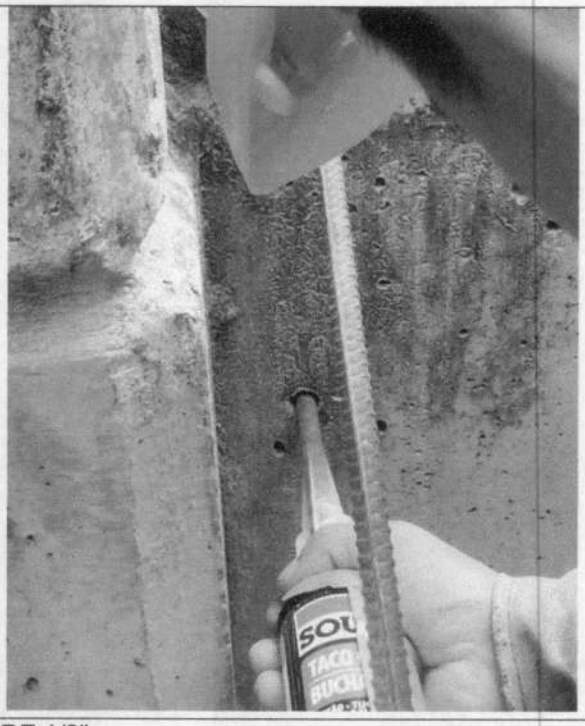

ANCLAJES DE 1/2"



ESPACIOS PARA TODOS
Alcaldía de Armenia



DESMONTE CIELO RASO Inc. Desmonte de la estructura del cielo raso y el acarreo horizontal





IMPERMEABILIZACION COLECTOR DE AGUAS







FLANCHE EN LAMINA DE ZINC C.16



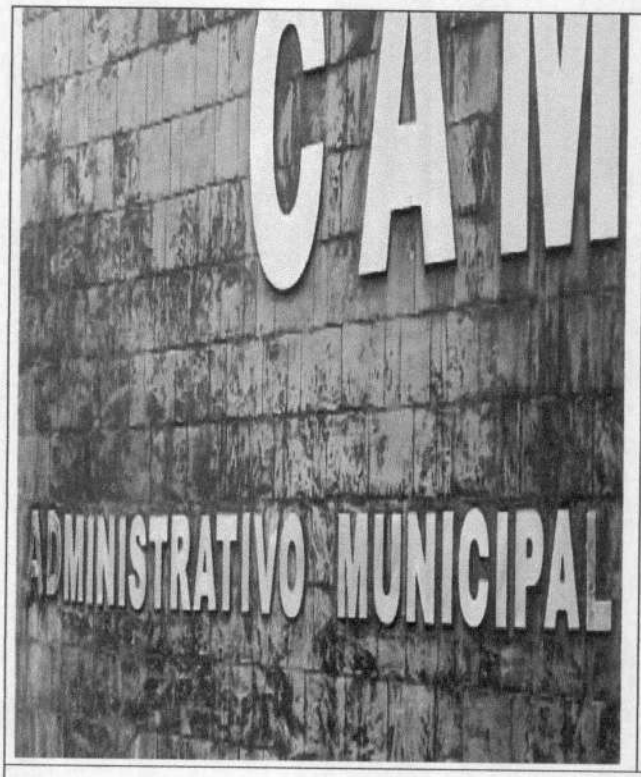


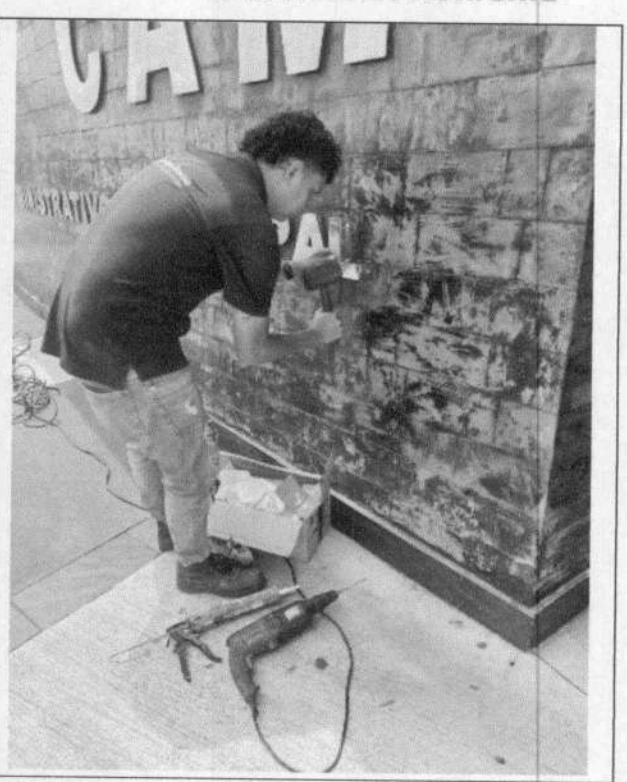


SUMINISTRO E INSTALACIÓN LETRAS ALUMINIO CON CALIBRE 6MM


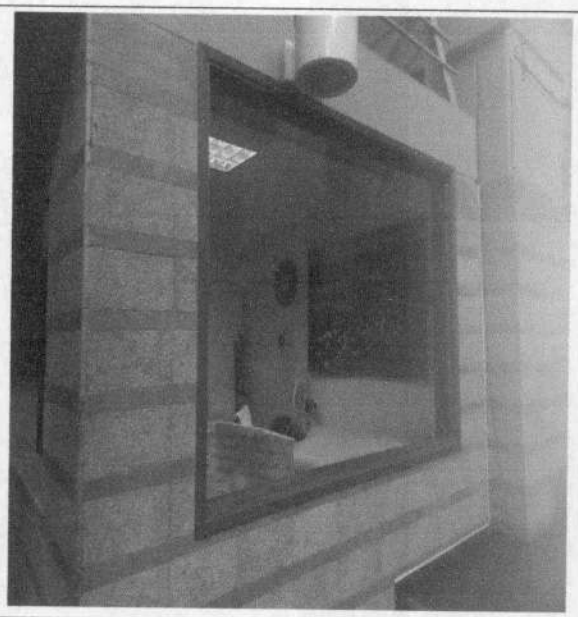



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4MM INC. SELLANTE EN POLIURETANO

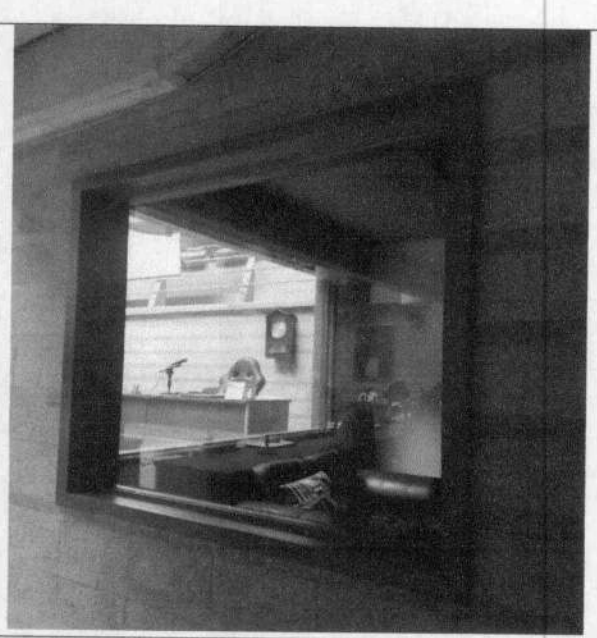

MARCO EN MADERA VENTANA



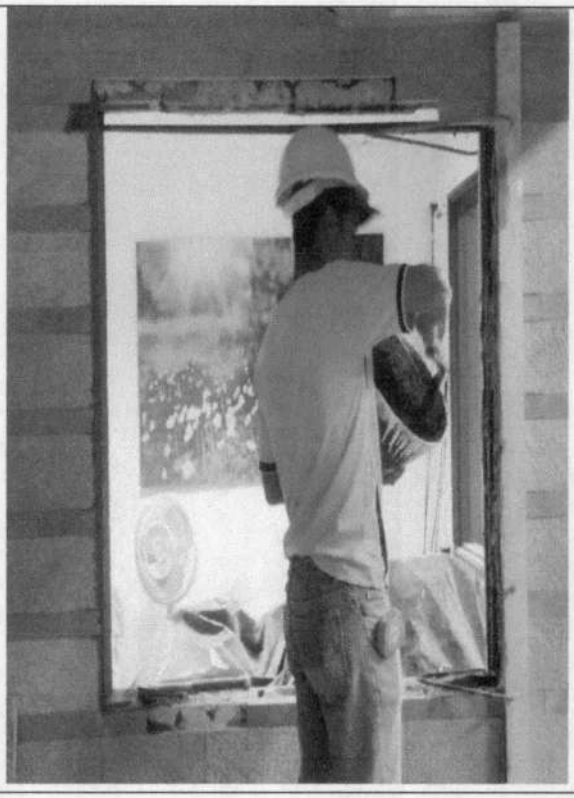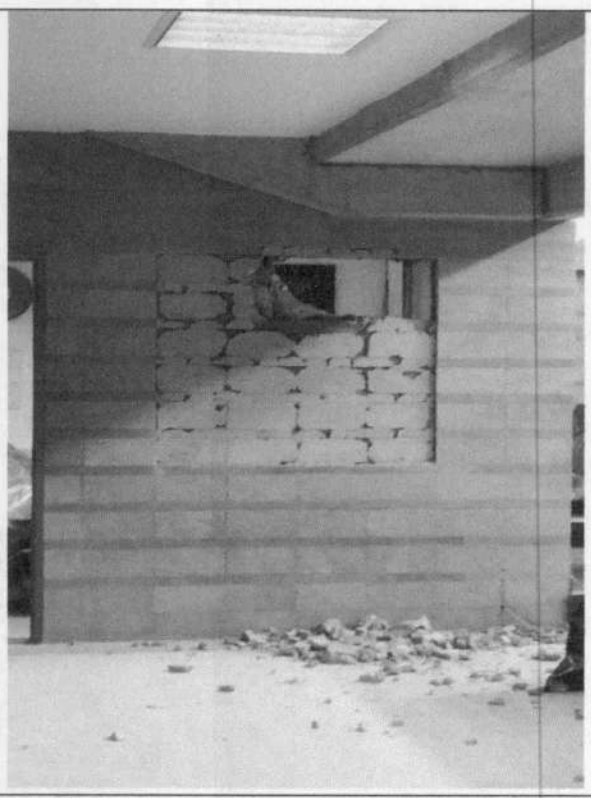	
FILOS Y DILATACIONES	DEMOLICION ENCHAPE PARED INC. ACARREO HORIZONTAL HASTA 100 M.




5. INFORME FINANCIERO

5.1 DETALLE POR CAPITULOS DE LOS COSTOS DEL CONTRATO DE OBRA

En la siguiente tabla se presentan los costos por capítulos contractuales, comparados con los valores ejecutados hasta el momento.

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO
	SECTOR CONCEJO MUNICIPAL		
1	CUBIERTA	$ 8.329.999,80	$ 9.464.938,30
2	HIDROSANITARIOS	$ 1.198.076,95	$ 1.037.538,48
2	INSTALACIÓN VENTANAS	$ 2.819.692,40	$ 417.359,82
3	MANTENIMIENTO PUERTAS	$ 471.153,83	$ 0,00
4	CIELO RASO	$ 1.694.615,50	$ 4.603.925,28
	PUENTE CONCEJO		
1	CUBIERTA	$ 2.446.922,95	$ 0,00
2	HIDROSANITARIOS	$ 1.471.538,50	$ 509.152,32
5	DEMOLICIONES	$ 25.538,48	$ 0,00
6	INSTALACIÓN LETRAS	$ 730.384,60	$ 0,00
7	RETIRO DE SOBRANTES	$ 971.538,45	$ 149.829,94
	SECTOR NOR - OCCIDENTAL CAM		
1	CUBIERTA	$ 5.276.922,80	$ 5.171.384,34
2	HIDROSANITARIOS	$ 684.615,40	$ 0,00
	AMPLIACIÓN ZONA ESPEJO DE AGUA		
5	DEMOLICIONES	$ 51.076,96	$ 89.410,22
8	MOVIMIENTO DE TIERRAS	$ 26.307,68	$ 0,00
2	HIDROSANITARIOS	$ 5.886.154,00	$ 8.323.021,76
9	ESTRUCTURALES	$ 8.437.230,78	$ 2.931.608,96
10	CARPINTERIA METALICA	$ 8.384.923,26	$ 8.858.424,81
6	INSTALACION LETRAS	$ 1.168.615,36	$ 0,00
7	RETIRO DE SOBRANTES	$ 647.692,30	$ 58.956,84
NP	OBRA NO CONTRATADA Y EJECUTADA	$ 0,00	$ 9.107.448,93
COSTO DIRECTO		$ 50.723.000,00	$ 50.723.000,00
A.I.U		$ 15.216.900,00	$ 15.216.900,00
VALOR TOTAL		$ 65.939.900,00	$ 65.939.900,00




5.2 RESUMEN DE PAGOS AL CONTRATISTA

Debido al método de pago establecido en el contrato y a que este no cuenta con pago de anticipo, a continuación, se presenta resumen de la Información financiera del Contrato de Obra y se detallan los pagos realizados hasta el momento, incluyendo la presente acta.

VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 65.939.900,00
ANTICIPO	N/A
ACTA DE OBRA N°1	$ 42.851.336,20
ACTA DE OBRA N°2	$ 23.088.563,80
VALOR ACUMULADO	$ 65.939.900,00
SALDO A FAVOR	$ 0,00

5.3 SEGUIMIENTO Y CONTROL CUMPLIMIENTO Y SANCIONES

Durante la ejecución de las obras, no se presentaron llamados de atención por parte de la entidad contratante, entidad alguna o comunidad en general.



6. INFORME ADMINISTRATIVO

6.1 CONTROL PERSONAL DE OBRA

A continuación, se presenta el personal administrativo empleado en el contrato de obra N°002 de 2023:

NOMBRE	CARGO
DIEGO FERNANDO BOTERO QUICENO	RESIDENTE DE OBRA
MARIA DEL PILAR GONZALEZ HERNANDEZ	PROFESIONAL EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO


6.2 CONTROL PAGO DE APORTES PARAFISCALES

El contratista de conformidad con las disposiciones del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, presentan certificado de cumplimiento con las obligaciones frente al pago de los aportes al sistema de seguridad social integral.

6.3 CONTROL EQUIPO DE OBRA

El equipo utilizado durante la ejecución de la obra fue el siguiente:

DESCRIPCION
CORTADORA
ANDAMIOS
DEMOLEDOR
MEZCLADORA
VIBRADOR DE CONCRETO
VOLQUETA
HERRAMIENTA MENOR



7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se cumplió a cabalidad con las obligaciones contractuales, tanto por parte del contratista como del contratante.

- Las obras se entregan en perfecto estado y son recibidas a satisfacción por parte de la entidad contratante y de la comunidad en general.


- Los lugares afectados por el desarrollo de la obra han sido entregados en igual o mejor condición de lo que se encontraba previo a las intervenciones.

JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO
CONTRATISTA DE OBRA

	MEMORIAS DE CALCULOS Secretaria de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura	Código: R-SI-POI-047 Fecha: 18/02/2015 Versión: 001 Página 1 de 1

Contrato No.	002	Año	2023	Objeto	CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Ítem:	DESMONTE DE CUBIERTA EN VIDRIO	Cantidad Total:	54,63

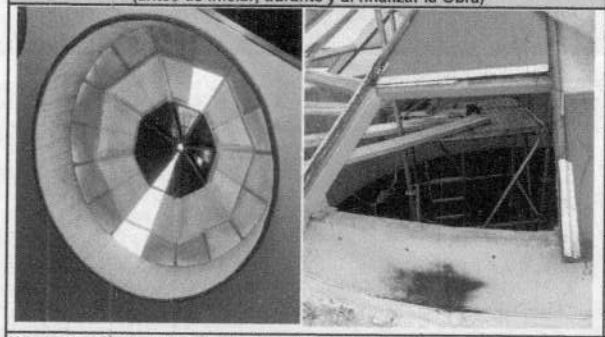Croquis y Record Fotográfico	Descripción	Unidad			Dimensiones			Valor Total (Cantidad Área Volumen)	Valor acumulada
		Cantidad	Área	Volumen	Largo	Ancho	Alto		
Récor Fotográfico de la Obra (antes de iniciar, durante y al finalizar la Obra)									
	DOMO CONCEJO				4,17	4,17	π	54,63	54,63

Nota: en la casilla de Unidad; Cantidad ejemplo si cantidad de tapas (und) o mi de tubería etc. Area: Ejemplo cuando son metros cuadrados de pavimento (m^2). Volumen: Ejemplo cuando son metros Cubicos (m^3)

Observaciones:													
	Firma												
	Nombre												
	Fecha	AA	2023	MM	8	DD	22	AA	2023	MM	8	DD	22
	Cargo	Contratista						Interventor					


MEMORIAS DE CALCULOS

Secretaria de Infraestructura
Proceso Obras Públicas e Infraestructura

Código:	R-SI-POI-047
Fecha:	18/02/2015
Versión:	001
Página	1 de 1

Contrato No.	002	Año	2023	Objeto	CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Item:	CUBIERTA EN TEJA POLICARBONATO INC. Tornillos de fijación y accesorios	Cantidad Total:	54,63

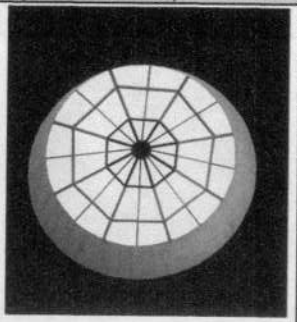Croquis y Record Fotográfico	Descripción	Unidad			Dimensiones			Valor Total (Cantidad Área Volumen)	Valor acumulada
		Cantidad	Área	Volumen	Largo	Ancho	Alto		
Récor Fotográfico de la Obra (antes de iniciar, durante y al finalizar la Obra)									
 	DOMO CONCEJO				4,17	4,17	π	54,63	54,63

Nota: en la casilla de Unidad: Cantidad ejemplo si cantidad de tapas (und) o ml de tubería etc. Area: Ejemplo cuando son metros cuadrados de pavimento (m^2), Volumen: Ejemplo cuando son metros Cubicos (m^3)

Observaciones:													
	Firma												
	Nombre												
	Fecha	AA	2023	MM	5	DD	22	AA	2023	MM	8	DD	22
	Cargo	Contratista						Interventor					

MEMORIAS DE CALCULOS

Secretaria de Infraestructura
Proceso Obras Públicas e Infraestructura

Código: R-SI-POI-047
Fecha: 18/02/2015
Versión: 001
Página 1 de 1

Contrato No.	002	Año	2023	Objeto	CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Ítem:	REJILLA CARCAMO PEATONAL DESAGUE LINEAL	Cantidad Total:	1,73

Croquis y Record Fotográfico	Descripción	Unidad			Dimensiones			Valor Total (Cantidad Área Volumen)	Valor acumulada
		Cantidad	Área	Volumen	Largo	Ancho	Alto		
Récor Fotográfico de la Obra (antes de iniciar, durante y al finalizar la Obra)	PUENTE CONCEJO				1,73			1,73	1,73



Nota: en la casilla de Unidad; Cantidad ejemplo si cantidad de tapas (und) o ml de tubería etc, Area: Ejemplo cuando son metros cuadrados de pavimento (m^2) Volumen: Ejemplo cuando son metros Cubicos (m^3)


Observaciones:

Firma															
Nombre															
Fecha	AA	2023	MM	8	DD	22		AA	2023	MM	8	DD	22		
Cargo	Contratista							Interventor							

	MEMORIAS DE CALCULOS Secretaria de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura	Código: R-SI-POI-047 Fecha: 18/02/2015 Versión: 001 Página 1 de 1

Contrato No.	002	Año	2023	Objeto	CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Item:	CUBIERTA EN TEJA POLICARBONATO INC. Tornillos de fijación y accesorios	Cantidad Total:	39,20

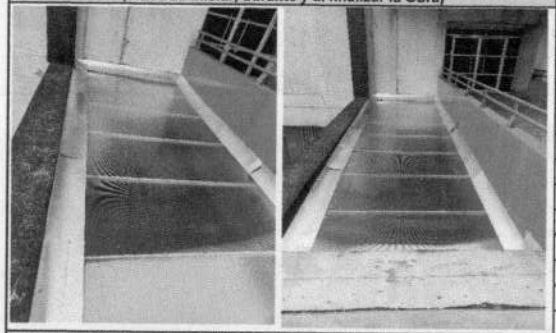Croquis y Record Fotográfico	Descripción	Unidad			Dimensiones			Valor Total (Cantidad Área Volumen)	Valor acumulada
		Cantidad	Área	Volumen	Largo	Ancho	Alto		
Récor Fotográfico de la Obra (antes de iniciar, durante y al finalizar la Obra)									
	CUBIERTA CAFETERIA				8,00	2,35		18,80	18,80
					8,00	2,55		20,40	39,20

Nota: en la casilla de Unidad; Cantidad ejemplo si cantidad de tapas (und) o ml de tuberia etc, Area: Ejemplo cuando son metros Cuadrados de pavimento (m^2), Volumen: Ejemplo cuando son metros Cubicos (m^3)

Observaciones:															
	Firma														
	Nombre														
	Fecha	AA	2023	MM	8	DD	22	AA	2023	MM	8	DD	22		
	Cargo	Contratista						Interventor							


MEMORIAS DE CALCULOS

Secretaria de Infraestructura
Proceso Obras Públicas e Infraestructura

Código: R-SI-POI-047
Fecha: 18/02/2015
Versión: 001
Página 1 de 1

Contrato No.	002	Año	2023	Objeto	CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Item:	RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES DISTANCIA HASTA DE 40 KM	Cantidad Total:	0,43

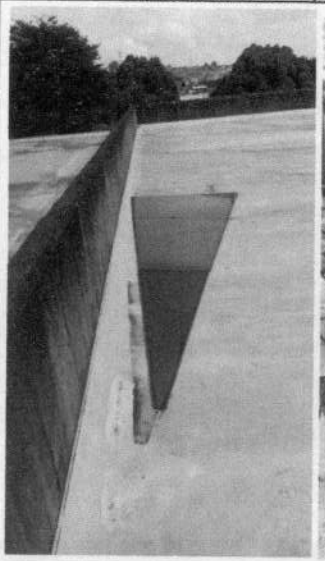Croquis y Record Fotográfico	Descripción	Unidad			Dimensiones			Valor Total (Cantidad Área Volumen)	Valor acumulada
		Cantidad	Área	Expasion	Largo	Ancho	Alto		
Récor Fotográfico de la Obra (antes de iniciar, durante y al finalizar la Obra)	CUBIERTA								
 	RETIRO CUBIERTA EN VIDRIO								
			54,63	1,3			0,01	0,43	0,43


Nota: en la casilla de Unidad; Cantidad ejemplo si cantidad de tapas (und) o ml de tuberia etc, Area: Ejemplo cuando son metros cuadrados de pavimento (m^2), Volumen: Ejemplo cuando son metros Cubicos (m^3)

Observaciones:													
	Firma												
	Nombre												
	Fecha	AA	2023	MM	8	DD	22	AA	2023	MM	8	DD	22
	Cargo	Contratista						Interventor					

	MEMORIAS DE CALCULOS Secretaria de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura	Código: R-SI-POI-047 Fecha: 18/02/2015 Versión: 001 Página 1 de 1

Contrato No.	002	Año	2023	Objeto	CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Item:	ESCALERAS S/HIERRO	Cantidad Total:	0,20

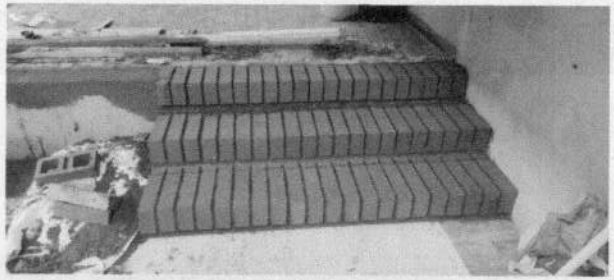Croquis y Record Fotográfico	Descripción	Unidad			Dimensiones			Valor Total (Cantidad Área Volumen)	Valor acumulada
		Cantidad	Área	Volumen	Largo	Ancho	Alto		
Récor Fotográfico de la Obra (antes de iniciar, durante y al finalizar la Obra)									
	ESCALERAS CONCEJO				1,50	0,30	0,15	0,07	0,07
					1,50	0,30	0,30	0,14	0,20


Nota: en la casilla de Unidad; Cantidad ejemplo si cantidad de tapas (und) o ml de tuberia etc, Area: Ejemplo cuando son metros cuadrados de pavimento (m²), Volumen: Ejemplo cuando son metros Cubicos (m³)

Observaciones:															
	Firma														
	Nombre														
	Fecha	AA	2023	MM	8	DD	22	AA	2023	MM	8	DD	22		
	Cargo	Contratista						Interventor							

	MEMORIAS DE CALCULOS Secretaria de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura	Código: R-SI-POI-047 Fecha: 18/02/2015 Versión: 001 Página 1 de 1

Contrato No.	002	Año	2023	Objeto	CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Ítem:	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE CANAL EN PVC DE 3"	Cantidad Total:	4,90

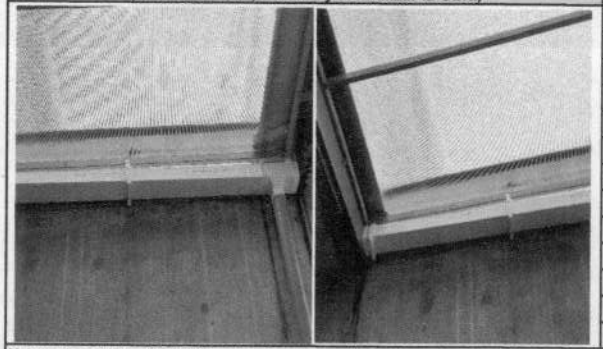Croquis y Record Fotográfico	Descripción	Unidad			Dimensiones			Valor Total (Cantidad Área Volumen)	Valor acumulada
		Cantidad	Área	Volumen	Largo	Ancho	Alto		
Récor Fotográfico de la Obra (antes de iniciar, durante y al finalizar la Obra)									
	CUBIERTA CAFETERIA ZONA 1				2,35			2,35	2,35
	CUBIERTA CAFETERIA ZONA 2				2,55			2,55	4,90

Nota: en la casilla de Unidad; Cantidad ejemplo si cantidad de tapas (und) o ml de tuberia etc, Area: Ejemplo cuando son metros cuadrados de pavimento (m^2), Volumen: Ejemplo cuando son metros Cubicos (m^3)

Observaciones:															
	Firma														
	Nombre														
	Fecha	AA	2023	MM	8	DD	22	AA	2023	MM	8	DD	22		
	Cargo	Contratista						Interventor							

	MEMORIAS DE CALCULOS Secretaria de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura	Código: R-SI-POI-047 Fecha: 18/02/2015 Versión: 001 Página 1 de 1

Contrato No.	002	Año	2023	Objeto	CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Ítem:	BAJANTE A. LLUVIAS 3" PVC	Cantidad Total:	8,50

Croquis y Record Fotográfico	Descripción	Unidad			Dimensiones			Valor Total (Cantidad Área Volumen)	Valor acumulada
		Cantidad	Área	Volumen	Largo	Ancho	Alto		
Récor Fotográfico de la Obra (antes de iniciar, durante y al finalizar la Obra)									
 	CUBIERTA CAFETERIA ZONA 1				4,50			4,50	4,50
	CUBIERTA CAFETERIA ZONA 2				4,00			4,00	8,50

Nota: en la casilla de Unidad; Cantidad ejemplo si cantidad de tapas (und) o ml de tuberia etc, Area: Ejemplo cuando son metros cuadrados de pavimento (m^2), Volumen: Ejemplo cuando son metros Cubicos (m^3)

Observaciones:															
	Firma														
	Nombre														
	Fecha	AA	2023	MM	8	DD	22	AA	2023	MM	8	DD	22		
	Cargo	Contratista						Interventor							

	MEMORIAS DE CALCULOS Secretaria de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura	Código: R-SI-POI-047 Fecha: 18/02/2015 Versión: 001 Página 1 de 1

Contrato No.	002	Año	2023	Objeto	CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Item:	FLANCHE EN LAMINA DE ZINC C.16	Cantidad Total:	40,10

Croquis y Record Fotográfico	Descripción	Unidad			Dimensiones			Valor Total (Cantidad Área Volumen)	Valor acumulada
		Cantidad	Área	Volumen	Largo	Ancho	Espesor		
Récor Fotográfico de la Obra (antes de iniciar, durante y al finalizar la Obra)									
 	CUBIERTA CAFETERIA								
	ZONA 1				19,85			19,85	19,85
	ZONA 2				20,25			20,25	40,10

Nota: en la casilla de Unidad: Cantidad ejemplo si cantidad de tapas (und) o ml de tuberia etc, Area: Ejemplo cuando son metros cuadrados de pavimento (m^2), Volumen: Ejemplo:cuando son metros Cubicos (m^3)

Observaciones:															
	Firma														
	Nombre														
	Fecha	AA		2023	MM	8	DD	22	AA		2023	MM	8	DD	22
	Cargo	Contratista							Interventor						

	MEMORIAS DE CALCULOS Secretaria de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura	Código: R-SI-POI-047 Fecha: 18/02/2015 Versión: 001 Página 1 de 1

Contrato No.	002	Año	2023	Objeto	CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Item:	IMPERMEABILIZACION COLECTOR DE AGUAS	Cantidad Total:	1,73

Croquis y Record Fotográfico	Descripción	Unidad			Dimensiones			Valor Total (Cantidad Área Volumen)	Valor acumulada
		Cantidad	Área	Volumen	Largo	Ancho	Espesor		
Récor Fotográfico de la Obra (antes de iniciar, durante y al finalizar la Obra)									
	PUENTE CONCEJO				1,73			1,73	1,73


Nota: en la casilla de Unidad; Cantidad ejemplo si cantidad de tapas (und) o ml de tuberia etc. Area: Ejemplo cuando son metros cuadrados de pavimento (m^2), Volumen: Ejemplo cuando son metros Cubicos (m^3)

Observaciones:													
	Firma												
	Nombre												
	Fecha	AA	2023	MM	8	DD	22	AA	2023	MM	8	DD	22
	Cargo	Contratista						Interventor					

	MEMORIAS DE CALCULOS Secretaria de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura	Código: R-SI-POI-047 Fecha: 18/02/2015 Versión: 001 Página 1 de 1

Contrato No.	002	Año	2023	Objeto	CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Item:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LETRAS ALUMINIO CON CALIBRE 6MM	Cantidad Total:	6,00

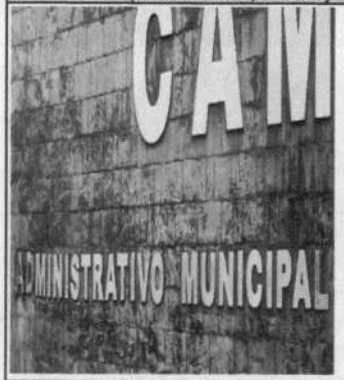Croquis y Record Fotográfico	Descripción	Unidad			Dimensiones			Valor Total (Cantidad Área Volumen)	Valor acumulada
		Cantidad	Área	Volumen	Largo	Ancho	Alto		
Récor Fotográfico de la Obra (antes de iniciar, durante y al finalizar la Obra)									
 	LETRAS CENTRO ADMINISTRATIVO LOCAL	3						3,00	3,00
	LETRAS CONCEJO	3						3,00	6,00

Nota: en la casilla de Unidad; Cantidad ejemplo si cantidad de tapas (und) o ml de tubería etc, Area: Ejemplo cuando son metros cuadrados de pavimento (m^2), Volumen: Ejemplo cuando son metros Cubicos (m^3)

Observaciones:	Firma													
	Nombre													
	Fecha	AA	2023	MM	8	DD	22	AA	2023	MM	8	DD	22	
	Cargo	Contratista						Interventor						

	MEMORIAS DE CALCULOS Secretaria de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura	Código: R-SI-POI-047 Fecha: 18/02/2015 Versión: 001 Página 1 de 1

Contrato No.	002	Año	2023	Objeto	CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Ítem:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4MM INC. SELLANTE EN POLIURETANO	Cantidad Total:	2,76

Croquis y Record Fotográfico	Descripción	Unidad			Dimensiones			Valor Total (Cantidad Área Volumen)	Valor acumulada
		Cantidad	Área	Volumen	Largo	Ancho	Alto		
Récor Fotográfico de la Obra (antes de iniciar, durante y al finalizar la Obra)									
	VENTANA 1				1,20		1,15	1,38	1,38
	VENTANA 2				1,20		1,15	1,38	2,76

Nota: en la casilla de Unidad; Cantidad ejemplo si cantidad de tapas (und) o ml de tuberia etc, Area: Ejemplo cuando son metros cuadrados de pav/muros (m²), Volumen: Ejemplo cuando son metros Cubicos (m³)

Observaciones:															
	Firma														
	Nombre														
	Fecha	AA	2023	MM	8	DD	22	AA	2023	MM	8	DD	22		
	Cargo	Contratista						Interventor							

	MEMORIAS DE CALCULOS Secretaria de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura	Código: R-SI-POI-047 Fecha: 18/02/2015 Versión: 001 Página 1 de 1

Contrato No.	002	Año	2023	Objeto	CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Item:	MARCO EN MADERA VENTANA	Cantidad Total:	9,40

Croquis y Record Fotográfico	Descripción	Unidad			Dimensiones			Valor Total (Cantidad Área Volumen)	Valor acumulada
		Cantidad	Área	Volumen	Largo	Ancho	Alto		
Récor Fotográfico de la Obra (antes de iniciar, durante y al finalizar la Obra)									
	VENTANA 1				4,70			4,70	4,70
	VENTANA 2				4,70			4,70	9,40

Nota: en la casilla de Unidad; Cantidad ejemplo si cantidad de tapas (und) o ml de tuberia etc, Area: Ejemplo cuando son metros cuadrados de pavimento (m^2), Volumen: Ejemplo cuando son metros Cubicos (m^3)

Observaciones:														
	Firma													
	Nombre													
	Fecha	AA	2023	MM	8	DD	22	AA	2023	MM	8	DD	22	
	Cargo	Contratista						Interventor						

MEMORIAS DE CALCULOS

Secretaria de Infraestructura
Proceso Obras Públicas e Infraestructura

Código:	R-SI-POI-047
Fecha:	18/02/2015
Versión:	001
Página	1 de 1

Contrato No.	002	Año	2023	Objeto	CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Item:	FILOS Y DILATACIONES	Cantidad Total:	12,80

Croquis y Record Fotográfico

Récor Fotográfico de la Obra
(antes de iniciar, durante y al finalizar la Obra)





Descripción	Unidad			Dimensiones			Valor Total (Cantidad Área Volumen)	Valor acumulada
	Cantidad	Área	Volumen	Largo	Ancho	Alto		
VENTANA 1				4,70			4,70	4,70
VENTANA 2				4,70			4,70	9,40
								9,40
ESCALERAS Y RAMPA NUEVAS (DESPUES DE DEMOLICION)				3,40			3,40	12,80

Nota: en la casilla de Unidad, Cantidad ejemplo si cantidad de tapas (und) o ml de tuberia etc, Area: Ejemplo cuando son metros cuadrados de pavimento (m2), Volumen: Ejemplo cuando son metros cubicos (m3)

Observaciones:

Firma													
Nombre													
Fecha	AA	2023	MM	8	DD	22	AA	2023	MM	8	DD	22	
Cargo	Contratista						Interventor						

	MEMORIAS DE CALCULOS Secretaria de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura	Código: R-SI-POI-047 Fecha: 18/02/2015 Versión: 001 Página 1 de 1

Contrato No.	002	Año	2023	Objeto	CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Ítem:	DEMOLICION ENCHAPE PARED INC. ACARREO HORIZONTAL HASTA 100 M.	Cantidad Total:	2,76

Croquis y Record Fotográfico	Descripción	Unidad			Dimensiones			Valor Total (Cantidad Área Volumen)	Valor acumulada
		Cantidad	Área	Volumen	Largo	Ancho	Alto		
Récor Fotográfico de la Obra (antes de iniciar, durante y al finalizar la Obra)									
	VENTANA 1				1,20		1,15	1,38	1,38
	VENTANA 2				1,20		1,15	1,38	2,76

Nota: en la casilla de Unidad; Cantidad ejemplo si cantidad de tapas (und) o ml de tuberia etc, Área: Ejemplo cuando son metros cuadrados de pavimento (m^2), Volumen: Ejemplo cuando son metros Cubicos (m^3)


Observaciones:															
	Firma														
	Nombre														
	Fecha	AA	2023	MM	8	DD	22	AA	2023	MM	8	DD	22		
	Cargo	Contratista						Interventor							

FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003
(PERSONAS NATURALES)

Yo **JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO** identificado (a) con **CC: 7.550.995** de Armenia Quindío de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes y/o el de mis empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016).

Dada en Armenia Q, a los (22) días del mes de agosto de 2023.



JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO
PROPONENTE

Comfenalco
Quindío

LA SUSCRITA SUBDIRECTORA DE SUBSIDIOS
DE COMFENALCO QUINDIO

A PETICION DEL INTERESADO
HACE CONSTAR:

LA EMPRESA: **SANDOVAL GALINDO JHON JAIRO SANDOVAL**
NIT: **7550995**

Efectuó pago de aportes por un valor de $ 66.800,00 pesos, por concepto de aportes parafiscales con destino al sistema de Compensación Familiar por la vigencia 2023, correspondiente a los períodos comprendidos entre Junio a Julio, discriminados así:

APORTES 4 %: 66.800,00
INTERESES CAJA: $0,00

PERIODO	APORTE
2023-06	$ 20.400,00
2023-07	$ 46.400,00
TOTAL	$ 66.800,00

Para constancia se firma el Lunes 04 de septiembre del año 2023.

Luz Piedad Salas Ceballos
Subdirector de Subsidio

Elaborado por: Portal Empleadores - Servicios en Linea

La información suministrada en este certificado está sujeta a verificación por parte la caja de compensación familiar COMFENALCO QUINDIO
La dinamica de los datos consignada en este certificado es variable; la información corresponde al día de hoy.
No tiene validez para efectos tributarios, no es válido para efectos de afiliación en otra caja de compensanción

VIGILADO SuperSubsidio

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Armenia - Quindío

Recibo de Caja No: 96067440

LIQUIDACION PAGO DE APORTES - FIC SECTOR CONSTRUCCI

FECHA: 1/ Sept /2023 No: 378

DATOS BASICOS

Nombre o razón social: SANDOVAL GALINDO JHON JAIRO
Nit: 7550995 Actividad económica: CONSTRUCCIÓN Caja de compensación: xxxxxxxxxx
Dirección GUADUALES DE LA VILLA MZ 3 CASA 33 Ciudad: ARMENIA Teléfono: 7476352

DETALLE DEL APORTE AL SENA

Año	Meses	Número de contrato	Contratante	Valor de la nómina	Valor del aport
2023	12 12 12 12 12 12	002-2023-75-20	MUNICIPIO DE ARMENIA		

Total a pagar al SENA

DETALLE DE APORTE AL FIC

Año	Meses	Tipo de obra a realizar	Ingre	Valor del contrato	Valor del pago
2023	12 12 12 12 12 12	ADECUACIONES Y/MANTENIMIENTO EN LA INFRAEST	A	PLANILLAS	164.850

Total a pagar al FIC $ 164.850

Total a pagar aportes SENA + FIC $ 164.850

PAGO EN EFECTIVO

Son: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

Observaciones: LIQUIDA CONTRATO POR$65.939.900 A TODO COSTO MPIO DE ARMENIA

ELABORADO

AUTORIZADO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1030301483A16

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **RAMIRO ORTIZ BEJARANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 18495418 de ARMENIA (QUINDIO) Y Tarjeta Profesional No 86967-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Junio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 18.495.418
ORTIZ BEJARANO
APELLIDOS
RAMIRO
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 19-NOV-1972
BUGA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
15-MAR-1991 ARMENIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-2600100-00209424-M-0018495418-20100118
0020006552A 1
4180602014



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
86967-T
RAMIRO
ORTIZ BEJARANO
C.C. 18495418
RESOLUCION INSCRIPCION 78 FECHA 18/07/02
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
PRESIDENTE
ELOY NES SANCHEZ CORTES
96776



Ramiro Ortiz Bejarano
FIRMA DEL TITULAR
005293
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

aportes en línea

Planilla Resumen

ATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
1097402734		BOTERO QUICENO DIEGO FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Mz E Casa 14 Barrio Guaduales	CALARCA-QUINDIO	7417700	No

ATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
23-07	2023-07	97354976	9453914118	I	2023/08/09	2023/08/11	BANCOLOMBIA	2	$331,500

QUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
	CC 1097402734	BOTERO DIEGO																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$330,600
al	Afiliados(1)																					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$330,600

2023/08/11 11:42 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

ATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
1097402734		BOTERO QUICENO DIEGO FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Mz E Casa 14 Barrio Guaduales	CALARCA-QUINDIO	7417700	No

ATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
23-07	2023-07	97354976	9453914118	I	2023/08/09	2023/08/11	BANCOLOMBIA	2	$331,500

ESUMEN DE PAGO

ESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
P (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$500	$0	$186,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$500	$0	$186,100
S (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$400	$0	$145,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$400	$0	$145,400
OTAL				1	$330,600	$900	$0	$331,500

2023/08/11 11:42 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7550995		SANDOVAL GALINDO JHON JAIRO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	REPARACIONES LOCATIVAS	CRA 16 ENTRE CALLES 14 Y 16	ARMENIA-QUINDIO	7777777	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	108159124	9454950269	E	2023/08/24	2023/08/17	BANCOLOMBIA	0	$359,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1098308835	GARCIA DIEGO		X																230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
Total	**Afiliados(1)**																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$80,800		$0	$0		$359,200

2023/08/17 10:20 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7550995		SANDOVAL GALINDO JHON JAIRO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	REPARACIONES LOCATIVAS	CRA 16 ENTRE CALLES 14 Y 16	ARMENIA-QUINDIO	7777777	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	108159124	9454950269	E	2023/08/24	2023/08/17	BANCOLOMBIA	0	$359,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$80,800	$0	$0	$80,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$80,800	$0	$0	$80,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$0	$0	$46,400
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	$46,400	$0	$0	$46,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$0	$0	$46,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
TOTAL				1	$359,200	$0	$0	$359,200

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO
IDENTIFICACION:	CC-7550995
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-08-22
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-08-24
FECHA DE PAGO:	2023-08-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-07
PERIODO SALUD:	2023-07
NUMERO PLANILLA:	8625992856
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8650170386
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 150.000	$ 150.000
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 192.000	$ 192.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 83.600	$ 83.600
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 425.600	$ 425.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/09/2023

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	MARIA DEL PILAR GONZALEZ HERNANDEZ
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	CC-41918756
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2023-08-03
INDENTIFICACION EMPLEADO	CC-41918756
NOMBRE EMPLEADO	MARIA DEL PILAR GONZALEZ HERNANDEZ
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
CAJA COMPENSACIÓN	Sin CCF
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
NÚMERO PLANILLA	8626039633
REFERENCIA PAGO(PIN)	8646088462
TIPO PLANILLA	I
PERIODO PENSIÓN	2023-07
PERIODO SALUD	2023-07
TIPO COTIZANTE	Independiente voluntario al sistema de riesgos laborales
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	0
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.160.000	0,1600000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.160.000	0,1250000	$ 145.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.160.000	0,0052200	$ 6.100	3

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
0	0	0,0000000	$ 0	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pension	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 185.600	$ 145.000	$ 6.100	$ 0	$ 336.700

CONTRATO DE OBRA No. 002 DE 2023

CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE ARMENIA	
CONTRATISTA	JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO	
MATRICULA PROFESIONAL O NIT	63202-52236	
INTERVENTOR(A) O SUPERVISOR (A)	DAVID ESTIVEN ACEVEDO OSORIO	
VALOR INICIAL CONTRATO	$	65.939.900,00
VALOR ADICIONAL AL CONTRATO	N.A	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	65.939.900,00
PLAZO CONTRACTUAL	45 DIAS	
FECHA DE INICIO	16 DE MAYO DE 2023	
FECHA DE SUSPENSION Nº 1	17 DE JULIO DE 2023	
FECHA DE REINICIO Nº 1	27 DE JULIO DE 2023	
FECHA DE TERMINACION INICIAL	29 DE JUNIO DE 2023	
ADICIONAL EN TIEMPO	2O DIAS	
FECHA DE TERMINACION FINAL	29 DE JULIO DE 2023	

Se anexa registro fotográfico de la obra ejecutada

NOTA: En caso de que exista mas de una sus pensión y reiniciación, se debe anexar el numero de filas que contengan la información de las suspensiónes y reinicios realizadas

El día Veintitres (23) de agosto de 2023, se reunieron en la Secretaría de Infraestructura Municipal la Ingeniera CLAUDIA MILENA ARENAS AGUDELO , en calidad de Secretario(a) de Infraestructura, el ingeniero DAVID ESTIVEN ACEVEDO OSORIO supervisor(a) del contrato y el ingeniero JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO, en calidad de Contratista ,con el fin de suscribir el Acta de Recibo a Satisfacción del Contrato de Obra N° 002 de 2023

JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO
CONTRATISTA

DAVID ESTIVEN ACEVEDO OSORIO
INTERVENTOR(A) O SUPERVISOR(A)

CLAUDIA MILENA ARENAS AGUDELO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA No. 002 DE 2023

CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Armenia, 1 de Septiembre de 2023

EJECUCIÓN DE LA OBRA	Desde el 16 de Mayo de 2023 hasta el 29 de Julio de 2023	
UBICACIÓN	CONCEJO MUNICIPAL E INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	10 DE ABRIL DE 2023	
FECHA DE LEGALIZACIÓN	11 DE ABRIL DE 2023	
FECHA DE INICIO	16 DE MAYO DE 2023	
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	29 DE JUNIO DE 2023	
PLAZO CONTRACTUAL	45 DIAS	
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	17 DE JULIO DE 2023	
FECHA DE REINICIO No. 1	27 DE JULIO DE 2023	
ADICIONAL EN TIEMPO	20 DÍAS	
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	29 DE JULIO DE 2023	
VALOR INICIAL CONTRATO	$	65.939.900,00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	N/A	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	65.939.900,00
VALOR ANTICIPO	N/A	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE ARMENIA	
CONTRATISTA	JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO	
INTERVENTORIA	N/A	

Registro fotográfico de obra entregada

Nota: En caso de que exista mas de una suspensión y reiniciación, se debe anexar el numero de filas que contengan la información de las suspensiónes y reinicios realizados

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL CONTRATO	$ 65.939.900,00	
VALOR ANTICIPO	N/A	
VALOR ADICIONAL AL CONTRATO	$ 0,00	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 65.939.900,00	
VALOR OBRA EJECUTADA		$ 65.939.900,00
VALOR CONTRATO NO EJECUTADO		$ 0
VALOR ANTICIPO		N/A
VALOR ACTA FINAL DE OBRA	$ 23.088.563,80	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATANTE	$ 0,00	
SUMAS IGUALES	$ 65.939.900,00	$ 65.939.900,00

EL INTERVENTOR PRESENTA A LA ENTIDAD CONTRATANTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

. Paz y salvo de pago por aportes parafiscales, Comfenalco, Sena, ICBF y FIC

. Paz y salvo de pago de autoliquidaciones a salud, pensión , ARP del personal vinculado.

. Bitácora de la obra original

Estudio fotográfico de la obra impreso y en medio magnético, que den cuenta del proceso evolutivo de la obra, planos de obra ejecutada (planos record)

. Fotografía de la valla instalada en el sitio de la obra
. Revisión de las pólizas, determinando la vigencia y el valor de las mismas

El contratante y el interventor, procede a la revisión de los documentos entregados, los cuales se encuentran ajustados a lo exigido en el contrato, Así mismo verifican que los valores consignados en las actas coinciden con lo pactado en el presente contrato.

DE IGUAL FORMA DECLARAN:

A. Que la obra fue entregada por el contratista y recibida por el contratante a entera satisfacción tal y como consta en el acta respectiva.
B. Que en la presente acta de liquidación del contrato, están incluidos todos los valores de obra ejecutada.
C. Que el contratista ejecuto las obras en el plazo previsto.
D. Que no se impusieron multas y/o sanciones de ninguna naturaleza al contratista.
E. Que agotado el objeto fisico del contrato queda un saldo a favor del contratante de
$ 0
F. Que el contratista manifiesta que el municipio de Armenia en calidad de contratante, cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra el Municipio de Armenia en relación con el contrato y la presente acta.
G. Los vicios ocultos que no puedan haber sido encontrados, así como las consecuencias que de ellos deriven, son de plena responsabilidad del contratista.

Por lo anteriormente expuesto, las partes, de común acuerdo dan por liquidado el contrato de obra No 002 de 2023, declarándose las partes a paz y salvo mutuamente, libres de toda divergencia o desacuerdo, razones por las cuales no se deja constancia alguna sobre observaciones u objeciones

En constancia de lo anterior, se suscribe por los que en ella intervinieron, en tres (03) ejemplares del mismo tenor.

DAVID ESTIVEN ACEVEDO OSORIO
INTERVENTOR(A) O SUPERVISOR (A)

JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO
CONTRATISTA

CLAUDIA MILENA ARENAS AGUDELO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 1b89a62e2bce57d27e25ec37778ac839abf82f90fe18a31089ab627ae340df49cf04345b532c059e325f67c3bcc35175

Número de Factura: FE-69
Fecha de Emisión: 22/08/2023
Fecha de Vencimiento: 31/08/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido: FE69
Fecha de orden de pedido: 22/08/2023

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SANDOVAL GALINDO JHON JAIRO
Nombre Comercial: SANDOVAL GALINDO JHON JAIRO
Nit del Emisor: 7550995
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 7112

País: Colombia
Departamento: Quindío
Municipio / Ciudad: Armenia
Dirección: CON LA ARCADIA MZ 18 CA 3
Teléfono / Móvil: 7410926
Correo: jhonsandoval333@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE ARMENIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890000464
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Quindío
Municipio / Ciudad: Armenia
Dirección: cra 16 nro. 15-28-Piso 4 CAM
Teléfono / Móvil:
Correo: servicioalcliente@armenia.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	002	COSTO DIRECTO	94	1,00	$ 17.760.433,69	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.760.433,69
2	001	ADMINISTRACION	94	1,00	$ 4.440.108,42	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.440.108,42
3	0005	UTILIDAD SIN IVA	94	1,00	$ 888.021,69	$ 0,00	$ 0,00					$ 888.021,69

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

ACTA FINAL CONCEJO
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-08-22 09:00:34
Documento generado el: 2023-08-22 09:00:15
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			23.088.563,80
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			23.088.563,80
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			23.088.563,80
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	23.088.563,80

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764048918293 Rango desde: 63 Rango hasta: 500 Vigencia: 2023-11-11

CONTRATO DE OBRA No. 002 DE 2023

CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

CONTRATISTA	JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO
MATRICULA PROFESIONAL O NIT	63202-52236
INTERVENTOR(A) O SUPERVISOR (A)	DAVID ESTIVEN ACEVEDO OSORIO
FORMA DE PAGO	Pagos parciales por avance de obra
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 65.939.900,00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	
VALOR ANTICIPO	N/A
VALOR ACTA 1	$ 42.851.336,20
VALOR ACTA FINAL	$ 23.088.563,80
SALDO DEL CONTRATO	$ -

Valor A Cancelar en letras: VEINTITRES MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	2122 del 17 de febrero de 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	20233009 del 11 de abril de 2023

JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO
CONTRATISTA

DAVID ESTIVEN ACEVEDO OSORIO
INTERVENTOR(A) O SUPERVISOR(A)

ALCALDIA DE ARMENIA

MUNICIPIO DE ARMENIA
NIT. 890000464-3
741 7100
Carrera 16 # 15-28 Centro.

Vigencia Fiscal 2023

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS Nº. 3009

Fecha de Compromiso: 11 de abril de 2023

Beneficiario JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO **Nit:** 7550995 -

No. C.D.P. 2122 **Fecha de Expedición del C.D.P.** 17 de febrero de 2023

Tipo de Compromiso Contrato

Oficio JURIDICA DJ-PJU-SUB-160 **Fecha:** 11/04/2023 **Vence:** 31/12/2023

Objeto: CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL .

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
Gastos-Funcionamiento		
Recurso Propio-Libre Destinación RECURSOS PROPIOS		
1302 - 2.1.2.02.02.005.53290 - 001	Otras obras de ingeniería civil	$ 65.939.900,00
	Total Compromiso	$65.939.900,00

Programación de PAC*	
Mes	Valor Programación
Abril	$59.345.910,00
Mayo	6.593.990,00
Valor Total	$65.939.900,00

GERMAN ALONSO GOMEZ CASTRILLON
Lider Gestión Presupuestal

Elaboró

Revisó

Elaboró: WSHANRRYR

*Los pagos se condicionan al cumplimiento de los requisitos establecidos contractualmente.

	AUTORIZACIÓN DESCUENTO DE ESTAMPILLAS	Código: R-SH-PGF-005
		Fecha: 28/09/2021
	Secretaria de Hacienda Municipal Proceso Gestión Financiera	Versión: 001
		Página: 1 de 1

Armenia, 23 de agosto de 2023

Señores
Secretaría de Hacienda
Municipio de Armenia

Asunto: Autorización Descuento de Estampillas

Nombre y Apellido: Jhon Jairo Sandoval Galindo Cédula: 7.550.995

Dirección: CONDOMINIO LA ARCADIA MZ 18 CASA 3 Teléfono: 3218158122

Manifiesto, que es mi voluntad autorizar al Municipio de Armenia para que realice los respectivos descuentos por concepto de estampillas:

☐ Pro-desarrollo ■ Pro-hospital ■ Pro-cultura ■ Pro-bienestar del adulto mayor

Que se lleguen a causar con ocasión del contrato de:

☐ Prestación de Servicios Apoyo a la Gestión ☐ Prestación de Servicios Profesionales

■ Contratos de Obra ☐ Contratos de Consultoría

☐ Compra Venta y/o Suministros ☐ Proveedor

☐ Otro

Especificar cual:

Atentamente;

Jhon Jairo Sandoval Galindo
C.C.: 7.550.995

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO Identificado con CC 7550995

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina ARMENIA PLAZA, con las siguientes características:

Cuentamiga

Número:	24121412575
Fecha de apertura:	16 de Marzo de 2023
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

VIGILADO

Esta constancia se expide con destino a QUIEN INTERESE, realizada en la Oficina 0091 ARMENIA PLAZA de la ciudad de ARMENIA QUINDIO, el día Miércoles, 12 de Abril de 2023.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

CONTRATO DE OBRA No. 002 DE 2023

CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Armenia, 30 de junio de 2023

FECHA DE INICIO	16 DE MAYO DE 2023
PLAZO CONTRACTUAL	45 DIAS
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 65.939.900,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 65.939.900,00
VALOR OBRA EJECUTADA	$ 65.939.900,00

FECHA TERMINACION CONTRATO INICIAL	29 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE SUSPENSION CONTRATO	17 DE JULIO DE 2023
FECHA DE REINICIO CONTRATO	27 DE JULIO DE 2023
ADICIONAL TIEMPO	20 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA	29 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACION CONTRATO FINAL	29 DE JULIO DE 2023

ITEM	Actividad	Obra Contratada				Obra Ejecutada								
						ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACUMULADO		% EJECUTADO
		Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	
	OBRA CONTRATADA EJECUTADA													
	SECTOR CONCEJO MUNICIPAL													
1	**CUBIERTA**													
1.1	DESMONTE DE CUBIERTA EN VIDRIO	M2	50,00	$ 13.538,46	$ 676.923,00	0,00	$ 0,00	54,63	$ 739.590,37	0,00	$ 0,00	54,63	$ 739.590,37	1,46%
1.2	CUBIERTA EN TEJA POLICARBONATO INC. Tornillos de fijación y accesorios	M2	55,00	$ 93.615,38	$ 5.148.845,90	0,00	$ 0,00	54,63	$ 5.114.099,66	0,00	$ 0,00	54,63	$ 5.114.099,66	10,08%
1.3	IMPERMEABILIZACION CULATA CON REFUERZO EN TELA DE POLIESTER NO TEJIDO	M2	85,00	$ 29.461,54	$ 2.504.230,90	122,58	$ 3.611.248,27	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	122,58	$ 3.611.248,27	7,12%
2	**HIDROSANITARIOS**													
2.1	PUNTO DESAGUE PVC SANITARIO 4" INC. ACCESORIOS Y TRAMO DE TUBERIA	UND	7,00	$ 129.692,31	$ 907.846,17	8,00	$ 1.037.538,48	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 1.037.538,48	2,05%
2.2	REJILLA - SIFON DE PISO 3"	UND	7,00	$ 41.461,54	$ 290.230,78	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
2	**INSTALACIÓN VENTANAS**													
2.1	CORTE DE MUROS CON DISCO	ML	32,00	$ 7.923,08	$ 253.538,56	46,06	$ 364.937,06	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	46,06	$ 364.937,06	0,72%
2.2	DEMOLICION MUROS ,15 SIN RETIRO	M2	8,00	$ 6.538,46	$ 52.307,68	8,02	$ 52.422,76	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	8,02	$ 52.422,76	0,10%
2.3	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN ALUMINIO SECC. 1,5*1,5 Inc. Perfiles y herrajes necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	UND	8,00	$ 314.230,77	$ 2.513.846,16	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
3	**MANTENIMIENTO PUERTAS**													
3.1	REPARACION Y REINSTALACION DE PUERTA	UND	7,00	$ 67.307,69	$ 471.153,83	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
4	**CIELO RASO**													
4.1	CIELO RASO EN DRYWALL PANEL YESO (Inc. Encintada, resane, listo para pintura)	M2	30,00	$ 45.615,39	$ 1.368.461,70	19,92	$ 908.658,57	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	19,92	$ 908.658,57	1,79%
4.2	PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS INC. RESANES, FILOS Y DILATACIONES	M2	20,00	$ 16.307,69	$ 326.153,80	19,92	$ 324.849,18	206,68	$ 3.370.417,52	0,00	$ 0,00	226,60	$ 3.695.266,71	7,29%
	PUENTE CONCEJO													
1	**CUBIERTA**													
1.2	CUBIERTA EN TEJA POLICARBONATO INC. Tornillos de fijación y accesorios	M2	20,00	$ 93.615,38	$ 1.872.307,60	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
1.4	ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	M2	15,00	$ 38.307,69	$ 574.615,35	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
2	**HIDROSANITARIOS**													
2.3	REJILLA CARCAMO PEATONAL DESAGUE LINEAL	ML	5,00	$ 294.307,70	$ 1.471.538,50	0,00	$ 0,00	1,73	$ 509.152,32	0,00	$ 0,00	1,73	$ 509.152,32	1,00%
5	**DEMOLICIONES**													
5.1	DEMOLICION ACABADO DE PISO INC DEMOL DE ALISTADO DE PISO ESPESOR HASTA 4 CM, ACARREO HORIZONTAL HASTA 100 m, no inc retiro de obra	M2	2,00	$ 12.769,24	$ 25.538,48	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
6	**INSTALACIÓN LETRAS**													
6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRAS FLOTANTES PARA FACHADA EN ACEROINOXIDABLE	UND	5,00	$ 146.076,92	$ 730.384,60	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
7	**RETIRO DE SOBRANTES**													
7.1	RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES DISTANCIA HASTA DE 40 KM	M3	15,00	$ 64.769,23	$ 971.538,45	1,89	$ 122.231,45	0,43	$ 27.598,49	0,00	$ 0,00	2,31	$ 149.829,94	0,30%
	SECTOR NOR - OCCIDENTAL CAM													
1	**CUBIERTA**													
1.2	CUBIERTA EN TEJA POLICARBONATO INC. Tornillos de fijación y accesorios	M2	40,00	$ 93.615,38	$ 3.744.615,20	0,00	$ 0,00	39,20	$ 3.669.722,90	0,00	$ 0,00	39,20	$ 3.669.722,90	7,23%
1.4	ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	M2	40,00	$ 38.307,69	$ 1.532.307,60	39,20	$ 1.501.661,45	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	39,20	$ 1.501.661,45	2,96%
2	**HIDROSANITARIOS**													
2.1	PUNTO DESAGUE PVC SANITARIO 4" INC. ACCESORIOS Y TRAMO DE TUBERIA	UND	4,00	$ 129.692,31	$ 518.769,24	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
2.2	REJILLA - SIFON DE PISO 3"	UND	4,00	$ 41.461,54	$ 165.846,16	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	AMPLIACIÓN ZONA ESPEJO DE AGUA													
5	**DEMOLICIONES**													
5.1	DEMOLICION ACABADO DE PISO INC DEMOL DE ALISTADO DE PISO ESPESOR HASTA 4 CM, ACARREO HORIZONTAL HASTA 100 m, no inc retiro de obra	M2	4,00	$ 12.769,24	$ 51.076,96	7,00	$ 89.410,22	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	7,00	$ 89.410,22	0,18%
8	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**													
8.1	EXCAVACION A MANO MATERIAL COMUN 0-2 MTS, SIN RETIRO	M3	2,00	$ 13.153,84	$ 26.307,68	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

ACTA PARCIAL O FINAL DE OBRA

Secretaria de Infraestructura

Proceso 5. Obras Públicas e Infraestructura

2	**HIDROSANITARIOS**													
2.3	REJILLA CARCAMO PEATONAL DESAGUE LINEAL	ML	20,00	$ 294.307,70	$ 5.886.154,00	28,28	$ 8.323.021,76	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	28,28	$ 8.323.021,76	16,41%
9	**ESTRUCTURALES**													
9.1	RAMPA EN CONCRETO 21 Mpa. A=0.90 M DN=0.20M	ML	12,00	$ 185.153,85	$ 2.221.846,20	7,00	$ 1.296.076,95	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	7,00	$ 1.296.076,95	2,56%
9.2	ESCALERAS S/HIERRO	M3	3,00	$ 1.418.230,77	$ 4.254.692,31	0,38	$ 538.927,69	0,20	$ 287.191,73	0,00	$ 0,00	0,58	$ 826.119,42	1,63%
9.3	ACERO DE REFUERZO Inc. Alambre de amarra y figurado	KG	5,00	$ 8.923,08	$ 44.615,40	90,71	$ 809.412,59	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	90,71	$ 809.412,59	1,60%
9.4	VIGA CIMENTACION 20*20 EN CONCRETO DE 21 MPa S/H (con formaleta)	ML	23,00	$ 83.307,69	$ 1.916.076,87	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
10	**CARPINTERIA METALICA**													
10.1	REJA CERRAMIENTO TUBO RECTANGULAR/ANTI-PINTADA	ML	34,00	$ 246.615,39	$ 8.384.923,26	35,92	$ 8.858.424,81	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	35,92	$ 8.858.424,81	17,46%
6	**INSTALACION LETRAS**													
6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRAS FLOTANTES PARA FACHADA EN ACERO/INOXIDABLE	UND	8,00	$ 146.076,92	$ 1.168.615,36	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
7	**RETIRO DE SOBRANTES**													
7.1	RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES DISTANCIA HASTA DE 40 KM	M3	10,00	$ 64.769,23	$ 647.692,30	0,91	$ 58.956,84	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,91	$ 58.956,84	0,12%
	OBRA NO CONTRATADA Y EJECUTADA													
NP1	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE CANAL EN PVC DE 3"	ML		$ 72.920,00		0,00	$ 0,00	4,90	$ 357.308,00	0,00	$ 0,00	4,90	$ 357.308,00	0,70%
NP2	BAJANTE A. LLUVIAS 3" PVC	ML		$ 35.950,00		0,00	$ 0,00	8,50	$ 305.575,00	0,00	$ 0,00	8,50	$ 305.575,00	0,60%
NP3	MURO EN CONCRETO E=.10 HASTA H=1.00 M S/H	M3		$ 1.083.708,45		0,23	$ 251.420,36	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,23	$ 251.420,36	0,50%
NP4	BARANDA 1 1/2" TRES TUBOS HORIZ INC. INST	ML		$ 204.643,20		8,00	$ 1.637.145,60	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 1.637.145,60	3,23%
NP5	ANCLAJES DE 1/2"	UND		$ 16.338,00		95,00	$ 1.552.110,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	95,00	$ 1.552.110,00	3,06%
	CORTE CON DISCO	ML		$ 7.923,08		68,96	$ 546.375,60	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	68,96	$ 546.375,60	1,08%
NP6	DESMONTE CIELO RASO Inc. Desmonte de la estructura del cielo raso y el acarreo horizontal	M2		$ 4.379,00		19,92	$ 87.229,68	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	19,92	$ 87.229,68	0,17%
NP7	FLANCHE EN LAMINA DE ZINC C.16	ML		$ 17.112,00		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP8	IMPERMEABILIZACION COLECTOR DE AGUAS	ML		$ 35.025,00		28,28	$ 990.507,00	1,73	$ 60.593,25	0,00	$ 0,00	30,01	$ 1.051.100,25	2,07%
NP9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LETRAS ALUMINIO CON CALIBRE 6MM	UND		$ 409.960,00		0,00	$ 0,00	6,00	$ 2.459.760,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 2.459.760,00	4,85%
NP10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4MM INC. SELLANTE EN POLIURETANO	M2		$ 54.135,00		0,00	$ 0,00	2,76	$ 149.412,60	0,00	$ 0,00	2,76	$ 149.412,60	0,29%
NP11	MARCO EN MADERA VENTANA	ML		$ 56.145,00		0,00	$ 0,00	9,40	$ 527.763,00	0,00	$ 0,00	9,40	$ 527.763,00	1,04%
NP12	FILOS Y DILATACIONES	ML		$ 11.114,00		0,00	$ 0,00	12,80	$ 142.259,20	0,00	$ 0,00	12,80	$ 142.259,20	0,28%
NP13	DEMOLICION ENCHAPE PARED INC. ACARREO HORIZONTAL HASTA 100 M	M2		$ 14.489,00		0,00	$ 0,00	2,76	$ 39.989,64	0,00	$ 0,00	2,76	$ 39.989,64	0,08%
COSTO DIRECTO					$ 50.723.000,00		$ 32.962.568,31		$ 17.760.433,69		$ 0,00		$ 50.723.000,00	
A.I.U					$ 15.216.900,00		$ 9.888.769,89		$ 5.328.130,11		$ 0,00		$ 15.216.900,00	
VALOR TOTAL					$ 65.939.900,00		$ 42.851.336,20		$ 23.088.563,80		$ 0,00		$ 65.939.900,00	

Nota: Se deberán adicionar o eliminar las columnas correspondientes a las actas de obra dependiendo del número de actas que lleven a la fecha de elaboración de la presente acta

CONTRATISTA

JHON JAIRO SANDOVAL RAMIREZ

INTERVENTOR (A)

SECRETARIO (A) DE INFRAESTRUCTURA

Obra contratada Incluido Adicional			**$ 65.939.900,0**
Valor presente acta	**$ 23.088.563,8**		
Valor pagado actas	**$ 42.851.336,2**		
Saldo del Contrato	**$ 0,0**		
Anticipo Recibido	**$ 0,0**		
Anticipo amortizado a lafecha	**$ 0,0**		
Anticipo amortizado en la presenta acta	**$ 0,0**		
Saldo anticipo por amortizar	**$ 0,0**		
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 23.088.563,8**		

VEINTITRES MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE

Armenia, 23 de agosto de 2023

Señores
Secretaría de Hacienda
Municipio de Armenia


Asunto: Autorización Descuento ochenta (80) centavos.

Nombre y Apellido: Jhon Jairo Sandoval Galindo Cédula: 7.550.995

Dirección: CONDOMINIO LA ARCADIA MZ 18 CASA 3 Teléfono: 3218158122

Como contratista del contrato de obra No. 002 de 2023, me permito autorizar a ustedes se realice el descuento de los ochenta (80) centavos que se encuentran en la factura electrónica FE-69 y se me pague el valor entero ajustado a pesos.

Atentamente;

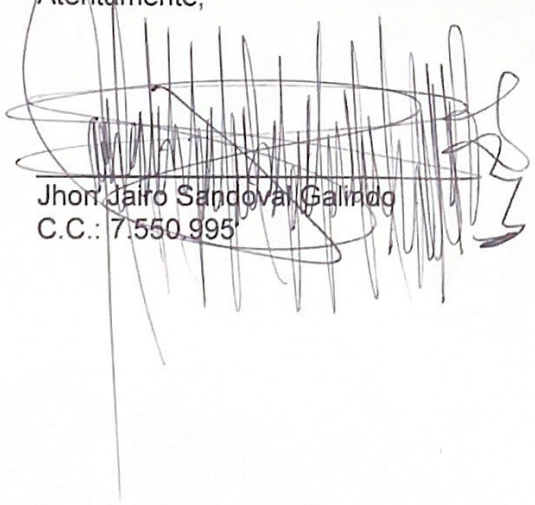

Jhon Jairo Sandoval Galindo
C.C.: 7.550.995
