9,7	Suministro, transporte e instalación de salida para tomacorriente a 220v, 3N°10. Incluye caja 4"*4" galvanizada y demás elementos necesarios para su correcta instalación	un	6,00	$ 182.552,00	$ 1.095.312,00	0,00	0,00	6,00	$ 1.095.312,00
9,8	suministro, transporte e instalación de Gabinete tipo intemperie IP 65, incluye breaker de 2x40A	un	2,00	$ 291.368,00	$ 582.736,00	1,00	0,00	1,00	$ 291.368,00
10	**LUMINARIAS**				**$ 69.716.579,00**				**$ 65.193.174,00**
10,1	Suministro, transporte e hincada de poste de alumbrado público tipo Carabobo de 5m. Incluye pintura de acuerdo a normas EPM.	un	0,00	$ 1.343.230,00	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
10,2	Suministro, Transporte E Instalación De Brazo Metalico Sencillo Galvanizado Tipo Cara Bobo Para Lamparas Instalado En Poste De Concreto Y Demás Accesorias Para Su Correcta Instalación	un	0,00	$ 578.399,00	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
10,3	Suministro transporte e instalación de luminaria marca silvania de alumbrado publico de 60 vatios, incluye fotocelda.	un	0,00	$ 1.444.692,00	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
10,4	Suministro, transporte e instalación de luminaria decorativa tipo exterior LUMINARIA ANTORCHA MINI 40W 100-240V 6600LM 113,8LM/W de un 1,02m de altura, Incluye: elementos de fijación, conectores de conexion y empalme.	un	23,00	$ 1.100.074,00	$ 25.301.702,00	9,00	0,00	14,00	$ 15.401.036,00
10,5	Suministro, transporte e instalación de luminaria decorativa tipo exterior LYRA LED 35W 100-277V 3500LM 100LM/W, Incluye: poste metalico redondo (h:3,5m) con base cuadrada, elementos de fijación, conectores de conexion y empalme.	un	16,00	$ 1.820.319,00	$ 29.125.104,00	0,00	2,00	18,00	$ 32.765.742,00
10,6	Bala de piso de 9 Vatios, Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion.	un	21,00	$ 248.089,00	$ 5.209.869,00	0,00	7,00	28,00	$ 6.946.492,00
10,7	Certificacion RETIE	un	1,00	$ 10.079.904,00	$ 10.079.904,00	0,00	0,00	1,00	$ 10.079.904,00
11	**OTROS**				**$ 32.332.581,00**				**$ 14.692.770,00**
11,1	Suministro, transporte e instalación de tierra abonada	m3	120,00	$ 83.021,00	$ 9.962.520,00	0,00	0,00	120,00	$ 9.962.520,00
11,2	Suministro, transporte y siembra de especies Arboreas (Lafoensia acuminata, Handrohanthus chrysanthus, Crotón magdalenensis, Quercus humboltii , Marianis nobilis o similares)	und	0,00	$ 485.551,00	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
11,3	Suministro, transporte e instalacion de grama Macana.	m2	250,00	$ 18.921,00	$ 4.730.250,00	0,00	0,00	250,00	$ 4.730.250,00

11,4	Suministro e instalación de marcas viales con material plástico en frío con resistencia al deslizamiento (flechas direccionales, flechas de fin de carril, textos, pares, triángulos ceda el paso, diamantes ceda el paso, textos de zona, pictograma de zona escolar entre otros). Incluye alúmina antideslizante	m2	211,00	$ 83.601,00	$ 17.639.811,00	211,00	0,00	0,00	$ 0,00
	OBRAS EXTRA				$ 586.385.370,46				$ 812.705.577,44
OE1	Construcción Rampas y losas en concreto de 3000 PSI para el acceso y salida vehiculos en vía principal, sika dur aplicado en los bordes y accelerante, Incluye formaleteria y todo lo necesario para su correcta construccion. Expesor minimo de 15cm	m2	97,12	$ 196.775,00	$ 19.110.788,00	0,00	0,00	97,12	$ 19.110.788,00
OE2	Entibado de brechas, con madera incluye todo lo necesario para su correcta instalacion, sera medido efectivamente el entibado por m2, descontando la superficie que no este entibada en las brechas.	m2	155,75	$ 118.008,00	$ 18.379.746,00	0,00	0,00	155,75	$ 18.379.746,00
OE3	Cama en triturado para cimentacio de tuberias, incluye todo lo necesario para su correcta instalacion.	m3	76,03	$ 212.308,00	$ 16.141.777,24	10,94	0,00	65,09	$ 13.819.127,72
OE4	Instalacion de plastico para aislamiento de estructuras de concreto con la superficie del terreno, incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	m2	652,50	$ 6.041,00	$ 3.941.752,50	80,00	0,00	572,50	$ 3.458.472,50
OE5	Construccion de cordon vaceado en obra en concreto de 3000 PSI, de medidas aproximadas 0,12x0,25m, incluye formaleteria en madera , y todo lo necesario para su correcta construccion.	ml	260,00	$ 84.326,00	$ 21.924.760,00	46,00	0,00	214,00	$ 18.045.764,00
E6	Construcción de PISO EN ADOQUÍN RECTANGULAR EN ARCILLA DE 12x24x6cm tipo santafe, de Color OSCURO para modulacion de cuadricula segun diseño. Incluye suministro y transporte de los adoquines, mortero 1:3, sello de juntas y cortes a máquina, compactacion y todo lo necesario para su correcta instalacion.	m2	400,00	$ 193.020,00	$ 77.208.000,00	195,00	0,00	205,00	$ 39.569.100,00
OE7	Instalacion de tableros electricos a la intemperie trifasicos 12 circuitos fijo y movil a 110 y 220, para todos los requerimientos de equipos electricos en el proyecto, Incluye instalacion de reflectores y todo lo necesario para su correcta instalacion.	Global	1,00	$ 3.624.597,00	$ 3.624.597,00	0,00	0,00	1,00	$ 3.624.597,00
OE8	Construccion de MH completo, en concreto de 3000 PSI, de 1,50m de diametro, Incluye cañuela, mesa, cilindro de 1,50m de diametro h promedio 2.8m, cono cilindrico, tapa cuadrada, herraje, ganchos y todo lo necesario para su correcta construccion.	unidad	3,00	$ 6.924.905,00	$ 20.774.715,00	0,00	0,00	3,00	$ 20.774.715,00

OE9	Movimiento de materas en concreto y llevada a puntos donde indique municipio de Marinilla, Incluye cargue y transporte de materas.	unidad	10,00	$ 60.408,00	$ 604.080,00	0,00	0,00	10,00	$ 604.080,00
OE10	Desmonte de plantas existentes en el area a intervenir, incluye desinstalacion, disposicion final según requerimientos del municipio de Marinilla.	unidad	60,00	$ 10.123,00	$ 607.380,00	0,00	0,00	60,00	$ 607.380,00
OE11	Construccion de Carcamo tipo alcancia en concreto de 3000psi según diseño, para recoleccion de aguas lluvias de la plaza seccion interna 0.40Mx 0,40M libres espesor 15cm, Incluye todo lo necesario para su correcta construccion.	ml	153,00	$ 575.208,00	$ 88.006.824,00	20,00	0,00	133,00	$ 76.502.664,00
OE12	Instalacion de anclajes con epoxico sicadur o similar, incluye perforacion con taladro, aplicación de epoxico, y todo lo necesario para su correcta construccion.	und	1742,00	$ 12.771,00	$ 22.247.082,00	300,00	0,00	1442,00	$ 18.415.782,00
OE13	Bolardo en hierro Modular tipo: Finsa o similar incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	unidad	6,00	$ 467.685,00	$ 2.806.110,00	0,00	4,00	10,00	$ 4.676.850,00
OE14	Bolardo en concreto tipo Kiinden o similar : Konkretus medidas 0,25m x 0,50m x 0,25m, peso 65kg.incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	unidad	21,00	$ 757.133,00	$ 15.899.793,00	0,00	7,00	28,00	$ 21.199.724,00
OE15	Basurera Pivotante sencilla única, tipo: SOCODA o similar, basurera en acero inoxidable para ambientes externos, capacidad 60 litros incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	unidad	15,00	$ 1.914.803,00	$ 28.722.045,00	5,00	0,00	10,00	$ 19.148.030,00
OE16	Suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica en caliente para reparcheo. Compactada con medios mecánicos según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye malla biaxia y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. La excavación, la base, la emulsión asfáltica se pagan por su respectivo ítem.	m3	34,80	$ 1.942.470,00	$ 67.597.956,00	7,80	0,00	27,00	$ 52.446.690,00
OE17	Suministro, transporte y colocación de emulsión asfáltica para imprimación de superficie a pavimentar y para las zonas de adoquin vehicular según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.	m2	150,00	$ 8.018,00	$ 1.202.700,00	0,00	60,00	210,00	$ 1.683.780,00

OE18	Suministro transporte e instalacion de Lamina depoliestireno para aislamiento de estructuras de contencion en concreto, incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	m2	29,85	$ 17.392,00	$ 519.151,20	0,00	0,00	29,85	$ 519.151,20
OE19	Suministro, transporte e instalacion de Tuberia presion RDE de 3" para red de incendios "Hidrantes" incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	ml	37,00	$ 119.713,00	$ 4.429.381,00	0,00	0,00	37,00	$ 4.429.381,00
OE20	Suministro, transporte e instalacion de Hidrantes de 3" para red de incendios.	unidad	2,00	$ 4.546.621,00	$ 9.093.242,00	0,00	0,00	2,00	$ 9.093.242,00
OE21	Suministro, transporte e instalacion de tuberia RDE de 1/2", incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	ml	60,00	$ 16.293,00	$ 977.580,00	0,00	10,00	70,00	$ 1.140.510,00
OE22	Suministro, transporte e instalación de canalización en tuberia conduit tipo DB D=1" incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	ml	160,00	$ 13.692,00	$ 2.190.720,00	60,00	0,00	100,00	$ 1.369.200,00
OE23	Nivelacion Manual de estructura en Base granular para garantizar niveles de proyecto y asi lograr una adecuada instalacion de los adoquines, Incluye chequeo de niveles con topografia, correccion con hilos y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	m2	2580,00	$ 6.966,00	$ 17.972.280,00	55,00	0,00	2525	$ 17.589.150,00
OE24	Construccion de cajas de registro para carcamos de 40x60 En concreto de 3000 PSI, en acabado de adoquin según diseño.	unidad	9,00	$ 705.678,00	$ 6.351.102,00	1,00	0,00	8,00	$ 5.645.424,00
OE25	Restauracion de estatuas de parque principal, incluye restauracion de pintura y pulida monumentos y adecuacion de estructuras de soporte.	UND	2,00	$ 7.730.957,00	$ 15.461.914,00	2,00	0,00	0,00	$ 0,00
OE26	Restauración de fuente patrimonial del municipio de Marinilla, incluye desmonte, desarmado, lavado y remoción de platinas y pinturas deterioradas, lavado y remoción de hongos y sales, reparación de fisuras y retallado de partes deterioradas, fundición de partes faltantes, aplicación química de protección del agua y la Imer perité, aplicación de patina en caliente y su cambio de sistema de	Global	1,00	$ 120.589.894,52	$ 120.589.894,52	0,00	0,00	1,00	$ 120.589.894,52

	bombeo, así como la reconstrucción de su estanque en concreto pulido.								
OE27	Suministro e instalación de bajante en tubería metálica galvanizada tipo IMC Ø2" incluye fijacion con zunchos y evillas	ml	0,00	$ 117.452	$ 0,00	0,00	9,00	9,00	$ 1.057.068,00
OE28	Suministro e instalacion de varilla copperweld Ø 5/8" para puesta a tierra y conexión, incluye excavación y lleno	und	0,00	$ 191.533	$ 0,00	0,00	4,00	4,00	$ 766.132,00
OE29	Empalme en punto de conexión a alumbrao publico, incluye ponchadora hidraulica, instalacion de conectores y demas elementos necesarios para su correcta instalacion.	und	0,00	$ 388.307	$ 0,00	0,00	1,00	1,00	$ 388.307,00
OE30	Suministro transporte e instalación de acometida electrica Cable 2No6 (F) + 1No8 (T) AWG Cu THWN-75°C - Acometida luminarias	ml	0,00	$ 38.316	$ 0,00	0,00	66,00	66,00	$ 2.528.856,00
OE31	Suministro transporte e instalación de acometida electrica Cable 4No8 (F) + AWG Cu THWN-75°C - Energia comerciantes, contador 1 y contador 2	ml	0,00	$ 38.915	$ 0,00	0,00	56,00	56,00	$ 2.179.240,00
OE32	Suministro transporte e instalación de acometida electrica Cable 3No4 (F) + 1N6 (T) AWG Cu THWN-75°C - Gabinete 1 (alcaldia)	ml	0,00	$ 79.353	$ 0,00	0,00	125,00	125,00	$ 9.919.125,00
OE33	Suministro transporte e instalación de acometida electrica Cable 3No2 (F) + 1N4 (T) AWG Cu THWN-75°C - Gabinete 2 (poste)	ml	0,00	$ 115.208	$ 0,00	0,00	101,00	101,00	$ 11.636.008,00
OE34	Restauración de gabinetes, incluye desmontage de elementos y reistalacion de elementos en buen estado y la instalacion de los elementos necesarios que estan en mal estado, incluye montage y desmontage del mismo	und	0,00	$ 1.495.853	$ 0,00	0,00	2,00	2,00	$ 2.991.706,00
OE35	Provisionales: Instalación tuberia cruce de via, para instalación de acometida de maquinaria a 220V y 2 visitas tecnicas para evaluación y reparación de acometida de privada de comerciantes (220V)	und	0,00	$ 1.182.632	$ 0,00	0,00	1,00	1,00	$ 1.182.632,00
OE36	Desmontaje, desensambre, limpieza, ensamble y montage de control luminarias	und	0,00	$ 417.936	$ 0,00	0,00	1,00	1,00	$ 417.936,00
OE37	Instalación de protecciones breaker 40A	und	0,00	$ 99.451	$ 0,00	0,00	4,00	4,00	$ 397.804,00
OE38	Instalacion de postes en fibra de vidrio altura total 8m, para instalacion de reflectores, incluye todo lo necesario para su correcta instalacion.	unidad	0,00	$ 2.370.375	$ 0,00	0,00	2,00	2,00	$ 4.740.750,00
OE39	Suministro, transporte e instalacion de caja y totalizador acometida gabinete, incluye desmontaje, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalacion.	global	0,00	$ 321.439	$ 0,00	0,00	2,00	2,00	$ 642.878,00

OE40	Suministro, transporte e instalación de luminaria decorativa tipo exterior LUMINARIA MINI POLE, fabricada en lamina de acero cold rolled cal 18, altura de 750mm, acabado en color negro, conjunto optico en lamina de acero cold rolled, difusor en acrilico opal mate.	un	0,00	$ 795.074	$ 0,00	0,00	9,00	9,00	$ 7.155.666,00
OE41	Enchape EN ADOQUÍN RECTANGULAR EN ARCILLA DE 12x24x6cm tipo santafe con piezas completas. Incluye suministro y transporte de los adoquines, pegacore, sello de juntas y cortes a máquina, y todo lo necesario para su correcta instalacion.	m2	0,00	$ 211.607	$ 0,00	0,00	232,80	232,80	$ 49.262.109,60
OE42	Suministro, transporte e instalacion de proteccion metalica en platina de 1"x3/16" metalico para luminaria tipo Antorcha, Incluye anclajes y todo lo necesario para su correcta instalacion.	unidad	0,00	$ 173.223	$ 0,00	0,00	28,00	28,00	$ 4.850.244,00
OE43	Hidrofugada y lavada de toda las superficies instaladas con adoquin tipo Santafe, Incluye utilizacion de hipoclorito, acido nitrico, hidrofugo, y detergentes para su correcta limpieza.	m2	0,00	$ 16.497	$ 0,00	0,00	3012,20	3012,20	$ 49.692.263,40
OE44	Marcacion con pintura espesor 10 a 12cm para demarcacion de zona de comerciantes, Incluye levantamiento, marcacion con cinta y aplicación de pintura y todo lo necesario para su correcta marcacion.	ml	0,00	$ 13.440	$ 0,00	0,00	524,13	524,13	$ 7.044.307,20
OE45	Enchape EN ADOQUÍN RECTANGULAR EN ARCILLA DE 12x24x6cm tipo santafe, en zonas donde su altura es menor a 30cm, como bordillos y demas elementos . Incluye suministro y transporte de los adoquines, pegacore, sello de juntas y cortes a máquina, y todo lo necesario para su correcta instalacion.	ml	0,00	$ 117.797	$ 0,00	0,00	417,90	417,90	$ 49.227.366,30
OE46	Construcción de PISO EN ADOQUÍN RECTANGULAR PARA TRAFICO VEHICULAR EN ARCILLA DE 10x20x8cm tipo santafe, estampillado, de Color OSCURO. Incluye suministro y transporte de los adoquines, pegacore capa gruesa para trafico vehicular, sello de juntas y cortes a máquina, compactacion y todo lo necesario para su correcta instalacion.	m2	0,00	$ 291.210	$ 0,00	0,00	15,60	15,60	$ 4.542.876,00
OE47	Construcción de PISO EN ADOQUÍN RECTANGULAR PARA TRAFICO VEHICULAR EN ARCILLA DE 10x20x8cm tipo santafe, estampillado, de Color CLARO. Incluye suministro y transporte de los adoquines, pegacore capa gruesa para trafico vehicular, sello de juntas y cortes a máquina, compactacion y todo lo necesario para su correcta instalacion.	m2	0,00	$ 245.037	$ 0,00	0,00	182,00	182,00	$ 44.596.734,00

OE48	Aplicación de acelerante para concreto de 3000 PSI de placas para zona vehicular frente a la iglesia, acelerante a 3 días, correspondiente al 2,5 al 3% del peso del cemento, para lograr una resitencia equivalente al 70 a 80% en los 3 dias despues de su vaceado, Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion. (Se cobrara por la relacion utilizada en cada m3 de concreto)	m3	0,00	$ 172.310	$ 0,00	0,00	47,00	47,00	$ 8.098.570,00
OE49	Restauracion de Bolardos metalicos existentes, Incluye restauracion de bolardos, resinatalcion y todo lo necesario para su correcta instalacion.	unidad	0,00	$ 250.000	$ 0,00	0,00	9,00	9,00	$ 2.250.000,00
OE50	Instalacion de cadena galvanizada calibre 3/8" para limitacion de paso peatonal, en bolardos metalicos, incluye ancjales y todo lo necesario para su correcta instalacion.	ml	0,00	$ 73.879	$ 0,00	0,00	70,00	70,00	$ 5.171.530,00
OE51	Suministro transporte e instalacion de maletines y/o barricadas, para control de trafico vehicular y peatonal, Incluye constantes movimientos según requerimientos, almacenamiento temporal y todo lo necesario para su instalacion.	unidad	0,00	$ 341.435	$ 0,00	0,00	30,00	30,00	$ 10.243.050,00
OE52	Enchape EN ADOQUÍN RECTANGULAR EN ARCILLA DE 12x24x6cm tipo santafe color OSCURO con piezas completas. Incluye suministro y transporte de los adoquines, pegacore, sello de juntas y cortes a máquina, y todo lo necesario para su correcta instalacion.	ml	0,00	$ 68.306	$ 0,00	0,00	352,00	352,00	$ 24.043.712,00
OE53	Suministro, transporte e instalacion de poste metálico para banderas, Incluye poste según diseño con cambio de diámetros de 4"x 2m, de 3"x 2m y 2"x2m, total altura de 6m, construcción de pedestal en concreto de 3000 PSI, bandera, y todo lo necesario para su correcta instalacion.	unidad	0,00	$ 3.808.866	$ 0,00	0,00	4,00	4,00	$ 15.235.464,00

COSTO DIRECTO	$ 2.537.325.524	**COSTO DIRECTO**	$ 2.537.325.524
ADMINISTRACIÓN (21,8%)	$ 553.136.964	**ADMINISTRACIÓN (21,8%)**	$ 553.136.964
UTILIDAD (4%)	$ 101.493.021	**UTILIDAD (4%)**	$ 101.493.021
TOTAL COSTO DIRECTO +AU	$ 3.191.955.509	**TOTAL COSTO DIRECTO +AU**	$ 3.191.955.509
PMA	$ 60.270.100	**PMA**	$ 60.270.100
PMT	$ 48.216.080	**PMT**	$ 48.216.080
VALOR TOTAL OBRA	**$ 3.300.441.689**	**VALOR TOTAL PROYECTADO**	**$ 3.300.441.689**

2. OBRA EXTRA ADICIÓNALES QUE SE APRUEBA Y CONCILIA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	V/UNIT
OE27	Suministro e instalación de bajante en tubería metálica galvanizada tipo IMC Ø2" incluye fijación con zunchos y evillas	ml	9,00	$ 117.452
OE28	Suministro e instalacion de varilla copperweld Ø 5/8" para puesta a tierra y conexión, incluye excavación y lleno	und	4,00	$ 191.533
OE29	Empalme en punto de conexión a alumbrado público, incluye ponchadora hidráulica, instalacion de conectores y demás elementos necesarios para su correcta instalacion.	und	1,00	$ 388.307
OE30	Suministro transporte e instalación de acometida eléctrica Cable 2No6 (F) + 1No8 (T) AWG Cu THWN-75°C - Acometida luminarias	ml	66,00	$ 38.316
OE31	Suministro transporte e instalación de acometida eléctrica Cable 4No8 (F) + AWG Cu THWN-75°C - Energía comerciantes, contador 1 y contador 2	ml	56,00	$ 38.915
OE32	Suministro transporte e instalación de acometida eléctrica Cable 3No4 (F) + 1N6 (T) AWG Cu THWN-75°C - Gabinete 1 (alcaldía)	ml	125,00	$ 79.353
OE33	Suministro transporte e instalación de acometida eléctrica Cable 3No2 (F) + 1N4 (T) AWG Cu THWN-75°C - Gabinete 2 (poste)	ml	101,00	$ 115.208
OE34	Restauración de gabinetes, incluye desmontaje de elementos y reinstalación de elementos en buen estado y la instalacion de los elementos necesarios que están en mal estado, incluye montaje y desmontaje del mismo	und	2,00	$ 1.495.853
OE35	Provisionales: Instalación tubería cruce de vía, para instalación de acometida de maquinaria a 220V y 2 visitas técnicas para evaluación y reparación de acometida de privada de comerciantes (220V)	und	1,00	$ 1.182.632
OE36	Desmontaje, desensamble, limpieza, ensamble y montaje de control luminarias	und	1,00	$ 417.936
OE37	Instalación de protecciones breaker 40A	und	4,00	$ 99.451
OE38	Instalacion de postes en fibra de vidrio altura total 8m, para instalacion de reflectores, incluye todo lo necesario para su correcta instalacion.	unidad	2,00	$ 2.370.375
OE39	Suministro, transporte e instalacion de caja y totalizador acometida gabinete, incluye desmontaje, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalacion.	global	2,00	$ 321.439
OE40	Suministro, transporte e instalación de luminaria decorativa tipo exterior LUMINARIA MINI POLE, fabricada en lamina de acero	un	9,00	$ 795.074

	cold rolled cal 18, altura de 750mm, acabado en color negro, conjunto óptico en lamina de acero cold rolled, difusor en acrílico opal mate.			
OE41	Enchape EN ADOQUÍN RECTANGULAR EN ARCILLA DE 12x24x6cm tipo Santafé con piezas completas. Incluye suministro y transporte de los adoquines, pegacore, sello de juntas y cortes a máquina, y todo lo necesario para su correcta instalacion.	m2	232,80	$ 211.607
OE42	Suministro, transporte e instalacion de protección metálica en platina de 1"x3/16" metálico para luminaria tipo Antorcha, Incluye anclajes y todo lo necesario para su correcta instalacion.	unidad	28,00	$ 173.223
OE43	Hidrofugada y lavada de toda las superficies instaladas con adoquín tipo Santafé, Incluye utilización de hipoclorito, acido nítrico, hidrofugo, y detergentes para su correcta limpieza.	m2	3012,20	$ 16.497
OE44	Marcación con pintura espesor 10 a 12cm para demarcación de zona de comerciantes, Incluye levantamiento, marcación con cinta y aplicación de pintura y todo lo necesario para su correcta marcación.	ml	524,13	$ 13.440
OE45	Enchape EN ADOQUÍN RECTANGULAR EN ARCILLA DE 12x24x6cm tipo Santafé, en zonas donde su altura es menor a 30cm, como bordillos y demás elementos . Incluye suministro y transporte de los adoquines, pegacore, sello de juntas y cortes a máquina, y todo lo necesario para su correcta instalacion.	ml	417,90	$ 117.797
OE46	Construcción de PISO EN ADOQUÍN RECTANGULAR PARA TRAFICO VEHICULAR EN ARCILLA DE 10x20x8cm tipo Santafé, estampillado, de Color OSCURO. Incluye suministro y transporte de los adoquines, pegacore capa gruesa para tráfico vehicular, sello de juntas y cortes a máquina, compactación y todo lo necesario para su correcta instalacion.	m2	15,60	$ 291.210
OE47	Construcción de PISO EN ADOQUÍN RECTANGULAR PARA TRAFICO VEHICULAR EN ARCILLA DE 10x20x8cm tipo Santafé, estampillado, de Color CLARO. Incluye suministro y transporte de los adoquines, pegacore capa gruesa para tráfico vehicular, sello de juntas y cortes a máquina, compactación y todo lo necesario para su correcta instalacion.	m2	182,00	$ 245.037
OE48	Aplicación de acelerante para concreto de 3000 PSI de placas para zona vehicular frente a la iglesia, acelerante a 3 días, correspondiente al 2,5 al 3% del peso del cemento, para lograr una resistencia equivalente al 70 a 80% en los 3 días después de su vaciado, Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion. (Se cobrará por la relación utilizada en cada m3 de concreto)	m3	47,00	$ 172.310

OE49	Restauración de Bolardos metálicos existentes, Incluye restauración de bolardos, reinstalación y todo lo necesario para su correcta instalacion.	unidad	9,00	$ 250.000
OE50	Instalacion de cadena galvanizada calibre 3/8" para limitación de paso peatonal, en bolardos metálicos, incluye anclajes y todo lo necesario para su correcta instalacion.	ml	70,00	$ 73.879
OE51	Suministro transporte e instalacion de maletines y/o barricadas, para control de tráfico vehicular y peatonal, Incluye constantes movimientos según requerimientos, almacenamiento temporal y todo lo necesario para su instalacion.	unidad	30,00	$ 341.435
OE52	Enchape EN ADOQUÍN RECTANGULAR EN ARCILLA DE 12x24x6cm tipo Santafé color OSCURO con piezas completas. Incluye suministro y transporte de los adoquines, pegacore, sello de juntas y cortes a máquina, y todo lo necesario para su correcta instalacion.	ml	352,00	$ 68.306
OE53	Suministro, transporte e instalación de poste metálico para banderas, Incluye poste según diseño con cambio de diámetros de 4"x 2m, de 3"x 2m y 2"x2m, total altura de 6m, construcción de pedestal en concreto de 3000 PSI, bandera, y todo lo necesario para su correcta instalación.	unidad	4,00	$ 3.808.866

3. JUSTIFICACIÓN DE OBRAS EXTRA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN DE CANTIDADES MAYORES O MENORES Y OBRAS EXTRA
1	PRELIMINARES	
OE27	Suministro e instalación de bajante en tubería metálica galvanizada tipo IMC Ø2" incluye fijación con zunchos y evillas	NECESARIO PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LOS CABLES QUE ALIMENTAN EL ALUMBRADO PUBLICO DESDE EL GABINETE DEL POSTE HASTA EL SUELO
OE28	Suministro e instalación de varilla copperweld Ø 5/8" para puesta a tierra y conexión, incluye excavación y lleno	NECESARIAS PARA LA RED ELÉCTRICA QUE ALIMENTAN LAS LUMINARIAS PORQUE PERMITE UNA ADECUADA DIFUSIÓN DE LAS CORRIENTES QUE SE PUEDAN PRESENTAR.
OE29	Empalme en punto de conexión a alumbrado público, incluye ponchadora hidráulica, instalación de conectores y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	ACTIVIDAD NECESARIA PARA EMPALMAR DESDE LA RED DEL TRANSFORMADOR AL CONTROL QUE DISTRIBUYE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL PARQUE
OE30	Suministro transporte e instalación de acometida eléctrica Cable 2No6 (F) + 1No8 (T) AWG Cu THWN-75°C - Acometida luminarias	RED QUE VA DESDE EL CONTROL DEL POSTE HASTA LA PRIMERA CAJA DEL PARQUE

OE31	Suministro transporte e instalación de acometida eléctrica Cable 4No8 (F) + AWG Cu THWN-75°C - Energía comerciantes, contador 1 y contador 2	REDES ELÉCTRICAS PRIVADAS QUE SE REEMPLAZARON POR ESTAR EN MALAS CONDICIONES
OE32	Suministro transporte e instalación de acometida eléctrica Cable 3No4 (F) + 1N6 (T) AWG Cu THWN-75°C - Gabinete 1 (alcaldía)	RED ELÉCTRICA NECESARIA PARA LA INSTALACIÓN DEL GABINETE QUE SE ENCARGA DEL CONTROL Y ALIMENTACIÓN DE LA FUENTE Y EVENTOS
OE33	Suministro transporte e instalación de acometida eléctrica Cable 3No2 (F) + 1N4 (T) AWG Cu THWN-75°C - Gabinete 2 (poste)	RED ELÉCTRICA NECESARIA PARA EL GABINETE N 2 PARA ALIMENTACIÓN PRIVADA ANTE UN EVENTO PRIVADO
OE34	Restauración de gabinetes, incluye desmontaje de elementos y reinstalación de elementos en buen estado y la instalación de los elementos necesarios que están en mal estado, incluye montaje y desmontaje del mismo	ESTA ACTIVIDAD FUE NECESARIA PARA INSTALAR LOS GABINETES QUE ESTABAN EN EL PARQUE ANTERIORMENTE
OE35	Provisionales: Instalación tubería cruce de vía, para instalación de acometida de maquinaria a 220V y 2 visitas técnicas para evaluación y reparación de acometida de privada de comerciantes (220V)	ACTIVIDADES NECESARIAS PARA ALIMENTAR CON ENERGÍA A LOS COMERCIANTES MIENTRAS SE REEMPLAZABAN LA TUBERÍA Y LA RED EXISTENTE
OE36	Desmontaje, desensamble, limpieza, ensamble y montaje de control luminarias	ACTIVIDAD REQUERIDA PARA RECOGER TODOS LOS COMPONENTES DEL CONTROL DE LA LUMINARIA
OE37	Instalación de protecciones breaker 40A	REEMPLAZO DE LOS BREAKER ANTIGUOS DE LOS CONTADORES DE LOS COMERCIANTES
OE38	Instalación de postes en fibra de vidrio altura total 8m, para instalación de reflectores, incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	ACTIVIDAD NECESARIA PARA COMPLEMENTAR LA ILUMINACIÓN DEL PARQUE
OE39	Suministro, transporte e instalación de caja y totalizador acometida gabinete, incluye desmontaje, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	ACTIVIDAD REQUERIDA PARA GARANTIZAR EL EMPALME Y EL CONTROL DE LAS LUMINARIAS
OE40	Suministro, transporte e instalación de luminaria decorativa tipo exterior LUMINARIA MINI POLE, fabricada en lamina de acero cold rolled cal 18, altura de 750mm, acabado en color negro, conjunto óptico en lamina de acero cold rolled, difusor en acrílico opal mate.	SE REALIZO ESTE CAMBIO PORQUE ESTAS LUMINARIAS SE UBICAN A LO LARGO DEL CORDÓN DE LA CARRERA 31, LAS CUALES POR SU DISEÑO ALUMBRAN SOLO EL INTERIOR DEL PARQUE, LO QUE GARANTIZA QUE LOS VEHÍCULOS QUE CRUCEN NO SE VEAN AFECTADOS POR LAS LUCES
OE41	Enchape EN ADOQUÍN RECTANGULAR EN ARCILLA DE 12x24x6cm tipo Santafé con piezas completas. Incluye suministro y transporte de los adoquines, pegadora, sello de juntas y cortes a máquina, y todo lo necesario para su correcta instalación.	ESTA ACTIVIDAD SE SEPARO DEL ÍTEM 7,3 POR LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROCESO CONSTRUCTIVO DIFERENTE DEBIDO A QUE LA INSTALACIÓN DEL ADOQUÍN ES CON PIEZA COMPLETA

OE42	Suministro, transporte e instalación de protección metálica en platina de 1"x3/16" metálico para luminaria tipo Antorcha, Incluye anclajes y todo lo necesario para su correcta instalación.	ESTA ACTIVIDAD OBEDECE A LA NECESIDAD DE DAR PROTECCIÓN Y ASEGURAR LAS LUMINARIAS TIPO ANTORCHA Y EVITAR QUE LAS DESPRENDAN CON FACILIDAD
OE43	Hidrofugada y lavada de toda las superficies instaladas con adoquín tipo Santafé, Incluye utilización de hipoclorito, acido nítrico, hidrofugo, y detergentes para su correcta limpieza.	ACTIVIDAD REQUERIDA PARA BRINDAR IMPERMEABILIZACIÓN Y PROTEGER EL ADOQUÍN DE LA HUMEDAD Y AGENTES QUE ESTA GENERA
OE44	Marcación con pintura espesor 10 a 12cm para demarcación de zona de comerciantes, Incluye levantamiento, marcación con cinta y aplicación de pintura y todo lo necesario para su correcta marcación.	ESTA ACTIVIDAD FUE REQUERÍA EN EL PROCESO DE REUBICACIÓN DE LOS VENTEROS ESTACIONARIOS EN EL QUE SE REALIZARON DEMARCACIONES PARA SU ORDEN Y NUMERACIÓN
OE45	Enchape EN ADOQUÍN RECTANGULAR EN ARCILLA DE 12x24x6cm tipo Santafé, en zonas donde su altura es menor a 30cm, como bordillos y demás elementos . Incluye suministro y transporte de los adoquines, pegacore, sello de juntas y cortes a máquina, y todo lo necesario para su correcta instalación.	ESTA ACTIVIDAD SE SEPARO DEL ÍTEM 7,3 POR DEBIDO A QUE EL PROCESO DE INSTALACIÓN EL COMPLEJO POR LOS CORTES IRREGULARES, VARIACIÓN EN LAS MEDIDAS DE LAS CHAPAS DE ADOQUÍN
OE46	Construcción de PISO EN ADOQUÍN RECTANGULAR PARA TRAFICO VEHICULAR EN ARCILLA DE 10x20x8cm tipo Santafé, estampillado, de Color OSCURO. Incluye suministro y transporte de los adoquines, pegacore capa gruesa para tráfico vehicular, sello de juntas y cortes a máquina, compactación y todo lo necesario para su correcta instalación.	ESTA ACTIVIDAD FUE NECESARIA DEBIDO A QUE EL ADOQUÍN DE TRAFICO VEHICULAR ES DE UN TAMAÑO DIFERENTE CON EL FIN DE RESISTIR CARGAS PESADAS Y POR EL TIPO DE PROCESO QUE CONLLEVA EL ADOQUÍN OSCURO LO QUE LO HACE MAS COSTOSO
OE47	Construcción de PISO EN ADOQUÍN RECTANGULAR PARA TRAFICO VEHICULAR EN ARCILLA DE 10x20x8cm tipo Santafé, estampillado, de Color CLARO. Incluye suministro y transporte de los adoquines, pegacore capa gruesa para tráfico vehicular, sello de juntas y cortes a máquina, compactación y todo lo necesario para su correcta instalación.	ESTA ACTIVIDAD FUE NECESARIA DEBIDO A QUE EL ADOQUÍN DE TRAFICO VEHICULAR ES DE UN TAMAÑO DIFERENTE CON EL FIN DE RESISTIR CARGAS PESADAS
OE48	Aplicación de acelerante para concreto de 3000 PSI de placas para zona vehicular frente a la iglesia, acelerante a 3 días, correspondiente al 2,5 al 3% del peso del cemento, para lograr una resistencia equivalente al 70 a 80% en los 3 días después de su vaciado, Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. (Se cobrará por la relación utilizada en cada m3 de concreto)	ÍTEM REQUERIDO PARA ACELERAR LA RESISTENCIA DEL CONCRETO DE LAS PLACAS, CON EL FIN DE DAR ACCESO VEHICULAR A LOS 3 DÍAS
OE49	Restauración de Bolardos metálicos existentes, Incluye restauración de bolardos, reinstalación y todo lo necesario para su correcta instalación.	ESTA ACTIVIDAD SE DA PARA EL APROVECHAMIENTO Y UTILIDAD DE LOS BOLARDOS RETIRADOS QUE SE ENCONTRABAN DENTRO DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN DEL PARQUE

OE50	Instalación de cadena galvanizada calibre 3/8" para limitación de paso peatonal, en bolardos metálicos, incluye anclajes y todo lo necesario para su correcta instalación.	ESTE ÍTEM ES PARA DELIMITAR LA ZONA PEATONAL CON LA VEHICULAR Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LO PEATONES Y LOS COMERCIANTES
OE51	Suministro transporte e instalación de maletines y/o barricadas, para control de tráfico vehicular y peatonal, Incluye constantes movimientos según requerimientos, almacenamiento temporal y todo lo necesario para su instalación.	ESTA ACTIVIDAD FUE NECESARIA PARA GARANTIZAR EL CERRAMIENTO EN LA INTERVENCIÓN DEL ÁREA FRENTE A LA IGLESIA
OE52	Enchape EN ADOQUÍN RECTANGULAR EN ARCILLA DE 12x24x6cm tipo Santafé color OSCURO con piezas completas. Incluye suministro y transporte de los adoquines, pegacore, sello de juntas y cortes a máquina, y todo lo necesario para su correcta instalación.	ESTE ÍTEM SE SEPARO DEL ÍTEM OE6 POR QUE SU PROCESO DE INSTALACIÓN FUE DIFERENTE DEBIDO A LOS MATERIALES UTILIZADOS COMO PEGADOR PARA ESTAMPILLAR SOBRE EL CORDÓN PERIMETRAL Y LOS BORDES DE LOS ALCORQUES
OE53	Suministro, transporte e instalación de poste metálico para banderas, Incluye poste según diseño con cambio de diámetros de 4"x 2m, de 3"x 2m y 2"x2m, total altura de 6m, construcción de pedestal en concreto de 3000 PSI, bandera, y todo lo necesario para su correcta instalación.	ESTA ACTIVIDAD FUE NECESARIA POR EL REMPLAZO DE LAS ANTERIORES ASTA Y BANDERAS QUE FUERON RETIRADAS POR LA INTERVENCIÓN DEL PARQUE.

4. RESUMEN FINAL DEL CAMBIO DE OBRA Y CONCILIACIÓN DE OBRAS EXTRAS

TOTAL, COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL		**$ 2.537.325.524**
ADMINISTRACIÓN	**21.80%**	**$ 553.136.964**
UTILIDAD	**4.00%**	**$ 101.493.021**
PMA		**$ 60.270.100**
PMT		**$ 48.216.080**
COSTO TOTAL		**$ 3.300.441.689**
DIFERENCIAS PRESUPUESTALES		**$ 0**

VALOR TOTAL QUE SE APRUEBA Y CONCILIA: TRES MIL TRESCIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ML ($3.300.441.689); el cual no se requiere de adición.
Las partes dejan constancia de lo siguiente:

1. Mediante la presente acta de conciliación de cambios de obra No.2, NO se presenta alteración del balance financiero del contrato de obra.
2. El objeto del contrato se mantiene indemne y no cambian las obligaciones ni clausulas fundamentales del mismo.
3. Las condiciones técnicas, especificaciones, garantías y demás obligaciones del contratista no se modifican y continúan indemnes.
4. Los precios extras se refieren a actividades que surgieron a partir de necesidades adicionales, valoradas por el CONTRATISTA DE OBRA, INTERVENTORÍA, SUPERVISIÓN y ADMINISTRACIÓN DELEGADA y las demás partes que aquí intervienen, dichas actividades fueron requeridas para desarrollar a completa cabalidad el objeto contractual.
5. Para que proceda el reconocimiento y pago de mayores cantidades de obra u obras extra es necesario que estas hayan sido previamente autorizadas por la supervisión del municipio.
6. Las propuestas de EL CONTRATISTA fueron revisadas por LA SUPERVISIÓN, y aprobadas. La presente acta de conciliación hace parte integral del contrato.
7. **Se anexan:** APU's de obra extra aprobados por la INTERVENTORÍA y Archivo Excel del balance presupuestal completo con los cambios de obra y balance final aprobado por las partes.

Para constancia se firma, el día siete (7) de julio de 2023

SEBASTIAN SIERRA JIMENEZ
Representante legal - CONTARTISTA
LUXURY INGENIEROS S.A.S

JOHN DAIRO GUERRERO ORDUZ
Representante legal - INTERVENTORIA
CONINCIVIL S.A.S

JOANA ANDREA OROZCO BUILES
Directora de Planeación e Infraestructura
Empresa de desarrollo sostenible de
Marinilla "SUMAR"

YEISON SEBASTIAN GRISALES MONTOYA
Secretario de Obras Publicas
Municipio de Marinilla

Municipio de Marinilla

Nuestro Compromiso ¡Eres tú!

Empresa de Desarrollo Sostenible de Marinilla sumar

LUXURY INGENIEROS

Coninci VIL

ACTA DE CANTIDADES MAYORES Y MENORES - CONCILIACION DE CAMBIO DE OBRA No. 2	
CONTRATO:	COIP-014-2022 RENOVACIÓN URBANISTICA DEL PARQUE PPAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA, ANT
CONTRATANTE:	CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE MARINILLA "SUMAR"
CONTRATISTA DE OBRA:	LUXURY INGENIEROS S.A.S
VALOR CONTRATO DE OBRA:	TRES MIL TRESCIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MLC ($3.300.441.689)
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONINCIVIL CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CIVIL S.A.S.
VALOR CONTRATO INTERVENTORIA	DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS ML ($ 225.611.850)
FECHA DE TERMINACION:	25 DE JULIO DE 2023

CONDICIONES ACTA DE CAMBIO N°1						CANTIDADES MAYORES Y MENORES		CANTIDADES PROYECTADAS	
						MENORES CANTIDADES	MAYORES CANTIDADES		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	V/UNIT	SUB-TOTAL	CANT (-)	CANT (+)	CANT	SUB-TOTAL
1	**PRELIMINARES**				**$ 41.826.351,00**				**$ 29.989.309,00**
1,1	Comision de topografia con equipos de precision	dia	**21,00**	$ 589.306,00	$ 12.375.426,00	2,00	0,00	19,00	$ 11.196.814,00
1,2	Cerramiento provisional en tela traslucida, incluye malla electrosoldada, postes en madera con base en concreto y platinas ancladas al piso y todo lo demas necesario para su correcta instalacion.	ml	**525,00**	$ 56.097,00	$ 29.450.925,00	190,00	0,00	335,00	$ 18.792.495,00
2	**RETIROS Y DEMOLICIONES**				**$ 181.889.200,04**				**$ 181.550.279,04**
2,1	DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m2	**879,11**	$ 43.118,00	$ 37.905.464,98	0,00	145,50	1024,61	$ 44.179.133,98
2,2	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO , cargue, transporte y botada de escombros, HASTA ESPESOR DE 4". Incluye compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m2	**1886,50**	$ 35.922,00	$ 67.766.853,00	220,00	0,00	1666,50	$ 59.864.013,00
2,3	DESMONTE de PISO en ADOQUÍN. Incluye recuperación de los materiales; su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría, y todo lo necesario para su correcto desmonte.	m2	**1476,18**	$ 35.567,00	$ 52.503.294,06	0,00	0,00	1476,18	$ 52.503.294,06
2,4	REINSTALACIÓN de PISO en ADOQUÍN. Incluye recuperación de los materiales; su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría; arena de pega, arena de revoque y mano de obra para su reinstalación y todo lo necesario para su correcto desmonte y reinstalación.	m2	0,00	$ 56.030,00	$ 0,00	0,00	15,00	15,00	$ 840.450,00
2,5	RETIRO DE BANCAS INDIVIDUALES PREFABRICADAS EN CONCRETO . Incluye recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría, cargue, transporte y botada de los escombros generados en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría.	un	**29,00**	$ 65.600,00	$ 1.902.400,00	0,00	0,00	29,00	$ 1.902.400,00
2,6	DESMONTE Y RETIRO DE CORDONES en concreto. MANUAL O MECÁNICO. Incluye: cargue, transporte y botada de escombros, retiro de refuerzo e instalaciones embebidas. Además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m	**475,78**	$ 36.148,00	$ 17.198.495,44	0,00	0,00	475,78	$ 17.198.495,44

2,7	DESMONTE Y RETIRO DE BOLARDOS en cualquier material. Incluye: Cargue, transporte y botada de escombros, o su almacenamiento, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	un	**11,00**	$ 33.973,00	$ 373.703,00	0,00	0,00	11,00	$ 373.703,00
2,8	RETIRO DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO con su respectivo brazo, incluye retiro, personal certificado de trabajo en alturas, escalera, elementos de protección y demás necesario para la correcta desinstalación y disposición donde indique la Interventoría	un	**12,00**	$ 58.930,00	$ 707.160,00	0,00	0,00	12,00	$ 707.160,00
2,9	Corte a maquina de pavimento hasta 3"	m	**245,11**	$ 8.996,00	$ 2.205.009,56	0,00	50,00	295,11	$ 2.654.809,56
2,10	Rotura de manholle existente para empalme de de tuberia Novafort o similar de carcamo, Incluye enboquillada en concreto de 21Mpa.	un	**2,00**	$ 663.410,00	$ 1.326.820,00	0,00	0,00	2,00	$ 1.326.820,00
3	**EXCAVACIONES Y LLENOS ESTRUCTURA**				**$ 382.284.177,88**				**$ 349.764.613,60**
3,1	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoria y su medida será en el sitio. No incluye entibado.	m3	**1246,90**	$ 68.205,00	$ 85.044.814,50	0,00	19,80	1266,70	$ 86.395.273,50
3,2	LLENOS EN ARENILLA O LIMO, compactados mecánicamente. Incluye el suministro, transporte, colocación del material, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado.	m3	1376,11354608	$ 96.460,20	$ 132.740.187,88	85,0981677417	0,00	1291,0153783	$ 124.531.602
3,3	Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado.	m3	821,90	$ 200.145,00	$ 164.499.175,50	134,20	0,00	687,70	$ 137.639.716,50
3,4	Suministro, transporte e instalacion de afirmado, Incluye riego y compactacion.	m3	0,00	$ 171.146,00	$ 0,00	0,00	7,00	7,00	$ 1.198.022,00
4	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				**$ 326.173.634,07**				**$ 300.731.743,34**
4,1	Construcción de MUROS TIPO BANCA en concreto de 21 Mpa. a la vista. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta de primera calidad en súper T de 18 mm., incluye suministro y transporte de los materiales, aristas biseladas, desmoldante, vibrado, protección y curado para estructuras y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento, de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos, No incluye refuerzo. Según diseño.	m3	57,63	$ 1.123.294,00	$ 64.735.433,22	0,00	0,00	57,63	$ 64.735.433,22
4,2	Construccion de estructuras en concreto de 3000PSI, como Alcorques, pompeyanos, tarima, estructuras de apoyo y demas, Incluye formaleteria en super T 18mm, vibrado curacion y todo lo necesario para su correcta construccion.	m3	151,97	$ 1.120.376,00	$ 170.261.594,85	26,80	0,00	125,17	$ 140.237.463,92
4,3	Gradas en concreto de f'c=3000 psi según diseño, incluye suministro y transporte de los materiales, aristas biseladas, desmoldante, vibrado, protección y curado para estructuras y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento, de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos, No incluye refuerzo. Según diseño.	ml	166,00	$ 323.395,00	$ 53.683.570,00	0,00	0,00	166,00	$ 53.683.570,00
4,4	Escalinatas en concreto de f'c=3000 psi según diseño, incluye suministro y transporte de los materiales, aristas biseladas, desmoldante, vibrado, protección y curado para estructuras y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento, de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos, No incluye refuerzo. Según diseño.	ml	60,00	$ 286.390,00	$ 17.183.400,00	0,00	16,00	76,00	$ 21.765.640,00
4,5	Construccion de Carcamo en concreto de 3000psi según diseño, para recoleccion de aguas lluvias de la plaza seccion interna 0.25Mx 0,70M libres espesor 15cm	ml	0,00	$ 623.593,00	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
4,6	Suministro, transporte e impermeabilización para superficies enterradas, con aditivo tipo igol denso o similar, dos manos con una dosificación de 1kg/m2 cada mano, se debe imprimar previamente la superficie con igol imprimante o equivalente, una mano con una dosificación de 200 gr/m2. Incluye todo lo necesario para su correcta aplicación según recomendaciones del proveedor del insumo.	m2	415,67	$ 48.860,00	$ 20.309.636,20	0,00	0,00	415,67	$ 20.309.636,20
5	**ACERO REFUERZO**				**$ 178.940.000,00**				**$ 149.309.772,75**
5,1	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	kg	20000,00	$ 8.947,00	$ 178.940.000,00	3311,75	0,00	16688,25	$ 149.309.772,75
6	**OBRAS DE DRENAJE**				**$ 131.109.042,00**				**$ 123.149.931,00**

6,1	Suministro, transporte e instalacion de tuberia NOVAFORT 30".	m	89,00	$ 1.060.677,00	$ 94.400.253,00	0,00	0,00	89,00	$ 94.400.253,00
6,2	Suministro, transporte e instalacion de tuberia NOVAFORT 16".	m	74,00	$ 310.593,00	$ 22.983.882,00	13,00	0,00	61,00	$ 18.946.173,00
6,3	Construcción de SUMIDERO DE CAPTACION LATERAL medidas 1,60*0,80m, en concreto de 3000PSI. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, reja metálica, formaleta, vibrado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento, según diseño y especificaciones de E.P.M. La excavación, llenos y entresuelo se pagarán en su ítem respectivo.	un	7,00	$ 1.960.701,00	$ 13.724.907,00	2,00	0,00	5,00	$ 9.803.505,00
6,4	Construccion de cajas de registro para carcamos de 80x80 en acabado de adoquin según diseño.	und	0,00	$ 840.223,00	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
6,5	Construccion de MH completo, en concreto de 3000 PSI, de 1,20m de diametro. Incluye cañuela, mesa, cilindro de 1,20m de diametro h promedio 1,5, cono cilíndrico, tapa, herraje, ganchos y todo lo necesario para su correcta construccion.	un	0,00	$ 4.145.856,00	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
7	**ADOQUIN EN ARCILLA**				**$ 484.049.512,40**				**$ 403.941.214,68**
7,1	Construcción de PISO EN ADOQUÍN RECTANGULAR EN ARCILLA DE 12x24x6cm tipo santafe. Incluye suministro y transporte de los adoquines, cama de asiento de 5 cm en arena, sello de juntas y cortes a máquina, compactacion y todo lo necesario para su correcta instalacion.	m2	2510,00	$ 163.512,00	$ 410.415.120,00	177,00	0,00	2333,00	$ 381.473.496,00
7,2	Colocación de ADOQUÍN TÁCTIL GUÍA O ALERTA 20 x 20 x 6. Color amarillo. Para un ancho de 0,20 m. Incluye suministro y transporte de los adoquines, perfilación, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, mortero 1:3 para la instalación, corte de piezas, arena de sello y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.	m	305,00	$ 35.518,00	$ 10.832.990,00	305,00	0,00	0,00	$ 0,00
7,3	Enchapes de muros, escalas, bancas y demas elementos con chapas de arcilla y/o material similar. Incluye mortero o pegacore y todo lo necesario para su correcta instalacion.	m2	443,40	$ 141.636,00	$ 62.801.402,40	284,77	0,00	158,63	$ 22.467.718,68
8	**CORDONERIA**				**$ 6.739.620,00**				**$ 6.739.620,00**
8,1	Suministro, transporte y colocación de cordón prefabricado de 0.15 x 0.35 x 0.80 m. de concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas ranuradas. Incluye excavación, conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero 1:4 de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño.	m	0,00	$ 98.905,00	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
8,2	Construccion de cordon vaceado en concreto de 3000 psi para adecuaciones electricas, medidas del cordon existente 15x40 Aproximados.	ml	60,00	$ 112.327,00	$ 6.739.620,00	0,00	0,00	60,00	$ 6.739.620,00
9	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**$ 115.879.456,00**				**$ 99.557.519,00**
9,1	Suministro, transporte e instalsción de canalización en tuberia conduit tipo DB D=2"	m	430,00	$ 65.229,00	$ 28.048.470,00	0,00	20,00	450,00	$ 29.353.050,00
9,2	Suministro transporte e instalacion de acometida en tuberia PVC de 1/2", con cableado 3N°14, Incluye todo lo necesario para su correcta instalacio.	m	330,00	$ 41.118,00	$ 13.568.940,00	30,00	0,00	300,00	$ 12.335.400,00
9,3	Suministro, transporte e instalsción de Acometida electrica 2No 8 (F) + 1No 10 (T) AWG Cu THWN-75°C	m	639,00	$ 37.592,00	$ 24.021.288,00	311,00	0,00	328,00	$ 12.330.176,00
9,4	Suministro, transporte e instalación de cable Encauchetado 3x14 AWG.	m	350,00	$ 27.434,00	$ 9.601.900,00	0,00	20,00	370,00	$ 10.150.580,00
9,5	Suministratro, transporte e instalación cajas de empalme de 50*50 de concreto con herraje metálico y tapa enchapada en chapa de arcilla Incluye todo lo necesario para su correcta construccion.	un	55,00	$ 629.343,00	$ 34.613.865,00	9,00	0,00	46,00	$ 28.949.778,00
9,6	Suministro, transporte e instalación de salida para tomacorriente a 110v, 3N°12. Incluye caja 4""4" galvanizada y demás elementos necesarios para su correcta instalación	un	37,00	$ 117.485,00	$ 4.346.945,00	0,00	6,00	43,00	$ 5.051.855,00
9,7	Suministro, transporte e instalación de salida para tomacorriente a 220v, 3N°10. Incluye caja 4""4" galvanizada y demás elementos necesarios para su correcta instalación	un	6,00	$ 182.552,00	$ 1.095.312,00	0,00	0,00	6,00	$ 1.095.312,00
9,8	suministro, transporte e instalación de Gabinete tipo intemperie IP 65, incluye breaker de 2x40A	un	2,00	$ 291.368,00	$ 582.736,00	1,00	0,00	1,00	$ 291.368,00

10	**LUMINARIAS**				**$ 69.716.579,00**				**$ 65.193.174,00**
10,1	Suministro, transporte e hincada de poste de alumbrado público tipo Carabobo de 5m. Incluye pintura de acuerdo a normas EPM.	un	0,00	$ 1.343.230,00	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
10,2	Suministro, Transporte E Instalación De Brazo Metalico Sencillo Galvanizado Tipo Cara Bobo Para Lamparas Instalado En Poste De Concreto Y Demás Accesorias Para Su Correcta Instalación	un	0,00	$ 578.399,00	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
10,3	Suministro transporte e instalación de luminaria marca silvania de alumbrado publico de 60 vatios, incluye fotocelda.	un	0,00	$ 1.444.692,00	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
10,4	Suministro, transporte e instalación de luminaria decorativa tipo exterior LUMINARIA ANTORCHA MINI 40W 100-240V 6600LM 113,8LM/W de un 1,02m de altura, Incluye: elementos de fijación, conectores de conexion y empalme.	un	23,00	$ 1.100.074,00	$ 25.301.702,00	9,00	0,00	14,00	$ 15.401.036,00
10,5	Suministro, transporte e instalación de luminaria decorativa tipo exterior LYRA LED 35W 100-277V 3500LM 100LM/W, Incluye: poste metalico redondo (h:3,5m) con base cuadrada, elementos de fijación, conectores de conexion y empalme.	un	16,00	$ 1.820.319,00	$ 29.125.104,00	0,00	2,00	18,00	$ 32.765.742,00
10,6	Bala de piso de 9 Vatios, Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion.	un	21,00	$ 248.089,00	$ 5.209.869,00	0,00	7,00	28,00	$ 6.946.492,00
10,7	Certificacion RETIE	un	1,00	$ 10.079.904,00	$ 10.079.904,00	0,00	0,00	1,00	$ 10.079.904,00
11	**OTROS**				**$ 32.332.581,00**				**$ 14.692.770,00**
11,1	Suministro, transporte e instalación de tierra abonada	m3	120,00	$ 83.021,00	$ 9.962.520,00	0,00	0,00	120,00	$ 9.962.520,00
11,2	Suministro, transporte y siembra de especies Arboreas (Lafoensia acuminata, Handrohanthus chrysanthus, Crotón magdalenensis, Quercus humbollii , Marianis nobilis o similares)	und	0,00	$ 485.551,00	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
11,3	Suministro, transporte e instalacion de grama Macana.	m2	250,00	$ 18.921,00	$ 4.730.250,00	0,00	0,00	250,00	$ 4.730.250,00
11,4	Suministro e instalación de marcas viales con material plástico en frío con resistencia al deslizamiento (flechas direccionales, flechas de fin de carril, textos, pares, triángulos ceda el paso, diamantes ceda el paso, textos de zona, pictograma de zona escolar entre otros). Incluye alúmina antideslizante	m2	211,00	$ 83.601,00	$ 17.639.811,00	211,00	0,00	0,00	$ 0,00
OBRAS EXTRA					$ 586.385.370,46				$ 812.705.577,44
OE1	Construcción Rampas y losas en concreto de 3000 PSI para el acceso y salida vehiculos en via principal, sika dur aplicado en los bordes y accelerante, Incluye formaleteria y todo lo necesario para su correcta construccion. Expesor minimo de 15cm	m2	97,12	$ 196.775,00	$ 19.110.788,00	0,00	0,00	97,12	$ 19.110.788,00
OE2	Entibado de brechas, con madera incluye todo lo necesario para su correcta instalacion, sera medido efectivamente el entibado por m2, descontando la superficie que no este entibada en las brechas.	m2	155,75	$ 118.008,00	$ 18.379.746,00	0,00	0,00	155,75	$ 18.379.746,00
OE3	Cama en triturado para cimentacio de tuberias, incluye todo lo necesario para su correcta instalacion.	m3	76,03	$ 212.308,00	$ 16.141.777,24	10,94	0,00	65,09	$ 13.819.127,72
OE4	Instalacion de plastico para aislamiento de estructuras de concreto con la superficie del terreno, incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	m2	652,50	$ 6.041,00	$ 3.941.752,50	80,00	0,00	572,50	$ 3.456.472,50
OE5	Construccion de cordon vaceado en obra en concreto de 3000 PSI, de medidas aproximadas 0,12x0,25m, incluye formaleteria en madera , y todo lo necesario para su correcta construccion.	ml	260,00	$ 84.326,00	$ 21.924.760,00	46,00	0,00	214,00	$ 18.045.764,00
OE6	Construcción de PISO EN ADOQUÍN RECTANGULAR EN ARCILLA DE 12x24x6cm tipo santafe, de Color OSCURO para modulacion de cuadricula segun diseño. Incluye suministro y transporte de los adoquines, mortero 1:3, sello de juntas y cortes a máquina, compactacion y todo lo necesario para su correcta instalacion.	m2	400,00	$ 193.020,00	$ 77.208.000,00	195,00	0,00	205,00	$ 39.569.100,00

OE7	Instalacion de tableros electricos a la intemperie trifasicos 12 circuitos fijo y movil a 110 y 220, para todos los requerimientos de equipos electricos en el proyecto, Incluye instalacion de reflectores y todo lo necesario para su correcta instalacion.	Global	1,00	$ 3.624.597,00	$ 3.624.597,00	0,00	0,00	1,00	$ 3.624.597,00
OE8	Construccion de MH completo, en concreto de 3000 PSI, de 1,50m de diametro, Incluye cañuela, mesa, cilindro de 1,50m de diametro h promedio 2.8m, cono cilindrico, tapa cuadrada, herraje, ganchos y todo lo necesario para su correcta construccion.	unidad	3,00	$ 6.924.905,00	$ 20.774.715,00	0,00	0,00	3,00	$ 20.774.715,00
OE9	Movimiento de materas en concreto y llevada a puntos donde indique municipio de Marinilla, Incluye cargue y transporte de materas.	unidad	10,00	$ 60.408,00	$ 604.080,00	0,00	0,00	10,00	$ 604.080,00
OE10	Desmonte de plantas existentes en el area a intervenir, incluye desinstalacion, disposicion final según requerimientos del municipio de Marinilla.	unidad	60,00	$ 10.123,00	$ 607.380,00	0,00	0,00	60,00	$ 607.380,00
OE11	Construccion de Carcamo tipo alcancia en concreto de 3000psi según diseño, para recoleccion de aguas lluvias de la plaza seccion interna 0.40Mx 0,40M libres espesor 15cm, Incluye todo lo necesario para su correcta construccion.	ml	153,00	$ 575.208,00	$ 88.006.824,00	20,00	0,00	133,00	$ 76.502.664,00
OE12	Instalacion de anclajes con epoxico sicadur o similar, incluye perforacion con taladro, aplicación de epoxico, y todo lo necesario para su correcta construccion.	und	1742,00	$ 12.771,00	$ 22.247.082,00	300,00	0,00	1442,00	$ 18.415.782,00
OE13	Bolardo en hierro Modular tipo: Finsa o similar Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	unidad	6,00	$ 467.685,00	$ 2.806.110,00	0,00	4,00	10,00	$ 4.676.850,00
OE14	Bolardo en concreto tipo Klinden o similar : Konkretus medidas 0,25m x 0,50m x 0,25m, peso 65kg.incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	unidad	21,00	$ 757.133,00	$ 15.899.793,00	0,00	7,00	28,00	$ 21.199.724,00
OE15	Basurera Pivotante sencilla única, tipo: SOCODA o similar, basurera en acero inoxidable para ambientes externos, capacidad 60 litros incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	unidad	15,00	$ 1.914.803,00	$ 28.722.045,00	5,00	0,00	10,00	$ 19.148.030,00
OE16	Suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica en caliente para reparcheo. Compactada con medios mecánicos según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye malla blaxia y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. La excavación, la base, la emulsión asfáltica se pagan por su respectivo ítem.	m3	34,80	$ 1.942.470,00	$ 67.597.956,00	7,80	0,00	27,00	$ 52.446.690,00
OE17	Suministro, transporte y colocación de emulsión asfáltica para imprimación de superficie a pavimentar y para las zonas de adoquin vehicular según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.	m2	150,00	$ 8.018,00	$ 1.202.700,00	0,00	60,00	210,00	$ 1.683.780,00
OE18	Suministro transporte e instalacion de Lamina depoliestireno para aislamiento de estructuras de contencion en concreto, incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	m2	29,85	$ 17.382,00	$ 519.151,20	0,00	0,00	29,85	$ 519.151,20
OE19	Suministro, transporte e instalacion de Tuberia presion RDE de 3" para red de incendios "Hidrantes" incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	ml	37,00	$ 119.713,00	$ 4.429.381,00	0,00	0,00	37,00	$ 4.429.381,00
OE20	Suministro, transporte e instalacion de Hidrantes de 3" para red de incendios.	unidad	2,00	$ 4.546.621,00	$ 9.093.242,00	0,00	0,00	2,00	$ 9.093.242,00
OE21	Suministro, transporte e instalacion de tuberia RDE de 1/2", incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	ml	60,00	$ 16.283,00	$ 977.580,00	0,00	10,00	70,00	$ 1.140.510,00
OE22	Suministro, transporte e instalación de canalización en tubería conduit tipo DB D=1" incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	ml	160,00	$ 13.692,00	$ 2.190.720,00	60,00	0,00	100,00	$ 1.369.200,00
OE23	Nivelacion Manual de estructura en Base granular para garantizar niveles de proyecto y asi lograr una adecuada instalacion de los adoquines, Incluye chequeo de niveles con topografia, correccion con hilos y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	m2	2580,00	$ 6.966,00	$ 17.972.280,00	55,00	0,00	2525	$ 17.589.150,00
OE24	Construccion de cajas de registro para carcamos de 40x60 En concreto de 3000 PSI, en acabado de adoquin según diseño.	unidad	9,00	$ 705.678,00	$ 6.351.102,00	1,00	0,00	8,00	$ 5.645.424,00

OE25	Restauracion de estatuas de parque principal, incluye restauracion de pintura y pulida monumentos y adecuacion de estructuras de soporte.	UND	2,00	$ 7.730.957,00	$ 15.461.914,00	2,00	0,00	0,00	$ 0,00
OE26	Restauración de fuente patrimonial del municipio de Marinilla, incluye desmonte, desarmado, lavado y remoción de platinas y pinturas deterioradas, lavado y remoción de hongos y sales, reparación de fisuras y retallado de partes deterioradas, fundición de partes faltantes, aplicación química de protección del agua y la Imer perité, aplicación de patina en caliente y su cambio de sistema de bombeo, así como la reconstrucción de su estanque en concreto pulido.	Global	1,00	$ 120.589.894,52	$ 120.589.894,52	0,00	0,00	1,00	$ 120.589.894,52
OE27	Suministro e instalación de bajante en tubería metálica galvanizada tipo IMC Ø2" incluye fijacion con zunchos y evillas	ml	0,00	$ 117.452	$ 0,00	0,00	9,00	9,00	$ 1.057.068,00
OE28	Suministro e instalacion de varilla copperweld Ø 5/8" para puesta a tierra y conexión, incluye excavación y lleno	und	0,00	$ 191.533	$ 0,00	0,00	4,00	4,00	$ 766.132,00
OE29	Empalme en punto de conexión a alumbrao publico, incluye ponchadora hidraulica, instalacion de conectores y demas elementos necesarios para su correcta instalacion.	und	0,00	$ 388.307	$ 0,00	0,00	1,00	1,00	$ 388.307,00
OE30	Suministro transporte e instalación de acometida electrica Cable 2No8 (F) + 1No8 (T) AWG Cu THWN-75°C - Acometida luminarias	ml	0,00	$ 38.316	$ 0,00	0,00	66,00	66,00	$ 2.528.856,00
OE31	Suministro transporte e instalación de acometida electrica Cable 4No8 (F) + AWG Cu THWN-75°C - Energia comerciantes, contador 1 y contador 2	ml	0,00	$ 38.915	$ 0,00	0,00	56,00	56,00	$ 2.179.240,00
OE32	Suministro transporte e instalación de acometida electrica Cable 3No4 (F) + 1N8 (T) AWG Cu THWN-75°C - Gabinete 1 (alcaldia)	ml	0,00	$ 79.353	$ 0,00	0,00	125,00	125,00	$ 9.919.125,00
OE33	Suministro transporte e instalación de acometida electrica Cable 3No2 (F) + 1N4 (T) AWG Cu THWN-75°C - Gabinete 2 (poste)	ml	0,00	$ 115.208	$ 0,00	0,00	101,00	101,00	$ 11.636.008,00
OE34	Restauración de gabinetes, incluye desmontage de elementos y reistalacion de elementos en buen estado y la instalacion de los elementos necesarios que estan en mal estado, incluye montage y desmontage del mismo	und	0,00	$ 1.495.853	$ 0,00	0,00	2,00	2,00	$ 2.991.706,00
OE35	Provisionales: instalación tuberia cruce de via, para instalación de acometida de maquinaria a 220V y 2 visitas tecnicas para evaluación y reparación de acometida de privada de comerciantes (220V)	und	0,00	$ 1.182.632	$ 0,00	0,00	1,00	1,00	$ 1.182.632,00
OE36	Desmontaje, desensambre, limpieza, ensamble y montage de control luminarias	und	0,00	$ 417.936	$ 0,00	0,00	1,00	1,00	$ 417.936,00

OE37	Instalación de protecciones breaker 40A	und	0,00	$ 99.451	$ 0,00	0,00	4,00	4,00	$ 397.804,00
OE38	Instalacion de postes en fibra de vidrio altura total 8m, para instalacion de reflectores, incluye todo lo necesario para su correcta instalacion.	unidad	0,00	$ 2.370.375	$ 0,00	0,00	2,00	2,00	$ 4.740.750,00
OE39	Suministro, transporte e instalacion de caja y totalizador acometida gabinete, incluye desmontaje, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalacion.	global	0,00	$ 321.439	$ 0,00	0,00	2,00	2,00	$ 642.878,00
OE40	Suministro, transporte e instalación de luminaria decorativa tipo exterior LUMINARIA MINI POLE, fabricada en lamina de acero cold rolled cal 18, altura de 750mm, acabado en color negro, conjunto optico en lamina de acero cold rolled, difusor en acrilico opal mate.	un	0,00	$ 795.074	$ 0,00	0,00	9,00	9,00	$ 7.155.666,00
OE41	Enchape EN ADOQUÍN RECTANGULAR EN ARCILLA DE 12x24x6cm tipo santafe con piezas completas. Incluye suministro y transporte de los adoquines, pegacore, sello de juntas y cortes a máquina, y todo lo necesario para su correcta instalacion.	m2	0,00	$ 211.607	$ 0,00	0,00	232,80	232,80	$ 49.262.109,60
OE42	Suministro, transporte e instalacion de proteccion metalica en platina de 1"x3/16" metalico para luminaria tipo Antorcha. Incluye anclajes y todo lo necesario para su correcta instalacion.	unidad	0,00	$ 173.223	$ 0,00	0,00	28,00	28,00	$ 4.850.244,00
OE43	Hidrofugada y lavada de toda las superficies instaladas con adoquin tipo Santafe, Incluye utilizacion de hipoclorito, acido nitrico, hidrofugo, y detergentes para su correcta limpieza.	m2	0,00	$ 16.497	$ 0,00	0,00	3012,20	3012,20	$ 49.692.263,40
OE44	Marcacion con pintura espesor 10 a 12cm para demarcacion de zona de comerciantes, Incluye levantamiento, marcacion con cinta y aplicación de pintura y todo lo necesario para su correcta marcacion.	ml	0,00	$ 13.440	$ 0,00	0,00	524,13	524,13	$ 7.044.307,20
OE45	Enchape EN ADOQUÍN RECTANGULAR EN ARCILLA DE 12x24x6cm tipo santafe, en zonas donde su altura es menor a 30cm, como bordillos y demas elementos . Incluye suministro y transporte de los adoquines, pegacore, sello de juntas y cortes a máquina, y todo lo necesario para su correcta instalacion.	ml	0,00	$ 117.797	$ 0,00	0,00	417,90	417,90	$ 49.227.366,30
OE46	Construcción de PISO EN ADOQUÍN RECTANGULAR PARA TRAFICO VEHICULAR EN ARCILLA DE 10x20x8cm tipo santafe, estampillado, de Color OSCURO. Incluye suministro y transporte de los adoquines, pegacore capa gruesa para trafico vehicular, sello de juntas y cortes a máquina, compactacion y todo lo necesario para su correcta instalacion.	m2	0,00	$ 291.210	$ 0,00	0,00	15,60	15,60	$ 4.542.876,00
OE47	Construcción de PISO EN ADOQUÍN RECTANGULAR PARA TRAFICO VEHICULAR EN ARCILLA DE 10x20x8cm tipo santafe, estampillado, de Color CLARO. Incluye suministro y transporte de los adoquines, pegacore capa gruesa para trafico vehicular, sello de juntas y cortes a máquina, compactacion y todo lo necesario para su correcta instalacion.	m2	0,00	$ 245.037	$ 0,00	0,00	182,00	182,00	$ 44.596.734,00
OE48	Aplicación de acelerante para concreto de 3000 PSI de placas para zona vehicular frente a la iglesia, acelerante a 3 dias, correspondiente al 2,5 al 3% del peso del cemento, para lograr una resitencia equivalente al 70 a 80% en los 3 dias despues de su vaceado, Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion. (Se cobrara por la relacion utilizada en cada m3 de concreto)	m3	0,00	$ 172.310	$ 0,00	0,00	47,00	47,00	$ 8.098.570,00
OE49	Restauracion de Bolardos metalicos existentes, Incluye restauracion de bolardos, resinatalcion y todo lo necesario para su correcta instalacion.	unidad	0,00	$ 250.000	$ 0,00	0,00	9,00	9,00	$ 2.250.000,00
OE50	Instalacion de cadena galvanizada calibre 3/8" para limitacion de paso peatonal, en bolardos metalicos, incluye anclajes y todo lo necesario para su correcta instalacion.	ml	0,00	$ 73.879	$ 0,00	0,00	70,00	70,00	$ 5.171.530,00
OE51	Suministro transporte e instalacion de maletines y/o barricadas, para control de trafico vehicular y peatonal, Incluye constantes movimientos según requerimientos, almacenamiento temporal y todo lo necesario para su instalacion.	unidad	0,00	$ 341.435	$ 0,00	0,00	30,00	30,00	$ 10.243.050,00
OE52	Enchape EN ADOQUÍN RECTANGULAR EN ARCILLA DE 12x24x6cm tipo santafe color OSCURO con piezas completas. Incluye suministro y transporte de los adoquines, pegacore, sello de juntas y cortes a máquina, y todo lo necesario para su correcta instalacion.	ml	0,00	$ 68.306	$ 0,00	0,00	352,00	352,00	$ 24.043.712,00
OE53	Suministro, transporte e instalacion de poste metálico para banderas, Incluye poste según diseño con cambio de diámetros de 4"x 2m, de 3"x 2m y 2"x2m, total altura de 6m, construcción de pedestal en concreto de 3000 PSI, bandera, y todo lo necesario para su correcta instalacion.	unidad	0,00	$ 3.808.866	$ 0,00	0,00	4,00	4,00	$ 15.235.464,00

COSTO DIRECTO	$ 2.537.325.524
ADMINISTRACIÓN (21,8%)	$ 553.136.964
UTILIDAD (4%)	$ 101.493.021
TOTAL COSTO DIRECTO +AU	$ 3.191.955.509
PMA	$ 60.270.100
PMT	$ 48.216.080
VALOR TOTAL OBRA	**$ 3.300.441.689**

COSTO DIRECTO	$ 2.537.325.524
ADMINISTRACIÓN (21,8%)	$ 553.136.964
UTILIDAD (4%)	$ 101.493.021
TOTAL COSTO DIRECTO +AU	$ 3.191.955.509
PMA	$ 60.270.100
PMT	$ 48.216.080
VALOR TOTAL PROYECTADO	**$ 3.300.441.689**

Para constancia de la presente acta de pago a continuación firman los que intervinieron en ella.

Elaboro: SAIR ALZATE ZULUAGA
Residente de Obra Contratista

Aprobó: JHON GUERRERO
Representante legal de Interventoria (conincivil)

Elaboro: JORGE RODRIGUEZ
Residente de Interventoria

Aprobó: YEISON SEBASTIAN GRISALES
supervision - Municipio

Aprobó: ALEXANDER SIERRA
Director de Obra Contratista

Vo. Bo: JOANA OROZCO
Supervision SUMAR

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5101238417

PÓLIZA No: 510-47-994000018998 ANEXO: 4

AGENCIA EXPEDIDORA: **RIONEGRO** COD. AGENCIA: 510 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
29	05	2023	29	05	2023

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **LUXURY INGENIEROS SAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.148.673-1**

DIRECCIÓN: CARRERA 52 B 37 05 TORRE 9 APTO 1102 CIUDAD: RIONEGRO, ANTIOQUIA TELÉFONO: 6045312571

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPI** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.453.183-1**

BENEFICIARIO: **EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPI** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.453.183-1**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	19/10/2022	25/07/2024	330,044,168.90
ANTICIPO	19/10/2022	25/07/2023	825,110,422.25
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	19/10/2022	25/07/2026	495,066,253.35
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	VER NOTA ACLARATORIA		330,044,168.90
CALIDAD DEL BIEN	25/07/2023	25/07/2028	330,044,168.90

BENEFICIARIOS
NIT 901453183 - EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPI

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA No. COIP-014-2022 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE 5 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

ASEGURADO/BENEFICIADIO ADICIONAL:
MUNICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ *2,310,309,182.30	$ **********910,108	$*********0.00	$ ******172,921	$ ********1,083,029

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS ORIENTE LTDA	10562	100.00			

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

(415)7701861000019(8020)000000000007000510123841

FIRMA ASEGURADOR **FIRMA TOMADOR**

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CBD920790B0DFB7B5B

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: RIONEGRO COD. AGENCIA: 510 RAMO: 47 No PÓLIZA: **994000018998** ANEXO: 4

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **LUXURY INGENIEROS SAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.148.673-1**

ASEGURADO: **EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPI** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.453.183-1**

BENEFICIARIO: **EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPI** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.453.183-1**

TEXTO ITEM 1

SEGUN OTROSI No. 4, SE ADICIONA AL VALOR DEL CONTRATO LA SUMA DE $536.466.906 PARA UN TOTAL DE $3.300.441.689, Y SE AMPLIA EL PLAZO EN 2 MESES MAS, QUEDANDO COMO FECHA FINAL EL 25/07/2023.

CLIENTE

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5101238433

PÓLIZA No: 510 -74 - 994000004457 ANEXO:6

AGENCIA EXPEDIDORA: **RIONEGRO** COD. AGE: 510 RAMO: 74 PAP:

FECHA DE EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DE LA PÓLIZA	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	HORAS	A LAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	A LAS	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN DIA	MES	AÑO
29	05	2023		25	05	2023	23:59		25	07	2023	23:59		61	29	05	2023

MODALIDAD FACTURACIÓN: **ANUAL** TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO PRORROGA

VIGENCIA DEL ANEXO DIA	MES	AÑO	HORAS	A LAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	A LAS	DIAS
25	05	2023	23:59		25	07	2023	23:59		61

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: **LUXURY INGENIEROS SAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.148.673-1**

DIRECCIÓN: CARRERA 52 B 37 05 TORRE 9 APTO 1102 CIUDAD: RIONEGRO, ANTIOQUIA TELÉFONO: 6045312571

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **LUXURY INGENIEROS SAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.148.673-1**

DIRECCIÓN: CARRERA 52 B 37 05 TORRE 9 APTO 1102 CIUDAD: **RIONEGRO, ANTIOQUIA** TELÉFONO: 6045312571

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: LUXURY INGENIEROS SAS NIT : 901148673

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA CIUDAD: MARINILLA

DIRECCION: DONDE SE EJECUTE

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: ESTATAL MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 464,000,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	464,000,000.00		

DEDUCIBLES: 15.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 3.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS
NIT 901453183 - EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPI
NIT 890983716 - MUNICIPIO DE MARINILLA

Mediante la presente póliza se amparan los perjuicios patrimoniales que cause directamente el asegurado con motivo de una determinada responsabilidad civil extracontractual en que incurra de acuerdo con la ley colombiana en virtud de la ejecucion del CONTRATO DE OBRA No. COIP-014-2022 referente a RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

ASEGURADOS/BENEFICIARIOS ADICIONALES:
EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE MARINILLA "SUMAR"
MUNICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA

SEGUN OTROSI No. 4, SE ADICIONA AL VALOR DEL CONTRATO LA SUMA DE $536.466.906 PARA UN TOTAL DE $3.300.441.689, Y SE AMPLIA EL PLAZO EN 2 MESES MAS, QUEDANDO COMO FECHA FINAL EL 25/07/2023.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***464,000,000.00	$ **********193,863	$*********0.00	$ *******36,834	$ **********230,697

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
AGENCIA DE SEGUROS ORIENTE LTDA	10562	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

(415)7701861000019(8020)000000000007000510123843

FIRMA ASEGURADOR **FIRMA TOMADOR**

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

DAVALENCIA 0

CBD920790B0DFB7B5A CLIENTE

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * **Dirección:** Carrera 13 # 29-21 Oficina 221, Bogotá * **Teléfono:** (601) 458 7174
Fax: (601) 458 7174 * **Celular:** 312 342 6229 * **Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

LISTADO DE ASEGURADOS
POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: **994000004457** ANEXO: 6 TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA

TOMADOR: **LUXURY INGENIEROS SAS** IDENTIFICACION: **901.148.673-1**

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	LUXURY INGENIEROS SAS	901148673-1	DONDE SE EJECUTE	MARINILLA	464,000,000.00	193,863	230,697

PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
193,863	**230,697**

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5101238433

PÓLIZA No: 510 -74 - 994000004457 ANEXO:7

AGENCIA EXPEDIDORA: **RIONEGRO** COD. AGE: 510 RAMO: 74 PAP:

DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO	HORAS		DIA	MES	AÑO	HORAS		DIA	MES	AÑO
30	05	2023	VIGENCIA DE LA PÓLIZA	19	10	2022	23:59		25	07	2023	23:59	279	30	05	2023
FECHA DE EXPEDICIÓN				VIGENCIA DESDE			A LAS		VIGENCIA HASTA			A LAS	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN		

MODALIDAD FACTURACIÓN: **ANUAL** TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO		DIA	MES	AÑO	HORAS		DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS
MODIFICACION	VIGENCIA DEL ANEXO	19	10	2022	23:59		25	07	2023	23:59	279
		VIGENCIA DESDE			A LAS		VIGENCIA HASTA			A LAS	

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: **LUXURY INGENIEROS SAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.148.673-1**

DIRECCIÓN: CARRERA 52 B 37 05 TORRE 9 APTO 1102 CIUDAD: RIONEGRO, ANTIOQUIA TELÉFONO: 6045312571

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **LUXURY INGENIEROS SAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.148.673-1**

DIRECCIÓN: CARRERA 52 B 37 05 TORRE 9 APTO 1102 CIUDAD: **RIONEGRO, ANTIOQUIA** TELÉFONO: 6045312571

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: LUXURY INGENIEROS SAS NIT : 901148673

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA CIUDAD: MARINILLA

DIRECCION: DONDE SE EJECUTE

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: ESTATAL MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 464,000,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	464,000,000.00		

DEDUCIBLES: 15.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 3.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS
NIT 901453183 - EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPI
NIT 890983716 - MUNICIPIO DE MARINILLA

Mediante la presente póliza se amparan los perjuicios patrimoniales que cause directamente el asegurado con motivo de una determinada responsabilidad civil extracontractual en que incurra de acuerdo con la ley colombiana en virtud de la ejecucion del CONTRATO DE OBRA No. COIP-014-2022 referente a RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

ASEGURADOS/BENEFICIARIOS ADICIONALES:
EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE MARINILLA "SUMAR"
MUNICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA

SEGUN OTROSI No. 4, SE ADICIONA AL VALOR DEL CONTRATO LA SUMA DE $536.466.906 PARA UN TOTAL DE $3.300.441.689, Y SE AMPLIA EL PLAZO EN 2 MESES MAS, QUEDANDO COMO FECHA FINAL EL 25/07/2023.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ **********0.00	$ **********0	$*********0.00	$ **********0	$ **********0

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
AGENCIA DE SEGUROS ORIENTE LTDA	10562	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR (415)7701861000019(8020)000000000007000510123843 **FIRMA TOMADOR**

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CBD920790B0DFB785A CLIENTE DAVALENCIA 0

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

LISTADO DE ASEGURADOS
POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: **994000004457** ANEXO: 7 TIPO DE MOVIMIENTO: MODIFICACION PAGINA: 2

TOMADOR: **LUXURY INGENIEROS SAS** IDENTIFICACION: **901.148.673-1**

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	LUXURY INGENIEROS SAS	901148673-1	DONDE SE EJECUTE	MARINILLA	0.00	0	0

PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
0	0

Conincivil	ACTA DE REUNIÓN TÉCNICA	MARINILLA
	RENOVACION PARQUE MARINILLA	ANTIOQUIA
CONTRATO DE OBRA NUMERO: 014 - 2022 CONTRATISTA: LUXURY INGENIEROS S.A.S REP. LEGAL: SEBASTIAN SIERRA NIT. 901.148.673-1 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 053 - 2022 CONTRATISTA: CONINCIVIL S.A.S REP. LEGAL: JHON DAIRO GUERERO NIT: 900.468-7230		COMITÉ No 18

INFORMACION BASICA DEL PROYECTO					
FECHA REG.	19-07-2023	CIUDAD	MARINILLA	DEPARTAME	ANTIOQUIA
DIRECCION	PARQUE PRINCIPAL			NOMBRE	RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.
MOTIVO DE LA REUNION	COMITÉ DE OBRA 18– APERTURA DE PARQUE- ACTIVIDADES PENDIENTES POR REMATAR				

ASISTENTES			
	NOMBRE	ENTIDAD	CARGO
1	LUIS FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ	CONTRATISTA	RESIDENTE DE OBRA 2
2	SARA ZULUAGA GOMEZ	ALCALDIA-OBRAS PUBLICAS	APOYO-SUPERVISORA-O.P
3	JORGE ANDRES RODRIGUEZ DONOSO	INTERVENTORIA	RESIDENTE INTERVENTORIA
4	LUIS QUINTERO GIRALDO	SUMAR	APOYO SUMAR
5	SAIR ALZATE	CONTRATISTA	RESIDENTE DE OBRA 1
6	JOANA ANDREA OROZCO	SUMAR	SUPERVISORA
7	Kelly Arriane Díaz Mosquera	INTERVENTORIA	DIRECTOR INTERVENTORIA

TEMAS DE AGENDA	
1	RECORRIDO DE OBRA - HACER ACTA CON OBSERVACIONES
	APERTURA DE PARQUE

1	Se realiza comité de obra No 18, en compañia contratista, funcionaria obras publicas, interventoría, Supervisor empresa SUMAR, se inicia el comité de obra:Realizando recorrido detallado para dejar claro las actividades pendientes para la terminacion y entrega de la obra a sastifacion, las actividades son las siguientes:

Powered by CamScanner

1.Limpieza de cárcamo :	no se ha ejecutado
2.Quitar rebaba pegante en cárcamo :	no se ha ejecutado
3.Fundir bases de banderas- instalar tubos :	ejecutado
4.Reinstalar postes de fibra de vidrio :	ejecutado
5.Quitar todos los resaltos en el adoquín :	no se ha ejecutado
6.Quitar todas las piezas rotas del adoquín :	no se ha ejecutado
7.Dar remate al borde de la tarima :	ejecutado
8.Aplicar boquilla gris en adoquín oscuro bordillos:	en ejecucion
9.Arreglar cajas eléctricas que no están a nivel :	no se ha ejecutado
10.Arreglar grada en concreto, esta hormigueada.	no se ha ejecutado
11.Mantenimiento de zonas verdes:	ejecutado
12.Instalar 3 bolardos en la esquina sobre la calle 31:	ejecutado
13.Aplicacion de hidrofugo en zonas faltantes :	en ejecucion
14.Lavado de adoquín- quitar las eflorescencias:	en ejecucion
15.Arreglar lampara antorcha que le cayó el cerramiento :	ejecutado
16.Arreglar cárcamo de la fuente:	ejecutado
17.Asfalto de la vía carrera 31 :	ejecutado
18.Terminar adoquín vehicular pompeyano :	ejecutado
19.Arreglar adoquín vehicular gris antiguo:	ejecutado

21. limpiar cajas electricas :	no se ha ejecutado
22. remate de adoquin zona alcaldia :	en ejecucion
23. sellado de adoquin con arena :	en ejecucion
24. retiro de campamento y almacen :	ejecutado
25. instalacion de bolardos plazoleta :	no se ha ejecutado
26.instalacion de reflectores :	no se ha ejecutado
27. instalacion de marmol fuente :	no se ha ejecutado
28. retoque de pintura lamparas lyra	no se ha eejcutado
29.nivelar lamaparas antrocha z.v:	no se ha ejecutado
30. arreglar caja o valvula hidrantes :	no se ha ejecutado
31.remate de rampa acceso iglesia	no se ha ejecutado
32. remate de gradas atrio :	en proceso

COMPROMISOS

	DESCRIPCION	CONDICIONES DEL COMPROMISO	RESPONSABLES	FECHA
1	Ejecutar estas actividades	INMEDIATO	CONTRATISTA	Sabado 29 JULIO

PROXIMA REUNION

FECHA	MARTES 25 JULIO DEL 2023
HORA	10:00 a. m.
LUGAR	PARQUE

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

Coninovil	FORMATO DE REGISTRO REMODELACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.	MARINILLA-ANTIOQUIA COMITÉ 17

CONTRATO DE OBRA NUMERO: 014 - 2022
CONTRATISTA: LUXURY INGENIEROS S.A.S — REP. LEGAL: SEBASTIAN SIERRA JIMENEZ — NIT. 901.148.673-1
CONTRATO DE INTERVENTORIA: 053 - 2022
CONTRATISTA: CONINOVIL S.A.S — REP. LEGAL: JHON DAIRO GUERRERO ORDUZ — NIT: 900.466.725-0
35 DE JUNIO 2023

ASISTENCIA

	NOMBRE	ENTIDAD	CARGO	FIRMA
1	Sara Zuluaga Gomez	Sec OOPP	Apoyo Supervisión	Sara Zuluaga
2	Gustavo Quintero G.	SUMDE	Apoyo Sup.	
3	John Guzman	Coninovil	Interventor	
4	Luis J Hernandez J	Contratista	Apoyo Residente	
5	SEBASTIAN SIERRA JIMENEZ	CONTRATISTA	R. LEGAL	
6	Jeferson Sierra Jimenez	Rte. Obra	Luxury	
7	Jorge Ly Rodriguez D	Coninovil	Interventoria	
8	San Martin D.	Contratista	Residente	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

Conincivil	ACTA DE REUNIÓN TÉCNICA	MARINILLA
	RENOVACION PARQUE MARINILLA	ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA NUMERO: 014 - 2022
CONTRATISTA: LUXURY INGENIEROS S.A.S — REP. LEGAL: SEBASTIAN SIERRA — NIT. 901.148.673-1
CONTRATO DE INTERVENTORIA: 053 - 2022
CONTRATISTA: CONINCIVIL S.A.S — REP. LEGAL: JHON DAIRO GUERERO — NIT: 900.468-7230

COMITÉ No 17

INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

FECHA REG.	26-06-2023	CIUDAD	MARINILLA	DEPARTAME	ANTIOQUIA
DIRECCION	PARQUE PRINCIPAL			NOMBRE	RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.
MOTIVO DE LA REUNION	COMITÉ DE OBRA 17-- AVANCE DE OBRA				

ASISTENTES

	NOMBRE	ENTIDAD	CARGO
1	LUIS FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ	CONTRATISTA	RESIDENTE DE OBRA 2
2	SARA ZULUAGA GOMEZ	ALCALDIA-OBRAS PUBLICAS	APOYO-SUPERVISORA-O.P
3	ALEXANDER SIERRA JIMENEZ	CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA
4	JORGE ANDRES RODRIGUEZ DONOSO	INTERVENTORIA	RESIDENTE INTERVENTORIA
5	JHON GERRERO	CONINCIVIL	REPESENTANTE LEGAL
6	LUIS QUINTERO GIRALDO	SUMAR	APOYO SUMAR
7	SAIR ALZATE	CONTRATISTA	RESIDENTE DE OBRA 1
8	SEBASTIAN SIERRA	CONTRATISTA	APOYO- DIRECTOR DE OBRA
9			
10			

TEMAS DE AGENDA

1	COMPROMISOS ANTERIOR COMITÉ
2	AVANCE DE OBRA
3	BALANCE DE OBRA No 2
4	APERTURA DE PARQUE- ENTREGA PARCIAL OBRA CON OBSERVACIONES
5	RECORRIDO DE OBRA - HACER ACTA CON OBSERVACIONES LUNES 26 DE JUNIO
6	COMPROMISOS
7	
8	

1	Se realiza comité de obra No 17, en compañía contratista, funcionaria obras publicas, interventoria, Supervisor empresa SUMAR, se inicia el comité de obra:la interventoria hace lectura de los compromisos del comité de obra anterior, 1.cotizar adoquin tactil plastico o PVC(el contratista informa que no dan garantia en la instalacion del adoquin) 2.entregar planos de la fuente(no se realizo) 3.entregar resultados prueba de densidades y resistencia (no se entrego) 4.visita enviado casa de la cultura(no se realizo) 5.radicar balance de obra 2(no se entrego)

Powered by CamScanner

2	El arquitecto Jorge Rodriguez toma la palabra, informa el avance de obra según programacion de obra con nueva prorroga hasta el 25 de julio deberia ser del 89,52% y el avance de obra real es del 78,12% , con atraso del 11,40% este atraso que se lleva es por no dar inicio a acticidades como:asfalto via- restauracion fuente- mantenimiento monumentos-y va seguir aumentando si no dan inicio.
3	Se acuerda entre las partes que la entrega del parque (viernes 07 de julio del 2023) se deben subsanar las siguientes observaciones en obra: 1.Limpieza de cárcamo 2. Quitar rebaba pegante en cárcamo 3.Fundir bases de banderas- cotizar 3 banderas 4.Instalar postes de fibra de vidrio 5.Quitar todos los resaltos en el adoquin 6.Quitar todas las piezas rotas del adoquin 7.Dar remate al borde de la tarima 8.Aplicar boquilla gris en adoquín oscuro bordillos ✓ 9.Arreglar cajas eléctricas que no están a nivel. 10.Arreglar grada en concreto, esta hormigueada. 11.Mantenimiento de zonas verdes. ✓ 12.Instalar 3 bolardos en la esquina sobre la calle 31 13.Se debe instalar protección lámparas tipo antorcha 14.Se debe instalar el adoquín táctil en la zona peatonal frente a l iglesia 15.Lavado de adoquin- quitar las eflorescencias o pedir al proveedor un certificado en donde explique que esta lesión es normal y se quita a los 10 meses de ser instalado. 16.Arreglar lampara antorcha que le cayó el cerramiento. ✓ 17.Arreglar cárcamo de la fuente. 18.Asfalto de la via frente a los jugos 19.Terminar adoquin vehicular pompeyano 20.Arreglar adoquin vehicular gris antiguo: ✓

COMPROMISOS				
	DESCRIPCION	CONDICIONES DEL COMPROMISO	RESPONSABLES	FECHA
1	COTIZAR ADOQUIN TACTIL PLASTICO - PVC(LAMINADO) O PINTURA	INMEDIATO	CONTRATISTA	MIERCOLES 21 JUNIO
2	ENTREGAR PLANOS FUENTE	INMEDIATO	SUMAR-OBRAS PUBLICAS	MIERCOLES 21 JUNIO
3	ENTREGAR RESULTADOS PRUEBA DE DENSIDAD-RESISTENCIA	INMEDIATO	CONTRATISTA	MIERCOLES 21 JUNIO
4	VISITA ENVIADO CASA DE LA CULTURA	INMEDIATO	SUMAR	MIERCOLES 21 JUNIO
5	RADICAR BALANCE 2 DE OBRA	PROXIMA SEMANA	CONTRATISTA-INTERVENTORIA	VIERNES 23 JUNIO
6	RECORRIDO DE OBRA	PROXIMA SEMANA	TODAS LAS PARTES	LUNES 26 JUNIO

PROXIMA REUNION	
FECHA	MARTES 04 JULIO DEL 2023
HORA	10:00 a. m.
LUGAR	CAMPAMENTO OBRA

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

Coninciv	FORMATO DE REGISTRO	MARINILLA-ANTIOQUIA
	RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.	COMITÉ 17

CONTRATO DE OBRA NUMERO: 014 - 2022

CONTRATISTA: LUXURY INGENIEROS S.A.S — **REP. LEGAL:** SEBASTIAN SIERRA JIMENEZ — **NIT.** 901.148.673-1

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 053 - 2022

CONTRATISTA: CONINCIVIL S.A.S — **REP. LEGAL:** JHON DAIRO GUERERO ORDUZ — **NIT:** 900.468-7230

26 DE JUNIO-2023

AISTENCIA

	NOMBRE	ENTIDAD	CARGO	FIRMA
1	Sara Zuluaga Gómez	Src OOPP	Apoyo Supervisión	Sara Zuluaga.
2	Luis Fdo Quintero G.	SUMDR	Apoyo Sup.	
3	John Guarecho	Coninciv.	Interventor	
4	Luis F Hernandez L.	Contratista	Auxiliar Residente	
5	SEBASTIAN SIERRA JIMENEZ	CONTRATISTA	R. LEGAL	
6	Alexander Sierra Tirado	Pte. Ofra	Luxury	
7	Jorge Ivan Rodyer T.	Coninciv	Ingeniero	
8	Sor Mazo D.	Contratos	Residente	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

Conincivil	ACTA DE REUNIÓN TÉCNICA	MARINILLA
	RENOVACION PARQUE MARINILLA	ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA NUMERO: 014 - 2022
CONTRATISTA: LUXURY INGENIEROS S.A.S — REP. LEGAL: SEBASTIAN SIERRA — NIT. 901.148.673-1
CONTRATO DE INTERVENTORIA: 053 - 2022
CONTRATISTA: CONINCIVIL S.A.S — REP. LEGAL: JHON DAIRO GUERERO — NIT: 900.468-7230

COMITÉ No 16

INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

FECHA REG.	15-06-2023	CIUDAD	MARINILLA	DEPARTAME	ANTIOQUIA
DIRECCION	PARQUE PRINCIPAL			NOMBRE	RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.
MOTIVO DE LA REUNION	COMITÉ DE OBRA 16– AVANCE DE OBRA				

ASISTENTES

	NOMBRE	ENTIDAD	CARGO
1	LUIS FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ	CONTRATISTA	RESIDENTE DE OBRA 2
2	SARA ZULUAGA GOMEZ	ALCALDIA-OBRAS PUBLICAS	APOYO-SUPERVISORA-O.P
3	ALEXANDER SIERRA JIMENEZ	CONTRATISTA	APOYO- DIRECTOR DE OBRA
4	JORGE ANDRES RODRIGUEZ DONOSO	INTERVENTORIA	RESIDENTE INTERVENTORIA
5	JHON GERRERO	CONINCIVIL	REPESENTANTE LEGAL
6	LUIS QUINTERO GIRALDO	SUMAR	APOYO SUMAR
7	SAIR ALZATE	CONTRATISTA	RESIDENTE DE OBRA 1
8			
9			
10			

TEMAS DE AGENDA

1	COMPROMISOS ANTERIOR COMITÉ
2	AVANCE DE OBRA
3	FUENTE-MONUMENTOS
4	ENTREGA PRUEBA DE DENSIDAD LLENOS EN BASE VIA- RESISTENCIA CONCRETO
5	APERTURA DE PARQUE- ENTREGA PARCIAL OBRA CON OBSERVACIONES
6	ADOQUIN TACTIL- SI SE INSTALA
7	BALANCE DE OBRA No 2
8	RECORRIDO DE OBRA FINAL- HACER ACTA CON OBSERVACIONES LUNES 26 DE JUNIO
9	RECORRIDO DE OBRA
10	COMPROMISOS

1	Se realiza comité de obra No 16, en compañía contratista, funcionaria obras publicas, interventoria, Supervisor empresa SUMAR, se inicia el comité de obra:la interventoria hace lectura de los compromisos del comité de obra anterior, 1.cotizar adoquin tactil plastico o PVC(el contratista no lo presento) 2.entregar planos de la fuente(no se realizo) 3.hacer prueba de densidades (no se realizo) 4.iniciar aplicacion de boquilla o lechada(se realizo) 5.radicar acta parcial 4(se realizo) 6. hacer prueba de hidrofugo(se realizo)

Powered by CamScanner

2	El arquitecto Jorge Rodriguez toma la palabra, informa el avance de obra según programacion de obra con nueva prorroga hasta el 25 de julio deberia ser del 80,60% y el avance de obra real es del 71,09% . con atraso del 9,51% este atraso que se lleva es por no dar inicio a acticidades como:asfalto via- restauracion fuente- mantenimiento monumentos-y va seguira aumentando si no dan inicio.
3	La interventoria vuelve a preguntar por los detalles constructivos, planos hidraulicos ,electricos de la fuente,ademas la interventoria solicito la aclaracion de los APU presentados anteriormente por el contratista, esta actividad se inicio sin estos requisitos.el tema de los monumentos se van a dejar las actividades en cero, no se van a cobrar por silicitud de obras publicas al no cumplir con las certificaciones solicitadas al contratista, tambien interventoria no esta conforme con los diseños de la fuente porque no llevan ningun tipo de iluminacion.
4	Interventoria solicita al contratista entregar los resultados de la prueba de densidades en la zonas donde se realizo el ensayo, tambien se solicito el resultado de resistencia del concreto, realizado a las placas de la via vehicular.
5	Obras publicas informa que el viernes 30 de junio se hara la apertura del parque por solicitud del alcalde, la idea es abrir el parque desde la via vehicular en adoquin frente a a la iglesia la calle 31 hasta el area frente a la alcaldia, el area que no se abre seria la peatonales alrededor del atrio contratista e interventoria solicitan a obras publicas que ese dia se reciban las obras terminadas que serian del 92% mediante un acta de entrega con observaciones.
6	Obras publicas informa que el adoquin tactil si se debe instalar,Interventoria solicita al contratista realizar nuevamente una acotizacion de la lamina, pvc tactil o pintura para saber precio y recomendaciones de instalacion para hacer la revision entre las partes y saber si puede funcionar su instalacion en el parque.
7	Se acuerda entre las partes que es necesario hacer el Balance de obra No 2, ya que vamos llegando al 90% de ejecucion de la obra, para determnar que actividades dieron mas o menos y aprobar las actividades extras que salieron, contratista e interventoria se comprometen a entregarlo el viernes 23 de junio.
8	Se acuerda entre las partes realizar un recorrido de obra el dia lunes 26 de junio en horas de la mañana para hacer un acta con todas las correciones o mejoras que tendra que hacer el contratsita para la apertura del parque.
9	Se finlaiza el comité de obra haciendo un recorrido de obra- en donde se explica los avances y atraso de actividades.

COMPROMISOS				
	DESCRIPCION	CONDICIONES DEL COMPROMISO	RESPONSABLES	FECHA
1	COTIZAR ADOQUIN TACTIL PLASTICO - PVC(LAMINADO) O PINTURA	INMEDIATO	CONTRATISTA	MIERCOLES 21 JUNIO
2	ENTREGAR PLANOS FUENTE	INMEDIATO	SUMAR-OBRAS PUBLICAS	MIERCOLES 21 JUNIO
3	ENTREGAR RESULTADOS PRUEBA DE DENSIDAD-RESISTENCIA	INMEDIATO	CONTRATISTA	MIERCOLES 21 JUNIO
4	VISITA ENVIADO CASA DE LA CULTURA	INMEDIATO	SUMAR	MIERCOLES 21 JUNIO
5	RADICAR BALANCE 2 DE OBRA	PROXIMA SEMANA	CONTRATISTA-INTERVENTORIA	VIERNES 23 JUNIO
6	RECORRIDO DE OBRA	PROXIMA SEMANA	TODAS LAS PARTES	LUNES 26 JUNIO

PROXIMA REUNION	
FECHA	LUNES 26 JUNIO DEL 2023
HORA	10:00 a. m.
LUGAR	CAMPAMENTO OBRA

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

Coninciv	FORMATO DE REGISTRO	MARINILLA-ANTIOQUIA
	RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.	COMITÉ 16

CONTRATO DE OBRA NUMERO: 014 - 2022

CONTRATISTA: LUXURY INGENIEROS S.A.S — REP. LEGAL: SEBASTIAN SIERRA JIMENEZ — NIT. 901.148.673-1

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 053 - 2022

CONTRATISTA: CONINCIVIL S.A.S — REP. LEGAL: JHON DAIRO GUERERO ORDUZ — NIT: 900.468-7230

15 DE JUNIO-2023

ASISTENCIA

	NOMBRE	ENTIDAD	CARGO	FIRMA
1	Luis F Hernandez Lopez	Contratista	Residente 2	
2	Sara Zuluaga Gomez	CDPP	Apoyo Supervision	
3	Jorge A. Rodriguez D	Coninciv	Arquitecto	
4	John Guerrero	coninciv	Interventor	
5	Luis Fdo Quintero G.	SUMDP	Apoyo	
6	Alexander Sierra Jimenez	Contratista	Dir. Obra	
7	Sor Mesa P	Contratista	Residente	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

RAER
Ingeniería

Rionegro, 10 de junio de 2023

S-3758-2023

Ingeniero:
ANDRES HENAO
Luxuri ingeneiros

Asunto: **INFORME DE DENSIDADES DE CAMPO**

Respetado Ingeniero.

A continuacion, se hace entrega del informe de densidades de campo realizadas para la obra: Renovacion urbanistica parque principal Marinilla
Los resultados se muestran a continuación.

info@raeringenieria.com (574) 532 2665 312 832 5437
Casa N° 10 Segunda entrada a Masora, sector Las Delicias
Vereda Barro Blaco / Rionegro, Antioquia

PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO METODO DEL CONO DE ARENA

I.N.V. E - 161-13

OBRA:	Renovacion urbanistica parque principal Marinilla		
CLIENTE:	Luxuri ingenieros	**MUESTRA Nº:**	
CONTRATISTA:	N/A	**RESPONSABLE:**	Ing. Andres Henao
LOCALIZACION:	Marinilla	**FECHA:**	10/06/2023
MATERIAL:	Grava arenosa de color gris		
ORIGEN MATERIAL:	Cantera el condor	**DESTINO MATERIAL:**	Base granular

		1	2	3	4	5	6
ENSAYO No		1	2				
FECHA		2/06/2023	2/06/2023				
LOCALIZACION		Bahia de la iglesia	Topellano derecho				
1	DENSIDAD DE LA ARENA (g/cm3)	1,300	1,300				
2	PESO FRASCO Y ARENA INICIAL (g)	5364	5269				
3	PESO FRASCO Y ARENA RESTANTE (g)	1757	1637				
4	CONSTANTE DEL CONO (g)	1489	1489				
5	PESO DE LA ARENA EN EL HUECO (2-3-4) (g)	2118	2143				
6	VOLUMEN TOTAL DEL HUECO (5/1) cm3	1629,23	1648,46				
7	PESO HUMEDO MATERIAL PASA 3/4" (g)	3972	3735				
8	PESO MATERIAL RETENIDO 3/4" (g)						
9	PESO ESPECIFICO S.S.S. MAT. RET. 3/4"	0	0				
	PESO ESPECIFICO S.S.S. MAT. PASA. 3/4"	0	0				
10	VOLUMEN MATERIAL RET 3/4" (cm3)	-	-				
11	VOLUMEN DE MATERIAL PASA 3/4" (6-10) (cm3)	1629,23	1648,46				
12	PESO UNITARIO HUMEDO (7/11) (g/cm3) D 1	2,44	2,27				
13	PESO MUESTRA HUMEDA + TARA (g)	340	284,7				
14	PESO DE LA MUESTRA SECA + TARA (g)	327,4	276,6				
15	TARA No	194	237				
16	PESO TARA (g)	34,1	33,6				
17	CONTENIDO DE HUMEDAD (13-14/14-16) % w	4,3	3,3				
18	PESO UNITARIO SECO D 1/(1+ w) (g/cm3)	2,338	2,193				
19	DENSIDAD SECA MAXIMA (kg/m3)(entregada por el cliente)	**2222**	**2222**				
20	HUMEDAD OPTIMA (%)	**6,4**	**6,4**				
21	% DE COMPACTACION DEL TERRENO (18/19)	**105%**	**99%**				
22	% DE COMPACTACION ESPECIFICADA	NR	NR				
23	Relacion de Vacios (e)	-	-				
24	% de Saturación	-	-				

EQUIPO UTILIZADO
Balanza Electronica calibrada el 25/01/2023
Cono y placa para densidades
Horno y herramienta menor

Observaciones: _____


Versión: V1
Creación: 30/09/2019

info@raeringenieria.com (574) 532 2665 312 832 5437
Casa N° 10 Segunda entrada a Masora, sector Las Delicias
Vereda Barro Blaco / Rionegro, Antioquia

RAER Ingeniería

RESUMEN

No	Humedad (%)	Humedad Optima (%)	% Compactación Especificada	% Compactación	% saturación	Localización
1	4	6	NR	105%	-	Bahia de la iglesia
2	3	6	NR	99%	-	Topellano derecho

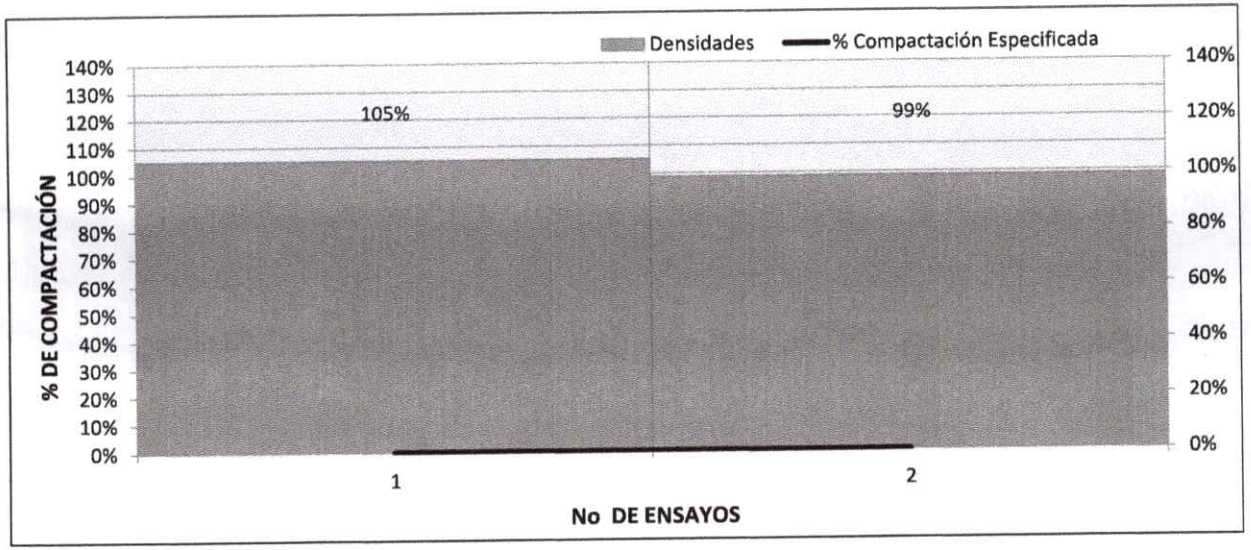

OBSERVACIONES:

Versión: V1
Creación: 30/09/2019

info@raeringenieria.com (574) 532 2665 312 832 5437
Casa N° 10 Segunda entrada a Masora, sector Las Delicias
Vereda Barro Blaco / Rionegro, Antioquia

Con gusto estamos atentos a cualquier novedad que pueda presentarse con relación al asunto.

JUAN JOSÉ BUSTAMANTE HERNÁNDEZ
CC 1 035 428 771 de Copacabana Antioquia.
Matricula Profesional N° 05202 332770 Ant.
I.C. Esp. Geotecnia y Estabilidad de Taludes

ANA MILENA ESCOBAR MEJÍA
Representante Legal
RAER Ingeniería S.A.S.

HENRI MESA
Encargado de laboratorio

info@raeringenieria.com (574) 532 2665 312 832 5437
Casa N° 10 Segunda entrada a Masora, sector Las Delicias
Vereda Barro Blaco / Rionegro, Antioquia

Versión: V1
Creación: 30/09/2019

RAER
Ingeniería

Rionegro, 10 de junio de 2023

S-3757-2023

Ingeniero:
ANDRES HENAO
Luxuri ingenieros

Asunto: **INFORME DE LABORATORIO**

Respetado Ingeniero.

A continuacion, se hace entrega del informe de laboratorio para la obra: Renovacion urbanistica parque principal Marinilla
Los resultados se muestran a continuación.


info@raeringenieria.com (574) 532 2665 312 832 5437
Casa N° 10 Segunda entrada a Masora, sector Las Delicias
Vereda Barro Blaco / Rionegro, Antioquia


RAER Ingeniería	RELACIONES DE HUMEDAD - PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS (ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACIÓN)	I.N.V. E-142-13

Proyecto :	Renovacion urbanistica parque principal Marinilla		
Cliente :	Luxuri ingenieros	**Fecha:**	5/06/2023
Responsable :	Ing. Andres Henao	**Origen :**	Cantera el Condor
N° interno:	5622	**Localización :**	Acopio obra
Descripción :	Grava arenosa de color café	**Destino :**	Base granular

METODO C	**MODIFICADO**			
MOLDE No:	5	5	5	5
PESO DEL MOLDE	5454	5454	5454	5454
VOLUMEN DEL MOLDE	2113	2113	2113	2113
PESO DE FRACCIÓN GRUESA (g)	2032	2032	2032	2032
PESO MOLDE + MUESTRA H (g)	10112	10376	10473	10400
Gravedad específica de la fracción gruesa	2,798	2,798	2,798	2,798
PESO MUESTRA SIN MOLDE (g)	4658	4922	5019	4946
PESO UNITARIO HUMEDO g/cm^3	2,204	2,329	2,375	2,341
Masa de la fracción fina (MDf)	4484	4668	4676	4509
Masa de la fracción gruesa (MDc)	2032	2032	2032	2032

CONTENIDO DE HUMEDAD				
RECIPIENTE No:	299	305	325	321
PESO MUESTRA HUMEDA + RECIPIENTE	215	175,1	260,4	240
PESO MUESTRA SECA + RECIPIENTE	208,3	168,1	245,0	222,0
PESO DEL RECIPIENTE	35,9	39,7	35,2	36,1
% DE HUMEDAD	3,9	5,5	7,3	9,7
PESO UNITARIO SECO g/cm^3	2,122	2,209	2,213	2,134
porcentaje de la fracción fina por masa (P_{FF})	68,8	69,7	69,7	68,9
porcentaje de la fracción gruesa por masa (P_{FE})	31,2	30,3	30,3	31,1
% HUMEDAD CORREGIDAD DE LAS FRACCIONES FINA Y GRUESA COMBINADA (Cw)	2,7	3,8	5,1	6,7
PESO UNITARIO SECO CORREGIDO DEL MATERIAL TOTAL (g/cm3)	2,295	2,360	2,363	2,304

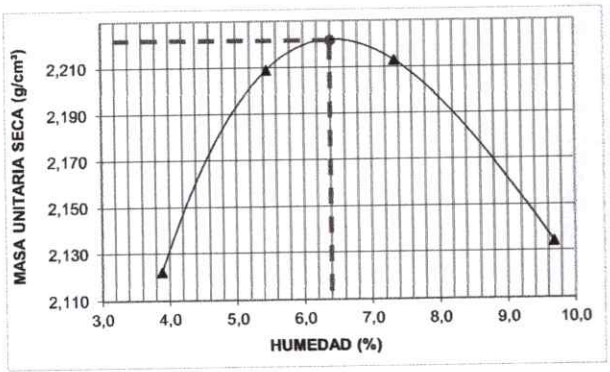

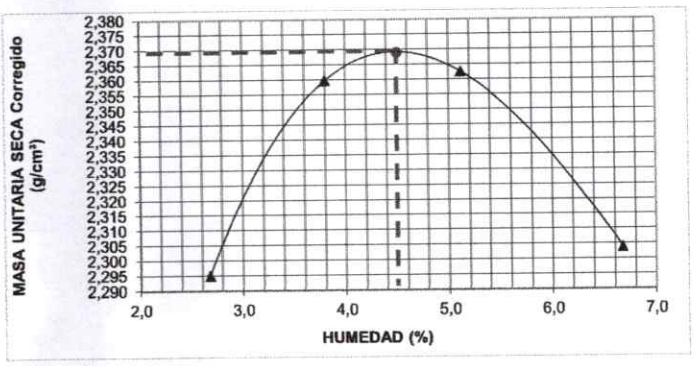

EQUIPO UTILIZADO
Balanzas Electrónicas calibradas el 25/01/2023
Equipo modificado
Horno termostáticamente controlado

RESULTADOS PROCTOR MODIFICADO	
PESO UNITARIO SECO Máximo (g/cm3)	2,222
% HUMEDAD OPTIMA:	6,4
PESO UNITARIO SECO Máximo Corregida (g/cm3):	2,369
% HUMEDAD OPTIMA Corregida:	4,5

Versión: V1

Creación: Mayo 2021

raule43@hotmail.com (574) 532 2665 312 832 5437
Casa No. 10 segunda entrada a Masora, sector Las Delicias
Vereda Barro Blanco | Rionegro, Antioquia

Con gusto estamos atentos a cualquier novedad que pueda presentarse con relación al asunto.

JUAN JOSÉ BUSTAMANTE HERNÁNDEZ
CC 1 035 428 771 de Copacabana Antioquia.
Matricula Profesional N° 05202 332770 Ant.
I.C. Esp. Geotecnia y Estabilidad de Taludes

ANA MILENA ESCOBAR MEJÍA
Representante Legal
RAER Ingeniería S.A.S.

HENRI MESA
Encargado de laboratorio

info@raeringenieria.com (574) 532 2665 312 832 5437
Casa N° 10 Segunda entrada a Masora, sector Las Delicias
Vereda Barro Blaco / Rionegro, Antioquia

Versión: V1
Creación: 30/09/2019

RAER
Consultoría y Laboratorio

Rionegro, 31 de julio de 2023

C-10939-2023

Ingeniero
Luis Fernando
Luxury Ingenieros SAS
Renovación Parque Marinilla

Asunto: **Informe de resultados de resistencia de cilindros de concreto**

Cordial saludo.

Con la presente hacemos entrega del informe con los resultados de resistencia a la compresión simple de los cilindros de concreto que se han venido ensayando para la obra: **Renovación Parque Marinilla**

Con gusto estamos atentos a cualquier novedad que pueda presentarse con relación al asunto.

Att

JUAN JOSÉ BUSTAMANTE HERNÁNDEZ
CC 1 035 428 771 de Copacabana Antioquia
Matricula Profesional N° 05202 332770 Ant.
I.C. Esp. Geotecnia y Estabilidad de Taludes

ANA MILENA ESCOBAR MEJIA
Representante Legal
RAER Ingeneieria S.A.S.

Versión: 01
Creación: 01/2020

RAER Consultoría y Laboratorio

Método de Ensayo Normalizado para Resistencia a la Compresión de Especímenes Cilíndricos de Concreto

I.N.V. E - 410 y N.T.C - 673

OBRA:	Renovación Parque Marinilla		
CLIENTE:	Luxury Ingenieros SAS		
FECHA:	31 de julio de 2023	**RESPONSABLE:**	Luis Fernando

Referencia	Numero Interno	Localización	Fecha		Edad (días)	Proporcion de mezcla	Asentamiento (cm)	Carga Máxima (KN)	*Medidas Prom. (cm)*		*Peso (gr)*	*Densidad (Kg/m³)*	Resistencia (Kg/cm²)				Patrón de Fractura
			Vaciado	Prueba					*Diámetro*	*Longitud*			Especificada	obtenida	PROBABLE A 28 DIAS	%	
RPM	32	Placa Vehicular calle 31	05/06/23	14/06/23	9	NR	NR	154,3	10,4	20,4	4103	2,37	210	185,2		88%	Dos
RPM	33	Placa Vehicular calle 31	05/06/23	19/06/23	14	NR	NR	159,3	10,2	20,4	3983	2,39	210	198,8	230,6	95%	Cuatro
RPM	34	Placa Vehicular calle 31	05/06/23	03/07/23	28	NR	NR	174,0	10,2	20,6	4000	2,38	210	217,1	-	103%	Cuatro
RPM	35	Placa Vehicular calle 31	05/06/23	03/07/23	28	NR	NR	175,0	10,2	20,5	3878	2,32	210	218,4	-	104%	Tres
RPM	36	Placa Vehicular calle 31	06/06/23	14/06/23	8	NR	NR	160,2	10,2	20,0	3850	2,36	210	199,9		95%	Cuatro
RPM	37	Placa Vehicular calle 31	06/06/23	20/06/23	14	NR	NR	196,1	10,4	20,3	4190	2,43	210	235,4	273,1	112%	Cinco
RPM	38	Placa Vehicular calle 31	06/06/23	04/07/23	28	NR	NR	228,2	10,3	20,4	4050	2,38	210	279,3	-	133%	Cuatro
RPM	39	Placa Vehicular calle 31	06/06/23	04/07/23	28	NR	NR	220,8	10,2	20,3	3998	2,41	210	275,5	-	131%	Cuatro

24 DE JULIO DE 2023

INFORME AMBIENTAL

"RENOVACIÓN URBANÍSTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO MARINILLA ANTIOQUIA"

Elaborado por:

LUXURY INGENIEROS S.A.S
EMPRESA CONTRATISTA
JULIO 2023

INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al Informe Final de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental – PMA elaborado del proyecto "RENOVACIÓN URBANÍSTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO MARINILLA ANTIOQUIA".

En el presente informe se desarrollan cada uno de los programas formulados en dicho PMA necesarios para la prevención, mitigación, corrección y/o compensación de los impactos generados; evitando alteración significativa de los elementos naturales presentes en la zona de influencia de donde se desarrolla la actividad.

Es así como las Buenas prácticas ambientales se han convertido en la herramienta primordial para cualquier actividad permitiendo un aprovechamiento sostenible de los recursos.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Dar cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental para las condiciones particulares del contrato cuyo Objeto "RENOVACIÓN URBANÍSTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO MARINILLA ANTIOQUIA", con el fin de estructurar el PMA correspondiente para el Proyecto.

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Implementar los programas estipulados en el PMA para la adecuada gestión ambiental al interior de la obra.
- Implementar el programa correspondiente al área social, para la adecuada gestión en la obra.
- Implementar los programas correspondientes al área SST, para la adecuada gestión en la obra.

  Implementar el programa de manejo de tránsito y desvíos dando cumplimiento al PMT aprobado para desarrollo constructivo.

3. UBICACIÓN DE LAS OBRAS DESARROLLADAS

- Durante el periodo reportado, las actividades constructivas desarrolladas han sido Construcción de fuente, Lavado de piso adoquín, construcción de cordones y vaciados, instalación de adoquín vehicular, reinstalación de piso adoquín, instalación poste de alumbrado, instalación de bolardos. Las cuales se encuentran en el parque principal del municipio de Marinilla.

4. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN UTILIZADOS

Las cantidades totales de material granular ingresado se entregarán en el acta, luego de la conciliación con la interventoría y estará acompañada de su respetivo certificado como anexo técnico.

FICHA GA-01 MANEJO DE RESIDUOS ORDINARIOS Y ESPECIALES

- **Residuos comunes**

Durante todo el periodo de ejecución del proyecto se mantuvo en funcionamiento el punto ecológico del campamento, el cual fue utilizado para la separación de los residuos generados por el personal, al igual que el área de acopio de residuos generados en obra, esta última se mantuvo adecuada correctamente con canecas de 55glns con el fin de que contaran con la capacidad necesaria para el depósito de dichos residuos; ambos cumplieron con lo establecido en la resolución 2184 de 2019 (código de colores).

La Empresa prestadora de aseo "ASEO GLOBAL", fue la encargada de prestar el servicio de recolección, transporte y disposición final de los residuos comunes. Durante el periodo de ejecución del proyecto se generaron un total de **25.283m³** de residuos sólidos.

- **Residuos RCD**


Durante el periodo de ejecución del proyecto se generaron residuos RCD producto de excavaciones y demoliciones. Dichos residuos fueron llevados a bomberos del municipio para ser acopiados y posteriormente aprovechados en el mantenimiento de vías terciarias del municipio, esto por instrucciones dadas por la alcaldía municipal. Las cantidades totales se entregarán en el acta.

- **Residuos Peligrosos**

En el punto ecológico central se mantuvo una caneca de 55glns roja, para disponer los residuos RESPEL generados hasta su posterior entrega al gestor autorizado.

Durante toda la ejecución del proyecto se llevaron a cabo charlas y capacitaciones a los trabajadores sobre la separación de residuos, con el fin de garantizar el buen manejo de residuos en obra. Además de realizar actividades de orden y aseo en el frente de obra al finalizar la jornada laboral.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

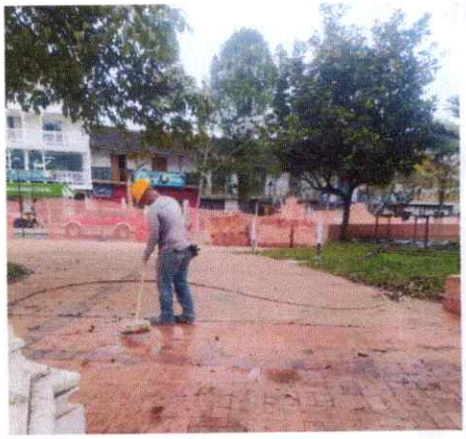

Fotografía 1. Jornada de orden y aseo



Fotografía 2. Recolección de residuos



Fotografía 3. Limpieza en campamentos



Fotografía 4. Recolección residuos en obra.



Fotografía 5. Capacitación personal



Fotografía 6. Punto ecológico



Fotografía 7. Actividad separación de residuos



Fotografía 8. Acopio de residuos solidos

Anexo 1. Reporte control de aforos

INDICATOR MONITOREO Y SEGUIMIENTO	
GESTIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS	**M3 RESIDUOS ORDINARIOS DISPUESTOS ADECUADAMENTE X 100** **M3 RESIDUOS TOTALES GENERADOS**
	25.283m³ residuos Ordinarios dispuestos X 100 = 100% **25.283m³** Residuos Totales Generados
GESTIÓN DE RESIDUOS RECICLADOS	**KG RESIDUOS RECICLADOS X 100** **KG RESIDUOS TOTALES GENERADOS**
	0 residuos Reciclados X 100 = 0 0 residuos Totales Generados
GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGOROSOS	**KG RESIDUOS PELIGROSOS DISPUESTOS ADECUADAMENTE KG X 100** **KG RESIDUOS TOTALES GENERADOS**
	0 residuos peligrosos Dispuestos X 100 = 0 0 residuos peligrosos Generados
GESTIÓN DE RCD	**M³ RCD DISPUESTOS ADECUADAMENTE KG X 100** **M³ RCD GENERADOS**
	239 m³ RCD Dispuestos X 100 = 0 239 m³ RCD Generados

FICHA GA-02 CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS, EMISIONES DIFUSAS DE MATERIAL PARTICULADO, GASES EN COMBUSTIÓN Y RUIDO GENERADO POR LA OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS

- **Verificación de vehículos**

Durante todo el periodo de ejecución del proyecto fue requerido el uso de vehículos para el ingreso de material granular y el retiro del material de excavación, se verificó la documentación vigente de estos (técnico-mecánica y emisiones contaminantes vigente) además del carpado al ingreso y salida de la obra para mitigar la emisión de materiales particulados.

- **Verificación de Maquinaria**

Durante la ejecución del proyecto fue necesario el uso de maquinaria para la adecuación del terreno y la remoción de las estructuras existentes, para el ingreso a la obra de estas se verifico la documentación.

- **Abastecimiento y almacenamiento de combustible**

El abastecimiento de combustible de los vehículos usados en la obra, se realizó mediante estaciones de servicio de la región (fuera de la obra); para el caso del equipo menor se realizó por medio de un vehículo que ingresa a la obra cada que es necesario el cual contiene un tanque de almacenamiento y bomba manual.

- **Almacenamiento de materiales granulares o pétreos**

Los materiales granulares ingresados a obra durante la ejecución del proyecto se mantuvieron acopiados y tapados con plástico negro correctamente.

REGISTRO FOTOGRAFICO




Fotografía 9. Verificación carpada



Fotografía 10. Cubrimiento material



Fotografía 11. Vehículos en obra

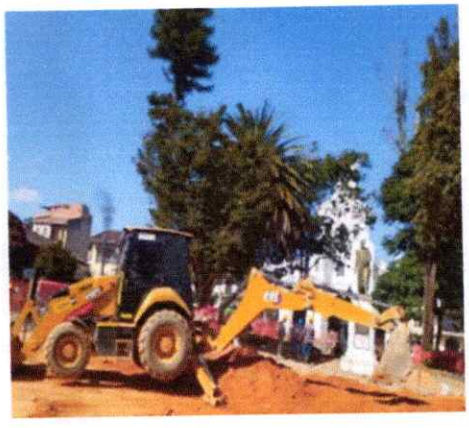

Fotografía 12. Maquinaria en obra

Anexo 2. Documentación vehículos
Anexo 3. Relación vehículos
Anexo 4. Documentación maquinaria

INDICADOR MONITOREO YSEGUIMIENTO	
CONTROL DE VEHÍCULOS EN OBRA	N.º VEHICULOS CON DOCUMENTOS EN OBRA X 100% / N.º TOTAL DE VEHICULOS EN OBRA
	7 vehículos con documentos en obra x 100% = 100% / 7 total de vehículos en obra

FICHA GA-03. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS.

Los sumideros existentes en el área de influencia del proyecto, se mantuvieron protegidos y recibieron mantenimiento de manera periódica con el fin de evitar contaminación u obstrucción sobre estos.

- **Aguas residuales Domésticas**

Se mantuvo en funcionamiento las dos unidades sanitarias adecuadas, la cuales estaban discriminadas por sexo y conectadas al alcantarillado del municipio mediante un Manhole existente cerca del proyecto, de esta manera se dio un manejo adecuado a las aguas residuales domesticas generadas. Se realizaron jornadas de orden y aseo en estos espacios.

- **Aguas residuales No domésticas**

Durante la realización de las actividades se generaron aguas residuales no domesticas producto del corte del adoquín; para dicha actividad, se adecuó un área de corte donde se instaló un sedimentador con el fin de darle un adecuado manejo a las aguas residuales no domésticas.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Fotografía 13. Unidades sanitarias



Fotografía 14. Protección en sumideros



Fotografía 15. Área de corte de adoquín

INDICADOR MONITOREO YSEGUIMIENTO	
Protección de sumideros	**Nº DE SUMIDEROS PROTEGIDOS X 100%** **Nº DE SUMIDEROS A PROTEGER**
	3 sumideros protegidos X 100%. = 100% 3 sumideros a proteger

FICHA GA-04. MANEJO DE LA VEGETACÍÓN, LA FAUNA Y EL PAISAJE

Durante el periodo de ejecución del proyecto no fue necesario intervenir ninguna especie arbórea, por lo que al iniciar las actividades constructivas se realizó un aislamiento de estos con tela en sarán, al iniciar con los cerramientos en algunas especies se evidenciaron algunas lesiones por lo que se aplico cicatrizante sobre estos, durante el tiempo de ejecución se realizaron riegos sobre los árboles, además de inspeccionar reiteradas veces el estado de estos.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Fotografía 16. Aislamiento de arboles



Fotografía 17. Aplicación cicatrizante



Fotografía 18. Arboles de la zona



Fotografía 19. Arboles de la zona

INDICADOR MONITOREO Y SEGUIMIENTO	
Gestión protección de arboles	N.º DE ARBOLES PROTEGIDOS X 100% N.º DE ARBOLES EN EL PARQUE
	10 árboles protegidos X 100%. = 100% 10 árboles en área de intervención

FICHA GA-05. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES.

Las instalaciones temporales utilizadas en obra fueron: almacén, oficinas y baños, estas cuentan con las condiciones necesarias. Al finalizar el proyecto se procedió con el desmonte de dichas instalaciones, de esta manera de garantiza dejar la zona en iguales o mejores condiciones.

En la cartelera informativa mes a mes se ha instalado mensajes referentes a las charlas y capacitaciones realizadas durante el tiempo de la obra, seguidamente se muestra una tabla con los temas dispuestos en ella:

No.	TIPO	METODOLOGÍA	TEMA	OBJETIVO	CARGOS A ENTRENAR	FECHA		COBERTURA
						PROGRAMADA	EJECUTADA	
1	Educación	Actividad	Separación de los Residuos	Concientizar a los trabajadores sobre la separación en la fuente para así garantizar una adecuada disposición de los residuos en obra	Personal operativo-Administrativo	05-nov-22	05-nov-22	100.0%
2	Educación	Entregable	Día internacional para la prevención de la explotación del medio ambiente en la guerra y los conflictos armados	Informar sobre los daños causados al medio ambiente en tiempos de conflicto y como estos siguen afectando los y los recursos naturales	Personal operativo-Administrativo	06-nov-22	05-nov-22	100.0%
3	Educación	Entregable	Dia internacional de aire puro	Concientizar sobre la importancia de tomar acción sobre el cuidado del aire y las consecuencias que trae la contaminación de este	Personal operativo-Administrativo	17-nov-22	17-nov-22	100.0%

No.	TIPO	METODOLOGÍA	TEMA	OBJETIVO	CARGOS A ENTRENAR	FECHA		COBERTURA
						PROGRAMADA	EJECUTADA	
4	Actividad	Jornadas de limpieza	Orden y aseo en el punto de trabajo	Promover programas de orden y aseo de cada una de las actividades de la obra	Personal operativo-Administrativo	26-nov-22	28-nov-22	30%
5	Capacitación	Charla (>15minutos)	Manejo integral de residuos (sólidos y líquidos)	Divulgar que son los residuos sólidos y líquidos y como se realiza la clasificación, generando conciencia en la separación de residuos en los frentes de trabajo.	Personal operativo-Administrativo	30-nov-22	05-dic-22	100.0%
6	Capacitación	Entregable	Orden y aseo en el punto de trabajo	Reiterar al personal de la obra la importancia del orden y aseo en su área de trabajo	Personal operativo-Administrativo	09-dic-22	09-dic-22	30%
7	Capacitación	Charla (>15minutos)	Día internacional de la montaña	Reconocer la importancia de las montañas y su papel en las fuentes hídricas	Personal operativo-Administrativo	11-dic-22	12-dic-22	100%
8	Capacitación	Charla (>15minutos)	Manejo de residuos peligrosos	Divulgar el programa de gestión ambiental en el manejo seguro de productos químicos, el cuidado que se debe tener en el transporte y manipulación de los mismos.	Personal operativo-Administrativo	21-dic-22	21-dic-22	100%
9	Educación	Entregable	Protocolo de ahuyamiento de fauna silvestre	Informar sobre las acciones a tener en cuenta en obra para el manejo de la fauna silvestre.	Personal operativo-Administrativo	28-dic-22	28-dic-22	100%
10	Capacitación	Entregable	Manejo integral de materiales de construcción (disposición de escombros).	Establecer las medidas y acciones adecuadas a la obtención de materiales para la ejecución de obras y definir las acciones para el manejo de los materiales sobrantes en los sitios de labor.	Personal operativo-Administrativo	01-ene-23	02-ene-23	50%

No.	TIPO	METODOLOGÍA	TEMA	OBJETIVO	CARGOS A ENTRENAR	FECHA		COBERTURA
						PROGRAMADA	EJECUTADA	
11	Actividad	Jornadas de limpieza	Orden y aseo en el punto de trabajo	Promover programas de orden y aseo de cada una de las actividades de la obra	Personal operativo-Administrativo	04-ene-23	06-ene-23	30%
12	Capacitación	Entrenamiento	Manipulación de productos químicos	Divulgar que son las hojas de seguridad, atención de derrames y los impactos que pueden causar al medio ambiente.	Personal operativo-Administrativo	10-ene-23	16-ene-23	100%
13	Capacitación	Entregable	Dia mundial de las aves	concientizar al personal de la importancia de las aves y las acciones que podemos tomar para cuidar de ellas.	Personal operativo-Administrativo	10-ene-23	10-ene-23	100%
14	Capacitación	Charla (>15minutos)	Importancia de la biodiversidad (agua, suelo, aire, fauna y flora)	Divulgar al personal que son los recursos naturales, concientizar la importancia de los recursos naturales y cuál es el manejo adecuado de estos .	Personal operativo-Administrativo	18-ene-23	16-ene-23	100%
15	Capacitación	Charla (>15minutos)	Dia Mundial de la Reducción de emisiones	Divulgar los impactos generados por las emisiones atmosféricas, las acciones que se toman en obra para la reducción de estas y la importancia de su implementación	Personal operativo-Administrativo	28-ene-23	30-ene-23	100%
16	Capacitación	Charla (>15minutos)	Día mundial de los humedales	Concientizar sobre la importancia de los humedales y su cuidado	Personal operativo-Administrativo	02-feb-23	02-feb-23	100%
17	Actividad	Jornadas de limpieza	Orden y aseo en el punto de trabajo	Promover programas de orden y aseo de cada una de las actividades de la obra	Personal Administrativo	08-fe-23	10-feb-23	49%
18	Educación	Entregable	Dia Mundial de la Energía	Campaña de ahorro y uso eficiente de la energía	Personal operativo-Administrativo	14-feb-23	14-feb-23	100%

No.	TIPO	METODOLOGÍA	TEMA	OBJETIVO	CARGOS A ENTRENAR	FECHA		COBERTURA
						PROGRAMADA	EJECUTADA	
19	Capacitación	Charla (>15minutos)	Manejo integral del agua	Divulgar el programa de gestión ambiental en obra para el uso racional del agua	Personal operativo-Administrativo	22-feb-23	24-feb-23	77%
20	Capacitación	Entregable	Día mundial de la vida silvestre	Divulgar el programa de gestión ambiental de manejo de fauna y crear conciencia sobre los beneficios que trae la conservación de la fauna silvestre	Personal operativo-Administrativo	03-mar-23	03-mar-23	100%
21	Capacitación	Entregable	El problema de las bolsas plásticas	Divulgar el impacto ambiental que genera el consumo de bolsas plásticas sobre todo a la biodiversidad acuática.	Personal operativo-Administrativo	09-mar-23	10-mar-23	50%
22	Capacitación	Charla - Entregable	Día mundial de los rios vivos	Promover el cuidado y protección de las fuentes hídricas, dando a conocer su importancia en nuestro diario vivir	Personal operativo-Administrativo	14-mar-23	15-mar-23	100%
23	Capacitación	Charla - Entregable	Dia del consumo responsable	Concientizar sobre los impactos del consumismo y como tener un consumo responsable para evitar estos impactos	Personal operativo-Administrativo	15-mar-23	15-mar-23	100%
24	Capacitación	Charla (>15minutos)	Día internacional de los Bosques	Resaltar la importancia de los bosques y los impactos de la deforestación	Personal operativo-Administrativo	21-mar-23	15-mar-23	100%
25	Capacitación	Charla (>15minutos)	Dia Mundial del agua	Divulgar prácticas de uso eficiente y ahorro del agua	Personal operativo-Administrativo	22-mar-23	15-mar-23	100%
26	Actividad	Jornadas de limpieza	Orden y aseo en el punto de trabajo	Promover programas de orden y aseo de cada una de las actividades de la obra	Personal operativo-Administrativo	28-mar-23	31-mar-23	30%
27	Capacitación	Charla (>15minutos)	Equilibrio ecológico "véndame unos gallinazos señor alcalde"	Generar estimulación en el personal de la obra frente al equilibrio	Personal operativo-Administrativo	10-abr-23	10-abr-23	92%

No.	TIPO	METODOLOGÍA	TEMA	OBJETIVO	CARGOS A ENTRENAR	FECHA		COBERTURA
						PROGRAMADA	EJECUTADA	
				ecológico y su importancia				
28	Capacitación	Charla corta (<15minutos)	Día mundial de la tierra	Celebrar el día de la tierra destacando la importancia de la protección de los recursos naturales	Personal operativo-Administrativo	22-abr-23	24-abr-23	88%
29	Educación	Entregable	Día del animal	Resaltar la importancia del respeto hacia los animales y su papel en el mundo	Personal operativo-Administrativo	29-abr-23	01-may-23	99%
30	Actividad	Jornadas de limpieza	Orden y aseo en el punto de trabajo	Promover programas de orden y aseo de cada una de las actividades de la obra	Personal operativo-Administrativo	02-may-23	09-may-23	100%
31	Capacitación	Charla corta (<15minutos)	Día mundial del reciclaje	Reconocer y divulgar la importancia de separar los residuos para poder realizar un adecuado aprovechamiento	Personal operativo-Administrativo	17-may-23	17-may-23	97%
32	Actividad	Jornadas de limpieza	Orden y aseo en el punto de trabajo	Promover programas de orden y aseo de cada una de las actividades de la obra	Personal operativo-Administrativo	26-may-23	26-may-23	100%
33	Educación	Entregable	Dia mundial del ambiente	Concientizar sobre la importancia del cuidado del medio ambiente	Personal operativo-Administrativo	05-jun-23	05-jun-23	99%
34	Capacitación	Charla corta (<15minutos)	Dia mundial de los océanos	Dar a conocer el papel que juegan los océanos en el mundo y en la regulación del clima	Personal operativo-Administrativo	08-jun-23	13-jun-23	100%
35	Capacitación	Charla corta (<15minutos)	Día Mundial de la lucha contra la Desertificación y la Sequía.	Identificar los grandes culpables de la desertificación en nuestro país, las acciones que podemos tomar para evitar los grandes impactos y su relación con la sequia	Personal operativo-Administrativo	17-jun-23	10-jun-23	100%

No.	TIPO	METODOLOGÍA	TEMA	OBJETIVO	CARGOS A ENTRENAR	FECHA		COBERTURA
						PROGRAMADA	EJECUTADA	
36	Actividad	Jornadas de limpieza	Orden y aseo en el punto de trabajo	Promover programas de orden y aseo de cada una de las actividades de la obra	Personal operativo-Administrativo	23-jun-23	26-jun-23	100%
37	Capacitación	Charla corta (<15minutos)	Acciones ambientales implementadas durante la ejecución de la obra	Realizar un resumen sobre las acciones ejecutadas durante la ejecución de la obra.	Personal operativo-Administrativo	30-jun-23	04-jun-23	100%

Tabla 1. Plan de control y formación

El suministro de agua potable fue mediante una domiciliaria por parte de la empresa ESPA E.S.P.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Fotografía 20. Desmonte oficinas



Fotografía 21. Desmonte campamentos



Fotografía 22. Contador de domiciliaria agua



Fotografía 23. Desmonte instalaciones temporales



Fotografía 24. Acopio de materiales



Fotografía 25. MH existente

INDICADOR MONITOREO YSEGUIMIENTO	
Servicios Sanitarios en obra	**N.º DE UNIDADES SANITARIA X 100%** **N.º DE EMPLEADOS EN EL FRENTE /15**
	2 de unidades sanitarias X 100%. = 100% 19 de empleados en el frente / 15

FICHA GA-06. MANEJO DE TRÁNSITO Y DESVIOS.

Durante el periodo de ejecución del proyecto se implementó el Plan de Manejo de Tránsito (PMT), elaborado y aprobado para el proyecto donde se plantearon las medidas de señalización vertical necesarias sobre la vía; continuamente, se realizaba revisión del estado de la señalización vertical y de ser necesario se realizaba mantenimiento. También se contó con auxiliar pare y siga para el control vehicular.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Fotografía 26. Señalización vertical



Fotografía 27. Señalización vertical



Fotografía 28. Señalización vertical



Fotografía 29. Señalización vertical



Fotografía 30. Auxiliar pare y siga



Fotografía 31. Auxiliar pare y siga

FICHA GA-07. PROGRAMA PARA LA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL DE LOS EMPLEADOS DE LA OBRA

Contratista: LUXURY INGENIEROS S.A.S

El presente informe de Seguridad y salud en el trabajo tendrá una síntesis desde la fecha 2 de noviembre de 2022 al 25 de julio de 2023.

Para empezar, es importante mencionar las actividades operativas con mayor relevancia que se ejecutaron durante el transcurso del proyecto parque Marinilla.

MES	ACTIVIDADES.
Noviembre 2022	• Instalación de señalización vertical, dentro las actividades están demolición de asfalto para rampas de acceso vehicular
Noviembre 2022	• Campamentos en teleras, incluye instalaciones de acometidas redes eléctricas e hidrosanitarias provisionales, cubiertas en zinc, complementos, puertas, bisagras y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.

Diciembre 2022	• Figuración y armado de hierro y formaletería. • Excavaciones de alcorques a nivel definido. • Demolición de asfalto.
Enero 2023	• Figuración y armado de hierro y formaletería. • Demolición de placa, concreto por donde pasa la tubería. • Excavaciones de alcorques a nivel definido. Excavación de brecha para manejo de aguas lluvias. • Lleno y compactación de material. • Excavación para cárcamos. • Construcción de MH. • Instalación de formaleta metálica.
Febrero 2023	• Vaciado del muro de contención, con concreto premezclado. • Figuración y colocación de hierro para muro de contención 2 y cárcamo. • Descargue de tercer viaje de adoquín. • Figuración de hierro y armado de formaleta de banca. • Lleno y compactación. • Construcción de sumideros de captación lateral. • Excavación e instalación de tubería para hidrantes. • Figuración para armado de gradas, bancas y cárcamo. • Instalación de adoquines.
Marzo 2023	• Instalación piso adoquín. • Enchape de bancas. • Vaciado de tramo de gradas. • Construcción de cárcamo. • Lleno superficial de tierra negra para alcorques. • Instalación de grama para alcorques. Excavación y vaciado de tramo de la zapata de tarima. • Colocación de grama para alcorques. • Pedestales luminarias. • Colocación de herrajes.
Abril 2023	• Excavación de huecos para dados de luminaria y alcorques. • Figuración de acero para cárcamo. • Construcción de pedestales para la luminaria. • Enchape de muros • Enchape de gradas • Vaciado de pedestales.
Mayo 2023	• Instalación de adoquines. • Enchape de gradas. • Nivelación de base granular y compactación.

	• Figuración de acero para cárcamo. • Enchape de tarima. • Instalación de bolardos • Demolición de asfalto • Remoción de asfalto • Construcción de sumidero para instalación de tubería. • Remate de instalación de adoquín. • Compactación de base vibro compactador. • Demolición de asfalto • Remoción de adoquín existente. • Traslado de materiales (adoquín, madera, acero, material pétreo.) • Descargue de adoquín.
Junio 2023	• Figuración de hierro para pompeyanos. • Descargue de adoquín • Demolición de placa para fuente. • Formalete ría en madera para vaciado de placa para acceso vehicular. • Instalación de tubería. • Instalación de tubería para fuente de agua. • Colocación de herrajes de cajas eléctricas. • Vaciado de placa para fuente. • Instalación de piso adoquín vehicular. • Colocación de boquilla en bancas y muros. • Construcción de fuente. • Traslado de adoquín. • Emboquillado de bancas. • Instalación de bolardos.
25 de julio 2023	• Instalación de adoquín. • Emboquillado de cordones. • Lavado de gradas y tarima. • Lleno y compactación de base granular frente la iglesia. • Recolección de escombros en las instalaciones de obra. • Realización de pedestales para las astas. • Desinstalación de campamento.

Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo.

Para dar cumplimiento al SG-SST durante la ejecución del proyecto se tuvo significativas actividades para garantizar la seguridad de los trabajadores en las instalaciones de la obra. Dentro de las actividades están:

1. Actualización de la matriz de identificación de peligros y valoración del riesgo, en apoyo con los trabajadores de obra mediante el formato RACI (Reporte de actos y condiciones inseguras) como también en las inspecciones preoperacionales de obra y equipos.

2. Auditoría interna al SG- SST LUXURY INGENIEROS S.A.S. con un resultado del 86% moderadamente aceptable, donde se ha venido trabajando en los hallazgos identificados.

3. Actualización indicadores de estructura proceso y resultado, matriz legal y se realizó seguimiento a las acciones correctivas y preventivas.

4. Por parte de la empresa contratista LUXURY INGENIEROS S.A.S se realizó el perfil sociodemográfico y profesiograma de los empleados.

5. Se indicó lineamientos básicos de seguridad y salud en el trabajo para subcontratista PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A.S con documentos de ingreso de personal operativo, realización de inducciones, entrega de EPP, exámenes médicos con sus recomendaciones, perfil sociodemográfico, llamados de atención, inspecciones preoperacionales y capacitaciones por parte de la profesional encargada de SST.

6. **Accidentalidad.**

Durante el desarrollo de las actividades de obra en los periodos comprometidos entre el 02 noviembre 2022 hasta al 25 de julio del 2023 no se presentó incidentes y accidentes laborales por la empresa LUXURY INGENIEROS S.A.S.

Durante el desarrollo de las actividades de obra en los periodos comprometidos entre el 02 de noviembre 2022 hasta al 25 de julio del 2023 por empresas contratistas se presentaron **dos** accidentes de trabajo leves reportados a la ARL y **tres** incidentes con reportados internamente con plan de acción por parte PROYECTOS y EDIFICACIONES S.A.S.

7. **Condiciones de salud.**

Durante el desarrollo del proyecto; LUXURY INGENIEROS SAS lleva el registro de condiciones de salud en el formato "Seguimiento de Exámenes médicos".

Entre los periodos del 02 de noviembre hasta al 25 de julio del 2023 por parte de la empresa LUXURY INGENIEROS S.A.S con el seguimiento de exámenes médicos se presentaron recomendaciones médicas.

En el periodo comprometido entre los periodos del 02 de noviembre del 2022 hasta al 25 de julio 2023, con el seguimiento de exámenes médicos por parte de PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A.S se presenta recomendaciones médicas. Se anexa en el presente informe.

8. Charlas de seguridad industrial y salud en el trabajo.

Durante el proceso constructivo se han realizado las siguientes charlas de SST.

TEMA	FECHA
Riesgo biomecánico	8 de noviembre
Riesgo físico	9 de noviembre
Análisis de trabajo seguro.	10 de noviembre
Seguridad y salud en el trabajo manual del contratista (Alcaldía de Marinilla)	16 de noviembre
Riesgo público	17 de noviembre
Análisis de trabajo seguro. (Autocuidado)	19 de noviembre
Socialización PPRE	22 de noviembre
Socialización de orden y aseo	23 de noviembre
Análisis de trabajo seguro	25 noviembre
Autocuidado de EPP	29 noviembre
Políticas de prevención de sustancias psicoactivas	30 noviembre
Copasst	2 diciembre
Orden y aseo	3 diciembre
Comité de convivencia laboral	5 diciembre
Autocuidado manejo de equipos	6 diciembre
Covid 19	13 diciembre
Procedimiento de trabajo sierra circular	16 diciembre
Caída al mismo nivel	19 diciembre
Procedimiento de trabajo con pulidora	21 diciembre
Riesgo físico	26 de diciembre
Socialización plan de emergencias	28 de diciembre
Autocuidado de EPP	3 de enero 2023
Caída a distinto nivel	6 de enero 2023
Orden y aseo	11 de enero 2023
Riesgo biomecánico	13 de enero 2023
Estándar de seguridad de excavación de brechas	14 de enero 2023
Riesgo Psicosocial	19 de enero 2023
Análisis de trabajo seguro de brechas.	21 de enero 2023
Riesgo locativo	23 de enero 2023
Fortalecimiento del manejo de residuos.	27 de enero 2023
Plan de emergencias	02 de febrero 2023
Manejo de equipos	03 de febrero 2023
Orden locativo	04 de febrero 2023
Riesgo biomecánico	07 de febrero 2023

Copasst – cocolab vigía	17 de febrero 2023
Manejo manual de cargas	20 de febrero 2023
Fortalecimiento del manejo de residuos.	21 de febrero 2023
Hojas de seguridad productos químicos.	22 de febrero 2023
Procedimiento seguro pulidora	24 de febrero 2023
Análisis de trabajo seguro cortadora de ladrillo	24 de febrero de 2023
Prevención, control del fuego y uso de extintores.	25 de febrero de 2023.
Procedimiento seguro de radial y taladro	27 de febrero de 2023
Orden locativo	04 de marzo 2023
Autocuidado del uso EPP	06 de marzo 2023
¿Cómo cuidar la salud mental en el contexto laboral?	07 de maro 2023
Sustancias psicoactivas (drogas- Alcohol)	08 de marzo 2023
Campaña sustancias psicoactivas	10 de marzo 2023
Los peligros y riesgos de las maquinas, herramientas.	18 de marzo 2023
El riesgo de accidente bajo cargas suspendidas.	20 de marzo 2023
Fortalecimiento de manejo de residuos.	21 de marzo 2023
Caída a mismo nivel	27 de marzo 2023
Planear el trabajo antes de ejecutarlo	30 de marzo 2023
Riesgo ergonómico	11 de abril 2023
Riesgo mecánico golpes	13 de abril 2023
Riesgo mecánico atrapamientos	14 de abril 2023
Fortalecimiento manejo de residuos	19 de abril 2023
Operación con pulidora	24 de abril 2023
Importancia uso de EPP	26 de abril 2023
Ficha de seguridad gasolina	2 de mayo
Autocuidado de EPP	3 de mayo
Fortalecimiento manejo de residuos	4 de mayo
Caída a distinto nivel	08 de mayo
Planificar el trabajo antes de ejecutar	13 de mayo
Políticas sst Luxury Ingenieros	17 de mayo
ATS minicargador	17 de mayo
Manejo manual de material	18 de mayo
Siete pasos para tener estilos de vida saludable	23 de mayo
Los peligros y riesgos de las máquinas herramientas	27 de mayo
Herramientas eléctricas	30 de mayo

¿Qué es un accidente e incidente de trabajo?	01 de junio
La importancia d delimitar el área de trabajo	3 de junio
Resbalo, tropiezos y caídas	6 de junio
Fortalecimiento manejo de residuos	10 de junio
Peligro, riesgos y tipos de peligros.	14 de junio
Cuidado del equipo de protección personal.	13 de mayo
Ficha técnica del hipoclorito	17 de junio
ATS hipoclorito- ácido nítrico	17 de junio
Orden y aseo áreas locativas de obra	23 de junio
Identificación de riesgos con productos químicos.	30 de junio
Manipulación de ácido nítrico peligros y riesgos	01 de julio
Percepción del riesgo y uso correcto de herramienta y equipos.	04 de julio
Actos y condiciones inseguras	11 de julio

8.1 Cumplimiento del plan de formación de capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo

Se realiza capacitación a los trabajadores de obra, para el cumplimiento al plan de formación en el SGSST.

TEMA	FECHA
Riesgo químico	26 de enero 2023
Importancia y uso de EPP	09 de febrero 2023
Fortalecimiento de la brigada Valoración primaria y secundaria de primeros auxilios	17 de febrero 2023
Conservación auditiva	17 de febrero de 2023
Riesgo mecánico	25 de febrero de 2023
Matriz de peligros gct45 evaluación del riesgo.	02 de marzo 2023
Estilos de vida saludable	07 de marzo 2023
Higiene postural- prevención del riesgo osteomuscular, manejo de cargas.	14 de febrero 2023
Fortalecimiento de la brigada Manejo de heridas, hemorragias y vendajes.	17 de marzo 2023
Actos y condiciones inseguras	23 de marzo 2023
Fortalecimiento de la brigada Camillaje-inmovilización	11 de abril 2023
Socialización plan de emergencias	17 de abril 2023
Divulgación de las políticas y objetivos sst	20 de abril 2023
Riesgo biológico	21 de abril 2023
Prevención de accidentes	6 de mayo
Importancia y uso EPP	11 de mayo
Riesgo psicosocial	15 de mayo

Divulgación plan de emergencias	8 de junio
Quemaduras-tipos de fuegos y extintores	09 de junio
Comunicación y liderazgo	20 de junio
Manejo de heridas, hemorragias y vendajes	23 de junio
Identificación de peligros y valoración del riesgo.	5 de julio

8.2 Se realizó con las actividades de alto riesgo el Análisis de trabajo seguro (ATS) para socializar e indicar sobre el procedimiento, los peligros y el uso adecuado de equipos y EPP.

Se adjunta listado de asistencia en el presente informe de las charlas y capacitaciones y ATS por parte de LUXURY INGENIEROS S.A.S.

9. Exámenes médicos

Todo el personal antes de ingresar a la compañía se envió a exámenes médicos Ocupacionales con el objetivo de garantizar personal apto para el desarrollo de las actividades.

Se valida el concepto de aptitud ocupacional del personal LUXURY INGENIEROS S.A.S. Y PROYECTOS Y EDIFICACIONES SAS. Se realiza el archivo correspondiente del mismo.

10. Inducciones de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Para todo el personal antes de iniciar actividades en obra recibió inducción en seguridad y salud en el trabajo. Se adjunta anexo en el presente informe.

INDUCCIONES SST	
EMPRESA	**CANTIDAD DE TRABAJADORES EMPRESA**
LUXURY INGENIEROS S.A.S.	5
PROYECTOS Y EDIFICACIONES SAS	73
PROVISIONALES	11
TODOEQUIPOS	1
ESTRUACABADOS	1
AFA CONSTRUCTORA S.A.S.	2
SOLUCIONES PESADAS S.A.S	2
DICONV	1
INDEPENDIENTE	1

11. Entrega de EPP

Se entregó dotación de camibuso al personal **LUXURY INGENIEROS SAS** y **PROYECTOS Y EDIFICACIONES.** Se adjunta en el presente informe.

Se hizo entrega al personal de **LUXURY INGENIEROS SAS** elementos de protección personal antes de dar inicio a la actividad, y posterior cuando presentan deterioro y por reposición. Se adjunta anexo en el presente informe.

La empresa **PROYECTOS Y EDIFICACIONES SAS,** entregó elementos de protección personal antes de dar inicio a la actividad, y posterior cuando presentan y por reposición. Se adjunta anexo en el presente informe.

Se realizó inspección de EPP para el personal de **LUXURY INGENIEROS SAS** y **PROYECTOS Y EDIFICACIONES SAS** y **AFA** INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. Se adjunta anexo en el presente informe.

12. Inspecciones de herramientas y equipos.

Se realizaron inspecciones preoperacionales de herramientas menores, se adjunta en el presente informe.

Herramientas menores
Barras
Picas
Palas
Palustre
Paladraga
Alicate
Martillo
Nivel de mano
Carretilla
Machete
Extensión eléctrica
Cinta métrica
Cincel
Almádana

12.1 Inspección de equipos

En el periodo 02 de noviembre 2022 al 19 de julio 2023 durante el proyecto se hizo inspecciones diariamente de equipos, herramientas eléctricas, y maquinaria pesada de acuerdo a la necesidad de las actividades realizadas en obra a través de check list

Herramientas Eléctricas
Taladro demoledor
Taladro percutor
Sierra circular
Pulidora

Cortadora de ladrillo
Caladora
Equipos/maquinaria
Concretadora
Planta eléctrica
Vibrador de concreto manual
Compactador rana
Canguro compactador
Minicargador
Compresor
Vibro compactador
Excavadora
Volqueta
Guadaña

12.2 Mantenimiento de equipos

A continuación, se hace una relación de los mantenimientos de equipos durante el tiempo del proyecto.

REPARACION Y MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS ELECTRICOS Y A COMBUSTION		
FECHA	**EQUIPO**	**OBSERVACION**
23/12/2022	Concretadora gasolina	Mantenimiento general
10/01/2023	Taladro de 1/2"	Mantenimiento general
10/01/2023	Pulidora bosch 9"	Mantenimiento eléctrico
10/01/2023	Taladro percutor dewalt	Mantenimiento general
26/01/2023	Rotomartillo dewalt	Cambio de piezas: BROCAL, PISTON, ORRINGS DE PESO MUERTO
27/01/2023	Sierra radial	Mantenimiento general
28/02/2023	Rotomartillo dewalt	Para revisar: GARANTIA DEL 26/01
9/02/2023	Concretadora gasolina	Cambio de aceite y engrase de rodamientos. ACEITE PROPORCIONADO POR LA OBRA"
17/02/2023	Vibrador a gasolina	Ajuste de acople de manguera
27/02/2023	Radial black & DECKER	Trinquete de disco y engrase
7/03/2023	Rana compactador #14	Mantenimiento carburador, filtro de aire, cambio de bujia
13/03/2023	Concretadora gasolina	Cambio de bandas y mantenimiento de carburador
9/05/2023	Concretadora gasolina	Cambio de aceite: ACEITE PRPORCIONADO POR LA OBRA
10/05/2023	Concretadora gasolina	Cambio de 2 Poleas
10/05/2023	Rana compactador #14	Arreglo de yoyo
4/07/2023	Pulidora 4½"	Cambio de escobillas
4/07/2023	Rana compactadora #6	Ajuste de polea y tornillos prisioneros


13. Acciones correctivas de equipos.


Equipos/herramientas	Tipo de mantenimiento
Pulidora 	Correctiva
Antes: soldada el mango, extensión con fisura.	
	
Después: Pulidora nueva	

Planta eléctrica . 	Correctiva
Antes: No se puede evidencia la cantidad de aceite que se gasta	
	
Después: Cambio de planta eléctrica	

Concretadora  **Antes:** Se evidencia llanta pinchada, el seguro no se resbala, sin filtro  **Después:** Mantenimiento de concretadora. - Se cambió el switch. - se engrasó la volante, tolva y el piñón - Se cambia llanta - Se coloca el filtro.	Correctiva



<table>
<tr><td>Taladro demoledor
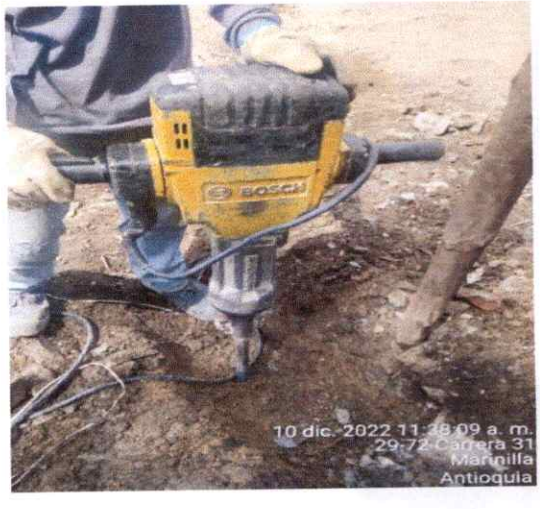
</td><td rowspan="4">Correctiva</td></tr>
<tr><td>Antes: mango sin ajustar al taladro, se solicita cambio.</td></tr>
<tr><td>
</td></tr>
<tr><td>Después: Ingreso de taladro demoledor en buenas condiciones.</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

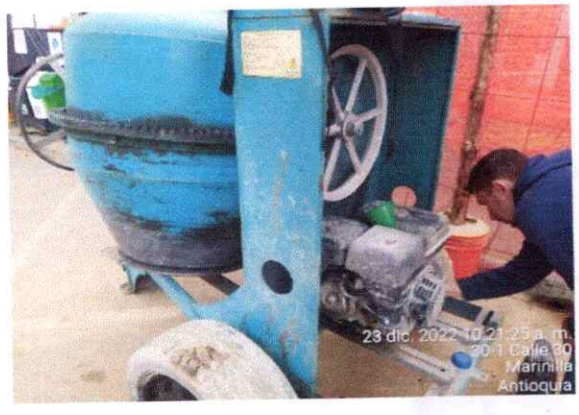Concretadora **Antes:** El mofle se pega con las correas.   **Después:** se le realiza mantenimiento general, cambio de aceite, engrasada de rodamientos, limpieza de filtro de aire.	Correctiva

Concretadora **Antes:** fallas en las bandas y tornillería.  	Correctiva
Después: Cambio de bandas, mantenimiento la tornillería  	Correctiva

Antes: Rana sin guarda de seguridad  	Correctiva
Después: Se realiza Cambio de rana con guarda de seguridad.  	

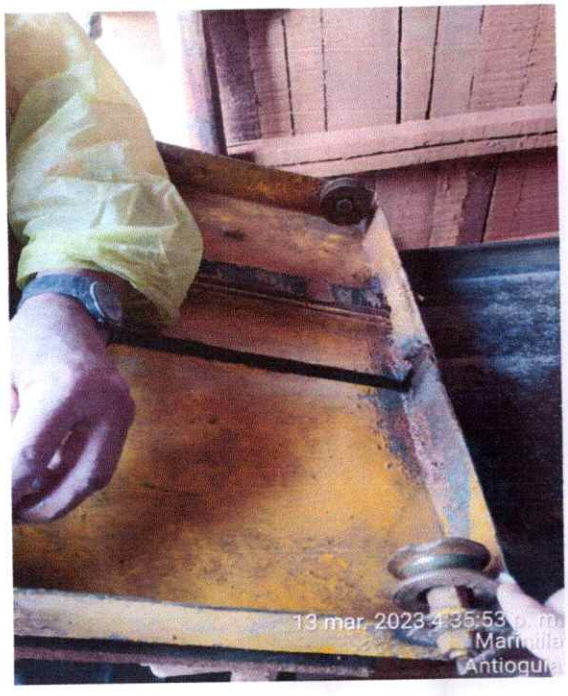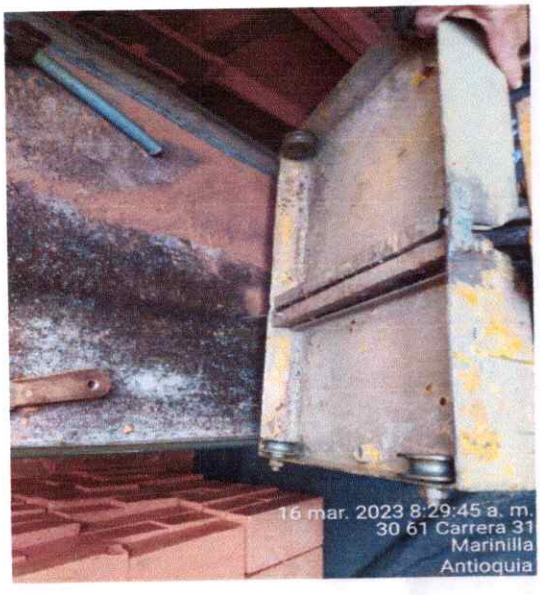Antes: Soporte y guía para rodar material con fisuras.  	
Después: Se realiza cambio de soporte y guía.  	

ACCIONES CORRECTIVAS DE ÁREAS DE LA OBRA	
Antes: Condición insegura alambre sin demarcar 	Correctiva
	


Después: Alambre demarcado	
Antes: Area de almacen  	
Después: Orden locativoa area almacen.  	Correctiva

Antes: Areas locativas de obra  	
Después: Areas locativas de obra  	Correctiva

Mesa de trabajo **Antes**  	Correctiva
Después  	

1.4. Plan de capacitaciones

La empresa Luxury Ingenieros s.a.s. certifica a dos trabajadores de Proyectos y Edificaciones para auxiliar de tránsito a través de la empresa Instruvial, esto con la finalidad de controlar y brindar mayor seguridad a los trabajadores y peatones que transitan en el espacio público que están en actividades de la obra.

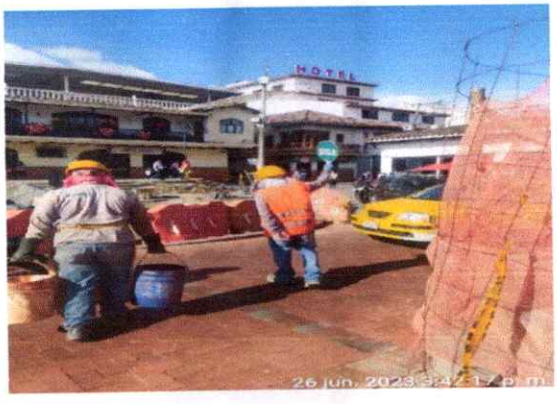

Fotografía 32. Auxiliar de tránsito.

1.5. Pausas activas

Durante la ejecución del proyecto se realizaron actividades de calistenia para prevenir lesiones osteomusculares durante sus jornadas laborales.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía 33. Calistenia



Fotografía 34. Socialización del uso EPP



Fotografía 35. Socialización ATS de vacceo con concreto




Fotografía 36. Calistenia




Fotografía 37. Capacitación de SST manual del contratista




Fotografía 38. Riesgo público

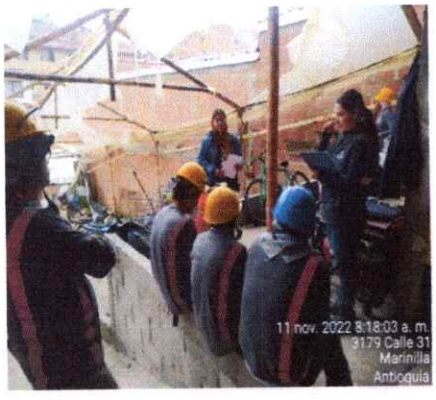

Fotografía 39. Capacitación del uso EPP

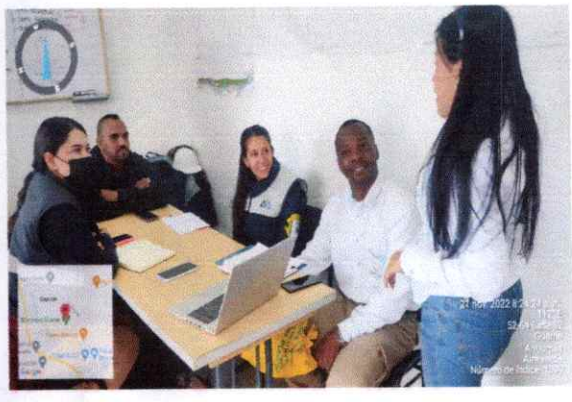

Fotografía 40. Fotografía asesoria ARL COLMENA

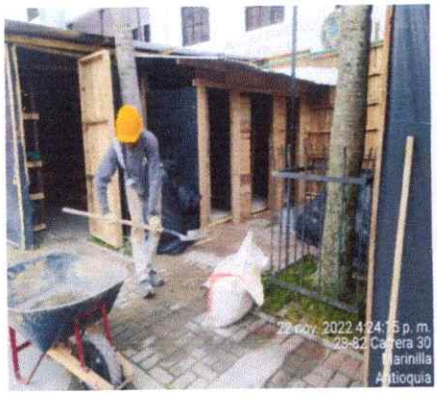


Fotografía 41. Orden y aseo



Fotografía 42. Capacitación ARL Colmena



Fotografía 43. Charla de ATS demolición de adoquín y asfalto

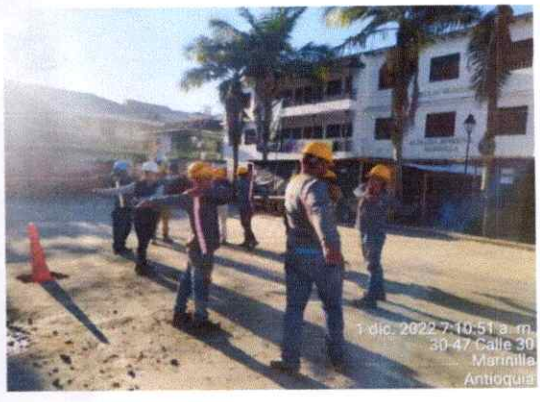


Fotografía 44. Calistenia.



Fotografía 45. Capacitación de COVID



Fotografía 46. Socialización de ATS operario minicargador

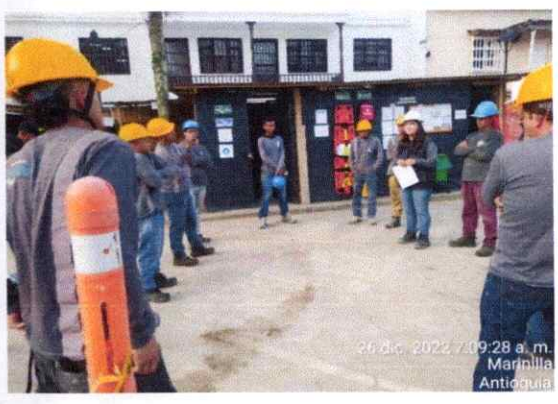	
Fotografía 47. Charla de equipo eléctrico sierra circular	Fotografía 48. orden y aseo
	
Fotografía 49. Charla riesgo caída al mismo nivel	Fotografía 50. Simulacro de evacuación oficina principal ARL COLMENA.
	
Fotografía 51. Charla de equipo eléctrico pulidora	Fotografía 52. Charla Riesgo Físico.



Fotografía 53. Charla plan de emergencias



Fotografía 54. Calistenia



Fotografía 55. Charla riesgo biomecánico



Fotografía 56. Orden y aseo



Fotografía 57. Charla riesgo psicosocial



Fotografía 58. Señalizaciones canecas



Fotografía 59. ATS brechas



Fotografía 60. Calistenia



Fotografía 61. Capacitación de riesgo químico




Fotografía 62. Charla socialización de residuos



Fotografía 63. Charla de plan de emergencias



Fotografia 64. Capacitación de equipos

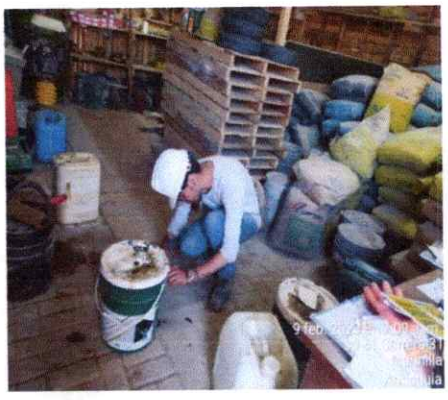
	
Fotografía 65. Charla riesgo biomecánico	Fotografía 66. Rotulación químicos hojas de seguridad.
	
Fotografía 67. Auditoría interna SGSST	Fotografía 68. Charla de manejo de taladro demoledor y percutor
	
Fotografía 69. Capacitación fortalecimiento de la brigada COLMENA.	Fotografía 70. Capacitación conservación auditiva.




Fotografía 71. Análisis de trabajo seguro cortadora de ladrillo



Fotografía 72. Capacitación riesgo mecánico

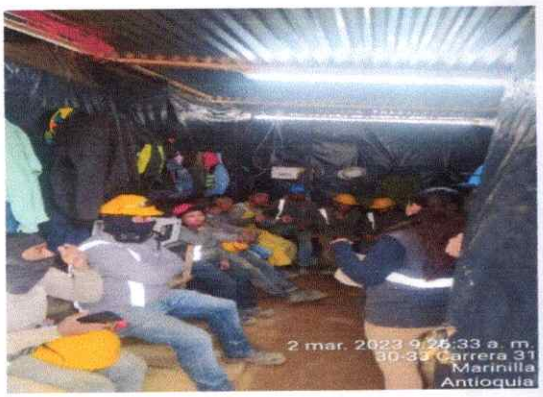

Fotografía 73. Matriz de peligros gct45 evaluación del riesgo.

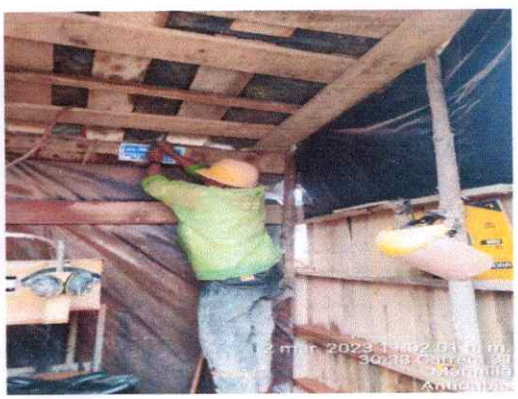

Fotografía 74. Señalización de áreas de trabajo.



Fotografía 75. Semana de la salud. Capacitación ¿Cómo cuidar la salud mental en el contexto laboral?



Fotografía 76. Semana de la salud. Charla de estilos de vida saludable.



Fotografía 77. Semana de la salud. Charla de sustancias psicoactivas drogas-alcohol.




Fotografía 78. Calistenia



Fotografía 79. Charla campaña del mes sustancias psicoactivas.




Fotografía 80. Cartelera campaña a la prevención de sustancias psicoactivas.

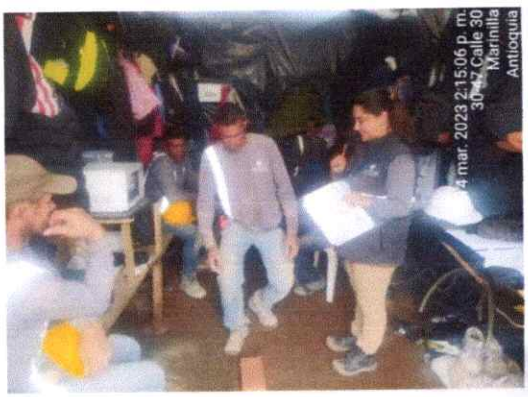

Fotografía 81. Higiene postural- prevención del riesgo osteomuscular, manejo de cargas.




Fotografía 82. Calistenia.

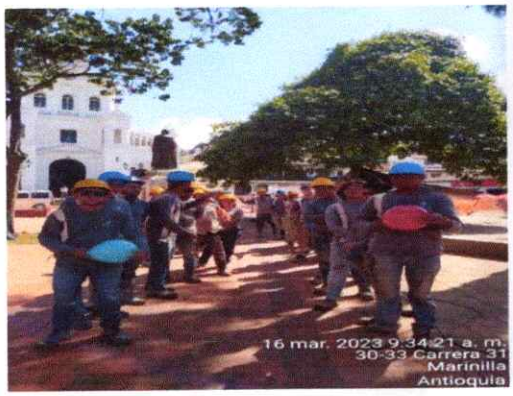

Fotografía 83. Pausa activa dinámica.



Fotografía 84. Charla planeación de las actividades en obra

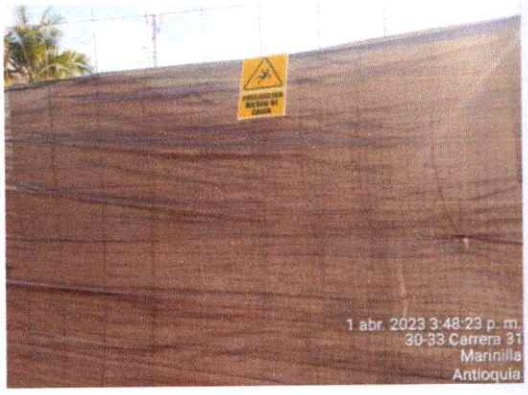

Fotografía 85. Señalización de cerramiento provisional



Fotografía 86. Charla riesgo ergonómico



Fotografía 87. Brigada de camillaje e inmovilización



Fotografía 88. Calistenia



Fotografía 89. Charla de atrapamientos riesgo mecánico.



Fotografía 90. Socialización plan de emergencias



Fotografía 91. Divulgación de las políticas y objetivos sst




Fotografía 92. Capacitación riesgo biológico.







Fotografía 93. Charla operación con pulidora






Fotografía 94. Charla autocuidado de EPP

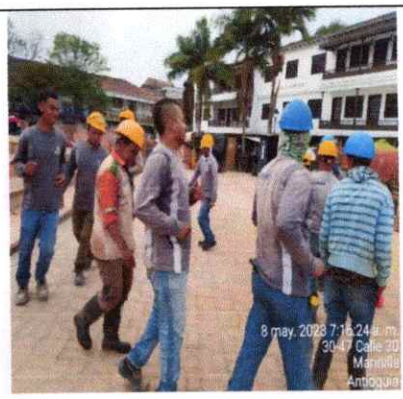	
Fotografía 95. Capacitación prevención de accidentes	Fotografía 96. Calistenia
	
Fotografía 97. Actividad dinámica -evaluativa	Fotografía 98. Socialización políticas sst Luxury Ingenieros s.a.s
	
Fotografía 99. Socialización ATS Minicargador	Fotografía 100. Siete pasos para tener estilos de vida saludable

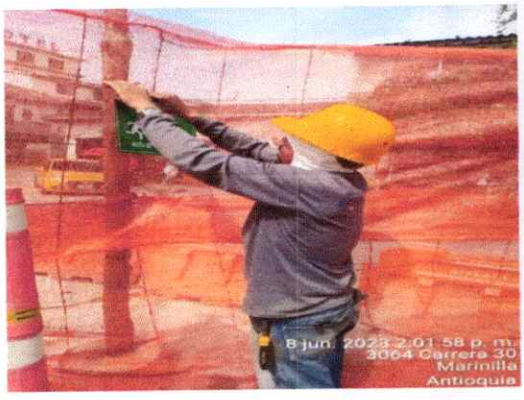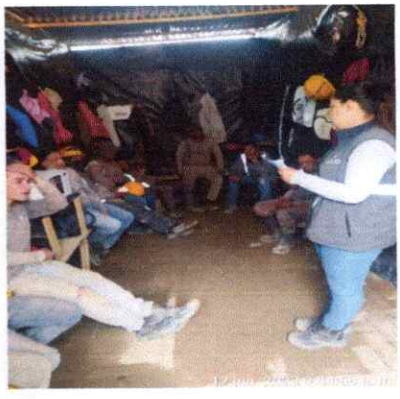
	
Fotografía 101. ¿Qué es un accidente e incidente de trabajo?	Fotografía 102. Orden y aseo áreas locativas
	
Fotografía 103. Señalización rutas de evacuación	Fotografía 104. Charla cuidado del manejo de herramientas manuales
	
Fotografía 105. Calistenia	Fotografía 106. Charla ficha técnica hipoclorito

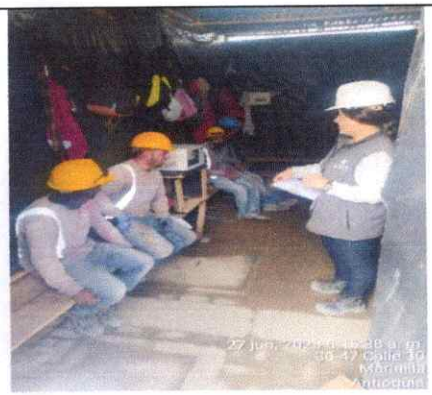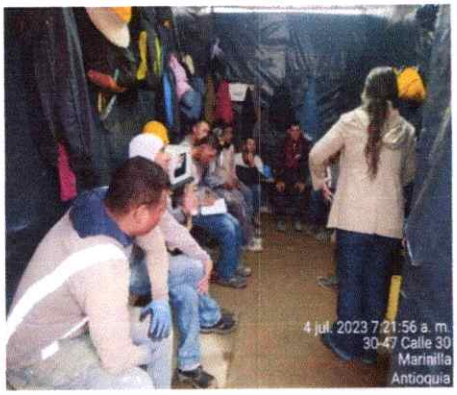	
Fotografía 107. Capacitación liderazgo y comunicación	Fotografía 108. Evaluación de simulacro
	
Fotografía 109. Orden y aseo en áreas locativas.	Fotografía 110. Charla peligros-riesgos con la manipulación ácido nítrico.
	
Fotografía 111. Percepción del riesgo y uso correcto de herramientas y equipos	Fotografía 112. Orden y aseo en areas locativas de obra.

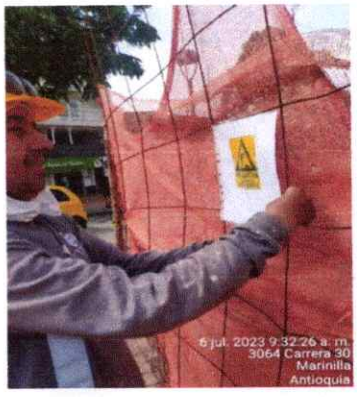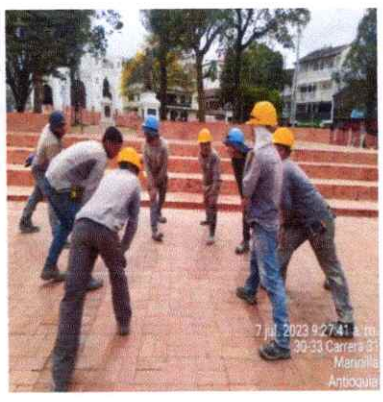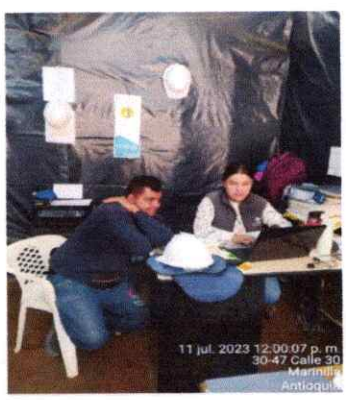	
Fotografía 113. Capacitación identificaicón de peligros y valoración del riesgo.	Fotografía 114. Señalización de áreas.
	
Fotografía 115. Charla de politicas de seguridad y salud en el trabajo.	Fotografía 116. Calistenia.
	
Fotografía 117. Planeación en el trabajo antes de ejecutarlo.	Fotografía 118. Actos y condiciones inseguras.



Fotografía 119. Calistenia

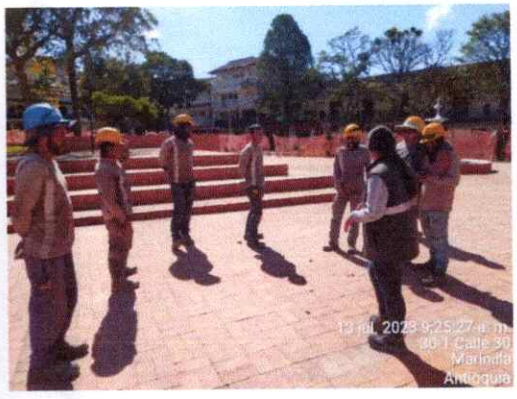

Fotografía 120. Importacia de la señalización

PERSONAL DE OBRA A LA FECHA DEL 25 DE JULIO 2023

NOMBRES – APELLIDOS	CEDULA	EMPRESA	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE TRASLADO	FECHA DE RETIRO
SEBASTIÁN SIERRA JIMÉNEZ	1036947694	LUXURY	Apoyo a la dirección	20/10/2022		
ALEXANDER SIERRA JIMNEZ	15448588	LUXURY	Director de obra	20/10/2022		
SAIR ALZATE Z	1038412719	LUXURY	Ingeniero residente de obra	20/10/2022		
LUIS FERNANDO HERNÁNDEZ LÓPEZ	1067960811	LUXURY	Auxiliar ingeniero residente	21/10/2022		
GLENYS YULIANA VARGAS HENAO	1032070398	LUXURY	Profesional en SST	31/10/2022		
DIANA NORELA CASTRILLÓN CAVIRIA	21492275	LUXURY	Socióloga	20/10/2022		
SANDRA PATRICIA ARENA	39450562	LUXURY	Ingeniera ambiental	20/10/2022		
JUANITA CARDONA JIMENEZ	1001724008	AFA	Auxiliar ambiental	20/10/2022		
YONIS JAVIER BERRIO HERNÁNDEZ	8057996	PROYECTOS/EDIFICACIONES	Ayudante de obra	9/11/2022		24/07/2023
HUMBERTO RESTREPO JIMENEZ	71619535	AFA	Conductor de vehículo	28/11/2022		
FRANKLIM ANDRES HENAO	1067960811	LUXURY	Almacenista	7/12/2022		
RAMIRO CARDONA	70905526	PROYECTOS/EDIFICACIONES	Ayudante de obra	20/12/2022		
DANILO ANDRES TRIANA DAVILA	1003734557	PROYECTOS/EDIFICACIONES	Oficial obra	26/12/2022		

MARCELINO JOSE HERNANDEZ VILLEGAS	23864795	PROYECTOS7EDIFICIONES	Ayudante de obra	17/01/2023		
TOMAS DE JESUS ARIAS CASTILLO	PPT 1218747	PROYECTO/EDIFICACIONES	Ayudante de obra	24/01/2023		
FERNANDO JOSE DIAZ	1038478042	PROYECTOS/EDIFICACIONES	Ayudante de obra	14/02/2023		
JOSE OMAR GOHES	70434204	PROYECTOS/EDIFICACIONES	Ayudante de obra	22/02/2023		21/07/2023
JUAN ANGEL ALVAREZ	70582595	PROYECTOS/EDIFICACIONES	Ayudante de obra	24/02/2023		
ALEISER MARQUEZ	98677699	PROYECTOS/EDIFICACIONES	Oficial de obra	27/02/2023		
JOSE LUIS MARULANDA	1040182707	PROYECTOS/ EDIFICACIONES	Oficial de obra	13/03/2023	21/07/2023	
JULIAN MARULANDA	1040182707	PROYECTOS/ EDIFICACIONES	Oficial de obra	14/03/2023		
VLADIMIR URREA	71727798	LUXURY	Ayudante de obra	19/03/2023		
NEIDER FUENTES	1005582162	AFA	Ayudante de obra	27/03/2023		21/07/2023
INGRID PAOLA SITU GRAJALES	1114732198	PROYECTOS/EDIFICACIONES	Profesional sst	10/04/2023		
JORGE ANDRES GOMEZ	98659490	INDEPENDIENTE	Escultor	26/06/2023		21/07/2023
LUIS FERNANDO HOYOS	1068813262	PROYECTOS/EDIFICACIONES	Ayudante	14/07/2023		
JUAN JOSE NAVARRO	1068808489	PROYECTOS/EDIFICACIONES	Ayudante	14/07/2023	21/07/2023	

Atentamente,

Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo – Luxury Ingenieros S.A.S.

Se adjunta como anexo los siguientes registros entre el mes de junio y julio 2023.

Anexo 5. afiliación y planillas a la seguridad social mayo y junio.
Anexo 6. asistencia e inducciones Luxury Ingenieros s.a.s.
Anexo 7. Inducciones – entrega EPP Proyectos y Edificaciones S.A.S.
Anexo 8. entrega e inspección de EPP Luxury Ingenieros s.a.s.
Anexo 9. permisos preoperacionales Luxury ingenieros s.a.s.
Anexo 10. permisos preoperacionales Proyectos y Edificaciones.
Anexo 11. exámenes ocupacionales contratistas.
Anexo 12. cartas de recomendaciones Proyectos y Edificaciones s.a.s.
Anexo 13. asistencia charla- capacitaciones - pausas activas Luxury Ingenieros s.a.s.
Anexo 14. capacitaciones proyectos y edificaciones s.a.s.
Anexo 15. plan de emergencias.
Anexo 16. certificados auxiliares de tránsito
Anexo 17. de inspección de botiquín, camilla y extintor.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Atención de PQRS:

Se atendió la PQRS recibida en el mes de junio:

PQRS	Nombre	Asunto	Fecha de respuesta
PQRS 6 de 24/06/2023	Edwin Álzate	Petición: El vehículo se rayó con una carreta de la obra que estaba salida del área encerrada para las obras del parque, por lo cual solicita la restauración de las piezas dañadas.	12/07/2023

Inicialmente se revisaron las condiciones establecidas desde la Empresa Constructora para la circulación de vehículos en el área del incidente, identificando que se contaba con espacio suficiente.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía 121. Espacio para circulación de vehículos en la calle 31, entre las carreras 30 y 31

Posteriormente se realizó recorrido validando la existencia de la señalización reglamentaria.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

<table>
<tr><td>
</td><td></td></tr>
<tr><td>Fotografía 122. Señalización vertical.</td><td>Fotografía 123. Señalización vertical.</td></tr>
<tr><td></td><td>
</td></tr>
<tr><td>Fotografía 124. Señalización vertical.</td><td>Fotografía 125. Barreras viales.</td></tr>
</table>

Se dio respuesta a través de correo electrónico el día 7 de julio de 2023, sin embargo, el mensaje no fue entregado y no se logró establecer contacto telefónico con el señor Edwin.

Posteriormente, el día 12 de julio, en conversación telefónica se le informó al señor Edwin que la Empresa haría un aporte económico de $ 300.000 (trescientos mil pesos) como medida de compensación.

El ciudadano se manifestó en desacuerdo con la respuesta recibida y solicitó que la situación fuera analizada nuevamente.

Atención a la comunidad:

Se realizó desmonte de campamento, cerramientos, cartelera y vallas informativas para la apertura del parque.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía 126. Cerramiento desmontado.



Fotografía 127. Cerramiento desmontado.



Fotografía 128. Campamento desmontado.




Fotografía 129. Parque abierto.

Actas de vecindad:

Se inició el proceso de cierre de actas de vecindad, para lo cual se realizaron visitas a cada uno de los predios.

N° Acta	Nombre	Fecha de elaboración	Fecha de cierre
AV 02	PARASOLES	21 de octubre de 2022	17 de julio de 2023
AV 04	BANCOLOMBIA	21 de octubre de 2022	17 de julio de 2023
AV 06	D1	21 de octubre de 2022	17 de julio de 2023
AV 07	BILLARES CALIFORNIA	21 de octubre de 2022	17 de julio de 2023
AV 08	LAS ORQUIDEAS	21 de octubre de 2022	17 de julio de 2023
AV 09	CAFETERIA Y POLLOS BOLIVAR	21 de octubre de 2022	17 de julio de 2023
AV 13	EL CARBÓN	21 de octubre de 2022	17 de julio de 2023
AV 56	VIVIENDA CRA 30 # 30 12 Y LOCAL CRA 30 # 30 18	31 de octubre de 2022	17 de julio de 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO

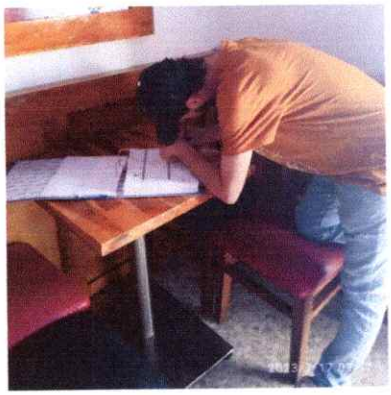	
Fotografía 130. Cierre AV 02.	Fotografía 131. Cierre AV 09.
	
Fotografía 132. Cierre AV 56.	Fotografía 133. Cierre AV 06.

Seguimiento en plazoleta de comidas:


Se continúa con los recorridos en la plazoleta de comidas y las vías cercanas, se identifica que se siguen presentando las situaciones que eventualmente pueden significar un riesgo para la ciudadanía:

- La existencia de un parqueadero de motos (Parqueadero de motos El Parque, ubicado en la carrera 31 número 30 61) posibilita la circulación de motos en la zona, no solo para el acceso y la salida del parqueadero, sino por toda la plazoleta de comidas y por el andén.
- La zona de cargue y descargue está ubicada dentro de la actual plazoleta de comidas; aunque se encuentran delimitados los espacios para el estacionamiento de seis vehículos, se ha evidenciado que estos circulan y estacionan en áreas distintas a las delimitadas.
- Se han demarcado los senderos vehiculares, peatonales y la zona de cargue y descargue; sin embargo, la ciudadanía no se acoge a estas demarcaciones.

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Fotografía 134. Vehículo de carga fuera de zona demarcada.

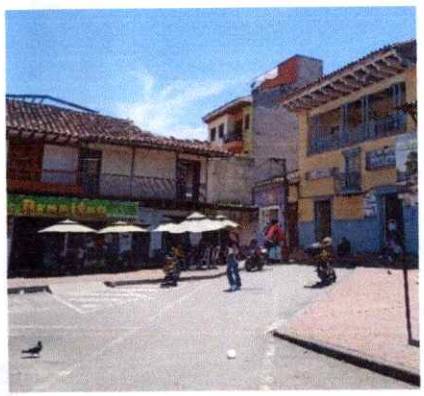

Fotografía 135. Parqueo de motos.



Fotografía 136. Vehículo de carga circulando en plazoleta de comidas.

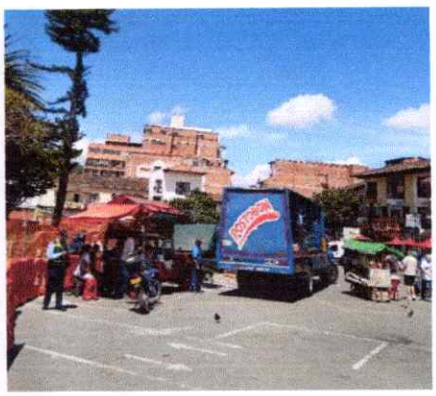

Fotografía 137. Vehículo de carga circulando en plazoleta de comidas.



Fotografía 138. Vehículo de carga circulando en plazoleta de comidas.






Fotografía 139. Vehículo de carga fuera de zona demarcada.

FICHA GA-09. MANEJO DE CONTINGENCIAS.


Se recibió capacitación de brigada por parte de la ARL COLMENA en valoración primaria y secundaria, manejo de heridas, hemorragias y vendajes, camillaje e inmovilización, quemaduras, tipos de fuego y extintores con el fin de reconocer y brindar la primera atención en caso de presentarse una emergencia. También mantuvo implementadas las medidas estipuladas en el plan de contingencias como un punto seguro el cual cuenta con extintor multipropósito y botiquín de primeros auxilios; señalización de los frentes de obra con las rutas de evacuación, puntos de encuentro y medidas seguras a implementar en obra, permaneció instalada la información de los contactos de emergencia en un punto visible en caso de algún evento contingente. Se verifico la seguridad social de cada persona antes de ingresar a la obra.

REGISTRO FOTOGRAFICO
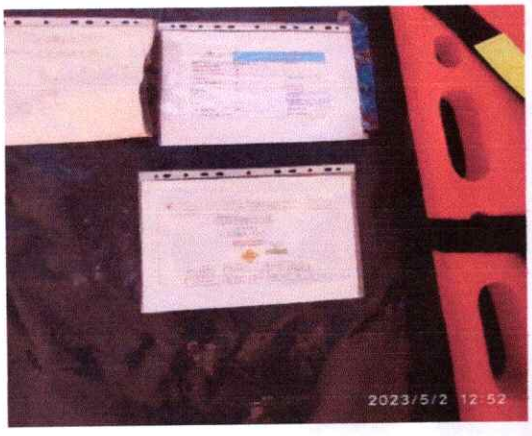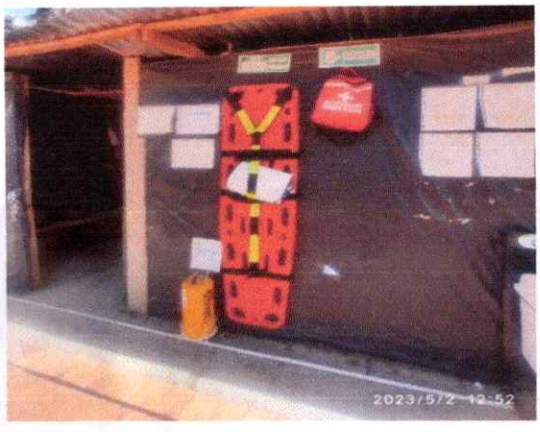
<table>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Fotografía 140. Señalización salida de emergencias.</td><td>Fotografía 141. Señalización protección.</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Fotografía 142. Contactos de emergencia</td><td>Fotografía 143. Punto seguro</td></tr>
</table>

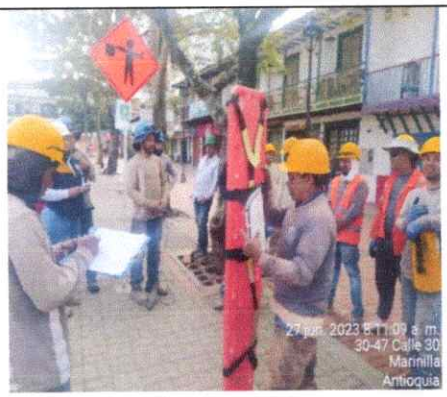

Fotografía 144. Capacitación ARL simulacro

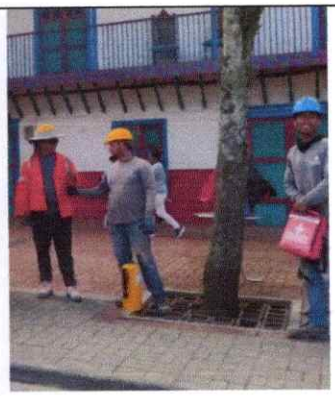

Fotografía 145. Capacitación ARL




Fotografía 146. Brigada atención primaria y secundaria.





Fotografía 147. Brigada de camillaje e inmovilización



Fotografía 148. Tipos de fuego y extintores

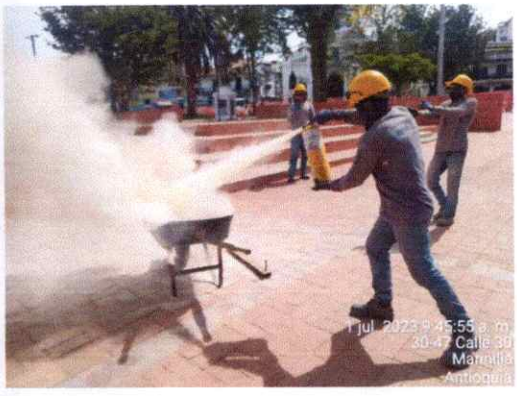

Fotografía 149. Practica de extintores

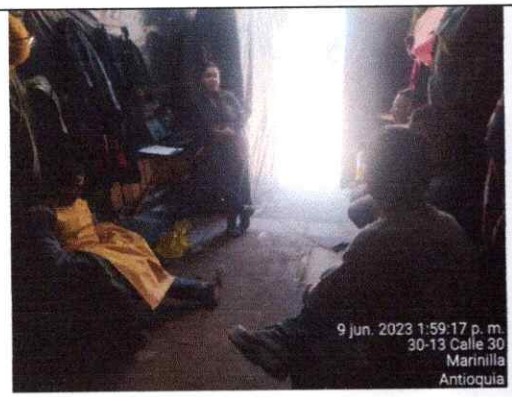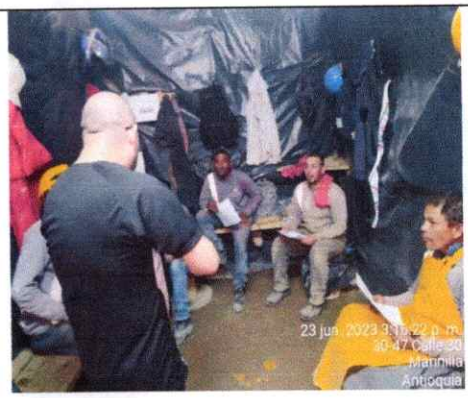	
Fotografía 150. Capacitación quemaduras-tipos de fuego y extintores	Fotografía 151. Capacitación de manejo heridas, hemorragias y vendaje.

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-07-12, 03:58:30 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 63899586

Periodo Cotización: junio de 2023 **Periodo Servicio:** julio de 2023

PAGADO 12/07/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUXURY INGENIEROS SAS		
Documento	NI901148673	**Dirección**	CL 51CLL #52 CLL - 35 RIOINEGRO
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5312571
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	RIONEGRO	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	SIERRA JIMENEZ SEBASTIAN	**Identificación**	CC 1036947694
Total Afiliados	6	**ARP**	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	ISC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICEF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1032070398	GLENYS YULIANA VARGAS HENAO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.000.000	$ 80.000	8,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF04) COMFAMA	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 1036947694	SEBASTIAN SIERRA JIMENEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.000.000	$ 80.000	8,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF04) COMFAMA	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 1036955094	FRANKLIN ANDRES HENAO RUIZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	8,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1038412719	SARA ALZATE ZULUAGA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.500.000	$ 100.000	8,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF04) COMFAMA	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 1087060811	LUIS FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.500.000	$ 100.000	8,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF04) COMFAMA	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 71727798	VLADIMIR URREA MUÑOZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	8,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 11.320.000	$ 11.320.000	$ 11.320.000	$ 11.320.000	$ 1.811.200	$ 452.800	$ 788.000	$ 452.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.504.800	$ 0	$ 3.504.800

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-07-24, 11:36:44 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 63903113

Periodo Cotización: junio de 2023 **Periodo Servicio:** junio de 2023

PAGADO 12/07/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ALEXANDER		
Documento	CC15448588	**Dirección**	CL 51 #52 - 35
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5618257
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	RIONEGRO	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio
CC 15448588	ALEXANDER SIERRA JIMENEZ	03	00																		0	30	0	0	(231001) COLFONDOS	$ 1.600.000	$ 256.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.600.000	$ 200.000	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.600.000	$ 1.600.000	$ 0	$ 0	$ 256.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 456.000	$ 0	$ 456.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-07-17, 12:27:05 PM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Numéro Planilla:** 63900388

Periodo Cotización: junio de 2023 **Periodo Servicio:** junio de 2023

PAGADO 12/07/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUXURY INGENIEROS SAS		
Documento	NI901148673	**Dirección**	CL 51CLL #52 CLL - 35 RIOINEGRO
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5312571
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	RIONEGRO	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	SIERRA JIMENEZ SEBASTIAN	**Identificación**	CC 1036947694
Total Afiliados	1	**ARP**	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días CCF	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio
CC 15448588	ALEXANDER SIERRA JIMENEZ	59	00																		0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.600.000	$ 111.400	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 0	$ 1.600.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 111.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 111.400	$ 0	$ 111.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 365 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-07-17, 12:32:37 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 63814635

Periodo Cotización: junio de 2023 **Periodo Servicio:** junio de 2023

PAGADO 09/06/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DIANA NORELA CASTRILLON		
Documento	CC21492275	**Dirección**	CL 29 #34 - 15 INTERIOR 302
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6100952
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MARINILLA	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días ERP	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio
CC 21492275	DIANA NORELA CASTRILLON GAVIRIA	03	00																0	30	30	0	0	(230201) PROTECCION	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.800.000	$ 225.000	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.800.000	$ 1.800.000	$ 0	$ 0	$ 288.000	$ 225.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 513.000	$ 0	$ 513.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

236

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-07-17, 12:27:03 PM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Numéro Planilla:** 63899754

Periodo Cotización: junio de 2023 **Periodo Servicio:** junio de 2023

PAGADO 12/07/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUXURY INGENIEROS SAS		
Documento	NI901148673	**Dirección**	CL 51CLL #52 CLL - 35 RIOINEGRO
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5312571
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	RIONEGRO	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	SIERRA JIMENEZ SEBASTIAN	**Identificación**	CC 1036947694
Total Afiliados	1	**ARP**	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días UPC adicional	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio
CC 21492275	DIANA NORELA CASTRILLON GAVIRIA	59	00																		0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.800.000	$ 125.300	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 0	$ 1.800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.300	$ 0	$ 125.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 39450562		ARENAS GARCIA SANDRA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	vereda abreo	RIONEGRO-ANTIOQUIA	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	50533178	9453614410	I	2023/07/17	2023/07/17	BANCOLOMBIA	0	$571,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,848,000	$295,700			$1,848,000	$231,000			$0	$0			$1,848,000		$45,100		$0	$0		$571,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,848,000	$295,700			$1,848,000	$231,000			$0	$0			$1,848,000		$45,100		$0	$0		$571,800
Ciudad: RIONEGRO Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																						$1,848,000	$295,700			$1,848,000	$231,000			$0	$0			$1,848,000		$45,100		$0	$0		$571,800
1	CC	39450562	ARENAS SANDRA								X									23020 1	30	$1,848,000	$295,700	EPS010	30	$1,848,000	$231,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,848,000	2.436%	$45,100	0	$0	$0	No	$571,800
Total	**Afiliados(1)**																					$1,848,000	$295,700			$1,848,000	$231,000			$0	$0			$1,848,000		$45,100		$0	$0		$571,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 39450562		ARENAS GARCIA SANDRA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	vereda abreo	RIONEGRO-ANTIOQUIA	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	50533178	9453614410	I	2023/07/17	2023/07/17	BANCOLOMBIA	0	$571,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$295,700	$0	$0	$295,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$295,700	$0	$0	$295,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$45,100	$0	$0	$45,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$45,100	$0	$0	$45,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$231,000	$0	$0	$231,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$231,000	$0	$0	$231,000
TOTAL				1	$571,800	$0	$0	$571,800

2023/07/17 08:44 AM

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-07-17, 12:27:08 PM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Numéro Planilla:** 63899966

Periodo Cotización: junio de 2023 **Periodo Servicio:** junio de 2023

PAGADO 12/07/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUXURY INGENIEROS SAS		
Documento	NI901148673	**Dirección**	CL 51CLL #52 CLL - 35 RIOINEGRO
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5312571
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	RIONEGRO	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	SIERRA JIMENEZ SEBASTIAN	**Identificación**	CC 1036947694
Total Afiliados	1	**ARP**	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	LAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días PRD	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio
CC 39450582	SANDRA PATRICIA ARENAS GARCIA	59	00																		0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 0	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.800	$ 0	$ 80.800

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

LUXURY
INGENIEROS

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIALY PARAFISCALES

Yo, (ANDRES FELIPE FLOREZ GOMEZ), identificado con cédula de ciudadaníaNo. 1038417514, y con Tarjeta Profesional No. 299202-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de contador de LUXURY INGENIEROS S.A.S identificada con NIT. 901148673-1 certifico que la empresa en el mes de marzo, abril y mayo del año en curso, legalmente ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Rionegro, a los 27 días del mes de julio de 2023

ANDRES FELIPE FLOREZ GOMEZ
CONTADOR PUBLICO
Cc:1038417514
TP. 299202-T

SEBASTIAN SIERRA JIMÉNEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.1036947694

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E 6 8 0 0 5 7 9 6 0 5 0 0 4 7 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANDRES FELIPE FLOREZ GOMEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1038417514 de MARINILLA (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 299202-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO


Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Mayo de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado





aseo global renovando el mundo	CONTROL DE AFOROS	aseo global renovando el mundo

INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

CONSECUTIVO:	SOL_130646	TIPO DE AFORO:	Permanente
CIUDAD:	Rio Negro	FECHA Y HORA:	2023-06-20 11:12:44

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CUENTA:	9320	TIPO DE CLIENTE:	Gran Productor
NOMBRE:	LUXURY INGENIEROS SAS - OBRA REMODELACIÃ"N PARQUE MARINILLA	CONTACTO:	
DIRECCION:	PARQUE PRINCIPAL MARINILLA	TELEFONO:	4879662
FRECUENCIA SEMANAL:	TODAS	DÍAS DE PRESTACION:	L-M-X-J-V (X=Miercoles)
CORREO CLIENTE:	sparenas@hotmail.com		

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

PLACA VEHÍCULO:	TOQ775	NÚMERO INTERNO:	TOQ775
CONDUCTOR:	JUAN HUMBERTO GARCIA MARIN		

DESCRIPCIÓN DEL AFORO PARA: No aprovechables

TIPO DE RECIPIENTE	DIMENSIÓN	EQUIVALENCIA M³	CANTIDAD	VOLUMEN (M³)	PESO (Kg)
CANECA X 55 GALONES	55 GL	0.21	3	0.63	0
BOLSA SEMI INDUSTRIAL	60 X 86 CM	0.05	15	0.75	0
			Total Aforado:	**1.38**	**0**

Observaciones:			
AFORADO POR:		**CLIENTE REPRESENTANTE O TESTIGO**	
 FIRMA		 FIRMA	
NOMBRE:	JUAN HUMBERTO GARCIA MARIN	NOMBRE:	SANDRA PATRICIA ARENAS
CC:	15437265	CC:	

aseo global renovando el mundo	CONTROL DE AFOROS	aseo global renovando el mundo

INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

CONSECUTIVO:	SOL_131255	TIPO DE AFORO:	Permanente
CIUDAD:	Rio Negro	FECHA Y HORA:	2023-06-23 11:49:07

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CUENTA:	9320	TIPO DE CLIENTE:	Gran Productor
NOMBRE:	LUXURY INGENIEROS SAS - OBRA REMODELACIÃ"N PARQUE MARINILLA	CONTACTO:	
DIRECCION:	PARQUE PRINCIPAL MARINILLA	TELEFONO:	4879662
FRECUENCIA SEMANAL:	TODAS	DÍAS DE PRESTACION:	L-M-X-J-V (X=Miercoles)
CORREO CLIENTE:	sparenas@hotmail.com		

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

PLACA VEHÍCULO:	TOQ775	NÚMERO INTERNO:	TOQ775
CONDUCTOR:	JUAN HUMBERTO GARCIA MARIN		

DESCRIPCIÓN DEL AFORO PARA: No aprovechables

TIPO DE RECIPIENTE	DIMENSIÓN	EQUIVALENCIA M³	CANTIDAD	VOLUMEN (M³)	PESO (Kg)
CANECA X 55 GALONES	55 GL	0.21	2	0.42	0
			Total Aforado:	**0.42**	**0**

Observaciones:			
AFORADO POR:		**CLIENTE REPRESENTANTE O TESTIGO**	
 FIRMA		Yuliana V FIRMA	
NOMBRE:	JUAN HUMBERTO GARCIA MARIN	NOMBRE:	SANDRA PATRICIA ARENAS
CC:	15437265	CC:	

aseo global	CONTROL DE AFOROS	aseo global

INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

CONSECUTIVO:	SOL_131679	TIPO DE AFORO:	Permanente
CIUDAD:	Rio Negro	FECHA Y HORA:	2023-06-27 11:18:27

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CUENTA:	9320	TIPO DE CLIENTE:	Gran Productor
NOMBRE:	LUXURY INGENIEROS SAS - OBRA REMODELACIÃ"N PARQUE MARINILLA	CONTACTO:	
DIRECCION:	PARQUE PRINCIPAL MARINILLA	TELEFONO:	4879662
FRECUENCIA SEMANAL:	TODAS	DÍAS DE PRESTACION:	L-M-X-J-V (X=Miercoles)
CORREO CLIENTE:	sparenas@hotmail.com		

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

PLACA VEHÍCULO:	TOQ775	NÚMERO INTERNO:	TOQ775
CONDUCTOR:	JUAN HUMBERTO GARCIA MARIN		

DESCRIPCIÓN DEL AFORO PARA: No aprovechables

TIPO DE RECIPIENTE	DIMENSIÓN	EQUIVALENCIA M³	CANTIDAD	VOLUMEN (M³)	PESO (Kg)
BULTO	70 X 120 CM	0.111	8	0.888	0
CANECA X 55 GALONES	55 GL	0.21	1	0.21	0
			Total Aforado:	**1.098**	**0**

Observaciones:			
AFORADO POR:		**CLIENTE REPRESENTANTE O TESTIGO**	
 FIRMA		 FIRMA	
NOMBRE:	JUAN HUMBERTO GARCIA MARIN	NOMBRE:	SANDRA PATRICIA ARENAS
CC:	15437265	CC:	

242
