BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: FDLBU.

FECHA: 7 Jul/10 2023 **Virtual:** ___ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** X

OBJETO DE LA REUNIÓN: Preseleccion Segmentos para terminar cto 211-2023. (Presentacion Sr. Alcalde)

HORA DE INICIO: 11:00. **HORA DE FINALIZACIÓN:** 2:00.

ASISTENTES: Equipo INFRAESTRUCTURA

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Andres Chavarro			X						X	FDLBU- Infraestructura	andres.chavarro@	3334591412	
Geovanny Rojas Castro			X						X	FDLBU - Infraestructura	geovanny.rojas@gobt.	3137633971	
Sonia Murcia. Nosse			X						X	FDLBU- Infraestructu	sonia.murc@gobto	3142100542	
Pablo Giovanny Parra Pinto			X						X	FDLBU - Infraestructura	pablo.parra@gob...	3112356860	

NOTA: **En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.**

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

ESTADO	OBSERVACION	CIV	Eje Vial	Desde	Hasta	UPZ	Nombre UPZ	Nombre Sector Catastral
No amerita intervención inmediata	SI EVALUACION MANT	12000598	CL 77	KR 63	KR 64	UPZ22	DOCE DE OCTUBRE	SIMON BOLIVAR
No amerita intervención inmediata	SI EVALUACION MANT	12002119	CL 71	KR 27A	KR 27B	UPZ98	LOS ALCAZARES	ALCAZARES
Rehabilitación y/o reconstrucción	SI EVALUACION MANT	12000934	KR 65	AC 68	CL 70	UPZ22	DOCE DE OCTUBRE	AN FERNANDO OCCIDENTA
Rehabilitación y/o reconstrucción	SI EVALUACION MANT	12003324	CL 63F	KR 28B	AK 30	UPZ98	LOS ALCAZARES	BENJAMIN HERRERA
Segmentos Viales para Intervención	NO EVALUACION	12000250	KR 57	CL 94B	CL 94C	UPZ21	LOS ANDES	RIONEGRO
Segmentos Viales para Intervención	SI EVALUACION AM	12000829	KR 65B	AC 68	AC 72	UPZ22	DOCE DE OCTUBRE	SAN FERNANDO OCCIDENTAL
Segmentos Viales para Intervención	SI EVALUACION MANT	12000283	CL 94	KR 60B	TV 60C	UPZ21	LOS ANDES	RIONEGRO
Segmentos Viales para Intervención	NO EVALUACION	12001442	KR 58	AC 68	CL 70A	UPZ22	DOCE DE OCTUBRE	SAN FERNANDO OCCIDENTAL
Segmentos Viales para Intervención	SI EVALUACION MANT	12001849	CL 70 A	KR 50	KR 51	UPZ22	DOCE DE OCTUBRE	DOCE DE OCTUBRE
Segmentos Viales para Intervención	SI EVALUACION MANT	12000076	CL 99	KR 48	KR 49	UPZ21	LOS ANDES	LA CASTELLANA
Segmentos Viales para Intervención	NO EVALUACION	12001752	KR 50	CL 71A	CL 71C	UPZ22	DOCE DE OCTUBRE	DOCE DE OCTUBRE
Segmentos Viales para Intervención	NO EVALUACION	12001435	CL 76	KR 29B	KR 29C	UPZ98	LOS ALCAZARES	ONCE DE NOVIEMBRE
Segmentos Viales para Intervención	NO EVALUACION	12000072	CL 97	KR 64	KR 65	UPZ21	LOS ANDES	LOS ANDES
Segmentos Viales para Intervención	SI EVALUACION MANT	12001381	KR 29B	CL 77	CL 78	UPZ98	LOS ALCAZARES	SANTA SOFIA
Segmentos Viales para Intervención	NO	12000969	KR 54	DG 78BIS	CL 79	UPZ22	DOCE DE OCTUBRE	JORGE ELIECER GAITAN
Segmentos Viales para Intervención	NO	12000091	CL 98A	KR 51	KR 52	UPZ21	LOS ANDES	LA CASTELLANA
Segmentos Viales para Intervención	SI EVALUACION AM	12002165	CL 71	AK 24	KR 25	UPZ98	LOS ALCAZARES	ALCAZARES
Segmentos Viales para Intervención	NO EVALUACION	12000357	KR 57A	CL 93A	CL 93B	UPZ21	LOS ANDES	RIONEGRO
Segmentos Viales para Intervención	NO	12000526	KR 65	CL 77	CL 78	UPZ22	DOCE DE OCTUBRE	METROPOLIS
Segmentos Viales para Intervención	SI	12000641	CL 86C	KR 49C	KR 49D	UPZ21	LOS ANDES	LA PATRIA
Segmentos Viales para Intervención	NO EVALUACION	12000303	CL 94	KR 57	KR 58	UPZ21	LOS ANDES	RIONEGRO
Segmentos Viales para Intervención	SI	12000673	KR 58	CL 79	CL 79A	UPZ22	DOCE DE OCTUBRE	JORGE ELIECER GAITAN
Segmentos Viales para Intervención	NO EVALUACION	12002621	KR 16	CL 65A	CL 66	UPZ98	LOS ALCAZARES	LA ESPERANZA
Segmentos Viales para Intervención	NO	12000695	CL 86C	KR 49A	KR 49C	UPZ21	LOS ANDES	LA PATRIA
Segmentos Viales para Intervención	NO EVALUACION	12000575	KR 49C	CL 87	CL 88	UPZ21	LOS ANDES	LA PATRIA
Segmentos Viales para Intervención	SI EVALUACION AM	12000251	CL 94B	KR 57	KR 57A	UPZ21	LOS ANDES	RIONEGRO
Segmentos Viales para Intervención	SI	12000880	KR 62	CL 74	CL 74A	UPZ22	DOCE DE OCTUBRE	SAN FERNANDO OCCIDENTAL
Segmentos Viales para Intervención	NO	12000917	TV 56A	DG 76A	KR 56BIS	UPZ22	DOCE DE OCTUBRE	JORGE ELIECER GAITAN
Segmentos Viales para Intervención	NO	12000965	TV 56A	CL 76	DG 76A	UPZ22	DOCE DE OCTUBRE	JORGE ELIECER GAITAN
Segmentos Viales para Intervención	SI EVALUACION MANT	12001856	KR 51	CL 70	DG 71BIS	UPZ22	DOCE DE OCTUBRE	SAN FERNANDO
Segmentos Viales para Intervención	NO EVALUACION	12000122	CL 97	KR 61BIS	KR 61A	UPZ21	LOS ANDES	LOS ANDES
Segmentos Viales para Intervención	SI EVALUACION MANT	12001125	CL 85A	AK 20	KR 21	UPZ98	LOS ALCAZARES	POLO CLUB
Segmentos Viales para Intervención	NO	12000635	KRA 65	CL 75	CI 75	UPZ22	DOCE DE OCTUBRE	SIMON BOLIVAR
Segmentos Viales para Intervención	NO EVALUACION	12000058	CL 97	KR 65	KR 65A	UPZ21	LOS ANDES	LOS ANDES
Segmentos Viales para Intervención	NO	12000070	CL 99	KR 49	KR 52	UPZ21	LOS ANDES	LA CASTELLANA
Segmentos Viales para Intervención	NO EVALUACION	12000664	KR 60	CL 78A	DG 79B	UPZ22	DOCE DE OCTUBRE	LA LIBERTAD
Segmentos Viales para Intervención	NO EVALUACION	12000651	CL 86B	KR 49D	AK 50	UPZ21	LOS ANDES	LA PATRIA
Segmentos Viales para Intervención	SI	12000725	KR 49A	CL 86B	CL 86C	UPZ21	LOS ANDES	LA PATRIA
Segmentos Viales para Intervención	NO EVALUACION	12000766	CL 79	KR 56	KR 56BIS	UPZ22	DOCE DE OCTUBRE	JORGE ELIECER GAITAN
Segmentos Viales para Intervención	NO EVALUACION	12000788	KR 62	CL 75	CL 75A	UPZ22	DOCE DE OCTUBRE	LA LIBERTAD
Segmentos Viales para Intervención	NO EVALUACION	12000582	CL 88B	KR 49	CL 90	UPZ21	LOS ANDES	LA PATRIA
Segmentos Viales para Intervención	NO	12000527	KR 62	CL 79BIS	CL 79A	UPZ22	DOCE DE OCTUBRE	LA LIBERTAD
Segmentos Viales para Intervención	SI EVALUACION AM	12001100	KR 21	CL 85A	CL 86	UPZ98	LOS ALCAZARES	POLO CLUB
Segmentos Viales para Intervención	SI EVALUACION MANT	12001099	CL 72A	KR 60	KR 61	UPZ22	DOCE DE OCTUBRE	SAN FERNANDO OCCIDENTAL
Segmentos Viales para Intervención	SI EVALUACION MANT	12001030	CL 74A	KR 58	KR 60	UPZ22	DOCE DE OCTUBRE	SAN FERNANDO OCCIDENTAL

ESTADO	OBSERVACION	CIV	Eje Vial	Desde	Hasta	UPZ	Nombre UPZ	Nombre Sector Catastral
Segmentos Viales para Intervención	NO EVALUACION	12001022	KR 57	CL 75ABIS	TV 56A	UPZ22	DOCE DE OCTUBRE	LA LIBERTAD
Segmentos Viales para Intervención	NO EVALUACION	12000973	CL 86		KR 28	UPZ98	LOS ALCAZARES	POLO CLUB
Segmentos Viales para Intervención	SI EVALUACION AM	12000899	KR 49A	CL 84	CL 85	UPZ21	LOS ANDES	LA PATRIA
Segmentos Viales para Intervención	SI EVALUACION MANT	12000432	KR 60A	CL 91A	CL 91B	UPZ21	LOS ANDES	RIONEGRO
Segmentos Viales para Intervención	SI EVALUACION AM	12000406	KR 60	CL 92	CL 93	UPZ21	LOS ANDES	RIONEGRO
Segmentos Viales para Intervención	NO EVALUACION	12000408	KR 49B	CL 93	CL 94	UPZ21	LOS ANDES	LA CASTELLANA
Segmentos Viales para Intervención	NO EVALUACION	12000489	CL 79	KR 64	KR 65	UPZ22	DOCE DE OCTUBRE	SIMON BOLIVAR
Segmentos Viales para Intervención	SI EVALUACION MANT	12002745	KR 16	CL 63B	CL 63C	UPZ98	LOS ALCAZARES	LA ESPERANZA

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN: 7.07.2023

CONTESTO 211 | 2022

Ejecutadas Mto – 67
Acciones – 6.

Fijo Adicionale Que Escogio Alcalde
12 000 725
12 000 641
12 000 880
12 000 673

Fijo 10 No Van. Se. Alcalde
12000 070 ✓
12000 091 ✓
12000695 ✓
12000526 ✓
12000 635 ✓
12000 829 ✓
12000527 ✓
12000 969 ✓
12000 965 ✓ (No) Junto ceño. Reiterado.
12000 917 ✓

Mto.
076 – Clinica Verny Sol.z – Sale 100 Orej. atravesar calles 30%
122 – No
058 – No
250 – No
203 – No
357 – No (Parqueo talleres – via Cerrada)
406 – Accion Movilidad.
432 – Via Corta Cerrada. Talleres. (Si) Mto. Concreto
408 – No
582 – No – Cerrada.
651 – No – Buen Estado General.
717 – No – Buen estado General.

Acción Movilidad.
251. Si
406. Si

899 – Accion Movilidad. –
1100 – Mto. Urgente (2 oficios)
973 – No Buen Estado
JAL 1055 – No. Buen Estado.
1194 – No Buen Estado.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
	CIV. 1381. Si - Cerca parque y Movilidad. - mto. ✓		
	1435 No - Buen Estado. General.		
	1735 No - Buen Estado.		
	2165 NO - Mto - Se hace Acera Movilidad.		
	2389 → No Div IQ Reserva		
	2621 - No Buen Estado.		
	1752 - No Buen Estado		
	1849 - Si Mto. * consulta.		
	1856 - Si mto. sale canal - descargadero obras de Canal.		
	1442 - No Bto Estado. General.		
	1069 - OK.		
	829 - No. alcalde. (Acera Movilidad) ✓ Si.		
	1099 - Sio Regular Estado. alto. flgo. sale. Cruce.		
	1030 - Si - cerca a una. Sipi		
	788 - NO - Señalizar		
	489 - No - Buen Estado		
	654 - No Buen Estado.		
	1022 - NO Buen Estado		
	766 - No Buen Estado.		
	969. - No. Buen Estado.		
	* 3324 - Si Mto. Indicio alto		
	2919. - Si Alcaldesa. sale 24.		
	1381 - Acción Movilid.		
	Presentarle ~~Exclusa~~ — 283 Si. Mto. Bueno.		
	1125 - Estado pto. - autopista *		
	2745 - Mto Si. (Placeres.)		
	598 - Vía Metrópolis (Si)		
	1654 - SIN Reserva. 1651 - SIN Reserva (211)		

Elaborada por:

Fecha de la próxima reunión: Lugar de la próxima reunión:

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar todos los compromisos de la reunión.

Resumen.

7.7.2023 Contrato 211-2023. Tiene la siguiente ejecución.

Mantenimiento: Ejecutado
43. Mto
24 Sello fisuras.
6 Acción Madidal.
73. > 67

Preseleccionado Comité técnico:

Mantenimto: 18 (14+4)

Acciones de Mould. (6) propuestas.

Total 24 segmentos propuestos.

Resumen total intev. 211.

Mto { Ejecutados 67 / x Ejecutar. 18 = 85

Acciones { Ejecutas 6 / x Ejecutar. 6 = 12

- (97 intervenidos)

INFORME SEMANAL

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	FDLBU -217-2022				
OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORIA	"Interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, social, ambiental y sistema de seguridad y salud en el trabajo, del contrato de obra que se derive de la licitación pública FDLBU -215-2022 cuyo objeto es contratar por el sistema de precios unitarios fijos y a monto agotable el mantenimiento de la malla vial local e intermedia de la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá D.C.,				
SEMANA No.	33	DEL	domingo, 25 de junio de 2023	AL	sábado, 1 de julio de 2023
TIEMPO (días) TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	227	NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISOR	Geovanny Rojas Castro		

CONTRATO DE OBRA	
Contratista	CUMBRE INGENIERÍA S.A.S
Nit	900321674-6
Contrato No.	No. 211-2022 COP (71773)
Representante Legal	LEONARDO IVAN RAMÍREZ BERNAL
Fecha de suscripción del contrato	viernes, 16 de septiembre de 2022
Valor Inicial	$4.500.000.000,00
Plazo Inicial	10 meses
Plazo Actualizado	14 meses
Fecha de Iniciación	viernes, 16 de septiembre de 2022
Fecha de Terminación*	sábado, 15 de julio de 2023
Valor Adición 1	$2.250.000.000,00
Plazo Prorroga 1	4 meses
Plazo Total de Obra	14 meses
Valor Total del Contrato	$6.750.000.000,00
Fecha Actualizada de Terminación	miércoles, 15 de noviembre de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Interventor	CONSORCIO LUZIANA 2022 BARRIOS UNIDOS
Nit	901624816-1
Contrato No.	217 de 2022
Representante Legal	ELKIN JAVIER PINEDA
Fecha de suscripción del contrato	viernes, 16 de septiembre de 2022
Valor Inicial	$ 449.981.138,50
Plazo Inicial	10 meses
Plazo Actualizado	10 meses
Fecha de Iniciación	viernes, 16 de septiembre de 2022
Fecha de Terminación	sábado, 15 de julio de 2023
Valor Adición 1	$213.506.736,50
Plazo Prorroga 1	4 meses
Plazo Total de Obra	14 meses
Valor Total del Contrato	$663.487.875,00
Fecha Actualizada de Terminación	miércoles, 15 de noviembre de 2023

* Se pueden adicionar celdas de acuerdo a prorrogas

II. INFORMACIÓN DE PÓLIZAS

CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
AMPARO	VIGENCIA (Desde- hasta)	VALOR	AMPARO	VIGENCIA (Desde- hasta)	VALOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/09/2022-15/01/2024	$ 1.350.000.000,00	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/09/2022- 16/07/2023	$ 89.996.227,00
PAGO DE SALARIOS	16/09/2022-16/07/2026	$ 225.000.000,00	PAGO DE SALARIOS	16/09/2022- 16/07/2026	$ 22.499.056,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD	2 AÑOS, 9 MESES Y 30 DIAS	$ 1.350.000.000,00	ESTABILIDAD Y CALIDAD	16/09/2022- 16/07/2025	$ 89.996.227,50
PRESIOS LABORES Y OPERACINES	16/09/2022- 15/01/2024	$ 400.000.000,00	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (adicion y prorroga 1)	23/12/2022- 16/03/2024	$ 132.697.575,20
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	16/09/2022- 15/01/2024	$ 40.000.000,00	PAGO DE SALARIOS (adición y prorroga 1)	23/12/2022- 16/01/2026	$ 33.174.393,80
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	16/09/2022- 15/01/2024	$ 40.000.000,00	ESTABILIDAD Y CALIDAD (adición y prorroga 1)	23/12/2022- 15/11/2026	$ 132.697.575,20
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO adicion y prorroga 1)	16/09/2022- 15/01/2024	$ 2.025.000.000,00			
PAGO DE SALARIOS adicion y prorroga 1)	16/09/2022- 16/07/2024	$ 337.500.000,00			
ESTABILIDAD Y CALIDAD adicion y prorroga 1)	16/09/2023- 16/07/2024	$ 2.025.000.000,00			

III. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	%avance de cada actividad realizada por CIV semanalmente	Descripción de la Actividad
1	CIV 12000623	26/06/2023	27/06/2023	100%	Se realizan los cortes de pavimento flexible existente segun lo acordado durante el recorrido con la supervisión, se hace la demolición, cargue y transporte del escombro resultante
2	CIV 12000623	27/06/2023	28/06/2023	100%	Se compacta la base, se identifican los fallos y se estabiliza el suelo, se ajustan niveles
3	CIV 12002051	29/06/2023	29/06/2023	100%	Durante el proceso de retiro de fallos, se evidencia mangueras de agua potable superficiales, en la cual se vieron afectadas en el proceso de estabilización, se realiza el mantenimiento y el restablecimiento del servicio a la residencia
4	CIV 12000623	29/06/2023	29/06/2023	50%	Imprimación, extendida, compactación y sello de asfalto del área que se esta interviniendo. Debido a inconvenientes de la planta de Asfaltos PAVIOBRAS se tuvo que reprogramar el asfalto faltante para el dia siguiente
5	CIV 12000623	29/06/2023	30/06/2023	100%	Se extiende, se realiza compactación y sello de asfalto en el área que hacia falta por intervenir
6	CIV 12000623	01/07/2023	1/07/2023	100%	Se realiza retiro de cerramiento, aseo y organización al CIV
7	CIV 12000717	30/06/2023	30/06/2023	100%	Se realizan los cortes de pavimento flexible existente, se hace la demolición, cargue y transporte del escombro resultante. Se hace la imprimación, extendida, compactación y sello de asfalto de los parches intervenidos. "Es importante recalcar que las actividades ejecutadas en el segmento, se ejecutaron pese a que nosotros como interventoria solicitamos detener las actividades, ya que en este segmento no se habia realizado el recorrido previo junto a la supervisión y tampoco se habia iniciado instalar toda la señalización vertical contemplada en el PMT, ni se contaba con la socialización con la comunidad que hace parte de este segmento
8	CIV 12002051	28/06/2023	28/06/2023	100%	Se realiza Cerramiento perimetral y actividad de imprimación del tramo pendiente por instalación de asfalto

INFORME SEMANAL

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	FDLBU -217-2022
OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORIA	"Interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, social, ambiental y sistema de seguridad y salud en el trabajo, del contrato de obra que se derive de la licitación pública FDLBU -215-2022 cuyo objeto es contratar por el sistema de precios unitarios fijos y a monto agotable el mantenimiento de la malla vial local e intermedia de la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá D.C.,

SEMANA No.	33	DEL	domingo, 25 de junio de 2023	AL	sábado, 1 de julio de 2023

9	CIV 12002051	29/06/2023	29/06/2023	100%	Se termina de realizar de instalar asfalto en la zona que hizo falta por instalar asfalto, con su respectiva compactación y sello
10					


PROGRAMADO			EJECUTADO		
AVANCE	SEMANAL	ACUMULADO	AVANCE	SEMANAL	ACUMULADO
VALOR ($)	$ 136.520.451,86	$ 3.629.972.614,88	VALOR ($)	$ 123.183.818,72	$ 4.834.709.762,09
%	53,78%		%	71,63%	

El presente informe viene ajustado y actualizado con la información de programado semanal y acumulado, al igual que el porcentaje, esto de acuerdo al flujo de caja y programación V3 presentado por el contratista, con la observación que se debía incluir con las priorizaciones de la UMV y acueducto

A corte de la semana del 01 de julio, **según la programación entregada por el contratista estarían al 55% del avance**

Con respecto al flujo de caja que es el que se esta relacionando en el informe, **llevan 53,78% en lo programado**

El avance real del contrato al 01 de julio llevan un avance del **71,63% con respecto al total del contrato**

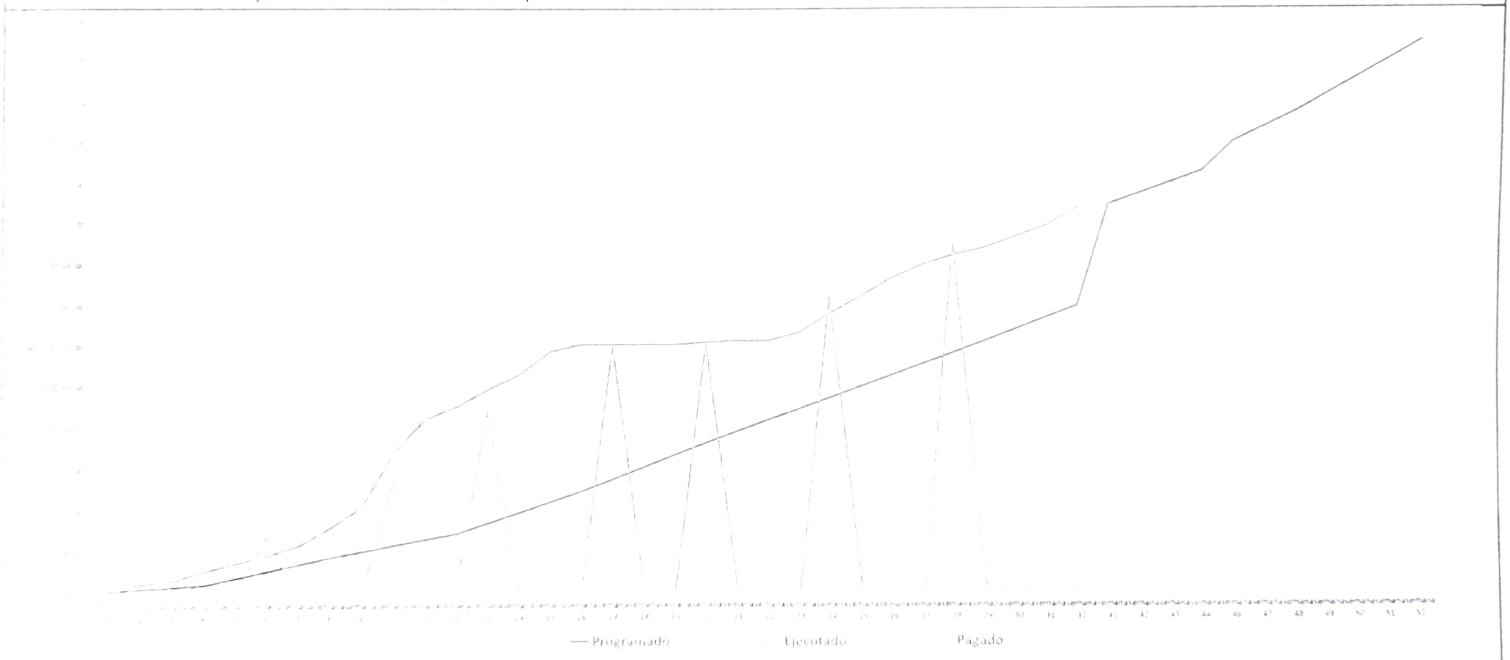

Seguimiento Ruta Critica

Actividad	Fecha Programada Inicio	Fecha Inicio Real	Tiempo de holgura	Tiempo de Ejecución	Atraso	OBSERVACIONES

IV. SEGUIMIENTO A PLANES COMPLEMENTARIOS

Aspecto Legal y Administrativo

Dentro del presente informe se anexa copia de la póliza de responsabilidad civil aportada por el contratista incluyendo la adición de los 4 meses que se aprobó en el mes de diciembre del 2022

Se anexa el reporte de la plataforma SUPERVISA con el Flujo de caja, Balance y Presupuesto de CIVMADE, este aprobado y se avalo por parte de la interventoría y quedo soportado mediante el oficio LUZ22BU-2022-132 - Anexo_01_Balance_programacion_Flujo de caja_Presupuesto por CIVMADE con fecha 29 de marzo del presente año

De acuerdo a los soportes entregados por el contratista, el presente informe se encuentra actualizado con la programación y flujo de caja entregado y avalado

Aspecto Financiero

INFORME SEMANAL

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	FDLBU -217-2022				
OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORIA	"Interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, social, ambiental y sistema de seguridad y salud en el trabajo, del contrato de obra que se derive de la licitación pública FDLBU -215-2022 cuyo objeto es contratar por el sistema de precios unitarios fijos y a monto agotable el mantenimiento de la malla vial local e intermedia de la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá D.C.,				
SEMANA No.	33	DEL	domingo, 25 de junio de 2023	AL	sábado, 1 de julio de 2023

Aspecto Técnico

Esta semana se presentaron lluvias fuertes durante todo el día varios días

Durante la semana se reactiva actividades de intervención de las obras

12000623 Se realiza el recorrido para verificación de las áreas que se encuentran con un alto deterioro para garantizar el porcentaje de intervención dada en las fichas de diagnostico inicial, se realiza la respectiva demarcación de las zonas indicadas
Se realiza cerramiento al CIV y se deja con corte de asfalto cerca de las bocacalles, esto de acuerdo a demarcación para su intervención para mantener el % de intervención
Se realiza replanteo General del CIV
Se realiza demolición en las áreas que se determinaron para su intervención
Se realiza retiro del asfalto existente y se procede a compactar las áreas intervenidas
Se evidencia varios fallos, se procede a estabilizarlos
Se rehabilita manguera de 1/2 in que se encontraba superficial y fue afectada en la intervención
Se instala asfalto con su respectiva compactación y sello
12000717. Se realiza el recorrido para verificación de las áreas que se encuentran con un alto deterioro para garantizar el porcentaje de intervención dada en las fichas de diagnostico inicial, se realiza la respectiva demarcación de las zonas indicadas
Se realiza cerramiento al CIV y se deja con corte se asfalto por las áreas demarcadas para su intervención
Se realiza replanteo General del CIV
Se realiza fresado en las áreas que se determinaron para su intervención
Cargue y retiro de material demolido
Se realiza retiro del asfalto existente y se procede a compactar las áreas intervenidas
Se instala asfalto con su respectiva compactación
12002051. Se termina de instalar asfalto en el área que quedo pendiente por instalar

SE ESTA PENDIENTE LA TOMA DE MEDIDA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTORIA PARA SOCIALIZAR CANTIDADES

Esta semana se realizo recorrido por cada uno de los Chivas la cual estos ya cuentan con PMT listos, esto con el fin de socializar las áreas a intervenir para cada uno de los tramos y definir la metodología en la que se van ha realizar las actividades, esto se realizo en compañía de las áreas técnicas de la supervisión, contratista e interventoría

Aspecto SST-Ambiental

Se le realiza la solicitud al contratista el mantenimiento de las mallas de protección a los sumideros durante la ejecución de obra
Se le solicita al contratista verbalmente la disponibilidad de personal para los cargos de Boal y auxiliares de trafico, pues es evidente que en el momento de intervenir mas de un segmento vial, se estarían teniendo frentes de obra sin el personal solicitado por el PMT y los requeridos para la ejecución de obra y su respectivo mantenimiento
Se le solicita al profesional SST que realice capacitación al personal de obra para el tema de uso de los equipos móviles en horas laborales y cumpliendo las actividades que se estén llevando a cabo, puesto que el personal se le ha evidenciando el incumplimiento de este
Se le solicita al contratista mas organización y orden en el momento de realizar el retiro de los cerramientos

Aspecto Social

Dando respuesta a los compromisos y aspectos establecidos en el apéndice social, se presenta a continuación reporte semanal respecto a las actividades realizadas con la comunidad:
1. Programa de Información
En la presente semana se realizó socialización de inicio de obra y socialización de PMT en los CIV´S 12000623 del Barrio L a Patria
2. Programa de divulgación
Para la presente semana se realizo la entrega de volantes de levantamiento de actas de vecindad primera visita en los CIV´S: 12000250 y 12000280 y entrega de copias de actas de vecindad en el CIV: 12000623 del barrio La Patria.
2.2. Instalación de PSI e inspección de vallas informativas
Para la presente semana se realizó instalación de PSI en los CIV´S: 12000623, como también se inspeccionaron las vallas informativas ubicadas en las zonas de intervención.
3. Programa Atención al Ciudadano
Para la presente semana se presentó una (1) PQRS por parte del ciudadano Orlando León, por daño de un paso en concreto del espacio público en el CIV :12000612, por lo tanto, se revisa la petición y se remite al componente técnico para programar el arreglo de la afectación.
4. Programa de Sostenibilidad
Para la presente semana se realizó la socialización y entrega de los boletines de sostenibilidad en el CIV: 12001848 del barrio Doce de Octubre.
5. Programa de formación a trabajadores adscritos a la obra
Para la presente semana se realizó capacitación a los trabajadores de la obra sobre el tema de diversidad e inclusión en el entorno laboral.
6. Programa para la generación de empleo
Para la presente semana no se contrató personal MONC
Por el momento contamos con el siguiente indicador de cumplimiento, el cual muestra que se cumple con el porcentaje de contratación exigida de MONC de la localidad de Barrios Unidos.

Tabla No. 13 Cumplimiento Indicadores Generación MONC

	Personal General Contratado	Personal Mano De Obra Calificada	Personal Mano De Obra No Calificada	Personal De La Localidad	Mujeres Contratadas
Cantidad	16	7	9	2	1
Porcentaje Cumplimiento	100%	44%	56%	22%	11%

7. Programa de Acompañamiento Social a Actividades Técnicas de Obra
Para la presente semana se realizaron los cierres de actas de vecindad en los CIV´S: 12001848 en el barrio Doce de Octubre
8. Actividades de seguimiento
Para la presente semana se asistió a comité de avance de obra en el CIV: 12001984

Aspecto PMT

El 05 de mayo fue radicado ante movilidad los diseños de demarcación a la secretaria de movilidad con el oficio LUZ22BU-2022-112 ENVIO PLANOS DE DISEÑOS DE SEÑALIZACION EN EL MARCO DEL CONTRATO 211 DE 2022 la cual tiene como número de radicación 2023ER120204140.42

Plan de Manejo de Trafico*

Identificación del PMT	Doc. Aprobación	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Prorroga No	Doc. Aprobación	Fecha Terminación
12000625 Calle 74A Carrera 66 Carrera 65B Local Mto periódico y/o Rutinario 12000611 Carrera 66 Calle 74 Calle 74A Local Mto periódico y/o Rutinario 12000893 Carrera 68 Calle 72A Calle 73 Local Mto periódico y/o Rutinario 12000785 Calle 72A Carrera 65 Carrera 65B Local Mto periódico y/o Rutinario 12000937 Calle 72A Carrera 63 Carrera 64 Local Mto periódico y/o Rutinario		11/11/2022	27/04/2023	N/A		27/04/2023

INFORME SEMANAL

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No	FDLBU -217-2022
OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORIA	"Interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, social, ambiental y sistema de seguridad y salud en el trabajo, del contrato de obra que se derive de la licitación pública FDLBU -215-2022 cuyo objeto es contratar por el sistema de precios unitarios fijos y a monto agotable el mantenimiento de la malla vial local e intermedia de la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá D.C."

SEMANA No	33	DEL	domingo, 25 de junio de 2023	AL	sábado, 1 de julio de 2023
[illegible]					
[illegible]	20226120400[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	20226120408[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	20236120043[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	20236120031[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	20236120053[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	20236120

INFORME SEMANAL

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	FDLBU -217-2022				
OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORIA	"Interventoria técnica, administrativa, legal, financiera, social, ambiental y sistema de seguridad y salud en el trabajo, del contrato de obra que se derive de la licitación pública FDLBU -215-2022 cuyo objeto es contratar por el sistema de precios unitarios fijos y a monto agotable el mantenimiento de la malla vial local e intermedia de la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá D.C."				
SEMANA No.	33	DEL	domingo, 25 de junio de 2023	AL	sábado, 1 de julio de 2023

V. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuara las actividades para los CIV s. 12000823
Se realizara instalación de PMT a los civ. 12000070 y 12000081 , posteriormente se iniciarian en el transcurso de la semana el inicio de actividades de obra

VI. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

En el siguiente cuadro se muestra el avance que tiene cada CIV intervenido hasta la fecha

ORDEN DE EJECUCIÓN	CIV	UBICACIÓN			% de intervención a recuperar por CIV	LONGITUD TRAMO (ml)	Km-Carril del segmento vial (m2)	FECHAS DE EJECUCION			Avance de ejecución de obra con asfalto del área recuperada %	Avance de obra demarcación vial %
		EJE	INICIO	FIN				INICIO	FINAL DE ACTIVIDADES	FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN		
1	12000611	Carrera 66	Calle 74	Calle 74A	100	48.46	0.154	15/11/2022	13/12/2022	31/01/2023	100	los diseños ya fueron radicados a SDM con radicado 20238120204 1842
2	12000883	Carrera 66	Calle 72A	Calle 73	100	48.1	0.135	21/11/2022	25/12/2022	31/01/2023	100	los diseños ya fueron radicados a SDM con radicado 20238120204 1842
3	12000784	Calle 72A	Carrera 65	Carrera 66B	100	96.3	0.243	28/11/2022	13/12/2022	31/01/2023	100	los diseños ya fueron radicados a SDM con radicado 20238120204 1842
4	12000937	Calle 72A	Carrera 63	Carrera 64	100	111.5	0.326	13/12/2022	20/12/2022	15/05/2023	100	los diseños ya fueron radicados a SDM con radicado 20238120204 1842
5	12001071	[illegible]	AC 68	AC 72	100	157.3	0.485	22/12/2022	[illegible]	AUN NO SE RECIBE A SATISFACCION	90	los diseños ya fueron radicados a SDM con radicado 20238120204 1842
6	12000670	[illegible]	KR 61	KR 64	100	95	0.24	3/01/2023	12/01/2023	15/02/2023	100	los diseños ya fueron radicados a SDM con radicado 20238120204 1842
7	12000682	[illegible]	KR 62	KR 63	80	74.5	0.192	6/01/2023	12/01/2023	28/02/2023	100	
8	12000566	KR 62	CL 78	CL 78A	100	44.1	0.106	12/01/2023	18/01/2023	28/02/2023	100	los diseños ya fueron radicados a SDM con radicado 20238120204 1842
9	12000822	CL 74A	KR 62	KR 61	100	86.62	0.196	14/01/2023	20/01/2023	28/02/2023	100	los diseños ya fueron radicados a SDM con radicado 20238120204 1842
10	12000777	KR 61	CL 74	CL 71	100	53.05	0.15	19/01/2023	23/01/2023	28/02/2023	100	los diseños ya fueron radicados a SDM con radicado 20238120204 1842
11	12000691	[illegible]	KR 61	KR 62	100	81.87	0.201	19/01/2023	24/01/2023	28/02/2023	100	los diseños ya fueron radicados a SDM con radicado 20238120204 1842
12	12000640	CL 72	KR 65	KR 65A	100	48.14	0.102	23/01/2023	26/01/2023	28/02/2023	100	
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CL Adc 5	100	120	0.286	27/01/2023	3/02/2023	20/03/2023	100	los diseños ya fueron radicados a SDM con radicado 20238120204 1842
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KR 72	85	93.43	0.208	25/01/2023	3/02/2023	20/03/2023	100	
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KR 58	90	45	0.244	2/02/2023	6/02/2023	20/03/2023	100	
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100	94.61	0.512	6/02/2023	18/02/2023	20/03/2023	100	Este CIV ya se encuentra demarcado por CONSORCIO SUMA VIAL 2021
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100	69	0.14	16/02/2023	24/02/2023	20/03/2023	100	los diseños ya fueron radicados a SDM con radicado 20238120204 1842
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16/02/2023	24/02/2023	11/04/2023	100	
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	88	
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	18/04/2023	28/04/2023	100	
21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	14/04/2023	15/05/2023	100	
22	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	18/04/2023	15/05/2023	100	

INFORME SEMANAL

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	FDLBU -217-2022
OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORIA	"Interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, social, ambiental y sistema de seguridad y salud en el trabajo, del contrato de obra que se derive de la licitación pública FDLBU -215-2022 cuyo objeto es contratar por el sistema de precios unitarios fijos y a monto agotable el mantenimiento de la malla vial local e intermedia de la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá D.C..
SEMANA No.	33 DEL domingo, 25 de junio de 2023 AL sábado, 1 de julio de 2023

23	12000691	CL 88A	AK 30	KR 49	30	87.0	0.161	18/04/2023	19/04/2023	3/06/2023	100	
24	12000269	CL 94A	KR 60	KR 60B	20	149.8	0.354	25/04/2023	29/04/2023	3/06/2023	100	
25	12000300	CL 93B	KR 60B	TV 60C	30	93.3	0.178	24/04/2023	25/04/2023	3/06/2023	100	
26	12000230	KR 60	CL 94B	CL 97	20	186.5	0.454	27/04/2023	27/04/2023	3/06/2023	100	
27	12000407	CL 92	KR 60	KR 60A	55	99.3	0.199	28/04/2023	3/04/2023	3/06/2023	100	
28	12000390	CL 79	KR 66	CERRADA	55	175.0	0.426	5/05/2023	9/05/2023	3/06/2023	100	
29	12000476	KR 64	CL 79BIS	CL 79A	40	50.78	0.118	11/05/2023	15/05/2023	3/06/2023	100	
30	12000488	KR 64	CL 79	CL 79BIS	55	51.14	0.127	11/05/2023	13/05/2023	1/06/2023	100	
31	12000508	KR 64	CL 78A	CL 79	20	61.56	0.132	13/05/2023	13/05/2023	1/06/2023	100	
32	12001017	CL 74	KR 60	KR 61	60	88.00	0.237	15/05/2023	20/05/2023	22/06/2023	100	
33	12001853	CL 66	KR 57C	KR 58	79	62.46	0.161	23/05/2023	27/05/2023	27/06/2023	100	
34	12001919	CL 66	KR 57	KR 57B	44	82.77	0.223	23/05/2023	27/05/2023	AUN NO SE RECIBE A SATISFACCION	98	
35	12000612	CL 74	KR 66		100	22.68	0.062	29/05/2023	10/06/2023	AUN NO SE RECIBE A SATISFACCION	98	
36	12000935	KR 62	CL 73	CL 74	85	52.56	0.142	29/05/2023	1/06/2023	AUN NO SE RECIBE A SATISFACCION	98	
37	12000769	CL 74	KR 64	KR 65	40	87.06	0.238	3/06/2023	8/06/2023	AUN NO SE RECIBE A SATISFACCION	98	
38	12000716	CL 74	KR 65	KR 65B	20	86.67	0.236	9/06/2023	9/06/2023	AUN NO SE RECIBE A SATISFACCION	98	
39	12001848	KR 50	DG 71BIS	CL 71A	32	138.20	0.366	13/06/2023	17/06/2023	AUN NO SE RECIBE A SATISFACCION	95	
40	12002051	KR 26	AC 72	CL 73	41	87.81	0.207	20/06/2023	29/06/2023	AUN NO SE RECIBE A SATISFACCION	73	
41	12001984	KR 27B	AC 72	CL 73BIS	34	105.84	0.253	20/06/2023	23/06/2023	AUN NO SE RECIBE A SATISFACCION	98	
42	12000623	CL 87	KR 49A	KR 49C	79	115.44	0.239	26/06/2023	1/07/2023	AUN NO SE RECIBE A SATISFACCION	98	
43	12000717	KR 49C	CL 86A	CL 86B	30	46.56	0.096	30/07/2023			95	
44												

En el IDU a anteriormente mencionada se dejan resultados los CIV que en este momento se están ejecutando y los que están por observación por parte de esta interventoría por acabados o que le hace falta una actividad para completar la finalización con la respectiva porcentaje de avance, tal es el caso para los CIV

Durante la semana se realizaron actividades de intervensión de las obras

12002051 Se realiza el recorrido para verificación de las áreas que se encuentran con un alto deterioro para garantizar el porcentaje de intervención dada en las fichas de diagnostico inicial, se realiza la respectiva demarcación de las zonas indicadas
Se realiza cerramiento al CIV y se deja con corte de asfalto cerca de las bocacalles, esto de acuerdo a demarcación para su intervención para mantener el % de intervención
Se realiza replanteo General del CIV
Se realiza demolición en las áreas que se determinaron para su intervención
Se realiza retiro del asfalto existente y se procede a compactar las áreas intervenidas
Se evidencia varios fallos, se procede a estabilizarlos
Se instala manguera de 1/2 in que se encontraba superficial y fue afectada en la intervención
Se instala asfalto con su respectiva compactación y sello
12000717 Se realiza el recorrido para verificación de las áreas que se encuentran con un alto deterioro para garantizar el porcentaje de intervención dada en las fichas de diagnostico inicial, se realiza la respectiva demarcación de las zonas indicadas
Se realiza cerramiento al CIV y se deja con corte se asfalto por las áreas demarcadas para su intervención
Se realiza replanteo General del CIV
Se realiza fresado en las áreas que se determinaron para su intervención
Cargue y retiro de material demolido
Se realiza retiro del asfalto existente y se procede a compactar las áreas intervenidas
Se instala asfalto con su respectiva compactación
12002051 Se termina de instalar asfalto en el área que quedo pendiente por instalar

Actividades pendientes para CIV ya intervenidos

12001974 Este CIV de acuerdo a la mesa de trabajo realizada con la interventoría encargada de la demarcación vial, da vía libre para las actividades de micro fresado que se encuentra pendiente para intervención por envejecimiento prematuro que

INFORME SEMANAL

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	FDLBU -217-2022
OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORIA	"Interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, social, ambiental y sistema de seguridad y salud en el trabajo, del contrato de obra que se derive de la licitación pública FDLBU -215-2022 cuyo objeto es contratar por el sistema de precios unitarios fijos y a monto agotable el mantenimiento de la malla vial local e intermedia de la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá D.C."

SEMANA No.	33	DEL	domingo, 25 de junio de 2023	AL	sábado, 1 de julio de 2023

presento la carpeta instalada sobre la boca calle de la calle 68. Se esta pendiente de la programación de esta actividad por parte del contratista

12001819: Se encuentra pendiente realizar la cinta de ajuste del sumidero que se encuentra en el CIV constado sur de la via

12001848: Este CIV se encuentra pendiente por subsanar observaciones por acabado de la carpeta, ya se encuentra socializado con el contratista

12001853: Este CIV se encuentra pendiente para recibir, aun no tiene los 30 días de haberse instalado el asfalto, tiempo que le daremos para observación de algún cambio o variación que se presente en su textura o instalado

12000769: Este CIV se encuentra pendiente para recibir, aun no tiene los 30 días de haberse instalado el asfalto, tiempo que le daremos para observación de algún cambio o variación que se presente en su textura o instalado

12000612: Este CIV se encuentra pendiente para recibir, aun no tiene los 30 días de haberse instalado el asfalto, tiempo que le daremos para observación de algún cambio o variación que se presente en su textura o instalado

12000935: Este CIV se encuentra pendiente para recibir, aun no tiene los 30 días de haberse instalado el asfalto, tiempo que le daremos para observación de algún cambio o variación que se presente en su textura o instalado

12000716: Este CIV se encuentra pendiente para recibir, aun no tiene los 30 días de haberse instalado el asfalto, tiempo que le daremos para observación de algún cambio o variación que se presente en su textura o instalado

12002051: Este CIV se encuentra pendiente para recibir, aun no tiene los 30 días de haberse instalado el asfalto, tiempo que le daremos para observación de algún cambio o variación que se presente en su textura o instalado

12000717: Este CIV se encuentra pendiente para recibir, aun no tiene los 30 días de haberse instalado el asfalto, tiempo que le daremos para observación de algún cambio o variación que se presente en su textura o instalado

12000623: Este CIV se encuentra pendiente para recibir, aun no tiene los 30 días de haberse instalado el asfalto, tiempo que le daremos para observación de algún cambio o variación que se presente en su textura o instalado

Al día de hoy la solicitud para este PMT, se encuentra en el nuevo paquete de priorización que el contratista tiene programado radicar ante la entidad de la SDM, esto también por la priorización de la nueva programación que se solicitó en estos días

Esta semana se realizo recorrido p cada uno de los CIV´s la cual estos ya cuentan con PMT listos, esto con el fin de socializar las áreas a intervenir para cada uno de los tramos y definir la metodología en la que se van ha realizar las actividades, esto se realizo en compañía de las áreas técnicas de la supervisión, contratista e interventoría

Adicionalmente esta semana se registra el para el presente informe el avance de los sellos de junta que se realizaron durante el periodo, puesto que se realiza la medición respectiva por CIV instalado

El 05 de mayo fue radicado ante movilidad los diseños de demarcación a la secretaria de movilidad con el oficio LUZ22BU-2022-112 ENVIO PLANOS DE DISEÑOS DE SEÑALIZACION EN EL MARCO DEL CONTRATO 211 DE 2022, la cual tiene como numero de radicación 20236120204164 2

En el transcurso de la semana se realiza recorrido por los frentes de obra con el contratista e interventoría. La cual además de las observaciones anteriormente descritas se realiza los sellos de juntas solicitados en jornada nocturna, solicitud a las

Para este contrato se han realizado actividades de acciones de movilidad y sello de fisuras, la cual se relacionan en la siguiente tabla

ORDEN DE EJECUCIÓN	CIV	UBICACIÓN			KM/CARRIL	ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA DE INTERVENCIÓN
		EJE	INICIO	FIN			
1	12000935	KR 62	CL 73	CL 74	0.142	ACCION DE MOVILIDAD	15/12/2022
2	12002500	KR 25	CL 63F	CL 64	0.169	ACCION DE MOVILIDAD	24/02/2023
3	12000579	KR 65A		CL 76	0.199	ACCION DE MOVILIDAD	25/01/2023
4	12000625	CL 74A	KR 65B	KR 66	0.192	ACCION DE MOVILIDAD	25/11/2022
5	12001139	KR 57A	CL 74	CL 74A	0.083	ACCION DE MOVILIDAD	19/12/2022
6	12000989	KR 62	CL 72A	CL 73	0.136	ACCION DE MOVILIDAD	25/01/2023
7	12000765	KR 56	CL 79	CL 79B	0.300	SELLO DE FISURAS	
8	12000654	CL 78	KR 61	KR 62	0.204	SELLO DE FISURAS	
9	12001169	CL 67B	KR 65A	KR 65B	0.154	SELLO DE JUNTAS	
10	12001209	KR 65	CL 67B	CL 67D	0.244	SELLO DE JUNTAS	
11	12000616	CL 75B	KR 64	KR 65	0.223	SELLO DE FISURAS	
12	12001088	KR 60	CL 72A	CL 73	0.137	SELLO DE FISURAS	
13	12001085	KR 61	AC 72	CL 72A	0.133	SELLO DE FISURAS	
14	12002534	KR 19	CL 66	CL 66A	0.183	SELLO DE FISURAS	
15	12002437	CL 69	KR 15	KR 16	0.188	SELLO DE FISURAS	
16	12002403	CL 69	KR 17	KR 19	0.246	SELLO DE FISURAS	
17	12001117	CL 73	KR 58	KR 60	0.158	ACCION DE MOVILIDAD	18/05/2023
18	12000033	KR 60	CL 99	AC 100	0.171	SELLO DE JUNTAS	7/06/2023
19	12000097	KR 60	CL 97A	CL 98A	0.188	SELLO DE FISURAS	8/06/2023
20	12000154	CL 97	KR 57	KR 58	0.224	SELLO DE FISURAS	8/06/2023
21	12000289	CL 94	KR 59	KR 60	0.059	SELLO DE FISURAS	8/06/2023
22	12000157	CL 97	TV 55	KR 57	0.100	SELLO DE FISURAS	8/06/2023
23	12000136	KR 47A	CL 97	CL 98	0.084	SELLO DE FISURAS	9/06/2023
24	12000125	CL 98	KR 47A	KR 48	0.111	SELLO DE FISURAS	9/06/2023
25	12000336	KR 67	CL 95	CL 96BIS	0.306	SELLO DE FISURAS	9/06/2023
26	12000137	CL 97	KR 47A	KR 48	0.108	SELLO DE FISURAS	9/06/2023
27	12000273	KR 58	CL 94A	CL 94B	0.121	SELLO DE FISURAS	9/06/2023
28	12000163	TV 60C	KR 60BIS	KR 60	0.245	SELLO DE FISURAS	9/06/2023
29	12000499	CL 91	KR 49A	KR 49B	0.153	SELLO DE FISURAS	11/06/2023
30	12000498	KR 49A	CL 91	CL 93	0.458	SELLO DE FISURAS	11/06/2023
31	12002462	CL 69	KR 14A	KR 15	0.195	SELLO DE FISURAS	24/06/2023

Para la fecha el contrato tiene un avance ejecutado en Km/ carril de 14,913 Km-(m2)

6 Acción M
24 Sello Fi

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
El 05 de mayo fue radicado ante movilidad el primer paquete de los diseños de demarcación a la secretaria de movilidad con el oficio LUZ22BU-2022-112 ENVIO PLANOS DE DISEÑOS DE SEÑALIZACION EN EL MARCO DEL CONTRATO 211 DE 2022, la cual tiene como numero de radicación 20236120204164 2	Gilberto Martínez Firma
