INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES
1909 de 2022_ No. 09_, MUNICIPIO: CANTON DE PABLO- DEPARTAMENTO: CHOCÓ
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES: AGOSTO DE _01 DE 30

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCÓ.		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	MANAGRÚ- BARRIO LAS BRISAS		
BENEFICIARIO:	CANTON DE SAN PABLO-CHOCÓ		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 3.931.858.630
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$693.857.405,00
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO		$ 4.625.716.035,00
FECHA SUSCRIPCIÓN	07/08/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	24/MARZO/2024		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	YIVIOLA RAMIREZ MORERNO		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	NOMBRE	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	NOMBRE	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No. 2-2022-030809	19/07/2022	DD/MM/AAAA
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No. 128	23/03/2022	30/12/2022
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No.	DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	16/12/2022		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 4.160.457.625,00		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 465.033.732,00		
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)			
VALOR DE OBRA	N/A		
VALOR INTERVENTORÍA	N/A		
VALOR ADICIONAL DE OBRA			

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	Previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y la entrega de los siguientes productos: a) Suscripción del acta de inicio b) Designación del supervisor del convenio por parte del municipio. Aprobacion del cronograma de jecucion del convenio por parte del supervisor del ministerio.	NO APLICA	27/04/2023	$ 693.857.405
SEGUNDO DESEMBOLSO	Previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y la entrega de los siguientes productos: a) Suscripción del acta de inicio b) Designación del supervisor del convenio por parte del municipio. Aprobacion del cronograma de jecucion del convenio por parte del supervisor del ministerio.	NO APLICA	DD/MM/AAAA	$ 1.965.929.315
TERCER DESEMBOLSO	Contra entrega de los siguientes productos: a) La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 70% de ejecución del proyecto. b) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance. Las actas parciales de avance del proyecto	70%	DD/MM/AAAA	$1.572.743.452
ÚLTIMO DESEMBOLSO	a) La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el cumplimiento del 100% b) Entrega al Ministeio del interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyecto FONSECON	100%	DD/MM/AAAA	$ 393.185.863
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				**$ 693.857.405**
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora:

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
3002240	Cumplimiento	$ 462.571.604.00	09/08/2022	24/09/2024

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO- DEPARTAMENTO DE CHOCÓ.		$ 4.160.457.625,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	YEISON ALBORNOZ RIVAS		
Fecha de Acta de inicio del contrato	28/FEBRERO/2023		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	28/NOVIEMBRE/2023		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 4.160.457.625,00

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A**
PÓLIZA No.	17-40-10102722
FECHA DE LA PÓLIZA	10/08/2022

- ***Contrato de ejecución de Interventoría Estudios y Diseños, obra***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
No. del contrato	INTERVENTORIA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION ESTACION DE LA POLICIA EN EL MUNICIPIO DE EL CANTON DE SAN PABLO DEPARTAMENTO CHOCO"		$ 465.033.732,00
Adicional en valor(adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	YORK STIVENSON PEREA AYALA		
Fecha de Acta de inicio del contrato	28/FEBRERO/2023		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	28/NOVIEMBRE/2023		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 465.033.732,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**		
PÓLIZA No.	**17-44-101208799**		
FECHA DE LA PÓLIZA	**21/02/2023**		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: Enero	**SI**	**NO**
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	X	
INFORME FINANCIERO	x	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	X	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	
OTROS		

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
SE REALIZARON LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**100**
% EJECUTADO DE OBRA	**100**

PERIODO: AGOSTO 2023
FECHA DE ACTA DE INICIO: 08/03/2023
AVANCE DE OBRA: 100%

Componente técnico,
Durante este periodo se desarrollaron las actividades de entrega de todos los diseños como el Levantamiento Topografía, Diseño Mecánico y Bioclimático, Diseño Arquitectónico, Diseño Estructural
• Diseño Hidrosanitario
• Diseño Red de Incendio

• Diseño Red de Gas, Diseño Eléctrico e Iluminación, Diseño Voz y Datos, Presupuesto y Programación de Obra **Componente administrativo** Se firmaron las actas de inicio de los contratos, se realizó mesa técnica, y se terminan todos los diseños, para posteriormente dar inicio a las actividades programadas. **Componente financiero** **E**l Municipio del cantón de san pablo ha realizado el primer desembolso al convenio con un valor de **Quinientos millones de pesos ($ 500.000.000**), por otro lado, el día 27 del mes de marzo se continuo con el pago del primer desembolso al convenio con un valor de **Ciento noventa y dos millones ochocientos cincuenta y siete mil cuatrocientos cinco pesos ($ 192,857,405.00),** el día 29 del mes de junio se continuo con el pago del primer desembolso al convenio con un valor de setecientos treinta y cinco millones setenta y tres mil quinientos cuarenta y dos pesos con sesenta centavos (**735.073.542,60).** El 11 de agosto se realizó el pago a la interventoría, de Ciento dieciséis millones doscientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos treinta y tres pesos con un centavo. **($ 116.258.433,01)** por concepto de avance de un 25% del contrato. **Componente Jurídico** • El convenio se encuentra vigente con plazo de ejecución hasta el 24 de marzo de 2024. • El municipio de cantón de san pablo, adjudico los procesos de estudios, diseños, obra N 001-LP-OP al contratista YORK STIVENSON PEREA AYALA por un valor de $ 465.033.732,00 y el proceso de interventoría de estudios, diseños, obra N 001-I-CM al contratista YEISON ALBORNOZ RIVAS por un valor de $ 4.160.457.625,00.
JUSTIFICACIÓN DE AVANCE: Durante este periodo se entregaron los diseños definitivos al municipio.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

15/03/2023	17/03/2023	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

YIVIOLA RAMIREZ MORENO Supervisor Municipio de cantón de san pablo	**OSCAR ANTONIO PALACIOS PALACIOS** Alcalde Municipio Cantón De San Pablo

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PAB
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8002394145
Generado por: FELIPE HINESTROZA

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	15380329	**Fecha de Emisión**	2023/08/11
Origen			
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CONSTRUCCION COMANDO	**No. Producto**	*****3817
Fecha Pago	2023/08/11		
Destino			
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía		
No. Identificación	9732848		
Beneficiario	YORK STIVENSON PEREA AYALA		
Valor a Pagar	$92,425,455.00		
Entidad Financiera	Bancolombia		
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Producto Destino	72839272511		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura			
Información Adicional			
Estado	En Proceso		

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

	INFORME DE INTERVENTORIA **YORK STIVENSON PEREA AYALA** **INFORME INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE LA PLICIA EN EL MUNICIPIO DE EL CANTON DE SAN PALO DEPARTAMENTO CHOCO"**		
MINISTERIO DEL INTERIOR		CANTÓN DE SAN PABLO	YORK STIVENSON PEREA AYALA
Versión: 01			

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No:	**22**	**MES:MAYO**		**FECHA DE INFORME**	
CONTRATO No	001-I-CM de 2023	**OBJETO:**	INFORME INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE LA PLICIA EN EL MUNICIPIO DE EL CANTON DE SAN PALO DEPARTAMENTO CHOCO"	**DEL** 7-ago-23	**AL** 13-ago-23

INTERVENTOR:**YORK STIVENSON PEREA AYALA**	DIRECTOR DE INTERVENTORIA: **ING. KATHERINE HINESTROZA**	DIRECTOR DE OBRA: **ARQ YEISON ALBORNOZ** RIVAS

1. LOCALIZACION DEL PROYECTO


CANTÓN DE SAN PABLO, MUNICIPIO DE MANAGRÚ, CHOCÓ

2. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE OBRA

FECHA DEL CONTRATO:	miércoles, 8 de marzo de 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:**	$ 4.160.457.625,00
FECHA DE INICIACIÓN:	miércoles, 8 de marzo de 2023	**VALOR ADICIONAL AL CONTRATO:**	
PLAZO	NUEVE (9) MESES	**FECHA DE TERMINACION:**	viernes, 8 de diciembre de 2023
PRORROGA Nº 1:		**NUEVA FECHA DE TERMINACION:**	
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 4.160.457.625,00	**VALOR DEL ANTICIPO:**	
CONTRATISTA:	YEISON ALBORNOZ RIVAS	**REPRESENTANTE LEGAL:**	YEISON ALBORNOZ RIVAS
PLAZO TRANSCURRIDO:	158 DÍAS	**PLAZO RESTANTE:**	275 DIAS

EJECUCION DEL CONTRATO SEMANA:	13,08%	**AVANCE FISICO PORCENTUAL ACUMULADO:**	100,00%	**PROGRAM. SEMANA**	2,96%	**PROGRAM. ACUMULADO**	100,00%
AVANCE FINANCIERO SEMANA:	$ 28.326.237,00	**AVANCE FINANCIERO ACUMULADO:**	$ 216.526.237,00	**PROGRAM FINANC SEMANA**	$ 6.409.176,63	**PROGRAMADO CONTRATO TOTAL:**	$ 216.526.237

3. REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

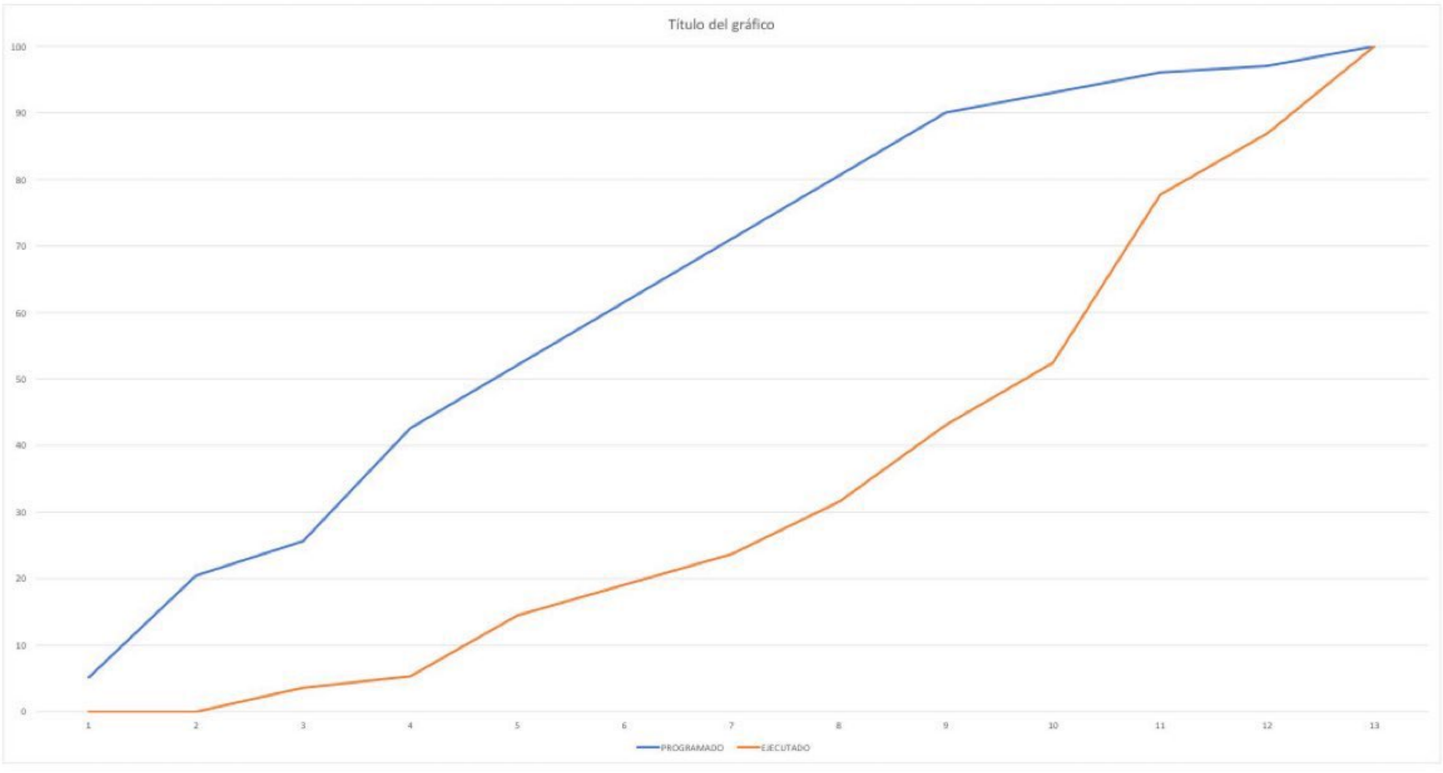

Powered by CamScanner

4. RESUMEN DE AVANCE ACTUAL DE CONSULTORÍA

CONTRATO INICIAL				
ITEM	DESCRIPCION	SEMANA ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCO.			
1	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	$ -	$ 19.500.000,00	$ 19.500.000,00
2	DISEÑO MECANICO Y BIOCLIMÁTICO	$ 1.800.000,00	$ 16.200.000,00	$ 18.000.000,00
3	ARQUITECTURA	$ -	$ 41.000.000,00	$ 41.000.000,00
4	ESTUDIOS DE SUELO	$ -	$ 22.000.000,00	$ 22.000.000,00
5	DISEÑO ESTRUCTURAL	$ 3.500.000,00	$ 17.500.000,00	$ 21.000.000,00
6	DISEÑO HIDROSANITARIO	$ 3.500.000,00	$ 15.500.000,00	$ 19.000.000,00
7	DISEÑO ELECTRICO E ILUMINACION	$ 3.000.000,00	$ 13.000.000,00	$ 16.000.000,00
8	DISEÑO RED DE INCENDIO	$ 4.000.000,00	$ 10.500.000,00	$ 14.500.000,00
9	DISEÑO VOZ Y DATOS	$ 3.500.000,00	$ 8.500.000,00	$ 12.000.000,00
10	PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA	$ 5.000.000,00	$ 13.000.000,00	$ 18.000.000,00
11	DISEÑO RED DE GAS	$ 4.026.237,00	$ 11.500.000,00	$ 15.526.237,00
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
AVANCE TOTAL EJECUTADO CONSULTORÍA	100,00%	SUBTOTAL $ 28.326.237,00	$ 188.200.000,00	$ 216.526.237,00
		A.I.U		
		VALOR TOTAL $ 28.326.237,00	$ 188.200.000,00	$ 216.526.237,00
AVANCE PROGRAMADO	100,00%			
PORCENTAJE EJECUTADO Vs. PROGRAMADO	0,00%			

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA PROXIMA SEMANA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR_UNITARIO	VR_PARCIAL
				$ 0
			AIU	$ 0
			TOTAL SEMANA 22	$ 0
				0,000%

6. ASPECTO JURIDICO CONTRACTUAL

ACTA PARCIAL					
CONCEPTO	VIGENTE	DESDE	HASTA	VALOR	OBSERVACIONES
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	NO	8-mar-23	6-dic-28	$ 2.912.320.337,50	PÓLIZA SEGUROS DEL ESTADO S.A. No PÓLIZA 17-44-101208889
PORLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTOS	NO	8-mar-23	7-mar-24	$ 232.000.000,00	PÓLIZA SEGUROS DEL ESTADO S.A. No PÓLIZA 17-40-101027222

ACTAS REALIZADAS			CONTRATOS ADICIONALES			PRORROGAS		
CONCEPTO	FECHA	OBSERVACION	Nº	VALOR	CAUSA	Nº	TIEMPO	CAUSAL

Powered by CamScanner

7. INFORMACION FINANCIERA

Nº	CONVENIO	CONCEPTO	FECHA	PORCENTAJE	VALOR	AMORTIZACION	NETO PAGADO	ACUMULADO	SALDO ACTUAL

8. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

* Revision de estudios y diseños por parte del DIRAF y Ministerio del Interior.

OBSERVACIONES

En el comité realizado quedaron los siguientes compromisos:

* Una vez el OK del DIRAF iniciar con la construcción del proyecto

Elaborado por:

YORK STIVENSON PEREA AYALA
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
NIT.: 9.732.848 - 2

FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPIO O GOBERNACION

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Powered by CamScanner

	INFORME DE INTERVENTORIA **YORK STIVENSON PEREA AYALA** **INFORME INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE LA PLICIA EN EL MUNICIPIO DE EL CANTON DE SAN PALO DEPARTAMENTO CHOCO"**		
MINISTERIO DEL INTERIOR		CANTÓN DE SAN PABLO	YORK STIVENSON PEREA AYALA
Versión: 01			

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No:	**23**		**MES:MAYO**	**FECHA DE INFORME**		
CONTRATO No	001-I-CM de 2023	**OBJETO:**	INFORME INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE LA PLICIA EN EL MUNICIPIO DE EL CANTON DE SAN PALO DEPARTAMENTO CHOCO"	**DEL** 14-ago-23	**AL**	20-ago-23

INTERVENTOR:**YORK STIVENSON PEREA AYALA** | DIRECTOR DE INTERVENTORIA: **ING. KATHERINE HINESTROZA** | DIRECTOR DE OBRA: **ARQ YEISON ALBORNOZ** RIVAS


1. LOCALIZACION DEL PROYECTO

CANTÓN DE SAN PABLO, MUNICIPIO DE MANAGRÚ, CHOCÓ

2. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE OBRA

FECHA DEL CONTRATO:	miércoles, 8 de marzo de 2023			**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:**	$ 4.160.457.625,00		
FECHA DE INICIACIÓN:	miércoles, 8 de marzo de 2023			**VALOR ADICIONAL AL CONTRATO:**			
PLAZO	NUEVE (9) MESES			**FECHA DE TERMINACION:**	viernes, 8 de diciembre de 2023		
PRORROGA Nº 1:				**NUEVA FECHA DE TERMINACION:**			
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 4.160.457.625,00			**VALOR DEL ANTICIPO:**			
CONTRATISTA:	YEISON ALBORNOZ RIVAS			**REPRESENTANTE LEGAL:**	YEISON ALBORNOZ RIVAS		
PLAZO TRANSCURRIDO:	165 DÍAS			**PLAZO RESTANTE:**	275 DIAS		
EJECUCION DEL CONTRATO SEMANA:	13,08%	**AVANCE FISICO PORCENTUAL ACUMULADO:**	100,00%	**PROGRAM. SEMANA**	2,96%	**PROGRAM. ACUMULADO**	100,00%
AVANCE FINANCIERO SEMANA:	$ 28.326.237,00	**AVANCE FINANCIERO ACUMULADO:**	$ 216.526.237,00	**PROGRAM FINANC SEMANA**	$ 6.409.176,63	**PROGRAMADO CONTRATO TOTAL:**	$ 216.526.237

3. REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

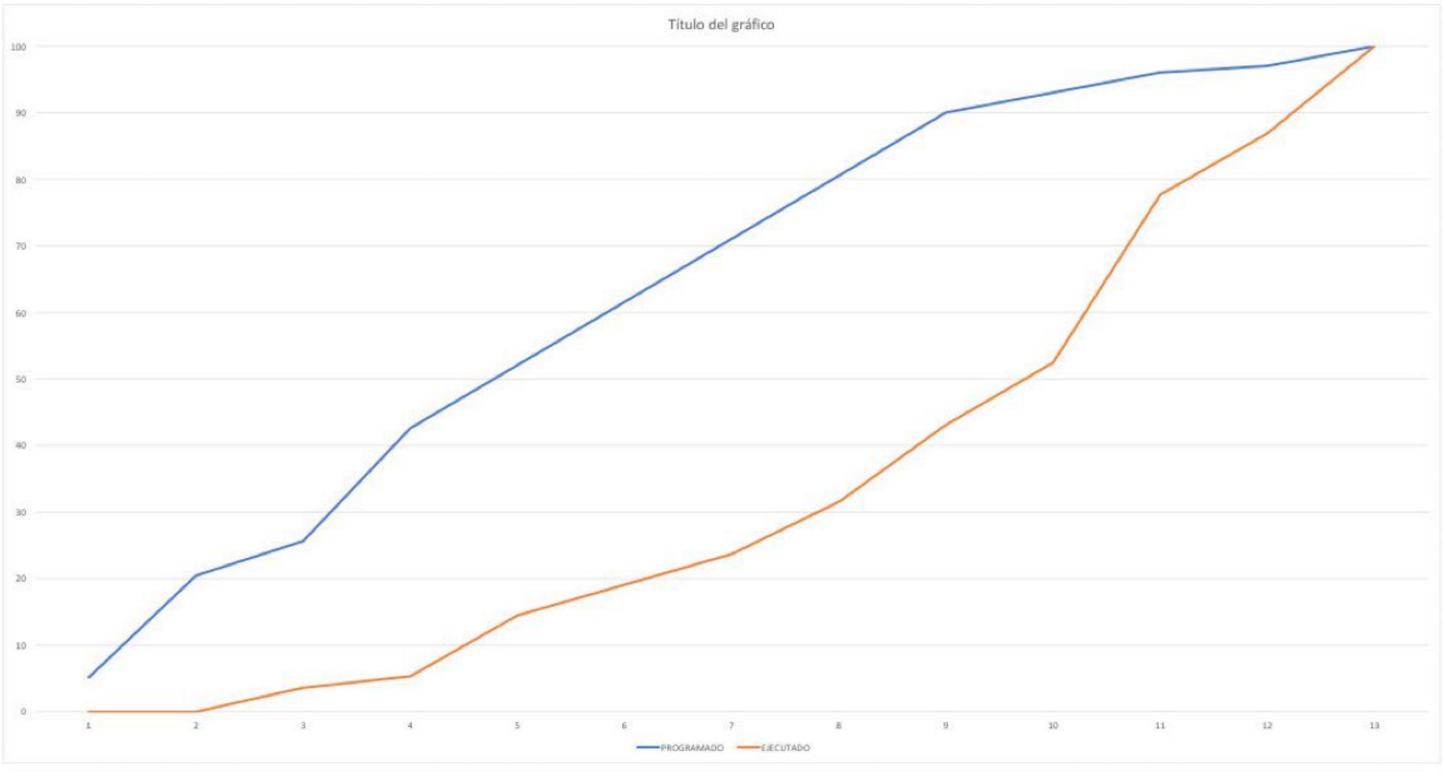

Powered by CamScanner

4. RESUMEN DE AVANCE ACTUAL DE CONSULTORÍA

CONTRATO INICIAL				
ITEM	DESCRIPCION	SEMANA ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCO.			
1	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	$ -	$ 19.500.000,00	$ 19.500.000,00
2	DISEÑO MECANICO Y BIOCLIMÁTICO	$ 1.800.000,00	$ 16.200.000,00	$ 18.000.000,00
3	ARQUITECTURA	$ -	$ 41.000.000,00	$ 41.000.000,00
4	ESTUDIOS DE SUELO	$ -	$ 22.000.000,00	$ 22.000.000,00
5	DISEÑO ESTRUCTURAL	$ 3.500.000,00	$ 17.500.000,00	$ 21.000.000,00
6	DISEÑO HIDROSANITARIO	$ 3.500.000,00	$ 15.500.000,00	$ 19.000.000,00
7	DISEÑO ELECTRICO E ILUMINACION	$ 3.000.000,00	$ 13.000.000,00	$ 16.000.000,00
8	DISEÑO RED DE INCENDIO	$ 4.000.000,00	$ 10.500.000,00	$ 14.500.000,00
9	DISEÑO VOZ Y DATOS	$ 3.500.000,00	$ 8.500.000,00	$ 12.000.000,00
10	PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA	$ 5.000.000,00	$ 13.000.000,00	$ 18.000.000,00
11	DISEÑO RED DE GAS	$ 4.026.237,00	$ 11.500.000,00	$ 15.526.237,00
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
AVANCE TOTAL EJECUTADO CONSULTORÍA	100,00%	SUBTOTAL $ 28.326.237,00	$ 188.200.000,00	$ 216.526.237,00
		A.I.U		
		VALOR TOTAL $ 28.326.237,00	$ 188.200.000,00	$ 216.526.237,00
AVANCE PROGRAMADO	100,00%			
PORCENTAJE EJECUTADO Vs. PROGRAMADO	0,00%			

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA PROXIMA SEMANA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR_UNITARIO	VR_PARCIAL
				$ 0
			AIU	$ 0
			TOTAL SEMANA 23	$ 0
				0,000%

6. ASPECTO JURIDICO CONTRACTUAL

ACTA PARCIAL					
CONCEPTO	VIGENTE	DESDE	HASTA	VALOR	OBSERVACIONES
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	NO	8-mar-23	6-dic-28	$ 2.912.320.337,50	PÓLIZA SEGUROS DEL ESTADO S.A. No PÓLIZA 17-44-101208889
PORLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTOS	NO	8-mar-23	7-mar-24	$ 232.000.000,00	PÓLIZA SEGUROS DEL ESTADO S.A. No PÓLIZA 17-40-101027222

ACTAS REALIZADAS			CONTRATOS ADICIONALES			PRORROGAS		
CONCEPTO	FECHA	OBSERVACION	Nº	VALOR	CAUSA	Nº	TIEMPO	CAUSAL

Powered by CamScanner

7. INFORMACION FINANCIERA

Nº	CONVENIO	CONCEPTO	FECHA	PORCENTAJE	VALOR	AMORTIZACION	NETO PAGADO	ACUMULADO	SALDO ACTUAL

8. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

* Revision de estudios y diseños por parte del DIRAF y Ministerio del Interior.

OBSERVACIONES

En el comité realizado quedaron los siguientes compromisos:

* Una vez el OK del DIRAF iniciar con la construcción del proyecto

Elaborado por:

YORK STIVENSON PEREA AYALA
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
NIT.: 9.732.848 - 2

FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPIO O GOBERNACION

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Powered by CamScanner

	INFORME DE INTERVENTORIA **YORK STIVENSON PEREA AYALA** **INFORME INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE LA PLICIA EN EL MUNICIPIO DE EL CANTON DE SAN PALO DEPARTAMENTO CHOCO"**		
MINISTERIO DEL INTERIOR		CANTÓN DE SAN PABLO	YORK STIVENSON PEREA AYALA
Versión: 01			

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No:	**24**		**MES:MAYO**	**FECHA DE INFORME**		
CONTRATO No	001-I-CM de 2023	**OBJETO:**	INFORME INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE LA PLICIA EN EL MUNICIPIO DE EL CANTON DE SAN PALO DEPARTAMENTO CHOCO"	**DEL** 21-ago-23	**AL**	27-ago-23

INTERVENTOR:**YORK STIVENSON PEREA AYALA**	DIRECTOR DE INTERVENTORIA: **ING. KATHERINE HINESTROZA**	DIRECTOR DE OBRA: **ARQ YEISON ALBORNOZ** RIVAS


1. LOCALIZACION DEL PROYECTO

CANTÓN DE SAN PABLO, MUNICIPIO DE MANAGRÚ, CHOCÓ

2. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE OBRA

FECHA DEL CONTRATO:	miércoles, 8 de marzo de 2023			**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:**	$ 4.160.457.625,00		
FECHA DE INICIACIÓN:	miércoles, 8 de marzo de 2023			**VALOR ADICIONAL AL CONTRATO:**			
PLAZO	NUEVE (9) MESES			**FECHA DE TERMINACION:**	viernes, 8 de diciembre de 2023		
PRORROGA Nº 1:				**NUEVA FECHA DE TERMINACION:**			
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 4.160.457.625,00			**VALOR DEL ANTICIPO:**			
CONTRATISTA:	YEISON ALBORNOZ RIVAS			**REPRESENTANTE LEGAL:**	YEISON ALBORNOZ RIVAS		
PLAZO TRANSCURRIDO:	172 DÍAS			**PLAZO RESTANTE:**	275 DIAS		
EJECUCION DEL CONTRATO SEMANA:	13,08%	**AVANCE FISICO PORCENTUAL ACUMULADO:**	100,00%	**PROGRAM. SEMANA**	2,96%	**PROGRAM. ACUMULADO**	100,00%
AVANCE FINANCIERO SEMANA:	$ 28.326.237,00	**AVANCE FINANCIERO ACUMULADO:**	$ 216.526.237,00	**PROGRAM FINANC SEMANA**	$ 6.409.176,63	**PROGRAMADO CONTRATO TOTAL:**	$ 216.526.237

3. REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

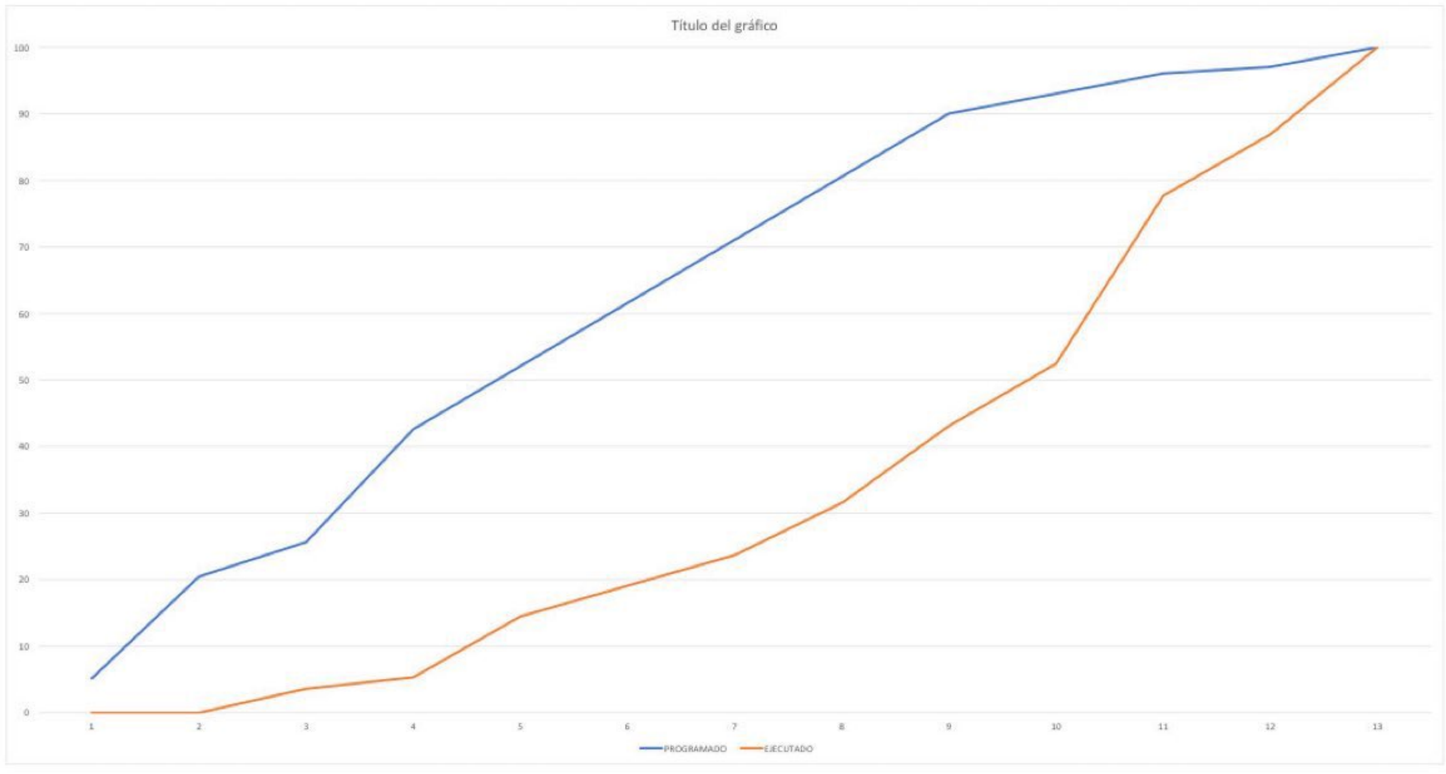

Powered by CamScanner

4. RESUMEN DE AVANCE ACTUAL DE CONSULTORÍA

CONTRATO INICIAL				
ITEM	DESCRIPCION	SEMANA ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCO.			
1	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	$ -	$ 19.500.000,00	$ 19.500.000,00
2	DISEÑO MECANICO Y BIOCLIMÁTICO	$ 1.800.000,00	$ 16.200.000,00	$ 18.000.000,00
3	ARQUITECTURA	$ -	$ 41.000.000,00	$ 41.000.000,00
4	ESTUDIOS DE SUELO	$ -	$ 22.000.000,00	$ 22.000.000,00
5	DISEÑO ESTRUCTURAL	$ 3.500.000,00	$ 17.500.000,00	$ 21.000.000,00
6	DISEÑO HIDROSANITARIO	$ 3.500.000,00	$ 15.500.000,00	$ 19.000.000,00
7	DISEÑO ELECTRICO E ILUMINACION	$ 3.000.000,00	$ 13.000.000,00	$ 16.000.000,00
8	DISEÑO RED DE INCENDIO	$ 4.000.000,00	$ 10.500.000,00	$ 14.500.000,00
9	DISEÑO VOZ Y DATOS	$ 3.500.000,00	$ 8.500.000,00	$ 12.000.000,00
10	PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA	$ 5.000.000,00	$ 13.000.000,00	$ 18.000.000,00
11	DISEÑO RED DE GAS	$ 4.026.237,00	$ 11.500.000,00	$ 15.526.237,00
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
AVANCE TOTAL EJECUTADO CONSULTORÍA	100,00%	SUBTOTAL $ 28.326.237,00	$ 188.200.000,00	$ 216.526.237,00
		A.I.U		
		VALOR TOTAL $ 28.326.237,00	$ 188.200.000,00	$ 216.526.237,00
AVANCE PROGRAMADO	100,00%			
PORCENTAJE EJECUTADO Vs. PROGRAMADO	0,00%			

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA PROXIMA SEMANA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR_UNITARIO	VR_PARCIAL
				$ 0
			AIU	$ 0
			TOTAL SEMANA 24	$ 0
				0,000%

6. ASPECTO JURIDICO CONTRACTUAL

ACTA PARCIAL					
CONCEPTO	VIGENTE	DESDE	HASTA	VALOR	OBSERVACIONES
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	NO	8-mar-23	6-dic-28	$ 2.912.320.337,50	PÓLIZA SEGUROS DEL ESTADO S.A. No PÓLIZA 17-44-101208889
PORLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTOS	NO	8-mar-23	7-mar-24	$ 232.000.000,00	PÓLIZA SEGUROS DEL ESTADO S.A. No PÓLIZA 17-40-101027222

ACTAS REALIZADAS			CONTRATOS ADICIONALES			PRORROGAS		
CONCEPTO	FECHA	OBSERVACION	Nº	VALOR	CAUSA	Nº	TIEMPO	CAUSAL

Powered by CamScanner

7. INFORMACION FINANCIERA

Nº	CONVENIO	CONCEPTO	FECHA	PORCENTAJE	VALOR	AMORTIZACION	NETO PAGADO	ACUMULADO	SALDO ACTUAL

8. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

* Revision de estudios y diseños por parte del DIRAF y Ministerio del Interior.

OBSERVACIONES

En el comité realizado quedaron los siguientes compromisos:

* Una vez el OK del DIRAF iniciar con la construcción del proyecto

Elaborado por:

YORK STIVENSON PEREA AYALA
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
NIT.: 9.732.848 - 2

FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPIO O GOBERNACION

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Powered by CamScanner

	INFORME DE INTERVENTORIA **YORK STIVENSON PEREA AYALA** **INFORME INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE LA PLICIA EN EL MUNICIPIO DE EL CANTON DE SAN PALO DEPARTAMENTO CHOCO"**		
MINISTERIO DEL INTERIOR		CANTÓN DE SAN PABLO	YORK STIVENSON PEREA AYALA
Versión: 01			

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No:	**25**		**MES:MAYO**	**FECHA DE INFORME**		
CONTRATO No	001-I-CM de 2023	**OBJETO:**	INFORME INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE LA PLICIA EN EL MUNICIPIO DE EL CANTON DE SAN PALO DEPARTAMENTO CHOCO"	**DEL** 28-ago-23	**AL**	3-sep-23

INTERVENTOR:**YORK STIVENSON PEREA AYALA** | DIRECTOR DE INTERVENTORIA: **ING. KATHERINE HINESTROZA** | DIRECTOR DE OBRA: **ARQ YEISON ALBORNOZ** RIVAS

1. LOCALIZACION DEL PROYECTO


CANTÓN DE SAN PABLO, MUNICIPIO DE MANAGRÚ, CHOCÓ

2. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE OBRA

FECHA DEL CONTRATO:	miércoles, 8 de marzo de 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:**	$ 4.160.457.625,00
FECHA DE INICIACIÓN:	miércoles, 8 de marzo de 2023	**VALOR ADICIONAL AL CONTRATO:**	
PLAZO	NUEVE (9) MESES	**FECHA DE TERMINACION:**	viernes, 8 de diciembre de 2023
PRORROGA Nº 1:		**NUEVA FECHA DE TERMINACION:**	
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 4.160.457.625,00	**VALOR DEL ANTICIPO:**	
CONTRATISTA:	YEISON ALBORNOZ RIVAS	**REPRESENTANTE LEGAL:**	YEISON ALBORNOZ RIVAS
PLAZO TRANSCURRIDO:	179 DÍAS	**PLAZO RESTANTE:**	275 DIAS

EJECUCION DEL CONTRATO SEMANA:	13,08%	**AVANCE FISICO PORCENTUAL ACUMULADO:**	100,00%	**PROGRAM. SEMANA**	2,96%	**PROGRAM. ACUMULADO**	100,00%
AVANCE FINANCIERO SEMANA:	$ 28.326.237,00	**AVANCE FINANCIERO ACUMULADO:**	$ 216.526.237,00	**PROGRAM FINANC SEMANA**	$ 6.409.176,63	**PROGRAMADO CONTRATO TOTAL:**	$ 216.526.237

3. REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

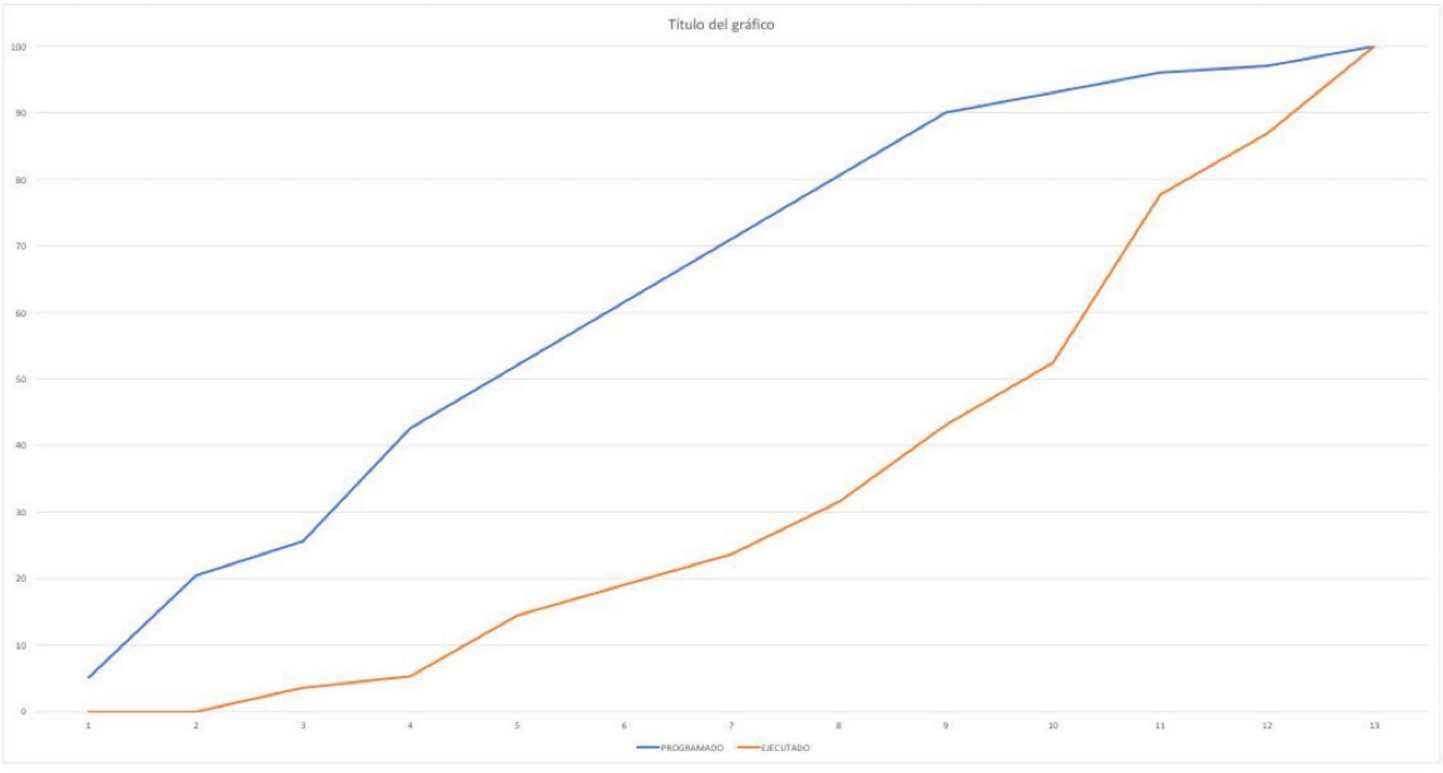

Powered by CamScanner

4. RESUMEN DE AVANCE ACTUAL DE CONSULTORÍA

CONTRATO INICIAL				
ITEM	DESCRIPCION	SEMANA ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCO.			
1	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	$ -	$ 19.500.000,00	$ 19.500.000,00
2	DISEÑO MECANICO Y BIOCLIMÁTICO	$ 1.800.000,00	$ 16.200.000,00	$ 18.000.000,00
3	ARQUITECTURA	$ -	$ 41.000.000,00	$ 41.000.000,00
4	ESTUDIOS DE SUELO	$ -	$ 22.000.000,00	$ 22.000.000,00
5	DISEÑO ESTRUCTURAL	$ 3.500.000,00	$ 17.500.000,00	$ 21.000.000,00
6	DISEÑO HIDROSANITARIO	$ 3.500.000,00	$ 15.500.000,00	$ 19.000.000,00
7	DISEÑO ELECTRICO E ILUMINACION	$ 3.000.000,00	$ 13.000.000,00	$ 16.000.000,00
8	DISEÑO RED DE INCENDIO	$ 4.000.000,00	$ 10.500.000,00	$ 14.500.000,00
9	DISEÑO VOZ Y DATOS	$ 3.500.000,00	$ 8.500.000,00	$ 12.000.000,00
10	PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA	$ 5.000.000,00	$ 13.000.000,00	$ 18.000.000,00
11	DISEÑO RED DE GAS	$ 4.026.237,00	$ 11.500.000,00	$ 15.526.237,00
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
AVANCE TOTAL EJECUTADO CONSULTORÍA	100,00%	SUBTOTAL	$ 28.326.237,00	$ 188.200.000,00	$ 216.526.237,00
		A.I.U			
		VALOR TOTAL	$ 28.326.237,00	$ 188.200.000,00	$ 216.526.237,00
AVANCE PROGRAMADO	100,00%				
PORCENTAJE EJECUTADO Vs. PROGRAMADO	0,00%				

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA PROXIMA SEMANA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR_UNITARIO	VR_PARCIAL
				$ 0
			AIU	$ 0
			TOTAL SEMANA 25	$ 0
				0,000%

6. ASPECTO JURIDICO CONTRACTUAL

ACTA PARCIAL					
CONCEPTO	VIGENTE	DESDE	HASTA	VALOR	OBSERVACIONES
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	NO	8-mar-23	6-dic-28	$ 2.912.320.337,50	PÓLIZA SEGUROS DEL ESTADO S.A. No PÓLIZA 17-44-101208889
PORLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTOS	NO	8-mar-23	7-mar-24	$ 232.000.000,00	PÓLIZA SEGUROS DEL ESTADO S.A. No PÓLIZA 17-40-101027222

ACTAS REALIZADAS			CONTRATOS ADICIONALES			PRORROGAS		
CONCEPTO	FECHA	OBSERVACION	Nº	VALOR	CAUSA	Nº	TIEMPO	CAUSAL

Powered by CamScanner

7. INFORMACION FINANCIERA

Nº	CONVENIO	CONCEPTO	FECHA	PORCENTAJE	VALOR	AMORTIZACION	NETO PAGADO	ACUMULADO	SALDO ACTUAL

8. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

* Revision de estudios y diseños por parte del DIRAF y Ministerio del Interior.

OBSERVACIONES

En el comité realizado quedaron los siguientes compromisos:

* Una vez el OK del DIRAF iniciar con la construcción del proyecto

Elaborado por:

YORK STIVENSON PEREA AYALA
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
NIT.: 9.732.848 - 2

FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPIO O GOBERNACION

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Powered by CamScanner

	INFORME DE INTERVENTORIA **YORK STIVENSON PEREA AYALA** **INFORME INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE LA PLICIA EN EL MUNICIPIO DE EL CANTON DE SAN PALO DEPARTAMENTO CHOCO"**		
MINISTERIO DEL INTERIOR		CANTÓN DE SAN PABLO	YORK STIVENSON PEREA AYALA
Versión: 01			

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No:	**26**		**MES:MAYO**	**FECHA DE INFORME**		
CONTRATO No	001-I-CM de 2023	**OBJETO:**	INFORME INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE LA PLICIA EN EL MUNICIPIO DE EL CANTON DE SAN PALO DEPARTAMENTO CHOCO"	**DEL** 4-sep-23	**AL**	10-sep-23

INTERVENTOR:**YORK STIVENSON PEREA AYALA** | DIRECTOR DE INTERVENTORIA: **ING. KATHERINE HINESTROZA** | DIRECTOR DE OBRA: **ARQ YEISON ALBORNOZ** RIVAS


1. LOCALIZACION DEL PROYECTO

CANTÓN DE SAN PABLO, MUNICIPIO DE MANAGRÚ, CHOCÓ

2. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE OBRA

FECHA DEL CONTRATO:	miércoles, 8 de marzo de 2023			**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:**	$ 4.160.457.625,00		
FECHA DE INICIACIÓN:	miércoles, 8 de marzo de 2023			**VALOR ADICIONAL AL CONTRATO:**			
PLAZO	NUEVE (9) MESES			**FECHA DE TERMINACION:**	viernes, 8 de diciembre de 2023		
PRORROGA Nº 1:				**NUEVA FECHA DE TERMINACION:**			
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 4.160.457.625,00			**VALOR DEL ANTICIPO:**			
CONTRATISTA:	YEISON ALBORNOZ RIVAS			**REPRESENTANTE LEGAL:**	YEISON ALBORNOZ RIVAS		
PLAZO TRANSCURRIDO:	186 DÍAS			**PLAZO RESTANTE:**	275 DIAS		
EJECUCION DEL CONTRATO SEMANA:	13,08%	**AVANCE FISICO PORCENTUAL ACUMULADO:**	100,00%	**PROGRAM. SEMANA**	2,96%	**PROGRAM. ACUMULADO**	100,00%
AVANCE FINANCIERO SEMANA:	$ 28.326.237,00	**AVANCE FINANCIERO ACUMULADO:**	$ 216.526.237,00	**PROGRAM FINANC SEMANA**	$ 6.409.176,63	**PROGRAMADO CONTRATO TOTAL:**	$ 216.526.237

3. REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

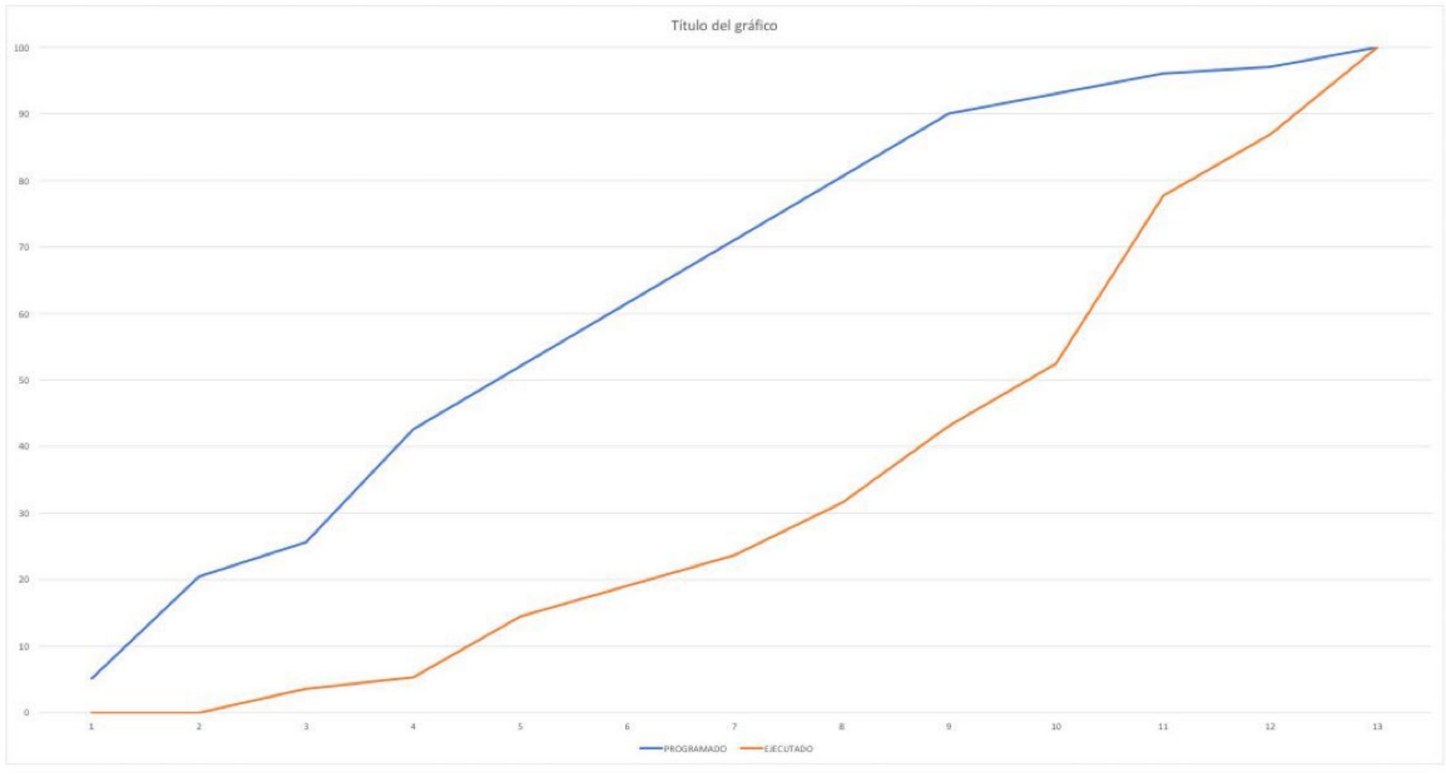

Powered by CamScanner

4. RESUMEN DE AVANCE ACTUAL DE CONSULTORÍA

CONTRATO INICIAL				
ITEM	DESCRIPCION	SEMANA ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCO.			
1	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	$ -	$ 19.500.000,00	$ 19.500.000,00
2	DISEÑO MECANICO Y BIOCLIMÁTICO	$ 1.800.000,00	$ 16.200.000,00	$ 18.000.000,00
3	ARQUITECTURA	$ -	$ 41.000.000,00	$ 41.000.000,00
4	ESTUDIOS DE SUELO	$ -	$ 22.000.000,00	$ 22.000.000,00
5	DISEÑO ESTRUCTURAL	$ 3.500.000,00	$ 17.500.000,00	$ 21.000.000,00
6	DISEÑO HIDROSANITARIO	$ 3.500.000,00	$ 15.500.000,00	$ 19.000.000,00
7	DISEÑO ELECTRICO E ILUMINACION	$ 3.000.000,00	$ 13.000.000,00	$ 16.000.000,00
8	DISEÑO RED DE INCENDIO	$ 4.000.000,00	$ 10.500.000,00	$ 14.500.000,00
9	DISEÑO VOZ Y DATOS	$ 3.500.000,00	$ 8.500.000,00	$ 12.000.000,00
10	PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA	$ 5.000.000,00	$ 13.000.000,00	$ 18.000.000,00
11	DISEÑO RED DE GAS	$ 4.026.237,00	$ 11.500.000,00	$ 15.526.237,00
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
AVANCE TOTAL EJECUTADO CONSULTORÍA	100,00%	SUBTOTAL $ 28.326.237,00	$ 188.200.000,00	$ 216.526.237,00
		A.I.U		
		VALOR TOTAL $ 28.326.237,00	$ 188.200.000,00	$ 216.526.237,00
AVANCE PROGRAMADO	100,00%			
PORCENTAJE EJECUTADO Vs. PROGRAMADO	0,00%			

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA PROXIMA SEMANA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR_UNITARIO	VR_PARCIAL
				$ 0
			AIU	$ 0
			TOTAL SEMANA 26	$ 0
				0,000%

6. ASPECTO JURIDICO CONTRACTUAL

ACTA PARCIAL					
CONCEPTO	VIGENTE	DESDE	HASTA	VALOR	OBSERVACIONES
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	NO	8-mar-23	6-dic-28	$ 2.912.320.337,50	PÓLIZA SEGUROS DEL ESTADO S.A. No PÓLIZA 17-44-101208889
PORLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTOS	NO	8-mar-23	7-mar-24	$ 232.000.000,00	PÓLIZA SEGUROS DEL ESTADO S.A. No PÓLIZA 17-40-101027222

ACTAS REALIZADAS			CONTRATOS ADICIONALES			PRORROGAS		
CONCEPTO	FECHA	OBSERVACION	Nº	VALOR	CAUSA	Nº	TIEMPO	CAUSAL

Powered by CamScanner

7. INFORMACION FINANCIERA

Nº	CONVENIO	CONCEPTO	FECHA	PORCENTAJE	VALOR	AMORTIZACION	NETO PAGADO	ACUMULADO	SALDO ACTUAL

8. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

* Se recibe el ACTA AVAL de la revision de estudios y diseños por parte del DIRAF, Ministerio del Interior y supervisión de la alcaldia.

OBSERVACIONES

En el comité realizado quedaron los siguientes compromisos:

* Iniciar con la construcción del proyecto

Elaborado por:

YORK STIVENSON PEREA AYALA
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
NIT.: 9.732.848 - 2

FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPIO O GOBERNACION

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
GRUPO TÉCNICO Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

Fecha:	Bogotá D.C., 06 de septiembre de 2023		
Hora de inicio:	08:30 horas	**Hora de finalización:**	12:00 horas
Lugar:	Carrera 59 26-21 CAN, segundo piso Grupo Técnico y Supervisión de Proyectos		

ACTA - 30 - DIFRA-GUTEP – 2.25

QUE TRATA DEL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y VALIDACIÓN DE LA ETAPA DE ESQUEMA BÁSICO DEL PROYECTO ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE CANTÓN DE SAN PABLO -DEPARTAMENTO DE CHOCÓ

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de integrantes del Comité de Diseño, de acuerdo con los art. 1 y 2 de la Resolución 0290 de 2011
2. Lectura del acta anterior
3. Verificación de los compromisos
4. Revisión de los diseños
5. Observaciones

DESARROLLO

1. Verificación de integrantes del comité de diseño, de acuerdo con los art. 1 y 2 de la resolución 0290 de 2011

En cumplimiento de la Resolución Nro. 0290 del 06/04/2011, *"Por la cual se crea el Comité de diseño para la revisión y aprobación de proyectos de infraestructura de la Policía Nacional"*, se convoca el presente comité con el fin de certificar la revisión y validación a nivel de esquema básico de los componentes de topografía, bioclimática y arquitectura del proyecto en mención, con la participación de los siguientes participantes:

- **Teniente Coronel EDWIN SANTIAGO PUENTES MATALLANA**
  Director de Infraestructura DIFRA
  Presidente del comité
- **Mayor OSCAR JAVIER RODRÍGUEZ FORERO**
  Subdirector de Infraestructura SUINF
- **Mayor GUSTAVO ADOLFO QUIROZ WALDO**
  Jefe Área Gestión de Proyectos
- **PRO 03 Arquitecta JANETH ASTRID SOLIS MELGAREJO**
  Grupo Técnico y Supervisión de Proyectos
  Secretaria técnica comité

Grupo de profesionales Policía Nacional:

- **Arquitecta JANETH ASTRID SOLIS MELGAREJO**
  M.P. A25202005-52148758
- **PT. JESICA FERNANDA BLANCO RUIZ**

Nota: según el artículo 2° de la Resolución 0290 de 2011, "Para su validez, el acta de comité de diseño requiere la participación mínima del secretario técnico y los profesionales de acuerdo con la competencia disciplinaria que demande el proyecto."

Powered by CamScanner

Profesionales externos encargados de supervisar y realizar los estudios y diseños:

Entidad territorial: Alcaldía Municipal del Cantón de San Pablo - Chocó

- Supervisor: YIVIOLA RAMÍREZ MORENO – Secretaria de Planeación del Municipio del Cantón de San Pablo

Ministerio del Interior:

- Supervisor: MANUEL ANTONIO LINARES DONATO
- Apoyo técnico Arquitecto GONZALO ANTONIO FLOREZ PEÑA

Profesionales de la Consultoría:

- **Topografía:** DEYBI MAURICIO GONZALES TORRES M.P. No. 25335213100CND
- **Arquitectura:** JHONNY LEÓN MURILLO PEREA M.P. T99872015– 1088282863.
- **Bioclimática:** DAVID PERICO AGUDELO M.P A25032002-79945861

Profesionales de la Interventoría:

- **Topografía:** LUIS FERNANDO MOLINA GARCIA M.P. No. 25335-177438 CND
- **Arquitectura:** YEINER YURGAKY MURILLO M.P A16782017-11707707
- **Bioclimática:** DIANA MARÍA RODRÍGUEZ DUQUE M.P. A63802008-41949998.

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

En atención a los comités de diseño realizados por el personal de la Dirección de Infraestructura de la Policía Nacional al proyecto para la revisión de estudios y diseños para la Estación de Policía en el Municipio de Cantón de San Pablo – Departamento de Chocó Nivel de seguridad III. Estación tipo D para 33 funcionarios (31 hombres – 2 mujeres), y teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra validado hasta la etapa de esquema básico, se procede con la elaboración del aval respectivo, desarrollado bajo los siguientes convenios y /o contratos:

Tipo de Convenio	Interadministrativo
No. del Convenio	1909-2022
Celebrado por	LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON CON EL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCO
Fecha suscripción	7 de agosto de 2022
Objeto	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO y CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCO
Valor	CUATRO MIL SEICIENTOS VEINTI CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISIES MIL TREINTA Y CINCO PESOS M/L ($4.625.716.035,00) M/L, incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones a las que haya lugar,
Plazo de ejecución	24 de marzo de 2024.

Powered by CamScanner

CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA:

Tipo de Contrato	Obra pública
No. del Contrato	001-LP-OP
Contratante	MUNICIPIO DE CANTÓN DE SAN PABLO
Contratista	YEISON ALBORNOZ RIVAS
Objeto	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCO.
Valor	CUATRO MIL CIENTO SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($4.160.457.625,00 COP).
Plazo de ejecución	NUEVE (9) meses

CONTRATO INTEREVENTORÍA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA

Tipo de Contrato	Contrato de Interventoría
No. del Contrato	001-I-CM
Contratante	MUNICIPIO DE CANTÓN DE SAN PABLO
Contratista	YORK STIVENSON PEREA AYALA
Objeto	INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION ESTACION DE LA POLICIA EN EL MUNICIPIO DE EL CANTON DE SAN PABLO DEPARTAMENTO CHOCO"
Valor	CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($465.033.732,00 COP).
Plazo de ejecución	NUEVE (9) meses

3. VERIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS

No aplica

4. REVISIÓN DE LOS DISEÑOS

En atención a la comunicación radicada el 18/07/2023 en la ventanilla única de la Dirección General de la Policía Nacional, bajo número consecutivo **GE-050060-DIPON**, remitida por el señor OSCAR ANTONIO PALACIOS PALACIOS, Alcalde Municipal del Cantón de San Pablo – en el Departamento de Chocó, mediante la cual hacen entrega en medio digital de la documentación del proyecto en mención, y a la comunicación oficial **GS-2023-000468-DIFRA** del 18/08/2023, remitida por la Dirección Logística y Financiera en la cual se establece el alcance de la revisión y acompañamiento del comité de diseño de la Policía Nacional hasta la etapa de Esquema básico, se mencionan los siguientes aspectos y consideraciones de los componentes revisados, así:

Mediante oficio del 30/06/2023 el Ingeniero YORK STIVENSON PEREA AYALA FLÓREZ, Representante Legal de la Interventoría manifiesta la aprobación de la consultoría.

Mediante comunicado del 30/06/2023 la señora YIVIOLA RAMIREZ MORENO supervisión por parte de la Secretaría de Planeación del Municipio de Cantón de San Pablo, remite el concepto de aprobación de la consultoría a la señora Coronel DIANA MARCELA TORRES CASTELLANOS, Directora Logística y Financiera de la Policía Nacional.

COMPONENTE TOPOGRAFÍA:

MEMORIALES DE RESPONSABILIDAD: se presentaron los memoriales de responsabilidad por parte de los siguientes profesionales:

Powered by CamScanner

Ing. topógrafo de la Consultoría: DEYBI MAURICIO GONZALES TORRES M.P. 25335213100CND

Ing. topógrafo de la interventoría: LUIS FERNANDO MOLINA GARCIA TORRES M.P 25335-177438CND.

OBSERVACIONES COMPONENTE DE TOPOGRAFÍA:

La revisión parte de la aprobación realizada por la interventoría del proyecto en comento y son los profesionales delegados por las firmas contratistas de obra e interventoría los responsables de su contenido, para lo cual al momento de la entrega del paquete técnico definitivo se deben anexar los memoriales de responsabilidad de los citados profesionales.

Al momento de la implantación del proyecto, la interventoría y consultoría deberán tener en cuenta la cota de inundación del terreno, con el fin de evitar futuras afectaciones a las edificaciones, como consecuencia de fenómenos naturales (fuertes precipitaciones, anegaciones, inundaciones, entre otros) o dificultades en la etapa de construcción.

Cada ajuste y/o verificación a los cálculos resultantes del estudio topográfico que genere nuevos resultados a los ya obtenidos, implica un nuevo producto de planos e informe, de acuerdo a la precisión y exactitud exigida y requerida en el presente estudio, así mismo la dirección de la consultoría deberá dar a conocer a las diferentes disciplinas que hayan intervenido en el desarrollo del proyecto, para que ellas las tengan en cuenta y procedan a ajustar sus demás productos.

Garantizar que la implantación del proyecto no afecte la intervisibilidad de los vértices o puntos de control materializados por la consultoría, sean toda vez que la reubicación de una de estas placas implicaría sobre costos y atrasos en el desarrollo de la obra civil.

Es preciso aclarar que el alcance de esta revisión, se realiza exclusivamente a la documentación aportada por la supervisión del contrato, sin que el componente topográfico tenga pleno conocimiento o la obligación de conocer las características físicas del predio, sus determinantes físicas y naturales, normas urbanas de la localidad o modificaciones posteriores a los diseños, entorno arquitectónico y urbano que lo rodea, toda vez que se reitera es una responsabilidad de la supervisión con las firmas contratistas de obra e interventoría.

La interventoría deberá exigir la certificación de verificación del equipo GNSS ALLYNAV R26, toda vez que remiten una certificación de calibración y para este tipo de equipos no cumple dicho documento.

Es importante anotar, que el consultor y la interventoría y la supervisión de la entidad contratante, se hacen responsables de la adaptación del proyecto a las condiciones de topografía reales de acuerdo al estudio técnico, con el fin de estimar los niveles definitivos de la construcción, además de la verificación de redes y acometidas de servicios públicos que garanticen el correcto funcionamiento de la edificación.

Es importante aclarar que las revisiones efectuadas por el comité de diseño de la Policía Nacional al proyecto no lo responsabilizan por hechos u omisiones que afecten el desarrollo de la construcción de la edificación.

COMPONENTE ARQUITECTÓNICO/BIOCLIMÁTICO:

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

Mediante Resolución No. 0409 del 30/06/2023, la Secretaría de Planeación del Municipio El Cantón de San Pablo – Departamento del Chocó, otorga la licencia de construcción en los términos contenidos, así:

Powered by CamScanner

Propietario: LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
Predio: urbano
Escritura Pública: Si posee
Dirección: Barrio Las Brisas/ no posee nomenclatura
Estrato: 1
Representante Legal: WILLIAM RENE SALAMANCA RAMIREZ
Cargó: Dirección General de la policía nacional
Cedula de ciudadanía: 6.770.835

La vigencia es de veinticuatro (24) meses contados a partir del 30/06/2023.

MEMORIALES DE RESPONSABILIDAD: se presentaron los memoriales de responsabilidad por parte de los siguientes profesionales:

Arquitecto diseñador de la Consultoría: JHONNY LEÓN MURILLO PEREA M.P. T99872015–1088282863.

Arquitecto diseñador de la interventoría: YEINER YURGAKY MURILLO M.P A16782017-11707707

Arquitecto bioclimático de la Consultoría: DAVID PERICO AGUDELO M.P A25032002-79945861

Arquitecto bioclimático de la Interventoría: DIANA MARÍA RODRÍGUEZ DUQUE M.P. A63802008-41949998.

OBSERVACIONES COMPONENTE BIOCLIMÁTICO:

Diagnóstico bioclimático

Se verificó que los datos de clima aplicaran al sitio de ejecución del proyecto de acuerdo a la ubicación de la estación meteorológica IDEAM más cercana, asegurando así que los datos son producto de equipos de medición certificados.

El análisis de clima se encuentra completo, con todas las variables necesarias para determinar unas estrategias bioclimáticas acordes al sitio.

El diagnóstico bioclimático cumple con todos los cálculos necesarios de medias horarias de temperatura y humedad que son soporte del diagrama psicrométrico, el cálculo de la temperatura neutral y el rango de confort en cumplimiento de la norma ASHRAE 55, al igual que se presenta análisis adecuado de trayectoria solar en función del predio.

Se determina de forma concluyente las estrategias bioclimáticas recomendadas para el proyecto, especificando aplicación desde la implantación, forma general de las edificaciones, zonificación bioclimática, climatización, protección solar y materiales de la envolvente arquitectónica.

Diseño bioclimático

Se aplican de forma correcta las estrategias bioclimáticas planteadas en la fase de diagnóstico, mediante una acertada orientación de la implantación por trayectoria solar y vientos predominantes y forma general de la edificación.

Se realiza diseño y cálculo de ventilación conforme a la ASHRAE 62.1 cumpliendo con los parámetros de renovación de aire de acuerdo al uso, y una efectiva aplicación de los conceptos de ventilación cruzada mediante el uso de presión positiva y negativa de fachadas.

Se realiza el diseño y cálculo de protección solar indicando los ángulos y horas de protección de acuerdo a cada fachada irradiada, con el fin de que el diseñador de aplicación de los mismos al diseño arquitectónico.

Powered by CamScanner

Se realiza análisis completo de la materialidad de la envolvente arquitectónica siguiendo los parámetros del nivel de seguridad, presentando el cálculo de las propiedades térmicas del sistema constructivo aplicado.

Fase comprobación final

Se indican de forma correcta los parámetros de simulación térmica en cuanto a materialidad, sistema constructivo, día crítico de simulación y variables de uso tales como la programación de uso, cargas internas por ocupación, cargas térmicas por equipos, iluminación y vestimenta.

Se presentan las gráficas de evolución de la temperatura interior de los espacios críticos en el día crítico de diseño, con las respectivas conclusiones donde se demuestra la efectividad del diseño bioclimático y los respectivos beneficios de su aplicación en cuanto confort térmico y eficiencia energética.

OBSERVACIONES COMPONENTE ARQUITECTURA:

Teniendo en cuenta la revisión llevada a cabo en ocho (8) comités, y que el presente aval corresponde al diseño arquitectónico en etapa de esquema básico, el componente de arquitectura cumple con los siguientes aspectos:

El diseño planteado responde a la normativa vigente del municipio, la cual fue presentada en comité por la firma consultora, e interventora.

Programa arquitectónico: cumple con las áreas establecidas en el programa arquitectónico de la Policía Nacional, encontrándose en el rango de las áreas construidas cubiertas y descubiertas.

El diseño arquitectónico planteado en dos niveles, la implantación, volumetría, zonificación y distribución interior, están acordes con las recomendaciones a nivel de bioclimática en cuanto a orientación y forma de las edificaciones, así como la materialidad y acabados en los muros y ventanas de las fachadas, cubiertas, de acuerdo a la imagen institucional. Así mismo, se sugiere la implementación de Sistema de aire acondicionado para las zonas de administración, social, alojamientos y áreas que se requieran por su correcto funcionamiento.

La distribución de espacios a nivel interior está acorde a la funcionalidad y dinámica institucional, y actividades que se realizan en cada una de las zonas planteadas en el programa arquitectónico (administrativo, social, restringido y alojamientos).

El planteamiento arquitectónico permite verificar el cumplimiento de los conceptos de implantación, funcionamiento, espacialidad, proporción, que definen de manera integral el diseño propuesto.

Se aporta la planimetría (plantas, cortes y fachadas) que permiten verificar las dimensiones, elevaciones, niveles, estructura de las edificaciones de cada uno de las áreas que componen el proyecto, así como las circulaciones, zonas exteriores, urbanismo de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas.

5. ASPECTOS A TENER EN CUENTA:

La presente acta corresponde a la revisión y validación de los diseños de los componentes de topografía, bioclimática y arquitectura a nivel de ESQUEMA BÁSICO en los cuales se verificó los aspectos funcionales, espaciales, volumétricos y conceptuales del diseño, con base en las determinantes físicas y naturales, normas urbanas, expuestas por el consultor y la interventoría y no responsabilizan al comité de diseño por hechos u omisiones que afecten el desarrollo de la construcción de la edificación, los cuales son responsabilidad del consultor, la interventoría y la entidad contratante.

La revisión y aval de todos los componentes de la consultoría hasta culminar y alcanzar la ETAPA DE PROYECTO, así como los trámites de licencias y permisos que se requieran, estarán a cargo de

Powered by CamScanner

la interventoría, quien garantizar el cumplimiento a cabalidad de las especificaciones técnicas de la Policía Nacional, la normatividad vigente y la correcta ejecución de la obra.

Lo anterior, se soporta en la Ley 80 de 1993, artículo 4, numeral 4, que establece la obligatoriedad que tienen las entidades estatales de realizar seguimiento y vigilar de forma ininterrumpida la ejecución de las obras, " (...) para los contratos derivados que involucren el seguimiento a través de la interventoría, la cual contará a su vez con supervisión técnica, de acuerdo a la normatividad vigente, en este sentido se definen los campos de acción alineados con la Ley 1474 de 2011 en su capítulo VII, artículo 82 "responsabilidad de los interventores, articulo 83 "supervisión e interventoría contractual" y el artículo 84. "facultades y deberes de los supervisores y los interventores (...)".

En caso de presentarse modificaciones en los diseños arquitectónicos durante la coordinación con las demás componentes (estructura, Instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, RCI, HVAC) se deberá someter a verificación y aprobación nuevamente por parte del comité de diseño de la Policía Nacional.

El proyecto contempla las áreas cubiertas (edificaciones) y descubiertas (zonas exteriores, parqueaderos, plaza de armas, zonas verdes, urbanismo y muro de cerramiento) de todo el predio de la Policía Nacional, las cuales deberán ser ejecutadas en su totalidad por el contratista, de acuerdo a las especificaciones técnicas, acabados y materiales establecidos, así como el suministro e instalación del sistema de aire acondicionado, para garantizar la entrega de las instalaciones en óptimas condiciones de funcionalidad y habitabilidad.

PRO03 JANETH ASTRID SOLIS MELGAREJO Grupo Técnico y Supervisión de Proyectos. Secretario técnico del comité	**Mayor GUSTAVO ADOLFO QUIROZ WALDO** Jefe Área de Gestión de Proyectos
Teniente Coronel EDWIN SANTIAGO PUENTES MATALLANA Jefe Dirección de Infraestructura Presidente del comité	

Elaboró: PRO-03 JANETH ASTRID SOLÍS MELGAREJO DIFRA-GUTEP	**Revisó:** MY. GUSTAVO ADOLFO QUIROZ WALDO DIFRA -ARGEP
Revisó: MY. OSCAR JAVIER RODRIGUEZ FORERO DIFRA -ARGEP.	**Revisó:** TC. EDWIN SANTIAGO PUENTES MATALLANA DIFRA -JEFAT.

Fecha de elaboración: 28/08/2023
Ubicación: C/trabajo 2023/Comité diseño 2023

Carrera 59 26-21, CAN
Teléfonos: 5159000 IP 9154
difra.gutep@policicia.gov.co
www.policia.gov.co

Humana

ISO 14001 SA-CER276952 ISO / IEC 27001 SI-CER431788

INFORMACIÓN PÚBLICA

Powered by CamScanner

Fecha:	Bogotá, 06 de septiembre de 2023		
Hora de inicio:	08:30 horas	**Hora de finalización:**	12:00 horas
Lugar:	Carrera 59 26-21 CAN, segundo piso Grupo Técnico y Supervisión de Proyectos		

ACTA - - DIFRA - GUTEP – 29.10

QUE TRATA DEL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y VALIDACIÓN DE LA ETAPA DE ESQUEMA BÁSICO DEL PROYECTO ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE CANTÓN DE SAN PABLO -DEPARTAMENTO DE CHOCÓ

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
TC	Edwin Santiago Puentes Matallana	DIFRA-JEFAT	difra. jefat@policia.gov.co	5159000-9154	
MY	Oscar Javier Rodríguez Forero	DIFRA-SUINF	difra.suinf@policia.gov.co	5159000-9154	
MY	Gustavo Adolfo Quiroz Waldo	DIFRA-ARGEP	difra.argep@policia.gov.co	5159000 -9154	
PT	Jesica Fernanda Blanco Ruiz	DIFRA-ARBIN	jesica.blanco@correo.policia.gov.co	5159000 -9154	
PRO 03	Janeth Astrid Solís Melgarejo	DIFRA-GUTEP	janeth.solis@correo.policia.gov.co	5159000 -9154	

Powered by CamScanner
