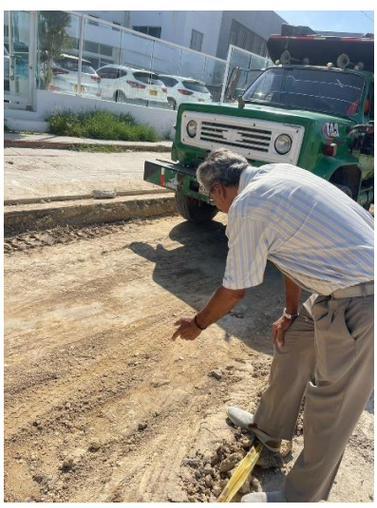
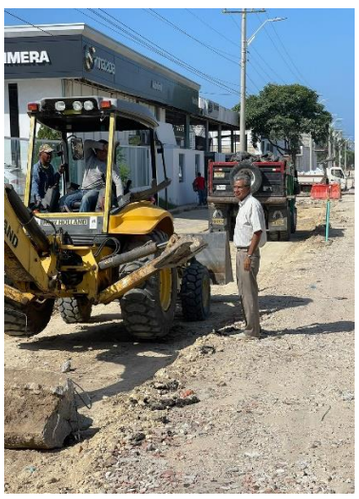
DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Fecha de presentación del informe:	Septiembre / 2023	Numero de contrato:	CD-12-2023-3725
Datos del Contratista (nombres y apellidos-número de identificación)	**FRANCISCO MANUEL SERRANO REDONDO** **C.C Nº 7472490**		
Periodo del informe:	Informe comprendido entre el periodo del 25 de julio al 24 de agosto de 2023.	Informe número:	03
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIAS A LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y A LOS PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.		
Valor del contrato	SON: DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/L ($16.800.000)		
Supervisor	RAFAEL LAFONT DE SALES C.C.: 8.662.605		
Cargo	SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS		

INFORME:

Recorridos en el proceso de supervisión y seguimiento de vías donde se continúan los trabajos, observando de forma general obras de ejecución de vías, correspondiente al Programa Barrios a la Obra, la vía se encuentra ubicada en la siguiente dirección: vía 40 con calle 69.







Observaciones: La máquina trabaja en la demolición del concreto viejo hasta una profundidad de 15 cm, El área ya demolida ha sido compactada, se trabaja en corte y nivelación de terreno y se retira material sobrante.

Recorridos en el proceso de supervisión y seguimiento de vías donde se continúan los trabajos, observando de forma general obras de ejecución de vías, correspondiente al Programa Barrios a la Obra, las vías se encuentran ubicadas en las siguientes direcciones y barrios: Calle 120 entre carrera 10 Y 11. Carrera 10 entre vía Circunvalar y calle 120, El Pueblo





Observaciones: tramos de vías ejecutadas, con detalles en terminación de bordillos y andenes

Supervisión de vías terminadas en el barrio VILLA SAN PEDRO, durante el proceso de recorrido en la fase final para la entrega de las vías terminadas, ubicadas en las siguientes direcciones: Carrera 6I entre Calles 102 y 102 A, Calles 101 entre Carreras 6M y 6Q, (Via Canal) Calle 102 entre Carreras 6L y Circunvalar, Calle 102 A entre Carreras 6I y 6L y Carrera 6H entre Calles 102 y 100, las cuales fueron entregadas a la comunidad por la administración Distrital.



Observaciones: tramos de vías terminadas y entregadas a la comunidad.

Recorridos en el proceso de supervisión y seguimiento de vías donde se continúan los trabajos, observando de forma general obras de ejecución de vías, correspondiente al Programa Barrios a la Obra, las vías se encuentran ubicadas en las siguientes direcciones y barrios: Calle 76 entre carreras 10sur y 11sur Calle 78 entre carreras 5sur y circunvalar Carrera 11sur entre calles 74 y 80 Carrera 10sur entre calles 76 y 78, 7 de abril.





Observaciones: tramos de vías ejecutadas, con detalles en algunos bordillos y filtraciones de agua potable, la cual debe ser reparada por la empresa AAA. Se observan que falta sella juntas en algunos tramos de las vías.

Recorridos en el proceso de supervisión y seguimiento de vías donde se continúan los trabajos, observando de forma general obras de ejecución de vías, correspondiente al Programa Barrios a la Obra, las vías se encuentran ubicadas en las siguientes direcciones y barrios: Calle 45g entre las carreras 3b y 4, Ciudadela 20 de Julio.




Observaciones: Se esta ejecutando las vías, algunas fisuras en placas de concretos, faltan bordillos y andenes, retiro de material sobrante. En términos generales la vía está en ejecución.

Atentamente,



FRANCISCO MANUEL SERRANO REDONDO
C.C. No 7472490
Contratista
