INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO DE OBRA		ACTA DE SUPERVISIÓN		FECHA DE EXPEDICION		
NUMERO	AÑO	PARCIAL	FINAL	DIA	MES	AÑO
190	**2023**	**1**		**12**	**09**	**2023**

INFORMACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARLOS HUMBERTO CAMPOS RUIZ
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT N°: 6775508-7
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS HUMBERTO CAMPOS RUIZ
C.C.: 6.775.508 DE TUNJA
OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACÁ
LUGAR DE EJECUCIÓN: MUNICIPIO DE MIRAFLORES
TERMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: : DEL 27 DE JULIO DE 2023 AL 27 DE OCTUBRE DE 2023
PLAZO DEL CONTRATO: TRES (03) MESES
PLAZO ADICIONAL: N/A
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: TRES (03) MESES
PERIODO REPORTADO: DEL 27 DE JULIO DE 2023 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023
VALOR CONTRATO: SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($64.934.895,25)
VALOR ADICION N°1: N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($64.934.895,25)
REPORTE SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
A continuación se describen las obras ejecutadas a través del contrato de obra "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACÁ", para el acta parcial No 1: CDI-SEMILLAS DEL FUTURO • DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES (ACARREO LIBRE 5 Km.) • EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO) • LIMPIEZA CAJA DE INSPECCION • MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM. • LOSA MACIZA CIMIENTO CONCRETO 21 MPa - 3000 PSI H=10 CM • PISO CERÁMICA 45*45 CM • SALIDA SANITARIA PVC 3" • SUMINISTRO E INSTALACIOREJILLAS DE PISO SOSCO 4*4*3 ALUMINIO

- REPARACION TAPONAMIENTO SANITARIO
- SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=2"
- SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=2"
- CORTE DE PAVIMENTO RÍGIDO PARA ZANJAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y GAS
- REGILLA EN ANGULO DE 2"*3/16 Y VARILLA 5/8
- SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS
- DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA THERMOACUSTICA ONDULADA EN POLIPROPILENO
- RESANE DE CUBIERTAS
- SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa
- SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.07MTS 14MPa (2000PSI)

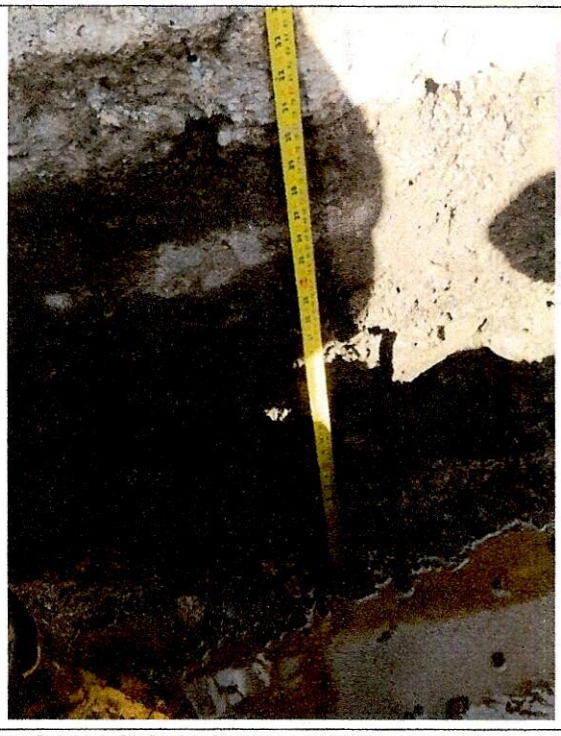
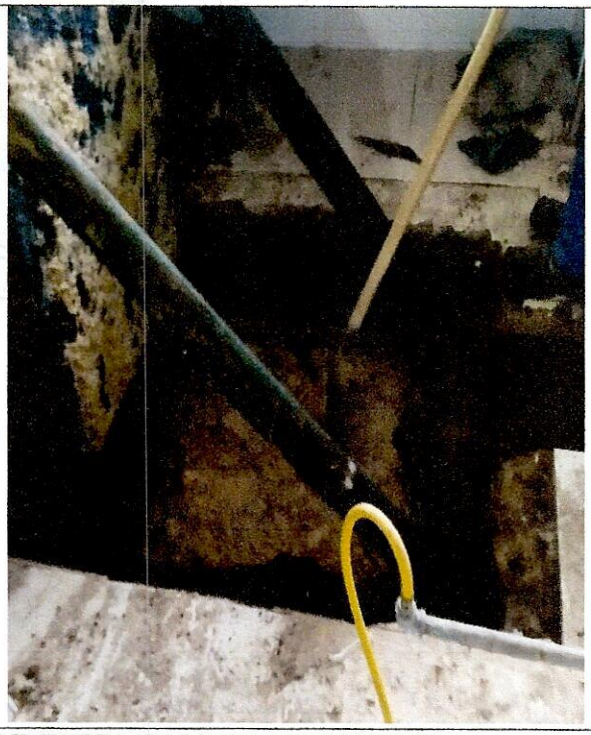
PARQUE PRINCIPAL

- LAVADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE MALEZA EN ADOQUINES
- SUMINISTRO E INSTALACION DE ARENA PARA SELLADO DE JUNTAS DE ADOQUIN
- LAVADA DE FACHADA INC. ACIDO MURIATICO
- IMPERMIABILIZACION DE PIEDRA MUÑECA CON SIKA 10 TRANSPARENTE
- SELLADO DE JUNTA ENTRE MATERA Y PISO EN ADOQUIN
- DESMONTE ADOQUIN PREFABRICADO

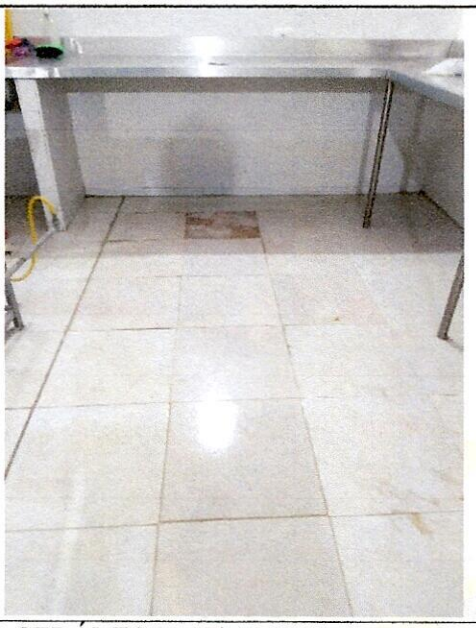
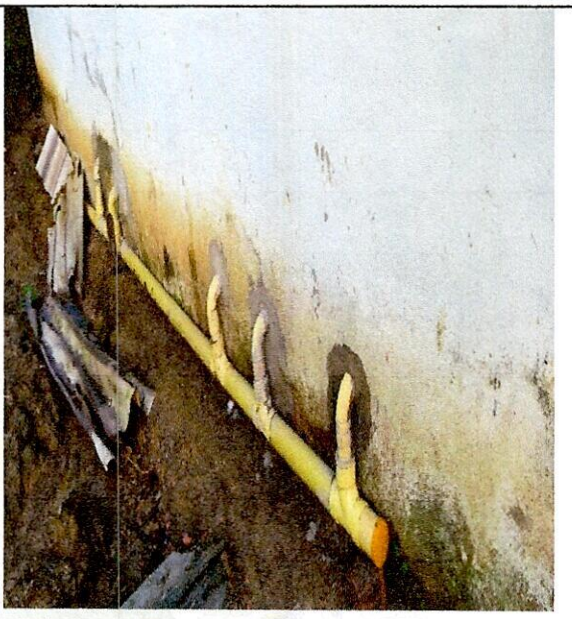
ITEMS NO PREVISTOS

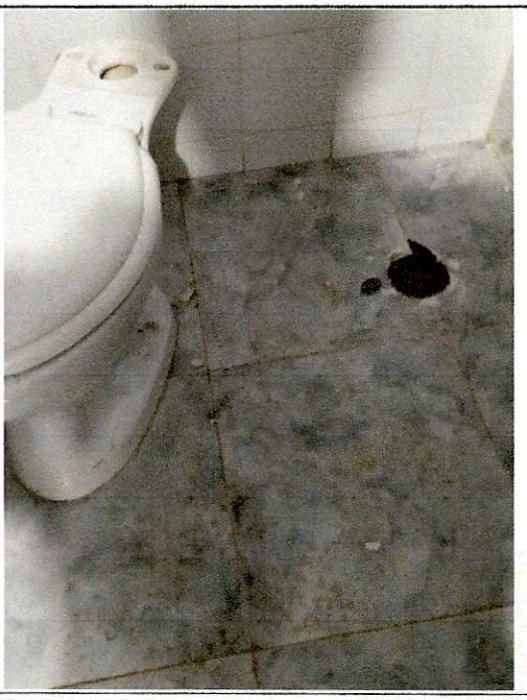
- SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 3"

	
DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO SIMPLE	DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO SIMPLE

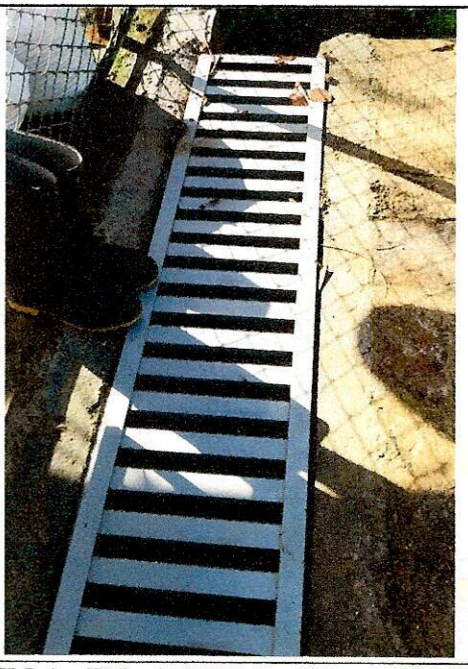
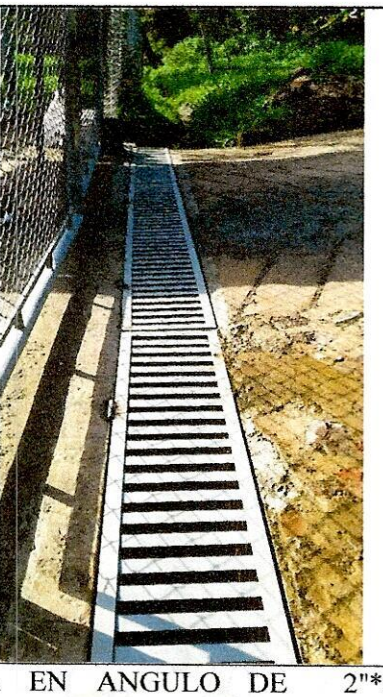
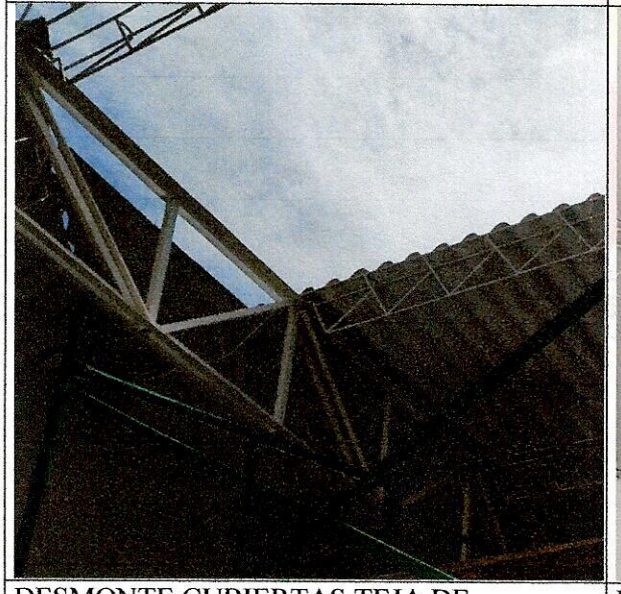
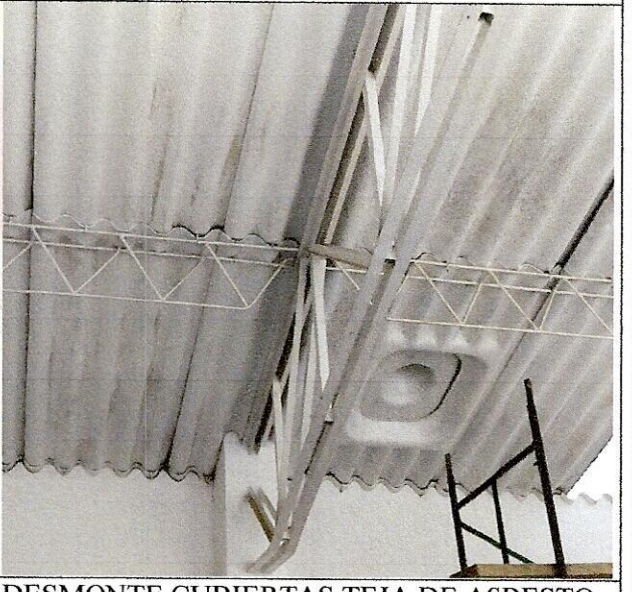
	
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN- Cocina	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN- Entrada al CDI
	
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN- Entrada al CDI	LIMPIEZA CAJA DE INSPECCION

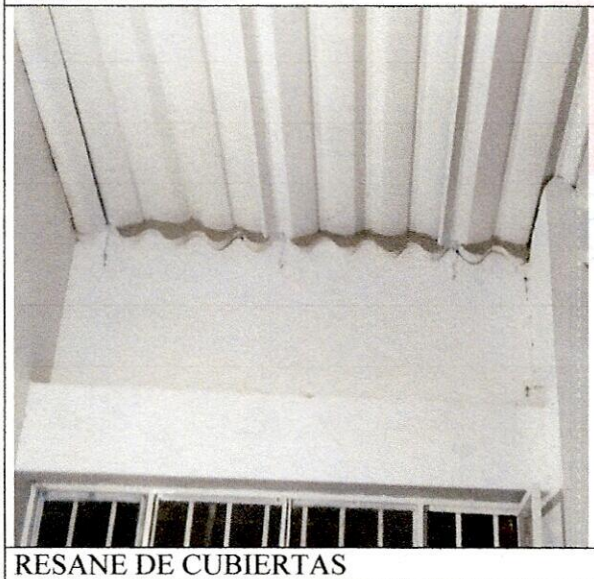
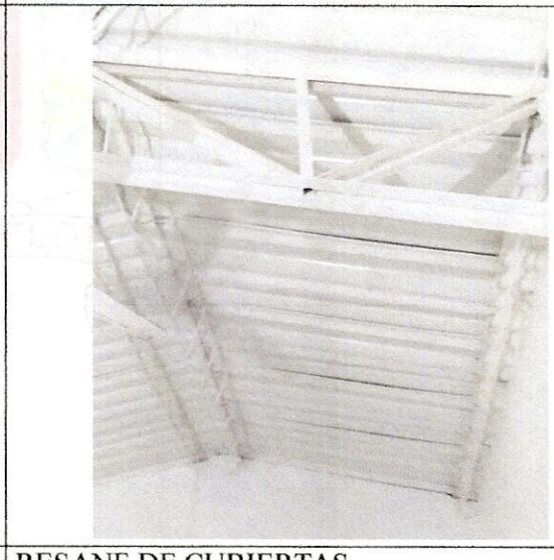
	
LIMPIEZA CAJA DE INSPECCION	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO
	
LOSA MACIZA CIMIENTO CONCRETO 21 MPa	PISO CERÁMICA 45*45 CM

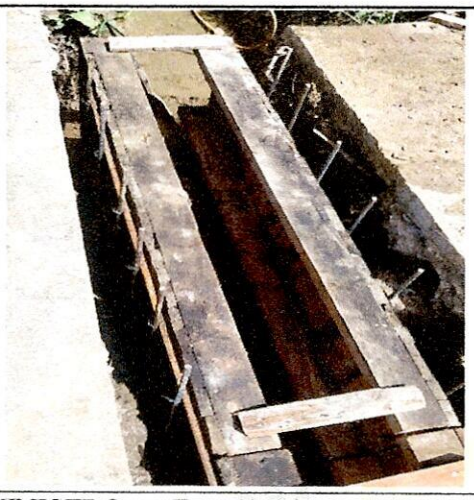
	
PISO CERÁMICA 45*45 CM	SALIDA SANITARIA PVC 3"
	
SALIDA SANITARIA PVC 3"	SUMINISTRO E INSTALACIOREJILLAS DE PISO

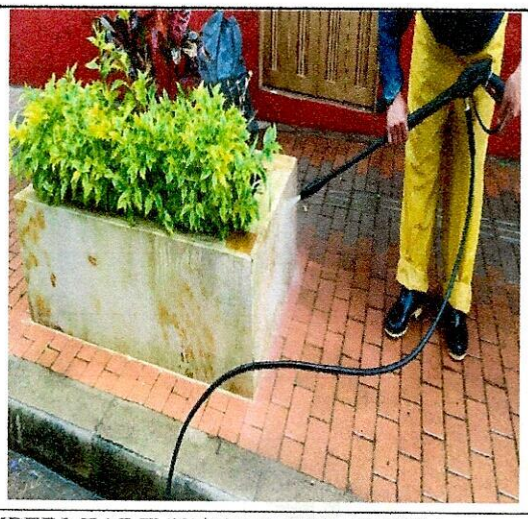
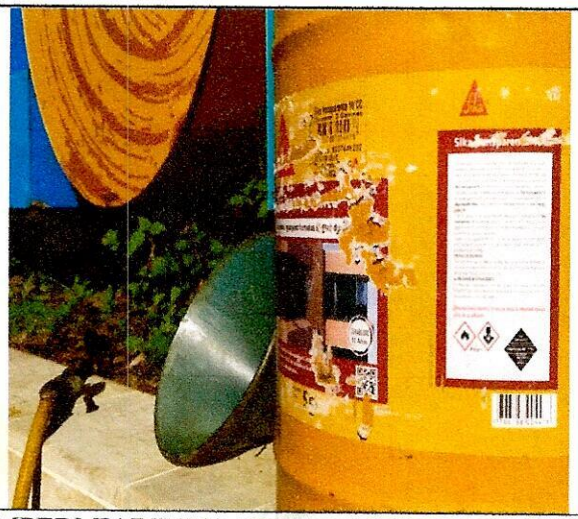
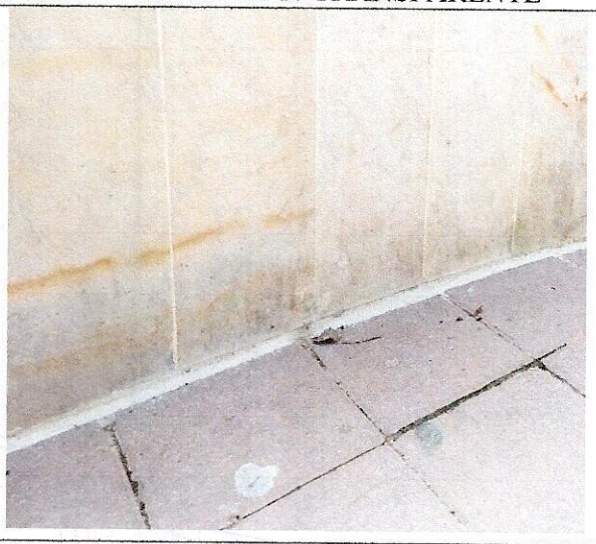
	
REPARACION TAPONAMIENTO SANITARIO	REPARACION TAPONAMIENTO SANITARIO
	
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 3"	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=2"

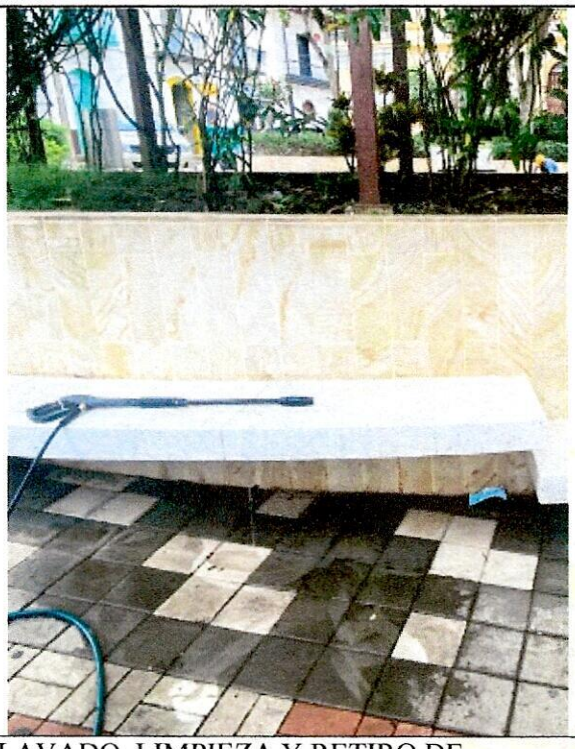
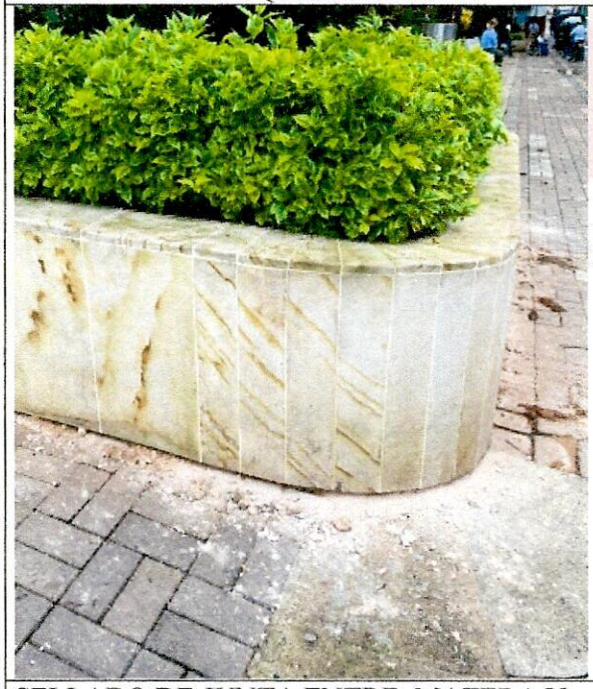
	
SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=2"	SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=2"
	
CORTE DE PAVIMENTO RÍGIDO PARA ZANJAS	CORTE DE PAVIMENTO RÍGIDO PARA ZANJAS

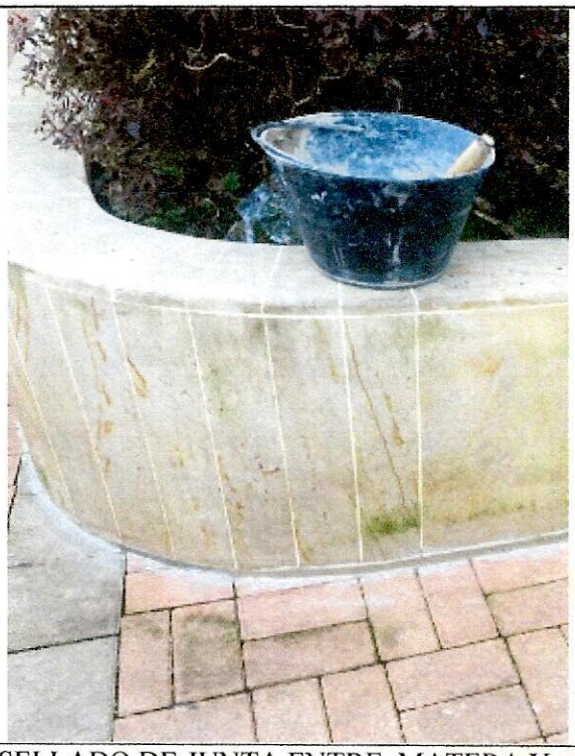
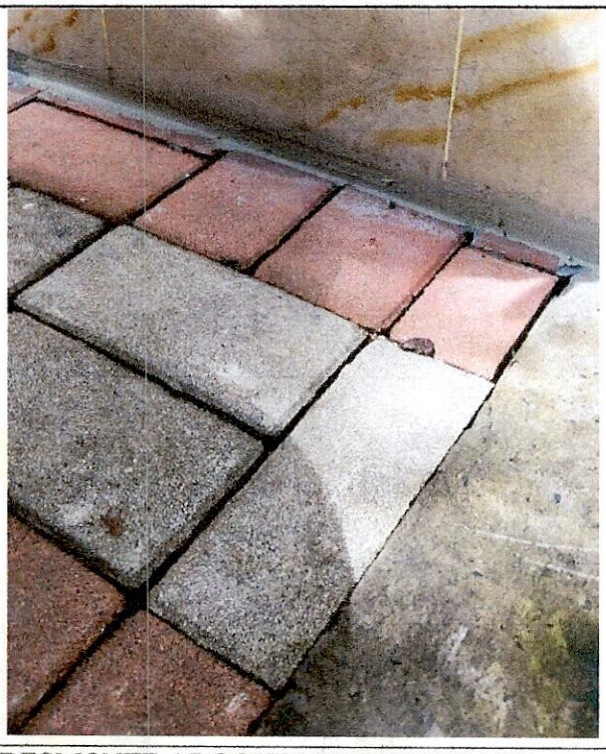
	
REGILLA EN ANGULO DE 2"*3/16 Y VARILLA 5/8	REGILLA EN ANGULO DE 2"*3/16 Y VARILLA 5/8
	
DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO

	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA THERMOACUSTICA ONDULADA EN POLIPROPILENO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA THERMOACUSTICA ONDULADA EN POLIPROPILENO
	
RESANE DE CUBIERTAS	RESANE DE CUBIERTAS

	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI)	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI)
	
SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.07MTS	LAVADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE MALEZA EN ADOQUINES
	
LAVADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE MALEZA EN ADOQUINES	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARENA PARA SELLADO DE JUNTAS DE ADOQUIN

	
IMPERMIABILIZACION DE PIEDRA MUÑECA CON SIKA 10 TRANSPARENTE	IMPERMIABILIZACION DE PIEDRA MUÑECA CON SIKA 10 TRANSPARENTE
	
IMPERMIABILIZACION DE PIEDRA MUÑECA CON SIKA 10 TRANSPARENTE	SELLADO DE JUNTA ENTRE MATERA Y PISO EN ADOQUIN

	
LAVADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE MALEZA EN ADOQUINES	MATERAS ANTES DE LAVADO
	
SELLADO DE JUNTA ENTRE MATERA Y PISO EN ADOQUIN	SELLADO DE JUNTA ENTRE MATERA Y PISO EN ADOQUIN

	
SELLADO DE JUNTA ENTRE MATERA Y PISO EN ADOQUIN	DESMONTE ADOQUIN PREFABRICADO

Observaciones:

REPORTE DE PAGOS A SALUD Y PENSIÓN

Se deja constancia que el contratista acredita el pago de aportes al sistema de seguridad social integral con la planilla de afiliación a la seguridad social N° 7890622439 correspondiente al mes de julio-agosto de 2023, planilla de afiliación a la seguridad social N° 7890640747 correspondiente al mes de julio de 2023, planilla de afiliación a la seguridad social N° 5164945122 correspondiente al mes de agosto-septiembre de 2023, planilla de afiliación a la seguridad social N° 7890644262 correspondiente al mes de agosto de 2023.

REPORTE DE VALORES A CANCELAR AL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO REPORTADO

PAGO NÚMERO	VALOR ACTAS ANTERIORES	VALOR DEL PAGO	SALDO POR PAGAR
01	**$0,00**	**$58.156.615,67**	**$6.778.279,58**

SUPERVISOR

ANGIE NATALIA VARGAS RAMIREZ
Secretaria de planeación e infraestructura
Supervisora

ANDREA PATRICIA NIÑO RUIZ
Apoyo a supervisión

Reviso y Aprobó: Angie Natalia Vargas Ramírez/Secretaria de Planeación e Infraestructura.
Proyecto: Ing. Andrea Niño Ruiz /Apoyo a Secretaria de Planeación e Infraestructura
