
CONSORCIO
INGENIERÍA
Nit: 901.590.075-0

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ
TOCANCIPA - CUNDINAMARCA

Contrato de obra No. CTO 448 MT 2022

Objeto "CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACION INICIAL VEREDA LA FUENTE".

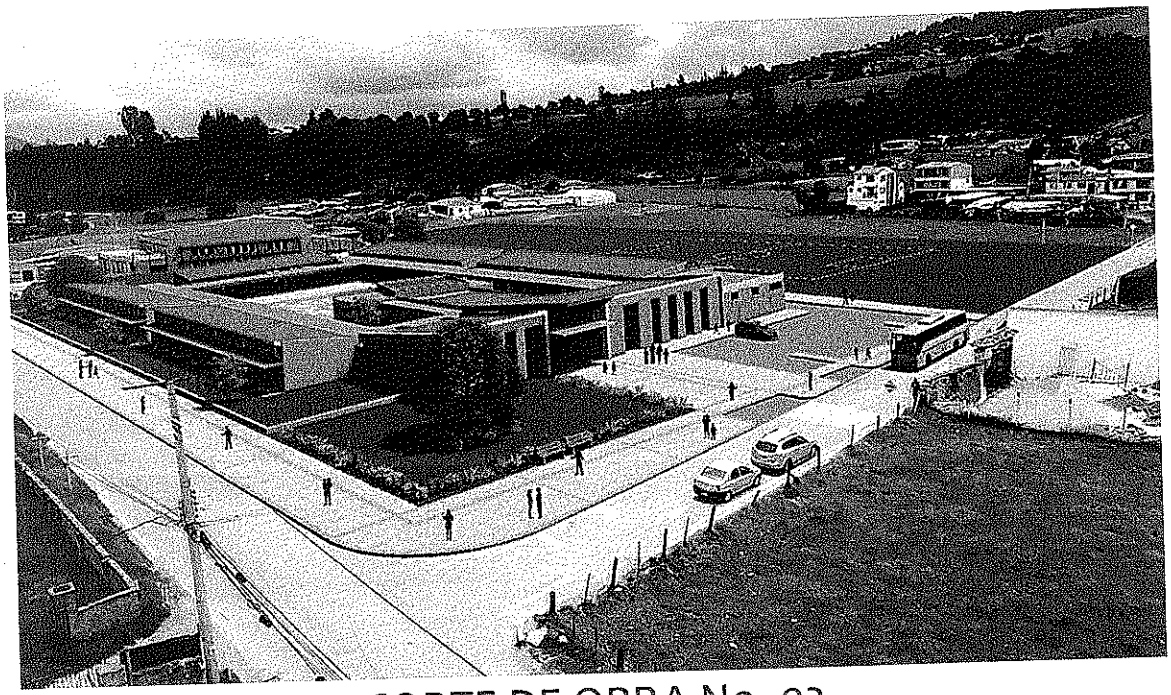

CORTE DE OBRA No. 02


E-mail: ingebypltda@gmail.com
Cra 69D No. 95B - 86 Of. 327-3 - Teléfono: 7561194- Cel. 315 295 8783 – Bogotá D.C.

CONSORCIO
INGENIERÍA
Nit: 901.590.075-0

INFORMES DE ACTIVIDADES CON REGISTRO FOTOGRÁFICO

E-mail: ingebypltda@gmail.com
Cra. 68D No. 25B - 86 Of. 327-3 - Teléfono: 7561194- Cel. 315 295 8783 – Bogotá D.C.

INFORME MENSUAL DE OBRA No. 3

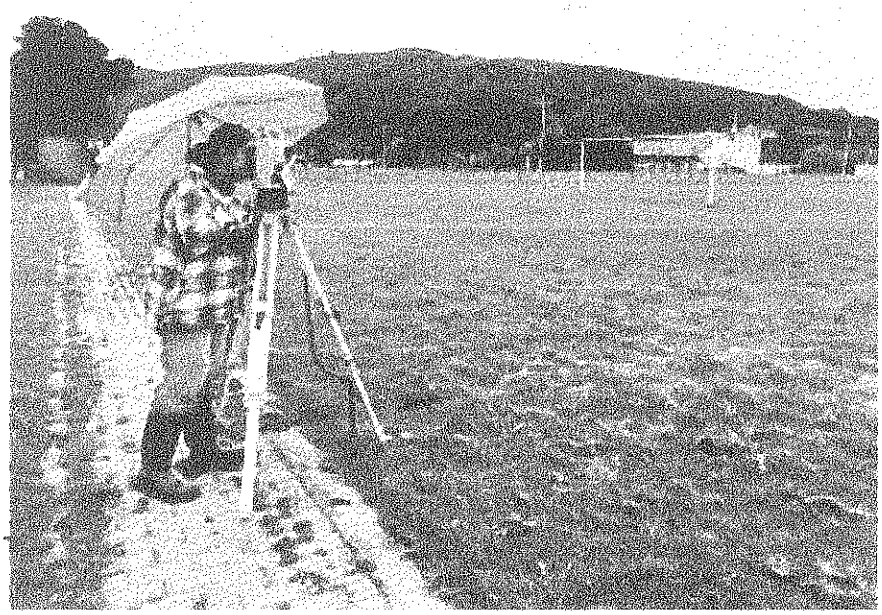

CONSORCIO BS INGENIERIA

Nit: 901.590.075-0

"CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ".

CONTRATO DE OBRA No. CTO 448 MT 2022

INFORME MENSUAL DE OBRA No. 3

002

CONSORCIO
INGENIERÍA

Periodo del 12 al 30 de abril 2023

MUNICIPIO TOCANCIPÁ
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

SUPERVISOR DEL CONTRATO

ING. MARIO ENRIQUE SUANCA PULIDO

003


1. Tabla de contenido

1. CONTROL DE MODIFICACIONES 4
2. INTRODUCCIÓN 5
3. GENERALIDADES DEL PROYECTO 6
LOCALIZACIÓN: 6
4. ANTECEDENTES MES A MES 7
MES DE ABRIL 2023 7
5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 9
5.1. CONTRATO DE OBRA 9
5.2 ENTIDAD CONTRATANTE 9
5.3 INFORMACION BASICA DE LA INTERVENTORIA 10
6. GARANTIAS 11
7. COMPONENTE TECNICO 12
7.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 12
7.1.1. ACTIVIDAES PRELIMINARES 12
8. ASPECTOS FINANCIEROS 14
7.1 RELACIÓN ACTAS DE PAGO 14
7.2 REVISÓN AL AVANCE SEGUN FLUJO DE FONDOS 14
7.3 SEGUIMIENTO A LOS TRAMITES DE SERVICIOS PUBLICOS PROVISIONALES 16
9. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 16
8.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 16
8.2 RELACIÓN DE PERSONAL 16
8.3 INFORMES SEMANALES DEL PERIODO 17
10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES DEL INFORME 18
11. ANEXOS 19
REGISTRO FOTOGRAFICO 19

1. CONTROL DE MODIFICACIONES

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
00	20-05-2023	Original
01	25-08-2023	Original

REVISIÓN Y APROBACIÓN

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORÓ:	Ing. Sandra López	Residente de obra	
VREVISÓ:	Ing. Fabián Oswaldo Bohórquez	Director de obra	
APROBÓ:	Ing. Natalie Tristancho Cleves	Representante Legal Interventoría	

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

FECHA	NOMBRE	CARGO
20-05-2023	Ing. Fabián Bohórquez	Director de Obra
20-05-2023	Ing. Lisandro Nuñez	Director de Interventoría

005

2. INTRODUCCIÓN

El presente informe se describen los aspectos más relevantes en el desarrollo del **CONTRATO DE OBRA No. CTO 448 MT 2022.** "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ".

Contine un recuento de las actividades adelantadas por el Consorcio BS Ingeniería durante el primer mes de ejecución de actividades constructivas, periodo comprendido entre el 12 al 30 de abril 2022.

El proyecto está dirigido, a construir la infraestructura física del CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ obteniendo así espacios que permitan avanzar en el proceso de aprendizaje de la primera infancia, teniendo dentro del centro de atención inicial áreas como aulas, zonas de recreación y otros espacios especializados que favorezcan el aprendizaje. El proyecto consiste en la construcción de un módulo de un piso, en el cual se encuentran 5 bloques de aulas de primera infancia. Adicional a esto, se contará con una zona de servicios, una zona de cuartos técnicos, zona administrativa y espacio al aire libre destinado a la recreación de los infantes.

La estructura de las nuevas edificaciones será convencional en concreto reforzado, la edificación contará, con un tanque de almacenamiento para el agua potable y sistema de red contra incendio y las redes necesarias para el correcto funcionamiento de la entidad.

3. GENERALIDADES DEL PROYECTO

LOCALIZACIÓN:

El centro de atención y educación inicial se encuentra ubicado en el municipio de Tocancipá, Cundinamarca, más específicamente en la vereda La fuente, vía Tocancipá – Zipaquirá, sector fuente vida predio rural Lote Sevilla

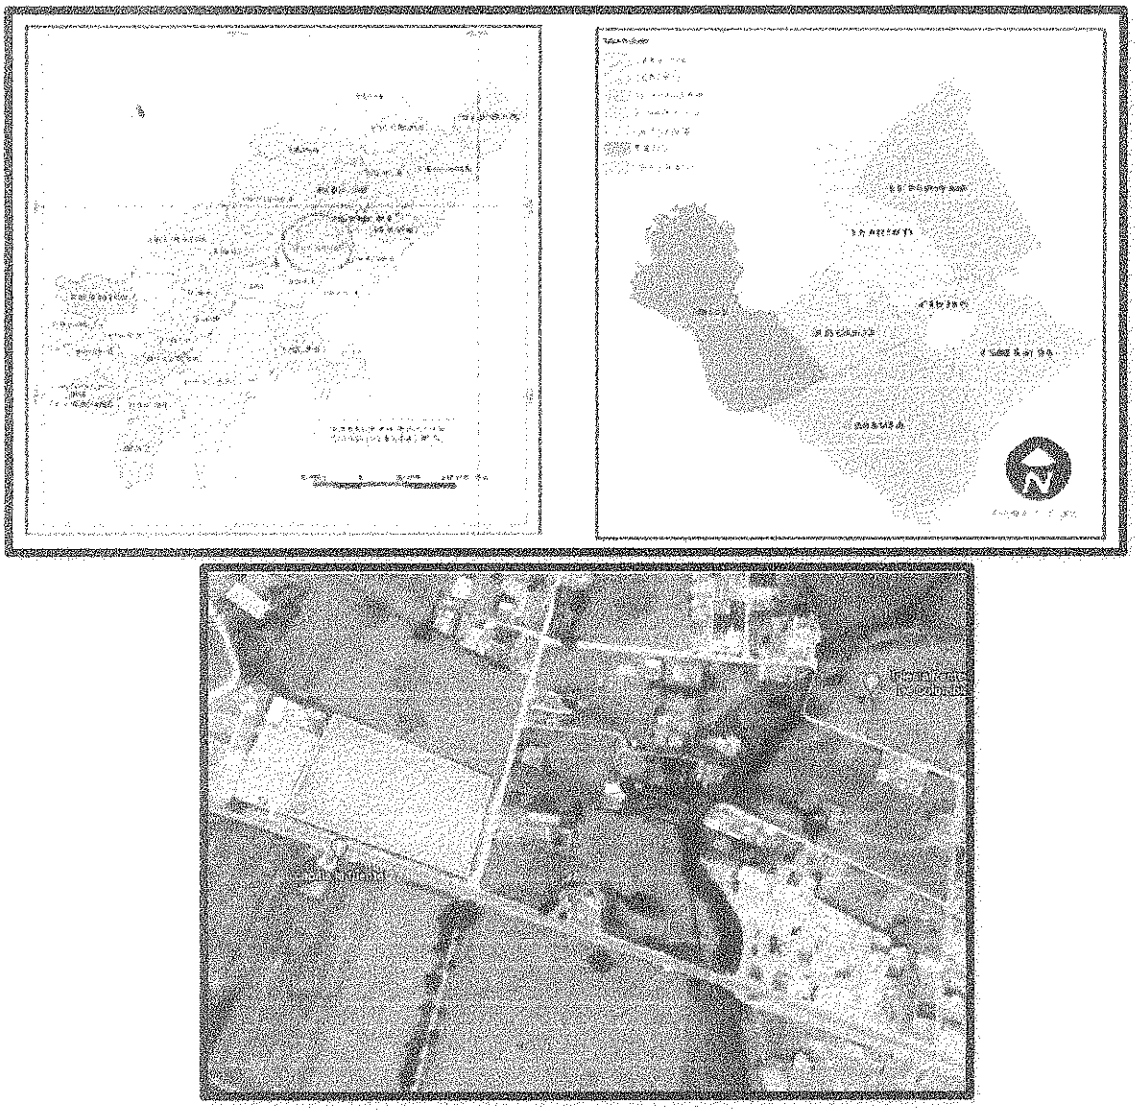


Imagen 2 Ubicación Del Predio donde se construirá la primera etapa centro de atención y educación inicial vereda la fuente en el municipio de Tocancipá. Fuente: Tomada. GOOGLE EARTH.

4. ANTECEDENTES MES A MES

El 06 de diciembre de 2022, se formaliza contrato de obra por la modalidad del Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP II funciona con contratos electrónicos que son aprobados/aceptados por las partes a través de la plataforma.

Estos contratos tienen validez jurídica y probatoria. No es necesario imprimir minutas y hacerlas firmar por las partes. En el SECOP II ya se encuentra el respectivo clausulado y los documentos soporte del contrato considerados pertinentes por la Entidad contratante.

El plazo de ejecución del contrato será de DIECIOCHO (18) MESES. Se define por las partes que este plazo se contará a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución y la suscripción del acta de inicio.

Es importante destacar que con el reinicio a la suspensión No 4, se comienzan las actividades de obra que serán sistemáticamente resumidas mes a mes en el siguiente capitulo:


MES DE ABRIL 2023

Durante el presente periodo se da inicio a las actividades de obra con el recibo del lote, el día 12 de abril de 2023, ejecutándose actividades correspondientes al capítulo de Preliminares, las cuales hacen parte a un conjunto de trabajos que deben ejecutarse antes del desplante del proyecto, y que son necesarias y obligatorias para garantizar la seguridad, implementación logística de campamentos y todo lo correspondiente al funcionamiento de las instalaciones provisionales en cuanto a campamentos para el desempeño de las actividades administrativas del proyecto.

Es importante indicar que no se logró ejecutar un avance superior al proyectado, toda vez que el predio a construir se encuentra en uso por la comunidad de la vereda la fuente, cancha de fútbol la cual permanentemente esta activa y hasta tanto no sea reubicada no se podrá avanzar en el total de las actividades programadas. Por lo cual se deja constancia en

el presente documento sobre las advertencias efectuadas en un futuro desplazamiento de la ruta crítica por tiempos no imputables al contratista, de no ser subsanada esta novedad por parte del municipio de Tocancipá.

En el mes de abril se dejó el campamento de obra ejecutado en su totalidad.

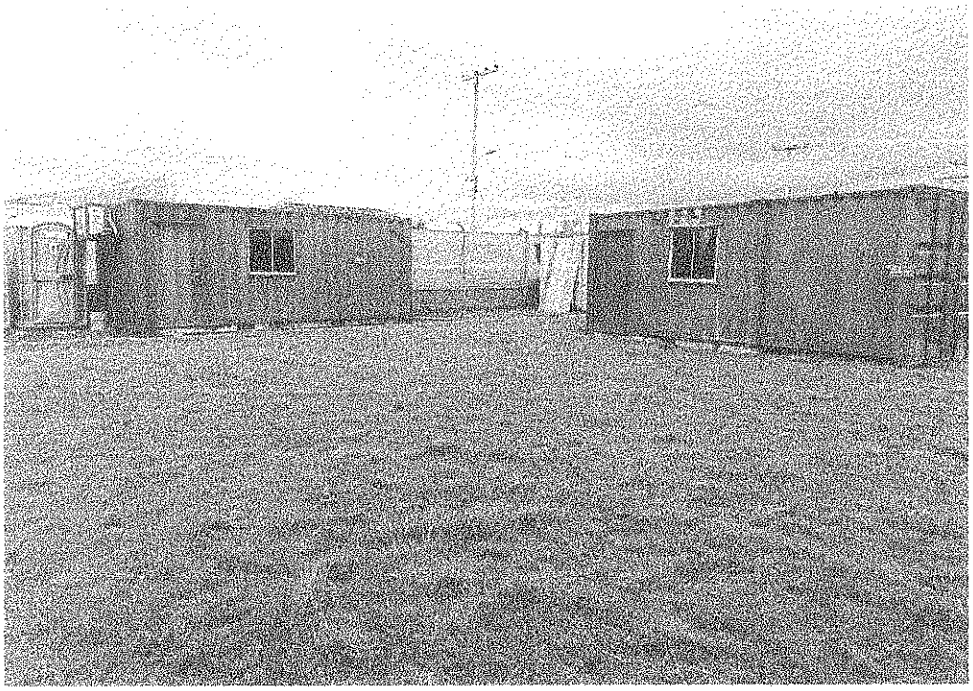



5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

5.1. CONTRATO DE OBRA

Contrato de Obra No.	:	CTO 448 MT 2022
Objeto	:	"CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ".
Valor inicial del Contrato de Obra	:	$ 16.376.116.616,00
Plazo inicial	:	18 meses
Fecha de inicio	:	Diciembre 06 de 2022.
Fecha de Terminación inicial	:	Junio 05 de 2024.
Acta de suspensión No 1	:	20 de enero de 2023
Tiempo de la suspensión	:	30 días
Acta de suspensión No 2	:	17 de febrero de 2023
Tiempo de la suspensión	:	30 días
Acta de suspensión No 3	:	17 de marzo de 2023
Tiempo de la suspensión	:	15 días
Acta de suspensión No 4	:	31 de marzo de 2023
Tiempo de la suspensión	:	12 días
Acta de reinicio a la suspensión 4	:	12 de abril de 2023
Nueva fecha de terminación	:	26 de agosto de 2024
Contratista	:	CONSORCIO BS INGENIERIA
NIT	:	901.590.075-0
Representante Legal	:	Ing. JEFFERSON BOHORQUEZ LESMES

5.2. ENTIDAD CONTRATANTE

Entidad contratante	:	MUNICIPIO DE TOCANCIPA
Departamento	:	Secretaria de Infraestructura
Supervisor contrato	:	Ing. MARIO ENRIQUE SUANCA PULIDO

Dirección	:	Alcaldía de Tocancipa 2do Piso.

5.3 INFORMACION BASICA DE LA INTERVENTORIA

Contrato de Interventoría No.	:	CTO 477 MT 2022
Objeto	:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ".
Valor inicial del Contrato de Interventoría	:	$ 1.316.604.045,00
Plazo inicial	:	19 meses
Fecha de inicio	:	Diciembre 06 de 2022.
Fecha de Terminación inicial	:	Julio 05 de 2024.
Contratista	:	CONSORCIO STARK
NIT	:	901.619.583-9
Fecha de terminación actualizada	:	26-09-2024
Representante Legal	:	Ing. NATALIE TRISTANCHO CLEVES

CONSORCIO
INGENIERÍA

6. GARANTIAS

Dando alcance a nuestros compromisos contractualmente pactados, se efectúa la correspondiente actualización de las pólizas, respecto al acta de reinicio correspondiente a la suspensión No 4:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO—POLIZA No 57944 ENDOSO 3 Berkley International Seguros Colombia S.A.				
DESCRIPCIÓN	NUMERO	VIGENCIA	VIGENCIA HASTA	VALOR AMPARADO ($)
CUMPLIMIENTO	57944	06/12/2022	26/02/2025	$ 1,637,611,661.60
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	57944	06/12/2022	26/08/2027	$ 818,805,830.80
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	57944	26/08/2024	26/08/2029	$ 3,275,223,323.20

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No 17278 Endoso 3 Berkley International Seguros Colombia S.A.				
DESCRIPCION	NUMERO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR AMPARADO ($)
AMPARO BASICO- PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	17278	06/12/2022	05/06/2024	$ 818,805,831.00
PATRONAL	17278	06/12/2022	05/06/2024	$ 818,805,831.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	17278	06/12/2022	05/06/2024	$ 818,805,831.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	17278	06/12/2022	05/06/2024	$ 818,805,831.00

7. COMPONENTE TECNICO

7.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante el periodo comprendido entre el 12 de abril al treinta de abril, se ejecutan las siguientes actividades correspondientes al capítulo:

7.1.1. ACTIVIDAES PRELIMINARES.

Cerramientos Perimetrales: delimitación del terreno para impedir el acceso a personas ajenas a la obra. Pese a que el lote se encuentra en uso se hace cierre en lona verde a fin de restringir la visual y garantizar la correspondiente protección a las zonas administrativas que se están proyectando.

Oficinas de Obra y de Interventoría: Se realiza el desplazamiento de los respectivos contenedores con el fin de establecer un área donde se lleva a cabo la administración, bodega y control de los movimientos en obra.

Servicios: Se Realizan las inspecciones previas para verificación de red sanitario, y se efectúan los tramites requeridos para efectuar las acometidas provisionales y de esta manera ofrecer servicios eléctricos, hidráulicos y sanitarios necesarios para el personal y el desarrollo de la obra.

Revisión topográfica inspección y levantamiento preliminar del lote: Se realizan las actividades previas topográficas verificando las condiciones iniciales planimétricas y altimétricas del lote

Valla: Según lo contractualmente estipulado, se realiza la actividad correspondiente al suministro e instalación de elemento informativo valla.

CONSORCIO
INGENIERÍA

SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Nombre de tarea	UNIDAD	Cantidad	Duración	Comienzo	Fin	INICIO REAL	ATRASO	MOTIVOS DE ATRASO	% DE EJECUCION
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA 3x5	UN	1	30 días	mié 12/04/23	mar 16/05/23	12/04/2023	0	n/a	100,00%
CAMPAMENTO 18 M2	UN	1	30 días	mié 12/04/23	mar 16/05/23	18/04/2023	0	n/a	50,00%
DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M	M2	5877,57	30 días	mar 16/05/23	sáb 17/06/23	18/04/2023	0	n/a	0%
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	M2	5057,93	30 días	mar 16/05/23	sáb 17/06/23	17/04/2023	0	n/a	0%
RED ELÉCTRICA PROVISIONAL L=50M	UN	1	30 días	mar 16/05/23	sáb 17/06/23	18/04/2023	0	n/a	EN TRAMITE
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	617,83	30 días	jue 15/06/23	mié 19/07/23		0	n/a	0%
EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	2937,42	60 días	vie 26/05/23	mié 2/08/23		0	n/a	0%

8. ASPECTOS FINANCIEROS

8.1. RELACIÓN ACTAS DE PAGO

Para el periodo comprendido en este informe no se realizan actas de corte de obra para pagos.


8.2. REVISÓN AL AVANCE SEGUN FLUJO DE FONDOS

A continuación, se informa sobre el flujo de fondos diarios y su comportamiento durante la *ejecución de las actividades de obra efectuadas para durante el mes de abril 2023*

ANALISIS FLUJO DE FONDOS PROGRMADO PARA EL MES DE ABRIL 2023								
AÑO	MES	SEMANAS	DIAS	VR. DIARIO PROGRMADO	VR ACUMULADO	% ACUMULADO PROGRMADO	% EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
2023	ABRIL		12	$ 156.480,48	$ 172.069.953,60	1,00%	0,10%	-0,90%
			13	$ 200.251,24	$ 172.270.204,84	1,00%	0,20%	-0,80%
			14	$ 200.251,24	$ 172.470.456,08	1,00%	0,35%	-0,65%
			15	$ 109.062,15	$ 172.579.518,23	1,05%	0,50%	-0,55%
			16	$ 0,00	$ 172.579.518,23	1,00%	0,65%	-0,35%
		Semana 16	17	$ 185.660,99	$ 172.765.179,22	1,00%	0,92%	-0,08%
			18	$ 200.251,24	$ 172.965.430,46	1,00%	0,92%	-0,08%
			19	$ 200.251,24	$ 173.165.681,70	1,00%	0,92%	-0,08%
			20	$ 200.251,24	$ 173.365.932,94	1,00%	0,92%	-0,08%

			21	$ 200.251,24	$ 173.566.184,18	1,00%	0,92%	-0,08%
			22	$ 109.062,15	$ 173.675.246,33	1,00%	0,94%	-0,06%
			23	$ 0,00	$ 173.675.246,33	1,00%	0,94%	-0,06%
		Semana 17	24	$ 185.660,99	$ 173.860.907,32	1,00%	0,94%	-0,06%
			25	$ 200.251,24	$ 174.061.158,56	1,00%	0,94%	-0,06%
			26	$ 200.251,24	$ 174.261.409,80	1,00%	0,94%	-0,06%
			27	$ 200.251,24	$ 174.461.661,04	1,00%	0,94%	-0,06%
			28	$ 200.251,24	$ 174.661.912,28	1,00%	0,95%	-0,05%
			29	$ 109.062,15	$ 174.770.974,43	1,00%	0,95%	-0,05%
			30	$ 0,00	$ 174.770.974,43	1,00%	0,95%	-0,05%

Como se puede evidenciar, el % ejecutado contra el programado se mantiene dentro del rango, sin mayores atrasos a la programación en cuento a flujo de fondos se refiere toda vez que el margen de atraso corresponde a un -0,05% y este a fecha del presente informe no es un atraso significativo para el periodo, toda vez que el indicador marca por debajo del 5% de atraso.

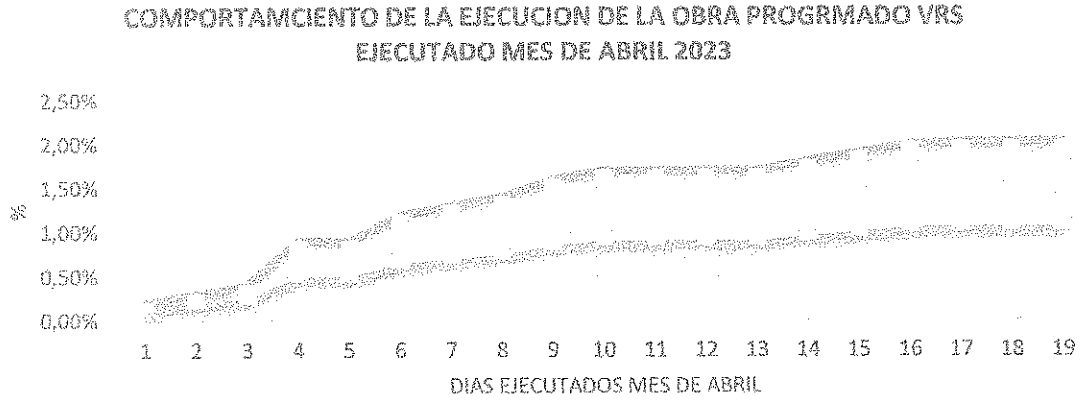

sin embargo, es importante advertir que, de no darse las condiciones de entrega total y definitiva del lote para su intervención y ejecución dentro de condiciones normales, la obra puede presentar retrasos no imputables al contratista.

8.3. SEGUIMIENTO A LOS TRAMITES DE SERVICIOS PUBLICOS PROVISIONALES

CODENSA: ya fueron entregado a **CODENSA** los respectivos planos serie 3 – Actualmente en trámite de aprobación

E.S.P. TOCANCIPA: Se radicó solicitud de Instalación de Provisional ante la empresa de servicios Públicos de Tocancipá (E.S.P.T). actualmente en trámite por respuesta.

9. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

8.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

Durante el presente periodo no se generó correspondencia saliente.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

OFICIO	FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO
STK-031-2023	12-04-2023	CONSORCIO STARK	CONSORCIO BS INGENIERIA	Remisión observaciones a cuenta No.1

8.2 RELACIÓN DE PERSONAL

En la siguiente tabla se relaciona el personal profesional y técnico perteneciente al contratista de obra.

No	APELLIDOS	NOMBRES	CEDULA	CARGO
1	BOHORQUEZ LESMES	FABIAN OSWALDO	79.952.110	DIRECTOR DE OBRA

2	LOPEZ PEREZ	SANDRA MILENA	52.716.243	RESIDENTE DE OBRA
3	PERDOMO	MARIA ISABEL	29.674.796	ASESOR SISO
4	MICAN HERRERA	BELISARIO	14.252.849	INSPECTOR DE OBRA
5	HERRERA ROLDAN	JORGE IVAN	10.025.130	ASESOR ESTRUCTURAL
6	BUITRAGO GRISALES	NELKY	6.422.497	ESPECIALISTA EN REDES
7	DE PLAZA SOLORZANO	JUAN SEBASTIAN	1.032.359.946	ESPECIALISTA EN REDES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y DE GAS
8	PARDO MORENO	OSCAR JAVIER	12.198.722	ASESOR DE GEOTECNIA

8.3 INFORMES SEMANALES DEL PERIODO

Cumpliendo con el compromiso de seguimiento y control de las labores ejecutadas, se realizan informes semanales de avance de obra que incluyen todos los aspectos del contrato.


- Informe semanal de obra 12 al 16 de abril 2023
- Informe semanal de obra 17 al 23 de abril 2023
- Informe semanal de obra 24 al 30 de abril 2023



10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES DEL INFORME

- Las actividades realizadas en el periodo del presente informe corresponden a las actividades del capítulo de preliminares.
- Durante el periodo también se subsanan y radican las observaciones correspondientes a los estudios y diseños
- Se le hace entrega a la interventoría de todos los documentos contractuales como lo son PMT, PMA, SG-SST, Cronograma de Obra y Plan de Calidad; documentos esenciales para el desarrollo de la ejecución de las actividades de obra.
- Es importante indicar que para que la obra mantenga un ritmo activo, es necesario que la Entidad, brinde las condiciones normales del espacio, a fin de entrar a atacar las actividades programadas a cabalidad.
- Cabe precisar que las novedades presentadas con la entrega parcial del lote y la dificultad presentada por la cancha de futbol que se encuentra actualmente en uso por la comunidad no es un hecho imputable al contratista, ya que no hace parte dentro de los compromisos contractualmente pactados.
- Que a cierre del presente informe el avance ejecutado contra el programado se mantiene dentro del margen sin atrasos significativos al programa

11. ANEXOS

REGISTRO FOTOGRAFICO

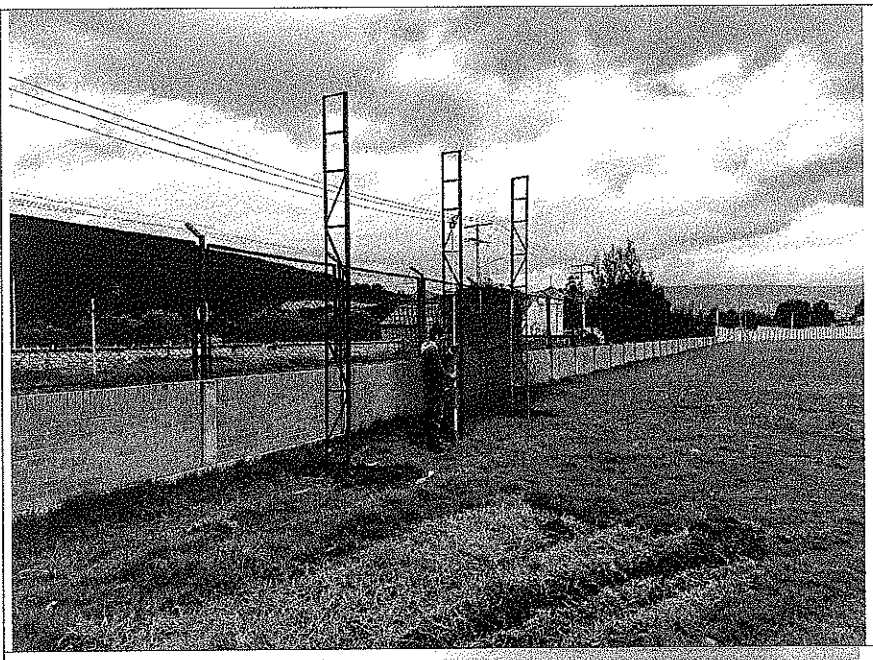Instalación de valla informativa de obra	 

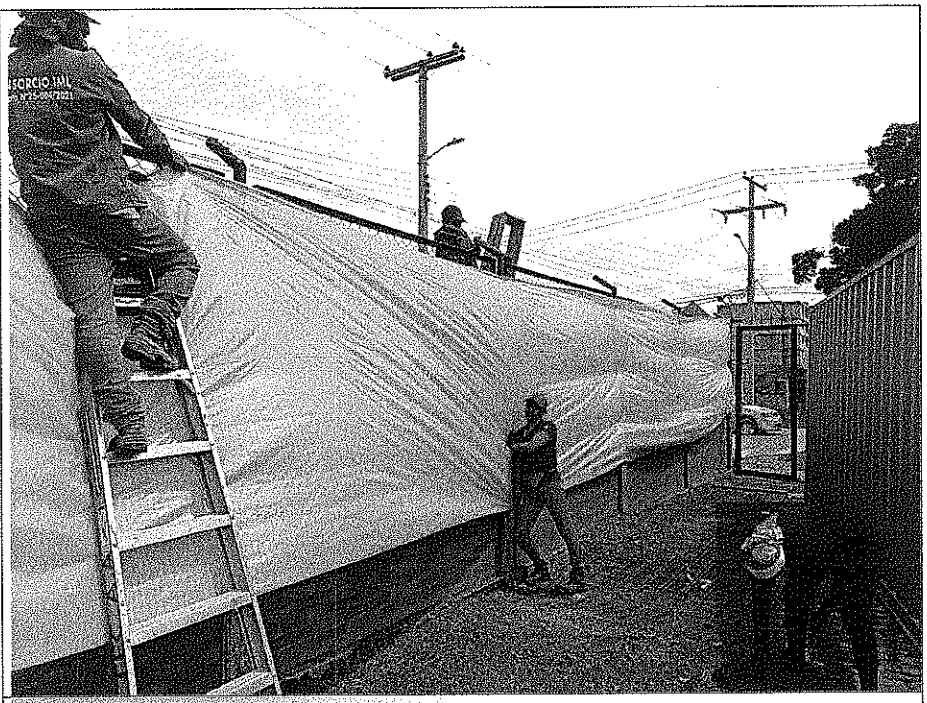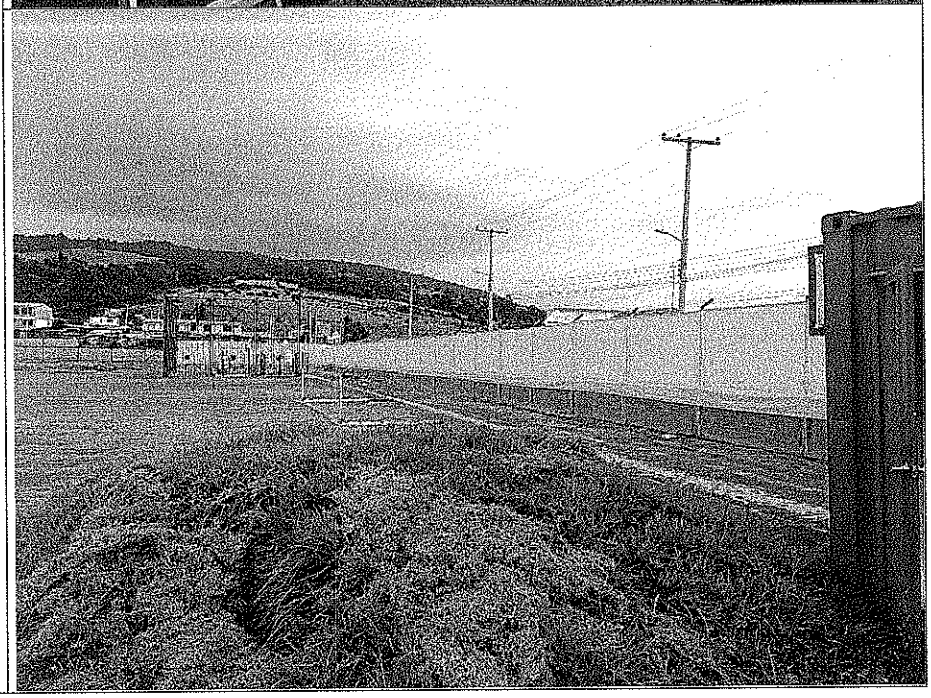CERRAMIENTO EN TELA VERDE	
	

INFORMES SEMANALES

	INFORME SEMANAL DE AVANCE	CODIGO: GINF-019 VERSION: 02 FECHA: MARZO DE 2023

INFORMACIÓN GENERAL

SEMANA No.	8	"CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ"	% AVANCE FÍSICO
FECHA INFORME	17/04/2023	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ"	8,92%
DESDE	12/04/2023		% AVANCE PROGRAMADO
HASTA	18/04/2023		9,00%

CONTRATO DE OBRA	No. 448 MT 2022	VALOR	$ 16.376.116.616,00	PLAZO	18 MESES	FECHA DE INICIO	6/12/2023	FECHA VENCIMIENTO	25/08/2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA	No. 477 MT 2022	VALOR	$ 1.316.604.045,00	PLAZO	19 MESES	FECHA DE INICIO	6/12/2023	FECHA VENCIMIENTO	26/09/2024

CONTROL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
1,10001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA 3x5	UN	0,13	0	0%
1,10002	CAMPAMENTO 18 M2	UN	0,13	0	0%
1,70063	CANALIZACIÓN EN 4 TUBOS DE 6" (PARA ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN), ESTA CANTIDAD ES ESTIMADA Y DEPENDERA DEL PROYECTO FINAL APROBADO POR CODENSA	ML	30	0	0%
		TOTAL	0,86%	0,00%	

CONTROL FINANCIERO DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA
(REGISTRE MOVIMIENTOS - PAGOS AUTORIZADOS Y RADICADOS ANTE LA ENTIDAD FIDUCIARIA)

No DE AUTORIZACIÓN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA RADICADO	FECHA PAGO REAL	VALOR BRUTO	DESCUENTOS Y RETENCIONES	PAGO NETO
			DD-MM-AAAA	DD-MM-AA	$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
				TOTAL	$ -	$ -	$ -


ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
(TÉCNICAS, LEGALES, ADMINISTRATIVAS - SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL, GESTION AMBIENTAL, GESTION DE CALIDAD)

Después de la firma del acta referida se procede a hacer reconocimiento del terreno de intervención, se define el lugar donde estar ubicados los campamentos de obra, oficinas y acopio de materiales, se define la ubicación de la acometida de agua potable y la acometida sanitaria.

Por otra parte, se verifica la existencia de unos equipos como parque bio saludable, cerramientos contra impacto canchas de caño que deben ser retirados para poder iniciar con la intervención


Se radica ante Codensa la documentación solicitada para la instalación de la provisional eléctrica.


GRÁFICA DE AVANCE - SEGUIMIENTO SEMANAL

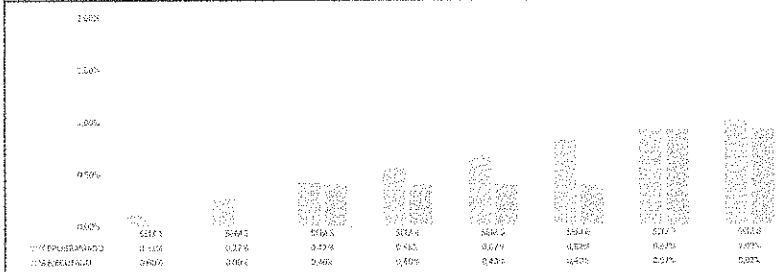



PERIODO	% PROGRAMADO	% EJECUTADO
SEM 1	0,11%	0,00%
SEM 2	0,27%	0,00%
SEM 3	0,42%	0,40%
SEM 4	0,56%	0,40%
SEM 5	0,67%	0,40%
SEM 6	0,82%	0,40%
SEM 7	0,92%	0,92%
SEM 8	1,00%	0,92%
SEM 9		
SEM 10		
SEM 11		
SEM 12		
SEM 13		
SEM 14		
SEM 15		
SEM 16		

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA






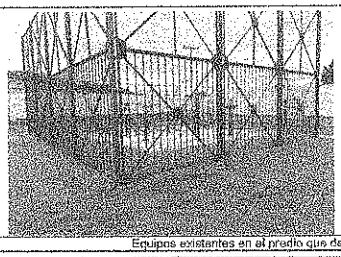



Equipos existentes en el predio que deben ser retirados para el inicio de las actividades constructivas

RELACION DE PERSONAL Y MAQUINARIA				REGISTRO DEL ESTADO DEL TIEMPO (HORAS)			
PERSONAL EN OBRA		EQUIPO EN OBRA		FECHA	LLUVIA	SECO	DETUVO TRABAJOS
DIRECTOR	SI	RETRO	NO	12/04/2023	6,00	2,00	SI
RESIDENTE	SI	VOLQUETA	NO	13/04/2023		8,00	NO
INSPECTOR	1	PILOTEADORA	NO	14/04/2023	4,00	4,00	SI
ASESOR SST	SI	MEZCLADOR	NO	15/04/2023		8,00	NO
MAESTRO	#	BOMBA CONCRETO	NO				
OFICIALES	1	OTROS	NO				
AYUDANTES	2						
OTROS	#				10,00	22,00	



ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

Teniendo en cuenta que contractual mente se contempla la instalacion de un campamento, se procede a instalar una serie de conteiners que prestaran el servicio de oficina para el personal administrativo y otro como punto de acopio de materiales que no puedan quedar expuestos a la intemperie como cemento acero entre otros.

Se contempla la instalación de la valla informativa que actualmente está en proceso de fabricación.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA / CONTRATISTA

Se está a la espera de la respuesta por parte de Condensa para la instalación de la provisional eléctrica.

Se trabajará en la generación de unos ítems no previstos para incluir dentro del presupuesto oficial el desmonte retiro de esos equipos que actualmente están instalados en varias zonas del área de intervención

ING. FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO BS INGENIERIA
No. MAT: 25202-08850B

** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMA EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO

INFORME SEMANAL DE AVANCE

CODIGO:	GIF-018
VERSION:	02
FECHA:	MARZO DE 2023

INFORMACIÓN GENERAL

SEMANA No.	9	"CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ"	% AVANCE FÍSICO
FECHA INFORME	24/04/2023		0,84%
DESDE	17/04/2023	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ"	% AVANCE PROGRAMADO
HASTA	23/04/2023		1,00%

CONTRATO DE OBRA	No. 448 MT 2022	VALOR	$ 16,376,116,616,00	PLAZO	18 MESES	FECHA DE INICIO	6/12/2023	FECHA VENCIMIENTO	25/08/2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA	No. 477 MT 2022	VALOR	$ 1,316,604,045,00	PLAZO	19 MESES	FECHA DE INICIO	6/12/2023	FECHA VENCIMIENTO	25/09/2024

CONTROL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
1,10001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA 3x5	UN	0,34	0	0%
1,10002	CAMPAMENTO 18 M2	UN	0,34	1	100%
1,79053	CANALIZACIÓN EN 4 TUBOS DE 6" (PARA ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN), ESTA CANTIDAD ES ESTIMADA Y DEPENDERA DEL PROYECTO FINAL APROBADO POR CODENSA.	ML	39	0	0%
	TOTAL	1,00%	0,84%		

CONTROL FINANCIERO DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA
(REGISTRE MOVIMIENTOS - PAGOS AUTORIZADOS Y RADICADOS ANTE LA ENTIDAD FIDUCIARIA)

No DE AUTORIZACIÓN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA RADICADO	FECHA PAGO REAL	VALOR BRUTO	DESCUENTOS Y RETENCIONES	PAGO NETO
			DD-MM-AAAA	DD-MM-AA	$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
				TOTAL	$ -	$ -	$ -


ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
(TÉCNICAS, LEGALES, ADMINISTRATIVAS - SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL, GESTION AMBIENTAL, GESTION DE CALIDAD)

Se realiza la instalación y adecuación de los conteiners destinados para las oficinas del personal administrativo de obra, acopio de materiales en la zona donde está proyectado el parqueadero del proyecto.

Se continúa trabajando en la generación de los ítems no previstos para el desmonte y retiro de los equipamientos existentes en el predio.


Se realiza reunión técnica entre los especialistas en seguridad y salud en el trabajo para verificar que los documentos del sistema de gestión están cumpliendo con la normativa vigente, además se verifica la manera en que se planea realizar la implementación del protocolo de bioseguridad, plan de manejo de tránsito y plan de manejo ambiental.


GRÁFICA DE AVANCE - SEGUIMIENTO SEMANAL

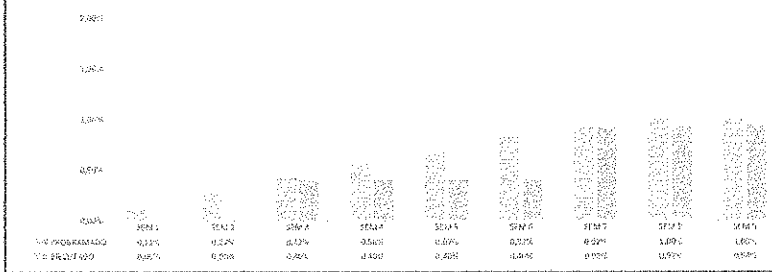

PERIODO	% PROGRAMADO	% EJECUTADO
SEM 1	0,11%	0,00%
SEM 2	0,27%	0,00%
SEM 3	0,43%	0,00%
SEM 4	0,56%	0,40%
SEM 5	0,67%	0,40%
SEM 6	0,82%	0,40%
SEM 7	0,92%	0,92%
SEM 8	1,00%	0,92%
SEM 9	1,00%	0,84%
SEM 10		
SEM 11		
SEM 12		
SEM 13		
SEM 14		
SEM 15		
SEM 16		

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

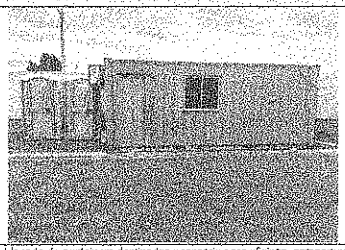

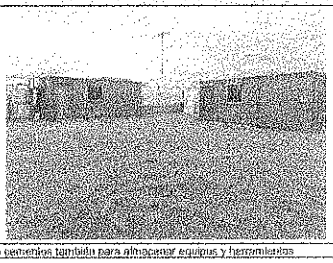

Llegada de prefabricados destinados necesario para oficinas, campamento de obra y acopio de materiales como cementos también para almacenar equipos y herramientas

026

RELACIÓN DE PERSONAL Y MAQUINARIA				REGISTRO DEL ESTADO DEL TIEMPO (HORAS)			
PERSONAL EN OBRA		EQUIPO EN OBRA		FECHA	LLUVIA	SECO	DETUVO TRABAJOS
DIRECTOR	SI	RETRO	NO	17/04/2023	4,00	4,00	SI
RESIDENTE	SI	VOLQUETA	NO	18/04/2023	2,00	2,00	SI
INSPECTOR	1	PLOTEADORA	NO	19/04/2023		8,00	NO
ASESOR SST	SI	MEZCLADOR	NO	20/04/2023	4,00	4,00	SI
MAESTRO	#	BOMBA CONCRETO	NO	21/04/2023	6,00	2,00	SI
OFICIALES	1	OTROS	NO	22/04/2023	6,00	2,00	SI
AYUDANTES	2						
OTROS	#				22,00	22,00	



ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

Se está a la espera la próxima semana de la respuesta por parte de Codensa con respecto a la provisional eléctrica de obra.
Instalación de valla informativa del proyecto.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA / CONTRATISTA

Se trabaja en la generación de los ítems no previstos y toda la documentación soporte solicitada por la secretaría de infraestructura para la radicación del modificatorio No 1.

ING. FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO BS INGENIENIERIA
No. MAT: 25202-086508

** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMA EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO

	INFORME SEMANAL DE AVANCE	CODIGO: GIF-019 VERSION: 02 FECHA: MARZO DE 2023

INFORMACIÓN GENERAL

SEMANA No.	11	"CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ"	% AVANCE FÍSICO
FECHA INFORME	1/08/2023		9,96%
DESDE	24/04/2023	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ"	% AVANCE PROGRAMADO
HASTA	30/04/2023		1,00%

CONTRATO DE OBRA	No. 448 MT 2022	VALOR	$ 16,376,116,616,00	PLAZO	18 MESES	FECHA DE INICIO	8/12/2023	FECHA VENCIMIENTO	25/08/2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA	No. 477 MT 2022	VALOR	$ 1,316,694,045,00	PLAZO	19 MESES	FECHA DE INICIO	8/12/2023	FECHA VENCIMIENTO	25/09/2024

CONTROL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
1,00000	AJUSTE A LOS DISEÑOS	UN	1,00	1	100%
1,10001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA 3x5	UN	0,54	0,50	50%
1,10002	CAMPAMENTO 18 M2	UN	0,64	1,00	100%
1,79053	CANALIZACIÓN EN 4 TUBOS DE 6" (PARA ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN), ESTA CANTIDAD ES ESTIMADA Y DEPENDERA DEL PROYECTO FINAL APROBADO POR CODENSA.	ML	39	0	0%
		TOTAL	1,06%	0,95%	


CONTROL FINANCIERO DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA
(REGISTRE MOVIMENTOS - PAGOS AUTORIZADOS Y RADICADOS ANTE LA ENTIDAD FIDUCIARIA)

No DE AUTORIZACIÓN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA RADICADO	FECHA PAGO REAL	VALOR BRUTO	DESCUENTOS Y RETENCIONES	PAGO NETO
			DD-MM-AAAA	DD-MM-AA	$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
				TOTAL	$ -	$ -	$ -

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
(TÉCNICAS, LEGALES, ADMINISTRATIVAS - SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL, GESTION AMBIENTAL, GESTION DE CALIDAD)


Se hace entrega de los ítems no previstos correspondientes al retiro de los arcos, cerramientos contra impacto y parque bio saludable que actualmente están ubicados en el predio de intervención para revisión y aprobación por parte de interventoría con el objetivo de poder radicar el modificatorio No 1 y dar inicio a estas actividades que obstaculizan las demás actividades constructivas como replanteo y excavación.
Llega obra valla informativa con la estructura necesaria para su instalación se programa personal para llevar a cabo su instalación.

GRÁFICA DE AVANCE - SEGUIMIENTO SEMANAL




PERIODO	% PROGRAMADO	% EJECUTADO
SEM 1	0,11%	0,00%
SEM 2	0,27%	0,00%
SEM 3	0,42%	0,40%
SEM 4	0,56%	0,40%
SEM 5	0,67%	0,68%
SEM 6	0,82%	0,80%
SEM 7	0,93%	0,92%
SEM 8	1,00%	0,92%
SEM 9	1,00%	0,94%
SEM 10	1,00%	0,95%
SEM 11		
SEM 12		
SEM 13		
SEM 14		
SEM 15		
SEM 16		

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

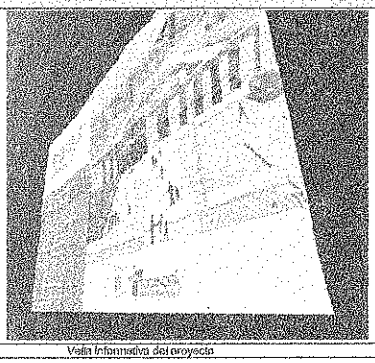

Valla informativa del proyecto

RELACIÓN DE PERSONAL Y MAQUINARIA				REGISTRO DEL ESTADO DEL TIEMPO (HORAS)			
PERSONAL EN OBRA		EQUIPO EN OBRA		FECHA	LLUVIA	SECO	DETUVO TRABAJOS
DIRECTOR	SI	RETRO	NO	24/04/2023		8,00	NO
RESIDENTE	SI	VOLQUETA	NO	25/04/2023	6,00	2,00	SI
INSPECTOR	1	PILOTEADORA	NO	26/04/2023	4,00	4,00	SI
ASESOR SST	SI	MEZCLADOR	NO	27/04/2023	8,00		SI
MAESTRO	#	BOMBA CONCRETO	NO	28/04/2023		8,00	NO
OFICIALES	1	OTROS	NO	29/04/2023	6,00	2,00	SI
AYUDANTES	2						
OTROS	#				24,00	24,00	



ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA
Instalación de la provisional eléctrica de obra parte de Codensa. Instalación de valla informativa. Entrega de documentación soporte de experiencia para cambio de profesional SST. Entrega de plan de señalización interna del proyecto solicitado por la secretaría de infraestructura.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA / CONTRATISTA
Se trabaja en la subsanación de observaciones hechas al sistema de gestión las cuales corresponden a la actualización de algunos formatos Actualmente se trabaja en montaje del área de trabajo de la zona administrativa con todos los servicios como internet, agua potable entre otros, para que los profesionales y personal de obra ya puedan llegar a realizar todas las actividades correspondientes a excavación e inicio de construcción de cimentación.

ING. FABIAN SOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO BS INGENIENERIA
No. MAT: 25202-088508

** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMA EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO

CONSORCIO
INGENIERÍA
Nit: 901.590.075-0

ACTA DE INICIO

E-mail: ingebypltda@gmail.com
Cra. 68D No. 25B - 86 Of. 327-3 - Teléfono: 7561194- Cel. 315 295 8783 – Bogotá D.C.

	ACTA DE INICIO	CODIGO: GC-F001 VERSION: 007 FECHA: ENERO 2017

CONTRATO ☐	CONVENIO ☐	RAD No.	CTO 448 MT 2022
FECHA INICIACION:	6-dic-22		
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	2022000995	FECHA DEL REGISTRO:	31/05/2022

PÓLIZAS:	APLICA. ☐ NO APLICA ☐	TIPO DE POLIZA:	DE CUMPLIMIENTO ☐ No. 67944 RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL ☐ No. 17276	NOMBRE ASEGURADORA	Berkley Colombia Seguros	FECHA DE APROBACIÓN.	23/08/2022

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ

PLAZO:	18 MESES ☐ DIAS CALENDARIO ☐
FECHA TERMINACIÓN:	5-jun-24
VALOR TOTAL:	DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($16.376.116.616)
CONTRATISTA:	CONSORCIO BS INGENIERÍA NIT. 901.590.075-0 R.L. JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES C.C. 79.894.001
EJECUTOR :	CONSORCIO BS INGENIERÍA NIT. 901.590.075-0 R.L. JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES C.C. 79.894.001
SUPERVISOR:	MARIO ENRIQUE SUANCA PULIDO - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
ASUNTO:	DAR INICIO AL CONTRATO DE OBRA No. CTO 448 MT 2022 CUYO OBJETO CONSISTE EN LA "CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ"

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATISTA	CONSORCIO BS INGENIERÍA NIT. 901.590.075-0 R.L. JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES C.C. 79.894.001	
INTERVENTOR	CONSORCIO STARK NIT 901.619.583-9 R.L. NATALIE TRISTANCHO CLEVES C.C 53.083.215	
SUPERVISOR (ES)	ING. MARIO ENRIQUE SUANCA PULIDO SUPERVISOR	
	ING. SONIA MERCEDES RODRÍGUEZ SARMIENTO APOYO A LA SUPERVISIÓN	

PÓLIZAS VIGENTES

CONSORCIO
INGENIERÍA

POLIZAS ACTUALIZADAS

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO BS INGENIERÍA CR 68 D 25 B 86 OF 327-3 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA NIT: 9015900750 Teléf. 7561194	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	17278 / 3

LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA

BOGOTÁ, D.C., 17/04/2023.

VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 05/06/2024,
VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 26/08/2024.

NUMERO DE FACTURA	06 - 0017278 / 003

ASEGURADO	BENEFICIARIO
CONSORCIO BS INGENIERÍA CR 68 D 25 B 86 OF 327-3 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA NIT: 9015900750 Teléf. 7561194	TERCEROS AFECTADOS

PRORROGA DE VIGENCIA

CODIGO DE VERIFICACION :
060001727800032BOG202304171706571

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.

PRIMA	GASTOS DE EXPEDICION	IVA	PRIMA TOTAL	VENCIMIENTO PAGO
COP 919.755,00	COP 0,00	COP 174.753,00	COP 1.094.508,00	17/05/2023

INTERMEDIARIOS :
RESPALDA TU FUTURO LIMITADA CLASE: AGENCIAS CLAVE: 250042

CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA

Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.

La presente póliza amparo los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-000I para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula.

Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.
Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.
No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511.
No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85

MARIA YOLANDA ARDILA GUARIN
PRESIDENTE
Firma Autorizada

EL TOMADOR

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-000I y 02082021-1347-NTP-06-RCGO06-000I

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá	Medellín	Barranquilla	Bucaramanga	Cali
Calle 75 No. 5 - 88 Edificio Difransa, Piso 3 PBX 601 3572727	Calle 7 Sur No. 42 - 70 Edificio Fórum, oficina 2501 PBX 604 3222707	Carrera 51 B No. 80 - 58 Smart Office Center, oficina 410 PBX 605 3187620	Carrera 29 No. 45 - 45 Edificio Metropolitan, oficina 1314 PBX 607 6898099	Calle 36 Norte No. 6A - 65 Ed. World Trade Center Pacific Mall, oficina 1813 PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co ***www.berkley.com.co***

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO BS INGENIERÍA	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	17278 / 3
CR 68 D 25 B 86 OF 327-3 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 17/04/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 05/06/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 26/08/2024.	
NIT: 9015900750 Teléf. 7561194	NUMERO DE FACTURA	06 - 0017278 / 003

CARATULA

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO SE CONOCEN ACTAS DE SUSPENSION #1-#2-#3 Y #4 AL CTO #448 Y SE CONOCE Y ACEPTA EL ACTA No.9 - ACTA REINICIO No.4 DE FECHA ABRIL 12 DE 2023 POR LA CUAL SE MODIFICA LA VIGENCIA DE LA POLIZA, EXTENSION DE VIGENCIA : DEL 05/06/2024 AL 26/08/2024.-

---

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO SE SE TRASLADA LA VIGENCIA SEGÚN ACTA DE INICIO DESDE 06/12/2022 HASTA 05/06/2024.-

==========

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

==========

ACTIVIDAD DESARROLLADA : CONSTRUCCION

NDEMNIZAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS PATRIMONIALES OCASIONADOS A TERCERAS PERSONAS DERIVADOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO NO. CTO 448 MT 2022; CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ.

EL CONSORCIO BS INGENIERÍA ESTA CONFORMADO POR :
INGESANBRA S.A.S. NIT 901.485.350-2 CON PARTICIPACION DEL 10%
INGEBYP S.A.S. NIT 830.121.507-2 CON PARTICIPACION DEL 90%

%LEY Y JURISDICCIÓN:
COLOMBIANA

%MODALIDAD DE COBERTURA:
OCURRENCIA

TERRITORIALIDAD:
Colombia

PLAZO PARA EL PAGO DE PRIMAS:
30 días contados a partir de la emisión de la póliza

PRIMA MINIMA POR ENDOSO:
Toda modificación con valor tendrá un costo mínimo de: COP 50.000 / USD 15 (según la moneda de emisión de la póliza)

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-000I y 02082021-1347-NTP-06-RCGO06-000I

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO BS INGENIERÍA	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	17278 / 3
CR 68 D 25 B 86 OF 327-3 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
	BOGOTÁ, D.C., 17/04/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 05/06/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 26/08/2024.	
NIT: 9015900750 Teléf. 7561194	NUMERO DE FACTURA	06 - 0017278 / 003

CARATULA

==========

RESUMEN DE COBERTURAS Y CAPITALES ASEGURADOS

AMPARO BASICO---------- COP 818.805.831,00

Predios Labores y Operaciones(PLO), dentro de esta se cubren las responsabilidades originadas por:

1. Incendio y/o explosión

2. Uso de ascensores y escaleras automáticas dentro de los predios asegurados.

3. Uso de máquinas y equipos de trabajo, de cargue y descargue y transporte dentro de los predios asegurados.

4. Montaje, desmonte o desplome de avisos y vallas publicitarias instaladas por el asegurado. En caso de que sean instaladas por terceros, se indemnizará la responsabilidad civil solidaria del asegurado. Siempre y cuando dichas vallas o avisos se encuentren en los predios del asegurado.

5. Uso de las instalaciones sociales y/o deportivas que se encuentren en los predios relacionados por el asegurado.

6. Eventos sociales o deportivos organizados por el asegurado en los predios relacionados por éste.

7. Viajes de funcionarios del asegurado dentro del territorio nacional, cuando, en desarrollo de actividades del asegurado inherentes al contrato laboral, se causen daños a terceros.

8. Participación del asegurado en ferias y exposiciones nacionales.

9. Vigilancia de los predios del asegurado según lo definido en el anexo "Responsabilidad Civil Por Personal de Celaduria, Vigilancia y Seguridad".

10. Posesión y el uso de depósitos, tanques y tuberías que se encuentren ubicados o instalados dentro de los predios relacionados por el asegurado.

11. Uso de parqueaderos dentro de los predios relacionados por el asegurado según lo definido en el anexo

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-000I y 02082021-1347-NTP-06-RCGO06-000I

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO BS INGENIERÍA	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	17278 / 3
CR 68 D 25 B 86 OF 327-3 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 17/04/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 05/06/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 26/08/2024.	
NIT: 9015900750 Teléf. 7561194	NUMERO DE FACTURA	06 - 0017278 / 003

CARATULA

Responsabilidad Civil Parqueaderos"

12. Posesión o utilización de cafeterías, casinos y restaurantes para uso de sus empleados, dentro de los predios asegurados.

13. Bienes bajo cuidado, tenencia y control, se indemnizarán los daños causados a terceros con los bienes más no los daños sufridos por los mismos.

14. Se entiende incorporado el daño emergente, lucro cesante, daño moral y perjuicios extra patrimoniales del tercero que se deriven de un daño físico directo ocasionado por el asegurado en ejecución de las actividades objeto e cobertura.

15. Gastos de defensa.

COBERTURAS ADICIONALES A LA BASICA :

==========

LOS LIMITES INDICADOS A CONTINUACIÓN HACEN PARTE DEL VALOR ASEGURADO DE LA PÓLIZA

==========

LÍMITES DE INDEMNIZACIÓN DE LA POLIZA:

==========

• LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 818.805.831,00

• LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 818.805.831,00

** GASTOS MEDICOS:

LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 163.761.166,00

• LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 163.761.166,00

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-0001 y 02082021-1347-NTP-06-RCG006-0001

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá	Medellín	Barranquilla	Bucaramanga	Cali
Calle 75 No. 5 - 88 Edificio Difransa, Piso 3 PBX 601 3572727	Calle 7 Sur No. 42 - 70 Edificio Fórum, oficina 2501 PBX 604 3222707	Carrera 51 B No. 80 - 58 Smart Office Center, oficina 410 PBX 605 3187620	Carrera 29 No. 45 - 45 Edificio Metropolitan, oficina 1314 PBX 607 6898099	Calle 36 Norte No. 6A - 65 Ed. World Trade Center Pacific Mall, oficina 1813 PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co ***www.berkley.com.co***

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO BS INGENIERÍA	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	17278 / 3
CR 68 D 25 B 86 OF 327-3 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
	BOGOTÁ, D.C., 17/04/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 05/06/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 26/08/2024.	
NIT: 9015900750 Teléf. 7561194	NUMERO DE FACTURA	06 - 0017278 / 003

CARATULA

** CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS:

EL PRESENTE AMPARO OPERARÁ EN EXCESO DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL QUE DEBA TENER CADA CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA CON UN MÍNIMO COP 30000000,00. EN CASO DE NO TENER CONTRATADA PÓLIZA, ESTE VALOR OPERARÁ COMO DEDUCIBLE.

• LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 163.761.166,00

• LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 163.761.166,00

** RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL:

• LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 163.761.166,00

• LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 163.761.166,00

** RESPONSABILIDAD CIVIL PARA VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS:

• OPERA EN EXCESO DE LA COBERTURA DE RCE DE LA PÓLIZA DE AUTOMÓVILES QUE DEBE TENER CONTRATADA Y SIEMPRE VIGENTE CADA VEHÍCULO, LA CUAL DEBERÁ TENER CONTRATADA UN LÍMITE MÍNIMO DE COP 200.000.000,00

• LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 163.761.166,00

• LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 163.761.166,00

DEDUCIBLES APLICABLES :

** AMPARO BÁSICO Y DEMAS EVENTOS:

EL ASEGURADO PARTICIPARÁ EN TODO Y CADA EVENTO INDEMNIZABLE POR LA PRESENTE POLIZA EN UN 10,00% DEL MONTO DEL MISMO, CON UN MÍNIMO DE COP 50.000.000,00

** CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS:

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-000I y 02082021-1347-NTP-06-RCGO06-000I

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO BS INGENIERÍA	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	17278 / 3
CR 68 D 25 B 86 OF 327-3 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 17/04/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 05/06/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 26/08/2024.	
NIT: 9015900750 Teléf. 7561194	NUMERO DE FACTURA	06 - 0017278 / 003

CARATULA

10,00 % DEL MONTO DEL EVENTO INDEMNIZABLE, CON UN MÍNIMO DE COP 10.000.000,00.

** RC PATRONAL:

10,00 % DEL MONTO DEL EVENTO INDEMNIZABLE, CON UN MÍNIMO DE COP 10.000.000,00

** VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS:

10,00 % DEL MONTO DEL EVENTO INDEMNIZABLE, CON UN MÍNIMO DE COP 10.000.000,00

==========

CLAUSULAS Y ANEXOS :

==========

GASTOS MÉDICOS:

QUEDAN AMPARADOS HASTA POR EL SUBLÍMITE ESTABLECIDO PARA EL EFECTO EN LA CARÁTULA O EN ANEXO DE LA PÓLIZA, LOS GASTOS MÉDICOS EN QUE INCURRA EL ASEGURADO CON EL FIN DE PRESTAR LOS PRIMEROS AUXILIOS A TERCEROS VÍCTIMAS DE UNA LESIÓN PERSONAL SUFRIDA DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA CARÁTULA O EN ANEXO DE LA PÓLIZA.

EL PAGO QUE SE HAGA BAJO ESTE AMPARO NO REQUIERE QUE EL ASEGURADO HAYA DEMOSTRADO SU RESPONSABILIDAD Y NO PODRÁ SIGNIFICAR ACEPTACIÓN ALGUNA DE RESPONSABILIDAD BAJO LA PÓLIZA POR PARTE DE LA COMPAÑÍA. AL PRESENTE AMPARO NO SE APLICA DEDUCIBLE ALGUNO.

RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

DE ACUERDO CON EL LÍMITE INDICADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, LA COMPAÑÍA INDEMNIZARÁ LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE A RESPONSABILIDAD CIVIL A CARGO DEL ASEGURADO COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE DAÑOS MATERIALES, LESIONES PERSONALES Y/O MUERTE CAUSADOS A LOS TERCEROS QUE LE SEAN IMPUTABLES AL ASEGURADO, POR DAÑOS CAUSADOS POR LOS CONTRATISTAS O SUBCONTRATISTAS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PARA LAS CUALES FUERON CONTRATADOS.

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-0001 y 02082021-1347-NTP-06-RCGO06-0001

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO BS INGENIERÍA	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	17278 / 3
CR 68 D 25 B 86 OF 327-3 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 17/04/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 05/06/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 26/08/2024.	
NIT: 9015900750 Teléf. 7561194	NUMERO DE FACTURA	06 - 0017278 / 003

CARATULA

INCLUYE LA RESPONSABILIDAD CIVIL SOLIDARIA QUE RECAE SOBRE EL ASEGURADO POR DAÑOS CAUSADOS POR LOS CONTRATISTAS O SUBCONTRATISTAS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PARA LAS CUALES FUERON CONTRATADOS.

EL PRESENTE AMPARO OPERARÁ EN EXCESO DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL QUE DEBA TENER EL ASEGURADO. EN CASO DE NO TENERLAS SUSCRITAS, LA COBERTURA OPERA EN EXCESO DE ACUERDO CON LO DEFINIDO EN LAS CONDICIONES PARTICULARES.

EXCLUSIONES

DEMÁS DE LO QUE AL RESPECTO SE CONSIGNA EN LAS EXCLUSIONES GENERALES, QUEDAN EXCLUIDOS DE COBERTURA BAJO EL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL LOS PERJUICIOS O LA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERADOS POR LAS RECLAMACIONES DE TERCEROS BASADAS TOTAL O PARCIALMENTE EN O RESULTANTES DE:

1. SE EXCLUYE LA COBERTURA DE PATRONAL.

RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL

DE ACUERDO CON EL LÍMITE INDICADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, LA COMPAÑÍA INDEMNIZARÁ LOS PERJUICIOS QUE DEBA PAGAR EL ASEGURADO DEBIDO A LA RESPONSABILIDAD CIVIL QUE LE SEA IMPUTABLE POR LOS ACCIDENTES DE TRABAJO QUE SUFRA LOS TRABAJADORES A SU SERVICIO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ASIGNADAS A ELLOS CON OCASIÓN DE LA JECUCIÓN DEL CONTRATO.

EL PRESENTE AMPARO OPERARÁ EN EXCESO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES CONSIGNADAS EN EL CÓDIGO DEL TRABAJO O EN EL RÉGIMEN PROPIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

EXCLUSIONES

ADEMÁS DE LO QUE AL RESPECTO SE CONSIGNA EN LAS EXCLUSIONES GENERALES, QUEDAN EXCLUIDOS DE COBERTURA BAJO EL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL LOS PERJUICIOS O LA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERADOS POR LAS RECLAMACIONES DE TERCEROS BASADAS TOTAL O PARCIALMENTE EN O RESULTANTES DE:

1. ENFERMEDADES PROFESIONALES, ENDÉMICAS O EPIDÉMICAS.

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-000I y 02082021-1347-NTP-06-RCG006-000I

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá	Medellín	Barranquilla	Bucaramanga	Cali
Calle 75 No. 5 - 88 Edificio Difransa, Piso 3 PBX 601 3572727	Calle 7 Sur No. 42 - 70 Edificio Fórum, oficina 2501 PBX 604 3222707	Carrera 51 B No. 80 - 58 Smart Office Center, oficina 410 PBX 605 3187620	Carrera 29 No. 45 - 45 Edificio Metropolitan, oficina 1314 PBX 607 6898099	Calle 36 Norte No. 6A - 65 Ed. World Trade Center Pacific Mall, oficina 1813 PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co ***www.berkley.com.co***

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO BS INGENIERÍA	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	17278 / 3
CR 68 D 25 B 86 OF 327-3 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 17/04/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 05/06/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 26/08/2024.	
NIT: 9015900750 Teléf. 7561194	NUMERO DE FACTURA	06 - 0017278 / 003

CARATULA

2. ACCIDENTES DE TRABAJO QUE HAYAN SIDO PROVOCADOS DELIBERADAMENTE O POR CULPA GRAVE DEL TRABAJADOR.

3. DAÑOS MATERIALES A BIENES PROPIEDAD DE LOS TRABAJADORES.

4. SE EXCLUYEN A LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS.

RESPONSABILIDAD CIVIL PARA VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

DE ACUERDO CON EL LÍMITE INDICADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, LA COMPAÑÍA INDEMNIZARÁ LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE A RESPONSABILIDAD CIVIL QUE LE SEA IMPUTABLE AL ASEGURADO, COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE DAÑOS MATERIALES, LESIONES PERSONALES Y/O MUERTE QUE SE OCASIONEN A TERCEROS CON VEHÍCULOS PROPIOS O NO PROPIOS QUE ESTÉN AL SERVICIO DEL ASEGURADO EN EL GIRO NORMAL DE LAS ACTIVIDADES ESPECIFICADAS EN LA CARÁTULA O EN ANEXO DE ESTA PÓLIZA.

OPERA EN EXCESO DE LA COBERTURA DE RCE DE LA PÓLIZA DE AUTOMÓVILES QUE DEBE TENER CONTRATADA Y SIEMPRE VIGENTE CADA EHÍCULO, LA CUAL DEBERÁ TENER CONTRATADO EL LÍMITE MÍNIMO EXPRESADO EN LA CARATULA O SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES PARTICULARES

EN CASO DE LESIONES A TERCERAS PERSONAS, TAMBIÉN SE AFECTARÁ PREVIAMENTE EL SEGURO OBLIGATORIO SOAT.

EN EL EVENTO DE QUE LOS VEHÍCULOS NO CUENTEN CON ALGUNA DE ESTAS PÓLIZAS, O QUE LA COBERTURA BAJO LAS MISMAS SEA INFERIOR AL DEDUCIBLE O DE QUE EL RIESGO NO SE ENCUENTRE AMPARADO, EL LÍMITE DEL PRESENTE AMPARO SÓLO OPERARÁ EN EXCESO DE LOS LÍMITES ESTABLECIDOS ANTERIORMENTE.

PARA EFECTOS DEL PRESENTE AMPARO, SE ENTENDERÁ POR VEHÍCULOS NO PROPIOS TODO AUTOMOTOR DE TRANSPORTE TERRESTRE, QUE SEA TOMADO POR EL ASEGURADO EN CALIDAD DE ARRENDAMIENTO, USUFRUCTO, COMODATO O A CUALQUIER OTRO TÍTULO NO TRASLATICIO DE DOMINIO Y QUE UTILICE PARA EL DESARROLLO NORMAL DE LAS ACTIVIDADES AMPARADAS EN LA PÓLIZA.

EXCLUSIONES

ADEMÁS DE LO QUE AL RESPECTO SE CONSIGNA EN LAS EXCLUSIONES GENERALES, QUEDAN EXCLUIDOS DE COBERTURA BAJO EL AMPARO DE VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS LOS PERJIUCIOS O LA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERADOS POR LAS RECLAMACIONES DE ERCEROS BASADAS TOTAL O PARCIALMENTE EN O RESULTANTES DE:

1. LOS DAÑOS CAUSADOS POR VEHÍCULOS MIENTRAS OPEREN EN LABORES DE SERVICIO PÚBLICO.

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-000I y 02082021-1347-NTP-06-RCGO06-000I
