RP 76

pivingeniería
PROYECTOS / CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES

piv ingeniería
Firma: Diana Arango
Diana Arango
Fecha: 5/09/2023
Hora: 9:09:58 a. m.
ENVIADO
Rad: 0296

Medellín, 05 de septiembre de 2023

PIV-4600013724-0296

Radicado R:2023010389064
Fecha:2023/09/05 2:34:34 PM
Tpo:INFORME
Responsable:BEATRIZ ELENA OSPINA MON

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Luis Alcides Diaz V
Supervisión SST
Secretaria de Infraestructura Física.
Gobernación de Antioquia

Requiere Respuesta	
☐ SI	☑ NO

Referencia	Interventoría Técnica, Administrativa, Ambiental, Financiera y Legal para el Mantenimiento, Mejoramiento, Reparación, Rehabilitación, Obras de Protección y Obras Complementarias en Puentes de la Red Vial Departamental
Asunto	Entrega Física del Informe mensual # 13 contrato de Interventoría 4600013724

Respetado Luis Alcides Diaz.

Por medio del presente comunicado, se hace la entrega física del informe # 13, correspondiente al contrato de interventoría 4600013724 mes de agosto 2023.

Cordialmente,

Realiza	Revisa	Recibe
Paola Moreno Bran		

Ing. Rómulo E Delgado Ramos
Director de Interventoría
Contrato No. 4600013724

2023 SEP 14 13:35:40 ARCHIVO SIF

Proyectó: P.M.Y.U
CC: Alcides Díaz V.
Anexos:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, REPARACIÓN, REHABILITACIÓN, OBRAS DE PROTECCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PUENTES EN LA RED VIAL DEPARTAMENTAL.

Informe mensual SST N°13 periodo de agosto 2023.



PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023.

R= 20230103890649

Diseño, Interventoría, Gerencia y Construcción de proyectos de Infraestructura Vial.
E-mail: sst.piv.ingenieria@gmail.com
Dirección: Calle 10B # 35-8 Edificio santa Coloma
Medellín - Colombia

05-09-2023

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, REPARACIÓN, REHABILITACIÓN, OBRAS DE PROTECCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PUENTES EN LA RED VIAL DEPARTAMENTAL.

Informe mensual SST N°13 periodo de agosto 2023.



PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023.

INFORME DE INTERVENTORIA Nº13 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST
PERIODO: AGOSTO - 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°4600013724 DE 2022 CONTRATO DE OBRA N°4600013720

Mantenimiento, mejoramiento, reparación, rehabilitación de obras de protección y obras complementarias en puentes en la red vial departamental.

VERSIÓN No. 13

VIGENCIA DESDE 01/08/2023 al 31/08/2023.

SISTEMA DE GESTIÓN		
Elaborado por: Paola Moreno Yamid Úsuga Residentes SST	Fecha: 31/08/2023	Firma:
Revisado por: Rómulo Delgado Director de Interventoría	Fecha: 31/08/2023	Firma:
Revisado por: Luis Alcides Díaz Villada Supervisor SST	Fecha: 31/08/2023	Firma:

2023 SEP 14 13:35:54
ARCHIVO SIF

Tabla de contenido

LISTA DE FOTOS.... 4
LISTADO DE ANEXOS PIV INGENIERIA S.A.S.... 5
1. OBJETIVO DEL INFORME.... 6
3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA.... 7
6. GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.... 15
6.1. Subprograma de Seguridad en el Trabajo.... 15
6.1.1. Gestión de seguridad en los diferentes frentes de trabajo y/o actividades.... 16
6.1.2. Inspecciones de SST.... 17
6.1.1. Control de los elementos de protección personal suministrados.... 19
6.1.2. Inducción a nuevos trabajadores.... 21
6.1.3. Demarcación y señalización de áreas y puestos de trabajo.... 21
6.1.4. Seguridad social.... 22
6.1.5. Capacitaciones.... 22
6.1.6. Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST).... 23
6.1.7. Accidentalidad e Indicadores de Impacto.... 23
6.1.8. Ausentismo General.... 24
6.2. Subprograma de medicina preventiva y del trabajo.... 25
6.2.1. Protocolo de bioseguridad.... 26
6.2.2. Promoción y control de la salud de los trabajadores.... 26
6.2.3. Comité de Convivencia laboral.... 26
6.3. Subprograma de Higiene Industrial.... 26
6.3.1. Plan de emergencias.... 27
6.3.2. Manejo de sustancias químicas.... 27

6. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES A LA EMPRESA SERGOM S.A.S. 27

7. ANEXOS SERGOM S.A.S. 29

LISTA DE FOTOS.

FOTO 1. Inspección de obra..... 12
FOTO 2. Inspección de trabajo, formato y equipos de altura..... 12
FOTO 3. Inspección de elementos de EPP..... 12
FOTO 4. Inspección de orden y aseo..... 12
FOTO 5. Inspección de documentación de las herramientas..... 12
FOTO 6. Inspección de trabajos viales..... 12
FOTO 7. Inspección vehicular..... 12

LISTADO DE ANEXOS SERGOM S.A.S.

Anexo 1. Inducción..... 26

Anexo 2. Cronograma de capacitación..... 26

Anexo 3. Charlas y capacitaciones..... 26

Anexo 4. ATS, permisos de alturas, pre-operacionales..... 26

Anexo 5. Certificado de altura..... 26

Anexo 7. Inspecciones de seguridad..... 26

Anexo 8. COPASST, COCOLA, brigada..... 26

Anexo 9. Afiliaciones y seguridad social..... 26

Anexo 10. Exámenes de ingreso y aptitud..... 26

Anexo 11. Contratos, renuncias y colillas de pago..... 26

Anexo 12. Perfil sociodemográfico..... 26

Anexo 13. Notificación de riesgos..... 26

Anexo 14. Accidentalidad de riesgos.....26

Anexo 15. Informe fotográfico SERGOM S.A.S.....26

LISTADO DE ANEXOS PIV INGENIERIA S.A.S.

Anexo 1. Exámenes médicos.....26

Anexo 2. Contrato y planilla de pago.....26

Anexo 3. Entrega de dotación y EPP.....26

Anexo 4. Seguridad social.....26

Anexo 5. Conformación o capacitación.....26

Anexo 6. Copia del Boucher de consignación.....26

Anexo 7. Liquidaciones del personal.....26

Anexo 8. Paz y salvo.....26

Anexo 9. Exámenes de retiro.....26

1. OBJETIVO DEL INFORME.

Informar a la entidad contratante, las actividades ejecutadas por los contratistas **SERGOM S.A.S, ARDIMET S.A.S Y MARLON YESID CACERES PEDRAZA** y la Interventoría **PIV INGENIERIA S.A.S,** en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto de 2023. Teniendo en cuenta los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), generados durante el periodo del informe, enmarcados en el avance del contrato que tiene por objeto Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal para el mantenimiento, mejoramiento, reparación, rehabilitación, obras de protección y obras complementarias en puentes en la red vial departamental.
La sociedad **PIV INGENIERÍAS S.A.S**, ejerce la interventoría del contrato N.º 4600013724 del 2022, cuyo objeto es: interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal para el mantenimiento, mejoramiento, reparación, rehabilitación, obras de protección y obras complementarias en puentes en la red vial departamental.
En el presente informe se relacionan las actividades desarrolladas como parte del plan de seguridad y salud en el trabajo; tiene como objetivo presentar el trabajo conjunto del contratista y la interventoría en pro del manejo de la seguridad en obra.

• 1.1 OBJETIVO GENERAL DE LA GESTIÓN DE INTERVENTORIA SST.

Vigilar, controlar y apoyar de forma eficaz y oportuna las acciones de seguridad y salud en el trabajo y la protección ambiental del proyecto.

• 1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA GESTIÓN DE INTERVENTORIA DE SST.

Realizar seguimiento al contratista sobre el pago oportuno de las prestaciones sociales del personal empleado en la ejecución de la obra, dentro de los periodos y plazos estipulados por la ley.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO VÍA.

El proyecto consiste en el desarrollo de un programa extenso de conservación de puentes de la red vial departamental, tendiente a mejorar las condiciones de uso seguro de este tipo de infraestructura y a prevenir incremento en daño por falta oportuna de atención, lo cual se traduce en evitar la pérdida de valor funcional de este tipo de bien.

La presente contratación es un aporte importante para satisfacer la necesidad identificada y busca intervenir aquellas estructuras que revisten mayor riesgo para el uso y que son esenciales para el desarrollo de las comunidades que influencian.

La relación de las vías a intervenir y selección de los puestos que se tuvieron en cuenta en la elaboración del presupuesto de obra no se constituye en una camisa de fuerza.

De obligatoria observación por lo que la intervención puntal en cada uno de los puentes debe valorarse individualmente definiendo su alcance acorde con el estado encontrado, el cual con respecto al evaluar el presupuesto puede haber variado, ya por intervención previa través de algún otro contrato de la secretaria de infraestructura, ya por deterioro progresivo debido a la demora en la intervención.

Es probable que algunas intervenciones requieran para su intervención, del análisis de especialistas y o la elaboración de estudios o diseños específicos sobre la patología particular, por lo cual se asigna una partida para asesorías especializadas en estudios y diseños que permitan atender este tipo de necesidad que la contratación.

Acorde con la necesidad del servicio, la administración departamental podrá solicitar al contratista la intervención prioritaria en alguna estructura de puentes que bien este dentro de los corredores viales seleccionados o bien en cualquier otra vía del departamento, lo anterior para atender situación de emergencias, proveer seguridad o garantizar la estabilidad a corto plazo del puente identificado.

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA.

Tabla 1. Información del contrato de obra.

CONTRATISTAS	
MEJORAMIENTO DE PUENTES	
Nit.	80412551-5
e-mail	sstsergomantioquia@gmail.com
Contrato No.	4613720
Objeto	Mantenimiento, mejoramiento, reparación rehabilitación, obras de protección y obras complementarias en puentes en la red vial departamental.

INTERVENTORIA	
MEJORAMIENTO DE PUENTES	
Nit.	860510291-5
e-mail	sst.piv.ingenieria@gmail.com
Contrato No.	4600013724 de 2022
Objeto	Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal para el mantenimiento, mejoramiento, reparación rehabilitación, obras de protección y obras complementarias en puentes en la red vial departamental.

4. LISTADO DE PERSONAL DEL CONTRATISTA.

En la siguiente tabla se relaciona el listado de personal técnico y operativo dando un total de 34 personas operativas de las cuales 4 son rotativos. Durante este mes se retiraron 10 personas.

Tabla 2. Listado de personal administrativo y operativo del periodo.

Fijo ☐ Rotativo ■ Retirado ■

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	CARGO
1	91275513	German Serrano	Director De Obra
2	1055206143	Walter Fernando Cruz	Residente De Obra
3	1095931469	Leidy Rivero Silva	Ing Civil

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	CARGO
4	1118545966	Andres Rueda Fonseca	Residente Ambiental
5	1128479907	Paola Andrea Castrillon Giraldo	Inspector SST
6	1193220376	Jorge Carlos Roa Correa	Ing Civil
7	1109297230	Diana Maria Grisales	Inspector SST
8	1193442330	Juan David Urbina	Ing Civil
9	1098819704	Laura Camila Medina Becerra	Ing Civil
10	1128264027	Yirley Soriani Montoya Agudelo	Residente Social
11	1039702179	Yohana Andrea Gutierrez Fajardo	Profeional Social
12	1232890960	Freddy Dario Pedraza	Ing Civil
13	13854585	Osmar Orencio Valderrama Devia	Tecnólogo Civil
14	91439653	Johnny Wilbingston Jimenez Castillo	Inspector De Calidad (Ardimet)
15	1005248792	Andres Lozada Castro	Oficial (Ardimet)
16	1099368734	Sergio Augusto Franco Hernández	Soldador (Ardimet)
17	91135944	Jhon Fredi Ardilla Pinzon	Pintor (Ardimet)
18	91184689	Ronal Mejia Ayala	Oficial (Ardimet)
19	1051636712	Juan Miguel Saenz Camacho	Ayudante (Ardimet)
20	5594475	Carlos Alexander Celis Monsalve	Soldador (Ardimet)
21	1001666719	Marcelo Jaramillo Zapata	Conductor
22	91444471	Jolguer Antonio Hernandez	Conductor

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	CARGO
23	91464253	Willinton Bautista Jaimes	Conductor
24	1005154670	Luiz Eduardo Martinez Duran	Oficial
25	32243952	Lina Maria Duque	Controlador Vial
26	1000908526	Lisandro Rodriguez Gutierrez	Conductor
27	1004359343	Miller Andres Hernandez Castro	Ayudante
28	1090420793	Jeny Claribel Sandoval Granados	Controlador Vial
29	1102717341	Derny Jamid Lopez Muñiz	Conductor
30	70854673	Diego León Calderon	Ayudante
31	1038338140	Sara Catalina Salas Álvarez	Controlador Vial
32	1115911527	Reinaldo Castillo Rivera	Ayudante
33	1116612779	Cesar Andres Gomez Soler	Ayudante
34	1007436900	Oscar David Viana Vega	Ayudante
35	14243150	Edgardo Jose Sanchez Avila	Ayudante
36	1092354367	Jhonattan Tarazona	Ayudante
37	79336147	Miguel Alfonso Ospino Montes	Ayudante
38	1193225703	Andres Acevedo	Conductor
39	79800557	Francisco Nieto	Soldador (Ardimet)
40	1098260109	Danna Calderon	Controlador Vial
41	1005161628	Andres Felipe Angarita	Ayudante
42	1045049339	Juan Camilo Escobar	Ayudante
43	1152691788	Cristian Alzate Quintero	Ayudante

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	CARGO
44	18957713	Gerardo Luquez Madrid	Ayudante
45	1038797032	Jose Rosendo Carvajal Ortiz	Oficial
46	16111687	Guillermo Cardona Rodriguez	Ayudante
47	1040262066	Yenifer Daza Daza	Controlador Vial
48	1095926384	Anderson Garcia Noriega	Metalmecanica (Marlon Caceres)
49	91225874	Carlos Orlando Caceres Cardenas	Metalmecanica (Marlon Caceres)
50	13872813	Jose Luis Bautista Gallo	Metalmecanica (Marlon Caceres)
51	91532573	Marlon Yesid Caceres Pedraza	Metalmecanica (Marlon Caceres)
52	1048045892	Andres Felipe Zuleta Duque	Ayudante
53	1007741614	Jesus Alejandro Montoya Corrales	Ayudante
54	1053346982	Jorge Llanos Arias	Inspector Obra
55	1118554113	Ivonne Liseth Vargas Silva	Inspector Obra
56	1100892623	Diego Armando Arenas	Oficial De Construcción
57	1005153094	German Alberto Vallejo	Ayudante De Construccion
58	1040747239	Bryan German Cardenaz	Ayudante
59	16076573	Hernando Horacio Salazar Otalvaro	Ayudante
60	91266240	Luis Alberto Gomez Gelvez	Ayudante
61	91468769	Eduardo Mendoza	Ayudante
62	14243150	Edgardo Jose Sanchez Avila	Ayudante

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	CARGO
63	3348194	Jorge Eliecer Restrepo	Ayudante
64	1022002185	Jose Manuel Ocapmo Zuleta	Controlador Vial
65	1002064733	Sara Carolina Corrales Murillo	Controlador Vial
66	1020486407	Javier Bautista Acosta	Maestro
67	6996338	Victor Arrieta	Ayudante
68	1098603745	Jhon Jairo Mesa Campos	Maestro
69	1036651649	Robin Alberto Ramirez Garcia	Ayudante
70	1094928568	Gustavo Adolfo Escobar Ciro	Soldador (Ardimet)
71	1099375329	Maikol Santa Maria	Pintor (Ardimet)
72	1102364402	Luis Carlos Naranjo Pereira	Soldador (Ardimet)
73	1102356061	Marco Aurelio Perez Mantilla	Ayudante
74	1101209447	Julian David Lopez Ortiz	Ayudante
75	1097609726	Jarol Jerez Vargas	Conductor
76	1040322163	Yorley Cristina Mazo	Conductor
77	1098682417	Jorge Enrique Stevez	Pintor (Marlon Caceres)
78	1067719801	Jhustin Rada	Ayudante
79	70194523	Mario Leon Patiño Tamayo	Conductor Carro Cisterna
80	32244870	Adriana Patricia Arango	Controlador Vial
81	91299998	Arcadio Florez	Ardimet
82	98559173	Guillermo Leon Ramirez Arias	Ayudante
83	1193588656	Javier David Serrano Luquez	Ayudante

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	CARGO
84	70001988	Argemiro Cano	Ayudante
85	1128441733	Kristian Camilo Cano	Residente Ambiental
86	32356824	Deicy Yurani Cortes Maquilon	Residente SST
87	1098679728	Oscar Marcilla Arenas	Metalmecanica (Marlon Caceres)
88	1098260109	Danna Viviana Calderon	Controlador Vial
89	1048745410	Jeferson Andres Paez	Ayudante (Marlon Caceres)
90	1033486204	Juan José Lopera	Ayudante
91	71318947	Alejandro Perez Zapata	Oficial
92	1001533392	Diego Fernandez	Ayudante
93	1035520058	Jhojan Parra Ortega	Ayudante
94	1063274289	Robinson Navarro	Oficial
95	1102370237	Diego Armando Holguín Suarez	Soldador (Ardimet)
96	1102364402	Luis Carlos Naranjo	Soldador (Ardimet)
97	1092354367	Jhonatan Fabian Tarazona Rojas	Ayudante
98	1038359154	Viviana Marcela Morales Porras	Controlador Vial
99	1062401761	Tomas Alfonso Ovalle Guillen	Ayudante
100	1033178483	Jhoan Alexis Jaramillo Morales	Controlador Vial
101	1101202708	Jean Carlos Ardilla	Soldador (Ardimet)
102	91215083	Manuel Cáceres	Soldador (Marlon Cáceres)
103	43831889	Doris Del Socorro Mora Herrara	Controlador Vial

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	CARGO
104	15683933	Luis Alberto Hernández Hernández	Oficial
105	71717138	Carlos Mauricio Álvarez Montoya	Oficial
106	71747171	Helmer De Jesús Zapata Moreno	Ayudante
107	71663207	Jorge Iván Montoya Correa	Ayudante
108	71526619	Yeison Daniel Goez Goez	Oficial
109	1041056702	Sandra Yurley Agudelo Cárdenas	Controlador Vial

5. LISTADO DE PERSONAL DE INTERVENTORIA.

En la tabla No 3 se relaciona el listado de personal técnico de interventoría.

Tabla 3. Listado de personal técnico de interventoría.

Fijo ☐ Rotativo ☐ Retirado ☐

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	CARGO
1	87301336	Rómulo Exequiel Delgado Ramos	Director de Interventoría
2	1091657325	German Bacca Sánchez	Residente de Interventoría
3	42691841	Sandra Mabel Torres Ospina	Residente Ambiental
4	53046740	Pamela Constanza García Sierra	Residente Social
5	1006359799	Paola Andrea Gutiérrez Ramírez	Auxiliar Administrativa
6	1096644423	Alejandro Nieto Latorre	Técnico 2 de apoyo

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	CARGO
7	1216714007	Karen Nayive Cardona Monsalve	Tecnólogo Civil
8	15402357	Luis Restrepo Arango	Tecnólogo Civil
9	14227746	Martiniano Osorio	Tecnólogo Civil
10	1038411315	David Santiago Gálvez Correa	Tecnólogo Civil
11	1038335403	Yamid Armando Úsuga Jiménez	Tecnólogo SST
12	1039703907	Marlon Sánchez	Tecnólogo Civil
13	1038337424	Paola Alejandra Moreno Bran	Tecnólogo SST
14	1037570469	Juan Camilo Franco David	Conductor
15	1017187278	Wilmar Ferney González	Tecnólogo SST
16	1128438601	Jonathan Andrés Zapata Álvarez	Tecnólogo SST
17	1036635416	Caterine Yuliana González Builes	Tecnóloga SST
18	14209306	José Elber Hernández Rodríguez	Ingeniero Civil

6. GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

La gestión en seguridad y salud en el trabajo va enmarcada en varios componentes que se describen a continuación, los cuales van encaminadas a propender el bienestar físico y mental de todos los colaboradores, subcontratistas, proveedores y terceras personas del área de influencia del proyecto.

6.1. Subprograma de Seguridad en el Trabajo.

La empresa **PIV INGENIERIA S.A.S**, logra una adecuada administración de riesgos, de manera que permita mantener el control permanente de los mismos en los diferentes oficios y que contribuya al bienestar físico, mental y social de los trabajadores al igual que el funcionamiento de los recursos e instalaciones; dentro de este programa se realizaron las actividades como:

- Gestión de seguridad en los diferentes frentes de obra y/o actividades.

- Inspecciones de SST.
- Control de los elementos de protección personal suministrados.
- Inspección en los trabajos y controles viales.
- Inspección de trabajo en alturas y sus respectivos equipos.
- Inspección de herramientas manuales y eléctricas.
- Inducción a nuevos trabajadores.
- Demarcación y señalización de áreas y puestos de trabajo.
- Capacitación del personal de acuerdo con las necesidades establecidas.
- Análisis de Incidentes y Accidentes de Trabajo.
- Investigación de accidentes e incidentes.

6.1.1. Gestión de seguridad en los diferentes frentes de trabajo y/o actividades.

6.1.1.1. Obras mantenimiento de puentes.

Se realiza seguimiento a las actividades en las obras (mantenimiento y reforma de puentes en las vías), verificando las condiciones de seguridad.
Se continuó solicitando al contratista garantizar zonas de acceso seguro, generando orden y aseo, áreas libres de caídas al mismo y a diferente nivel, trabajo de control vial, herramienta que se encuentren en buen estado, acopios de material adecuados, buen diligenciamiento en la documentación.

6.1.1.1. Trabajo de puentes.

Se hace inspección de las actividades de trabajo en los puentes, por lo que durante las actividades se vigiló el cumplimento en las inspecciones de herramientas manuales y eléctricas, el uso de los EPP.
Para el trabajo de puentes se deben realizar el cargue y descargue de materiales que debe ser dispuesto en tramos de la vía, por lo que se solicitó a la SST del contratista ser más enfáticos en las capacitaciones de manejo de carga de materiales, ya que se evidencian malas posturas por parte de los colaboradores, falta de orden y aseo, mal acopio de los materiales.


6.1.2. Inspecciones de SST.

En este periodo el contratista realizo permisos de las actividades con equipos y herramientas eléctricas, además de los preoperacionales de los equipos utilizados en obra, se encuentran en las carpetas de **anexos fotográficos PIV INGENIERIA S.A.S,** a continuación, se relacionan las inspecciones de seguridad realizadas durante este mes y sus registros fotográficos.


Tabla 4. Inspecciones de SST.


No.	TIPO DE INSPECCION
1	Compresor
2	Concretadora
3	Generador Eléctrico
4	Compresor
5	Equipo de Soldadura
6	Pulidora
7	Taladro Percutor



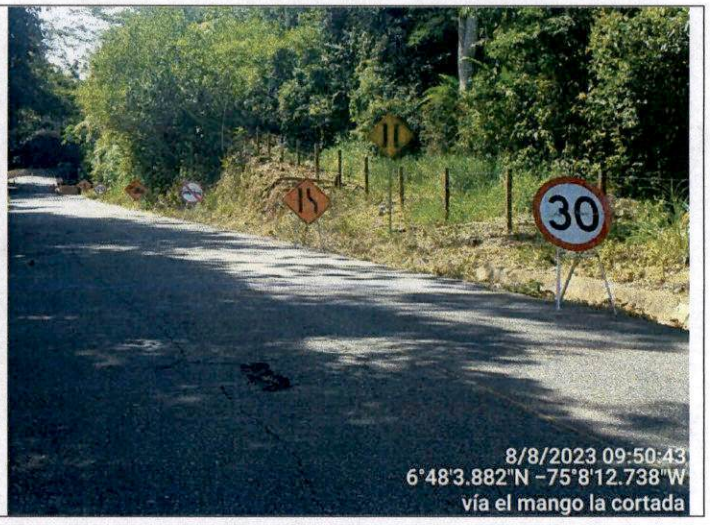

INFORME DE INTERVENTORÍA - GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

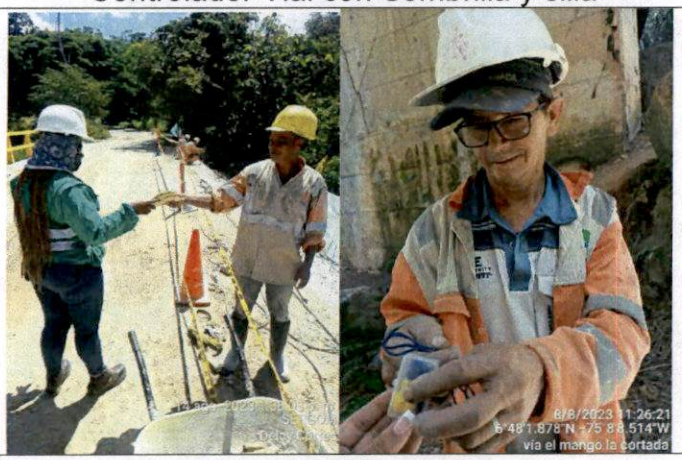Controlador Vial con Sombrilla y silla	Verificación del PMT
	
Entrega de Dotación	Verificación de uso de EPP
	
Capacitación	Etiquetado de Producto Químico

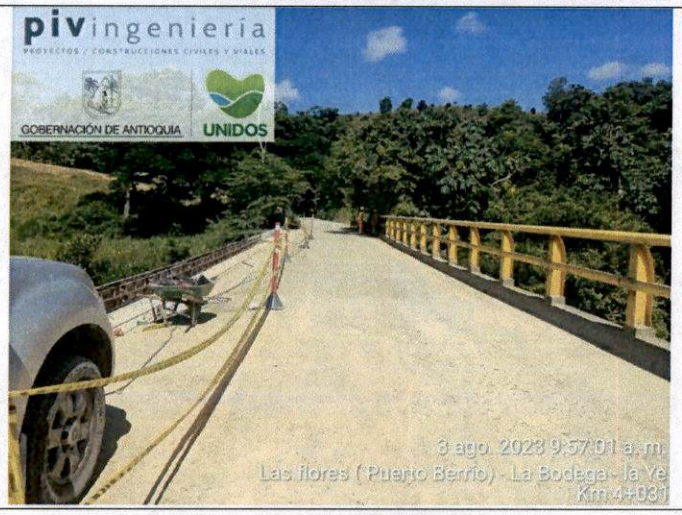	
Señalización de la vía	Hidratación del Personal

6.1.1. Control de los elementos de protección personal suministrados.

Durante este periodo no se realizó entrega de la dotación y EPP al persona nuevo, solo se hizo cambio de elementos deteriorados, sin embargo en obra se evidencia que algunos de los colaboradores no hacen uso de estos, en las actividades de preparación de concreto, manipulación de herramientas manuales y electicas; por la cual se continua solicitando al contratista incentivar el uso de los elementos de protección personal en los trabajadores para generar el autocuidado en ellos promoviendo la protección y seguridad del personal; el registro de entrega de la dotación y EPP se encuentran en la carpeta **Anexos fotográficos PIV INGENIERIA S.A.S.**

pivingeniería PROYECTOS / CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, REPARACIÓN, REHABILITACIÓN, OBRAS DE PROTECCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PUENTES EN LA RED VIAL DEPARTAMENTAL	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA UNIDOS

INFORME DE INTERVENTORÍA - GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.




Uso de EPP



Inspección a Vehículo



Trabajadores Autorizados

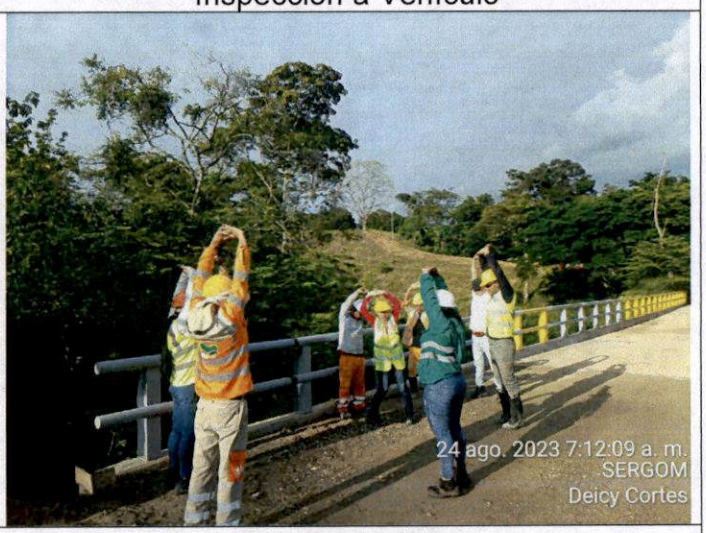

Pausas Activas

6.1.2. Inducción a nuevos trabajadores.

En este periodo ingresaron 5 colaboradores nuevos, a los cuales se les realizó el proceso de inducción, divulgando el **SG-SST** y el **PESV** con junto con el **PMT.**

Tabla 5. Listado personal ingresado.

Fecha de ingreso	Nombre y apellidos	Cargo
21/08/2023	Luis Alberto Hernandez Hernandez	Oficial
23/08/2023	Carlos Mauricio Alvarez Montoya	Oficial
23/08/2023	Helmer De Jesus Zapata Moreno	Ayudante
23/08/2023	Jorge Ivan Montoya Correa	Ayudante
23/08/2023	Yeison Daniel Goez Goez	Oficial

6.1.3. Demarcación y señalización de áreas y puestos de trabajo.

En obra se cuenta con señalización vertical y horizontal, en todo el tramo de la vía donde se encuentran realizando labores, de acuerdo con lo establecido en el PESV Y PMT, al igual no dan cumplimiento con los reductores de velocidad en las zonas de labor y personal sin el uso del peto reflectivo.
Por parte de Interventoría se solicitó la instalación de algunas señalizaciones que no las tienen para el cumplimiento de acuerdo con el manual de señalización del 2015. Esta observación no ha sido subsanada por parte del contratista.
Se cuenta con controladores viales para los cierres temporales de la vía en los diferentes frentes tramos donde se ejecutan las labores, pero la mayoría de estos no cuentan con dotación, solo con peto.
También se continúa con la delimitación en las zonas de peligro a borde de vía, expuesta por el riesgo de caída al mismo y diferente nivel, al igual que se delimita para evitar el contacto de trabajador a vehículos y peatones que transitan por el área de labor, se encuentra en la carpeta **anexos fotográficos PIV INGENIERIA S.A.S** (Carpeta7).

6.1.4. Seguridad social.

El contratista durante este mes realizo solo la entrega de la planilla de seguridad social periodo de cotización de los subcontratistas Derny Jamid López Muñez y MARLON CACERES, pero no el de ARDIMET S.A.S.
El periodo de servicio de la entrega de la seguridad social corresponde al mes de Julio del 2023, enviado por el contratista SERGOM S.A.S; pero se aclara que cuenta con las novedades y que el IBC no coincide con el pago de esta.

Anexo 9 de la carpeta anexos SERGOM S.A.S.

Tabla 6. Relación seguridad social.

EMPRESA	# DE PLANILLA
SERGOM S.A.S	9454573469
ARDIMET	
MARLON CACERES	8626341391
DERNY JAMID LOPEZ MUNEZ	1056948963

6.1.5. Capacitaciones.

En este periodo se realizaron 14 capacitaciones y charlas de SST al personal de obra, las cuales se relacionan en la tabla 7 y en la carpeta de **anexos fotográficos PIV INGENIERIA S.A.S,** (charla y capacitaciones) **y en el anexo 9**
Tabla 7. Capacitaciones de seguridad realizadas durante el periodo.

No.	Fecha	Tema	No. Asistentes
1	25/07/2023	Golpe de calor	7
2	25/07/2023	Levantamiento de Cargas	12
3	25/07/2023	Movimientos Repetitivos	5

No.	Fecha	Tema	No. Asistentes
4	01/08/2023	Buen Comité de convivencia	7
5	03/08/2023	Comunicación y Trabajo en Equipo	10
6	08/08/2023	Riesgo Biomecánico	4
7	10/08/2023	Golpe de Calor e Hidratación	8
8	14/08/2023	Inspección Máquinas y equipos	12
9	15/08/2023	Primeros Auxilios	10
10	17/08/2023	Juegos de Manos	11
11	17/08/2023	Diferencia entre IPS y EPS	10
12	18/08/2023	¿A quién reportar en caso de Emergencia?	7
13	21/08/2023	Orden y Aseo	10
14	23/08/2023	Riesgo locativo	8

6.1.6. Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST).

Durante este mes de agosto no se realizó reunión del **COPASST**.

6.1.7. Accidentalidad e Indicadores de Impacto.

Durante este periodo el contratista reportó no accidentes de trabajo.

6.1.8.1Índice de accidentalidad.

Durante este periodo el contratista reportó no accidentes de trabajo.

INDICE DE ACCIDENTALIDA = I.A

$$\% \, I.A = \frac{NUMERO \; DE \; ACCIDENTES \; LABORALES \; EN \; EL \; PERIODO}{NUMERO \; DE \; TRABAJADORES \; EXPUESTOS \; EN \; EL \; PERIODO}$$

$\% \, I.A = \frac{0}{} * 100 \quad \% \, I.A = 0\%$

6.1.8.2 Indicadores de Impacto

La variable correspondiente al número de trabajadores en obra corresponde al número máximo de trabajadores.

6.1.8.3 Índice de frecuencia: IF

No. de eventos accidente = 0

K = 20000 (teniendo en cuenta 39 trabajadores que laboran 47 horas semanales) Horas hombres trabajados (HHT): 4500

$IF = \frac{No.\ de\ eventos\ accidente * K}{No.\ HHT} = \quad * 200000 = _____$

NOTA: ver conclusiones y recomendaciones

6.1.8.4Índice de Severidad: IS

Durante el mes de agosto se presentaron eventos

No. de días perdidos=

K = 20000 (teniendo en cuenta 100 trabajadores que laboran 47 horas semanales)
Horas hombres trabajados (HHT): 4500

$$\frac{0 \ *k}{4500} = 0$$

NOTA: ver conclusiones y recomendaciones

6.1.8. Ausentismo General.

Durante el mes de agosto no se presentaron incapacidad por accidente de trabajo

Tabla 8. Ausentismo general.

FECHA	NOMBRE	TIPO INCAPACIDAD	DIAGNOSTICO	# DIAS DE AUSENTISMO

6.1.9.1 % de ausentismo total.

Durante el mes de agosto se presentó el siguiente ausentismo.

Horas hombres trabajados (HHT): 4500
No. Días perdidos por AT: 0
No. Días perdidos por EG: 0 K: 100

$$\%_{AT} = \frac{(No.\ dias\ perdidos\ por\ AT + No.\ dias\ perdidos\ por\ EG) * \text{AT}}{HHT} * k$$

$$= \frac{(0+0) * 0 *}{4500} 100 = 0$$

NOTA: ver conclusiones y recomendaciones

6.2. Subprograma de medicina preventiva y del trabajo.

La medicina del trabajo o medicina ocupacional se ocupa de la prevención y tratamiento de enfermedades y lesiones que ocurren en el trabajo o en ocupaciones específicas. Una enfermedad laboral es aquella que se asocia a una determinada ocupación y se produce en el lugar de trabajo, por tanto, la interventoría **PIV INGENIERIA S.A.S**, en su compromiso con los trabajadores verifica la realización de los exámenes médicos de ingreso correspondientes al personal nuevo en obra y demás actividades:

- Ejecución de las medidas del protocolo de bioseguridad.
- Mejoramiento y mantenimiento de las condiciones generales de salud y calidad de vida de los trabajadores.
- Reuniones del Comité de Convivencia Laboral.

6.2.1. Protocolo de bioseguridad.

Durante este periodo se continuó con el cumplimiento de las medidas del protocolo de bioseguridad, lavado de manos y distanciamiento de seguridad.

6.2.2. Promoción y control de la salud de los trabajadores.

Durante este mes se presentó por parte del contratista las evaluaciones médicas de los colaboradores nuevos.

6.2.3. Comité de Convivencia laboral.

El comité de convivencia de la empresa **SERGOM S.A.S,** fue creado en el 23 de marzo 2022, la reunión trimestral se realizó el mes de junio, pero no se ha presentado los soportes de esta actividad.

6.3. Subprograma de Higiene Industrial.

La higiene industrial es el conjunto de procedimientos destinados a controlar los factores ambientales que pueden afectar la salud en el ámbito de trabajo. Se entiende por salud al completo bienestar físico, mental y social.

- Se verifica señalización preventiva en los frentes de obra, al igual que de los elementos para atención de emergencias.
- Se hace seguimiento a la señalización y demarcación instalada en los frentes de obra de acuerdo con el **PMT**.
- Manejo de sustancias químicas.

6.3.1. Plan de emergencias.

Durante este periodo el contratista realizo no ha conformada la brigada de emergencias, observación que se realizó al personal SST del contratista.

Tabla 9. Brigada de emergencias.

FUNCION	# INTEGRANTES
Jefe de Brigada	N/A
Brigadistas de emergencia	N/A

A demás se verificó la instalación de los elementos para la atención de emergencias en cada uno de los frentes, el cual no cuentan con los kits de emergencias.

6.3.2. Manejo de sustancias químicas.

En los frentes de labor no se cuenta aún con un acopio de sustancias químicas, ni el dique donde se acopian los bidones con la sustancia química.
En reiteradas ocasiones se ha solicitado la rotulación de los recipientes, la matriz de compatibilidad, el dique, la identificación del acopio químico y el sistema global mente armonizado, la cual no se ha hecho entrega por parte del contratista, las fotos se encuentran en la carpeta **anexos 10 fotográficos PIV INGENIERIA S.A.S.**

6. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES A LA EMPRESA SERGOM S.A.S.

- Durante este periodo se evidencio la falta de equipos para la atención de emergencias, ya que anteriormente se han presentados sucesos que pudieron haberse atendido en el sitio de trabajo; se reitera que esta condición se viene presentando desde el inicio del contrato.
- Se recomienda a la contratita estar pendiente de las planillas de la seguridad social de las empresas aliadas a sus servicios, pues es labor de la interventoría verificar esta y no solicitarla.

- En este periodo se evidencio la entrega de dotación, sobrilla y sillas a los controladores viales.
- Se evidencia actividades en alturas en el frente "Puente de Occidente" sin la presencia del personal SST.
- Durante este periodo se solicitó la seguridad social del subcontratista ARDIMET, a la fecha no se tiene una respuesta.
- El contratista hace entrega de EPP a sus empleados.
- Se realiza una reunión en la gobernación con el supervisor SST, contratista SST e interventoría SST, cuyo fin era validar la información requerida que para iniciar las actividades en el "Puente de Occidente".
- Se realiza revisión de las investigaciones de los accidentes de trabajo que se presentaron en le ejecución del contrato y se identifican que hacen faltan 2 por ser entregadas, se recomienda al contratista ponerse al día para poder dar cierre a estas no conformidades.
- Se reitera que al mes de agosto no se ha recibido el PMT actualizado, ya que esta tenía vigencia hasta el 31 de mayo del 2023 y solo se cuenta con el PMT de puente de occidente que es específico para este.
- Se reitera la falta de compromiso con el uso de los EPP, para las actividades que se encuentran ejecutando, por parte de la interventoría se ha realizado en varias ocasiones la recomendación sobre el uso obligatorio.
- El contratista no cuenta con Brigada de Emergencia, solo se ha realizado una capacitación en ejercicios de rescate; esta condición se viene presentando de forma continua, haciendo caso omiso a la interventoría.
- Se reitera que no se están realizando los indicadores de gestión en los anexos que el contratista debe de enviar cada mes.
- Se reitera que, en la planilla de pago de seguridad social del personal, que el pago del IBC no coincide con el valor inicial de la propuesta del proyecto.
- No se está realizando la entrega oportuna de los anexos mensuales y estos no están completos, se informa al contratista vía correo electrónico, pero este hace caso omiso a las recomendaciones de la interventoría.
- No se recibe soportes de la investigación y los furat, de los accidentes ocurrido en los meses anteriores.
-

7. ANEXOS SERGOM S.A.S.

Anexo 1. Inducciones.
Anexo 2. Cronograma de capacitaciones.
Anexo 3. Charlas y Capacitaciones.
Anexo 4. ATS, permisos de altura y pre-operacionales.
Anexo 5. Certificado de alturas.
Anexo 6. Entrega de dotación y EPP.
Anexo 7. Inspecciones de Seguridad.
Anexo 8. COPASST, COCOLA y Brigada.
Anexo 9. Afiliaciones y seguridad social.
Anexo 10. Exámenes de ingreso y aptitud.
Anexo 11. Contratos, renuncias y colillas de pago.
Anexo 12. Perfil sociodemográfico.
Anexo 13. Notificación de riesgos.
Anexo 14. Accidentalidad e indicadores.
Anexo 15. Informe fotográfico SERGOM S.A.S.
Anexo 16. Documentación vehículo, transporte de agua para lavado de puentes.
Anexo 17. hojas de vida equipos de altura e inspección.
Anexo 18. Fichas de seguridad y programa de almacenamiento de productos químicos.
Anexo 19 Matriz SG-SST.

8. ANEXOS PIV INGENIERIA S.A.S.

Anexo 1. Exámenes médicos y recomendaciones.
Anexo 2. Contrato y planillas de pago.
Anexo 3. Entrega de dotación y EPP.
Anexo 4. Seguridad social.
Anexo 5. Conformación o capacitación.
Anexo 6. Copia del Boucher de consignación.
Anexo 7. Liquidaciones del personal.
Anexo 8. Paz y salvo.
Anexo 9. Examen de retiro o carta.
Anexo 10. Inducción y evaluación de ingreso piv.

Anexo 11. Capacitaciones piv.
Anexo 12. Actas de reunión.
