CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA / CONTRATISTA
Actualmente se trabaja en la adecuación del campamento para los trabajadores, acopio de materiales y puestos de trabajo para los profesionales que estarán a cargo de la obra, es importante contar con todos los servicios para poder generar toda la gestión documental necesaria sin tener que salir de las instalaciones del proyecto.



ING. FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO BS INGENIENIERIA
No. MAT: _____25202-088508_____

(*) EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMA EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO

	INFORME SEMANAL DE AVANCE	CODIGO: GFF-018 VERSION: 02 FECHA MAYO DE 2023

INFORMACIÓN GENERAL

SEMANA No.	14	"CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ"	% AVANCE FÍSICO
FECHA INFORME	29/05/2023		2,00%
DESDE	22/05/2023	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ"	% AVANCE PROGRAMADO
HASTA	28/05/2023		3,00%

CONTRATO DE OBRA	No. 448 MT 2022	VALOR	$ 16.376.116.616,00	PLAZO	18 MESES	FECHA DE INICIO	6/12/2023	FECHA VENCIMIENTO	25/06/2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA	No. 477 MT 2022	VALOR	$ 1.316.604.045,00	PLAZO	19 MESES	FECHA DE INICIO	6/12/2023	FECHA VENCIMIENTO	25/07/2024

CONTROL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
1,00000	AJUSTE A LOS DISEÑOS	UN	1,00	1	100%
1,10001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA 3x5	UN	1,00	1,00	100%
1,10002	CAMPAMENTO 18 M2	UN	1,00	100	100%
1,10004	DESCAPOTE CON MAQUINA E=0,20M	M2	955,24	0	0%
1,10005	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRECISION	M2	2984,16	1,5	20,85%
1,10006	RED ELECTRICA PROVISIONAL L=50M	UN	0,69	0,50	50%
17,0053	CANALIZACIÓN EN 4 TUBOS DE 6" (PARA ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN), ESTA CANTIDAD ES ESTIMADA	ML	0,39	0	0%
2,30001	PROVISIONAL DE OBRA HIDRAULICA Y SUPERVISION PROVISIONAL ALCANTARILLADO SANITARIO	ML	1	0,5	50%
		TOTAL	3,0%	2,0%	


CONTROL FINANCIERO DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA
(REGISTRE MOVIMIENTOS - PAGOS AUTORIZADOS Y RADICADOS ANTE LA ENTIDAD FIDUCIARIA)

No DE AUTORIZACIÓN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA RADICADO	FECHA PAGO REAL	VALOR BRUTO	DESCUENTOS Y RETENCIONES	PAGO NETO
			DD-MM-AAAA	DD-MM-AA	$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
				TOTAL	$ -	$ -	$ -

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
(TÉCNICAS, LEGALES, ADMINISTRATIVAS - SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL, GESTION AMBIENTAL, GESTION DE CALIDAD)

Se continua trabajando en la generación de los ítems no previstos identificados para el inicio de las actividades constructivas, estas análisis de precios unitarios fueron generados de acuerdo con la lista de insumos, maquinaria y mano de obra contractuales, para los apus que contienen materiales que no se encuentran dentro de la lista se realizaron 3 cotizaciones en depósitos de material cercanos a la obra de los cuales se tomó la de menor valor, adicional se hace entrega de justificación de actividades no previstas, balance con la inclusión de estos ítems, programación y flujo de caja ajustados.
Se realiza la instalación de la valla informativa del proyecto.

GRAFICA DE AVANCE - SEGUIMIENTO SEMANAL

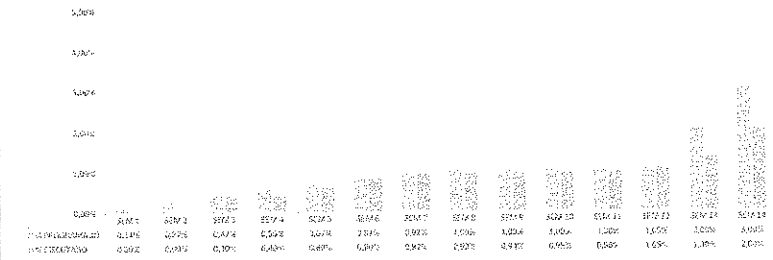


PERIODO	% PROGRAMADO	% EJECUTADO
SEM 1	0,11%	0,00%
SEM 2	0,27%	0,00%
SEM 3	0,42%	0,40%
SEM 4	0,56%	0,40%
SEM 5	0,67%	0,60%
SEM 6	0,82%	0,80%
SEM 7	0,92%	0,92%
SEM 8	1,00%	0,92%
SEM 9	1,00%	0,94%
SEM 10	1,00%	0,95%
SEM 11	1,00%	0,95%
SEM 12	1,05%	1,05%
SEM 13	1,00%	1,30%
SEM 14	3,00%	2,00%
SEM 15		
SEM 16		

RELACIÓN DE PERSONAL Y MAQUINARIA

PERSONAL EN OBRA		EQUIPO EN OBRA	
DIRECTOR	SI	RETRO	NO
RESIDENTE	SI	VOLQUETA	SI
INSPECTOR	1	PLOTEADORA	NO
ASESOR SST	SI	MEZCLADOR	NO
MAESTRO	#	BOMBA CONCRETO	NO
OFICIALES	2	OTROS	NO
AYUDANTES	2		
OTROS	#		

REGISTRO DEL ESTADO DEL TIEMPO (HORAS)

FECHA	LLUVIA	SECO	DETUVO TRABAJOS
22/05/2023			
23/05/2023	6,00	2,00	SI
24/05/2023	5,00	3,00	SI
25/05/2023	6,00	2,00	SI
26/05/2023	5,00	3,00	SI
27/05/2023	6,00	2,00	SI
	28,00	12,00	



ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

- Teniendo en cuenta que la documentación solicitada por Codensa para la instalación de la provisional eléctrica ya fue entregada, se está a la espera de la respuesta por parte de esta entidad prestadora del servicio.
- Se está a la espera de la visita por parte de la empresa que presta el servicio de Internet para realizar su debida instalación.
- Instalación de cerramiento en tela verde la parte frontal del proyecto.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA / CONTRATISTA

Teniendo en cuenta que con este informe se culminan los reportes semanales correspondientes al mes de mayo, se trabaja en la generación del informe mensual el cual recopila toda la gestión técnica, SST y ambiental, el cual será entregado a la interventoría el día 5 de junio para su revisión y aprobación.

ING. FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO BS INGENIENERIA
No. MAT: 25202-888508

** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMA EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO

CONSORCIO

INGENIERÍA

Nit: 901.590.075-0

COPIA DE LA CORRESPONDENCIA

E-mail: ingebypltda@gmail.com
Cra. 68D No. 25B - 86 Of. 327-3 - Teléfono: 7561194- Cel. 315 295 8783 – Bogotá D.C.

CORRESPONDENCIA

ENVIADA

CONSORCIO
BS
INGENIERÍA

Bogotá D.C., 02 de mayo de 2023

Señor(es)
CONSORCIO STARK
R.L. ING. NATALIE TRISTANCHO CLEVES
Cra 30 #10c-228 Ofi. 629
Ciudad

OFICIO No. CTO-448-MT-2022-0019

REF: "CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ".

ASUNTO: PROGRAMACION DE OBRA AJUSTADA CON FECHA DE REINICIO.

Por medio de la presente se envía programación de obra con el ajuste de fecha con el acta de reinicio, de obra del contrato No. CTO-448-MT-2022 que tiene por objeto la "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL DE LA VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ".

Quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,

Ing.Msc. JEFFERSON ODILIO BOHÓRQUEZ LESMES
C.C. 79.894.001 de Bogotá D.C.
REPRESENTANTE LEGAL / CONSORCIO BS INGENIERIA
Nit: 901.590.075-0

Adjunto ___ Folios.
CC Ing. Sonia Rodríguez – Apoyo a la Supervisión del Contrato:

Recibido 02-05-2023. 04:05 pm.
1083697187.

ELABORO

APROBÓ

E-mail: ingebypltda@gmail.com – Cra 68D No. 25B - 86 Of. 327-3
Teléfono: 7561194– Bogotá D.C.

CONSORCIO
BS
INGENIERÍA

Bogotá D.C., 02 de mayo de 2023

Señor(es)
CONSORCIO STARK
R.L. ING. NATALIE TRISTANCHO CLEVES
Cra 30 #10c-228 Ofi. 629
Ciudad

OFICIO No. CTO-448-MT-2022-0020

REF: "CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ".

ASUNTO: INFORME SEMANAL DE EJECUCIÓN DE OBRA No. 8, 9 y 10.

Por medio de la presente se radica informe semanal de obra No. 8, 9 y 10, de obra del contrato No. CTO-448-MT-2022 que tiene por objeto la "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL DE LA VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ".

Quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,

Ing.Msc. JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
C.C. 79.894.001 de Bogotá D.C.
REPRESENTANTE LEGAL / CONSORCIO BS INGENIERIA
Nit: 901.590.075-0

Adjunto ___ Folios.
CC Ing. Sonia Rodríguez – Apoyo a la Supervisión del Contrato:

Recibido. 03-05-2023. 09:07 AM.
1083897187.

ELABORO

APROBÓ

E-mail: ingebyplтda@gmail.com – Cra 68D No. 25B - 86 Of. 327-3
Teléfono: 7561194– Bogotá D.C.

245

CONSORCIO BS INGENIERÍA

Bogotá D.C., 02 de mayo de 2023

Señor(es)
CONSORCIO STARK
R.L. ING. NATALIE TRISTANCHO CLEVES
Cra 30 #10c-228 Ofi. 629
Ciudad

OFICIO No. CTO-448-MT-2022-0021

REF: "CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ".

ASUNTO: RADICADO DE ITEMS NO PREVISTOS.

Por medio de la presente se envían Ítems no previstos para su revisión y posterior aprobación; ítems que son primordiales para las actividades iniciales de ejecución de obra del contrato No. CTO-448-MT-2022 que tiene por objeto la "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL DE LA VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ".

Quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,

Ing.Msc. JEFFERSON ODILIO BOHÓRQUEZ LESMES
C.C. 79.894.001 de Bogotá D.C.
REPRESENTANTE LEGAL / CONSORCIO BS INGENIERIA
Nit: 901.590.075-0

Adjunto ___ Folios.
CC Ing. Sonia Rodríguez – Apoyo a la Supervisión del Contrato:

Recibido. 03-05-2023.
03:08 Pm.
1083697187.

ELABORO

APROBÓ

E-mail: ingebyptda@gmail.com – Cra 68D No. 25B - 86 Of. 327-3
Teléfono: 7561194– Bogotá D.C.

246

CONSORCIO
BS
INGENIERÍA

Bogotá D.C., 08 de mayo de 2023

Señor(es)
CONSORCIO STARK
R.L. ING. NATALIE TRISTANCHO CLEVES
Cra 30 #10c-228 Ofi. 629
Ciudad

OFICIO No. CTO-448-MT-2022-0022

REF: "CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ".

ASUNTO: AFILIACION PERSONAL PROFESIONAL Y OPERATIVO DE OBRA.

Por medio de la presente se envían se envía las afiliaciones del personal Profesional y operativo de obra del contrato No. CTO-448-MT-2022 que tiene por objeto la "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL DE LA VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ".

- Afiliación Ing. VIVIANA PULGARIN - PROFESIONAL SST
- Afiliación Garli Guerrero - AYUDANTE OBRA
- Afiliación José Herrera - AYUDANTE OBRA

Quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,

Ing.Msc. JEFFERSON ODILIO BOHÓRQUEZ LESMES
C.C. 79.894.001 de Bogotá D.C.
REPRESENTANTE LEGAL / CONSORCIO BS INGENIERIA
Nit: 901.590.075-0

Adjunto ___ Folios.
CC Ing. Sonia Rodríguez – Apoyo a la Supervisión del Contrato:

Recibido. 08-05-2023. 09:10 AM.
1083897182

ELABORO

APROBÓ

E-mail: ingebypltda@gmail.com – Cra 68D No. 25B - 86 Of. 327-3
Teléfono: 7561194– Bogotá D.C.

CONSORCIO
BS
INGENIERÍA

Bogotá D.C., 08 de mayo de 2023

Señor(es)
CONSORCIO STARK
R.L. ING. NATALIE TRISTANCHO CLEVES
Cra 30 #10c-228 Ofi. 629
Ciudad

OFICIO No. CTO-448-MT-2022-0023

REF: "CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ".

ASUNTO: SOLICITUD CAMBIO DEL PERFIL PROFESIONAL SISO.

Por medio de la presente se le solicitad de la manera más cordial, el cambio del Profesional ASESOR SISO, Se solicita el siguiente cambio de la Ingeniara María Isabel Perdomo por la Profesional en Salud Ocupacional Viviana Pulgarin García del contrato No. CTO-448-MT-2022 que tiene por objeto la "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL DE LA VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ".

- Hv. VIVIANA PULGARIN – ASESOR SISO

Quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,

Ing.Msc. JEFFERSON ODILIO BOHÓRQUEZ LESMES
C.C. 79.894.001 de Bogotá D.C.
REPRESENTANTE LEGAL / CONSORCIO BS INGENIERIA
Nit: 901.590.075-0

Recibido 08-05-2023 02-06 PM
1083897407

Adjunto ___ Folios.
CC Ing. Sonia Rodríguez – Apoyo a la Supervisión del Contrato:

ELABORO

APROBÓ

CONSORCIO
BS
INGENIERÍA

Bogotá D.C., 09 de mayo de 2023

Señor(es)
CONSORCIO STARK
R.L. ING. NATALIE TRISTANCHO CLEVES
Cra 30 #10c-228 Ofi. 629
Ciudad

OFICIO No. CTO-448-MT-2022-0024

REF: "CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ".

ASUNTO: CUENTA DE COBRO No. 1 – DICIEMBRE 2022 A ENERO 2023

Por medio de la presente se envía documentos del acta No. 1 y su respectiva cuenta de cobro que corresponde desde el 06 de diciembre de 2022 hasta el 19 de enero de 2023 del contrato No. CTO-448-MT-2022 que tiene por objeto la "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL DE LA VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ".

- CUENTA DE COBRO No. 1

Quedamos atentos a sus comentarios.

Recibido
09-05-2023

Atentamente,

Ing.Msc. JEFFERSON ODILIO BOHÓRQUEZ LESMES
C.C. 79.894.001 de Bogotá D.C.
REPRESENTANTE LEGAL / CONSORCIO BS INGENIERIA
Nit: 901.590.075-0

Adjunto ___ Folios.
CC Ing. Sonia Rodríguez – Apoyo a la Supervisión del Contrato:

ELABORO

APROBÓ

CONSORCIO
INGENIERÍA

Bogotá D.C., 12 de mayo de 2023

Señor(es)
CONSORCIO STARK
R.L. ING. NATALIE TRISTANCHO CLEVES
Cra 30 #10c-228 Ofi. 629
Ciudad

OFICIO No. CTO-448-MT-2022-0025

REF: "CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ".

ASUNTO: CORRECCIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS.

Por medio de la presente se envía los Ítems no previstos corregidos para su revisión y posterior aprobación; ítems que son primordiales para las actividades iniciales de ejecución de obra del contrato No. CTO-448-MT-2022 que tiene por objeto la "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL DE LA VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ".

Los ítems no previstos son los siguientes:

No. Ítems	Descripción	Justificación
NP - 001	DESMONTE Y RETIRO DEL PARQUE BIOSALUDABLE	El desmonte y retiro del Parque Biosaludable es necesario para el desarrollo de la construcción de los parqueaderos del centro de educación inicial.
NP - 002	DESMONTE Y RETIRO DE LA MALLA CONTRAIMPACTO	El desmonte de la malla contraimpacto debe ser retirada del predio donde se va a realizar la construcción, ya que no se requiere de este tipo de cerramiento.
NP - 003	DESMONTE Y RETIRO DE GRAMA EXISTENTE	Se realiza el corte y retiro de la grama de la cancha de futbol teniendo en cuenta que el material de grama puede ser trasladado al espacio deportivo.

ELABORO

APROBÓ

CONSORCIO BS INGENIERÍA

NP - 004	FILTRO GEODREN 0.45X0.45 M CON TUBERIA FILTRO DE D=100 mm (Incluye geotextil y gravilla, no incluye el retiro de la excavación)	El filtro que se requiere para este predio es para darle el manejo adecuado a las aguas de la escorrentía superficial y que llegan de los lotes vecinos.
NP - 005	DESMONTE Y RETIRO DE LOS ARCOS DE LA CANCHA DE FUTBOL EXISTENTES	Se debe realizar el desmonte y traslado de los arcos de futbol que se encuentran en el predio donde se va a realizar la construcción del centro de educación inicial.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,

Ing.Msc. JEFFERSON ODILIO BOHÓRQUEZ LESMES
C.C. 79.894.001 de Bogotá D.C.
REPRESENTANTE LEGAL / CONSORCIO BS INGENIERIA
Nit: 901.590.075-0

Adjunto ___ Folios.
CC Ing. Sonia Rodríguez – Apoyo a la Supervisión del Contrato:

Recibido 12-05-2023. 11:15 AM.
1083 [illegible]

ELABORO

APROBÓ

E-mail: ingebyplтda@gmail.com – Cra 68D No. 25B - 86 Of. 327-3
Teléfono: 7561194— Bogotá D.C.

CONSORCIO
BS
INGENIERÍA

Bogotá D.C., 12 de mayo de 2023

Señor(es)
CONSORCIO STARK
R.L. ING. NATALIE TRISTANCHO CLEVES
Cra 30 #10c-228 Ofi. 629
Ciudad

OFICIO No. CTO-448-MT-2022-0026

REF: "CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ".

ASUNTO: INFORME MENSUAL No.2 - MES DE ABRIL

Por medio de la presente se envía le informe mensual de obra No. 2 correspondiente al mes de enero y abril del año 2023 del contrato de obra No. CTO-448-MT-2022 que tiene por objeto la "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL DE LA VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ".

Quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,

Ing.Msc. JEFFERSON ODILIO BOHÓRQUEZ LESMES
C.C. 79.894.001 de Bogotá D.C.
REPRESENTANTE LEGAL / CONSORCIO BS INGENIERIA
Nit: 901.590.075-0

Adjunto ___ Folios.
CC Ing. Sonia Rodríguez – Apoyo a la Supervisión del Contrato:

Recibido
1085267187.
12-05-2023.
03:00 pm.

ELABORO

APROBÓ

E-mail: ingebypltda@gmail.com – Cra 68D No. 25B - 86 Of. 327-3
Teléfono: 7561194— Bogotá D.C.

252

CONSORCIO
BS
INGENIERÍA

Bogotá D.C., 12 de mayo de 2023

Señor(es)
CONSORCIO STARK
R.L. ING. NATALIE TRISTANCHO CLEVES
Cra 30 #10c-228 Ofi. 629
Ciudad

OFICIO No. CTO-448-MT-2022-0027

REF: "CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ".

ASUNTO: INFORME SEMANAL DE OBRA CORREGIDO No. 8, 9 y 10.

Por medio de la presente se radica informe semanal de obra No. 8, 9 y 10 corregido según observaciones remitidas por la interventoría del contrato de obra No. CTO-448-MT-2022 que tiene por objeto la "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL DE LA VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ".

Quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,

Ing.Msc. JEFFERSON ODILIO BOHÓRQUEZ LESMES
C.C. 79.894.001 de Bogotá D.C.
REPRESENTANTE LEGAL / CONSORCIO BS INGENIERIA
Nit: 901.590.075-0

Adjunto ___ Folios.
CC Ing. Sonia Rodríguez – Apoyo a la Supervisión del Contrato:

Recibido. 12-05-2023. 04:35 PM.
1083597187.

ELABORO

APROBÓ

E-mail: ingebypltda@gmail.com – Cra 68D No. 25B - 86 Of. 327-3
Teléfono: 7561194– Bogotá D.C.

253

CONSORCIO
BS
INGENIERÍA

Bogotá D.C., 26 de mayo de 2023

Señor(es)
CONSORCIO STARK
R.L. ING. NATALIE TRISTANCHO CLEVES
Cra 30 #10c-228 Ofi. 629
Ciudad

OFICIO No. CTO-448-MT-2022-0028

REF: "CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ".

ASUNTO: SOLICITUD CAMBIO DEL PERFIL PROFESIONAL INSPECTOR DE OBRA.

Por medio de la presente se le solicitad de la manera más cordial, el cambio del Profesional que cumple con el perfil de INSPECTOR DE OBRA, Se solicita el siguiente cambio, el señor Belisario Mican Herrera por la Ingeniera Liliana Prieto Cruz del contrato No. CTO-448-MT-2022 que tiene por objeto la "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL DE LA VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ".

- Hv. LILIANA PRIETO CRUZ – INSPECTOR DE OBRA

Quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,

Ing.Msc. JEFFERSON ODILIO BOHÓRQUEZ LESMES
C.C. 79.894.001 de Bogotá D.C.
REPRESENTANTE LEGAL / CONSORCIO BS INGENIERIA
Nit: 901.590.075-0

Adjunto ___ Folios.
CC Ing. Sonia Rodríguez – Apoyo a la Supervisión del Contrato:

Recibido: 26-05-2023 09:15 AM.
1083891781

ELABORO

APROBÓ

E-mail: ingebypltda@gmail.com – Cra 68D No. 25B - 86 Of. 327-3
Teléfono: 7561194— Bogotá D.C.

254

CORRESPONDENCIA

RECIBIDA

CONSORCIO
STARK
NIT 901.619.583-9

313 809 8624
constark2022@gmail.com
CRA 30 No. 10C – 228 OF 629, Medellín

02 de mayo de 2023 **STK-033-2023**

Señores
CONSORCIO BS INGENIERIA
R/L JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES

REF: CTO 477 MT 2022 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ"

ASUNTO: Implementación PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO SANITARIO (PAPSO) – BIOSEGURIDAD - CORONAVIRUS –MEDIDAS DE PREVENCION, PROMOCION Y CONTROL, CONTRATO No. CT 448 MT 2022.

Teniendo en cuenta que el reinicio del contrato de obra No. CT 448 MT 2022 se dio el día 12 de abril de 2023, esta interventoría solicita que se inicie la implementación del plan de aplicación del protocolo sanitario (PAPSO) – protocolos de bioseguridad - coronavirus –medidas de prevención, promoción y control para la ejecución de la construcción de la primera etapa centro de atención y educación inicial vereda la fuente, de acuerdo al protocolo aprobado por esta interventoría.

Es de recordar que cualquier actualización en los requisitos legales definidos para este tema y que afecten el desarrollo del proyecto, deben ser ajustados e implementados para su adecuación y cumplimiento.

Agradezco la atención prestada

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
R.L CONSORCIO STARK

Rb 02/may/2023

256

CONSORCIO
STARK
NIT 901.619.583-9

313 809 8624
constark2022@gmail.com
CRA 30 No. 10C – 228 OF 629, Medellín

02 de mayo de 2023 **STK-034-2023**

Señores
CONSORCIO BS INGENIERIA
R/L JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES

REF: CTO 477 MT 2022 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ"

ASUNTO: Entrega informe mensual de obra y plan de señalización interna CONTRATO No. CT 448 MT 2022.

De acuerdo con los compromisos adquiridos en los comités de obra, se recuerda la entrega de la siguiente documentación:

- **Informes mensuales:**
  Teniendo en cuenta lo hablado en el comité de obra No 2 del día 13 de abril se definió, la entrega de los informes mensuales con corte el día 30, el cual deberá ser remitido a la interventoría el tercer día hábil de cada mes, por lo cual este documento debe ser entregado a más tardar el día jueves 4 de mayo de 2023 para su respectiva revisión.

- **Plan de señalización**
  De acuerdo con el acta de comité No 3 del 20 de abril de 2023, se solicito el plan de señalización interno de la obra, el cual a la fecha no ha sido radicado por parte del contratista de obra, esta interventoría solicita la entrega de dicho documento para el día viernes 5 de mayo de 2023.

Agradezco la atención prestada

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
R.L CONSORCIO STARK

Pb 02/05/2023

257

CONSORCIO
STARK
NIT 901.619.583-9

313 809 8624
constark2022@gmail.com
CRA 30 No. 10C – 228 OF 629, Medellín

05 de mayo de 2023 **STK-035-2023**

Señores
CONSORCIO BS INGENIERIA
R/L JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES

REF: CTO 477 MT 2022 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ"

ASUNTO: Reunión técnica para conciliación de precios para ítems no previstos

Una vez hecha la revisión a los APUS de los ítems no previstos, se solicita una reunión técnica el día Lunes a las 9 am, con el objetivo unificar criterios y poder conciliar el precio de dichas actividades.

Agradezco la atención prestada

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
R.L CONSORCIO STARK

Rbo Odilio 5/05/2023

CONSORCIO
STARK
NIT 901.619.583-9

313 809 8624
constark2021@gmail.com
CRA 30 No. 10C – 228 OF 629, Medellín

09 de mayo de 2023

STK-036-2023

Señores
CONSORCIO BS INGENIERIA
R/L JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES

REF: CTO 477 MT 2022 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ"

ASUNTO: Solicitud entrega informe mensual y observaciones a informes semanales

De acuerdo con el compromiso acordado el día 03 de mayo de 2023 mediante acta de comité No 4 se solicita la entrega del informe mensual de obra debido a que este es un insumo para la generación del informe mensual de interventoría.

Con respecto a los informes semanales se solicita verificar el porcentaje programado de cada actividad por medio de los cortes con las líneas de progreso en el diagrama Gantt.

Agradezco la atención prestada

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
R.L CONSORCIO STARK

Recibido 09/05/2023

254

CONSORCIO
STARK
NIT 901.619.583-9

313 809 8624
constark2022@gmail.com
CRA 30 No. 10C – 228 OF 629, Medellín

16 de mayo de 2023 **STK-039-2023**

Señores
CONSORCIO BS INGENIERIA
R/L JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES

REF: CTO 477 MT 2022 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ"

ASUNTO: Observaciones componentes SST y Ambiental, Informe mensual 2 mes de abril de 2023, CONTRATO No. CT 448 MT 2022, "CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACION INICIAL VEREDA LA FUENTE".

Por medio de la presente, esta interventoría se permite realizar las siguientes observaciones al informe mensual N° 2 mes de abril, radicado mediante oficio No. CTO-448-MT-2022-0026:

Componente SST:

- No se anexan los exámenes médicos ocupacionales de personal mínimo.
- No se anexa registro de Inducción y notificación de riesgos de personal mínimo.
- No se anexa registro de entrega de EPP de personal mínimo.
- Afiliación y pago de seguridad social de personal mínimo:
  - Belisario Mican Herrera, Inspector de obra: No se anexa soporte.
  - Jorge Ivan Herrera, Asesor estructural: No se anexa soporte.
  - Nelki Buitrago, Especialista en Redes Eléctricas: No se anexan soportes de pago de ARL y Pensión. Solamente se anexa registro de afiliación de salud.
  - Juan Sebastián de Plaza Solórzano, Especialista en redes Hidraulicas: No se anexa soporte.

260

CONSORCIO
STARK
NIT 901.619.583-9

313 809 8624
constark2022@email.com
CRA 30 No. 10C – 228 OF 629, Medellín

- Oscar Javier Pardo Moreno: No se anexan soportes de pago de ARL y Pensión. Solamente se anexa registro de afiliación de salud.
- Los documentos de los señores: GUERRERO MIRANDA GARLI, HERRERA HERRERA JOSE ALFONSO y PULGARIN GARCIA VIVIANA, corresponden al mes de mayo. Por lo que se deben presentar dentro de ese informe de ejecución.

- Anexar junto al pago de seguridad social, el formato determinado por la alcaldía denominado CONTROL A SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL GI-F-018.
- Presentar los indicadores mínimos, teniendo en cuanta la estructura de la resolución 0312 de 2019, así como los indicadores de gestión en la ejecución del SGSST.
- Presentar la ejecución del programa de trabajo del SGSST, teniendo en cuenta las actividades desarrolladas en el periodo del informe.
- Presentar la ejecución del programa de capacitación, teniendo en cuenta la ejecución de las actividades durante el periodo del informe.

Componente Ambiental:

- No hay coherencia entre las fichas ambientales presentadas, teniendo en cuenta el PMA aprobado, el cual maneja 12 fichas de manejo ambiental para el proyecto y se presentan dentro del informe 16 fichas de manejo ambiental.
- Revisar dentro de las fichas presentadas el alcance y objeto del proyecto, dado que se menciona en varios documentos soporte de las mismas el proyecto/Obra: Colegio el Porvenir.
- Verificar el cronograma de capacitaciones presentado, dado que aparecen fechas de programación del año 2020.
- En la ficha de manejo12, aparecen 12 especies arbóreas inventariadas, pero esto no corresponde al alcance y objeto del proyecto.
- Revisar los datos de los indicadores presentados ya que aparecen con fechas de ejecución año 2020 y los datos reflejados no son coherentes con el alcance del proyecto, como la cantidad de RCD estimada, así

CONSORCIO
STARK
NIT 901.619.583-9

313 809 8624
constark2022@gmail.com
CRA 30 No. 10C – 228 OF 629, Medellín

como la cantidad de material de ejecución y numero de permisos requeridos.

- Presentar la ejecución del programa de trabajo actividades ambientales, teniendo en cuenta el periodo del informe.
- Presentar la ejecución del programa de capacitación, teniendo en cuenta el desarrollo de las actividades ambientales previstas en el periodo del informe.

Dado lo anterior esta interventoría solicita que estas observaciones sean subsanadas y entregadas a más tardar el día 19 de mayo de 2023

Agradezco la atención prestada.

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
R.L CONSORCIO STARK

16/05/2023

CONSORCIO
STARK
NIT 901.619.583-9

313 809 8624
constark2022@gmail.com
CRA 30 No. 10C – 228 OF 629, Medellín

19 de mayo de 2023 **STK-041-2023**

Señores
CONSORCIO BS INGENIERIA
R/L JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES

REF: CTO 477 MT 2022 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ"

ASUNTO: Observaciones Plan de señalización, CONTRATO No. CT 448 MT 2022, "CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACION INICIAL VEREDA LA FUENTE".

Por medio de la presente, esta interventoría se permite realizar las siguientes observaciones al plan de señalización, radicado por ustedes:

Además de lo determinado dentro del plan, el documento debe contemplar lo siguiente:

- Esquema de señalización interna, incluyendo señalización óptica y acústica.
- Plan y estructura de señalización de zonas o áreas de circulación de tránsito de personal al interior de la zona de ejecución del proyecto.
- Plan y estructura de señalización en actividades de alto riesgo, para trabajo en alturas o espacios confinados.
- Plan de señalización y activación sonora.
- Plan y estructura de señalización de actividades de trabajo nocturno o de baja luminosidad.
- Plan y estructura de señalización de zonas externas y de tránsito de peatones.
- Plan y estructura de señalización de áreas de tránsito de maquinaria y equipos.

CONSORCIO
STARK
NIT 901.619.583-9

313 809 8624
constark2022@gmail.com
CRA 30 No. 10C – 228 OF 629, Medellín

- Plan y estructura de señalización de cierres temporales que se generen en el desarrollo del proceso constructivo, almacenamiento o acopio temporal de materiales pétreos y otros materiales.
- Plan y estructura de señalización para eventos que se generen por condiciones ambientales o emergencias presentadas al interior de la zona de ejecución del proyecto.

Dado lo anterior esta interventoría solicita que estas observaciones sean subsanadas y entregadas a más tardar el día 23 de mayo de 2023.

Agradezco la atención prestada.

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
R.L CONSORCIO STARK

19/05/2023

CONSORCIO
STARK
NIT 901.619.583-9

313 809 8624
constark2022@gmail.com
CRA 30 No. 10C – 228 OF 629, Medellín

20 de mayo de 2023

STK-042-2023

Señores
CONSORCIO BS INGENIERIA
R/L JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES

REF: CTO 477 MT 2022 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ"

ASUNTO: Solicitud procedimiento de trabajo actividades de cimentación

Por medio de la presente se solicita la entrega un procedimiento de trabajo donde nombre cada una de las actividades que se llevarán a cabo para la construcción de la cimentación del proyecto en mención.

Se recomienda verificar la información referente a la cimentación y las recomendaciones dadas por el especialista que realizo el estudio de suelos, también se recomienda verificar las especificaciones técnicas de los materiales exigidos por el diseño estructural.

Agradezco la atención prestada.

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
R.L CONSORCIO STARK

RO 23/05/2023

265

CONSORCIO
STARK
NIT 901.619.583-9

313 809 8624
constark2022@gmail.com
CRA 30 No. 10C – 228 OF 629, Medellín

27 de mayo de 2023

STK-044-2023

Señores
CONSORCIO BS INGENIERIA
R/L JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES

REF: CTO 477 MT 2022 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ"

ASUNTO: Solicitud de análisis de rendimiento de los APUS no previstos identificados para el balance de alcance final

Teniendo en cuenta que el contratista de obra actualmente está en la generación del balance de obra con ítems y cantidades finales, y con base en el contrato de obra **No 448 MT 2022** en las obligaciones generales del contratista en el numeral 10 ***(Presentar los informes que le sean solicitados por el supervisor dentro del término señalado para tal efecto)*** y de acuerdo con el contrato de interventoría **No 477 MT 2022** en las obligaciones especificas del contratista en el numeral 25 ***(Coordinar la recopilación de datos sobre costos, rendimientos, sistemas de construcción etc., para lo cual podrá requerir del contratista la información completa y detallada sobre número, clasificación, salarios o sueldos de los empleados, costos de materiales, herramientas, equipos e instrumentos utilizados en la obra, así como rendimientos de la mano de obra, materiales y equipo).*** Se solicita que junto con los ítems no previstos que se identifiquen y que no estén soportados con alguno de los listados de precios ICCU, IDU y otros de referencia, se presente un análisis de rendimiento para cada uno de los APUS generados.

Agradezco la atención prestada.

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
R.L CONSORCIO STARK

Recibo 27/05/2023

166

COPIA BITACORA

DE OBRA

R/L Interventoria

02 MAYO 2023.

*Personal Interventoria: Residente (1). Inspector (1) profesional SST (1) Director (1) topografo (1) * Personal Administrativo Obra: Inspector (1). Residente (1) profesional SST (1) - Director (1). * Personal Operativo: Oficiales (1) Ayudante (2) Sub contratista, Maquinaria ( ) Equipos ( )

*El Contratista Realiza entrega de programacion de obra, informes semanales e items no previstos para Revision por parte de la interventoria; Se Realiza Suministro e instalacion de valla informativa se continua con la adecuacion del campamento del proyecto, se Comienta con la canalizacion en tubos de 6" para Acometida de media tensión. Durante el dia se presentan lluvias lo cual detuvo las actividades programadas

Clima mañana: 2 horas lluvia clima tarde: 11 horas lluvia

R/L interventoria

MIÉRCOLES 03 MAYO 2023.

Personal Interventoria: Residente (1), profesional SST (1), Inspector (1)

*Personal Administrativo Obra: Residente (1) Inspector (1) profesional (SST) (1) director (1) *Personal Obra: Oficiales (1) Ayudantes (2) *Equipos ( ) maquinaria ( ) Sub contratista ( ) TOPOGRAFO (2)

Se Continua actividades de instalación de valla INFormativa, se realiza realiza Revision topografica del Área y Verificacion del tuberia hidrosanitaria Existente para acometida provisional de Alcantarillado, Se continua con la revisión de la programación de Obra e informes semanales e items no previstos, se informa por oficio la implementacion del protocolo de bioseguridad (PAPSO) Aprobado por la interventoria * Durante el dia se presentan lluvias lo cual hace que se detengan las actividades programadas generando atraso en la programación y avance.

Clima mañana: 4 horas lluvia clima tarde: soleada.

R/L Interventoria.
Jueves 04 MAYO 2023.
Personal Interventoria: Residente (1) Profesional SST (1) Inspector (2)
* Personal Administrativo Obra: profesional SST (1) Inspector (1)
Residente (1) Director (1) * personal Operativo: Oficiales (1) Ayudantes (2)
Sub contratista ( ). Maquinaria ( ) Equipos ( )
*Se continua con Actividades de instalación de Valla informativa
para el proyecto, como tambien Verificacion de tuberia sanitaria
Existente, para Acometida de Alcantarillado, Se solicita al contratista
la entrega de documentos de ingreso y Afiliaciones de los
Ayudantes de obra se esté a la espera de la respuesta por parte
de Enel para la instalacion de la provisional Electrica. * Durante el
dia se presentan lluvias que detienen las actividades programadas
clima mañana: 4 horas lluvia clima tarde: 4 horas lluvia.

R/L Interventoria.
Viernes 05 MAYO 2023
*Personal interventoria: Residente (1). Profesional SST (1) Inspector (1) Director (1)
Topografo (1) * Personal Administrativo obra: Residente (1) profesional
SST (1) Inspector (1) director (1). * Personal obra: Oficiales (2)
Ayudantes (2) * maquinaria ( ) * Equipos ( ) sub contratistas ( ).
se continua con Actividades de logistica e implementacion de las
instalaciones provisionales y campamento de obra para la
ejecución de las Actividades de construcción. Se continua con la revisión
de la programación, informes semanales e items no previstos. Se solicita
al contratista Ajuste del plan de SG-SST definido para el proyecto
clima mañana: soleada. clima tarde: soleada

R/L Interventoria
Sabado 06 MAYO 2023
*Personal interventoria: profesional SST (1) Residente (1) Inspector (1)
*Personal Administrativo obra: Residente (1) Inspector (1) profesional SST (1)

* personal obra: Oficiales (2) Ayudantes (2) subcontratistas ( ). maquinaria ( ) Equipos ( )
* Durante el dia se presentan fuertes lluvias que hacen que se detengan las actividades programadas, se continuan con el desarrollo de actividades de la instalación de la valla informativa y adecuación de campamento, se revisan pagos de seguridad social emitidos por el contratista de obra de 2 ayudantes de obra se solicita la entrega del plan de señalización interna del proyecto.
Clima mañana: 4 horas lluvia clima tarde: 2 horas lluvia.

R/L Interventoria.

Residente SST


Lunes 08 MAYO 2023.
personal interventoria residente (1). inspector (1) profesional SST (1) topografo (1) * personal Administrativo Obra: inspector (1). Residente (1) profesional (2) * personal Obra: Oficiales (1) Ayudantes (2). subcontratista maquinaria ( ) Equipos ( ). topografo (2)
* Se continua con la revisión de programación del proyecto y los items no previstos, se solicita informes mensual de obra, el cual el contratista de obra lo presenta para el 12/05/2023. Se presentan documentos para el cambio de SST, se realiza acometida provisional de acueducto y se espera que en 15 dias se realice la acometida electrica por parte de enel, se realiza levantamiento topografico y replanteo en el área del proyecto. Se continua con instalación de valla informativa y Adecuación del campamento de obra
Clima mañana: soleada. clima tarde: soleada.


R/L Interventoria.

Residente SST

Martes 09 MAYO 2023.
* personal interventoria: inspector (1), Residente (1), profesional SST (1) director (1) topografo (1). * personal Administrativo obra: Residente (1), profesional SST (1) inspector (1) * personal Obra: Oficiales (1) Ayudantes (2) subcontratistas ( ) maquinaria ( ) Equipos ( ), topografo (1)
* se continua Verificación topografica del lote y levantamiento, ubicación


de pozos sanitarios, se continua con adecuación de campamento instalación de valla informativa, se realiza finalización de cerramiento en lona verde perimetral al lote del proyecto. se continua con revisión de programación e ítems no previstos, Durante el día se presentan lluvias
Clima mañana: 4 horas lluvia clima tarde: 2 horas lluvia.






R/L Interventoria


Miércoles 10 MAYO 2023.
Personal Interventoria: Residente (1), profesional SST (1) inspector (1), Director (1)
*Personal Administrativo Obra: Residente (1), profesional SST (1). Inspector (1).
*personal obra: Oficiales (1) Ayudantes (2), Subcontratista maquinaria ( ) Equipos ( )
Se continua con el desarrollo de la adecuación de campamento de obra instalacion de valla informativa e instalación de provisional de agua potable se realiza Radicado de cuenta de cobro Nº 1, Durante el dia se presentan lluvias lo cual detienen las Actividades programadas.
Clima mañana: 4 horas lluvias clima tarde: 4 horas lluvia






R/L Interventoria.

Jueves 11 MAYO 2023.
*Personal Interventoria: Residente (1), Inspector (1), profesional SST (1). Topografo (1), *personal Administrativo Obra: Residente (1), Inspector (1) Profesional SST (1) *personal Obra: Oficiales (1) Ayudantes (2) subcontratistas ( ) maquinaria, ( ) Equipos ( ).
*Se Continua con el desarrollo de Adecuación de campamento de obra, Se realiza instalación provisional de agua potable, Se realiza la continuación de la instalacion de la valla informativa, se hace seguimiento a las solicitudes de servicios de internet, luz, para el campamento, Durante el dia se presentan fuertes lluvias lo cual se detienen las Actividades.
Clima mañana: 4 horas lluvia clima tarde: 4 horas lluvia.





R/L Interventoria.
Viernes 12 MAYO 2023.
*Personal Interventoria: Residente (1). Inspector (1). profesional SST (1).
*Personal Administrativo Obra: Profesional SST (1). Residente (1). Inspector (1) maquinaria ( ), Equipos ( ) subcontratista ( ) *personal Obra: Oficiales (1) Ayudantes (2).
*Se realiza subsanación de ítems previstos, se realizan entrega de informe mensual N° 3 correspondiente al mes de Abril por el contratista, las revisión por parte de la interventoria, se entregan por parte del contratista los informes semanales corregidos, se remite a la supervisión del contrato la. Remisión de la hoja de vida del Asesor siso del contrato de obra, se. Continua con Adecuación de campamento e instalación de provisionales de Agua.
Clima mañana: soleada Clima tarde: soleada.

Residente SST


R/L Interventoria. SABADO 13 MAYO 2023
Personal Interventoria: Profesional SST (1), Residente (1), Inspector (1), topografo (1) Director (1) *personal Administrativo Obra: Profesional SST (1) Residente (1) Inspector (1) *personal Obra: Oficiales (1) Ayudantes (2), maquinaria ( ). Equipos ( ) sub contratista ( ).
*Se comienza con la revisión al informe mensual de obra entregado por el contratista, se realiza instalación de baños portatiles para el Frente de obra, se continua con el acondicionamiento e instalación de campamento de obra se realiza seguimiento a instalación de provisional de energia electrica
*Durante el dia se presentan lluvias lo cual hace que se superden las Actividades programadas
Clima mañana: 4 horas lluvias Clima tarde: 4 horas lluvia.


Residente SST

R/L Interventoria.
LUNES 15 MAYO 2023.
personal Interventoria Residente (1) profesional SST (1), Inspector (1) topografo (1)
*personal Administrativo Obra: profesional SST (1), Inspector (1), Residente (1)
*personal Obra: Oficiales (1) Ayudantes (2) maquinaria ( ) equipos ( )
Se continues con la revisión de documentos del informe mensual

Radicado por el contratista, se [illegible] Acondicionamiento del campamento de obra, se realiza Acondicionamiento de red hidraulica y se continua con el seguimiento a red electrica e internet para el proyecto.

Clima mañana: Soleada Clima tarde: soleada






R/L Interventoria


MARTES 16 MAYO 2023.

*Personal interventoria: Profesional SST (1), Residente (1), Inspector (7) topografo (1), *Personal Administrativo Obra: residente (1), profesional SST (1) Inspector (1), * personal obra: Oficiales (2) Ayudantes (2) maquinaria ( ). Equipos ( ) sub contratistas ( ).

*Se realizan observaciones de los componentes SST y Ambiental al informe radicado por el contratista de obra, Se radica por parte del contratista el plan de señalización interna para su revisión por parte de la interventoria. El contratista realiza entrega de subsanación de informes semanales observados por la interventoria, Se continua con el seguimiento a la instalación provisional de la red electrica y de internet para el proyecto Durante el dia se presentan lluvias lo cual detienen Actividades programadas

Clima mañana: soleada. Clima tarde: 4 horas de lluvia.





R/L Interventoria.

MIERCOLES 17 MAYO 2023.

*Personal interventoria: Profesional SST (1), Residente (1), Inspector (1)

*Personal Administrativo Obra: Profesional SST (1), Inspector (1), Residente.

*Personal obra: Oficiales (2), Ayudantes (2), maquinaria ( ) Equipos ( )

Se continua con el seguimiento a red provisional electrica y de internet para el proyecto, Se continua con la Adecuación del campamento de obra, Se realiza Comite de obra y se exponen los compromisos pendientes se continua con la revisión del plan de señalización interna entregado por el contratista de obra. la supervisión solicita que el Personal de Obra se encuentre afiliado con riesgo V. Se solicita la entrega del balance de Avance del proyecto,

teniendo en cuenta los no previstos de acuerdo al ajuste de los diseños, se presenta avance de ejecución el cual corresponde al 2% de ejecución.
Clima mañana: 2 horas lluvias Clima tarde: soleada

R/L Interventoria.

JUEVES 18 MAYO 2023,
*Personal Interventoria: Residente (1), Inspector (1), profesional SST (1), topografo (1)
*Personal Administrativo obra: profesional SST (1), Residente (1) inspector (1) Director (1), *Personal Obra: Oficiales (2) Ayudantes (2), maquinaria ( ), equipos ( ) Subcontratistas ( ) * Se continua con la revisión del plan de señalización radicado por el contratista de obra para el proyecto. Se continua con la adecuación del campamento y seguimiento a la red provisional electrica y de internet, Se continua con las subsanación de las observaciones del Acta N°1 y del informe mensual por parte del contratista y la radicación del modificatorio. se presentan lluvias durante el dia, detuvo actividades.
Clima mañana: 3 horas lluvia Clima tarde: soleada.

R/L Interventoria.

VIERNES 19 MAYO 2023
*Personal Interventoria: Profesional sst (1) Residente (1), inspector (1),
*Personal Administrativo obra: profesional sst (1), residente (1) inspector (1).
*Personal obra: Oficiales (2) Ayudantes (2) maquinaria, equipos ( ) sub contratista ( ) * Se realizan observaciones al plan de señalización radicado por el contratista de obra, Se continua con la adecuación del campamento e instalación de provisionales para la red electrica y de internet, se continua con el seguimiento al Ajuste de las observaciones realizadas al Acta N°1 Asi como del modificatorio mañana nublada. NO se detienen Actividades.
Clima mañana: 2 horas lluvia. Clima tarde: soleada

R/L Interventoria
SABADO 20 ABRIL 2023
*Personal Interventoria: Profesional SST (1), Residente (1), Inspector (1), topografo (0) *Personal Administrativo Obra: Residente (1), Inspector (1), Profesional SST (1) *Personal Obra: Oficiales (1), Ayudantes (2), maquinaria, equipos ().
Se Continua con la Adecuación de campamento y se realiza seguimiento a la solicitud de instalación de provisional electrica y de internet para el proyecto, se continua con Ajuste de Acta N° 7 y modificatorio, se revisan Pagos de seguridad social del personal Operativo de obra, se presentan fuertes lluvias lo cual hacen que se detengan Actividades programadas.
Clima mañana: soleada Clima tarde: 4 horas lluvias.

R/L Interventoria.
MARTES 23 MAYO 2023.
*Personal Interventoria: Profesional SST (1), Residente (0), Inspector (0) Topografo (1) * Personal Administrativo Obra: Residente (1) Inspector (1) profesional SST (1) Equipos (1) maquinaria: Sub contratista ()
*Se Continua con la revisión del Ajuste Al Acta N° 7 y el modificatorio Se continua con la adecuación de campamento y se realiza seguimiento altramite para la instalación de la provisional electrica, se revisan planillas de pagos fiscales enviados por el contratista, se recibe informe mensual N° 3 correspondiente al mes de ABRIL. Se presentan lluvias la cual hace que se detengan las Actividades programadas.
Clima mañana: 4 horas lluvia Clima tarde: 2 horas lluvia.

R/L Interventoria.
MIÉRCOLES 24 MAYO 2023.
*Personal Interventoria: Profesional SST (1), Residente (1), Inspector (1)
*Personal Administrativo Obra: Residente (1), Inspector (1) Director (1), profesional SST (1), maquinaria (1), equipos (1) Sub Contratista ().
*Personal Obra: Oficiales (2) Ayudantes (2)
*Se realiza revisión del informe mensual N° 3 del MES de ABRIL

2-75

Entregado por el contratista, se continua con la adecuación de campamento de obra y adecuaciones en la instalación de red provisional electrica, se remite informe de interventoria del mes de ABRIL. se detienen Actividades programadas por fuerte lluvias presentadas en la zona del proyecto.

Clima mañana: 4 horas lluvia Clima tarde: 1 hora lluvia

R/L Interventoria.

JUEVES 25 MAYO 2023.

* Personal interventoria profesional SST(1), Residente(1), Inspector(1), Topografo(1)
* Personal Administrativo Obra: Residente(1), Inspector(1), profesional SST(1)
* Personal Obra: Oficiales (2), Ayudantes (2), maquinaria(1) equipos(1)
* Se Continua con la revisión del informe de subsanacion N°3 correspondiente al mes de Abril, de acuerdo a las observaciones dadas por la interventoria, se mantiene la adecuacion de la zona de transito interna del campamento de obra y se realiza seguimiento a requisitos de instalacion de Acometida Electrica para el frente de obra, se suspenden Actividades programadas por fuertes lluvias

Clima mañana: 4 horas lluvia Clima tarde: 2 horas lluvia

RESIDENTE SST

R/L Interventoria.

VIERNES 26 MAYO 2023

* Personal Interventoria: Profesional SST(1), Residente(1), Inspector(1), director(1)
* Personal Administrativo Obra: Residente(1), Inspector(1), profesional SST(1)
* Personal Obra: Oficiales(2) Ayudantes(2), sub contratistas(1) maquinaria(1) equipos(1)

Se continua revisión de los informes al Ajuste de diseños del proyecto, Así como con la revisión del informe de subsanación del informe mensual N°3 Realizado por la interventoria, se continua con la adecuación de la zona de transito interna del campamento de obra, Se continua con el seguimiento a instalación de provisional para energia Electrica y Adecuación de valla informativa. Se suspenden Actividades por fuertes lluvias en la zona del proyecto.

Clima mañana: 4 horas lluvia Clima tarde: 1 hora lluvia

RESIDENTE SST

R/L Interventoria.
SABADO 27 MAYO 2023.
*Personal Interventoria: Profesional SST (1), Residente (1) Inspector (1)
*Personal Administrativo Obra: Profesional SST (1), Residente (1), Director (1)
*Personal Obra: Oficiales (3), Ayudantes (2) maquinaria (1), Equipos (1).
*Se Continua con la revisión de informe mensual N° 2 y revisión al ajuste del informe de diseño del proyecto, se Verifica la adecuación de Valla informativa y adecuación de campamento de obra, pendiente a la adecuación de provisional de red electrica para el proyecto. hay puertas lluvias que suspenden las actividades en el proyecto
Clima mañana: 4 horas lluvias Clima tarde: 2 horas lluvias

Residente SST

R/L Interventoria
LUNES 29 MAYO 2023.
*Personal Interventoria: profesional (1), Residente (1), Inspector (1) Topografo (1) *Personal Administrativo Obra: Residente (1) Profesional SST (1) *Personal Obra: Oficiales (2), Ayudantes (2), maquinaria (1), Equipos (1) sub contratista ( ).
*Se reciben planillas de pagos del consorcio BS Ingeniería para su revisión, se Continua con el ajuste y revisión del informe mensual de estudios y diseños, se continua con la revisión a las observaciones realizadas al informe mensual del mes de Abril de los componentes SST, Y Ambiental, se realiza seguimiento a la adecuación de campamento e instalación de provisional Electrica la cual esta pendiente por tinel
Clima mañana: Soleada Clima tarde: Soleada

Residente SST

R/L Interventoria.
MARTES 30 MAYO 2023.
*Personal Interventoria: profesional SST (1) Residente (1) Inspector (1) Topografo (1), Director (1) *Personal Administrativo: Obra: Residente (1), Inspector (1) profesional SST (1) *Director (1) *personal Obra: Oficiales (2) Ayudantes (2), maquinaria, Equipos (1) subcontratista ( )

se continua con el ajuste y revisión del informe mensual de ethics y dixies, se continua con la revisión a las observaciones realizadas al informe mensual correspondiente al mes de Abril, por parte de SST y Ambiental se continua con adecuación del campamento como también la instalación provisional Electrica la cual esta pendiente por Enel se detienen actividades por lluvia.
Clima mañana: 2horas lluvia clima tarde: 2horas lluvia.

Residente SS

P/L Interventoria.

MIERCOLES 31 MAYO 2023.

*Personal Interventoria: profesional SST (1), Residente (1), Inspector (1), Asesor (1), Oficial (1)
*Personal Administrativo Obra: Residente (1), profesional (1), Inspector (1) *Personal obra. Oficiales (2), Ayudantes (2), maquinaria (2) Equipos (2), Subcontratistas ( )
*Se continua con la revisión del informe mensual N°3 para subsanación se continua con la adecuación del sendero peatonal interno, se continua a la espera de la instalación de provisional electrica para el proyecto, se suspenden actividades debido a fuertes lluvias en la zona
Clima mañana: 4 horas lluvia clima tarde: 2horas lluvia.

Residente SS

P/L Interventoria.


JUEVES 01 JUNIO 2023.

*Personal Interventoria: profesional SST (1), Inspector (1), Residente (1),
*Personal administrativo Obra: profesional SST (1), Residente (1) Asesor (1)
*Personal Obra: Oficiales (2), Ayudantes (2), subcontratistas ( ), maquinaria (2) Equipos *Se continua con el seguimiento de la instalación provisional Electrica, para el frente de obra, se realiza subsanación al informe N°3 se continua con adecuación del campamento de obra, se suspenden actividades por fuertes lluvias en la zona del proyecto.
Clima mañana: 4 horas lluvias clima tarde: 1 hora lluvia.

Residente SS

INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST).No.4

CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DEATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ

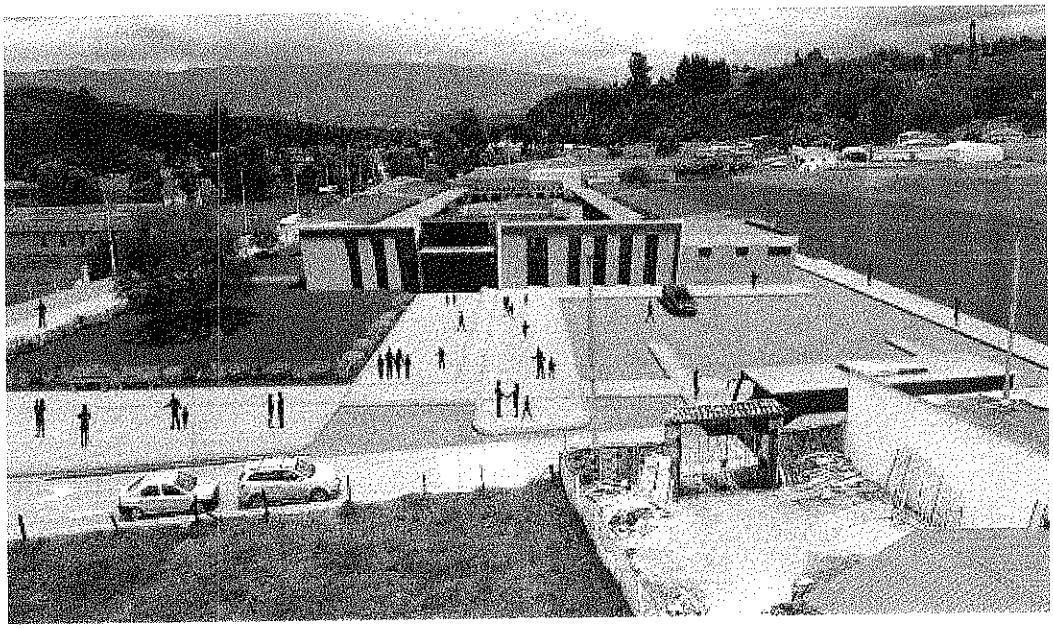

CONSORCIO BS INGENIERIA

INFORME MENSUAL SST DE OBRA

Mayo 2023

CONTENIDO

1. INTRODUCCION
2. OBJECTIVO GENERAL
2.1 OBJECTIVOS ESPECIFICOS
3. ALCANCE
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
5. RESUMEN DE ACTIVIDADES GENERADAS DURANTE EL PERIODO -ACTIVIDADES GENERALES
6. CONTROL Y SEGUIMIENTO SST
6.1 ACTIVIDADES REALIZADAS SST
6.2 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
6.3 EXÁMENES OCUPACIONALES
6.4 NOTIFICACIÓN EXAMEN DE EGRESO
6.5 INGRESO Y RETIRO DEL PERSONAL DEL PROYECTO
6.6 PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL
6.7 COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
6.8 COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL
6.9 GESTIÓN DE EMERGENCIA Y BRIGADA
6.10 ACCIDENTES E INCIDENTES EN OBRA
6.11 INDUCCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RIESGO
6.12 CAPACITACIONES Y CHARLAS SST
6.13 TAREAS DE ALTO RIESGO E INSPECCIONES DE SEGURIDAD
6.14 CERTIFICADOS DE FORMACIÓN TRABAJO EN ALTURAS
6.15 REGISTRO DE INSPECCIÓN Y ENTREGA DE EPP
6.16 INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
6.17 CONTROLES DE APLICACIÓN
7. PAPSO Y SEGUIMIENTO

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene el resumen de las actividades en el área de seguridad y salud en el trabajo realizadas durante el periodo comprendido del mes de mayo del 2023, conforme a lo establecido en los Pliegos de condiciones de seguridad en el contrato de Obra:

CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ

Teniendo en cuenta el compromiso empresarial constante en la promoción de la salud y seguridad en el trabajo y con el fin de mejorar continuamente el bienestar laboral de la población trabajadora con el fin de minimizar los riesgos laborales y de accidentalidad derivados de condiciones peligrosas y actos inseguros, en el presente se describen los objetivos y el resumen mensual de la gestión ejecutada, relacionadas con las actividades del componente de gestión en SST realizadas durante el periodo.

2. OBJETIVO GENERAL

Presentar el informe de gestión mensual en seguridad y salud en el trabajo llevada a cabo dentro del periodo establecido y durante el desarrollo de las actividades en ejecución del proyecto, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales.

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Informar sobre las actividades contempladas en el sistema de gestión y seguridad en el trabajo ejecutadas durante el periodo del mes de mayo del 2023.
- Informar sobre los resultados de la gestión en Seguridad y Salud en el trabajo.

3. ALCANCE

El presente informe contempla las acciones implementadas en materia de seguridad y salud en el trabajo por el CONSORCIO BS INGENERIA y sus subcontratistas.

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El presente proyecto tiene como objetivo: **CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL**

MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ.


5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO ACTIVIDADES GENERALES

Durante el periodo reportado en el presente informe se llevaron a cabo el seguimiento de las siguientes actividades constructivas:


Para cumplir con el objetivo y los alcances del proyecto, durante el periodo de mayo se desarrollaronlas siguientes actividades:


- Toma de niveles topográficos
- Instalación de valla comunicativa del proyecto
- Instalación de cerramiento en poli sombra verde





Se verifica que todos los trabajadores que tienen diferentes funciones en sus puestos de trabajo cumplan con las normas de seguridad y salud en el trabajo, para así evitar que se presenten accidentes de trabajo o enfermedades

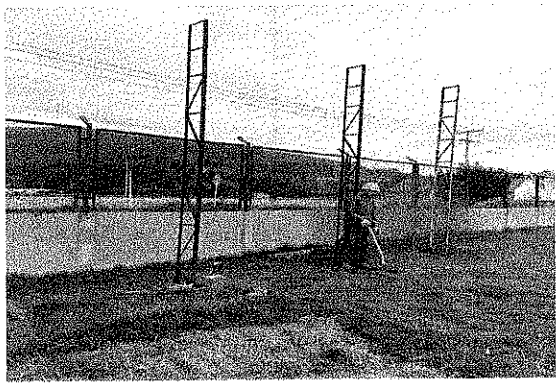





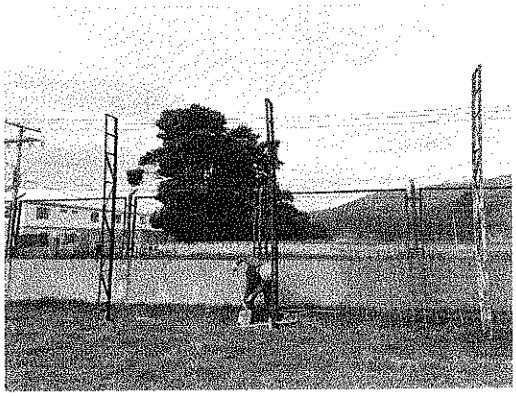

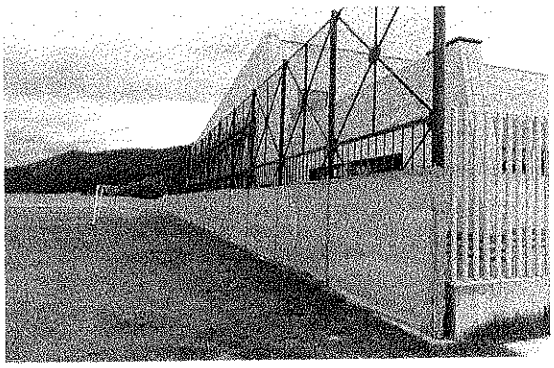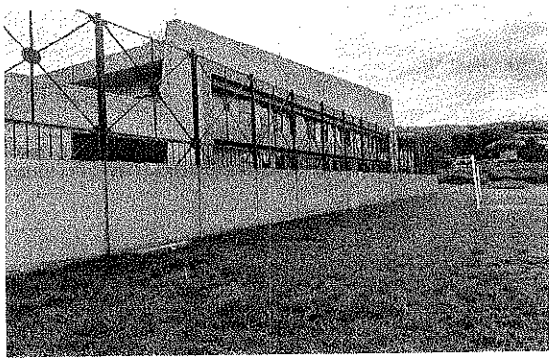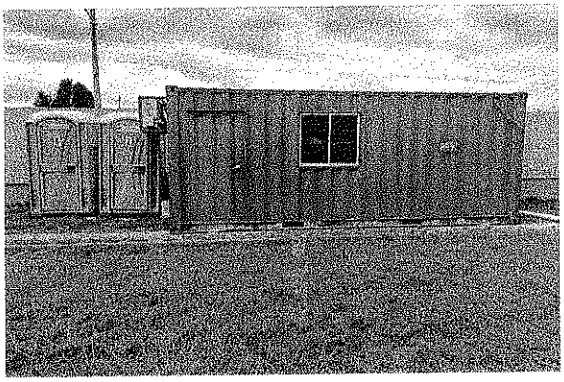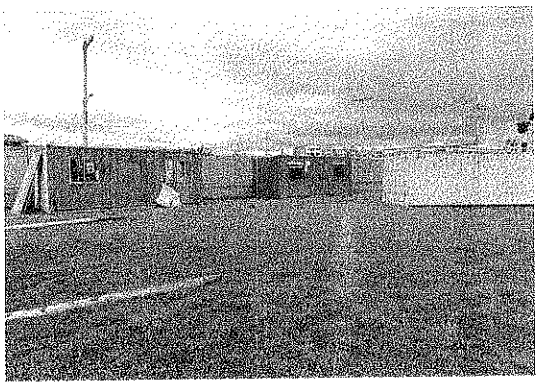





6. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES SST

6.1 Actividades realizadas SST durante el periodo

- **Durante el mes de mayo se realizaron las siguientes actividades:**

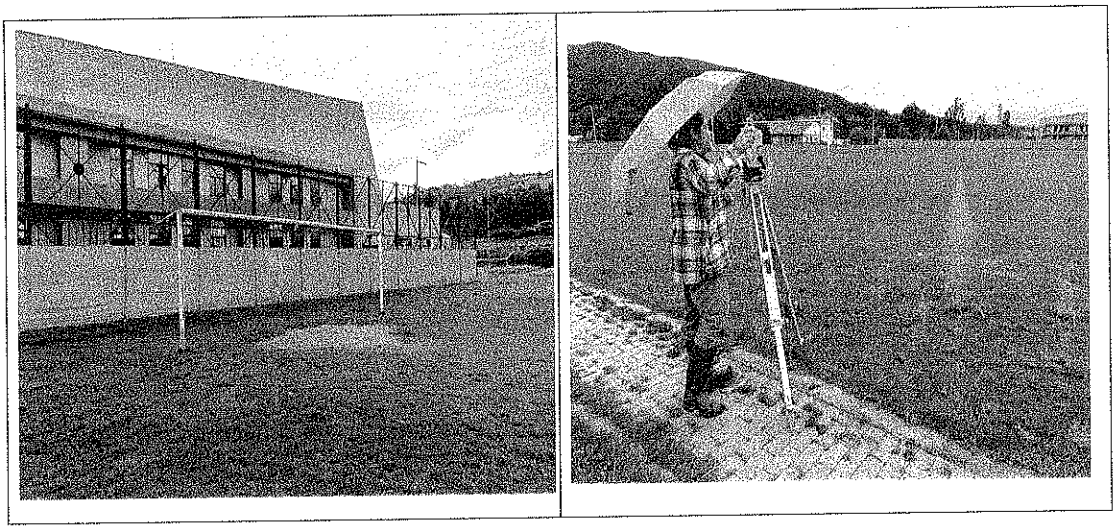- Actividades de cerramiento con poli sombra verde alrededor del proyecto.
- Se instala la vaya informativa del proyecto.
- Se realiza la conformación del COPASST.
- Se realiza la conformación de comité de convivencia laboral.
- Se realiza inspecciones de obra.
- Se realiza entrega de EPP



Anexo 1 Plan de trabajo

6.2 SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Como medida de seguimiento y realizar la verificación de la medición del desempeño del sistema, con el fin de corregir lo que no está funcionando y mejorar lo que ya hacemos bien. El sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene uno de los propósitos más importantes es el de promover la salud y el bienestar de sus empleados.
Pare el mes de mayo se presenta los indicadores

Anexo 2 Indicadores

6.3 EXÁMENES OCUPACIONALES

Todos los trabajadores que se vinculan al proyecto deben pasar por una valoración médica de aptitud laboral de ingreso con énfasis en altura si lo requieren, el cual reposa en la información del trabajador en la oficina SST de la obra en su respectiva AZ. Dichos exámenes son revisados para determinar el personal apto para el cargo. Las fechas detalladas de las evaluaciones médicas ocupacionales de todo el personal. Personal nuevo que ingresó a laborar con los diferentes contratistas.

Para el periodo del mes de mayo se revisan los exámenes ocupacionales del siguiente personal.

N	NOMBRE	CEDULA	CARGO	Contratista
1	Viviana pulgarin García	29674796	Asesor SST	BS ingeniería
2	Garly Guerrero Miranda	19930186	Oficial	BS ingeniería
3	José Alfonso Herrera	86052493	Oficial	BS ingeniería
4	Yilber Vargas	1031135149	Ingeniero Apoyo	BS ingeniería
5	Edilberto Cruz	1106780087	Ingeniero Apoyo	BS ingeniería

Los exámenes ocupacionales de los asesores están en trámite para realizar.

Anexo 3 Exámenes ocupacionales

6.4. NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO

Establece que existe una obligación por parte del empleador al entregar la orden una vez haya finalizado el vínculo laboral para que el trabajador se tome su correspondiente examen dentro de los 5 días siguientes a partir de su retiro.

No obstante, la obligación del mismo se encuentra hasta dicho punto, lo anterior debido a que es voluntad y libre autonomía por parte del trabajador tomarse dicho examen, por lo tanto, se realiza una notificación por parte del empleado.

Para el mes de mayo no se realizaron retiros en obra.

6.5 INGRESO Y RETIROS DEL PERSONAL DEL PROYECTO

El personal que ingresa a laborar en el proyecto se encuentra debidamente afiliado al SGSS (ARL, EPS, AFP) y los aportes de los mismos son verificados mensualmente; información correspondiente como copia de pagos vigentes y/o afiliación se encuentran en la oficina SST de la obra y son remitidos a la interventoría notificando cada ingreso.

285

Control personal obra

NOMBRE	CEDULA	CARGO	ARL	EPS	AFP	FECHA DE EXAMEN MEDICO	FECHA DE CURSO DE ALTURAS	FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA	INDUCCION Y NOTIFICACION DE RIESGO	FECHA DE RETIRO
Garly Guerrero Miranda	19930186	Oficial	Sura	Nueva eps	Porvenir	03-05-23	N/A	05-05-23	Si	Activo
José Alfonso Herrera	86052493	Oficial	Sura	Nueva eps	Colpensiones	02-05-23	N/A	05-05-23	si	Activo
Viviana Pulgarin Garcia	79952110	Asesor SST	Sura	Alian salud	Colpensiones	16-08-22	N/A	Abril	si	Activo
Fabián Bohórquez Lesmes	29674796	Director de Obra	Sura	Sanitas	Porvenir	03-05-23	N/A	Abril	si	Activo
Sandra Milena López Pérez	52716243	Residente De obra	Sura	Compensar	Colpensiones	12-05-23	N/A	05-05-23	si	Activo
Carlos Martínez	1122723202	Licitación	Sura	Sanitas	Colfondos	27-12-22	N/A	Abril	si	Activo
Yilber Vargas	1031135149	Apoyo	sura	Famisanar	Porvenir	12-05-23	N/A	15-05-23	si	Activo
Edilberto Cruz	1106780087	Apoyo	Sura	Compensar	Porvenir	12-05-23	N/A	15-05-23	si	Activo

Asesores

NOMBRE	CEDULA	CARGO	ARL	EPS	AFP	FECHA DE EXAMEN MEDICO	FECHA DE CURSO DE ALTURAS	FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA	INDUCCION Y NOTIFICACION DE RIESGO	FECHA DE RETIRO
Jorge Herrera	10025130	Asesor Estructural	Sura	Aliansalud	Colpensiones	solicitud de realización examen	N/A	Abril	si	Activo
Nelki Buitrago	6422497	Especialista en Redes Eléctricas.	Positiva	Salud total	Colpensiones	Pendiente entrega por solicitud de realización examen	N/A	Abril	si	Activo
Juan Sebastián de Plaza Solórzano	1032359946	Especialista en redes Hidráulicos,	Sura	Sanitas	Porvenir	Pendiente entrega por solicitud de realización examen	N/A	Abril	si	Activo
Oscar Javier Pardo Moreno	12198722	Asesor Geotecnia	Sura	Compensar	Porvenir	Pendiente entrega por solicitud de realización examen	N/A	Abril	si	Activo
Mican herrera Belisario	14252849	Inspector	Sura	Famisanar	Colfondos	Pendiente entrega por solicitud de realización examen	N/A	Abril	si	Activo

Personal nuevo mayo

N	NOMBRE	CEDULA	CARGO	Contratista
1	Viviana Pulgarin	29674796	Asesor SST	BS ingeniería
2	Garly Guerrero Miranda	19930186	Oficial	BS ingeniería
3	José Alfonso Herrera	86052493	Oficial	BS ingeniería
4	Yilber Vargas	1031135149	Ingeniero Apoyo	BS ingeniería
5	Edilberto Cruz	1106780087	Ingeniero Apoyo	BS ingeniería

Anexo 4. Documentación Personal Ingreso nuevo en el mes de mayo

6.6 PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Se valida los últimos dígitos de NIT de planilla de pago, que es el plazo que se tienen para pagar los aportes a seguridad social y aportes parafiscales cuando haya lugar a ellos, que son los siguientes:

Razón (subcontratista)	NIT	Fecha pago Seguridad Social mes mayo
CONSORCIO BS INGENIERIA	901590075	20-05-2023
INGEBYT	830121507	02-05-2023

Anexo 5 Planillas de pago seguridad social
Anexo 6 Control de pagos de seguridad alcaldía
Anexo 7 Documentos contador cumplimiento pago seguridad social.

6.7 COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

De acuerdo a la resolución 2013 de 1986 conformación del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, para el periodo del mes de mayo se realiza la conformación del comité COPASST.

Anexo 8 Conformación del COPASST

6.8 COMITÉ CONVIVENCIA LABORAL:

Comité de convivencia laboral para el periodo del mes de mayo se conforma el comité de convivencia laboral.
Anexo 9 Conformación del comité de convivencia laboral.

6.9 GESTION DE EMERGENCIA ACTIVIDADES DE MANEJO Y BRIGADA

Brigada de emergencia

Para el periodo del mes de mayo, se está realizando el plano 0 para posteriormente realizar la señalización de rutas y puntos de emergencia en obra.

Igualmente, se está adecuando los campamentos y solicitando todo lo necesario para conformar el grupo de brigadista

6.10 ACCIDENTES E INCIDENTES EN OBRA

Para el periodo del mes de mayo no se cuenta con actividades en obra, las actividades realizadas son cerramiento y levantamiento de topografía no se generaron accidente e incidentes en las actividades mencionadas

Consolidado de accidentalidad 2023

Mes	Accidentes
Abril	0
Mayo	0

6.11 INDUCCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RIESGO

Se realiza en el momento que ingresa el personal nuevo a obra está para inicio de actividades estas inducciones se le informa al personal.

- Ubicación de los diverso puntos y frentes de trabajo
- Protocolo de bioseguridad
- Políticas del SG SST
- Reglamento Interno del Trabajo
- Uso adecuado EPP dentro de la obra y respecto a actividades a desarrollar
- Normas de Seguridad Industrial
- Políticas medio ambientales -Manejo de residuos sólidos
- Recomendaciones generales

Inducción personal nuevo

NOMBRE	CEDULA	CONTRATISTA	FECHA DE INGRESO
Viviana Pulgarin	29674796	BS INGENERIA	2-05-23
Garly Guerrero Miranda	19930186	BS INGENERIA	2-05-23
José Alfonso Herrera	86052493	BS INGENERIA	2-05-23

Yilber	1031135149	BS INGENERIA	15 -05-23
Edilberto	1106780087	BS INGENERIA	15 -05-23

Anexo 10 Inducción y notificación de riesgo personal nuevo

6.12 CAPACITACIONES Y CHARLAS SST

Corresponde a aquellos minutos previos al inicio de las labores de cada día, en donde se les brinda información a los trabajadores sobre aspectos relevantes de las actividades a ejecutar o ejecutadas el día anterior con el fin de socializar los procedimientos, informar sobre los posibles cambios en los procedimientos, la planificación de actividades o prevenir acciones que pudieran repercutir en las condiciones de seguridad de la obra o de salud de los trabajadores. Durante este periodo se realizaron las siguientes.

TEMA	FECHA	# de Asistentes
Uso adecuado de EPP	16-05-23	2
Actos inseguros	19-05-23	2

Anexo 11 Charlas SST

CUMPLIMIENTO CON CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES

Para el mes de mayo se realiza las siguientes charlas SST, dando cumplimiento al cronograma de capacitaciones

TEMA	FECHA	# de Asistentes
Riesgo Ergonómico higiene de postura	25-05-23	2
Liderazgo trabajo en equipo	30-05-23	2
