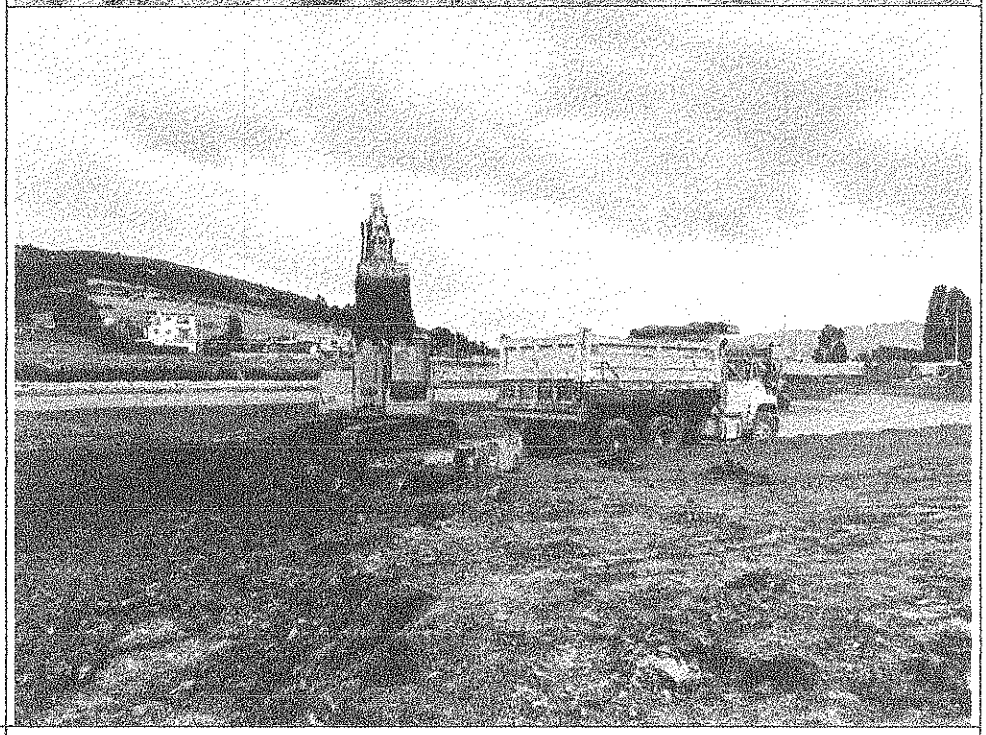
Retiro de sobrantes a botadero autorizado certificado por la CAR.	
	

CONSORCIO
INGENIERÍA
Nit: 901.590.075-0

INFORMES SEMANALES

E-mail: ingebypltda@gmail.com
Cra. 68D No. 25B - 86 Of. 327-3 - Teléfono: 7561194- Cel. 315 295 8783 – Bogotá D.C.

	INFORME SEMANAL DE AVANCE	CODIGO: GIF-019 VERSION: 02 FECHA: MARZO DE 2020

INFORMACIÓN GENERAL

SEMANA No.	20	"CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ"	% AVANCE FÍSICO
FECHA INFORME	10/07/2023	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ"	2,14%
DESDE	3/07/2023		% AVANCE PROGRAMADO
HASTA	9/07/2023		5,00%

CONTRATO DE OBRA	No. 448 MT 2022	VALOR	$ 16.376.116.616,00	PLAZO	18 MESES	FECHA DE INICIO	6/12/2023	FECHA VENCIMIENTO	25/08/2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA	No. 477 MT 2022	VALOR	$ 1.316.604.045,00	PLAZO	19 MESES	FECHA DE INICIO	6/12/2023	FECHA VENCIMIENTO	25/09/2024

CONTROL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
1,00000	AJUSTE A LOS DISEÑOS	UN	1,00	1	100%
1,10001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA 3x5	UN	1,00	1	100%
1,10002	CAMPAMENTO 18 M2	UN	1,00	1	100%
1,10004	DESCAPOTE CON MAQUINA E=0,20M	M2	5877,57	5877,57	100%
1,10005	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	M2	5057,93	0	0%
1,10006	RED ELECTRICA PROVISIONAL L=50M	UN	1	0,5	50%
1,10012	REPLANTEO ESTRUCTURA	M2	780	0	0%
1,10007	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA	M3	183	0	0%
1,10008	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA	M3	1284	1840	143%
2,30001	PROVISIONAL DE OBRA HIDRAULICA Y SUPERVISIÓN PROVISIONAL ALCANTARILLADO SANITARIO	UN	1	0,5	13
2,30038	CERCA EN TELA VERDE H=2,10 M	ML	352,4	352,4	100%
NP-001	DESMONTE Y RETIRO DEL PARQUE BIOSALUDABLE	UN	1	1	100%
NP-002	DESMONTE Y RETIRO DE LA MALLA CONTRAIMPACTO	GLB	56,16	18,16	31%
NP-003	DESMONTE Y RETIRO DE GRAMA EXISTENTE	M2	5448	6504,55	107%
NP-004	FILTRO GEODREN 0,45X0,45 M CON TUBERIA FILTRO DE D=100 mm (incluye geotextil y gravilla, no incluye el retiro	ML	230	0	0%
NP-005	DESMONTE Y RETIRO DE LOS ARCOS DE LA CANCHA DE FUTBOL EXISTENTES	UN	2	2	100%
		TOTAL	5,00%	2,14%	


CONTROL FINANCIERO DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA
(REGISTRE MOVIMIENTOS - PAGOS AUTORIZADOS Y RADICADOS ANTE LA ENTIDAD FIDUCIARIA)

No DE AUTORIZACION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA RADICADO	FECHA PAGO REAL	VALOR BRUTO	DESCUENTOS Y RETENCIONES	PAGO NETO
2023001944	CONSORCIO BS INGENIERIA	AJUSTE A LOS DISEÑOS	13/06/2023	16/06/2023	$ 151.725.000,00	$ -	$ 151.725.000,00
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
				TOTAL	$ 151.725.000,00	$ -	$ 151.725.000,00

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
(TECNICAS, LEGALES, ADMINISTRATIVAS - SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL, GESTION AMBIENTAL, GESTION DE CALIDAD)

Se continua con actividad de excavación para cimentación de bloque A, y el retiro de material hacia centro de disposición final certificado por la CAR, teniendo en cuenta las buenas condiciones climáticas se trabaja en horarios adicionales y fines de semana con el objetivo de mitigar el atraso que actualmente se está presentando.

GRÁFICA DE AVANCE - SEGUIMIENTO SEMANAL

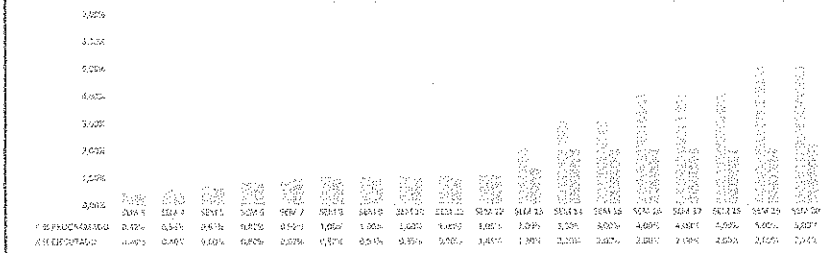

PERIODO	% PROGRAMADO	% EJECUTADO
SEM 3	0,42%	0,40%
SEM 4	0,56%	0,40%
SEM 5	0,67%	0,60%
SEM 6	0,82%	0,80%
SEM 7	0,92%	0,92%
SEM 8	1,00%	0,92%
SEM 9	1,00%	0,94%
SEM 10	1,00%	0,95%
SEM 11	1,00%	0,96%
SEM 12	1,05%	1,05%
SEM 13	2,00%	1,36%
SEM 14	3,00%	2,00%
SEM 15	3,00%	2,00%
SEM 16	4,00%	2,00%
SEM 17	4,00%	2,00%
SEM 18	4,30%	2,00%
SEM 19	5,00%	2,00%
SEM 20	5,00%	2,14%

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Excavación para cimentación




Retiro y traslado de grama existente

RELACIÓN DE PERSONAL Y MAQUINARIA

PERSONAL EN OBRA		EQUIPO EN OBRA	
DIRECTOR	SI	RETRO	SI
RESIDENTE	SI	VOLQUETA	SI
INSPECTOR	1	PILOTEADORA	NO
ASESOR SST	SI	MEZCLADOR	NO
MAESTRO	#	BOMBA CONCRETO	NO
OFICIALES	2	OTROS	SI
AYUDANTES	2		
OTROS	#		

REGISTRO DEL ESTADO DEL TIEMPO (HORAS)

FECHA	LLUVIA	SECO	DETUVO TRABAJOS
3/07/2023	-		NO
4/07/2023	2,00	8,00	SI
5/07/2023	4,00	4,00	SI
6/07/2023	2,00	8,00	SI
7/07/2023	3,00	5,00	SI
8/07/2023	3,00	5,00	SI
	14,00	26,00	



ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA
• Excavaciones varias a máquina sin clasificar (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km). • Localización y replanteo de cimientos con elementos de precisión. • Excavación manual en material común h=0.0-2.0 m (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km). • Retiro de sobrantes a botadero autorizado (incluye cargue).
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA / CONTRATISTA
Se continua con actividad de excavación y retiro de residuos, se tiene previsto dar inicio a las actividades de replanteo con elementos de precisión una vez se tenga instalado el material seleccionado para el relleno, para proceder a excavar de manera manual para los elementos estructurales como zapatas y vigas de cimentación.
ING. FABIAN BOHORQUEZ LESMES DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO BS INGENIENIERIA No. MAT: _____25202-088508_____ ** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMA EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO

INFORME SEMANAL DE AVANCE

CODIGO:	GI-F-012
VERSION:	02
FECHA:	MARZO DE 2023

INFORMACIÓN GENERAL

SEMANA No.	21	"CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCION Y EDUCACION INICIAL EN LA "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ"	% AVANCE FISICO
FECHA INFORME	17/07/2023		2,45%
DESDE	10/07/2023		% AVANCE PROGRAMADO
HASTA	16/07/2023		5,00%

CONTRATO DE OBRA	No. 448 MT 2022	VALOR	$ 16,376,116,616,00	PLAZO	18 MESES	FECHA DE INICIO	6/12/2023	FECHA VENCIMIENTO	25/08/2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA	No. 477 MT 2022	VALOR	$ 1,316,604,045,00	PLAZO	19 MESES	FECHA DE INICIO	6/12/2023	FECHA VENCIMIENTO	25/08/2024

CONTROL DE EJECUCION DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
1,00000	AJUSTE A LOS DISEÑOS	UN	1,00	1	100%
1,10001	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLA INFORMATIVA 3X5	UN	1,00	1	100%
1,10002	CAMPAMENTO 18 M2	UN	1,00	1	100%
1,10004	DESCAPOTE CON MAQUINA E=0,20M	M2	5877,57	5877,57	100%
1,10005	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE OBJIENTOS CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	M2	5057,93	0	0%
1,10006	RED ELECTRICA PROVISIONAL L=50M	UN	1	0,5	50%
1,10012	REPLANTEO ESTRUCTURA	M2	789	0	0%
1,10007	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0,0-2,0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA	M3	161	0	0%
1,10008	EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA	M3	1264	2240	177%
2,30001	PROVISIONAL DE OBRA HIDRAULICA Y SUPERVISION PROVISIONAL ALCANTARILLADO SANITARIO	UN	1	0,5	1%
2,30033	CERCA EN TELA VERDE H=2,10 M	ML	352,4	352,4	100%
NP-001	DESMONTE Y RETIRO DEL PARQUE BIOSALUDABLE	UN	1	1	100%
NP-002	DESMONTE Y RETIRO DE LA MALLA CONTRAIMPACTO	GLB	58,16	18,16	31%
NP-003	DESMONTE Y RETIRO DE GRAMA EXISTENTE	M2	6448	6904,55	107%
NP-004	FILTRO GEODREN 0,45X0,45 M CON TUBERIA FILTRO DE D=160 mm (Incluye geotextil y gravilla, no incluye el re	ML	230	0	0%
NP-005	DESMONTE Y RETIRO DE LOS ARCOS DE LA CANCHA DE FUTBOL EXISTENTES	UN	2	2	100%
		TOTAL	5,00%	2,45%	

CONTROL FINANCIERO DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA

No DE AUTORIZACIÓN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA RADICADO	FECHA PAGO REAL	VALOR BRUTO	DESCUENTOS Y RETENCIONES	PAGO NETO
2023001944	CONSORCIO ES INGENIERIA	AJUSTE A LOS DISEÑOS	13/06/2023	18/06/2023	$ 161,725,000,00	$ -	$ 161,725,000,00
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
				TOTAL	$ 161,725,000,00	$ -	$ 161,725,000,00

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se continua con actividad de excavación para cimentación de bloque A, y el retiro de material hacia centro de disposición final certificado por la CAR, las condiciones climáticas en la zona no son optimas ya que el fin de semana esta lloviendo y no permite los trabajos de los fines de seman para mitigar los atrasos.

GRAFICA DE AVANCE - SEGUIMIENTO SEMANAL




PERIODO	% PROGRAMADO	% EJECUTADO
SEM 4	0,56%	0,40%
SEM 5	0,67%	0,60%
SEM 6	0,82%	0,80%
SEM 7	0,92%	0,92%
SEM 8	1,00%	0,92%
SEM 9	1,00%	0,94%
SEM 10	1,00%	0,95%
SEM 11	1,00%	0,96%
SEM 12	1,05%	1,05%
SEM 13	2,00%	1,80%
SEM 14	3,00%	2,00%
SEM 15	3,00%	3,00%
SEM 16	4,00%	2,00%
SEM 17	4,00%	2,00%
SEM 18	4,00%	2,00%
SEM 19	5,00%	2,00%
SEM 20	5,00%	2,14%
SEM 21	5,00%	2,45%

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



DESMONTE Y RETIRO DE MALLA CONTRAIMPACTO

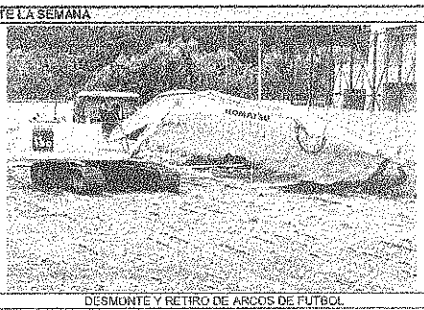

DESMONTE Y RETIRO DE ARCOS DE FUTBOL

RELACIÓN DE PERSONAL Y MAQUINARIA

PERSONAL EN OBRA		EQUIPO EN OBRA	
DIRECTOR	SI	RETRO	SI
RESIDENTE	SI	VOLQUETA	SI
INSPECTOR	1	PILOTEADORA	NO
ASESOR SST	SI	MEZCLADOR	NO
MAESTRO	#	BOMBA CONCRETO	NO
OFICIALES	2	OTROS	SI
AYUDANTES	2		
OTROS	#		

REGISTRO DEL ESTADO DEL TIEMPO (HORAS)

FECHA	LLUVIA	SECO	DETUVO TRABAJOS
10/07/2023	4,00	4,00	SI
11/07/2023	2,00	6,00	SI
12/07/2023	4,00	4,00	NO
13/07/2023	3,00	5,00	SI
14/07/2023	4,00	4,00	SI
15/07/2023	3,00	5,00	SI
	20,00	28,00	



ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

- Excavaciones varias a máquina sin clasificar (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km).
- Localización y replanteo de cimientos con elementos de precisión,
- Excavación manual en material común h=0.0-2.0 m (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km).
- Retiro de sobrantes a botadero autorizado (incluye cargue).
- Demoliciones de placa

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA / CONTRATISTA

Se continua con actividad de excavación y retiro de residuos, se tiene previsto dar inicio a las actividades de replanteo con elementos de precisión una vez se tenga instalado el material seleccionado para el relleno, para proceder a excavar de manera manual para los elementos estructurales como zapatas y vigas de cimentación.

ING. FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO BS INGENIERIA
No. MAT: 25202-068598

** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMA EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO

INFORME SEMANAL DE AVANCE

CODIGO: GIF-018
VERSION: 03
FECHA: JULIO DE 2023

INFORMACION GENERAL

SEMANA No.	22
FECHA INFORME	24/07/2023
DESDE	17/07/2023
HASTA	23/07/2023

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

"CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ"

% AVANCE ACUMULADO
4,60%
% AVANCE SEMANA
1,55%

CONTRATO DE OBRA	No. 448 MT 2022	VALOR	$ 16.376.116.618,00	PLAZO	18 MESES	FECHA DE INICIO	6/12/2023	FECHA VENCIMIENTO	26/08/2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA	No. 477 MT 2022	VALOR	$ 1.316.604.045,00	PLAZO	18 MESES	FECHA DE INICIO	6/12/2023	FECHA VENCIMIENTO	25/09/2024

CONTROL DE EJECUCION DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT	VR. UNITARIO	PROGR.	%	EJECUT.	VALOR EJECUTADO	%
1,00000	AJUSTE A LOS DISEÑOS	UN	1,00	$ 151.725.000,00	1,00	0,93%	1,00	151.725.000	100%
1,10001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA 3x5	UN	1,00	$ 1.800.000,00	1,00	0,01%	1,00	1.800.000	100%
1,10002	CAMPAMENTO 18 M2	UN	1,00	$ 2.149.242,00	1,00	0,01%	1,00	2.149.242	100%
1,10004	DESCAPOTE CON MAQUINA E=0,20M	M2	5877,67	$ 1.836,00	5878,00	0,96%	-	-	0%
1,10005	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRECISION	M2	5057,03	$ 10.304,00	5058,00	0,84%	-	-	0%
1,10006	RED ELECTRICA PROVISIONAL L=50M	UN	1,00	$ 2.866.124,00	1,00	0,02%	0,50	1.433.062	50%
1,10007	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0,0-2,0 M (INCLUYE RETIRO DE	M3	617,83	$ 49.774,00	308,92	0,19%	-	-	0%
1,10008	EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A	M3	2937,42	$ 19.041,00	1517,67	0,34%	2.500,00	47.602.500	165%
1,10012	REPLANTEO ESTRUCTURA	M2	2962,19	$ 4.040,00	1865,00	0,07%	-	-	0%
1,20001	CONCRETO 2500 PSI	M3	43,87	$ 401.058,35	43,87	0,11%	-	-	0%
1,20002	CONCRETO CICLOPEO 2500 PSI, 40% RAJON	M3	97,35	$ 288.935,29	9,74	6,17%	-	-	0%
1,20003	DADOS EN CONCRETO 4000 PSI	M3	12,00	$ 634.144,45	6,00	0,06%	-	-	0%
1,20004	ZAPATAS EN CONCRETO 4000PSI	M3	155,40	$ 837.788,10	2,59	0,78%	-	-	0%
1,20006	ACERO FIGURADO 6000 PSI	KG	25195,01	$ 10.202,40	157,97	1,57%	-	-	0%
1,70053	CANALIZACION EN 4 TUBOS DE 4" (PARA ACOMETIDA EN MEDIA TENSION), ESTA	ML	39,00	$ 386.212,90	39,00	0,09%	-	-	0%
2,30001	PROVISIONAL DE OBRA HIDRAULICA Y SUPERVISION PROVISIONAL ALCANTARILLADO	UN	1,00	$ 3.326.558,00	1,00	0,02%	0,50	1.663.429	50%
2,30002	DEMOLICION ESTRUCTURAS EXISTENTES (PLACAS Y VIGAS)	M2	661,31	$ 519.123,60	133,56	2,06%	251,12	130.359.554	253%
2,30003	CERCA EN TELA VERDE H=2,10 M	ML	352,40	$ 29.329	352,40	0,08%	352,49	10.334.500	100%
2,30004	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H=0,0-2,0M (INCLUYE RETIRO DE	M3	727,52	$ 71.006,65	91,46	0,32%	-	-	0%
NP-001	DESMONTE Y RETIRO DEL PARQUE BIOSALUDABLE	UN	1,00	$ 2.000.000,00	1,00	0,01%	1,00	2.000.000	100%
NP-002	DESMONTE Y RETIRO DE LA MALLA CONTRAIMPACTO	GLB	58,16	$ 400.000,00	58,16	0,14%	18,16	7.264.000	31%
NP-003	DESMONTE Y RETIRO DE GRAMA EXISTENTE	M2	8448,00	$ 6.129,90	8448,00	0,24%	6.904,55	42.317.997	107%
NP-004	FILTRO GEODREN 0,45X0,45 M CON TUBERIA FILTRO DE D=100 mm (incluye geotextil y	ML	230,00	$ 128.976,60	230,00	0,18%	-	-	0%
NP-005	DESMONTE Y RETIRO DE LOS ARCOS DE LA CANCHA DE FUTBOL EXISTENTES	UN	2,00	$ 290.000,00	2,00	0,00%	2,00	580.000	100%
				TOTAL		8,06%			4,60%

CONTROL FINANCIERO DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA

No DE AUTORIZACIÓN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA RADICADO	FECHA PAGO REAL	VALOR BRUTO	DESCUENTOS Y RETENCIONES	PAGO NETO
2023001944	CONSORCIO RS INGENIERIA	AJUSTE A LOS DISEÑOS	13/06/2023	16/06/2023	$ 151.725.000,00	$ 31.684.500,00	$ 120.040.500,00
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
				TOTAL	$ 151.725.000,00	$ 31.684.500,00	$ 120.040.500,00


ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se continua con la actividad de excavación para cimentación de los diferentes bloques, y el retiro de material hacia centro de disposición final certificado por la CAR, se manifiesta que las condiciones climáticas de la zona son de constante lluvia que no permiten un avance idóneo según lo programado.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA***


La interventoría emite informe físico y digital con observaciones del mes de junio para subsanación.
La interventoría esta a la espera de la entrega del informe técnico por parte del especialista en geotecnia para toma de decisiones con respecto al diseño de la ejecución de la cimentación dentro actual actual
La interventoría realiza revisión de planillas de seguridad del personal de obra
La interventoría realiza seguimiento y control de la ejecución de las obras para que se desarrollen con velocidad y aceleración pertinente para evitar retrasos.

GRÁFICA DE AVANCE - SEGUIMIENTO SEMANAL

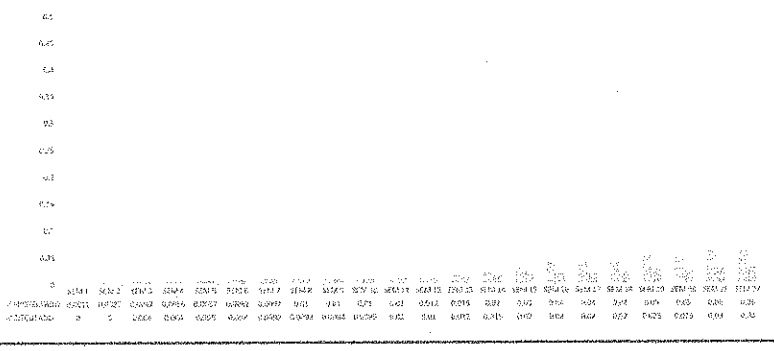


PERIODO	PROYECTADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 1	0,31%	0,00%	0,00%
SEM 2	0,37%	0,00%	0,00%
SEM 3	0,42%	0,40%	0,02%
SEM 4	0,56%	0,40%	0,16%
SEM 5	0,67%	0,60%	0,07%
SEM 6	0,82%	0,80%	0,02%
SEM 7	0,92%	0,92%	0,00%
SEM 8	1,00%	0,92%	0,08%
SEM 9	1,00%	0,84%	0,16%
SEM 10	1,00%	0,95%	0,05%
SEM 11	1,00%	1,00%	0,00%
SEM 12	1,20%	1,00%	0,20%
SEM 13	1,50%	1,20%	0,30%
SEM 14	1,60%	1,50%	0,50%
SEM 15	3,00%	2,60%	1,00%
SEM 16	4,00%	2,60%	2,00%
SEM 17	4,00%	2,60%	2,60%
SEM 18	4,00%	2,00%	2,00%
SEM 19	5,00%	2,50%	2,50%
SEM 20	5,00%	2,50%	2,50%
SEM 21	6,00%	3,00%	3,00%
SEM 22	6,00%	3,00%	3,00%

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



TOMA DE MUESTRAS DE SUELOS

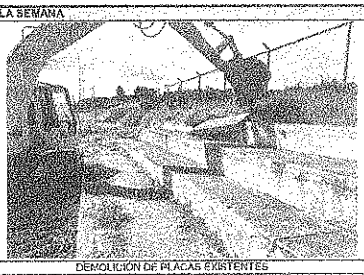

DEMOLICIÓN DE PLACAS EXISTENTES

RELACION DE PERSONAL Y MAQUINARIA				REGISTRO DEL ESTADO DEL TIEMPO (HORAS)			
PERSONAL EN OBRA		EQUIPO EN OBRA		FECHA	LLUVIA	SECO	DETOVO
DIRECTOR	SI	RETRO	SI	17/07/2023	5.00	3.00	SI
RESIDENTE	SI	VOLQUETA	SI	18/07/2023	2.00	6.00	SI
INSPECTOR	1	PILOTEADORA	NO	19/07/2023	2.00	6.00	NO
ASESOR SST	SI	MEZCLADOR	NO	20/07/2023			
MAESTRO	2	BOMBA CONCRETO	NO	21/07/2023	3.00	5.00	NO
OFICIALES	2	OTROS	SI	22/07/2023		8.00	NO
AYUDANTES	2						
OTROS	0				12.00	28.00	

ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

- Excavaciones varias a máquina sin clasificar (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km).
- Localización y replanteo de cimientos con elementos de precisión.
- Excavación manual en material común hasta 2.0 m (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km).
- Retiro de sobrantes a botadero autorizado (incluye cargue).
- Demoliciones de placa

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA / CONTRATISTA

Se continua con actividad de excavación y retiro de material de excavación, se tiene previsto dar inicio a las actividades de replanteo con elementos de precisión una vez se tenga instalado el material seleccionado para el relleno, se trae muestras del material de relleno B-200.

ING. FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO BS INGENIERIA
No. MAT: _____25202-988568_____

* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR COPIA DE LA BITACORA EN LA SEMANA CORRESPONDIENTE
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMA EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** ESTE APARTE SE DILIGENCIA EN CASO QUE EL CONTRATO TENGA INTERVENTORIA

INFORME SEMANAL DE AVANCE

CODIGO: GIF-016
VERSION: 03
FECHA: JULIO DE 2023

INFORMACION GENERAL

SEMANA No.	33	OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	% AVANCE ACUMULADO
FECHA INFORME	31/07/2023		6,82%
DESDE	24/07/2023	"CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ"	% AVANCE SEMANA
HASTA	30/07/2023		0,82%

CONTRATO DE OBRA	No. 448 MT 2022	VALOR	$ 16.378.116.816,00	PLAZO	18 MESES	FECHA DE INICIO	6/12/2023	FECHA VENCIMIENTO	25/08/2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA	No. 477 MT 2022	VALOR	$ 1.316.604.045,00	PLAZO	19 MESES	FECHA DE INICIO	6/12/2023	FECHA VENCIMIENTO	25/09/2024

CONTROL DE EJECUCION DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT	VR. UNITARIO	PROGR.	%	EJECUT.	VALOR EJECUTADO	%
1,00000	AJUSTE A LOS DISEÑOS	UN	1,00	$ 151.725.000,00	1,00	0,93%	1,00	151.725.000	100%
1,10001	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLA INFORMATIVA 3x2	UN	1,00	$ 1.800.000,00	1,00	0,01%	1,00	1.800.000	100%
1,10002	CAMPAMENTO 18 M2	UN	1,00	$ 2.149.242,00	1,00	0,01%	1,00	2.149.242	100%
1,10004	DESCAPOTE CON MAQUINA E=0,20M	M2	5877,57	$ 1.636,00	5878,00	0,00%	-	-	0%
1,10005	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE CIMENTOS CON ELEMENTOS DE PRECISION	M2	5567,38	$ 10.964,00	5568,00	0,34%	-	-	0%
1,10006	RED ELECTRICA PROVISIONAL L=50M	UN	1,00	$ 2.965.124,00	1,00	0,02%	0,50	1.433.062	50%
1,10007	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0,0-2,0 M (INCLUYE RETIRO DE	M3	517,83	$ 48.774,00	432,48	0,13%	-	-	0%
1,10008	EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE	M3	2937,42	$ 19.041,00	1911,41	0,34%	2.820,00	53.695.620	196%
1,10009	REPLANTEO ESTRUCTURA	M2	2962,19	$ 4.046,00	2927,59	0,97%	-	-	0%
1,20001	CONCRETO 3500 PSI	M3	43,87	$ 401.038,35	43,30	0,11%	-	-	0%
1,20002	CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI, 40% RAJON	M3	97,35	$ 288.935,26	58,41	0,17%	-	-	0%
1,20003	DADOS EN CONCRETO 4000 PSI	M3	12,00	$ 834.144,15	4,20	0,06%	-	-	0%
1,20004	ZAPATAS EN CONCRETO 4000PSI	M3	155,40	$ 837.788,10	18,13	0,79%	-	-	0%
1,20058	ACERO FIGURADO 6000 PSI	KG	25185,61	$ 10.202,46	1176,77	1,57%	-	-	0%
1,70053	CANALIZACION EN 4 TUBOS DE 6" (PARA ACOMETIDA EN MEDIA TENSION), ESTA	ML	39,00	$ 369.212,80	39,00	0,09%	-	-	0%
2,30001	PROVISIONAL DE OBRA HIDRAULICA Y SUPERVISION PROVISIONAL ALCANTARILLADO	UN	1,00	$ 3.336.856,00	1,00	0,02%	0,50	1.668.428	50%
2,30028	DEMOLICION ESTRUCTURAS EXISTENTES (PLACAS Y VIGAS)	M2	681,31	$ 519.123,60	135,07	2,06%	261,12	135.553.364	193%
2,30033	CERCA EN TELA VERDE H=2,10 M	ML	352,40	$ 38.326	352,40	0,08%	352,40	10.334.900	100%
2,50044	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H=0,0-2,5M (INCLUYE RETIRO DE	M3	727,55	$ 71.006,65	122,86	0,32%	-	-	0%
NP-001	DESMONTE Y RETIRO DEL PARCHE BIOSALUDABLE	UN	1,00	$ 2.000.000,00	1,00	0,01%	1,00	2.000.000	100%
NP-002	DESMONTE Y RETRO DE LA MALLA CONTRAIMPACTO	GLB	58,16	$ 400.000,00	58,16	0,14%	18,16	7.264.000	31%
NP-003	DESMONTE Y RETIRO DE GRAMA EXISTENTE	M2	6448,00	$ 6.129,00	6448,00	0,24%	6.904,55	42.317.667	107%
NP-004	FILTRO GEODREN 0,45X0,45 M CON TUBERIA FILTRO DE D=100 mm (inclutye geotextil y	ML	230,00	$ 129.976,00	230,00	0,18%	-	-	0%
NP-005	DESMONTE Y RETIRO DE LOS ARCOS DE LA CANCHA DE FUTBOL EXISTENTES	UN	2,00	$ 290.000,00	2,00	0,00%	2,00	580.000	100%
				TOTAL		6,90%			4,82%

CONTROL FINANCIERO DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA

No DE AUTORIZACIÓN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA RADICADO	FECHA PAGO REAL	VALOR BRUTO	DESCUENTOS Y RETENCIONES	PAGO NETO
2023001944	CONSORCIO 6S INGENIERIA	AJUSTE A LOS DISEÑOS	13/06/2023	16/06/2023	$ 151.725.000,00	$ 31.684.500,00	$ 120.040.500,00
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
				TOTAL	$ 151.725.000,00	$ 31.684.500,00	$ 120.040.500,00


ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se continua con la actividad de excavación para la cimentación de los diferentes bloques y el retiro de material hacia centro de disposición final certificado por la CAR, se manifiesta que las condiciones climáticas de la zona son de constante lluvia que no permiten un avance técnico según lo programado.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA**


La interventoria realiza toma de muestras del material de relleno B-200 y B-400.
La interventoria esta a la espera de la entrega del informe técnico por parte del especialista en geotecnia para toma de decisiones con respecto al diseño de la ejecución de la cimentación contra actual actual
La interventoria realiza revisión de planillas de seguridad del personal de obra
La interventoria realiza seguimiento y control de la ejecución de las obras para que se desarrollen con veracidad y aceleración pertinente para evitar retrasos.

GRAFICA DE AVANCE - SEGUIMIENTO SEMANAL




PERIODO	PROYECTADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 1	0,11%	0,00%	0,00%
SEM 2	0,27%	0,00%	0,00%
SEM 3	0,42%	0,40%	0,02%
SEM 4	0,56%	0,40%	0,16%
SEM 5	0,67%	0,60%	0,07%
SEM 6	0,83%	0,80%	0,03%
SEM 7	0,92%	0,92%	0,00%
SEM 8	1,00%	0,92%	0,08%
SEM 9	1,00%	0,92%	0,08%
SEM 10	1,00%	0,95%	0,05%
SEM 11	1,00%	1,00%	0,00%
SEM 12	1,10%	1,00%	0,10%
SEM 13	1,50%	1,20%	0,30%
SEM 14	2,00%	1,50%	0,50%
SEM 15	3,00%	2,00%	1,00%
SEM 16	4,00%	2,00%	2,00%
SEM 17	4,00%	2,00%	2,00%
SEM 18	4,00%	2,00%	2,00%
SEM 19	5,00%	2,50%	2,50%
SEM 20	5,00%	2,50%	2,50%
SEM 21	6,00%	3,00%	3,00%
SEM 22	6,00%	3,00%	3,00%
SEM 23	6,50%	3,82%	1,68%


REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

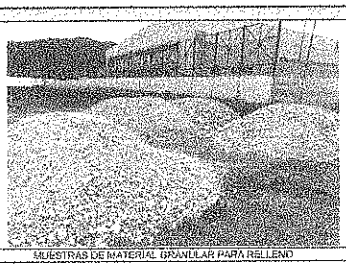


MUESTRAS DE MATERIAL GRANULAR PARA RELLENO



EXCAVACIÓN VARIAS A MAQUINA

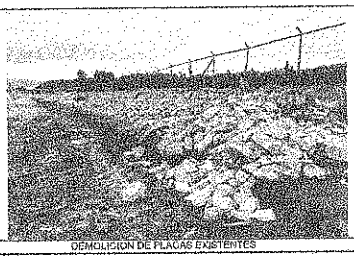

DEMOLICION DE PLACAS EXISTENTES

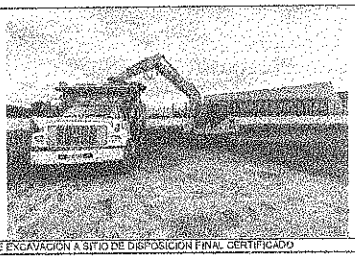

RETIRO DE EXCAVACIÓN A SITIO DE DISPOSICION FINAL CERTIFICADO

RELACIÓN DE PERSONAL Y MAQUINARIA

PERSONAL EN OBRA		EQUIPO EN OBRA	
DIRECTOR	SI	RETRO	SI
RESIDENTE	SI	VOLQUETA	SI
INSPECTOR	1	PILOTEADORA	NO
ASESOR SST	SI	MEZCLADOR	NO
MAESTRO	2	BOMBA CONCRETO	NO
OFICIALES	2	OTROS	SI
AYUDANTES	2		
OTROS	8		

REGISTRO DEL ESTADO DEL TIEMPO (HORAS)

FECHA	LLUVIA	SECO	DETUVO
24/07/2023	3,00	5,00	SI
25/07/2023	1,00	7,00	NO
26/07/2023	-	8,00	NO
27/07/2023	-	8,00	NO
28/07/2023	1,00	7,00	NO
29/07/2023	1,00	8,00	NO
	6,00	41,00	

SELLO DE OBRA

ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

- Excavaciones varias a máquina sin clasificar (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km).
- Localización y replanteo de elementos con elementos de precisión.
- Excavación manual en material común h=0.0-2.0 m (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km).
- Retiro de sobrantes a botadero autorizado (incluye cargue).
- Demoliciones de placa

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA / CONTRATISTA

Se continúa con actividad de excavación y retiro de material de excavación, se tenía previsto dar inicio a las actividades de rellenos con elementos de precisión una vez se tenga instalado el material seleccionado para el relleno, se traen muestras de material de relleno B-20M y B-4M, se llevan a laboratorios certificados para realizar los laboratorios de proctor.

ING. FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO BS INGENIERIA
No. MAT: _____25292-988588_____

* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR COPIA DE LA BITACORA EN LA SEMANA CORRESPONDIENTE
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMA EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** ESTE APARTE SE DILIGENCIA EN CASO QUE EL CONTRATO TENGA INTERVENTORIA

CONSORCIO

INGENIERÍA

Nit: 901.590.075-0

COPIA DE LA CORRESPONDENCIA

E-mail: ingebypltda@gmail.com
Cra. 68D No. 25B - 86 Of. 327-3 - Teléfono: 7561194- Cel. 315 295 8783 – Bogotá D.C.

CONSORCIO
INGENIERÍA
Nit: 901.590.075-0

CORRESPONDENCIA

ENVIADA

E-mail: ingebypltda@gmail.com
Cra. 68D No. 25B - 86 Of. 327-3 - Teléfono: 7561194- Cel. 315 295 8783 – Bogotá D.C.

CONSORCIO
INGENIERÍA

Bogotá D.C., 05 de Julio de 2023

Señor(es)
CONSORCIO STARK
R.L. ING. NATALIE TRISTANCHO CLEVES
Cra 30 #10c-228 Ofi. 629
Ciudad

OFC. No. 448-MT-2022– 0033

REFERENCIA: CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ.

Asunto: BALANCE OBRA

Cordial Saludo,

Por medio de la presente se hace entrega del balance preliminar, adjunto archivo Excel

Gracias por su atención.

Atentamente,

Fabian Bohorquez

ING. Esp – FABIAN BOHÓRQUEZ LESMES.
NIT 901.590.075-0
REPRESENTANTE LEGAL / CONSORCIO BS INGENIERIA
Consecutivo No.0033
Proyectó: FOB
CC Archivo: Johana Pérez
Adjunto 1 Folios

ELABORO

05-07-2023
10:18 AM

Recibido
1093297187

APROBÓ

E-mail: ingebyplтda@gmail.com – Cra 68D No. 25B - 86 Of. 327-3
Teléfono: 7561194— Bogotá D.C.

CONSORCIO
BS
INGENIERÍA

Bogotá D.C., 18 de julio de 2023

Señor(es)
CONSORCIO STARK
R.L. ING. NATALIE TRISTANCHO CLEVES
Cra 30 #10c-228 Ofi. 629
Ciudad

OFICIO No. CTO-448-MT-2022-0034

REF: "CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ".

ASUNTO: INFORME MENSUAL No. 5 del MES DE JUNIO.

Por medio de la presente se radica el informe mensual técnico No. 5 correspondiente al mes de junio de año 2023 referente al contrato No. CTO-448-MT-2022 que tiene por objeto la "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL DE LA VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ".

- Informe Técnico mensual No. 5 correspondiente al mes de junio del año 2023

Quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,

Ing. FABIAN OSWALDO BOHÓRQUEZ LESMES
C.C. 79.952.110 de Bogotá D.C.
DIRECTOR DE OBRA / CONSORCIO BS INGENIERIA
Nit: 901.590.075-0

Adjunto 22 Folios.
CC Ing. Sonia Rodríguez – Apoyo a la Supervisión del Contrato:

JUL 18/2023
12:40 pm

ELABORO

APROBÓ

E-mail: ingebyplтda@gmail.com – Cra 68D No. 25B - 86 Of. 327-3
Teléfono: 7561194– Bogotá D.C.

CONSORCIO
BS
INGENIERÍA

Bogotá D.C., 18 de julio de 2023

Señor(es)
CONSORCIO STARK
R.L. ING. NATALIE TRISTANCHO CLEVES
Cra 30 #10c-228 Ofi. 629
Ciudad

OFICIO No. CTO-448-MT-2022-0035

REF: "CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ".

ASUNTO: INFORME SEMANAL No. 20 Y 21 DE AVANCE DE OBRA.

Por medio de la presente se radica el informe semanal de avance de obra No. 20 y 21 correspondiente al mes de julio de año 2023 referente al contrato No. CTO-448-MT-2022 que tiene por objeto la "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL DE LA VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ".

- Informe semanal de avance de obra No. 20
- Informe semanal de avance de obra No. 21

Quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,

Ing. FABIAN OSWALDO BOHÓRQUEZ LESMES
C.C. 79.952.110 de Bogotá D.C.
DIRECTOR DE OBRA / CONSORCIO BS INGENIERIA
Nit: 901.590.075-0

19/07/2023
12:09pm

Adjunto 31 Folios.
CC Ing. Sonia Rodríguez – Apoyo a la Supervisión del Contrato:

ELABORO

APROBÓ

E-mail: ingebyltda@gmail.com – Cra 68D No. 25B - 86 Of. 327-3
Teléfono: 7561194– Bogotá D.C.

739

CONSORCIO BS INGENIERÍA

Bogotá D.C., 18 de julio de 2023

Señor(es)
CONSORCIO STARK
R.L. ING. NATALIE TRISTANCHO CLEVES
Cra 30 #10c-228 Ofi. 629
Ciudad

OFICIO No. CTO-448-MT-2022-0036

REF: "CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ".

ASUNTO: PLAN DE TRABAJOS DE CIMENTACIÓN.

Por medio de la presente se radica el plan de trabajos de la cimentación referente al contrato No. CTO-448-MT-2022 que tiene por objeto la "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL DE LA VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ".

- Plan de trabajos de la cimentación del proyecto de la referencia

Quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,

Ing. FABIAN OSWALDO BOHÓRQUEZ LESMES
C.C. 79.952.110 de Bogotá D.C.
DIRECTOR DE OBRA / CONSORCIO BS INGENIERIA
Nit: 901.590.075-0

Adjunto 13 Folios.
CC Ing. Sonia Rodríguez – Apoyo a la Supervisión del Contrato:

19/07/2023
12:09 pm

ELABORO

APROBÓ

E-mail: ingebvolida@gmail.com – Cra 68D No. 258 - 86 Of. 327-3
Teléfono: 7561194– Bogotá D.C.

CONSORCIO
BS
INGENIERÍA

Bogotá D.C., 21 de julio de 2023

Señor(es)
CONSORCIO STARK
R.L. ING. NATALIE TRISTANCHO CLEVES
Cra 30 #10c-228 Ofi. 629
Ciudad

OFICIO No. CTO-448-MT-2022-0037

REF: "CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ".

ASUNTO: TITULO MINERO DE RESACA.

Por medio de la presente se radica el Certificado de Registro Minero de la empresa Inversiones y Construcciones el Cerro LTDA (Resaca) mina de la cual se va a realizar la exploración de material para los llenos del contrato No. CTO-448-MT-2022 que tiene por objeto la "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL DE LA VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ".

- Certificado de Registro Minero

Quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,

Ing. FABIAN OSWALDO BOHÓRQUEZ LESMES
C.C. 79.952.110 de Bogotá D.C.
DIRECTOR DE OBRA / CONSORCIO BS INGENIERIA
Nit: 901.590.075-0

Adjunto ___ Folios.
CC Ing. Sonia Rodríguez – Apoyo a la Supervisión del Contrato:

Recibido 21-07-2023 10:20 AM
1098667187

ELABORO

APROBÓ

E-mail: ingebypltda@gmail.com – Cra 68D No. 25B - 86 Of. 327-3
Teléfono: 7561194 – Bogotá D.C.

276

CONSORCIO
BS
INGENIERÍA

Bogotá D.C., 26 de julio de 2023

Señor(es)
CONSORCIO STARK
R.L. ING. NATALIE TRISTANCHO CLEVES
Cra 30 #10c-228 Ofi. 629
Ciudad

OFICIO No. CTO-448-MT-2022-0038

REF: "CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ".

ASUNTO: INFORME SEMANAL No. 22 DE AVANCE DE OBRA.

Por medio de la presente se radica el informe semanal de avance de obra No. 22 correspondiente al mes de julio de año 2023 referente al contrato No. CTO-448-MT-2022 que tiene por objeto la "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL DE LA VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ".

- Informe semanal de avance de obra No. 22

Quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,

Ing. FABIAN OSWALDO BOHÓRQUEZ LESMES
C.C. 79.952.110 de Bogotá D.C.
DIRECTOR DE OBRA / CONSORCIO BS INGENIERIA
Nit: 901.590.075-0

Adjunto ___ Folios.
CC Ing. Sonia Rodríguez – Apoyo a la Supervisión del Contrato:

26-07-2023
12:30 PM.
Recibido
1003297107.

ELABORO

APROBÓ

E-mail: ingebypltda@gmail.com – Cra 68D No. 25B - 86 Of. 327-3
Teléfono: 7561194– Bogotá D.C.

CONSORCIO BS INGENIERÍA

Bogotá D.C., 26 de julio de 2023

Señor(es)
CONSORCIO STARK
R.L. ING. NATALIE TRISTANCHO CLEVES
Cra 30 #10c-228 Ofi. 629
Ciudad

OFICIO No. CTO-448-MT-2022-0039

REF: "CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ".

ASUNTO: SUBSANACIÓN INFORME MENSUAL No. 5 MES DE JUNIO.

Por medio de la presente se subsana las observaciones realizadas al informe mensual No. 5 correspondiente al mes de junio del año 2023 del contrato No. CTO-448-MT-2022 que tiene por objeto la "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL DE LA VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ".

Quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,

Ing. FABIAN OSWALDO BOHÓRQUEZ LESMES
C.C. 79.952.110 de Bogotá D.C.
DIRECTOR DE OBRA / CONSORCIO BS INGENIERIA
Nit: 901.590.075-0

Adjunto ___ Folios.
CC Ing. Sonia Rodríguez – Apoyo a la Supervisión del Contrato:

Recibido. 26-07-2023. 04:30 PM.
1083697107

ELABORO

APROBÓ

E-mail: ingebyoltda@gmail.com – Cra 68D No. 25B - 86 Of. 327-3
Teléfono: 7561194– Bogotá D.C.

739

CONSORCIO BS INGENIERÍA

Bogotá D.C., 29 de julio de 2023

Señor(es)
CONSORCIO STARK
R.L. ING. NATALIE TRISTANCHO CLEVES
Cra 30 #10c-228 Ofi. 629
Ciudad

OFICIO No. CTO-448-MT-2022-0040

REF: "CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ".

ASUNTO: SUBSANACIÓN INFORME MENSUAL SST Y AMBIENTAL DEL MES DE MAYO Y JUNIO.

Por medio de la presente se subsana las observaciones realizadas al informe mensual SST y Ambiental correspondiente a los meses de mayo y junio del año 2023 del contrato No. CTO-448-MT-2022 que tiene por objeto la "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL DE LA VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ".

Quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,

Fabian B Bohorquez L

Ing. FABIAN OSWALDO BOHÓRQUEZ LESMES
C.C. 79.952.110 de Bogotá D.C.
DIRECTOR DE OBRA / CONSORCIO BS INGENIERIA
Nit: 901.590.075-0

Adjunto ___ Folios.
CC Ing. Sonia Rodríguez – Apoyo a la Supervisión del Contrato:

Recibido. 29-07-2023. 02:40 PM.
1083897187

ELABORO

APROBÓ

E-mail: ingebypltda@gmail.com – Cra 68D No. 25B - 86 Of. 327-3
Teléfono: 7561194— Bogotá D.C.

778

CONSORCIO
INGENIERÍA
Nit: 901.590.075-0

CORRESPONDENCIA

RECIBIDA

E-mail: ingebyptda@gmail.com
Cra. 68D No. 25B - 86 Of. 327-3 - Teléfono: 7561194- Cel. 315 295 8783 – Bogotá D.C.

CONSORCIO
STARK
NIT 901.619.583-9

313 809 8624
constark2022@gmail.com
CRA 30 No. 10C – 228 OF 629, Medellín

14 de julio de 2023 **STK-051-2023**

Señores
CONSORCIO BS INGENIERIA
R/L JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES

REF: CTO 477 MT 2022 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ"

ASUNTO: Observaciones entrega componentes SST y Ambiental, Informe mensual mes de junio de 2023, CONTRATO No. CT 448 MT 2022, "CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACION INICIAL VEREDA LA FUENTE".

Por medio de la presente, esta interventoría se permite realizar las siguientes observaciones al informe mensual mes de junio, radicado mediante correo electrónico:

Componente SST

- Ajustar periodo del informe, ya que indica del 1 al 31 de junio de 2023.
- Ajustar el anexo 1. Teniendo en cuenta los indicadores definidos en la resolución 0312 de 2019, así como presentar los indicadores de estructura proceso y resultado definidos para el proyecto dentro del SG-SST. (Ver informe del mes de mayo anexados). Tener en cuenta que la constante K cambió de acuerdo a la resolución 0312 de 2019.
- Ajustar anexo 2 plan de trabajo, dado que no se identifican actividades programadas y ejecutadas para los meses de abril y mayo de 2023. Para el mes de junio justificar por qué se reprograman actividades que debieron ejecutarse durante el mes de junio, teniendo en cuenta que algunas son de cumplimiento de requisitos legales aplicables al proyecto.

780

CONSORCIO
STARK
NIT 901.619.583-9

313 809 8624
constark2022@gmail.com
CRA 30 No. 10C – 228 OF 629, Medellín

- Se tienen las siguientes observaciones referentes a la documentación inicial que debe entregarse del personal que ingresó en el mes de junio, respecto al cumplimiento del SGSST:

Nombre	Cargo	Seguridad Social	Inducción	Notificación de riesgos	Examen medico	Entrega EPP	Certificación tareas de alto riesgo
Einer Rodriguez	Jardinero	No presenta	OK	OK	OK	No presenta	N/A
Nestor Torres	Jardinero	OK	OK	OK	OK	No presenta	N/A
Victor Otalora	Jardinero	OK	OK	OK	OK	No presenta	N/A
Wilmer Suarez	Jardinero	OK	OK	OK	OK	No presenta	N/A
Javier Ortega	Operador de retroexcavadora	OK	OK	OK	No presenta	No presenta	N/A
Liliana Prieto Cruz	Inspector de Obra	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	OK

- En anexo 6. Formato de control de seguridad social se tienen las siguientes observaciones:
- No se registra el personal de jardinería.
- No se registra el pago de seguridad social de los señores Juan Sebastián Solorzaso (Especialista en redes hidráulicas); Oscar Javier Pardo (Asesor en Geotecnia) y Liliana Prieto Cruz (Inspector de Obra), Nelki Buitrago (Especialista en Redes Electricas, voz y datos); Juan Sebastián de Plaza Solórzano (Especialista en redes Hidráulicos, Sanitarias y de Gas), que corresponden a la plantilla mínima requerida para el proyecto.
- Registrar los números de planillas correspondientes al pago de seguridad social
- No se presenta documentación de los siguientes trabajadores de acuerdo a planilla de pago presentada para el consorcio BS Ingeniería:
    - VARGAS ORTIZ YILBER YANIN
    - CRUZ SANTA EDILBERTO

CONSORCIO
STARK
NIT 901.619.583-9

313 809 8624
constark2022@gmail.com
CRA 30 No. 10C – 228 OF 629, Medellín

- Se solicita que se anexe, registro de control de personal del proyecto con toda la información del personal mínimo requerido, así como el de personal de obra, que contenga como mínimo:
    - CONTRATISTA/ SUBCONTRATISTA
    - TIPO DE CONTRATO
    - NOMBRE DEL TRABAJADOR
    - CEDULA
    - EDAD
    - "SEXO F/M"
    - CARGO
    - "FECHA DE INGRESO"
    - "FECHA DE RETIRO"
    - "NOMBRE ARL"
    - CLASE DE RIESGO
    - FECHA AFILIACION
    - "NOMBRE EPS"
    - "NOMBRE AFP"
    - FECHA DE EXAMEN MEDICO DE INGRESO/PERIÓDICO/ EGRESO
    - Concepto de aptitud laboral.

- No se anexa registro de actas de reunión de comité de COPASST y COCOLA.
- No se evidencia conformación de brigada de emergencia.
- Dentro del programa de capacitaciones presentado en el anexo 11. Justificar porque se reprograman algunos temas definidos dentro del plan para el mes de junio.
- No se evidencia registro de entrega de epp que ingresó en el mes de junio. Solo se anexa registro de reposición de EPP del señor Garly Guerrero.
- No se anexa documentos que acrediten el cumplimiento del pago al sistema de seguridad social en salud y pensión, riesgos laborales y parafiscales firmado por contador y/o Revisor fiscal, y/o representante legal Adjuntar copia de Tarjeta profesional del contador y/revisor.

CONSORCIO
STARK
NIT 901.619.583-9

313 809 8624
constark2022@gmail.com
CRA 30 No. 10C – 228 OF 629, Medellín

- Evidenciar de forma estructurada el Manejo de la Seguridad y Salud en el Trabajo implementado en obra, soportado mediante registro fotográfico, de los siguientes subcomponentes:

Políticas de SST, Reglamentos, Políticas de Farmacodependencia, cartelera
Kit de Señalización SST (Uso de EPP, sustancias peligrosas, ruta de evacuación, punto de encuentro y Baños)
Kit de Emergencia (Extintor, camilla rígida, conos reflectivos y botiquín con elementos necesarios)
Reg. Fotográfico de Inspecciones de seguridad realizadas deben ser diferentes en cada informe mensual
Pausas Activas, Punto de hidratación.
Manejo de sustancias peligrosas
Demarcación y señalización de áreas de trabajo / senderos y pasos peatonales.
Registro de implementación de Protocolo de Bioseguridad PAPSO
Demarcación y señalización de maquinaria y vehículos

- Generar conclusiones derivadas del desarrollo e implementación del SG-SST para el proyecto.

Componente Ambiental

- No se anexa Plan de ejecución Ambiental diligenciado con sus respectivos soportes.
- No se anexa Cronograma de Capacitaciones ambientales ejecutado por el contratista. Tener en cuenta lo definido en la ficha de manejo ambiental aprobada que define "Por lo anterior es necesario realizar una (1) charlas y / o capacitaciones ambientales mensual que generen sensibilidad en los trabajadores. Estas se registrarán en el formato FT-ING-02".

CONSORCIO
STARK
NIT 901.619.583-9

313 809 8624
constark2022@gmail.com
CRA 30 No. 10C – 228 OF 629, Medellín

- No se anexa Documentación de la maquinaria y vehículo en obra (SOAT, Tecnomecanica, etc).
- No se anexa el registro de Capacitaciones ambientales
- No se anexa registro de Inspecciones ambientales realizadas, teniendo en cuenta las conclusiones realizadas en el informe y la ejecución de actividades en el proyecto.
- Frente al registro de Indicadores ambientales del mes de ejecución, validar la siguiente información:
    - Ficha 1: Hacer un análisis de cuales son los 5 permisos requeridos y porque solo hay dos tramitados.
    - Ficha 2: Complementar y analizar los indicadores faltantes definidos en el PMA.
    - Ficha 3: Validar indicar referente al presentado en el PMA.
    - Ficha 4: Validar el indicador teniendo en cuenta que se realizarán una capacitación mensual sobre los temas propuestos el programa de capacitación, durante la ejecución del proyecto, estas estarán dirigidas a todos los trabajadores.
    - Ficha 5: Complementar y analizar indicadores anexados en PMA para la ficha.
    - Ficha 6: Validar indicador frente al presentado en PMA.
    - Ficha 9: Complementar indicadores definidos dentro del PMA y sus análisis respectivos.
    - Ficha 12: Complementar con indicador de mantenimiento definido dentro del PMA.
- Evidenciar de forma estructurada Manejo ambiental implementado en obra, soportado mediante registro fotográfico, de los siguientes subcomponentes:

Kit de señalización Ambiental (residuos reciclables, orgánicos y sustancias peligrosas)
Kit para desperdicios sólidos (residuos reciclables, orgánicos y sustancias peligrosas)
Actividades de Orden y Aseo realizadas en el periodo.

789

CONSORCIO
STARK
NIT 901.619.583-9

313 809 8624
constark2022@gmail.com
CRA 30 No. 10C – 228 OF 629, Medellín

Manejo de acopio de escombros
Maquinaria y vehículos usados en obra
Manejo de acopio de materiales
Baños en obra para el uso del personal de obra.

Dado lo anterior esta interventoría solicita que estas observaciones sean subsanadas y entregadas a más tardar el día 19 de julio de 2023.

Agradezco la atención prestada.

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
R.L CONSORCIO STARK

19/7/2023

CONSORCIO
STARK
NIT 901.619.583-9

313 809 8624
constark2022@gmail.com
CRA 30 No. 10C – 228 OF 629, Medellín

18 de julio de 2023 **STK-052-2023**

Señores
CONSORCIO BS INGENIERIA
R/L JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES

REF: CTO 477 MT 2022 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ"

ASUNTO: Solicitud entrega Informe técnico mes de junio

De acuerdo con los temas tratados en el comité de obra No 9, se solicita la entrega urgente del informe técnico de obra correspondiente al mes de junio, se recuerda que el día 13 de abril del presente año en el comité de obra No 2, se acordó con presencia de contratista, interventoría y supervisión la entrega de los informes mensuales el tercer día hábil de cada mes y la entrega de los informes semanales el día lunes de cada semana, el no cumplir con este compromiso obstaculiza el seguimiento por parte de interventoría.

Agradezco la atención prestada

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
R.L CONSORCIO STARK

Rec 18/7/2023

786

CONSORCIO
STARK
NIT 901.619.583-9

313 809 8624
constark2022@gmail.com
CRA 30 No. 10C – 228 OF 629, Medellín

18 de julio de 2023 **STK-053-2023**

Señores
CONSORCIO BS INGENIERIA
R/L JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES

REF: CTO 477 MT 2022 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ"

ASUNTO: Aprobación plan de cimentación

Una vez hecha la revisión del plan de trabajo para la cimentación, se verifica la inclusión de las recomendaciones dadas por el especialista, por lo cual esta interventoría dentro de su alcance da su aval a dicho documento con las siguientes observaciones:

- En el numeral 4.1 "proceso constructivo el nombre del proyecto no corresponde.
- En la descripción del registro fotográfico se nombra "I.E PLAZA LOGISTICA" lo cual no corresponde con el proyecto.

Se solicita que las observaciones anterior mente nombradas sean subsanadas y que se radique el documento de nuevo al correo de interventoría.

Agradezco la atención prestada

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
R.L CONSORCIO STARK

Recibido 19/7/2023

CONSORCIO
STARK
NIT 901.619.583-9

313 809 8624
constark2022@gmail.com
CRA 30 No. 10C – 228 OF 629, Medellín

21 de julio de 2023

STK-055-2023

Señores
CONSORCIO BS INGENIERIA
R/L JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES

REF: CTO 477 MT 2022 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ"

ASUNTO: OBSERVACIONES INFORME MENSUAL JUNIO

Una vez hecha la por parte de la interventoría se realizan las siguientes observaciones.

- En el numeral 8 ASPETOS FINANCIEROS, favor relacionar el valor pagado, concepto y numero de cotización.
- En el numeral 8.2 Donde se relaciona el porcentaje de atraso corresponde al 2.5
- En el numeral 10 Donde se relaciona las conclusiones y recomendaciones. Favor incluir a que **entidad** hace referencia y como también relacionar qué **condiciones** se refiere.

Se solicita que las observaciones anteriormente nombradas sean subsanadas y que se radique el documento de nuevo al correo de interventoría.

Agradezco la atención prestada

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
R.L CONSORCIO STARK

Rec 21/07/2023

CONSORCIO
STARK
NIT 901.619.583-9

313 809 8624
constark2022@gmail.com
CRA 30 No. 10C – 228 OF 629, Medellín

26 de julio de 2023

STK-056-2023

Señores
CONSORCIO BS INGENIERIA
R/L JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES

REF: CTO 477 MT 2022 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ"

ASUNTO: Solicitud de informe del geotecnista.

Teniendo en cuenta lo acordado en el comité de obra N° 10, donde se acordó la entrega del informe de resultados por parte del especialista en geotecnia para el día Martes 24 de Julio la entrega. Esto con el fin de revisar por parte de interventoría los resultados para la toma de decisiones con respecto a la cimentación y la programacion.

Agradezco la atención prestada

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
R.L CONSORCIO STARK

Rec 26/jul/2023


784


CONSORCIO
INGENIERÍA
Nit: 901.590.075-0

COPIA DE LA BITÁCORA

E-mail: ingebypltda@gmail.com
Cra. 68D No. 25B - 86 Of. 327-3 - Teléfono: 7561194- Cel. 315 295 8783 – Bogotá D.C.

Se realiza comité de obra para tratar temas de avance de obra.
Clima mañana: Soleada Clima tarde Soleada







R/L interventoría

JUEVES 29 JUNIO 2023

*Personal interventoría: Residente (1), Inspector (1), Profesional SST (1)
*Personal Administrativo obra: profesional SST (1), Residente (1) Inspector (1)
*Personal Obra: Oficiales (2) Ayudantes (2), maquinaria (2), Equipos (1)
Se continua con actividad de excavación, se realiza retiro de material,
Sigue pendiente la instalación provisional Eléctrica y Alcantarillado
se revisan planillas de seguridad al personal de obra
Clima Mañana: Soleada Clima tarde: Soleada







R/L Interventoría

VIERNES 30 JUNIO 2023

* Personal interventoría: Profesional SST (1), Residente (1), Inspector (1)
Topografo (1), Asesor (1), *Personal Administrativo Obra: Director (1)
Residente (1), profesional SST (1), Inspector (1), *Personal Obra: Oficiales (3)
Ayudantes (2), maquinaria (2), Equipos (1), Sub Contratistas (5)
*Se continua con excavación, se realiza retiro de material, sigue pendiente
la instalación total de PMT y PMA por parte del contratista.
se revisan planillas y documentación del personal de obra, se solicita
Retiro definitivo del proyecto al contratista.
Clima mañana: soleada Clima tarde: Soleada.





R/L interventoría

SABADO 01 JULIO 2023.

*Personal interventoría: Residente (1), Profesional SST (1), Inspector (1)
Asesor (1), Director (1), Topografo (1). * Profesionales Administrativo
Obra: Residente (1), Inspector (1), Profesional SST (1), Director (1).

*personal obra: Oficiales (2), Ayudantes (2), maquinaria (2), Equipos (2). sin contratista (6) * se continua con excavación, se realiza retiro de material sigue pendiente la instalación provisional de Alcantarillado y electrica, se Realiza revisión de documentacion al personal contratista.
Clima mañana: soleada clima tarde: soleada

[signature] [signature] RESIDENTE SST

P/L Interventoria.
MARTES 04 julio 2023
*Personal Interventoria: Profesional SST (1), Inspector (1), Residente (1), Asesor (3)
*personal Administrativo Obra: Residente (1), Inspector (1), Profesional SST (1) director (1)
*personal obra: Oficiales (2), Ayudantes (2), maquinaria (3) Equipos (1).
*Se continua con excavación, se realiza retiro de material se revisa documentación, y subsanación al informe de junio entregado por parte del contratista. sigue pendiente la terminación de la implementación del pmt por parte del Contratista. Sigue pendiente la instalación provisional electrica y Alcantarillado
Clima mañana: 2 horas lluvia clima tarde: soleada

[signature] [signature] RESIDENTE SST

P/L Interventoria:
* MIÉRCOLES 05 JULIO 2023
* personal interventoria: profesional SST (1), Residente (1), topografo (1), Inspector (1) Director (1) * persona Administrativo obra: Residente (1), profesional SST (1) inspector (1), Asesor (1), * personal obra: Oficiales (2), Ayudantes (2), sub contratista (1), maquinaria, (3), equipos (2) *
* Se continua actividades de Retiro y Excavación, sigue pendiente la instalación provisional de Alcantarillado y Electrica, se revisan las observaciones del mes de junio, se revisan planillas de seguridad del personal de obra. se presentan lluvias durante el dia lo cual detiene actividades programadas
Clima mañana: 4 horas lluvia clima tarde: 1 horas lluvia


[signature] [signature] RESIDENTE SST


R/L Interventoria.
JUEVES 06 JULIO 2023.
*Persona Interventoria: Residente (1), Inspector (1), profesional SST (1) Director (1), Topografo (1), Asesor (1) *Persona Administrativo Obra: Residente (1), Inspector (1) Profesional SST (1) director (1) Asesor (1)
*Personal obra: Oficiales (2), Ayudantes (2) maquinaria (3) equipos (1) Sub contratistas ( ) *Se continua con Actividades de excavación con Ayuda de maquina, se realiza retiro de material con ayuda de Volqueta, Aun esta pendiente la instalación provisional electrica y Alcantarillado por parte de los entes encargados
Clima mañana: 2 horas lluvia Clima tarde: soleada

R/L Interventoria.
VIERNES 07 JULIO 2023.
*Personal interventoria: Residente (1), Asesor (1), profesional SST (1), inspector (1), *Personal Administrativo Obra: Residente (1), Inspector (1), Profesional SST (2) Asesor (1) *Persona Obra: Oficiales (2), Ayudantes (2) maquinaria (3), Equipos (1) Sub contratista ( )
*Se continua con excavación con ayuda de retro excavadora se continua con el retiro de material con ayuda de volquetas hacia el botadero, Aun esta pendiente la instalación del Alcantarillado.
Clima mañana = 3 horas lluvias Clima tarde: soleada.

R/L Interventoria.
SABADO 08 JULIO 2023.
*Personal Interventoria: Residente (1), Inspector (1), profesional SST (1) Director (1) Topografo (1) Asesor (1) *Personal administrativo obra Residente (1), Inspector (1) profesional SST (1), *Personal Obra: Oficiales (2), Ayudantes (2), maquinaria (3), Equipos (1) sub contratistas ( ) *se realiza retiro de material, se continua con excavación con maquina, se realiza retiro de parque Biosaludable, se realiza retiro de malla contra impacto, se continua con Actividades de recisión

de los informes mensuales del mes de junio suministrados por el contratista. Como tambien se suspenden actividades por lluvias.
Clima mañana: horas de lluvia Clima tarde: 3 horas lluvia.







R/L Interventoria.

LUNES 10 JULIO 2023.

* Personal interventoria: Residente (1), Inspector (1) Profesional SST (1)
* Personal Administrativo Obra: Residente (1) Inspector (1) Profesional SST (1) Asesor (1). * Personal Obra: Oficiales (2), Ayudantes (2), maquinaria (3) Equipos (2). Sub contratistas (1).
* Se continua con Actividades de excavación, se continua con Actividades de Retiro de material con ayude de Volqueta hacia botadero. se continua con Retiro de parque Biosaludable y malla contra impacto, se Realiza Retiro de arcos como tambien se Realiza retiro de grama. Durante el dia se Presentan intensas lluvias que detienen las actividades.
Clima mañana: 4 horas lluvia clima tarde: soleado.







R/L Interventoria.

MARTES 11 JULIO 2023.

* Personal Interventoria: topografo (1), Residente (1), Asesor (1), Profesional SST (1) Inspector (1), Director (1) * Personal Administrativo obra: Residente (1) Inspector (1) Asesor (1) * Personal Administrativo Obra: Residente (1), Profesional SST (1), Inspector (1), * Personal Obra: Oficiales (2), Ayudantes (2). Sub contratistas (1), maquinaria (3), Equipos (2).
* Se continua con Retiro de grama, Arcos, malla contra impacto como tambien Retiro de parque Biosaludable, Se continua con Actividades de excavación con maquina, Se realiza Retiro de material con Volqueta.
Clima mañana: 2 horas lluvia clima tarde: soleado.





R/L Interventoría.
MIÉRCOLES 12 JULIO 2023.
*Personal Interventoría: Residente (1), Inspector (1), Profesional SST (1), Asesor (1), Topógrafo (1) Director (1) *Personal Administrativo Obra: (1) Residente, Profesional SST (1), Director (1), Asesor (1). * Personal obra: Oficiales (2) Ayudantes (2), maquinaria (3) Equipos (1) Sub contratistas
*Se continua con actividad de excavación con maquina, se realiza Retiro de material hacia botadero, se entrega informes semanales pendientes, Se realizan informe mensual suministrado por el contratista, se realiza retiro de malla contra impacto, se continua con Retiro del Parque Biosaludable
Clima mañana: horas lluvia Clima tarde: soleada

Sandra Lopez Perez
Residente SST

R/L Interventoría.
JUEVES 13 JULIO 2023.
*Personal interventoría: Profesional SST (1), Inspector (1), Residente (1) Asesor (1), *Personal Administrativo Obra: Residente (1), Inspector (1) profesional SST (1), *Personal Obra: Oficiales (3), Ayudantes (2) maquinaria (3), equipos (1) sub contratista ( ).
* Se continua con actividades de excavación con maquina, se continuan con Actividades de Retiro de material con Ayuda de Volquetas, se realiza informe mensual de obra por parte de interventoría.
Clima mañana: Soleada Clima tarde: 3 horas de lluvia.

Sandra Lopez Perez
Residente SST

R/L Interventoría.
VIERNES 14 JULIO 2023.
*Personal interventoría: Residente (1), Inspector (1), profesional SST (1) Asesor (1), Topógrafo (1) director (1), *Personal Administrativo Obra Residente (1), Inspector (1), profesional SST (1). Asesor (1).
*Personal Obra: Oficiales (2), Ayudantes (2), maquinaria (3), Equipos (1)
*Se continua con actividades de excavación con maquina, se continua con actividades de Retiro de material, se realizan apiques

para agilizar visitas del geotecnista, aun esta pendiente la instalación de la provisional de Alcantarillado y Electrica, se presentan lluvias durante el dia lo cual hace que se detengan actividades programadas durante el dia se recisan Observaciones a los informes entregados.
Clima mañana: 4 horas lluvias clima tarde: soleada.

Sandra Lopez Perez
RESIDENTE SS.

2) L INTERVENTORIA:
SABADO 15 JULIO 2023.
* Personal interventoria: Residente(1), Inspector(1), Director(1), Topografo(1), Profesional SST (1), Asesor(1) * Personal administrativo obra: Profesional SST(1) Residente(1), Inspector(1) * Personal obra: Ayudantes(2), Oficiales(2), maquinaria (3), Equipos(1), Sub contratista() * se continua con excavación y retiro de material hacia Botadero, se recisan Planillas de seguridad social del personal contratista se realiza reubicación del parque Biosaludable y malla contra impacto. Aun esta pendiente la instalación provisional de Alcantarillado y Electrica. se suspenden actividades por lluvias en la zona
Clima mañana: 3 horas lluvia clima tarde: soleada

Sandra Lopez Perez
RESIDENTE SS

P/L INTERVENTORIA:
LUNES 17 JULIO 2023.
* Personal interventoria: Residente(1) Inspector(1) Profesional SST(1),
* Personal Administrativo Obra: Residente (1), Inspector (1), Profesional SST(1)
* Personal Obra: Oficiales(2), Ayudantes(2), maquinaria(3), Equipos (1) subcontratista()
* se continua con Actividades programadas de excavacion, se continuan con retiro de material con ayuda de Volqueta hacia el botadero Autorizado. se termina de Retirar y adecuar el parque Biosaludable y la malla contra impacto se suspenden Actividades programadas durante el dia ya que se presentan fuertes lluvias en la zona donde se ejecuta el proyecto.
Clima mañana: 4 horas lluvia clima tarde: soleada.

Sandra Lopez Perez
RESIDENTE SS

796

4/4 Intervventoria:

18 JULIO 2023. MARTES.

Personal intervventoria: Residente(1), Inspector(1), Profesional SST(1) topógrafo(1), director(1) # Personal Administrativo Obra: Residente(1), inspector(2) profesional SST(1) # Personal Obra: Oficiales (2), Ayudantes (2), maquinaria 3 equipos(1) Sub contratista ( ). # Se espera visita Geotecnista

SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE EXCAVACION CON AGUDA DE RETRO OBRIGADA, COMO TAMBIEN SE CONTINUA CON EL RETIRO DEL MATERIAL CON AGUDA DE VOLQUETA. SE COORDINA VISITA POR SEGUNDA VEZ PARA EL DIA SIGUIENTE PARA REALIZAR PRUEBAS DE COMPACTACION Y TOMA DE DENSIDADES PARA TOMA DE DECISIONES. SE RADICA OFICIO STK-054 CON OBSERVACIONES AL CONTRATISTA

CLIMA MAÑANA: 4 HORAS LLUVIAS. · CLIMA TARDE.

El día de hoy se realizó visita por parte del Especialista en Geotecnia por parte del constructor, donde se verificó el perfil estratigráfico mediante apiques realizados en el sitio. Se evidencia que el perfil es congruente con lo que aparece en el estudio de suelos, sin embargo, se hace la anotación que los espesores difieren significativamente sobre todo en la capa orgánica, evidenciándose capas hasta de 80 cm hasta el contacto con el limo arcilloso de color marrón oscuro.

El día de mañana 19 de Julio del presente año se realizaran toma de muestras sobre el material inorgánico con el fin de presentar propuesta de mejoramiento de la placa de contrapeso dado que los espesores que se recomiendan en los diseños difieren en algunos centímetros con respecto a lo que se evidencia en terreno.

Asimismo, se realizará propuesta de mejoramiento de cimentación superficial asociado tanto a la empradización inicial que se encuentra en contrato ciclópeo como la estabilización dinámica con el fin de reducir tiempos en obra.

Ing. Oscar J. Pinzón M.
Esp en Geotecnia Vial

R/L interventoria

MIERCOLES 19 JULIO 2023.

Personal interventoria: Residente (1), Inspector (1), Residente (1), topografo (1) profesional SST (1), # personal Administrativo obra: Residente (1) Inspector (1) profesional SST (1) # personal Obra: Oficiales (2) Ayudantes (2) maquinaria (3), equipos (1)

siguen Actividades de excavación y Retiro de material con ayuda de Retro y Volqueta, la interventoria Revisa informes semanales suministrados por el contratista como tambien revisa documentación del personal en Obra

Clima mañana: 3 horas lluvia clima tarde: soleada.

R/L interventoria.

VIERNES 21 JULIO 2023.

#personal interventoria: Residente (1), Inspector (1), Profesional SST (1) Asesor (1) Director (1) # personal Administrativo Obra: Residente (1), Inspector (1) Asesor (1) profesional SST (1) # personal obra: Oficiales (2), Ayudantes (2) maquinaria (3), equipos (1), subcontratistas ( ).

Se continua la espera de la instalación provisional de Alcantarillado. Se continuan Actividades de excavación con maquina Orugada, se continuan Actividades de Retiro de materia con Ayuda de Volqueta hacia botadero Autorizado, la interventoria realiza subsanación del informe mensual correspondiente al mes de junio, Temporalmente se suspenden Actividades por lluvias en la zona del proyecto

Clima mañana: 3 horas lluvia clima tarde: soleada.

R/L Interventoria.

SABADO 22 JULIO 2023.

Personal Interventoria: profesional SST (1), Residente (1), Inspector (1), topografo (1), Asesor (1), personal Administrativo Obra: Residente (1) Inspector (1), profesional SST (1), Director (1) # personal obra: Oficiales (2) Ayudantes (2), maquinaria (3), equipos (1), sub contratista (2) # se continua con #actividades programadas como Retiro de material

con Ayuda de Vibroplaca y vía batadero autorizado, se continua con excavación con Ayuda de Retro Cargada, Aun está pendiente por instalación la provisional de alcantarillado por parte de la Empresa de servicios públicos de Tocancipa, como también la provisional Electrica por parte de ente encargado Enel
Clima mañana: Soleada clima tarde: Soleada.

Residentes.

R/L Interventoria.
LUNES 24 JULIO 2023.
#Personal interventoria: Residente(1), Inspector(1), Topografo(1), profesional SST (1), Asesor (1), #Personal Administrativo Obra: Residente (1) Inspector(1) profesional SST(1), # Personal Obra: Oficiales (2) Ayudantes (2) maquinaria (3) equipos (1), Sub contratistas (2) # se continua con Actividades de excavación y retiro de material hacia batadero, la interventoria esta a la espera de la entrega de los resultados por parte del asesor en geotecia para toma de decisiones relacionadas a la cimentación, se suspenden temporalmente las Actividades programadas por fuertes lluvias en la zona
Clima mañana: 3 horas lluvia. clima tarde: soleada.

Residentes.

R/L interventoria.
MARTES 25 JULIO 2023.
#Personal Interventoria: Residente (1) Inspector(1), profesional SST(1), Asesor (1) Director (1), #Personal Administrativo Obra: Residente (1) Inspector(1), profesional SST (1), Asesor (1), #Personal Obra: Oficiales (2) Ayudantes (2), maquinaria (3), equipos (1) sub contratista (2) # Se Continua con Actividades de excavación, se continua con Actividades de Retiro de material hacia batadero autorizado
Clima mañana: Soleada clima tarde: 1 hora lluvia

Residentes.

R/L Interventoria.
MIÉRCOLES 26 JULIO 2023.
*Personal Interventoria: Residente(1) Inspector(1), Profesional SST(1) Topografo(1), Asesor(1) *Personal Administrativo Obra: Residente(1) Inspector(1), Profesional SST(1) *Personal Obra: Ayudantes(2). Oficiales(2), maquinaria(3), Equipos(1) Sub contratista (2).
* Se continua con retiro de material hacia botadero, se continua con actividad de excavación. Se espera visita del Asesor Especialista en Geotecnia por parte de interventoria para realizar recorrido en Area excavada, y con ella tomar decisiones con respecto a la excavación, esto Con el Fin de analizar los Estudios iniciales de la cimentacion.
Cima mañana: 2060.5 Cima tarde: 2060.5

Daniel Diaz Pinto
Residente SS.

R/L Interventoria
JUEVES 27 JULIO 2023
*Personal Interventoria: Residente(1) Inspector(1), Profesional SST(1) Director(1) Asesor(1). * Personal Administrativo Obra: Residente(1) Inspector(2) profesional SST(1). *Personal obra: Oficiales(2), Ayudantes(3) maquinaria(3). Equipos(1) sub contratistas(2) *Se continua con Actividades de excavación con Ayuda de Volqueta hacia botadero, se continua con Actividad de excavación con Ayuda de Retro Orugada
023 Se realiza visita Tecnica Geotecnia Estructuras. Se realiza recorrido a la obra. Se aprecia que los materiales concuerdan con lo encontrado en el estudio geotecnico. En algunos Sectores Sobre la cota que corresponde a Zapatas, hay un mayor espesor en organica. Se recomienda el mismo nivel de desplante -1.05 metros a este nivel se dispone capa de 0.5 espesor de 2cm. Encima grava gruesa. Se compacta bien. Al finalizar el grava se repite hasta que el material no permita mas hincado. Se nivela con Concreto pobre y se dispone la zapata para las zonas de excavacion mayores, se retira material organica sobre mayor, se dispone capa con 800

Vibro compactador. Se aclara que el mejoramiento de las zapatas se hace con compactador de pato (canguro). El material de sub compactado para mejoramiento se llama SBC-B o similar en espesores de 10 cm. La piedra de los gaviones puede ser empleada para mejoramiento. La subbase que se encuentra en obra no sirve, el material puesto no puede ser superior a 3 pulgadas o a 5 pulgadas. No puede tener contenido de rocas foliadas ni anfibolitas o lutitas grises. como se encontro.



Luis Felipe Carrillo
Coetecma Estructuras.

#Con tramando con las Actividades llega material para toma de muestras B-200 y B-400 para caracterización por parte del laboratorio de la interventoria esto con el fin de continuar con retiro Autoridad programad
Clima mañana: soleada Clima tarde: soleada.

Daniela Lopez Perez
RESIDENTE SST

#1 Interventoria: VIERNES 28 JULIO 2023.
#personas interventoria: Residente (1), inspector (1), profesional SST (1)
topografo (1), Asesor (1) # Personal Administrativo cliente: Residente (1)

Inspectal (2), Asesor (1) profesional SST (1) Director (1)
personal obra: Oficiales (2), Ayudante (2), maquinaria (3)
Equipos (1) sub contratista (2).
Continuando con Actividades llega material para toma de muestras para caracterización por parte del laboratorio de. Obra e interventoria, se continua con actividad de excavación con ayuda de Retro cargador, Se realizo retiro de material para cisco por parte del ente Ambiental Realizo petición para la Alcaldia de recaudo Se espera respuesta de granulometria de las muestras tomadas.
clima mañana: soleada clima tarde: 1 hora lluvia.

RESIDENTE SS.

R/L interventoria

SABADO 29 julio 2023
* Personal interventoria: Residentes (1), Inspector (1) profesional SST (1)
Asesor (1) Topografo (1) # personal Administrativo Obra: Residente (1)
inspector (1) profesional SST (1) Asesor (1). # personal Obra: Oficiales (2)
Ayudantes (2) sub contratistas, maquinaria (3), Equipos (1).
Continuando con las actividades se continua con actividades de excavación, se continua con Retiro de materia hacia botadero autorizado.
como también se realiza Retiro de material hacia el cisco ubicado en tocancipa "petición Realizo por parte del ente Ambiental de la Alcaldia.
Clima mañana: soleada clima tarde: soleada

RESIDENTE SS

R/L Interventoria.

LUNES 31 JULIO 2023.
Personal interventoria: Residente (1) inspector (1) profesional SST (1)
Asesor (1) Director (1) # personal Administrativo Obra: Residente (1)
Inspector (1) profesional SST (1) # personal obra: Oficiales (2) Maestro (1)
Ayudantes (3), maquinaria (3), equipos (1), sub contratistas (2).
Según actividades programadas se espera visita del "Asesor" Especialista en geotecnia por parte del contratista para revisar

Fecha de excavación, la cual está en curso por parte de obra

Se realiza visita de asesor en geotecnia del consorcio Stark, Ing Juan Carlos Ruge dejando las siguientes observaciones:

1. Se procede a hacer un apique con la maquinaria en el costado nor occidental del predio por información previa, se conoce que la materia organica llega a una profundidad de 2m. Se propone bajar hasta 2,5m con el fin de verificar si se encuentra un estrato de mejor competencia portante. En caso de no encontrarlo, se acoje la propuesta del geotecnista de obra, de relleno con el material de demolición de concreto y garras hasta que el suelo de fundación se estabilice.

De igual manera en la esquina nor-occidental se observa en superficie una posible filtración de origen desconocido, como se encuentra en el límite del lote se espera que el filtro permanente que será construido en la obra mejore estas condiciones de saturación puntual en el terreno.

Se levanta el apique descrito a 2,5 m de profundidad donde se encuentra un material de arcilla arenosa gris con presencia de vetas amarillas de arena fina, consistencia media, humedad alto y plasticidad alto. Sobre este material se puede emplear el material sumido al bajar recetado de las garras.

Mg. Juan Carlos Ruge
Esp en Geotecnia

Clima mañana: soleado Clima mañana: 1 hora lluvia

RESIDENTE BS.

P/E Interventoria

01 AGOSTO 2023 MARTES.

*Personal Interventoria: Residente (1) INSPECTOR (1) Profesional SST (1), Asesor (1) Topografo (1), *Personal Administrativo Obra: Profesional SST (1), Asesor (1). Inspector (1) Residente (1) *Personal obra: maestro (1), Oficiales (3) ayudante (2) maquinaria (3) Equipos (1) * Continuando con las actividades programadas se toman muestras para caracterización por parte de interventoria, Esto con el fin de dar continuidad del Relleno con material granular, se continua con excavación con maquina, como también se realiza retiro de material con ayuda de vasqueta, la interventoria recomienda al contratista que el material que se encuentra en sitio debe cumplir con las caracteristicas y especificaciones tecnicas para poder continuar con la actividad de llenos y compactación esto con el fin de acatar las Recomendaciones dadas por parte del Asesor especialista en geotecnia de la interventoria se indica que de no cumplir con dichas caracteristicas "El contratista debera levantar todo el material que se esta compactando sin indicación al costo total del proyecto ya que es bajo su responsabilidad", El dia de hoy se encontró actividad de instalación de poste transformador Electrico y red de energia "Acometida provisional electrica" para la cual la interventoria solicita los permisos para izaje de cargas y formas de trabajo en Alturas con los debidos Soportes, para lo cual no se presentan por parte del contratista de obra, de tal forma que no se puede verificar la operación y se procede a suspender esta actividad dado que no cuenta con la operación y documentación suficiente que avale el desarrollo de esta actividad. De igual forma se solicita que se mantengan los registros de los precoperacionales de las maquinas que actualmente se encuentran en operación "Retroexcavadora, bortcat, y Vibrocompactador, dado que al verificar no se encontraron los mismos, La interventoria solicita mayor aplicación de estas inspecciones, para asegurar la integridad operacional de los equipos, Se solicita que se realice mantenimiento a los baños portables dado que desde la semana pasada se evidencian sucios y no se Soporta el registro de aseo de los mismos.

Clima mañana: 2 horas lluvia clima tarde: soleado.

R/L Interventoria.

MIERCOLES 02 AGOSTO 2023.

Personal interventoria. Residente(1) Inspector(1) Profesional SST(1) Asesor(1) Topografia(1) Director(1) % Personal Administrativo Obra: Residente(1) Inspector(1) Residente(1) Profesional SST(1). MAESTRO (1) %personal obra: Oficiales(2) Ayudantes(3) maestro(1) maquinaria(3) equipos(1) subcontratistas (2) % se continua con actividades de Relleno y compactación con Vibro compactador, Continuando con las actividades llega material para avaluación por parte del laboratorio de interventoria, se realiza control de obra Nº 12 donde se toman temas de avance de obra, en cuanto lo programado es de 6.5% y lo ejecutado es de 4.5 lo cual da un atraso del 2%, se continua con Actividad de instalación provisional electrica suspendida el dia Anterior.

Clima mañana: 1 hora lluvia Clima tarde: Soleado.

R/L Interventoria.

JUEVES 03 AGOSTO 2023.

Personal Interventoria: Residente(1), Inspector(1) Profesional SST(1) Asesor(1), Director(1) % personal administrativo obra: Residente(1) Inspector(1) Profesional SST(1), % personal obra: Oficiales(2) maquinaria() Ayudantes(3), maestro(1) % se continua con actividades de excavación y retiro de material hasta nivel Autorizado, luego de esto se realiza retiro de material y se realiza relleno del mismo con material en sitio "material de gaviones ubicado en graderia siguiendo recomendación del geotecnista" el material que llega para llenos presenta material grandes lajoso el cual no cumple las especificaciones tecnicas dadas por el especialista de la interventoria, dichas lajas deben ser retiradas en su totalidad posteriormente se le recuerda al contratista que de no cumplir el material debera ser retirado en su totalidad bajo la responsabilidad del contratista y sin ningun costo adicional al contrato, por otra parte segun los resultados arrojados

para coordinación no cumplen para B-100 y B-400, se espera toma de decisiones por parte de los especialistas en geotecnia de obra e interventoría. Clima mañana: 7 horas lluvias clima tarde soleado.

Residente BS.

R/I Interventoría

VIERNES 04 AGOSTO 2023.

*Personal interventoría: Residente (1) inspector (3) profesional SST (1) topografía (2)
*Personal Administrativo Obra: profesional SST (1) inspector (2) Residente (2) Maestro (1)
*Personal Obra: maestro (1), Oficiales (2), Ayudantes (3), maquinaria (3)
Equipos (1) Sub contratista (2) *se continua con actividades de excavación y retiro de material hacia botaderos, se emite oficio SPIC N° 57 para toma de decisiones con respecto a los resultados suministrados por parte del laboratorio de interventoría, a la fecha el contratista no de resultados de caracterización por parte del laboratorio de ellos, se continua con actividad de tiros y compactación del material de relleno (en un espesor de 30cm compactado) se recomienda que debe ser capas no mayor a 15cm y paralelamente compactar. Clima mañana: se presentan lluvias durante la madrugada anterior clima tarde: 2 horas lluvia

Residente SS.

R/I Interventoría

SABADO 05 AGOSTO 2023

*personal interventoría: Inspector (2) Residente (1) profesional SST (1) Asesor (1)
*personal administrativo obra: Residente (1) Inspector (2), profesional (1) Asesor (2) Director (1) *personal Obra: maestro (1), Oficiales (2) Ayudantes (3) maquinaria (3) equipos (1). * se suspenden actividades de excavación debido a las fuertes lluvias que se presentan en la hora 10:30 PM como también se suspende el retiro de material debido a las lluvias presentadas las cuales hicieron que los botaderos no reciben material

Clima mañana: 2 horas lluvias clima tarde. soleada.

Residente BS.

F/L interventoria.
MARTES 08 AGOSTO 2023
Personal interventoria. Residente(1) Inspector(2), profesional SST(1) Asesor(1) topografo(1) Director(1). # Personal administrativo obra: residente(1) asesor(1) inspector(1) profesional SST(1) # personal administrativo obra: maestro(1) oficiales(2) Ayudantes(3) maquinaria(3) equipos(1).
Se continua con actividades de excavacion con maquina, se continuan con actividades de retiro de material con Ayuda de Volqueta hacia botadero. Durante la mañana se realizan toma de densidad del material compactado por parte del laboratorio de interventoria, se esperan resultados por parte del laboratorio, se continua con alistado del terreno mediante compactacion con Vibrocompactador. Se toman muestras de material de relleno para determinar su granulometria por parte de interventoria. Durante el dia se presentan lluvias en la zona lo cual hace que se suspenden actividades momentaneamente.
Clima mañana: 3 horas lluvia Clima tarde: soleado.

F/L interventoria
MIÉRCOLES 09 AGOSTO 2023.
Personal interventoria: Residente(1) profesional SST(1) inspector(1) director(1) Asesor(1) # personal Administrativo Obra: Residente(1) profesional SST(1) inspector(1) # personal Obra: maestro(1) Oficiales(2) Ayudantes(3) maquinaria(3) Equipos(1) # se continua con actividades de relleno con recebo, se continua tambien con actividades de excavación y Retiro de material hacia botadero, en horas de la mañana se realiza Recorrido con personal de medio Ambiente Visita programada por parte de supervision para hacer temas del Vertido existente sobre la vía, se presentan fuertes lluvias durante el dia lo cual hace que se suspenden actividades, se émite OFICIO con observación al informe del mes de julio entregado por el contratista
Clima mañana: Horas lluvia Clima tarde: Soleado.

F/L Interventoria.
JUEVES 10 AGOSTO 2023.

* Personal Interventoria: Residente (1) Inspector (1) Asesor (1) profesional SST (1)
* Personal Administrativo obra: Residente (1) Inspector (1) Profesional SST (1)
* Personal obra: maestro (1) Oficiales (2) Ayudantes (3) maquinaria (3) Equipos (1) Sub contratistas (7) * se continuan Actividades de Relleno y Ajustado del terreno para continuar con Actividades programadas de cimentacion, se continua actividades de Retiro de material con Ayuda de Volqueta hacia botadero se continua con Actividades de excavacion con maquina, se realiza compactacion con Vibrocompactador. Se suspenden Actividades programadas por horas de lluvia
Clima mañana: 4 horas de lluvia clima tarde: soleada.

Residente

R/L Interventoria.

VIERNES 11 AGOSTO 2023.

Personal Interventoria: Asesor (1). Residente (1) profesional SST (1) inspector (1)
* Personal Administrativo Obra: Profesional SST (1) inspector (1) Asesor (1) Residente (1)
* Personal obra: maestro (1) Oficiales (2) Ayudantes (3) maquinaria (3) equipos (1) sub contratistas ( ) * Se continuan con Actividades y compactacion, Se continuan con Actividades de adecuacion del complemento provisional hidro sanitario y electrico, se espera entrega de planos en fisico por parte de obra
Clima mañana: 2 horas lluvias clima tarde: soleada.

Residente

R/L Interventoria.

* SABADO 12 AGOSTO 2023.
* Personal Interventoria: Profesional SST (1) Inspector (1) Residente (1) Asesor (1) Director (1) * Personal Administrativo obra: Residente (1) Inspector (1) profesional SST (1) Asesor (1), Director (1) Topografo (1).
* Personal obra: maestro (1) Oficiales (2) Ayudantes (3) maquinaria (3) Equipos (1) Sub contratista ( ) * Se Realiza Retiro de la malla contra incendio Cuidado norte, llega material de uso para toma de muestras de granulometria para continuar con la actividad de Relleno, se realiza compactacion con Vibrocompactador, se continuan actividades de adecuacion hidrosanitaria provisional, se realiza separacion de material de demolicion de graderia para posible reutilizacion en lleno segun recomendaciones dadas por especialista en geotecnia.
