INGENIERIA SISMICA – CIVIL - PATOLOGIA ESTRUCTURAL - INGENIERIA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
CALLE 23N #23-00 CASA H, ARMENIA -CEL 3163877117
CORREO CARLOSMANUELOLARTE@GMAIL.COM

Santiago de Cali

Agosto 29 de 2023

OFICIO - NACION 003-2022-030

Señores
FUNDACION EDICOL
María Margarita Zapata Paredes
INTERVENTORIA NACION 001 DE 2022

CONTRATO DE OBRA No. NACION 003 DE 2022 **"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CABAÑA DE PREVENCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE PARQUES NATURALES NACIONALES DE COLOMBIA (PNNC) Y UNA CABAÑA DE VIGILANCIA DE LA ARMADA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (ARC)."**

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO DE OBRA No NACION 003 DE 2022

Cordial saludo.

Por medio del presente oficio, queremos hacer solicitud a la interventoría del contrato de obra NACION 003 de 2022 sobre el requerimiento de ampliación de plazo de ejecución de obra desde el 30 de agosto de 2023 (fecha contractual de finalización de obra) hasta el 31 de octubre de 2023 equivalente a 61 días, requerimiento del cual la manifestamos las causantes a continuación


solicitamos a la entidad y a la interventoría, revisar y analizar las situaciones que conllevaron a requerir dicha ampliación de plazo de ejecución del contrato de obra NACION 003 DE 2022 dadas las circunstancias que sea dieron el día 27 de mayo en horas de las noches con respecto a la afectación que sufrió el puente voladizo (tangón) por el fuerte oleaje que presento con afectación de manera significativa en el tramo de acceso a este , siendo el único medio para el ingreso de los materiales , víveres y personas al SFF isla Malpelo lo que conllevo en este momento a realizar obra de contingencia temporal en su reforzamiento esto con el fin de proteger la integridad humana de las personas que estaban realizando intervención en este frente de trabajo (tangón)labor que retrazo todas las actividades predecesoras y permitir el continuo ingreso de los materiales que se requirieren para continuar con el proceso constructivo de una cabaña de prevención, control y vigilancia de parques naturales nacionales de Colombia (PNNC) y una cabaña de vigilancia de la armada de la república de Colombia (ARC)."

Es por esto que solicitamos se conceda un nuevo plazo de finalización del contrato de obra para el 31 de octubre de 2023 que corresponde a 61 días de ejecución contados a partir del 01 de septiembre de 2023, el cual sea concebido con el nuevo cronograma de obra ajustado con el periodo solicitado.

INGENIERIA SISMICA – CIVIL - PATOLOGIA ESTRUCTURAL - INGENIERIA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
CALLE 23N #23-00 CASA H, ARMENIA -CEL 3163877117
CORREO CARLOSMANUELOLARTE@GMAIL.COM

Adjuntamos reporte sustentados por el **Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacifico** entidad marítima encargada de ejercer autoridad en todo el territorio marítimo

En el cuadro del pronóstico de planeares y bajares del mes de mayo del año en curso, se evidencia un aumento en la altura del oleaje en el océano pacifico hasta de 4.51 mts de altura lo que ha afectado el ingreso a la estructura del tangón.

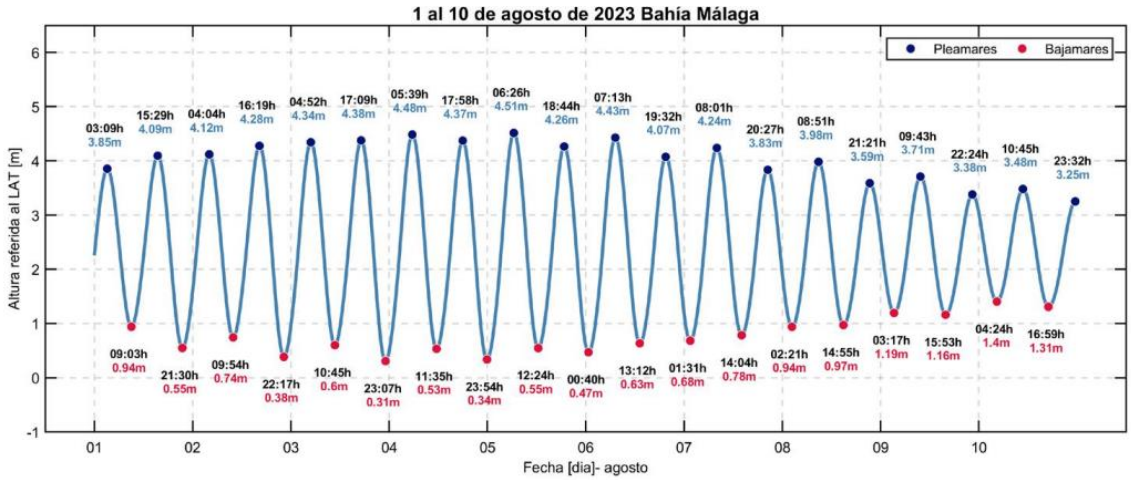

http://www.ideam.gov.co/documents/21021/137239/CARTILLA+BAJAMARES+Y+PLEAMARES+-+PAC%C3%8DFICA+2023.pdf/124e7277-05d5-4cee-83da-87984c666eed?version=1.0

Adjuntamos afectación del Tangón por el fuerte oleaje

INGENIERIA SISMICA – CIVIL - PATOLOGIA ESTRUCTURAL - INGENIERIA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
CALLE 23N #23-00 CASA H, ARMENIA -CEL 3163877117
CORREO CARLOSMANUELOLARTE@GMAIL.COM



Imagen sin afectación con acceso al tangon

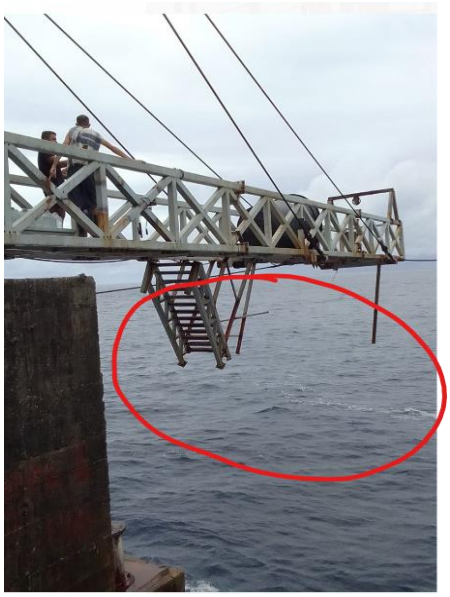


Imagen con afectación sin acceso al tangon

Cordialmente

ING. CARLOS MANUEL OLARTE MARTINEZ
CONTRATISTA. CONTRATO DE OBRA No. NACION 003 DE 2022

CC ı **PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA**
Robinson Galindo Tarazona
DIRECCION TERRIOTORIAL PACIFICO
