INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA 0323-2023 SUCRITO ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM Y RESGURADO INDIGENA TAMAS DEL CAGUAN

CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA-CAM
CONTRATISTA: RESGUARDO INDIGENA TAMAS DEL CAGUAN
OBJETO: CONTRATAR EL ESTABLECIMIENTO CON SISTEMA DE CERCA VIVA, REFUGIOS DE FAUNA Y ADECUACION DE PERCHAS, PARA LA RECUPERACION DE LA FLORA Y FAUNA DE LA PANCHA MAMA, CONFORME A LOS USOS Y COSTUMBRES DE LA COMUNIDAD INDIGENA TAMAS DEL CAGUAN, LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE RIVERA-HUILA
FECHA DE INICIO: 29 de Junio de 2023
PLAZO DE EJECUCION: CINCO (5) meses

Se efectuó visita de seguimiento en el Municipio de Rivera (H) para verificar el establecimiento de Cuatro Mil (4.000) metros lineales con sistema de cercas viva en áreas de zonas de protección, La construcción de diez (10) refugios de fauna conforme a las condiciones técnicas exigidas y la construcción de diez (10) sistemas de perchas conforme a las condiciones técnicas exigidas.

Municipio: Rivera (H)
Vereda: Jurisdicción RESGUARDO INDIGENA TAMAS DEL CAGUAN
Actividad Ejecutada: Implementación de Cuatro Mil (4.000) metros lineales de aislamiento con sistema de cercas vivas en áreas de importancia ambiental del RESGUARDO INDIGENA TAMAS DEL CAGUAN, la construcción de (10) refugios de fauna y la construcción de diez (10) sistemas de perchas
Beneficiario (a): RESGUARDO INDIGENA TAMAS DEL CAGUAN
Coordenadas: E**:** 871989; N: 805657
a.s.n.m: 600m
Fecha visita: 04 de septiembre de 2023

SITUACIÓN ENCONTRADA:

En compañía del señor Vicente Ríos Miembro del Resguardo Indígena designado por el señor Camilo Ortega Miembro de la Junta directiva del Resguardo Indígena para verificar el avance de la implantación del aislamiento de 4000 metros lineales localizados en zonas de áreas de importancia ambiental, de los cuales se pudo constatar que a la fecha llevan implementados 2222 metros lineales de aislamiento, en siete tramos observándose en campo 889 postes de madera hincados con distanciamiento de 2,5mts entre postes a cuatro (4) hilos de alambre púa calibre 14, debidamente templados y grapados cumpliendo con la especificaciones técnicas del contrato y 74 postes como pie de amigo, cada poste pie de amigo con distanciamiento de 30 metros cada uno.

TABLA 1. AVANCE IMPLEMENTACION DE 4000 METROS LINEALES CON POSTES DE MADERA							
MUNICIPIO	**VEREDA**	**PREDIO**	**E**	**N**	**METROS LINEALES IMPLEMENTADOS**	**POSTES DE MADERA**	**POSTES PIE DE AMIGO DE MADERA**
RIVERA	RESGUARDO INDIGENA TAMAS DEL CAGUAN	LOTE 1	873029	804492	2222	888	74
TOTAL					**2222**	**888**	74

FUENTE: Propia

En cuanto a los refugios de fauna se han implementado Diez (10) refugios con distanciamiento de cada refugio de 100 metros siguiendo la continuidad de un corredor biológico cumpliendo con las especificaciones técnicas del proceso de construcción.

Tabla 2. Ubicación de los refugios de fauna

REFUGIO	COORDENADAS		A.S.N.M
	X	y	
1	872275	805567	594
2	872467	805650	628
3	872253	805895	582
4	872281	806481	551
5	872429	807431	542
6	872274	807088	534
7	872053	808014	602
8	872439	808016	558
9	872478	807819	557
10	872594	808052	566

RECOMENDACIONES:

1. Se recibe a satisfacción la implementación de 2222 metros lineales de aislamiento con postes de madera sin sistemas de cercas vivas y el pago parcial de dicha actividad.

2. Se recibe a satisfacción y pago total de la construcción de Diez (10) Refugios de fauna,

3. El contratista debe realizar la limpia de la franja del aislamiento, con el fin de evitar el deterioro de los postes de madera con el cubrimiento de estos por malezas y la implementación de las cercas vivas en épocas de lluvia

Por lo tanto, se da por concluido el Concepto Técnico y se remite al supervisor del contrato según su solicitud para sus condiciones e información pertinente.

Cordialmente,



DIVER ARMANDO GUEVARA CUELLAR
Contratista CAM – SGA

Registro fotográfico

MUNICIPIO:	Rivera	VEREDA: Resguardo indígena Tamas Caguan	
NOMBRE DEL PREDIO:	Lote 1	Mts Lineales: 2222mts lineales	
ACTIVIDAD REALIZADA:	Implementación de aislamiento	BENEFICIARIO: Resguardo Indígena Tamas Caguan	
RESPONSABLE DE VISITA:	Diver Armando Guevara Cuellar	COORDENADAS: X: 871989 Y: 805657 A.S.N.M : 600	



Foto: 1 Track recorrido del aislamiento la chamba



Foto: 2 imagen Satelital del aislamiento



Foto: 3 Aislamiento con postes de madera a 4 hilos



Foto: 4 Aislamiento con 4 hilos de alambre púa

Registro fotográfico

MUNICIPIO:	Rivera	VEREDA: Resguardo indígena Tamas Caguan	
NOMBRE DEL PREDIO:	Lote 1	Mts Lineales: 2222mts lineales	
ACTIVIDAD REALIZADA:	Implementación de aislamiento	BENEFICIARIO: Resguardo Indígena Tamas Caguan	
RESPONSABLE DE VISITA:	Diver Armando Guevara Cuellar	COORDENADAS: X: 871989 Y: 805657 A.S.N.M : 600	



Foto 1: Aislamiento con 4 hilos de alambre



Foto 2: Aislamiento con postes de madera



Foto 3 distanciamiento de postes a 2,5 x 2,5

Registro fotográfico

MUNICIPIO: Rivera

VEREDA: Resguardo indígena Tamas Caguan

NOMBRE DEL PREDIO: Lote 1

No de lineales: (10) Refugios Fauna

ACTIVIDAD REALIZADA: Refugios Fauna

BENEFICIARIO: Resguardo Indígena Tamas Caguan

RESPONSABLE DE VISITA: Diver Armando Guevara Cuellar

COORDENADAS: X: 871241 Y: 809723
A.S.N.M : 541

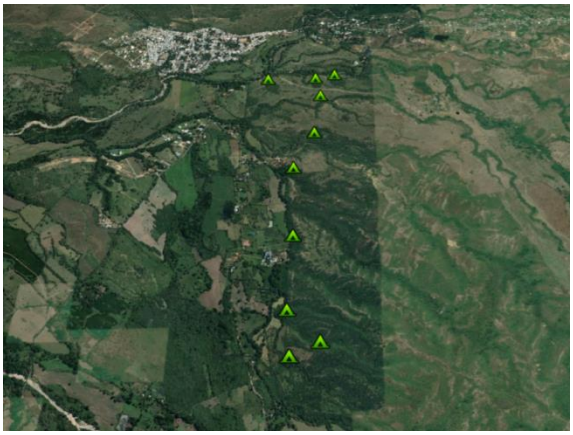


Foto: 1 Ubicación satelital de los Diez Refugios



Foto: 2 Refugio con las condiciones tecnicas



Foto: 3 Refugios Fauna



Foto: 4 Refugios Fauna
