MINISTERIO DEL INTERIOR

Al contestar cite Radicado 2023-3-003122-013893 Id: 127113
Folios: 1 Fecha: 2023-05-10 06:23:40
Anexos: 1 Documentos electrónicos
Remitente: GRUPO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA: Subdirección de Gestión Contractual

DE: Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.

ASUNTO: Remisión informe de ejecución del Ministerio del Interior – Convenio No 1909 de 2022 Municipio de Carmen de Cantón de San Pablo del periodo de MARZO de 2023.

Cordial saludo;

Por medio de la presente remito para su información y fines pertinentes información relacionada con el Convenio No 1909 de 2022 suscrito con el Municipio de Cantón de San Pablo, así:

1. Informe del ministerio - Convenio No 1909 de 2022, del mes de MARZO de 2023 en CUARENTA Y TRES (43) Folios.

Atentamente,

MANUEL ANTONIO LINARES DONATO
Supervisor convenio

GONZALO ANTONIO FLOREZ PEÑA
Profesional de Apoyo a la Supervisión

Anexo: en CUARENTA Y TRES (43) Folios

Elaboró: Arq. Gonzalo Flórez Peña /Apoyo Supervisión

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN NO.**1909-2022** MUNICIPIO DE **CANTON DE SAN PABLO-CHOCO**
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **MARZO 2023**

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	*"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO y CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCO"*		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	BARRIO LAS BRISAS POBLOCION DE MANAGRU		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE CHOCO		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 3.931.858.630,00
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 693.857.405,00
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$ 4.625.716.035,00
FECHA SUSCRIPCIÓN	07/08/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	24/03/2024		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	Manuel Antonio Linares Donato	**DESDE:** 21/12/2022	
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Manuel Antonio Linares Donato	21/12/2022	VIGENTE
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Oscar Javier Cuadros	21/12/2022	31/12/2022
	Gonzalo Flórez Peña	27/01/2023	VIGENTE
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MININTERIOR	30323	20/01/2023	31/12/2023
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	23923	20/01/2023	31/12/2023
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	cupo de aprobación de vigencias futuras con radicado No. 2-2022-030809 de fecha 19 de julio de	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No. 128	23/03/2022	31/12/2022
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 3002240	16/12/2022	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA PRIMERA PRORROGA	N/A		
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	16/12/2022		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRORROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	SEGUNDA PRORROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	TERCERA PRORROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)			FECHA: DD/MM/AAAA
			FECHA: DD/MM/AAAA
			FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		

Escaneado con CamScanner

VALOR DE ESTUDIOS, DISEÑOS, OBRA	N/A
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS, DISEÑOS, OBRA	N/A
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	N/A
VALOR ADICIONAL DE OBRA	N/A

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

➢ ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	A. Suscripción del acta de inicio. B. designación del supervisor del convenio por parte del municipio C. Aprobación del cronograma de ejecución del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO D. Aprobación del componente de estudios y diseños por parte del interventor del contrato y del supervisor del municipio.	NO APLICA	DD/MM/AAAA	$ 1.965.929.315
SEGUNDO DESEMBOLSO	A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 60% de ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños. B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance. C. La respectiva acta parcial de avance del proyecto avalada por el interventor. D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	60%	DD/MM/AAAA	$ 1.572.743.452
ÚLTIMO DESEMBOLSO	A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el cumplimiento del 100% de ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de ejecución del proyecto avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado.	100%	DD/MM/AAAA	$ 393.185.863
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				0,00
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				0,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
3002240	Cumplimiento	$ 462.571.604,00	09/08/2022	24/09/2024

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➢ ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños, Obra.***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR

Escaneado con CamScanner

No. del contrato 001-LP-OP	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCO.		$ 4.160.457.625,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0.00
	DD/MM/AAAA		$ 0.00
Nombre contratista	YEISON ALBORNOZ RIVAS		
Fecha de Acta de inicio del contrato	08/03/2023		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 4.160.457.625,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTDO**		
PÓLIZA No.	17-40-101027222		
FECHA DE LA PÓLIZA	24/02/2023		

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños, Obra.***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato 001-I-CM	INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION ESTACION DE LA POLICIA EN EL MUNICIPIO DE EL CANTON DE SAN PABLO DEPARTAMENTO CHOCO".		$ 465.033.732,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	YORK STIVENSON PEREA AYALA		
Fecha de Acta de inicio del contrato	08/03/2023		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 465.033.732,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**		
PÓLIZA No.	**17-44-101208799**		
FECHA DE LA PÓLIZA	**21/02/2023**		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	SI	NO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		X
INFORME FINANCIERO	X	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	X	

Escaneado con CamScanner

ACTIVIDADES DEL PROYECTO	Publicación de procesos estudios, diseños, obra e interventoría.	X
OTROS		X

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	
% EJECUTADO DE OBRA	

PERIODO: MARZO 2023
FECHA DE ACTA DE INICIO: 08/03/2023
AVANCE DE OBRA: Se avanza en etapa de estudios y diseños
VIGENCIA: N.A.

Componente Técnico.

- Se realizó visita al predio el 8 de marzo de 2023.
- Con fecha del 8 de marzo de 2023, se firmaron las actas de inicio de del Contrato de Obra Pública 001-LP-OP con el objeto "(...) AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCO (...)" y del Contrato de interventoría No. 001-I-CM con el asunto "(...)INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION ESTACION DE LA POLICIA EN EL MUNICIPIO DE EL CANTON DE SAN PABLO DEPARTAMENTO CHOCO" (...)".
- Se realizó comité de diseños en la DIRAF el 14 de marzo de 2023.
- Se realizó comité de diseños en la DIRAF el 31 de marzo de 2023.
- Con respecto al cronograma del convenio a la fecha el Municipio del Cantón de San Pablo se encuentra al día teniendo en cuenta que para el mes de marzo debía dar inicio la etapa de estudios y diseños, la cual comenzó el 14 de marzo de 2023.

Componente Administrativo.

- Con fecha del 4 de marzo de 2023, se remitió correo electrónico por parte del Ministerio del Interior al Municipio de Cantón de San Pablo, con el asunto "(...) ANEXOS TECNICOS - CONVENIO No. 1917 DE 2022 (...)".
- Con fecha del 6 de marzo de 2023, se remitió correo electrónico por parte del Ministerio del Interior al Municipio de Cantón de San Pablo, con el asunto "(...) CITACION COMITE DE SGEUIMIENTO Y VISITA DE PREDIO CONVENIO No. 1909 DE 2022 MUNICIPIO DE CANTÓN DE SAN PABLO (...)".
- Con fecha del 7 de marzo de 2023, se remitió correo electrónico por parte del Municipio de Cantón de San Pablo al Ministerio del Interior, con el asunto "(...) REITERACION CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONVENIO No. 1909 DE 2022 MUNIVICPIO DE CANTON DE SAN PABLO (...)".
- Con fecha del 7 de marzo de 2023, se remitió correo electrónico por parte del Ministerio del Interior al Municipio de Cantón de San Pablo, con el asunto "(...) REITERACION CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONVENIO No. 1909 DE 2022 MUNIVICPIO DE CANTON DE SAN PABLO (...)".
- Con fecha del 8 de marzo de 2023, se remitió correo electrónico por parte del Ministerio del Interior a Oficial de Enlace de la Policia con el asunto "(...) SOLICITUD COORDINACION MESAS TECNICAS CONVENIO No. 1917-2022 MUNICIPIO DE LOS PALMITOS - SUCRE Y CONVENIO No. 1909 DE 2022 MUNICIPIO DE CANTÓN DE SAN PABLO (...)".
- Con fecha del 10 de marzo de 2023, se remitió correo electrónico por parte del Ministerio del Interior al Municipio de Cantón de San Pablo, con el asunto "(...) CITACIÓN COMITE DIRAF CONVENIO No. 1909 DE 2022 MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO - CHOCÓ (...)".
- Con fecha del 15 de marzo de 2023, se remitió correo electrónico por parte del Ministerio del Interior al Municipio de Cantón de San Pablo, con el asunto "(...) SOLICITUD DOCUEMNTOS CONVENIO No. 1909 DE 2020 MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO (...)".
- Con fecha del 15 de marzo de 2023, se remitió correo electrónico por parte del Municipio de Cantón de San Pablo al Ministerio del Interior, con el asunto "(...) SOLICITUD DOCUEMNTOS CONVENIO No. 1909 DE 2020 MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO (...)".

Escaneado con CamScanner

- Con fecha del 15 de marzo de 2023, se remitió correo electrónico por parte de la DIRAF al Ministerio del Interior, con el asunto "(...) Directiva 004 y Imagen Institucional (...)".
- Con fecha del 19 de marzo de 2023, se remitió correo electrónico por parte del Ministerio del Interior al Municipio de Cantón de San Pablo, con el asunto "(...) PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONVENIO No. 1909 DE 2022 (...)".
- Con fecha del 24 de marzo de 2023 se remitió por parte de la supervisión a la subdirección de Gestión Contractual el Radicado 2023-3-003122-010546 Id: 103881 con el asunto "(...) Documentación correspondiente a la solicitud del primer desembolso al Convenio No. 1909 de 2022 suscrito entre el Ministerio del Interior – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana – FONSECON y el Municipio de Cantón de San Pablo (...)".
- Con fecha del 24 de marzo de 2023 se remitió por parte de la supervisión a la subdirección de Gestión Contractual el Radicado 2023-3-003122-010548 Id: 103883 con el asunto "(...) Documentación correspondiente a la solicitud del primer desembolso al Convenio No. 1909 de 2022 suscrito entre el Ministerio del Interior – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana – FONSECON y el Municipio de Cantón de San Pablo (...)".
- Con fecha del 27 de marzo de 2023, se remitió correo electrónico por parte del Ministerio del Interior a Oficial de Enlace de la Policía con el asunto "(...) SOLICITUD PROGRAMACIÓN MESA DE TRABAJO CONVENIO 1909-2022 ESTACION DE POLICIA MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO (...)".
- Con fecha del 28 de marzo de 2023, se remitió correo electrónico por parte del Ministerio del Interior a Oficial de Enlace de la Policía con el asunto "(...) SOLICITUD PROGRAMACIÓN MESA DE TRABAJO CONVENIO 1909-2022 ESTACION DE POLICIA MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO (...)".
- Con fecha del 29 de marzo de 2023, se remitió correo electrónico por parte del Ministerio del Interior al Municipio de Cantón de San Pablo, con el asunto "(...) SOLICITUD DE INFORMACIÓN CONVENIO No. 1909 DE 2022 MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO2022 (...)".

Componente Financiero.

- A la fecha no se han realizado desembolsos al convenio.
- Con fecha del 24 de marzo de 2023 se remitió por parte de la supervisión a la subdirección de Gestión Contractual el Radicado 2023-3-003122-010546 Id: 103881 con el asunto "(...) Documentación correspondiente a la solicitud del primer desembolso al Convenio No. 1909 de 2022 suscrito entre el Ministerio del Interior – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana – FONSECON y el Municipio de Cantón de San Pablo (...)".
- Con fecha del 24 de marzo de 2023 se remitió por parte de la supervisión a la subdirección de Gestión Contractual el Radicado 2023-3-003122-010548 Id: 103883 con el asunto "(...) Documentación correspondiente a la solicitud del primer desembolso al Convenio No. 1909 de 2022 suscrito entre el Ministerio del Interior – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana – FONSECON y el Municipio de Cantón de San Pablo (...)".

Componente Jurídico.

- El Convenio se encuentra vigente con plazo de ejecución hasta el 24 de marzo del 2024.

Anexos

- Con fecha del 4 de marzo de 2023, se remitió correo electrónico por parte del Ministerio del Interior al Municipio de Cantón de San Pablo, con el asunto "(...) ANEXOS TECNICOS - CONVENIO No. 1917 DE 2022 (...)".
- Con fecha del 6 de marzo de 2023, se remitió correo electrónico por parte del Ministerio del Interior al Municipio de Cantón de San Pablo, con el asunto "(...) CITACION COMITE DE SGEUIMIENTO Y VISITA DE PREDIO CONVENIO No. 1909 DE 2022 MUNICIPIO DE CANTÓN DE SAN PABLO (...)".
- Con fecha del 7 de marzo de 2023, se remitió correo electrónico por parte del Municipio de Cantón de San Pablo al Ministerio del Interior, con el asunto "(...) REITERACION CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONVENIO No. 1909 DE 2022 MUNIVICPIO DE CANTON DE SAN PABLO (...)".
- Con fecha del 7 de marzo de 2023, se remitió correo electrónico por parte del Ministerio del Interior al Municipio de Cantón de San Pablo, con el asunto "(...) REITERACION CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONVENIO No. 1909 DE 2022 MUNIVICPIO DE CANTON DE SAN PABLO (...)".
- Con fecha del 8 de marzo de 2023, se remitió correo electrónico por parte del Ministerio del Interior a Oficial de Enlace de la Policia con el asunto "(...) SOLICITUD COORDINACION MESAS TECNICAS CONVENIO No. 1917-2022 MUNICIPIO DE LOS PALMITOS - SUCRE Y CONVENIO No. 1909 DE 2022 MUNICIPIO DE CANTÓN DE SAN PABLO (...)".
- Con fecha del 10 de marzo de 2023, se remitió correo electrónico por parte del Ministerio del Interior al Municipio de Cantón de San Pablo, con el asunto "(...) CITACIÓN COMITE DIRAF CONVENIO No. 1909 DE 2022 MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO - CHOCÓ (...)".
- Con fecha del 15 de marzo de 2023, se remitió correo electrónico por parte del Ministerio del Interior al Municipio de Cantón de San Pablo, con el asunto "(...) SOLICITUD DOCUEMNTOS CONVENIO No. 1909 DE 2020 MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO (...)".

Escaneado con CamScanner

- Con fecha del 15 de marzo de 2023, se remitió correo electrónico por parte del Municipio de Cantón de San Pablo al Ministerio del Interior, con el asunto "(...) SOLICITUD DOCUEMNTOS CONVENIO No. 1909 DE 2020 MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO (...)".
- Con fecha del 15 de marzo de 2023, se remitió correo electrónico por parte de la DIRAF al Ministerio del Interior, con el asunto "(...) Directiva 004 y Imagen Institucional (...)".
- Con fecha del 19 de marzo de 2023, se remitió correo electrónico por parte del Ministerio del Interior al Municipio de Cantón de San Pablo, con el asunto "(...) PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONVENIO No. 1909 DE 2022 (...)".
- Con fecha del 24 de marzo de 2023 se remitió por parte de la supervisión a la subdirección de Gestión Contractual el Radicado 2023-3-003122-010546 Id: 103881 con el asunto "(...) Documentación correspondiente a la solicitud del primer desembolso al Convenio No. 1909 de 2022 suscrito entre el Ministerio del Interior – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana – FONSECON y el Municipio de Cantón de San Pablo (...)".
- Con fecha del 24 de marzo de 2023 se remitió por parte de la supervisión a la subdirección de Gestión Contractual el Radicado 2023-3-003122-010548 Id: 103883 con el asunto "(...) Documentación correspondiente a la solicitud del primer desembolso al Convenio No. 1909 de 2022 suscrito entre el Ministerio del Interior – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana – FONSECON y el Municipio de Cantón de San Pablo (...)".
- Con fecha del 27 de marzo de 2023, se remitió correo electrónico por parte del Ministerio del Interior a Oficial de Enlace de la Policía con el asunto "(...) SOLICITUD PROGRAMACIÓN MESA DE TRABAJO CONVENIO 1909-2022 ESTACION DE POLICIA MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO (...)".
- Con fecha del 28 de marzo de 2023, se remitió correo electrónico por parte del Ministerio del Interior a Oficial de Enlace de la Policía con el asunto "(...) SOLICITUD PROGRAMACIÓN MESA DE TRABAJO CONVENIO 1909-2022 ESTACION DE POLICIA MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO (...)".
- Con fecha del 29 de marzo de 2023, se remitió correo electrónico por parte del Ministerio del Interior al Municipio de Cantón de San Pablo, con el asunto "(...) SOLICITUD DE INFORMACIÓN CONVENIO No. 1909 DE 2022 MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO2022 (...)".
- Acta de inicio Contrato de Obra Pública 001-LP-OP.
- Acta de inicio Contrato de interventoría No.001-I-CM
- Informe de supervisión de marzo de 2023.
- Informe Financiero de marzo de 2023.
- Extracto bancario del mes de marzo de 2023.
- Acta de visita del 8 de marzo de 2023.
- Acta comité DIRAF del 14 de marzo de 2023.
- Acta comité DIRAF del 31 de marzo de 2023.

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

- Con respecto al cronograma del convenio a la fecha el Municipio del Cantón de San Pablo se encuentra al día teniendo en cuenta que para el mes de marzo debia dar inicio la etapa de estudios y diseños, la cual comenzó el 14 de marzo de 2023.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

08/03/2023	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

MANUEL ANTONIO LINARES DONATO Supervisor Convenio No. 1909-22 FONSECON	GONZALO ANTONIO FLOREZ PEÑA Elaboró - Apoyo a la supervisión- FONSECON (A partir del 27 de enero de 2023)

Escaneado con CamScanner

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES
1909 de 2022_ No. 04_, MUNICIPIO: CANTON DE PABLO- DEPARTAMENTO: CHOCÓ
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES: Marzo DE _01 AL 30

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOSY FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCÓ.		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	MANAGRÚ- BARRIO LAS BRISAS		
BENEFICIARIO:	CANTON DE SAN PABLO-CHOCÓ		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 3.931.858.630
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$693.857.405,00
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO		$ 4.625.716.035,00
FECHA SUSCRIPCIÓN	07/08/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	24/MARZO/2024		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	YIVIOLA RAMIREZ MORENO		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	NOMBRE	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	NOMBRE	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No. 2-2022-030809	19/07/2022	DD/MM/AAAA
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No. 128	23/03/2022	30/12/2022
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No.	DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	16/12/2022		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 4.160.457.625,00		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 465.033.732,00		
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	N.A		
VALOR ADICIONAL DE OBRA	N.A		

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	Previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y la entrega de los siguientes productos: a) Suscripción del acta de inicio b) Designación del supervisor del convenio por parte del municipio. Aprobación del cronograma de ejecución del convenio por parte del supervisor del ministerio.	NO APLICA	DD/MM/AAAA	$ 693.857.405
SEGUNDO DESEMBOLSO	Previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y la entrega de los siguientes productos: a) Suscripción del acta de inicio b) Designación del supervisor del convenio por parte del municipio. Aprobacion del cronograma de ejecución del convenio por parte del supervisor del ministerio.	NO APLICA	DD/MM/AAAA	$ 1.965.929.315
TERCER DESEMBOLSO	Contra entrega de los siguientes productos: a) La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 70% de ejecución del proyecto. b) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance. Las actas parciales de avance del proyecto	70%	DD/MM/AAAA	$1.572.743.452
ÚLTIMO DESEMBOLSO	a) La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el cumplimiento del 100% b) Entrega al Ministerio del interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyecto FONSECON	100%	DD/MM/AAAA	$ 393.185.863
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 0,00
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora:

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
3002240	Cumplimiento	$ 462.571.604,00	09/08/2022	24/09/2024

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños, Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO- DEPARTAMENTO DE CHOCÓ.		$ 4.160.457.625,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	YEISON ALBORNOZ RIVAS		
Fecha de Acta de inicio del contrato	28/FEBRERO/2023		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	28/NOVIEMBRE/2023		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 4.160.457.625,00

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A**
PÓLIZA No.	17-40-10102722
FECHA DE LA PÓLIZA	10/08/2022

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños, Obra***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
No. del contrato	INTERVENTORIA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION ESTACION DE LA POLICIA EN EL MUNICIPIO DE EL CANTON DE SAN PABLO DEPARTAMENTO CHOCO"		$ 465.033.732,00
Adicional en valor(adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	YORK STIVENSON PEREA AYALA		
Fecha de Acta de inicio del contrato	28/FEBRERO/2023		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	28/NOVIEMBRE/2023		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 465.033.732,00

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**
PÓLIZA No.	**17-44-101208799**
FECHA DE LA PÓLIZA	**21/02/2023**

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	**SI**	**NO**
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	X	
INFORME FINANCIERO	X	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA		X
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	
OTROS		

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
SE FIRMARON LAS ACTAS DE INICIO, EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, EL RADICADO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y LA SEGUNDA MESA TECNICA	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**52,08 %**
% EJECUTADO DE OBRA	**14,46 %**

P**ERIODO**: MARZO 2023
FECHA DE ACTA DE INICIO: 28/02/2023
AVANCE DE OBRA: 14,46%
VIGENCIA: N.A

Componente Técnico.

- Durante este periodo se desarrollaron las actividades del levantamiento Topográfico, radicado de levantamiento topográfico, el diseño mecánico y biométrico.

Componente administrativo.
Se firmaron las actas de inicio de los contratos, se realizó la segunda mesa técnica, y se continuo con el traslado de los uniformados que se encontraban en el predio, para posteriormente dar inicio a las actividades programadas.

Componente Financiero.

El Municipio del cantón de san pablo ha realizado el primer desembolso al convenio con un valor de **Quinientos millones de pesos ($ 500.000.000)**

Componente jurídico.

- El Convenio se encuentra vigente con plazo de ejecución hasta el 24 de marzo del 2024.

• El Municipio de Cantón de San Pablo, adjudico los procesos de estudios, diseños, obra No. 001-LP-OP al Contratista YORK STIVENSON PEREA AYALA por un valor de $465.033.732,00 y el proceso de interventoría de estudios, diseños, obra No. 001-I-CM al Contratista YEISON ALBORNOZ RIVAS por un valor de $4.160.457.625,00.
• El Municipio de Cantón de San Pablo celebro el Contrato No. 001-LP-OP con el objeto "(…) AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCO. Y el Contrato No. 001-I-CM con el objeto "(…) INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION ESTACION DE LA POLICIA EN EL MUNICIPIO DE EL CANTON DE SAN PABLO DEPARTAMENTO CHOCO".

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

- Durante este periodo se desarrollaron el levantamiento Topográfico, radicado de levantamiento topográfico y el diseño mecánico y biométrico.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)


15/03/2023	21/03/2023	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

YIVIOLA RAMIREZ MORENO Supervisor Municipio de Cantón San Pablo	**OSCAR ANTONIO PALACIOS PALACIOS** Alcalde Municipio de Cantón de San pablo

Anexos

- **Mesa Técnica**
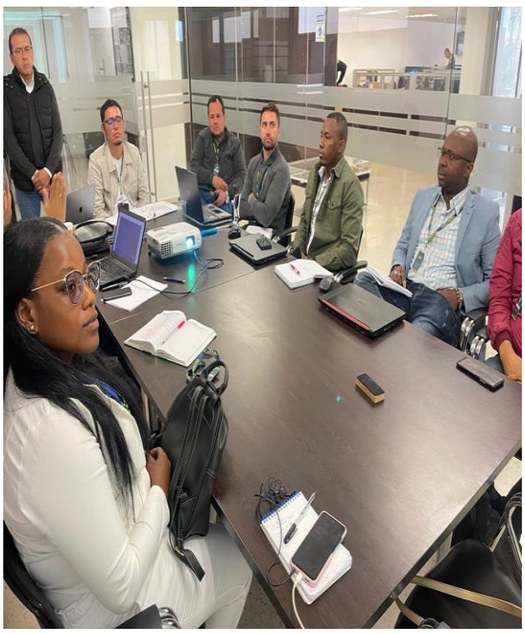
<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

ACTA DE INICIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°.	001-I-CM de 2023
CONTRATANTE:	ALCALDÍA EL CANTÓN DEL SAN PABLO- CHOCÓ
REPRESENTANTE LEGAL:	ÓSCAR ANTONIO PALACIOS PALACIOS
CONTRATISTA:	YORK STIVENSON PEREA AYALA.
REPRESENTANTE LEGAL:	YORK STIVENSON PEREA AYALA
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION ESTACION DE LA POLICIA EN EL MUNICIPIO DE EL CANTON DE SAN PABLO DEPARTAMENTO CHOCO".
VALOR:	CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($465.033.732,00 COP).
FECHA DE INICIO	28 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE FINALIZACION	28 DE NOVIEMBRE DE 2023

FORMA DE PAGO:	LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO DE ACUERDO A SU DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y DE LA SIGUIENTE FORMA: NO SE CONSIDERA ANTICIPO. EL VALOR DEL CONTRATO SE PAGARÁ MEDIANTE ACTAS PARCIALES DE AVANCE DE LA INTERVENTORÍA; DONDE LA PRIMERA ACTA SE PAGARÁ CUANDO EL CONTRATISTA HAYA EJECUTADO CUANDO MENOS EL VEINTICINCO POR CIENTO (25%) DE LA INTERVENTORÍA MEDIDA EN TÉRMINOS DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA. ESTAS ACTAS PARCIALES DE AVANCE DE INTERVENTORÍA SERÁN ELABORADAS POR EL
	INTERVENTOR Y REFRENDADAS CON EL VISTO BUENO DEL SUPERVISOR ASIGNADO. EL MUNICIPIO REALIZARÁ LOS PAGOS UNA VEZ EL INTERVENTOR HAYA PRESENTADO LOS INFORMES DE EJECUCIÓN, CUANTIFICADOS Y VERIFICADOS POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO, EL CUAL EXPEDIRÁ LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007, DE ACUERDO CON LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES QUE DEL MISMO SE HAGA EN EL PRESUPUESTO Y A LA PROGRAMACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA – PAC Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PAGOS DE SSS
PLAZO DE EJECUCIÓN	EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO ES HASTA NUEVE (09) MESES, SIGUIENTES A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.
SUPERVISOR	YIVIOLA RAMIREZ MORENO

El martes 28 de FEBRERO de 2023 se reunieron los señores **YORK STIVENSON PEREA AYALA**.; en calidad de contratista, mayor de edad identificado con numero de cedula 9.732.848 de armenia**,** quien para los efectos del presente contratos será denominada en calidad de EL **CONTRATISTA** y la

señora **YIVIOLA RAMIREZ MORENO** identificado con cedula de ciudadanía Nº 1.077.447.541 de Quibdó, en calidad de EL SUPERVISOR. Con el objetivo de dar inicio al contrato de Interventoría N.º 001-I-CM cuyo objeto: **INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION ESTACION DE LA POLICIA EN EL MUNICIPIO DE EL CANTON DE SAN PABLO DEPARTAMENTO CHOCO".**

Previo a las siguientes consideraciones:

1. Que el día 20 del mes de febrero mediante **resolución No. 0066** DE 2023 se adjudicó el proceso de selección No. **001 de 2022 (MCSP-SP-I-CM-001-2023**)" cuyo objeto es: **LA INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION ESTACION DE LA POLICIA EN EL MUNICIPIO DE EL CANTON DE SAN PABLO DEPARTAMENTO CHOCO".**
2.
3. Que mediante **resolución 0072** del día 21 de febrero de 2023 se realizaron las respectivas aprobaciones de las pólizas de garantía única de cumplimiento. Así las cosas, los participantes acuerdan dar inicio al contrato **N.º 001-I-CM** cuyo objeto es: **LA INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION ESTACION DE LA POLICIA EN EL MUNICIPIO DE EL CANTON DE SAN PABLO DEPARTAMENTO CHOCO**". A partir del día 8 del mes de marzo del año 2023.

Para mayor constancia se firma en Managrú, por quienes en ella intervienen el día 28 de febrero del año 2023.

YIVIOLA RAMIREZ MORENO.
Supervisor

YORK STIVENSON PEREA AYALA.
Contratista

ACTA DE INICIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°.	001-LP-OP- 2023
CONTRATANTE:	ALCALDÍA EL CANTÓN DEL SAN PABLO-CHOCÓ
REPRESENTANTE LEGAL:	ÓSCAR ANTONIO PALACIOS PALACIOS
CONTRATISTA:	YEISON ALBORNOZ RIVAS.
REPRESENTANTE LEGAL:	YEISON ALBORNOZ RIVAS
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCO.
VALOR:	CUATRO MIL CIENTO SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($4.160.457.625,00 COP).
FECHADE INICIO	28 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE FINALIZACION	28 DE NOVIEMBRE DE 2023
FORMA DE PAGO:	EL MUNICIPIO PAGARÁ EL VALOR DEL CONTRATO DE LA SIGUIENTE MANERA: UN ANTICIPO EQUIVALENTE AL CUARENTA POR CIENTO (40%) DEL VALOR DEL CONTRATO, Y EL SALDO RESTANTE SERÁ PAGADO MEDIANTE PAGOS PARCIALES O FINAL, DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA REALMENTE EJECUTADAS QUE HAYAN SIDO APROBADAS POR LA INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. EN TODO CASO, EL PAGO DE LAS ACTAS PARCIALES Y/O FINAL, SERÁ REALIZADO DENTRO DE LOS 30 DÍAS SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA FACTURA CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES.PAGOS UNA VEZ EL INTERVENTOR HAYA PRESENTADO LOS INFORMES DE

	EJECUCIÓN, CUANTIFICADOS Y VERIFICADOS POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO, EL CUAL EXPEDIRÁ LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007, DE ACUERDO CON LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES QUE DEL MISMO SE HAGA EN EL PRESUPUESTO Y A LA PROGRAMACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA – PAC Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PAGOS DE SSS
PLAZO DE EJECUCIÓN	EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO ES HASTA NUEVE (09) MESES, SIGUIENTES A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.
SUPERVISOR	YIVIOLA RAMIREZ MORENO

El lunes 28 de febrero de 2023 se reunieron los señores **YEISON ALBORNOZ RIVAS**; en calidad de contratista, mayor de edad identificado con numero de cedula 11.708.479 expedida en Istmina, quien para los efectos del presente contratos será denominada en calidad de EL **CONTRATISTA** y la señora **YIVIOLA RAMIREZ MORENO** identificado con cedula de ciudadanía Nº 1.077.447.541 de Quibdó, en calidad de EL SUPERVISOR. Con el objetivo de dar inicio al contrato de **OBRA N.º 001-LP-OP** cuyo objeto: **AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCO.**

Previo a las siguientes consideraciones:

1. Que el día 23 del mes de febrero mediante **resolución No. 0085** DE 2023 se adjudicó el proceso de selección No. **001- 2023 (MCSP-SP- LP-OP -001-2023**)" cuyo objeto es: **AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCO.**
2. Que mediante **resolución 0117**del día 28 de febrero de 2023 se realizaron las respectivas aprobaciones de las pólizas de garantía única de cumplimiento. Así las cosas, los participantes acuerdan dar inicio al contrato **N.º 001-I-CM** cuyo objeto es: **AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCO.** A partir del día 28 del mes de febrero del año 2023.

Para mayor constancia se firma en managru, por quienes en ella intervienen el día 28 de febrero del año 2023.

OSCAR ANTONIO PALACIOS PALACIOS Alcalde municipal	**YIVIOLA RAMIREZ MORENO** Supervisora
YEISON ALBORNOZ RIVAS Contratista obra	**YORK STIVENSON PEREA AYALA**. Contratista interventoría

Managrú – Cantón Del San Pablo, 3 de abril del 2023

Señor:
ARQ. OSCAR CASTELLANO

Referencia: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCO.

Asunto: Aprobación de levantamiento topográfico.

Por medio del presente documento y después de haber revisado y verificado el levantamiento topográfico realizado por el contratista y su equipo de trabajo y aprobado por el personal de la consultoría e interventoría del proyecto cuyo objeto es: **AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCO**, se observó que este cumple con los requerimientos emitidos por ministerio del interior y la DIRAF.
Debido a que la interventoría aprueba el levantamiento topográfico, la supervisión revisa y hace entrega oficial de CD O MEMORIA con la información exigida, revisada ya aprobada la cual contiene:

- Documentos del personal especializado.
- Especificaciones de equipo.
- Cartera.
- Plano de localizaciòn.
- Plano topográfico.
- Informe.
- Archivos crudos de la estación de policía.
- Rinex y crudos.

Para mayor constancia se firma el día lunes 3 del mes de abril del año 2023

OSCAR ANTONIO PALACIOS PALACIOS
Alcalde
Municipio El Cantón Del San Pablo -Chocó

YIVIOLA RAMIREZ MORENO
Secretaria De Planeación
Municipio El Cantón Del San Pablo -Chocò

Banco de Bogotá

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2023040203CD3153521708



122662 3-6

ESTUDIO DISENOS Y CONTRUCCION DE LA ESTA
CR 5 2-1
MANAGRU ,CHOCO
Entrega: UR Oficina: 2037 Gerencia Oficial 2 - Quibdó
122662

FECHA EXTRACTO **Marzo - Marzo 2023**

Desde: Marzo 01	Hasta: Marzo 31
Cuenta Número:	979123817
Tipo de Cuenta:	Superdía Oficial
Cod. Origen:	2037
ZZ-INDIVIDUAL	

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**0.00**
Total 000001 Abonos:	505,000,000.00
Total 000002 Cargos:	-500,007,100.00
Total IVA:	-1,349.00
Total 4x1000 GMF:	-2,000,033.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	14,753.00
Saldo Final:	**3,006,271.00**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
16/03	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Municipio Canton Del San Pablo	QUIBDO	G. Oficial Red 2	000000	505,000,000.00	505,000,000.00
23/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	QUIBDO	G. Oficial Red 2	000000	-500,000,000.00	5,000,000.00
23/03	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	QUIBDO	G. Oficial Red 2		-2,000,000.00	3,000,000.00
24/03	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	QUIBDO	G. Oficial Red 2	000000	-7,100.00	2,992,900.00
24/03	GT08	Cargo IVA	QUIBDO	G. Oficial Red 2		-1,349.00	2,991,551.00
24/03	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	QUIBDO	G. Oficial Red 2		-33.00	2,991,518.00
31/03	GT01	Intereses ganados	QUIBDO	G. Oficial Red 2		14,753.00	3,006,271.00
-----	-----	-------- FIN MOVIMIENTOS --------	----------	----------	---------	----------	----------

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por dispapeles S.A.S. NIT: 860028580-2

CS Escaneado con CamScanner

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1909 DE 2022

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO-DEPARTAMENTO DEL CHOCÒ.

INFORME FINANCIERO DEL MES DE MARZO 2023
MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO

PROYECTO (S):	**AUNAR ESFUERZO TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO-DEPARTAMENTO DEL CHOCÒ.**

CUENTA (AHORROS) No.: 979123817 — **DEL BANCO: DE BOGOTA**

VALOR CONVENIO	**$ 4,625,716,035.00**
VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 3,931,858,630.00**
VALOR APORTE DEPARTAMENTO	**$ 0.00**
VALOR APORTE MUNICIPIO	**$ 693,857,405.00**

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:

FECHA DE GIRO	GIROS	VALOR DE GIROS
	GIRO 1	$ 0.00
	GIRO 2	$ 0.00
	GIRO 3	$ 0.00
	TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 0.00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 979123817 A LA FECHA	**$ 0.00**
VALOR CONTRATADO:	$

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
001-LP-OP	YEISON ALBORNOZ RIVAS	$ 4,160,457,625.00	N/A	$ 4,160,457,625.00
001-I-CM	YORK STIVENSON PEREA AYALA	$ 465,003,732.00	N/A	$ 465,003,732.00
	TOTAL CONTRATADO			**$ 4,625,461,357.00**

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	AFECTACION RECURSOS DEL DEPARTAMENT	VALOR DEL PAGO
001-LP-OP	Acta parcial numero 1	162	1900-06-13	23-3-2023	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 500,000,000.00
VALOR TOTAL PAGADO (2)					**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 500,000,000.00**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
2023-03-31	$ 14,753.00
TOTAL (3)	**$ 14,753.00**

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
NO	NO	NO
TOTAL (4)	**$ 0.00**	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	**$ 505,000,000.00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	**$ 500,000,000.00**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	**$ 14,753.00**
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	**$ 0.00**
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	**$ 14,753.00**

DESCUENTOS BANCARIOS	**2022-03-24**	**$ 2,000,000.00**
	2022-03-24	**$ 7,100.00**
	2022-03-24	**$ 1,349.00**
	2022-03-24	**$ 33.00**

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)	**$ 3,006,271.00**
SALDO A FAVOR X DEVOLVER (Informe Final)	**.00**

OBSERVACIONES	

FIRMA

Felipe Hinestroza Trellez

FELIPE HINESTROZA TRELLEZ
Tesorero General
Secretario de hacienda

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS, COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS SOBRANTES.

Banco de Bogotá

Fogafín | Producto protegido por el Seguro de Depósitos

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2023040203CD3153521708

Comprar lo que quieres **sin importar el valor, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.**



122662 3-6

ESTUDIO DISENOS Y CONTRUCCION DE LA ESTA
CR 5 2-1
MANAGRU ,CHOCO
Entrega: UR Oficina: 2037 Gerencia Oficial 2 - Quibdó
122662

FECHA EXTRACTO Marzo - Marzo 2023
Desde: Marzo 01 Hasta: Marzo 31
Cuenta Número: 979123817
Tipo de Cuenta: Superdía Oficial
Cod. Origen: 2037
ZZ-INDIVIDUAL

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**0.00**
Total 000001 Abonos:	505,000,000.00
Total 000002 Cargos:	-500,007,100.00
Total IVA:	-1,349.00
Total 4x1000 GMF:	-2,000,033.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	14,753.00
Saldo Final:	**3,006,271.00**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
16/03	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Municipio Canton Del San Pablo	QUIBDO	G. Oficial Red 2	000000	505,000,000.00	505,000,000.00
23/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	QUIBDO	G. Oficial Red 2	000000	-500,000,000.00	5,000,000.00
23/03	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	QUIBDO	G. Oficial Red 2		-2,000,000.00	3,000,000.00
24/03	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	QUIBDO	G. Oficial Red 2	000000	-7,100.00	2,992,900.00
24/03	GT08	Cargo IVA	QUIBDO	G. Oficial Red 2		-1,349.00	2,991,551.00
24/03	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	QUIBDO	G. Oficial Red 2		-33.00	2,991,518.00
31/03	GT01	Intereses ganados	QUIBDO	G. Oficial Red 2		14,753.00	3,006,271.00
-----	-----	-------- FIN MOVIMIENTOS --------	----------	----------	---------	----------	----------

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por dispapeles S.A.S NIT 805023580-2

MINISTERIO DEL INTERIOR	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	3
	FORMATO	ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA DE LOTE (PROYECTOS DE OBRA) ANEXO 19	PÁGINA	1 de 6
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

MUNICIPIO:	Cantón de San Pablo	Nº CONVENIO:	1909 - 2022
FECHA DE ACTA INICIO:	16/12/2022	FECHA DE TERMINACIÓN DE CONVENIO:	24/03/2024
ELABORÓ:	ARQ. Gonzalo Florez	FECHA DE VISITA:	08/03/2024
TIPO DE PROYECTO: (CIC, Sacúdete, CAMs, Estaciones de Policía)	Estación de Policía		

ASISTENTES			
No.	NOMBRE	CARGO	REPRESENTA A
1	Gonzalo A Florez Perez	Sp. supervisión	Ministerio Interior
2	Yiviola Ramirez M.	S. Planeacion	Alcaldia Municipal C.P.
3	Laura Stella Cordoba	S. Infraestructura	Alcaldia Municipal cp
4	Oscar Palacios P	Alcalde	Alcalde Municipal
5			
6			
7			
8			

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:


Si es urbano:

Barrio las Brisas

Si es rural:


CROQUIS DETALLADO DEL LOTE (se debe identificar linderos respecto a lo expuesto en la escritura, identificar accesos y vías circundantes, accidentes topográficos y estructuras existentes)

Vista planta del Lote

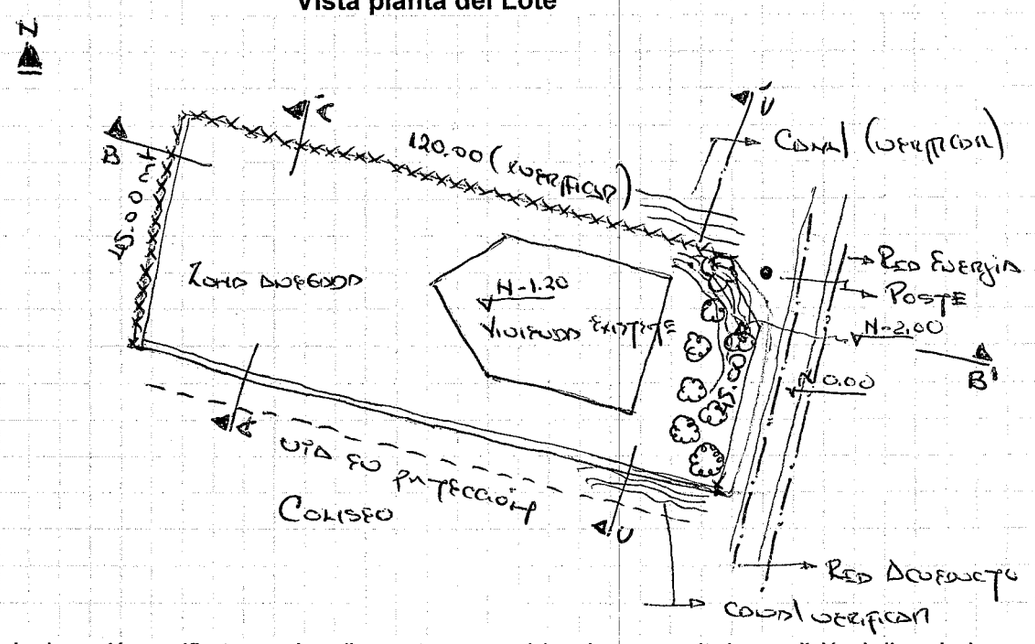

El secretario de planeación manifiesta que el predio cuenta con uso del suelo que permite la expedición de licencia de construcción

Perfil del Lote

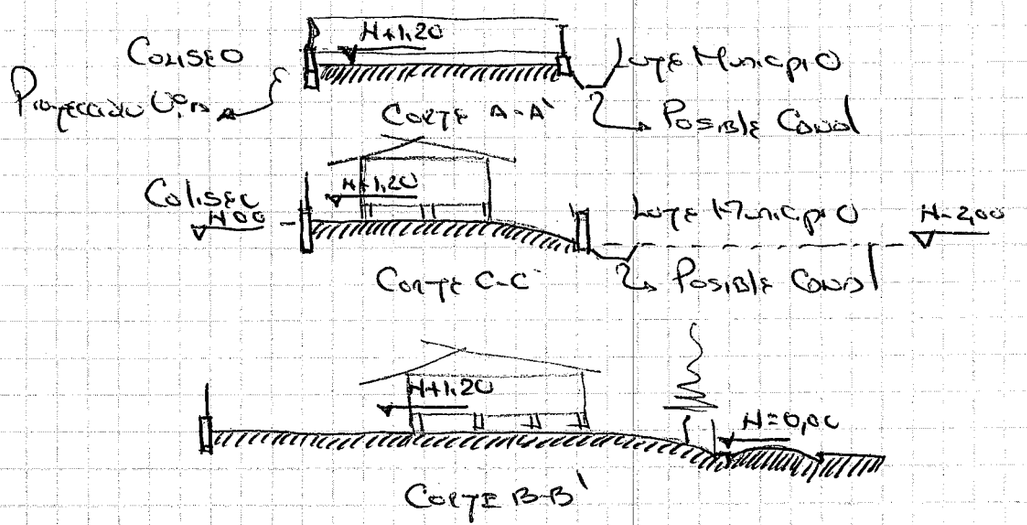

DATOS DEL PREDIO				
DESCRIPCIÓN		SI	NO	OBSERVACIONES
¿Ya inicio el proceso de contratación de estudios y diseño?:		X		Ya fueron adjudicados y contratados
Se observa algún limitante frente a la tenencia del predio:			X	
Implantación dentro del predio:		X		Estación Policía existente
Limitante física y/o jurídica:		X		Verificar presencia canales laterales y
Accesibilidad directa vía publica		X		Cra 5
Requiere adecuación del predio (demoliciones-movimiento de tierras-estabilización de taludes -etc.)		X		Posibles rellenos
Se observa algún tipo de talud aledaño			X	
Se observa algún cuerpo hídrico cerca del lote (ríos, quebradas, etc)		X		Verificar canales laterales (ubicación)
Se observa torres de alta tensión u otra estructura de riesgo para la obra			X	
Acceso a servicios públicos:	Agua	X		Acueducto veredal
	Alcantarillado	X		Traslado de red a borde de predio
	Energía	X		Llega a borde de predio
	Otros			

Documentos entregados en la visita (En caso de recibir documentación en la visita)

1.
2.
3.
4.

DESARROLLO DE LA VISITA

(Incluya una breve descripción de las actividades realizadas durante la visita)

Se da inicio a la visita de predio y comité de seguimiento del cual hacemos

1. El predio cuenta con vía de acceso por la carrera 5ª.
2. De acuerdo con el plano se verificaron medidas por frente del predio el cual presenta variación (en el plano es recto pero en visita cuenta con 2 quiebres hasta el lindero). Se debe verificar en topografía de la consultoría. Corroborar medidas laterales ya que es posible esto que el terreno se encuentren anegado.
3. Se evidencio que el área donde esta ubicado la actual estación, esta

aproximadamente 1.00 mt por encima del nivel de la vía. Sobre el costado lateral derecho del predio se encuentra aproximadamente 1.50 mt por debajo del nivel de la vía. (Posible relleno).

4. Se evidencia costado izquierdo un canal de agua, municipio manifiesta que corresponde al cauce antiguo afluente río San Pablo. Se requiere certificación por parte del municipio del estado de este cauce.
5. Se evidencia costado derecho un canal. Municipio manifiesta que corresponde a box coulvert aguas lluvias. Se requiere certificación por parte del Municipio del estado de este canal.
6. Se solicita al Municipio de Cantón de San Pablo presentar plano de alineamientos de acuerdo con normativa EOT.
7. Certificado por parte del Municipio de Cantón de San Pablo que el predio no se encuentra en una zona inundable
8. Sobre el predio no se evidencian redes de alta tensión, ni tampoco se evidencian canales o cauces de agua internos.
9. Con respecto a servicios públicos: * Energía pasa la línea de conexión al borde del predio, * Acueducto: se cuenta con el servicio a través de un acueducto veredal, * Alcantarillado: se debe verificar el punto de conexión, Ministerio del Interior aclara que las redes deben estar o ser trasladadas hasta el borde del predio. (Municipio debe adelantar las acciones necesarias).
10. Se evidencian construcciones en el predio edificación policía, pozo séptico (séptico), tanque de agua, locales de acuerdo con las obligaciones del convenio deben ser demolidas.
11. Se deben verificar las condiciones posteriores del predio dado que se encuentran muy anegadas. (condiciones de inundabilidad).

De acuerdo con las obligaciones del convenio tenemos.
Cláusula segunda: obligaciones del Municipio. I. Específicas.
Obligación n°8: se remite acta de socialización y linderos suscrita por interventor.
Obligación n°10: A la fecha el Municipio no ha adelantado las actividades de descapote, nivelado y demoliciones, retiro y disposición final de escombros, rellenos y servicios públicos. El Municipio de Cantón de San Pablo indica que está en la coordinación del inmueble para el traslado del personal de Policía. (El martes 14/03/23 municipio presentó informe al respecto).
Obligación n° 28: El Municipio a la fecha no ha remitido el documento mediante el cual se garantice el traslado de recursos de cofinanciación, a la

cuenta destino del convenio para tal fin.

Obligación 29: Remite documento de conformación recursos de refinanciación

Obligación 30: Remite de manera inmediata informe financiero del mes de diciembre 2022, enero y febrero 2023.

Obligación 31: Municipio de Cantón indica que remite el día de hoy los cronogramas de los contratos derivados, debidamente aprobados, por interventor y supervisor municipio.

Obligación 32: Remite de manera inmediata los expedientes de los meses de diciembre 2022, enero y febrero 2023.

Obligación 33: Municipio de Cantón de San Pablo, indica que el día de hoy remite los contratos derivados, actos de inicio, polizas y aprobación de polizas.

Obligación 60: Ministerio del Interior indica al Municipio de Cantón de San Pablo corregir en las polizas de los contratos derivados y incluyan al Ministerio como beneficiario.

Se anota que teniendo en cuenta que todos los contratos derivados y los actos de inicio, se programa comité mesa técnica en la DIRSE el próximo martes 14 de marzo de 2023 a las 11:00 am (Suspensión por municipio quien convoca a representantes legales de los contratos derivados).

Teniendo en cuenta lo anterior se solicita al Municipio acompañar las acciones necesarias para dar cumplimiento a los compromisos del acta y a las obligaciones del convenio

Hito: En el plano de levantamiento entregado se evidencia que por el costado derecho del lote, se encuentra presentada una vía/reducida la afectación de la vía sobre el predio e incluirlo en el plano de distribución

COMPROMISOS		
RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LIMITE CUMPLIMIENTO
Luego Cyos Su Bblo	Los del Acta	

REGISTRO FOTOGRÁFICO (Ver anexo 1- parte integral de esta acta)

FIRMA DE ASISTENTES	
Por parte de: ***MINISTERIO DEL INTERIOR***	*Por parte de:* ***MUNICIPIO***
Nombre y firma: Cargo: Email: Celular:	**Nombre y firma:** Cargo: SECRETARIA DE PLANEACION Email: Celular: 314 5057127
Por parte de:	*Por parte de:*
Nombre y firma: Cargo: Secretaria de Infraestructura Email: Celular: 3216263005	**Nombre y firma:** Cargo: Email: Celular:
Por parte de:	*Por parte de:*
Nombre y firma: Cargo: Email: Celular: 3147472886	**Nombre y firma:** Cargo: Email: Celular:
Por parte de:	*Por parte de:*
Nombre y firma: Cargo: Email: Celular:	**Nombre y firma:** Cargo: Email: Celular:
Por parte de:	*Por parte de:*
Nombre y firma: Cargo: Email: Celular:	**Nombre y firma:** Cargo: Email: Celular:

Bajo la gravedad del juramento, el MUNICIPIO certificaque los documentos en medio físico y magnético anexos son auténticos y la información es veraz y asume todas las responsabilidades de índole fiscal, penal y disciplinaria, en el evento de demostrarse que la información o parte de ella o de los estudios, no corresponden a la realidad.

MINISTERIO DEL INTERIOR	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	3
	FORMATO	ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA DE LOTE (PROYECTOS DE OBRA) ANEXO 19	PÁGINA	1 de 6
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

MUNICIPIO:	Alto Baudó	Nº CONVENIO:	1921-2022
FECHA DE ACTA INICIO:	13/12/2022	FECHA DE TERMINACIÓN DE CONVENIO:	24/03/2024
ELABORÓ:	Arq. Gonzalo Florez	FECHA DE VISITA:	09-03-2023
TIPO DE PROYECTO: (CIC, Sacúdete, CAMs, Estaciones de Policía)	Estación de Policía		

ASISTENTES

No.	NOMBRE	CARGO	REPRESENTA A
1	Gonzalo A. Florez Perez	Dp. Supervisión	Ministerio Interior
2	Jesus A. Cordoba Mosquera	Secretario Planeación	Municipio Alto Baudó
3	Ulises Palacios Palacios	Alcalde.	Alcaldía Alto Baudó
4			
5			
6			
7			
8			

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:


Si es urbano:

Manzana 9 Carrera B con Calle 4


Si es rural:

CROQUIS DETALLADO DEL LOTE (se debe identificar linderos respecto a lo expuesto en la escritura, identificar accesos y vías circundantes, accidentes topográficos y estructuras existentes)

Vista planta del Lote

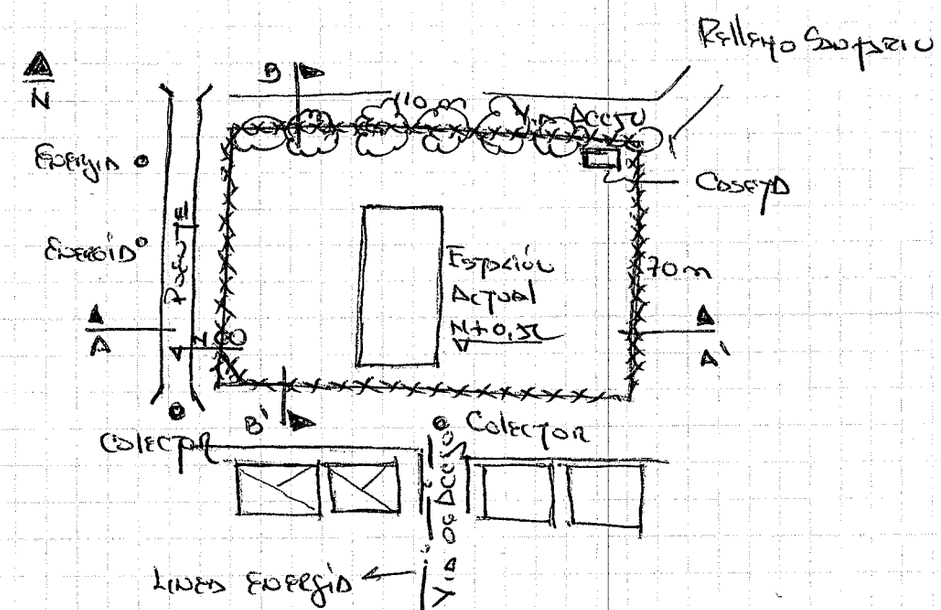

El secretario de planeación manifiesta que el predio cuenta con uso del suelo que permite la expedición de licencia de construcción

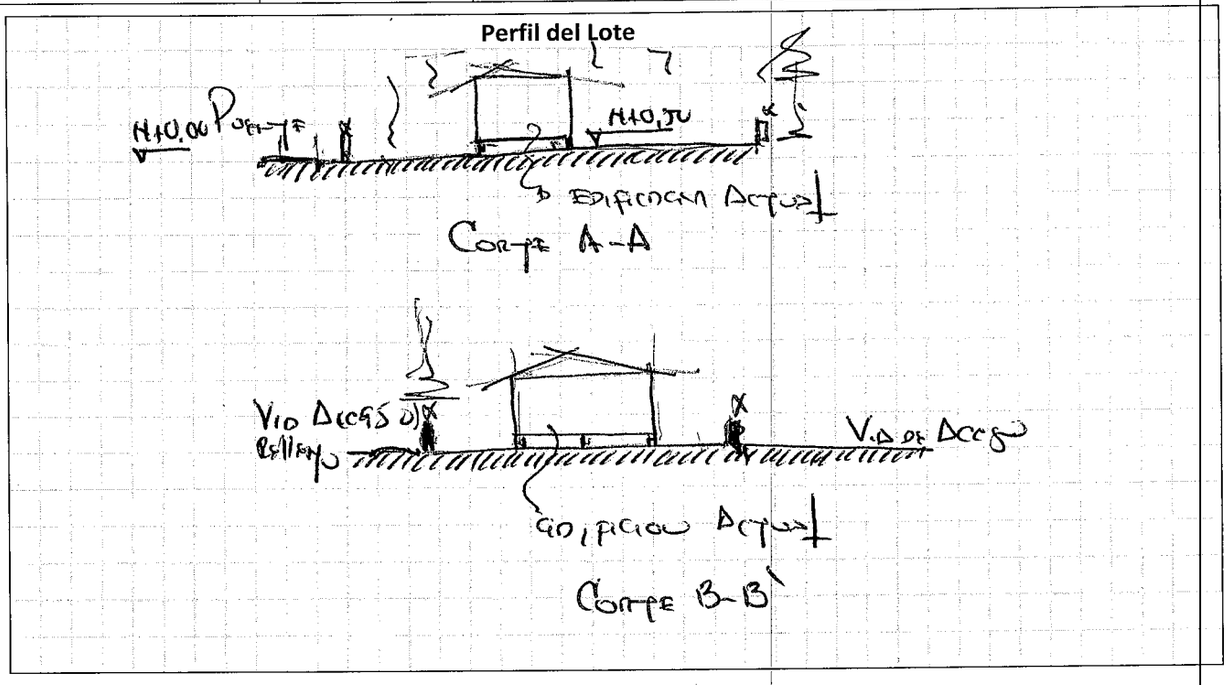

DATOS DEL PREDIO				
DESCRIPCIÓN		SI	NO	OBSERVACIONES
¿Ya inicio el proceso de contratación de estudios y diseño?:		X		SE ENCUENTRAN EN EVALUACIÓN
Se observa algún limitante frente a la tenencia del predio:			X	
Implantación dentro del predio:		X		ESTACIÓN POLICÍA EXISTENTE - VERIF. CABIDA
Limitante física y/o jurídica:			X	
Accesibilidad directa vía publica		X		EXISTE PERO SE DEBE CONSOLIDAR.
Requiere adecuación del predio (demoliciones-movimiento de tierras-estabilización de taludes -etc.)		X		ESTACIÓN EXISTENTE
Se observa algún tipo de talud aledaño			X	
Se observa algún cuerpo hídrico cerca del lote (ríos, quebradas, etc)		X		VERIFICAR COTAS PARTE POSTERIOR
Se observa torres de alta tensión u otra estructura de riesgo para la obra			X	
Acceso a servicios públicos:	Agua	X		POSTE EN BORDE PREDIO
	Alcantarillado	X		MANHOLES CERCA A PREDIO
	Energía	X		LUMINARIAS CERCA ACCESO
	Otros			

Documentos entregados en la visita (En caso de recibir documentación en la visita)

1.
2.
3.
4.

DESARROLLO DE LA VISITA

(Incluya una breve descripción de las actividades realizadas durante la visita)

SE DA INICIO A LA VISITA AL PREDIO Y COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DEL CUAL TENEMOS:

1. EL PREDIO CUENTA CON VÍA DE ACCESO DIRECTO. LA MISMA ESTÁ DETERMINADA POR EL MUNICIPIO SE SUGIERE SEA CONSOLIDADA COMO TAL YA QUE EN SITIO NO SE VE EL TRAZADO PERO NO SU CONSOLIDACIÓN.
2. DE ACUERDO CON EL PLANO SE VERIFICARON MEDIDAS, SE EVIDENCIA QUE COLINDANTES DEBE SER VERIFICADOS POR LA CONSULTORÍA (ESTUDIO TÍTULOS)

3. El lote no es completamente plano, presenta leve inclinación, aprox 50 cm (verificar topografía).
4. Por la parte posterior del predio se evidencia canal de agua, municipio manifiesta que corresponde a punto de recolección de aguas de escorrentía. Se requiere por parte del municipio el estado de este debe afectación al predio de policía.
5. No se evidencia claramente cerca o elemento que delimite el predio. (En verificación de medidas existe posibilidad) que en lindero nor-este se cruce con cabeza obicada allí. Se debe verificar).
6. Se solicita al Municipio de Alto Baudó presentar plano de disclaimers de acuerdo con normativa EOT.
7. Se requiere certificado por parte del Municipio de Alto Baudó que el predio no se cuenta en una zona inundable.
8. Se requiere certificado por parte del Municipio de Alto Baudó de la cota de inundación.
9. Sobre el predio no se evidencian redes de alta tensión, ni se evidencian canales o cauces de agua internos.
10. Con respecto a servicios públicos: * Energía para la línea de conexión provisional frente al predio, * Acueducto: La línea de conexión está a borde predio, * Alcantarillado: Se cuenta con 2 manjoles a borde de predio.
11. Se evidencia construcciones en el predio edificio de policía, dentro, los cuales de acuerdo a con las obligaciones del convenio deben ser demolidas.

De acuerdo con las obligaciones del convenio tenemos:

Obligación 10 y 11: Si bien se realizaron las publicaciones de los pliegos y se adelanta su evaluación, se requiere su proceso de contratación que permita colocar al día el cronograma de ejecución.

Obligación 27 y 28: El Municipio de Alto Baudó no ha remitido la certificación del traslado de recursos de cofinanciación a la cuenta destinada para tal fin.

Obligación 30: El Municipio de Alto Baudó no ha remitido la certificación (Resolución) de incorporación de los recursos del Ministerio al presupuesto del Municipio.

Obligación 9: El Municipio de Alto Baudó a la fecha no ha adelantado

LAS ACTIVIDADES DE DESCAPOTE, NIVELADO, EXCAVACIONES, RETIRO

El Municipio de Alto Baudó deberá remitir al Ministerio del Interior los contratos de estudios, diseños, obra, e interventoría a los mismos así como las pólizas, aprobación de pólizas y actas de inicio de manera inmediata teniendo en cuenta que se presenten atrasos en el cronograma

Se solicita al Municipio de Alto Baudó que debe acometer las acciones necesarias para dar cumplimiento al cronograma, compromisos y condiciones de las obligaciones del convenio

COMPROMISOS		
RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LIMITE CUMPLIMIENTO
Municipio Alto Baudo	Incorporación Recursos, Traslado Recursos Cofinanciación	Inmediato
	Plan Ordenamiento, Certificados Predio	Inmediato

REGISTRO FOTOGRÁFICO (Ver anexo 1- parte integral de esta acta)

FIRMA DE ASISTENTES	
Por parte de: ***MINISTERIO DEL INTERIOR***	*Por parte de:* ***MUNICIPIO***
Nombre y firma: Gonzalo P. Lopez Perea Cargo: Apoyo Supervisión Email: gonzalo.florez@mininterior.gov.co Celular: 310 6690061	**Nombre y firma:** Cargo: Secretario de Planeación Email: chambaje@hotmail.com Celular: 3207704587
*Por parte de:*_____	*Por parte de:*_____
Nombre y firma: Cargo: Alcalde Email: despachoalcalde@altobaudo-choco.gov.co Celular: 3117629151	**Nombre y firma:** Cargo: Email: Celular:
*Por parte de:*_____	*Por parte de:*_____
Nombre y firma: Cargo: Email: Celular:	**Nombre y firma:** Cargo: Email: Celular:
*Por parte de:*_____	*Por parte de:*_____
Nombre y firma: Cargo: Email: Celular:	**Nombre y firma:** Cargo: Email: Celular:
*Por parte de:*_____	*Por parte de:*_____
Nombre y firma: Cargo: Email: Celular:	**Nombre y firma:** Cargo: Email: Celular:

Bajo la gravedad del juramento, el MUNICIPIO certificaque los documentos en medio físico y magnético anexos son auténticos y la información es veraz y asume todas las responsabilidades de índole fiscal, penal y disciplinaria, en el evento de demostrarse que la información o parte de ella o de los estudios, no corresponden a la realidad.

MINISTERIO DEL INTERIOR	PROCESO	PLANEACIÓN, DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y COMUNICACIONES	VERSIÓN	05
	FORMATO	LISTA DE ASISTENTES	PÁGINA	1 de 3
			FECHA VIGENCIA	18/08/2022

Tema, reunión o actividad:	Comité Técnico Cuerpo N° 1909-2022 Municipio Campoa						
Responsable u organizador:	Ministerio - DIRAT	Dependencia:	Infraestructura				
Ciudad:	Bogotá	Lugar:	DIRAT	☐Presencial ☐Virtual	Fecha		Hora inicio
Tipo ☒ Comité ☐ Junta ☐ Reunión ☐ Inducción ☐ Reinducción ☐ Capacitación ☐ Actividades de bienestar ☐ Otro: ¿Cuál?_____					Día: 30 Mes: 03 Año: 2023		Hora final

N°	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO / ROL	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO EXTENSIÓN	FIRMA
1	Jhonny León Murillo P	1088282863	Contratista	Ingeniero	murilloperea@gmail.com	3146336505	
2	Yenon Alberto Ríos	1120834-79	Contratista	Dr. Diseño	yeial1138@gmail.com	3117653636	
3	Yiviola Ramirez Moreno	1077447541	Alcaldia CSP	Se. Planeacion	Yiviolaristo@hotmail.com	3145057429	
4	Laura Stella Cordoba Andrade	1078856262	Alcaldia C.sp	Se. Infraestructura	lcordobaandrade@gmail.com	3216263005	
5	York Stiven Perez Ayala	9737818.	Interventoria	Contratista.	yorkperez@Hotmail.com	3108365373	
6	Yeymier Yirgaky Murillo	1120707707	Interventoria	Contratista	yeymiermsn@hotmail.com	3117011569	
7	Hana Paola Suarez Serrano	1.010.233525	MIN INTERIOR	Ap. Ejecucion	mariap.suarez@mininterior.gov	3046623	
8	Carlos Alberto Perez	80420013	Ministerio	Ap. Ejecucion	carlos.perez@mi	3146090014	
9	Oscar Andrés Castellanos	1023864279	Cusep	Analista proyectos	oacastellanos@	3103989177	
10	Carlos Pallares Ville	1082845990	DCSEP	Enlace	Carlos.pallares@	3166988368	
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

- Insertar las filas que sean necesarias
- Los datos anteriormente consignados son acogidos según la política de tratamiento y protección de datos personales en el Ministerio del Interior en el marco la ley 1581 de 2012.

Escaneado con CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Humana

Fecha:	Bogotá, 30/03/2023		
Hora de inicio:	10:00	**Hora de finalización:**	12:00
Lugar:	Grupo Seguimiento a Proyectos - DIRAF		

2

ACTA 23 **– DIRAF – ARINF – 2.25**

QUE TRATA DEL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LA CONSULTORÍA CUYO OBJETO ES:

PROYECTO: Estación de Policía Cantón de San Pablo Departamento del Choco.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de asistentes
2. Lectura del acta anterior
3. Verificación de los compromisos
4. Temas a tratar

DESARROLLO

1. Verificación de asistentes.

2. Lectura del acta anterior

3. Verificación de los compromisos

4. Temas a tratar

Inicia reunión de seguimiento para el proyecto Estación de Policía Cantón de San Pablo Con presencia de la firma Consultora, Interventoria, representantes de la secretaria de planeación e Infraestructura de Choco y funcionarios del Min Interior.

* Convenio 1909 de 2022.

Presentación del Informe Topografico preliminar del proyecto.

* Se proyecta el plano Urbano, Con una Vía principal de acceso al Lote, con unas medidas aprox. 6m + Andenes 6.353 m2
* Lote relativamente plano, Con forma rectangular.
* El Lote presenta Factividad de servicios públicos, manifiesta el Contratista Consultor.
* La Conección de aguas residuales sera por la red de alcantarillado del Municipio
* Se realizan demoliciones en el Lote de edificación existente, La secretaria de planeación manifiesta el translado de los uniformados a una edificación en arriendo tomado por el Municipio.
* Por parte de la Diraf, se entrega documento donde se encuentran estipulados los entregables del Componente Topografico.

se presenta Informe preliminar de Bioclimática.

Clima – Calido – humedo Isotermal

Se describen las Condiciones climaticas del lugar las Cuales arrojan las

estrategias a Implementar
- Protección Solar
- Ventilación Natural
- Acondicionamiento de aire (Ventilación Mecanica).

la Implantación propuesta porel Arq. Penco Bioclimatico, es Con las fachadas Cortas en sentido de la afectación Solar.

* Framentación de las edificaciones para el aprovenchamiento del Viento.
* Se realiza la recomendación por parte de Bioclimatica en elevar las edificaciones del suelo, para permitir la permeabilidad del viento.

Componente Arquitectonico.

* Lote medianero, Con un nivel de seguridad III, en donde el Consultor presenta dos propuestas de Diseño.
  1. Propuesta con Edificaciones de un nivel.
  2. Propuesta con Edificaciones de dos niveles en la Zona de alojamientos.

De acuerdo a lo anterior el Consultor manifiesta que va Diseñar sobre la propuesto 1 (un Nivel).

* Se Solicita plano de aislamiento, segun Como lo dicta la norma del sector.

Compromisos

* Informe topografico avalado por la Interventoria para la fecha 04/03/2023
* Avance del Diseño Arquitectonico avalado por la Interventoria 10/04/2023
* Avance Informe Bioclimatico 10/04/2023
* Factivilidad de servicios Públicos 10/04/2023
* Requisitos Empresa de Energía. 10/04/2023

- Se proyecta Reunión para la fecha 10/04/2023, Con previo envio de Correo para agendarla por la Secretaria de la Dirección de Infraestructura.
- Se reitera el poco tiempo para el desarrollo del Diseño del proyecto, de acuerdo a la fecha estimada de entrega que es para el 07/05/2023.

Elaborado por: PRO 06 JORGE ACOSTA

Carrera 59 N° 26-21 CAN, Bogotá
Teléfonos: 5159000 Ext. 9845
diraf.arinf-jefat@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Fecha:	Bogotá, 30/03/2023		
Hora de inicio:	10:00	**Hora de finalización:**	12:00
Lugar:	Grupo Seguimiento Proyectos - DIRAF		

ACTA 23 – DIRAF – ARINF – 2.25

QUE TRATA DEL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LA CONSULTORÍA CUYO OBJETO ES:

ASISTENTES

GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANÍA	TELÉFONO	FIRMA
	John Velasquez	Arq. Diseñador	jovelasquezb@unal.edu.co	1053833304	3137368808	
	Wilmer León Murillo	Consultor	murillogeleaz@gmail.com	1064662286	3146336835	
	York Fiveconteras Ayala	Interventoría	yorkpera@Hotmail.com	91732848	3108365134	
	Yeyier Yurgaky Murillo	Interventoría	yeyniermsn@hotmail.com	11707707	3117011569	
	YILIOLA RAMIREZ M.	S. PLANEACION	Yiliola1@hotmail.com	1077447541	3145057172	
	Laura Stella Cordoba A.	S. infraestructura	cordobaandrades@gmail.com	1078856262	3216213005	
	Sandra Franco Pro	Tec. Icm Inter	franco.dnec@mail.com	30420013	2100650614	
	Lado Tello Tuberlo	Bioclimático	direccion@arquitecturamoverde.com	7715801	3151089762	
	Maria Paula Suarez Serrano	Min Interior	mariap-suarez@mininterior.gov.co	1010233525	3046622842	

Carrera 59 26 -21CAN
Teléfono 5159000 Extensión 9845
Diraf.arinf-jefat@policia.gov.co
www.policia.gov.co

ACTA DE INICIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°.	001-LP-OP- 2023
CONTRATANTE:	ALCALDÍA EL CANTÓN DEL SAN PABLO-CHOCÓ
REPRESENTANTE LEGAL:	ÓSCAR ANTONIO PALACIOS PALACIOS
CONTRATISTA:	YEISON ALBORNOZ RIVAS.
REPRESENTANTE LEGAL:	YEISON ALBORNOZ RIVAS
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCO.
VALOR:	CUATRO MIL CIENTO SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($4.160.457.625,00 COP).
FECHADE INICIO	8 DE MARZO DE 2023
FECHA DE FINALIZACION	8 DE DICIEMBRE DE 2023
FORMA DE PAGO:	EL MUNICIPIO PAGARÁ EL VALOR DEL CONTRATO DE LA SIGUIENTE MANERA: UN ANTICIPO EQUIVALENTE AL CUARENTA POR CIENTO (40%) DEL VALOR DEL CONTRATO, Y EL SALDO RESTANTE SERÁ PAGADO MEDIANTE PAGOS PARCIALES O FINAL, DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA REALMENTE EJECUTADAS QUE HAYAN SIDO APROBADAS POR LA INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. EN TODO CASO, EL PAGO DE LAS ACTAS PARCIALES Y/O FINAL, SERÁ REALIZADO DENTRO DE LOS 30 DÍAS SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA FACTURA CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES.PAGOS UNA VEZ EL INTERVENTOR HAYA PRESENTADO LOS INFORMES DE

	EJECUCIÓN, CUANTIFICADOS Y VERIFICADOS POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO, EL CUAL EXPEDIRÁ LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007, DE ACUERDO CON LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES QUE DEL MISMO SE HAGA EN EL PRESUPUESTO Y A LA PROGRAMACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA – PAC Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PAGOS DE SSS
PLAZO DE EJECUCIÓN	EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO ES HASTA NUEVE (09) MESES, SIGUIENTES A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.
SUPERVISOR	YIVIOLA RAMIREZ MORENO

El lunes 28 de febrero de 2023 se reunieron los señores **YEISON ALBORNOZ RIVAS**; en calidad de contratista, mayor de edad identificado con numero de cedula 11.708.479 expedida en Istmina**,** quien para los efectos del presente contratos será denominada en calidad de EL **CONTRATISTA** y la señora **YIVIOLA RAMIREZ MORENO** identificado con cedula de ciudadanía Nº 1.077.447.541 de Quibdó, en calidad de EL SUPERVISOR. Con el objetivo de dar inicio al contrato de **OBRA N.º 001-LP-OP** cuyo objeto**: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCO.**

Previo a las siguientes consideraciones:

1. Que el día 23 del mes de febrero mediante **resolución No. 0085** DE 2023 se adjudicó el proceso de selección No. **001- 2023 (MCSP-SP- LP-OP -001-2023**)" cuyo objeto es: **AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCO.**
2. Que mediante **resolución 0117**del día 28 de febrero de 2023 se realizaron las respectivas aprobaciones de las pólizas de garantía única de cumplimiento. Así las cosas, los participantes acuerdan dar inicio al contrato **N.º 001-I-CM** cuyo objeto es: **AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCO.** A partir del día 28 del mes de febrero del año 2023.

Para mayor constancia se firma en managru, por quienes en ella intervienen el día 28 de febrero del año 2023.

OSCAR ANTONIO PALACIOS PALCIOS Alcalde municipal	**YIVIOLA RAMIREZ MORENO** Supervisora
YEISON ALBORNOZ RIVAS Contratista obra	**YORK STIVENSON PEREA AYALA.** Contratista interventoría

ACTA DE INICIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°.	001-I-CM de 2023
CONTRATANTE:	ALCALDÍA EL CANTÓN DEL SAN PABLO- CHOCÓ
REPRESENTANTE LEGAL:	ÓSCAR ANTONIO PALACIOS PALACIOS
CONTRATISTA:	YORK STIVENSON PEREA AYALA.
REPRESENTANTE LEGAL:	YORK STIVENSON PEREA AYALA
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION ESTACION DE LA POLICIA EN EL MUNICIPIO DE EL CANTON DE SAN PABLO DEPARTAMENTO CHOCO".
VALOR:	CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($465.033.732,00 COP).
FECHA DE INICIO	8 DE MARZO DE 2023
FECHA DE FINALIZACION	8 DE DICIEMBRE DE 2023

Dirección: Cra. 5 No. 2-1, Edificio de la Alcaldía Municipal, Barrio Divino Niño - Managrú. Código Postal: 272040
Teléfono: 3127954915 - 3215059736 - 3113756309.
e-mail: alcaldía@elCantóndesanpablo-choco.gov.co, contactenos@elCantóndesanpablo choco.gov.co
www.elCantóndesanpablo-choco.gov.co

FORMA DE PAGO:	LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO DE ACUERDO A SU DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y DE LA SIGUIENTE FORMA: NO SE CONSIDERA ANTICIPO. EL VALOR DEL CONTRATO SE PAGARÁ MEDIANTE ACTAS PARCIALES DE AVANCE DE LA INTERVENTORÍA; DONDE LA PRIMERA ACTA SE PAGARÁ CUANDO EL CONTRATISTA HAYA EJECUTADO CUANDO MENOS EL VEINTICINCO POR CIENTO (25%) DE LA INTERVENTORÍA MEDIDA EN TÉRMINOS DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA. ESTAS ACTAS PARCIALES DE AVANCE DE INTERVENTORÍA SERÁN ELABORADAS POR EL
	INTERVENTOR Y REFRENDADAS CON EL VISTO BUENO DEL SUPERVISOR ASIGNADO. EL MUNICIPIO REALIZARÁ LOS PAGOS UNA VEZ EL INTERVENTOR HAYA PRESENTADO LOS INFORMES DE EJECUCIÓN, CUANTIFICADOS Y VERIFICADOS POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO, EL CUAL EXPEDIRÁ LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007, DE ACUERDO CON LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES QUE DEL MISMO SE HAGA EN EL PRESUPUESTO Y A LA PROGRAMACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA – PAC Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PAGOS DE SSS
PLAZO DE EJECUCIÓN	EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO ES HASTA NUEVE (09) MESES, SIGUIENTES A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.
SUPERVISOR	YIVIOLA RAMIREZ MORENO

El martes 8 de MARZO de 2023 se reunieron los señores **YORK STIVENSON PEREA AYALA**.; en calidad de contratista, mayor de edad identificado con numero de cedula 9.732.848 de armenia**,** quien para

Dirección: Cra. 5 No. 2-1, Edificio de la Alcaldía Municipal, Barrio Divino Niño - Managrú. Código Postal: 272040
Teléfono: 3127954915 - 3215059736 - 3113756309.
e-mail: alcaldía@elCantóndesanpablo-choco.gov.co, contactenos@elCantóndesanpablo choco.gov.co
www.elCantóndesanpablo-choco.gov.co

los efectos del presente contratos será denominada en calidad de EL **CONTRATISTA** y la señora **YIVIOLA RAMIREZ MORENO** identificado con cedula de ciudadanía Nº 1.077.447.541 de Quibdó, en calidad de EL SUPERVISOR. Con el objetivo de dar inicio al contrato de Interventoría N.º 001-I-CM cuyo objeto**: INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION ESTACION DE LA POLICIA EN EL MUNICIPIO DE EL CANTON DE SAN PABLO DEPARTAMENTO CHOCO".**

Previo a las siguientes consideraciones:

1. Que el día 20 del mes de febrero mediante **resolución No. 0066** DE 2023 se adjudicó el proceso de selección No. **001 de 2022 (MCSP-SP-I-CM-001-2023**)" cuyo objeto es: **LA INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION ESTACION DE LA POLICIA EN EL MUNICIPIO DE EL CANTON DE SAN PABLO DEPARTAMENTO CHOCO".**
2.
3. Que mediante **resolución 0072** del día 21 de febrero de 2023 se realizaron las respectivas aprobaciones de las pólizas de garantía única de cumplimiento. Así las cosas, los participantes acuerdan dar inicio al contrato **N.º 001-I-CM** cuyo objeto es: **LA INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION ESTACION DE LA POLICIA EN EL MUNICIPIO DE EL CANTON DE SAN PABLO DEPARTAMENTO CHOCO**". A partir del día 8 del mes de marzo del año 2023.

Para mayor constancia se firma en managru, por quienes en ella intervienen el día 8 de marzo del año 2023.

YIVIOLA RAMIREZ MORENO.
Supervisor

YORK STIVENSON PEREA AYALA.
Contratista
