SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CHEQUEO ACTA PARCIAL CONTRATOS DE OBRA	PROCESO OBRA	
		CONTRATO DE OBRA	LP-SPM-019-2022

OBJETO CONTRATO DE OBRA	CONTRATISTA	C.C.P INGENIEROS NIT. 901.595.820-4 R/L. Eliana Margarita Otero Perez
MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LOS BARRIOS PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	**VALOR DEL CONTRATO:** CUATRO MIL ONCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTE Y OCHO PESOS M/CT ($4.011.671.268,00).	
	SALDO A LA FECHA:	
	ACTA PARCIAL: No: 1	**VALOR DEL ACTA** $ 1.202.560.618,00
	PLAZO INICIAL: 4 MESES	**FECHA** 15-sep-23
PROCESO INTERVENTORIA		
CMA-SPM-022-2022		
CONTRATO INTERVENTORIA	Para revisión del secretario de infraestructura deben completarse las tres verficaciones de cumplimiento en el orden establecido	
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA LP-SPM-019-2022 CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LOS BARRIOS PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"		

ID	CRITERIO	CUMPLIMIENTO				DEPENDENCIA	
		1. Aprobó Interventoría	2.Verificó Apoyo a la Supervisión	3. VB Personal especifico SIM		EXPEDIENTE SIM	TESORERIA
1	**ADMINISTRATIVO**						
1.1	Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal (CDP) que apliquen		PSV			*Original archivado previamente	Copia
1.2	Copia del desglose del AIU y factor prestacional aprobado		PSV			Copia	N.A
1.3	Certificado(s) de Registro Presupuestal (CRP) que apliquen		PSV			Original archivado previamente	Copia
1.4	Afiliacion del personal requerido , salario, porcentaje dedicación e IBC de afilación (Según Formato) actualizado si se han realizado cambios de personal previamente autorizados. Acompañado de hojas de vida aprobadas de por la interventoría si el contrato lo requiere.		PSV		V.B Responsable verficacion jurídica	Original	N.A
1.5	Pagos mensuales Seguridad Social y Parafiscales o afiliaciones del mes		PSV		V.B Responsable verficacion jurídica	Original	Copia
1.6	Copia de Acta de Inicio		PSV			Original archivado	Copia
1.7	Copia de Póliza del contrato, Aprobación de Póliza, Recibo pago de Pólizas		PSV			"Original" archivado	Copia
1.8	Copia Contrato y/o modificaciones		PSV			"Original" archivado	Copia
1.9	Copia RUT (actualizado)		PSV			"Original" archivado	Copia
1.10	Copia de Constitución del consorcio (si aplica)		PSV			"Original" archivado	Copia
1.11	Imprimir el estado de aprobación del tramite del pago debe estar en estado APROBADO en SECOP II.					Copia	Copia
2	**PROYECTOS POR REGALIAS**						
2.1	Imprimir el estado actual del proyecto en Gesproy que refleje el avance acorde a la fecha o en su defecto el soporte impreso de la información enviada al funcionario responsable de la plataforma		N/A		V.B responsable de GESPROY	Copia	N.A
2.2	Copia de los documentos aprobados y/o soporte de la información enviada al funcionario responsable de la plataforma - en la plataforma SUIFP		N/A			Copia	N.A
3	**JURIDICO**						
3.1	Renuncia del Anticipo (Según Modificatorio)		N/A		V.B Responsable verficacion jurídica	*Original	Copia
3.2	Declaración Juramentada de pagos de seguridad social y aportes parafiscales. Firmada por el Representante					Original	Copia
3.3	Certificado de pago de seguridad social por parte de interventoria		PSV			*Original	Copia
3.4	Certificado de Cumplimiento para pago por parte de interventoria		PSV			Original	Copia
3.5	Modificaciones/actualizaciones a Licencias y/o Permisos que apliquen		N/A			*Original	N.A
3.6	**OFICIO REMISORIO DE CUENTA**					recibido tesorería	Copia
4	**FINANCIERO/CONTABLE**		PSV		V.B responsable de CALIDAD	*Copia	Copia
4.1	Copia Certificación Bancaria		N/A			Original	Copia
4.2	Certificado de egresos de pagos anteriores		N/A			*Original	Copia
4.3	Cierre de Fiducia (Si el Anticipo fue Ejecutado en su totalidad)		PSV			Copia	Original
4.4	Factura Original o Cuenta de Cobro						

5	TECNICO						
5,1	Certificado de interventoría detallado de avance de obra y planilla de seguridad social				V.B responsable de CALIDAD	Original	N.A
5,2	Certificado de ensayos según normas técnicas vigentes realizados por la interventoria y el contratista de obra, se anexan ensayos					Original	N.A
5,3	Informes semanales de interventoría correspondientes al periodo a cobrar					Original	N.A
5,4	Bitácora de obra del periodo a cobrar					Original	
5,5	Registro fotográfico del periodo a cobrar					Copia	N.A
5,6	Cronograma de la obra debidamente aprobado por interventoría, Según lo ejecutado aclarando las reprogramaciones o balances realizados a la fecha					Original	N.A
5,7	Acta Parcial Literal					*Original	copia
5,8	Acta Parcial Numérica					*Original	N.A
5,9	Justificación de imprevistos si se requiere		N/A				
5,10	Comités de obra originales del periodo					*Original	
5,11	Memoria de Cantidades de obra ejecutadas (firmada por Interventor, Contratista)					*Original archivado previamente	N.A
	observaciones						

NOTA: esta lista siempre debe ser verificada de acuerdo con las condiciones especificas de cada contrato, para lo cual se debe tener en cuenta el anexo técnico, el contrato, pliego de condiciones y demas documentos de acuerdo al tipo de contrato.

De acuerdo con el DECRETO 1080/2015, dentro de los principios que deben gobernar una correcta GESTIÓN DE DOCUMENTOS se encuentra la Eficiencia, Economía, Control Y Seguimiento, Protección Del Medio Ambiente, entre otros. Por lo cual se debe tener en cuenta lo siguiente, al momento de presentar documentos que posteriormente vayan a ser parte del EXPEDIENTE:

* si ya se cuenta previamente con los DOCUMENTOS originales y o copias dentro de los EXPEDIENTES del contrato, no se hace necesario anexar nuevamente la información con cada cuenta. APLICA PARA LA LISTA "EXPEDIENTE"

Con la finalidad de tener los expedientes en el orden exigido, los Documentos entregados deben contar con SEPARADORES QUE PERMITAN SU FÁCIL IDENTIFICACIÓN, adicionalmente DEBEN ESTAR LEGADOS CON LAS MEDIDAS DE HOJA TAMAÑO OFICIO, independientemente del tamaño en el que vengan impresos y entregarse en carpeta tipo archivo de YUTE 600 gr, con grosor maximo de aproximado 200 folios (no es necesario foliar)

Actualizacion 2/11/22

Nombre y firma	Nombre y firma	Nombre y firma
1.Represente legal interventoría	2. Apoyo a la supervision	3. Secretario de Infraestructura

C.C.P
INGENIEROS S.A.S

EXPEDIENTE SIM

Dirección: Carrera 6 No. 65-24
Email: ccpconstrucciones22@gmail.com
Montería, Córdoba - Colombia

C.C.P
INGENIEROS S.A.S

ADMINISTRATIVO

Dirección: Carrera 6 No. 65-24
Email: ccpconstrucciones22@gmail.com
Montería, Córdoba - Colombia

C.C.P
INGENIEROS S.A.S

Copia del Certificado Disponibilidad Presupuestal (CDP)

Dirección: Carrera 6 No. 65-24
Email: ccpconstrucciones22@gmail.com
Montería, Córdoba - Colombia

MONTERÍA

Alcaldia de Monteria

OFICINA DE PRESUPUESTO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Solicitud Nº	22001849
CDP No.	22001403-R
miércoles 08 febrero 2023	

CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones Alcaldia de Monteria Para la vigencia Fiscal de 2023 se tiene Disponibilidad Presupuestal para las siguientes partidas asi:

Rubro	Descripcion	Tipo de Financiacion	Valor C.D.P.	Valor Disponible.
R-2.3.2.02.02.006-24.7	Servicios de la construcción (Recursos Credito FINDETER)	1.3.3.5.04 - R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	$ 4.011.661.268,00	$ 0,00
		Totales...	$ 4.011.661.268,00	$ 0,00

Total CDP en letras: CUATRO MIL ONCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA y OCHO Pesos

El certificado No. 22001403-R se emite en Monteria el dia miércoles 08 de febrero de 2023 como requisito previo a MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LOS BARRIOS PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

Dairo Hoyos Bedoya

Jefe de Presupuesto

Solicito: HUGO KERGUELEN		
Elaboró: ADMIN	Imprimió: ANGELICA LLORENTE RAMOS	IP Imprimió: 186.43.33.250

MONTERÍA
Gobierno de la GENTE
Calle 27 # 3-16, Edificio Antonio de la Torre y Miranda
www.monteria.gov.co
Monteria, Cordoba

C.C.P
INGENIEROS S.A.S

Copia del desglose del AIU y factor prestacional aprobado

Dirección: Carrera 6 No. 65-24
Email: ccpconstrucciones22@gmail.com
Montería, Córdoba - Colombia

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

AIU - PGIO - PAPSO

COSTO DIRECTO DE OBRA (CD)	**$2.933.296.162**
TERMINO DE EJECUCIÓN DE OBRA (MESES)	**4**

A. ADMINISTRACIÓN

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL CARGO	DEDICACIÓN MES	SALARIO MENSUAL	FACTOR PRESTACIONAL	PLAZO CONSTRUCCION	CANTIDAD DE PERSONAL / DEDICACION/SALARIO / PLAZO/FACTOR PRESTACIONAL
A		C	D	E	D	F = A * B * C * D * E
1.1 PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALISTAS						
1	Director de Obra	100%	$ 5.550.000,00	1,5900	4	$34.980.000,00
2	Residente de Obra	100%	$ 3.000.000,00	1,6000	4	$38.400.000,00
2	Inspector de Obra	100%	$ 2.000.000,00	1,7100	4	$27.360.000,00
1	Ingeniero con postgrado en vias	30%	$ 3.700.000,00	1,5900	4	$7.059.600,00
1	Ingeniero Residente electrico	20%	$ 2.700.000,00	1,60	4	$3.456.000,00
1	Ingeniero con postgrado Geotecnia	30%	$ 3.700.000,00	1,59	4	$7.059.600,00
1	Ingeniero con postgrado ambiental	100%	$ 3.700.000,00	1,5900	4	$23.532.000,00
1	Trabajador(a) Social	100%	$ 2.800.000,00	1,5900	4	$17.808.000,00
1	Profesional SISOMA	100%	$ 2.800.000,00	1,6000	4	$17.920.000,00
1.2 PERSONAL TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO						
2	TOPOGRAFO	100%	$ 2.000.000,00	1,6000	4	$25.600.000,00
4	CADENEROS	100%	$ 1.160.000,00	1,7900	4	$33.222.400,00
2	MAESTRO GENERAL	100%	$ 2.000.000,00	1,6000	4	$25.600.000,00
1	ALMACENISTA	100%	$ 1.200.000,00	1,7400	4	$8.352.000,00
2	PERSONAL DE SERVICIOS DE VIGILANCIA	100%	$ 1.200.000,00	1,7200	4	$16.512.000,00
1.3 PERSONAL ADMINISTRATIVO						
1	Secretaria	100%	$ 1.160.000,00	1,7200	4	$7.980.800,00
1	Abogado	10%	$ 2.600.000,00	1,5900	4	$1.653.600,00
1	Auxiliar Contable	10%	$ 1.200.000,00	1,7200	4	$825.600,00
1	Conductor	100%	$ 1.200.000,00	1,7200	4	$8.256.000,00
1	Mensajero	100%	$ 1.160.000,00	1,7600	4	$8.166.400,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$313.744.000**

2. GASTOS OPERACIONALES

CAMPAMENTO

DESCRIPCION	AREA (M2)	COSTO ($/M2.MES)	COSTO MES	DURACION MESES	VALOR ($)
Campamento de obra para depósito de materiales, equipos, personal, exclusivo para obra,	50,00	50.000,00	$ 2.500.000,00	4	$ 10.000.000,00
Campamento oficina para personal y atención al público, incluye servicios públicos provisionales	50,00	30.000,00	$ 1.500.000,00	4	$ 6.000.000,00

OTROS GASTOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO MES	CANTIDAD/ DEDICACION	DURACION MESES	VALOR ($)
Toma de Muestras, Ensayos de Laboratorio, resultados	1	$ 5.500.000	1,00	4,00	$ 22.000.000
Mantenimientos, Equipos, Herramientas	1	$ 1.500.000	1,00	4,00	$ 6.000.000
Registro Fotografico, Videos, Informes	1	$ 100.000	1,00	4,00	$ 400.000
Registro y elaboracion planos record	1	$ 500.000	1,00	4,00	$ 2.000.000
Gastos de mobiliario, papelería, fotocopias, etc	1	$ 1.000.000	1,00	4,00	$ 4.000.000
Sotfware/Hardware para obra	1	$ 750.000	1,00	4,00	$ 3.000.000
Vehiculo Campero 4x4 min 2000cc	1	$ 4.500.000	1,00	4,00	$ 18.000.000
Equipo de topografia	1	$ 4.500.000	1,00	4,00	$ 18.000.000

SUBTOTAL GASTOS OPERACIONALES MENSUALES	**$ 89.400.000,00**
TOTAL COSTOS PERSONAL + GASTOS OPERACIONALES POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN	**$403.144.000,00**
TOTAL COSTOS PERSONAL + GASTOS OPERACIONALES POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN EN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO	**13,74%**

3. IMPUESTOS Y GARANTÍAS

3.1 IMPUESTOS

DESCRIPCIÓN	VR. BASE	IMPUESTO %	VALOR ($)
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	$2.933.296.162	5%	$146.664.808

ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES		$2.933.296.162	2%	$58.665.923
ESTAMPILLA PROCULTURA		$2.933.296.162	1%	$29.332.962
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR		$2.933.296.162	3%	$87.998.885
ESTAMPILLA PRO DEPORTE		$2.933.296.162	1%	$29.332.962
SUBTOTAL IMPUESTOS				**$351.995.539**
3.2 GARANTIAS				
DESCRIPCIÓN				**VALOR TOTAL ($)**
CUMPLIMIENTO, CALIDAD DE BIENES, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES, ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA,RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL				$36.850.424
SUBTOTAL GARANTÍAS				**$36.850.424**
TOTAL IMPUESTOS Y GARANTÍAS				**$388.845.964**
TOTAL IMPUESTOS Y GARANTÍAS EN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO				**13,26%**
A. ADMINISTRACIÓN (1 + 2 + 3)				**$791.989.963,65**
A. ADMINISTRACIÓN (1 + 2 + 3)				**27,00%**
I. IMPREVISTOS				**$29.332.962**
I. IMPREVISTOS				**1,00%**
U. UTILIDAD				**$146.664.808**
U. UTILIDAD				**5,00%**
A..I.U. (ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD)				**$967.987.733,35**
			A..I.U. (ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD)	**33,00%**
P. PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO)				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**VR. BASE**	**CANTIDAD**	**VALOR ($)**
1. IMPLEMETACIÓN PGIO - EJE S&SO				
Kit de Emergencias El Kit incluye: extintor de 10 lbs (señalización en acrílico de 22 cm x 15 de extintor), camilla rígida, reflectivos y botiquín con elementos necesarios)	UND	$165.000,00	1,00	$165.000,00
Kit para trabajos con soldadura	UND	$53.000,00	3,00	$159.000,00
Kit señalización SST	UND	$25.000,00	3,00	$75.000,00
Examen médico ocupacional de ingreso y egreso	UND	$50.000,00	20,00	$1.000.000,00
Generación de informes, impresión de información, adquisición de información, capacitaciones y mantenimiento del plan de implementación	MES	$450.000,00	4,00	$1.800.000,00
TOTAL IMPLEMETACIÓN PGIO - EJE S&SO POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN				**$3.199.000,00**
TOTAL IMPLEMETACIÓN PGIO - EJE S&SO POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN EN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO				**0,11%**
2. IMPLEMETACION PGIO - EJE AMBIENTAL				
Kit señalización Ambiental El kit incluye: señal de 15 x 15 cm - reciclable, señal de 15 x15 cm- orgánico, señal de 15 x 15 cm - sustancias peligrosas.	UND	$20.000,00	2,00	$40.000,00
Kit para desperdicios sólidos	UND	$430.000,00	2,00	$860.000,00
Lavado de Herramientas	UND	$135.000,00	2,00	$270.000,00
Cubrimiento de Materiales Granulares	MES	$30.000,00	4,00	$120.000,00
Cubrimiento de escombros	MES	$30.000,00	4,00	$120.000,00
Alquiler baño portatil Suministro de baño portatil	UND	$340.000,00	4,00	$1.360.000,00
Kit aseo Edificación	UND	$25.000,00	2,00	$50.000,00
Kit aseo Infraestructura	UND	$172.000,00	2,00	$344.000,00
Brigada de aseo	UND	$3.916.000,00	4,00	$15.664.000,00
Kit de derrames pequeños	UND	$20.000,00	2,00	$40.000,00
Generación de informes, impresión de información, adquisición de información, capacitaciones y mantenimiento del plan de implementación	MES	$450.000	4,00	$1.800.000,00
TOTAL IMPLEMETACIÓN PGIO - EJE AMBIENTAL POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN				**$20.668.000,00**
TOTAL IMPLEMETACIÓN PGIO - EJE AMBIENTAL POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN EN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO				**0,70%**
3. IMPLEMETACION PGIO - EJE DE SEGURIDAD Y/O OBRA				
cerrmiento tipo 3: consta de postes de madera rolliza de 2m de altura libre,enterrados como minimo 0,3m, entre los postes debe haber doble cinta de demarcacion de peligro calibre 4.con franjas amarillas y negras y con el texto "peligro". Adicionalmente entre postes debe disponerse de tela verde para cerramiento con una altura igual al poste.Separacion entre postes maximo de 5m.	ML/MES	$14.979,00	1.800,00	$26.962.200,00

TOTAL IMPLEMETACIÓN PGIO -EJE DE SEGURIDAD Y/O OBRA POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN				**$26.962.200,00**
TOTAL IMPLEMETACIÓN PGIO -EJE DE SEGURIDAD Y/O OBRA POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN EN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO				**0,92%**
4. IMPLEMETACION PGIO - EJE MANEJO DE TRAFICO				
SEÑALES PREVENTIVAS	UND/MES	$49.450,00	12,00	$593.400,00
SEÑALES REGLAMENTARIAS	UND/MES	$49.450,00	9,00	$445.050,00
SEÑALES INFORMATIVAS	UND/MES	$49.450,00	12,00	$593.400,00
PALETERO CON DOTACION MAS PRESTACIONES	UND/MES	$1.958.000,00	4,00	$7.832.000,00
TOTAL IMPLEMETACIÓN PGIO - EJE MANEJO DE TRAFICO POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN				**$9.463.850,00**
TOTAL IMPLEMETACIÓN PGIO - EJE MANEJO DE TRAFICO POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN EN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO				**0,32%**
P. PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO) (1 + 2 + 3 + 4)				**$60.293.050**
P. PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO) (1 + 2 + 3 + 4)				**2,06%**
COSTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA "PAPSO"				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**VR. BASE**	**CANTIDAD**	**VALOR ($)**
Tapa boca reutilizable en tela	UND	$1.000,00	2.500,00	$2.500.000,00
Guantes de nitrilo o latex para actividades de limpieza y desinfección	Par	$598,00	2.500,00	$1.495.000,00
Pendones informativos sobre el COVID -19	UND	$60.000,00	2,00	$120.000,00
Pasa calle con información sobre el inicio de actividades y compromiso con la implementación de medidas, para informar a la comunidad aledaña al	UND	$150.000,00	2,00	$300.000,00
Aviso sobre las tecnicas de lavado de mano, que se debe ubicar en cada lavamanos.	UND	$10.000,00	2,00	$20.000,00
Caneca Roja de 120 lts	UND	$85.000,00	2,00	$170.000,00
bolsas para las canecas de residuos	UND	$1.600,00	300,00	$480.000,00
Set x2 Tapetes Desinfectantes 60x40 cm	UND	$150.000,00	1,00	$150.000,00
Lavamanos portatil	UND	$840.000,00	2,00	$1.680.000,00
Toallas individuales desechables.	UND	$80,00	17.998,00	$1.439.840,00
Jabon líquido antiséptico	Litro	$3.995,00	38,27	$152.888,65
Jabón desengrasante industrial para limpiar las superficies.	Litro	$6.000,00	25,76	$154.560,00
Hipoclorito de uso domestico	Litro	$2.774,00	12,48	$34.619,52
Gel antibacterial (Concentración de alcohol 70 % o superior).	Litro	$11.085,00	9,45	$104.753,25
Alcohol en concentración de 70% o superior.	Litro	$9.000,00	76,54	$688.860,00
Dispensadores de jabón/gel antibacterial de pedal	UND	$150.000,00	2,00	$300.000,00
Tarros atomisadores de alcohol	UND	$1,00	2,00	$2,00
Fumigador Pulverizadora Manual de 20 litros	UND	$124.900,00	2,00	$249.800,00
Brigada de control de ingreso y salida de personal, limpieza y desinfeccion de areas de trabajo (2 ayudantes) incluyen prestaciones	Mes	$3.916.000,00	4,00	$15.664.000,00
TOTAL COSTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA "PAPSO"				**$25.704.323**
% COSTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA "PAPSO"				**0,88%**
TRAMITES Y LEGALIZACION AFINIA (INMODIFICABLE)				**$6.400.000**
TRAMITES AMBIENTALES (INMODIFICABLE)				**$17.980.000**

C.C.P
INGENIEROS S.A.S

Copia de Certificado Registro Presupuestal (CRP)

Dirección: Carrera 6 No. 65-24
Email: ccpconstrucciones22@gmail.com
Montería, Córdoba - Colombia

MONTERÍA

RP No.	22002956-R
miércoles 08 febrero 2023	

ALCALDIA DE MONTERIA

Oficina de presupuesto

Constancia de registro presupuestal Reserva No: 22002956-R

null

REGISTRO PRESUPUESTAL

Beneficiario: 901647860 - CONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE **NIT:** 901647860

No. del Certificado de disponibilidad 22001403-R **Resolución No:** RESERVA 2022

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Rubro	Descripcion	Tipo de Financiacion	Valor R.P.
R-2.3.2.02.02.005-24.7	Servicios de la construcción (Recursos Crédito FINDETER)	1.3.3.5.04 - R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	$ 4.011.661.268,00
		Total Reserva..	$ 4.011.661.268,00

Total reserva en letras: CUATRO MIL ONCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA y OCHO Pesos

Objeto

MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LOS BARRIOS PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Dairo Hoyos Bedoya

Jefe de Presupuesto

Solicito: HUGO KERGUELEN		
Elaboro: ADMIN	Imprimió: ANGELICA LLORENTE RAMOS	IP Imprimió: 186.43.33.250

C.C.P
INGENIEROS S.A.S

Relación de personal de la propuesta, salario y porcentaje dedicación (Según Formato)

Dirección: Carrera 6 No. 65-24
Email: ccpconstrucciones22@gmail.com
Montería, Córdoba - Colombia

RELACION DE AFILIACION DEL PERSONAL

CONTRATO No:	LP-SPM-019-2022
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA:	C.C.P INGENIEROS, representado por ELIANA MARGARITA OTERO PEREZ C.C No.1.064.985.667
OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LOS BARRIOS PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
VALOR:	CUATRO MIL ONCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($4.011.661.268,00).
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIO:	27 DE FEBRERO DE 2023
SUSPENSIÓN 1:	28 DE ABRIL DE 2023
REINICIO 1:	10 DE JULIO DE 2023
FECHA FINAL SEGÚN REINICIO 1:	09 DE SEPTIEMBRE DE 2023

RELACION DE AFILIACION DEL PERSONAL
Contrato N°: LP-SPM-019-2022
Fecha: 14 de septiembre de 2023

CARGO	NOMBRE Y APELLIDO	Salario propuesta	*FP	Dedicación	Salario afiliación	N° C.C	SALUD	PENSIÓN	ARL
Director de Obra	Claudia Stella Carvajal Pineda	$5.500.000	1,59	100	$5.500.000	30.685.544	Nueva EPS	Colpensiones	SURA
Residente de obra 1	Rafael Andrés Puche Díaz	$3.000.000	1,6	100	$3.000.000	80.087.842	Nueva EPS	Colfondos	SURA
Residente de obra 2	Eduardo Andrés Gómez Pastrana	$3.000.000	1,6	100	$3.000.000	78.751.878	Salud total	Colpensiones	SURA
Inspector de obra 1	Melissa Hernández Durango	$2.000.000	1,71	100	$2.000.000	1.062.681.755	Nueva EPS	Porvenir	SURA
Inspector de obra 2	Moisés Ayubb Ramos	$2.000.000	1,71	100	$2.000.000	1.193.223.977	Sanitas	Colpensiones	SURA
Ingeniero con postgrado en Vías	Dayane Obají Bernal	$3.700.000	1,59	30	$1.160.000	1.073.998.415	Nueva EPS	Porvenir	SURA
Ingeniero residente eléctrico	Jaam Fernández Pérez	$2.700.000	1,6	20	$1.160.000	78.034.100	Salud Total	Colpensiones	SURA
Ingeniero con postgrado Geotecnia	Pablo Eugenio Castilla Negrete	$3.700.000	1,59	30	$1.160.000	73.143.152	Sanitas	Colpensiones	SURA
Ingeniero con postgrado ambiental	Rafael Dario Vergara de la Ossa	$3.700.000	1,59	100	$3.700.000	11.052.258	Nueva EPS	Colpensiones	SURA
Trabajadora social	Patricia Álvarez Manchego	$2.800.000	1,59	100	$2.800.000	50.925.652	Mutual Ser	Porvenir	SURA

Profesional Sisoma	Armando Javier Atencia Soto	$2.800.000	1,6	100	$2.800.000	10.765.955	Salud total	Porvenir	SURA
Topógrafo 1	Ernan Antonio Díaz Hernández	$2.000.000	1,6	100	$2.000.000	78.060.039	Mutual Ser	Porvenir	SURA
Topógrafo 2	Santiago Guerrero Lamadrid	$2.000.000	1,6	100	$2.000.000	1.000.857.854	Nueva EPS	Protección	SURA
Cadenero 1	Deiker Bellorin Ibarra	$1.160.000	1,79	100	$1.160.000	4.948.063	Nueva EPS	Porvenir	SURA
Cadenero 2	Nayib Enrique Genes Hoyos	$1.160.000	1,79	100	$1.160.000	1.137.974.763	Mutual Ser	Porvenir	SURA
Cadenero 3	Domingo Antonio Álvarez Gaviria	$1.160.000	1,79	100	$1.160.000	1.064.606.239	Mutual Ser	Porvenir	SURA
Cadenero 4	Ismael Andrés Vega	$1.160.000	1,79	100	$1.160.000	1.065.011.515	Mutual Ser	Porvenir	SURA
Maestro de obra 1	Eduardo Melendrez Coronado	$2.000.000	1,6	100	$2.000.000	1.067.925.581	Salud total	Porvenir	SURA
Maestro de obra 2	Oscar Luis Chima Gómez	$2.000.000	1,6	100	$2.000.000	78.693.762	Nueva EPS	Porvenir	SURA
Almacenista	Jader Luis Spir del Castillo	$1.200.000	1,74	100	$1.200.000	1.073.971.706	Nueva EPS	Protección	SURA
Vigilante	Erni Elias Urango Chima	$1.200.000	1,72	100	$1.200.000	1.067.881.710	Salud Total	Colfondos	SURA
Vigilante	Miguel Jose Rizo Ozuna	$1.200.000	1,72	100	$1.200.000	1.067.911.549	Salud Total	Colfondos	SURA

RELACION DE AFILIACION DEL PERSONAL
Contrato N°: LP-SPM-019-2022
Fecha: 14 de septiembre de 2023

Secretaria	Kelly Yohana Rivero Berrio	$1.160.000	1,72	100	$1.160.000	1.067.924.222	Salud total	Porvenir	SURA
Auxiliar contable	Daniela Paola Payares Espitia	$1.200.000	1,72	10	$1.160.000	1.062.604.597	Nueva EPS	Porvenir	SURA
Abogado	Angela Maria Avilez Padilla	$2.600.000	1,59	10	$1.160.000	1.128.268.092	Sanitas	Protección	SURA
Conductor	Jhon Edisson Pitalua Tamara	$1.200.000	1,72	100	$1.200.000	78.694.199	Sanitas	Colpensiones	SURA
Mensajero	Jose Guillermo Perez Perez	$1.160.000	1,76	100	$1.160.000	1.065.011.191	Salud total	Porvenir	SURA

Nota: Anexar afiliaciones del personal propuesto.

Eliana Otero P.

ELIANA OTERO PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ALVARO VERA AYALA
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR

C.C.P
INGENIEROS S.A.S

Montería, 19 de julio de 2023

Señores

ALVARO VERA AYALA
R/L CONSORCIO HIDRALMA

OF-CCP-003

REF CONTRATO DE OBRA N° LP-SPM –019 - 2022 OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LOS BARRIOS PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

ASUNTO: HOMOLOGACIÓN PROFESIONALES DE OBRA

Cordial Saludo;

De conformidad a los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones del proceso de selección **LP-SPM-09 – 2022**, mediante el cual se realizó la suscripción del contrato en referencia, se realiza entrega formal de la documentación del personal profesional requerido para el desarrollo del contrato.

A continuación, se relaciona los cargos homologados y los requisitos de experiencia de acuerdo con el anexo técnico del proceso:

Dirección: Carrera 6 No. 65-24
Email: ccpconstrucciones22@gmail.com
Montería, Córdoba - Colombia

CARGO A DESEMPEÑAR	FORMACION ACADEMICA	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA	PROFESIONAL
DIRECTOR DE OBRA	Ingeniero Civil o de vías y transporte con Estudios de posgrado en gerencia.	Experiencia mínima de 5 años como profesional la cual se contabilizar a partir de la expedición de la tarjeta profesional. Experiencia mínima con estudios de especialización, maestría o doctorado de 3 años, la cual se contabilizar a partir de la expedición del Diploma.	Experiencia como director de obra de mínimo dos proyectos que tengan por objeto la construcción y/o mejoramiento y/o mantenimiento de pavimento.	CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA
RESIDENTE DE OBRA (1)	Ingeniero Civil	Experiencia mínima de 3 años como profesional la cual se contabilizar a partir de la expedición de la expedición de la tarjeta profesional. Experiencia mínima con estudios de especialización, maestría o doctorado de 2 años, la cual se contabilizar a partir de la expedición del Diploma	Experiencia como Residente de obra de mínimo dos proyectos que tengan por objeto la construcción y/o mejoramiento y/o mantenimiento de pavimento	RAFAEL ANDRES PUCHE
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	Ingeniero civil con postgrado en geotecnia	Experiencia mínima de 3 años como profesional la cual se contabilizar a partir de la expedición de la expedición de la tarjeta profesional. Experiencia mínima con estudios de especialización, maestría o doctorado de 2 años, la cual se contabilizar a partir de la expedición del Diploma	Experiencia como profesional área de geotecnia de mínimo dos proyectos que tengan por objeto la construcción y/o mejoramiento y/o mantenimiento de pavimento	PABLO CASTILLA NEGRETE
ESPECIALISTA AMBIENTAL	Área Ambiental / Ingeniero ambiental o sanitario y ambiental o ingeniero civil con postgrado en área ambiental	Experiencia mínima de 5 años como profesional la cual se contabilizar a partir de la expedición de la expedición de la tarjeta profesional.	Experiencia como profesional área ambiental de mínimo dos proyectos que tengan por objeto la construcción y/o mejoramiento y/o mantenimiento de pavimento	RAFAEL VERGARA
ELECTRICISTA	Ingeniero electricista	Experiencia mínima de 2 años como profesional la cual se contabilizar a partir de la expedición de la expedición de la tarjeta profesional.	Experiencia como profesional área electrica de mínimo dos proyectos que tengan por objeto la construcción y/o mejoramiento y/o mantenimiento de pavimento	JAAM FERNANDEZ
PROFESIONAL SOCIAL	Profesional área social/ Trabajador social o sociólogo	Experiencia mínima de 3 años como profesional la cual se contabilizar a partir de la expedición de la expedición de la tarjeta profesional.	Experiencia como profesional área social de mínimo dos proyectos que tengan por objeto la construcción y/o mejoramiento y/o mantenimiento de vías	PATRICIA ALVAREZ
SISO	Profesional en SG-SST / Profesional en SG-SST, o Profesionales con estudios de posgrados en SG-SST o QHSE, con licencia en SST vigente, y el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas	[Experiencia mínima de 3 años como profesional la cual se contabilizar a partir de la expedición de la expedición de la tarjeta profesional. Experiencia mínima con estudios de especialización, maestría o doctorado de 2 años, la cual se contabilizar a partir de la expedición del Diploma para los que aplique.	Profesional área de seguridad industrial y salud ocupacional en dos proyectos que tengan por objeto la construcción y/o mejoramiento y/o mantenimiento de pavimento	ARMANDO ATENCIA

C.C.P
INGENIEROS S.A.S

De igual manera se informa que los siguientes profesionales continuaran ejerciendo los cargos que venían desarrollando dentro del proyecto previos a la suscripción del contrato de cesión a la empresa C.C.P INGENIEROS S.A.S:

- **Residente de Obra 2** – Eduardo Gómez Pastrana
- **Especialista en vías** - Dayane Mercedes Obaji Bernal

Agradeciendo su pronta y oportuna respuesta:

Eliana Otero P

ELIANA MARGARITA OTERO PEREZ
R/L C.C.P INGENIEROS S.A.S

Anexos:

CLAUDIA CARVAJAL PINEDA: - Cedula de ciudadanía - Tarjeta Profesional - Cert. Vigencia - Diploma postgrado - Acta de grado pregrado - Certificaciones experiencia	**RAFAEL PUCHE DIAZ** - Cedula de ciudadanía - Tarjeta profesional - Acta de grado pregrado - Diploma postgrado - Cert. Vigencia - Certificaciones experiencia
JAAM FERNANDEZ - Cedula de ciudadanía - Diploma Pregrado - Acta de grado pregrado - Tarjeta profesional - Cert. Vigencia - Certificaciones experiencia	**PABLO CASTILLA NEGRETE** - Cedula de ciudadanía - Diploma Postgrado - Diploma Pregrado - Tarjeta profesional - Cert. Vigencia Certificaciones experiencia
RAFAEL VERGARA - Cedula de ciudadanía - Diploma Postgrado - Diploma Pregrado - Tarjeta profesional - Cert. Vigencia - Certificaciones experiencia	**PATRICIA ALVAREZ** - Cedula de ciudadanía - Diploma Pregrado - Tarjeta profesional - Cert. Vigencia - Certificaciones experiencia
ARMANDO ATENCIA - Cert. formación auditor interno de sistemas de gestión - Cedula de ciudadanía - Cert. Curso 50hrs SGSST - Diploma Pregrado - Diploma Postgrado - Resolución renovación de licencia - Cert. Vigencia - Tarjeta profesional - Certificaciones experiencia	

C.C.P
INGENIEROS S.A.S

DIRECTOR DE OBRA

Dirección: Carrera 6 No. 65-24
Email: ccpconstrucciones22@gmail.com
Montería, Córdoba - Colombia


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 30.685.544
CARVAJAL PINEDA

APELLIDOS
CLAUDIA STELLA

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 18-JUN-1982
CERETE
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 ESTATURA | A+ G.S. RH | F SEXO

01-DIC-2000 CERETE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1301000-00308436-F-0030685544-20110615 0027229963A 1 36713841

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA

COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.

2220212892BCOR

INGENIERO CIVIL

DE FECHA 22/03/2006

CLAUDIA STELLA

CARVAJAL PINEDA

C.C. 30685544

UNIVERSIDAD PONTIFICIA

BOLIVARIANA SECC MONTERIA

PRESIDENTE DEL CONSEJO

Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza a su titular para ejercer como Ingeniero en todo el Territorio Nacional.

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA

Calle 78 No. 9 - 57 Oficina 1301 Tel. 3220102 Bogotá D.C.

El Notario Tercero del Circulo De Monteria TESTIFICA que Esta fotocopia coincide con el Original que he tenido a la vista

07 FEB 2012

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2023-2160361

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 30685544, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 22202-128928 desde el 22 de Marzo de 2006, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 117.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los diecinueve (19) días del mes de Julio del año dos mil veintitres (2023).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

Universidad Pontificia Bolivariana

MONTERÍA

APROBADA SEGÚN RESOLUCIÓN No. 4800 DEL 20 DE OCTUBRE DE 1995 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Teniendo en cuenta que

Claudia Stella Carvajal Pineda

Cédula de ciudadanía No. 30.685.544 expedida en Cereté

Cursó y aprobó los estudios exigidos por las normas legales reglamentarias vigentes, le confiere el título de

Especialista en Gerencia para Ingenieros

En testimonio de ello le expide el presente diploma en Montería, Departamento de Córdoba, República de Colombia el día 25 del mes de Febrero del año 2011

El Rector

El Decano

El Secretario General

Anotado en el folio **264** del libro **5-A** de registro de diplomas
Refrendado en Montería el 25 de febrero de 2011

15956

Claudia Stella Carvajal Pineda
Celular: 3013646793-3134920313

universidad Pontificia Bolivariana

ACTA DE GRADO

ESCUELA DE INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA

Confiere el Título de

INGENIERO CIVIL

CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA

Identificado con cédula de ciudadanía número 30.685.511 de Cerete, en cuanto cursó y aprobó la totalidad de las asignaturas correspondientes al pensum de INGENIERIA CIVIL, según Registro ICFES No. 12351624000230011100, y realizó el trabajo de grado con el título

y la sustentó satisfactoriamente.

Para el reconocimiento de lo que en los anteriores términos

QUIEN SUSCRIBE EL SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE HA CONFERIDO EL CONSEJO DIRECTIVO, EXPIDE EL PRESENTE DIPLOMA EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN, A LOS VEINTIOCHO (28) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CINCO (2005).

El rector, gobernador y representante legal de la Universidad Pontificia Bolivariana,

Pbro. Dr. Luis Fernando Múnera Congote

El Secretario General,

Dr. Carlos Mario Restrepo Arango

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

LA SUSCRITA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA CERTIFICA:

Que el CONSORCIO PAVIMENTAR 2019 identificado con NIT 901.339.855-5 conformado por CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA, identificada cédula de ciudadanía N° 30.685.544 de Cerete - Córdoba y Tarjeta Profesional No. 22202129928COR, la empresa DP INGENIEROS S.A.S identificada con NIT.900.322.118 – 7 e INTEL DE LA COSTA S.A.S identificado con NIT 830.502.135-1, ejecuto el contrato de obra pública **N° 1192 -2021** cuyo objeto fue **"REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VIA LA CEIBA (CRUCE VÍA MONTERÍA – PUERTO REY) CANALETE EN EL DEPARTAMENTO DE CÓROBA"** cuya información se resume a continuación:

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N°	1192-2019
OBJETO	"REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VIA LA CEIBA (CRUCE VÍA MONTERÍA – PUERTO REY) CANALETE EN EL DEPARTAMENTO DE CÓROBA"
CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTAR 2019 – Nit. 901.339-885-5
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERCANALETE Nit. 901.342.259 - 6
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA	$ 27.952.592.361
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO DE OBRA	$6.272.280.738
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$34.224.873.099
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	Catorce (14) meses
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO	Dos (2) meses
PLAZO FINAL DEL CONTRATO SEGÚN PRORROGA No. 1	Dieciséis (16) meses
FECHA DE ACTA DE INICIO	16 de marzo de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO (según acta de inicio)	16 de mayo de 2021
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 (Plazo y fechas del periodo de suspensión)	**25 de marzo de 2020** Diecinueve (19) días calendario – Desde las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020
FECHA DE LA PRORROGA No. 1 AL ACTA DE SUSPENSION No.1	**13 de abril de 2020** Catorce (14) días calendario - Desde las cero

(Plazo y fechas del periodo de suspensión)		horas (00.00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, hasta las cero horas (00.00 a.m.) del día 27 de abril del 2020.
FECHA DE LA PRORROGA No. 2 AL ACTA DE SUSPENSION No. 1 (Plazo y fechas del periodo de suspensión)		**27 de abril de 2020** Un (01) mes y seis (6) días calendario - Desde las cero horas (00.00 a.m.) del día 27 de abril de 2020, hasta las cero horas (00.00 a.m.) del día 04 de junio del 2020
PLAZO TOTAL DE SUSPENSIÓN No. 1		**DOS (2) MESES Y SEIS (6) DIAS**
FECHA ACTA DE REINICIO No. 1		04 de junio de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO (Según acta de reinicio No. 1)		26 de julio de 2021
FECHA DE ADICION No.1 Y PRORROGA No. 1		23 de abril de 2021
PLAZO DE PRORROGA No. 1		DOS (2) meses
FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO (Según adición No. 1 y prorroga No. 1)		26 de septiembre de 2021
FECHA DE TERMINACION DEFINITIVA		18 de agosto de 2021
LONGITUD DEL PAVIMENTO		10.869,10 ML
ESPESOR Y ANCHO DEL PAVIMENTO		22CM X 7M
ESTRUCTURAS CONSTRUIDAS		UN (1) PUENTE DE DIEZ (10) METROS DE LONGITUD Y NUEVE (9) METROS DE ANCHO. UN (1) PUENTE DE VEINTIUN (21) METROS DE LONGITUD Y NUEVE (9) METROS DE ANCHO. CUNETAS: 4.273 ML PROTECCION LATERAL:16.709ML
MULTAS Y SANCIONES		NINGUNA
DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA		EXCELENTE
NIVEL DE CUMPLIMIENTO		TERMINADO ANTES DEL TIEMPO ESTIPULADO
EQUIPO DE TRABAJO	**DIRECTOR DE OBRA (30%)**	CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA C.C 30.869.155
	RESIDENTE DE OBRA (100%)	RAFAEL PUCHE DÍAZ C.C 80.087.842
	ESPECIALISTA EN SUELOS (50%)	PABLO CASTILLA NEGRETE C.C 73.143.152
	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS (50%)	JORGE LUIS GALLEGO SILVA, C.C 78.690.478
	ESPECIALISTA EN	CAMILO BENÍTEZ LACOUTURE

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

	VÍAS (50%)	C.C 78.751.256
	ESPECIALISTA EN HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL (50%)	ARMANDO JAVIER ATENCIA SOTO C.C 10.765.955
	TOPÓGRAFO (50%)	ALONSO LAFONT BERNAL C.C 6.860.037
	INSPECTOR DE OBRA (100%)	JUAN CAMILO CABRALES POLO C.C 1.067.854.304

Se otorga la presente certificación en la ciudad de Montería, a los diecinueve (19) días de mes de noviembre de 2021.

Cordialmente,

CILIA JAQUELIN TOBÍAS CARRASCAL
C.C No. 50.882.640 de Momil - Córdoba
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Elaboro: María Annicchiarico Negrete – Ing. Civil-Contratista Externa S.I.D

DEPARTAMENTO DE SUCRE
MUNICIPIO DE MORROA
ALCALDÍA MUNICIPAL
Cra. 6ª No. 8-11. Teléfax: 285 7451
Correo Electrónico: alcaldia@morroa-sucre.gov.co
Página Web: www.morroa-sucre.gov.co
REPÚBLICA DE COLOMBIA

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE MORROA CERTIFICA

Que **CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA**, identificado con cedula de ciudadanía N° 30.685.544 de Montería y matricula profesional como ingeniero civil N° 22202129928COR presto sus servicios como DIRECTOR DE OBRA durante la ejecución del contrato que se describe a continuación el cual recibido a satisfacción:

CONTRATO	LP-005-2018
OBJETO	**"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN EL SECTOR BARRIO PALITO EN EL MUNICIPIO DE MORROA, SUCRE"**
VALOR CONTRATO	$ 823.448.930,00
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MORROA
CONTRATISTA	CONSORCIO MORROA 2018
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES MORROA
FECHA ACTA DE INICIO	20 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE TERMINACION:	17 DE ABRIL DE 2019

Para constancia se firma la presente certificación en el municipio de morroa a los siete (07) días del mes de mayo de 2019.

RAFAEL MOGOLLON GONZALEZ
SECRETARIO DE PLANEACION

C.C.P
INGENIEROS S.A.S

RESIDENTE DE OBRA N°1

Dirección: Carrera 6 No. 65-24
Email: ccpconstrucciones22@gmail.com
Montería, Córdoba - Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.087.842**

PUCHE DIAZ
APELLIDOS

RAFAEL ANDRES
NOMBRES

Rafael Puche
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-MAR-1981**
MONTERIA
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

11-MAR-1999 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1300100-38163743-M-0080087842-20071124 03923 07328A 02 2795240 35

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA

COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No

22202133859COR

INGENIERO CIVIL

DE FECHA 17/08/2006

RAFAEL ANDRES

PUCHE DIAZ

C.C. 80087842

UNIVERSIDAD PONTIFICIA

BOLIVARIANA SECC MONTERIA

PRESIDENTE DEL CONSEJO

universidad Pontificia Bolivariana
SECCIONAL MONTERIA

Aprobada según Resolución Ministerial No. 4800 de 1.995 del Ministerio de Educación Nacional

ACTA DE GRADO

Del 28 de julio de 2006

En la ciudad de Montería, la Universidad Pontificia Bolivariana- Seccional Montería con Personería Jurídica reconocida mediante Resolución No. 4800 del 20 de octubre de 1995, expedida por el Ministerio de Educación Nacional en Ceremonia de Grado y previo el solemne juramento de rigor, confirió el titulo de:

INGENIERO CIVIL

A

RAFAEL ANDRÉS PUCHE DÍAZ

C.C. 80.087.842 de Santafé de Bogotá D.C.

En cuanto cursó y aprobó la totalidad de las asignaturas correspondientes al plan de estudios de:

INGENIERÍA CIVIL
Registro ICFES No. 17274624000230011100

y quien realizó y aprobó como requisito final el trabajo de Grado con el título:
"IMPACTOS DE LA REPAVIMENTACIÓN EN LA INSTALACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMOCILIARIOS EN UN SECTOR CÉNTRICO DE LA CIUDAD DE MONTERÍA"

El Rector Seccional: *Pbro. JOSÉ MARÍA HOYOS REGINO*
La Secretaria General: *A.E. MARILIN MEJÍA MALDONADO*
El Decano de la Escuela: *Ing. CARLOS ALFONSO BARRIOS VILLADIEGO*

Diploma No. 13737 *Registrado en el folio* 211 *del libro* 3-A *de registro de diplomas.*

Marilin Mejía M.

A 1858

universidad Pontificia Bolivariana
SECCIONAL MONTERIA

Aprobada según Resolución Ministerial No. 4800 de 1.995 del Ministerio de Educación Nacional

ACTA DE GRADO

Del 30 de mayo de 2008

En la ciudad de Montería, la Universidad Pontificia Bolivariana Montería con Personería Jurídica reconocida mediante Resolución No.4800 del 20 de octubre de 1995, expedida por el Ministerio de Educación Nacional en Ceremonia de Grado y previo el solemne juramento de rigor, confirió el titulo de:

ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS

A

RAFAEL ANDRÉS PUCHE DÍAZ

C.C. 80.087.842 de Montería

En cuanto cursó y aprobó la totalidad de las asignaturas correspondientes al plan de estudios de:

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS
Código MEN-SNIES No. 17105658040230010110O

y quien realizó y aprobó como requisito final el trabajo de Grado con el título:
"VALIDAR UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN ACUAPONICA MULTITROFICA INTEGRADA PARA EL CULTIVO SIMULTANEO DE TILAPIAS, CAMARONES Y AJÍ EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA AÑO 2008"

El Rector Seccional: Pbro. ORLANDO RAFAEL LÓPEZ VERGARA

La Secretaria General: A.E. LUZ ESTELA FUENTES SANTOS

El Decano de la Escuela: A.E. JHON ARTURO BUELVAS PARRA

Diploma No. 14730 *Registrado en el folio* 108 *del libro* 4A *de registro de diplomas.*

Secretaria General

A 2849

THOMAS GREG & SONS

REPÚBLICA DE COLOMBIA

COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2023-2160371

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que RAFAEL ANDRES PUCHE DIAZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 80087842, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 22202-133859 desde el 17 de Agosto de 2006, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 387.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los diecinueve (19) días del mes de Julio del año dos mil veintitres (2023).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO
ALCALDÍA MUNICIPAL
NIT. N° 800.096.770-7

CERTIFICA:

Que EL ING RAFAEL ANDRES PUCHE DIAZ, identificado con cedula de ciudadanía No 80.087.842 de Bogotá y matricula profesional No 22202133859COR presto sus servicios como RESIDENTE DE OBRA en el contrato LP-001-2013 descrito a continuación:

CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ESCONDIDO
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIAL PUERTO ESCONDIDO
OBJETO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA VIA PUERTO ESCONDIDO LOS CHERES – PLAN PAREJO – SILENCIO – AGUAS VIVAS – EL PANTANO – MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA"
VALOR:	MIL CIENTO SIETE MILLONES DE PESOS MCTE ($1.107.000.000).
PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES
FECHA DE INICIO:	JULIO 04 DE 2014
OTROSI No 1	OCTUBRE 04 DE 2014
OTROSI No 2	NOVIEMBRE 04 DE 2014
TERMINO DE DURACION FINAL	CINCO (5) MESES CON QUINCE (15) DIAS
FECHA FINAL	DICIEMBRE 12 DE 2014

Para constancia se firma a los veintiún (21) días del mes de marzo de 2017.

ADALBERTO GALVAN PEREZ
SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL

CERTIFICA:

Que el ingeniero **RAFAEL ANDRES PUCHE DIAZ** identificado con cedula de ciudadania N°80.087.842 expedida en Bogotá laboro como residente de obra en el contrato No. 047-2012 relacionado a continuación.

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE CHINU
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL LA ESPERANZA
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE CHINU – DEPARTAMENTO DE CORDOBA
VALOR	($ 12,028,360,497.64)
FECHA DE INICIO	08 DE AGOSTO DE 2012
FECHA DE TERMINACION	28 DE FEBRERO DE 2013

Para constancia de lo anterior se expide esta certificación en el municipio de chinu a los 05 días del mes marzo de 2013.

CARMEN JULIA MORALES
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

C.C.P
INGENIEROS S.A.S

INGENIERO RESIDENTE ELECTRICO

Dirección: Carrera 6 No. 65-24
Email: ccpconstrucciones22@gmail.com
Montería, Córdoba - Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **78.034.100**

FERNANDEZ PEREZ

APELLIDOS

JAAM

NOMBRES



FIRMA

Scanned by CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-OCT-1981**

CERETE
(CORDOBA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

29-NOV-2000 CERETE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1301000-00258632-M-0078034100-20101004 0024230704A 1 34774259

REPUBLICA DE COLOMBIA

07647

UNIVERSIDAD DEL SINU
Elías Bechara Zainúm

EL RECTOR Y EL CONSEJO SUPERIOR
POR EL TENOR DE LA PRESENTE, HACEMOS SABER QUE

Jaam Fernández Pérez

IDENTIFICADO(A) CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NO. 78.034.100 de Cereté , ALUMNO(A) DE ESTA INSTITUCION Y EN TAL VIRTUD FORMADA EN EL PENSAMIENTO DE NUESTRO FUNDADOR CON PROYECCION UNIVERSAL, VALORES CULTURALES Y HUMANOS DEL HOMBRE COLOMBIANO CONFERIMOS, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y POR AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, EL CARACTER Y TITULO DE

Ingeniero Electricista

CON EL COMPROMISO DE LIDERAZGO AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD, LA UNIVERSIDAD Y SU FAMILIA PARA GENERAR FUTURAS CONDICIONES DE VIDA MAS FAVORABLES A TODOS; COMPROMETIDO CON NUESTRA RAZON DE SER, ELEVANDO LA CULTURA REGIONAL Y NACIONAL, COMO CONTRIBUCION A LA HUMANIDAD, CON EL CRITERIO DE LA LIBERTAD COMO DERECHO NATURAL Y SIN DISTINGO DE RAZA, CREDO, SEXO O COLOR. EL PRESENTE TITULO LLEVA LAS FIRMAS DEL RECTOR, VICERRECTOR, DECANO Y SECRETARIO GENERAL, EN LA CIUDAD DE Montería
A LOS 01 DIAS DEL MES DE Agosto DEL AÑO 2013

EL RECTOR | EL VICERRECTOR | EL DECANO | EL SECRETARIO GENERAL

HOJA DE VIDA PERSONAL PROFESIONAL

HOJA DE VIDA PERSONAL PROFESIONAL

UNIVERSIDAD DEL SINU
Elías Bechara Zainúm
Fundada en 1974

Facultad de
Ciencias e Ingenierías

ACTA DE GRADO NUMERO 0583-001IE

Resolución No. 1459 de Julio 24 de 2013

CONSIDERANDO QUE

Jaam Fernández Pérez
C. C. No. 78.034.100 expedida en Cereté

Cumplió satisfactoriamente con los requisitos exigidos por los acuerdos y reglamentos de la Universidad, resuelve otorgarle el título de

Ingeniero Electricista

En nombre y representación de la Universidad del Sinú -Elías Bechara Zainúm- y de la República de Colombia y previo el juramento de rigor, el Rector hizo entrega del Diploma No._____ registrado en el folio _____ del libro _____

En el testimonio de lo anterior se firma la presente acta de grado en la ciudad de Montería, el día primero (1°.) del mes de Agosto de 2013.

Rectora

Secretaria General

Decano

Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines



Titular JAAM

FERNÁNDEZ PÉREZ

D.I. 78.034.100

Ingeniero ELECTRICISTA

Matricula BL205-95772

Resol. Secc. 16/2013

Fecha de Exp. 28/08/2013

Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines

Esta tarjeta acredita a su titular el derecho de ejercer la ingeniería en su especialidad en cualquier lugar del país, de acuerdo con la Ley 51 de 1986 y su Decreto Reglamentario 1873 de 1996.

Para efectos de información adicional o pérdida dirigirse a la Secretaría del Consejo Profesional Nacional, Calle 70 No. 9 - 10, PBX 3127393, Bogotá, D.C.

Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines

Referencia: .

EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERíAS ELÉCTRICA, MECÁNICA Y PROFESIONESAFINES, EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY 51 DE 1986 Y EL DECRETO 1873 DE 1996

HACE CONSTAR QUE:

1. El Ingeniero **Jaam FERNÁNDEZ PÉREZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **78034100** de **Cereté (Córdoba)**, se encuentra registrado ante el Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines, como Ingeniero **ELECTRICISTA** con Matrícula No. **BL205-95772** expedida por el Consejo Profesional Seccional de **BOLÍVAR** mediante resolución No. **BL-16 de 2013** el día **28** de **Agosto** de **2013** y confirmada por el Consejo Profesional Nacional según Resolución No. **CPN-106 de 2013**.

2. La matrícula profesional No. **BL205-95772**, del citado ingeniero se encuentra Vigente y no se registran Sanciones a la fecha.

Esta constancia se expide por solicitud del interesado. La vigencia de la presente certificación es de Seis (6) meses a partir de la fecha de expedición.

Dada en la ciudad de Bogotá D.C., a los Diecinueve (19) días del mes de Junio de Dos Mil Veintitrés (2023)

Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines
Código de Validación:**999901779719. Vence el 19-Diciembre-2023**
Entre a www.consejoprofesional.org.co y a la opción 'Validar Certificado' para verificar su validez

MARCO ANTONIO GOMEZ ALBORNOZ
Secretario Ejecutivo

CONSORCIO
MORROA 2018

CERTIFICA

Que **JAAM FERNANDEZ PEREZ**, identificado con cedula de ciudadanía N°78.034.100 de Cereté y matricula profesional como ingeniero Electricista N° BL205-95772 presto sus servicios como INGENIERO ELECTRICISTA durante la ejecución del contrato que se describe a continuación el cual recibido a satisfacción:

CONTRATO	LP-005-2018
OBJETO	**"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN EL SECTOR BARRIO PALITO EN EL MUNICIPIO DE MORROA, SUCRE"**
VALOR CONTRATO	$ 823.448.930,00
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MORROA
CONTRATISTA	CONSORCIO MORROA 2018
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES MORROA
FECHA ACTA DE INICIO	20 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE TERMINACION:	17 DE ABRIL DE 2019

Para constancia se firma la presente certificación en el municipio de Monteria a los siete (07) días del mes de mayo de 2019.

CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA
C.C 30.685.544 DE CERETE
REP. LEGAL CONSORCIO
MORROA 2018

CRA 15 N° 54 – 31 MONTEVERDE
TEL: 3013646793
Consorciomorroa2018@gmail.com

CONSORCIO
PAVIMENTAR 2019

CERTIFICA

Que JAAM FERNANDEZ PEREZ, identificado con cedula de ciudadanía N° 78.034.100 de Cereté y matricula profesional como ingeniero Electricista N°BL205-95772 presto sus servicios como **INGENIERO ELECTRICISTA** durante la ejecución del contrato que se describe a continuación:

CONTRATO	1192-2019
OBJETO	"REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VIA LA CEIBA (CRUCE VÍA MONTERIA – PUERTO REY) – CANALETE EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"
VALOR CONTRATO	$34.224.873.099,00)
CONTRATANTE	GBERNACIÓN DE CÓRDOBA
CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTAR 2019
FECHA DE INICIO	18 DE MARZO DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN	26 DE AGOSTO DE 2021

Para constancia se firma en Montería – Córdoba, a los quince (15) días del mes de septiembre de 2021.

CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA
C.C No.30.685.544 de Cereté
Rep. Legal CONSORCIO PAVIMENTAR 2019

C.C.P
INGENIEROS S.A.S

INGENIERO CON POSTGRADO EN GEOTECNIA

Dirección: Carrera 6 No. 65-24
Email: ccpconstrucciones22@gmail.com
Montería, Córdoba - Colombia


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
73.143.152
CASTILLA NEGRETE
PABLO EUGENIO


FECHA DE NACIMIENTO 17-AGO-1970
MONTERIA
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.79
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
30-JUN-1988 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL

UNIVERSIDAD EAFIT

Abierta al mundo

PERSONERÍA JURÍDICA RESOLUCIÓN No. 75 DE JUNIO 28 DE 1960 DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

En atención a que

PABLO EUGENIO CASTILLA NEGRETE

C.C. 73.143.152 de Cartagena (Bol.)

Ha cumplido con todos los requisitos académicos exigidos por los estatutos universitarios, le confiere el título de

ESPECIALISTA EN MECÁNICA DE SUELOS Y CIMENTACIONES

Para constancia se firma en Medellín el día 15 de Diciembre del año 2010 y se refrenda con el sello respectivo.

Rector

Secretario General

Registro: Libro 3 Folio 1206 Número 11139

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
y en su nombre

LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

CONFIERE EL TITULO DE

Ingeniero Civil

A

PABLO EUGENIO CASTILLA NEGRETE

C.C. No. 73.143.152 Expedida en Cartagena (Bolívar)

POR HABER CUMPLIDO LOS REQUISITOS ACADEMICOS EXIGIDOS
Y EN TESTIMONIO DE ELLO LE OTORGA EL PRESENTE DIPLOMA

En la ciudad de Cartagena, a 25 de junio de 19 93

EL DECANO DE LA FACULTAD

EL SECRETARIO DE LA FACULTAD

08956

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

EL SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD

Registrado al Folio No. 689 del Libro de Diplomas No. 14

EL SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA

Registrado al Folio No. 217 del Libro de Diplomas No. 235
Cartagena 20 septiembre 1993

EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE MONTERIA
HACE CONSTAR QUE ESTA COPIA FOTOSTATICA CONCUERDA
CON ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA
MONTERIA REPUBLICA DE COLOMBIA
03 NOV 2011
RAFAEL DURANGO CHAAR
NOTARIO PRIMERO

COPNIA

Matricula Profesional No.
13202-61172 BLV
Fecha de Expedición: **16/06/1994**

Nombre:
PABLO EUGENIO
CASTILLA NEGRETE

Identificación:
C.C. 73143152

Profesión:
INGENIERO CIVIL

Institución:
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA



Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza al titular a ejercer como Ingeniero en el Territorio Nacional.

DIRECTOR GENERAL

PRESIDENTE DEL CONSEJO

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA. Calle 78 No. 9-57 primer piso
Línea Nacional: 01 8000 116590

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2023-2159597

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que PABLO EUGENIO CASTILLA NEGRETE, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 73143152, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 13202-51172 desde el 16 de Junio de 1994, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 102.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los diecinueve (19) días del mes de Julio del año dos mil veintitres (2023).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO
ALCALDÍA MUNICIPAL
NIT. N° 800.096.770-7

CERTIFICA:

Que EL ING PABLO EUGENIO CASTILLA NEGRETE, identificado con cedula de ciudadanía No 73.143.152 de Cartagena y matricula profesional No 1320251172BLV presto sus servicios como profesional en ESPECIALISTA EN SUELOS en el contrato LP-001-2013 descrito a continuación:

CONTRATANTE:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO ESCONDIDO
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIAL PUERTO ESCONDIDO
OBJETO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA VIA PUERTO ESCONDIDO LOS CHERES – PLAN PAREJO – SILENCIO – AGUAS VIVAS – EL PANTANO – MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA"
VALOR:	MIL CIENTO SIETE MILLONES DE PESOS MCTE ($1.107.000.000).
PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES
FECHA DE INICIO:	JULIO 04 DE 2014
OTROSI No 1	OCTUBRE 04 DE 2014
OTROSI No 2	NOVIEMBRE 04 DE 2014
TERMINO DE DURACION FINAL	CINCO (5) MESES CON QUINCE (15) DIAS
FECHA FINAL	DICIEMBRE 12 DE 2014

Para constancia se firma a los veintiún (21) días del mes de marzo de 2017.

ADALBERTO GALVAN PEREZ
SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE SUCRE
MUNICIPIO DE MORROA
ALCALDÍA MUNICIPAL
Cra. 6ª No. 8-11. Teléfax: 285 7451
Correo Electrónico: alcaldia@morroa-sucre.gov.co
Página Web: www.morroa-alcre.gov.co
REPÚBLICA DE COLOMBIA

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE MORROA CERTIFICA

Que **PABLO EUGENIO CASTILLA NEGRETE**, identificado con cedula de ciudadanía N° 73.143.152 de Cartagena y matricula profesional como ingeniero civil N° 1320251172BLV presto sus servicios como ESPECIALISTA EN SUELOS durante la ejecución del contrato que se describe a continuación el cual recibido a satisfacción:

CONTRATO	LP-005-2018
OBJETO	**"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN EL SECTOR BARRIO PALITO EN EL MUNICIPIO DE MORROA DEPARTAMENTO DE SUCRE"**
VALOR CONTRATO	$ 823.448.930,00
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MORROA
CONTRATISTA	CONSORCIO MORROA 2018
PLAZO DE EJECUCION:	(4) CUATRO MESES
FECHA ACTA DE INICIO	20 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE TERMINACION:	17 DE ABRIL DE 2019

Para constancia se firma la presente certificación en el municipio de morroa a los siete (07) días del mes de mayo de 2019.

RAFAEL MOGOLLON GONZALEZ
SECRETARIO DE PLANEACION

C.C.P
INGENIEROS S.A.S

INGENIERO CON POSTGRADO AMBIENTAL

Dirección: Carrera 6 No. 65-24
Email: ccpconstrucciones22@gmail.com
Montería, Córdoba - Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 11.052.258
VERGARA DE LA OSSA

APELLIDOS

RAFAEL DARIO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 02-FEB-1981
LA UNION
(SUCRE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

23-JUL-1999 LA UNION
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2805000-00195041-M-0011052258-20091108 0017835075A 1 26727745

República de Colombia

El Ministerio de Educación Nacional y en su nombre la

Corporación Universitaria del Caribe

Personería Jurídica No. 7786 expedida por el Ministerio de Educación Nacional

Le confiere el Título de:

Especialista en Gerencia Ambiental

A

Rafael Darío Vergara De la Ossa

C.C. 11.052.258 de La Unión, Sucre

Por haber cumplido los requisitos académicos exigidos por la Corporación y el respectivo programa de estudios;
En fe de lo cual se expide el presente Diploma en Sincelejo - Sucre - República de Colombia

A los Diez (10) días del mes de Diciembre de 2.010.

Presidente

Rector

Director Centro de Educ. Continuada y Posgrado

Secretario General

Registrado Libro No. 9 Folio No. 045

No. 1090

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

y en su nombre, la

Corporación Universitaria de la Costa, CUC

Con Personería Jurídica Nº 352 - Abril 1971

Por cuanto

Rafael Darío Vergara De La Ossa

C.C. Nº 11052258 de La Unión L.M. 81020952628 D.M. 55

Cursó todas las materias que los Estatutos Universitarios exigen, le confiere el título de

Ingeniero Sanitario y Ambiental

Aprobado por Acuerdo Nº 003, de junio 11 de 1993 del Consejo Directivo

En fe de lo cual se expide el presente Diploma en Barranquilla, Atlántico

El día 29 de Agosto de 2003

Presidente Consejo Directivo

Decano

Rector

Director de Programa

Secretario General

Anotado al folio Nº 93 del Libro de Registro de Diplomas Nº 04 - 006840

Refrendado en Barranquilla el 29 de Agosto de 2003

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA

COPNIA



MATRICULA No 08236105535ATL

INGENIERO SANITARIO Y AMBIENTAL

DE FECHA 16/03/2004

VERGARA DE LA OSSA

RAFAEL DARIO

C C 11052256

CORPORACION UNIVERSITARIA DE LA COSTA - C.U.C.

PRESIDENTE DEL CONSEJO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2023-2159644

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que RAFAEL DARIO VERGARA DE LA OSSA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 11052258, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL con MATRICULA PROFESIONAL 08236-105535 desde el 18 de Marzo de 2004, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 117.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los diecinueve (19) días del mes de Julio del año dos mil veintitres (2023).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

JESUS JULIO TEHERAN
Ingeniero Civil
Consultorías & Construcción

CERTIFICA

Que el Ingeniero **RAFAEL DARIO VERGARA DE LA OSA**, identificado con Cédula de Ciudadanía Nº 11.052.258 de La Unión – Sucre, se desempeñó como ESPECIALISTA AMBIENTAL durante la ejecución del contrato que se describe a continuación, el cual fue recibido y liquidado a entera satisfacción por la Interventoría.

CONTRATO N°	:	LP-002-12
OBJETO	:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CORDOBA
CONTRATANTE	:	MUNICIPIO DE TUCHIN
CONTRATISTA	:	JESUS HERNANDO JULIO TEHERAN
VALOR TOTAL CONTRATO	:	$1.913.967.109,oo
PLAZO	:	OCHO (08)MESES
FECHA DE INICIO	:	Noviembre 07 de 2012
FECHA DE TERMINACION	:	Julio 03 de 2013

Para constancia se firma en Sincelejo, Sucre, a los diez (10) días del mes de Julio del 2014.

JESUS HERNANDO JULIO TEHERAN
C.C. Nº 92,446.149 de San Onofre – Sucre
Contratista

JESUS JULIO TEHERAN
Ingeniero Civil
Consultorías & Construcción

CERTIFICA

Que el Ingeniero **RAFAEL DARIO VERGARA DE LA OSA**, identificado con Cédula de Ciudadanía Nº 11.052.258 de La Unión – Sucre, se desempeñó como ESPECIALISTA AMBIENTAL durante la ejecución del contrato que se describe a continuación, el cual fue recibido y liquidado a entera satisfacción por la Interventoría.

CONTRATO N°	:	LP-006-2013
OBJETO	:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA - CONSTRUCCIONES DE ANDENES Y MOBILIARIOS - PUESTO DE POLICIA – LAS HUERTAS – LIMITES BUENAVISTA, MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE
CONTRATANTE	:	MUNICIPIO SINCELEJO
CONTRATISTA	:	JESUS HERNANDO JULIO TEHERAN
VALOR TOTAL CONTRATO	:	$ 442.000.000,oo
PLAZO	:	Hasta 31 de Diciembre de 2013
FECHA DE INICIO	:	Agosto 02 de 2013
FECHA DE TERMINACION	:	Diciembre 31 de 2013

Para constancia se firma en Sincelejo, Sucre, a los diez (10) días del mes de Julio del 2014.

JESUS HERNANDO JULIO TEHERAN
C.C. Nº 92,446.149 de San Onofre – Sucre
Contratista


Carrera 6i No. 27 A – 46, Barrio Nuevo Pioneros, Sincelejo, Sucre
Cel. 3143301526, Email. jjulio1225@hotmail.com

C.C.P
INGENIEROS S.A.S

TRABAJADORA SOCIAL

Dirección: Carrera 6 No. 65-24
Email: ccpconstrucciones22@gmail.com
Montería, Córdoba - Colombia


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 50.925.652
ALVAREZ MANCHEGO
APELLIDOS
PATRICIA DE JESUS
NOMBRES
FIRMA

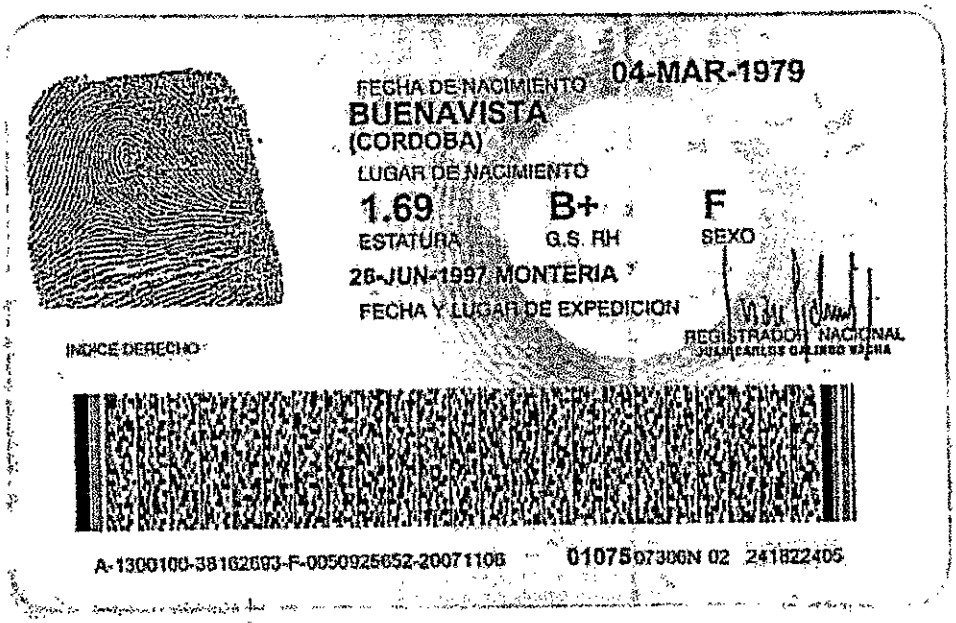
FECHA DE NACIMIENTO 04-MAR-1979
BUENAVISTA
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.69
ESTATURA
B+
G.S. RH
F
SEXO
26-JUN-1997 MONTERIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-1300100-38162693-F-0050925652-20071106
0107507306N 02 241822405

EN NOMBRE DE

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

Y POR AUTORIZACION
DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
A



Corporación Universitaria del Sinú

EN ATENCION A QUE

Patricia de Jesús Alvarez Manchego

C.C. N° [illegible] Especialidad [illegible]

HA COMPLETADO TODOS LOS REQUISITOS QUE LOS ESTATUTOS UNIVERSITARIOS EXIGEN PARA OPTAR EL TITULO DE

PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL

LE EXPIDE EL PRESENTE DIPLOMA. EN TESTIMONIO DE ELLO, SE FIRMA Y REFRENDA CON LOS SELLOS RESPECTIVOS EN MONTERIA, EL DIA 30 DEL MES DE MAYO DEL 2.002

RECTOR

VICE-RECTOR ACADEMICO

SECRETARIO GENERAL

DIRECTOR DE PROGRAMA

102


CONSEJO
NACIONAL
DE TRABAJO
SOCIAL

Consejo Nacional de Trabajo Social

Ley 53 de 1977 y Decreto 2833 de 1981

Nit 800005991-9

CERTIFICADO DE VIGENCIA Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

EL CONSEJO NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL

CERTIFICA

1. Que PATRICIA DE JESÚS ALVAREZ MANCHEGO identificada con cédula de ciudadanía número 50925652 de Montería, se encuentra inscrita como trabajadora social en este Consejo según el artículo sexto de la Ley 53 de 1977.
2. Que su registro profesional tiene el número 50925652 con código interno 092125015 y con fecha de inscripción 28 de Febrero de 2003, resolución de inscripción 0197 del 28 de Febrero de 2003.
3. Que el registro profesional está vigente.
4. Que revisados los archivos de los casos tratados por el Comité de ética, hasta la fecha, esta persona no ha sido sancionada por faltas contra la ética profesional.
5. Que este certificado tiene vigencia por seis (6) meses a partir de su expedición.

Bogotá D.C., 19 de Julio de 2023.

Elaborado por EjerzoLegalmente
Valide éste documento ingresando el código DO7Bk6S5CE en el siguiente enlace.
https://ejerzo.consejonacionaldetrabajosocial.org.co/public/documentmanagement/validate

CONSORCIO
PAVIMENTAR 2019

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO PAVIMENTAR 2019

NIT: 901.339.855-5

CERTIFICA:

Que la Señora PATRICIA DE JESUS ALVAREZ MANCHEGO, identificada con cédula de ciudadanía N° 50.925.652 de montería, trabajo para este CONSORCIO, con una dedicación de 50% desempeñando el cargo de: **PROFESIONAL SOCIAL** - EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 1192-2019 relacionado a continuación:

CONTRATO DE OBRA No.:	1192-2019
OBJETO:	"REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VIA LA CEIBA (CRUCE VÍA MONTERÍA - PUERTO REY) - CANALETE EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"
CONTRATANTE:	GOBERNACION DE CORDOBA
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO PAVIMENTAR 2019
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 34.224.873.099)
FECHA DE ACTA DE INICIO:	16 DE MARZO DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN DEFINITIVA:	18 DE AGOSTO DE 2021

para constancia se firma en la ciudad de montería a los 12 días del mes octubre del año 2021.

CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA
RL CONSORCIO PAVIMENTAR 2019
NIT: 901.339.855-5

CRA 6 # 65-24 OF 331 3014372346 conpav2019@gmail.com

CONSORCIO VIAS LORICA

Cra 6 #65-24 Places Mall Oficina 331
300-210-5766 consviaslorica2019@gmail.com

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO VIAS LORICA

CERTIFICA QUE:

La señora **PATRICIA DE JESUS ALVAREZ MANCHEGO**, identificada con cédula de ciudadanía N° 50.925.652 de montería; presto sus servicios profesionales el cargo de PROFESIONAL SOCIAL con una dedicación de 50%, en la ejecución del contrato de obra pública N° 1253-2019 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DE VÍA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE LORICA Y MOÑITOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA" y cuya información se resume a continuación:

CONTRATO N°	1253-2019
OBJETO	"MEJORAMIENTO DE VÍA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE LORICA Y MOÑITOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"
DURACIÓN	(12) DOCE MESES
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS LORICA
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORÍA VIAL
FECHA DE INICIO	18 DE AGOSTO DE 2020
FECHA DE TERMINACION	30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Se otorga la presente constancia para los fines que el interesado considere pertinentes a los 11 días de mes de noviembre de 2021 en la Ciudad de Montería.

Cordialmente,

HUGO ALBERTO SALGADO SOLANO
REP. LEGAL CONSORCIO VIAS LORICA
NIT: 901.344.831-9

C.C.P
INGENIEROS S.A.S

PROFESIONAL SISOMA

Dirección: Carrera 6 No. 65-24
Email: ccpconstrucciones22@gmail.com
Montería, Córdoba - Colombia

icontec
internacional

certifica que:

Armando Javier Atencia Soto

10.765.955

asistió y aprobó el programa

FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS EN SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADOS HSEQ. NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 Y NTC ISO 45001:2018

Con una intensidad de 64 horas

El contenido del programa comprendió:

- FUNDAMENTOS ISO 9001 (16 horas)
- COMPETENCIAS BÁSICAS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL (8 horas)
- ELEMENTOS ESTRUCTURALES NTC ISO 45001:2018 (8 horas)
- AUDITORIAS COMBINADAS AL SGI. (24 horas)
- PENSAMIENTO BASADO EN RIESGO (8 horas)

Montería(Colombia), 22 de Junio del 2018

Germán Nava Gutiérrez
Director técnico
ICONTEC

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 10.765.955
[illegible] SOTO

ARMANDO JAVIER

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 02-MAR-1980
MONTERIA
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.77 O- M
ESTATURA G.S. RH SEXO

27-ABR-1998 MONTERIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
[illegible]



A-1300[illegible] 0114 [illegible]

Colmena Seguros

Colmena Formación Virtual

La República de Colombia y en su nombre

Colmena Seguros
NIT. 800226175-3

Debidamente autorizada y habilitada por el Ministerio de Trabajo bajo el número de registro RCO 0001, otorga la certificación correspondiente a la capacitación virtual en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) a:

ARMANDO JAVIER ATENCIA SOTO
Identificado con C.C.10765955

Número de horas cursadas: 50 Horas

De acuerdo a lo establecido en la resolución Número 4927 del 2016
El presente certificado se expide el 23 de julio de 2017, en la ciudad de Bogotá, D. C.

Colmena Seguros

EN NOMBRE DE
LA REPUBLICA DE COLOMBIA

LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

EN ATENCION A QUE

ARMANDO JAVIER ATENCIA SOTO

C.C.No.10.766.955 de Montería

HA COMPLETADO TODOS LOS REQUISITOS QUE LOS ESTATUTOS UNIVERSITARIOS EXIGEN PARA OPTAR AL TITULO DE

INGENIERO INDUSTRIAL

LE EXPIDE EL PRESENTE DIPLOMA. EN TESTIMONIO DE ELLO, SE FIRMA EN MONTERIA,
EL DÍA 26 DEL MES DE MARZO DE 2004

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

DECANO DE LA FACULTAD

SECRETARIO GENERAL

REGISTRADO AL FOLIO No. 245 DEL LIBRO DE REGISTROS DE DIPLOMAS No. 1

UNIVERSIDAD DE CORDOBA - SECRETARIA GENERAL

11868

LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
y en su nombre

LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CONFIERE EL TÍTULO DE

ESPECIALISTA EN HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

A

ARMANDO JAVIER ATENCIA SOTO

C.C. No. 10.765.955 DE MONTERÍA

POR HABER CUMPLIDO LOS REQUISITOS ACADÉMICOS EXIGIDOS
Y EN TESTIMONIO DE ELLO LE OTORGA EL PRESENTE DIPLOMA

En la ciudad de Montería, a los 15 días del mes de JUNIO de 2009

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

SECRETARIO GENERAL

DECANO DE LA FACULTAD

Registrado al folio No. 97 del Libro de Registro de Diplomas No. 8

16386

RESOLUCION Nº [redacted] 0238

POR LA CUAL SE CONCEDE RENOVACION DE LICENCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

EL SECRETARIO DE DESARROLLO DE LA SALUD DE CORDOBA

En uso de sus facultades legales en especial las conferidas por Resolución No. 00004502 de fecha Diciembre 28 de 2012, emanadas del Ministerio de Salud y Protección Social y,

CONSIDERANDO

Que la Ley, 09 de 1979 en Articulo 87, expresa que todas las personas que presten servicios de salud ocupacional a empleadores o trabajadores estarán sujetos a la supervisión y vigilancia del Ministerio de Salud y Protección Social o la entidad en que éste delegue.

Que de conformidad con el Decreto 614 de 1984, corresponde al Ministerio de Salud y Protección Social, determinar los requisitos mínimos que debe cumplir el personal calificado en Salud Ocupacional, tanto a nivel científico como técnico, con el fin de propender por la calidad en la prestación de los servicios en el área, e impulsar el desarrollo de la Salud Ocupacional en el país.

Que de conformidad con la Resolución 1016 de 1989, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, los requisitos mínimos de las personas naturales o jurídicas que oferten servicios de Salud Ocupacional, se acreditarán mediante la respectiva autorización impartida por la autoridad competente y de acuerdo con la legislación vigente.

Que mediante Resolución 0004502 del 28 de diciembre de 2012, el Ministerio de Salud y Protección Social, reglamento el procedimiento y requisitos para el otorgamiento y renovación de las licencias de Salud Ocupacional, estableciendo en su artículo 1° que *la expedición, renovación, vigilancia y control de las licencias de salud ocupacional a las personas naturales o jurídicas públicas o privadas que oferten a nivel nacional, servicios de seguridad y salud en el trabajo, definidos por el artículo 1o de la Ley 1562 de 2012, estará a cargo de las Secretarías Seccionales y Distritales de Salud, en cumplimiento de la competencia asignada a estas por el inciso primero del artículo 23 de la citada ley, previo el cumplimiento de los requisitos y procedimientos señalados.*

Que la Ley 1562 del 11 de julio de 2012 "Por el cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional", en su artículo 1° establece que la Salud Ocupacional se entenderá en adelante como Seguridad y Salud en el Trabajo.

Continuacion RESOLUCIÓN Nº [redacted] 0238

Que **ARMANDO JAVIER ATENCIA SOTO**, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No.10.765.955 expedida en Monteria (Cordoba) y residenciado en la carrera 8 No. 46- 05 en la ciudad de Monteria, ha solicitado renovación de Licencia de Prestación de Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo como Ingeniero Industrial y Especialista en Higiene y Seguridad Industrial , anexando a su petición de fecha 19 de junio de 2019, la documentación exigida por la resolución número 00004502 de diciembre de 2012, así:

1. Formato de solicitud de expedición de la licencia de seguridad y salud en el trabajo, anexo 2 debidamente diligenciado, con indicación de los servicios y las áreas en que se encuentra capacitado y las características básicas de los servicios que va a prestar.
2. Fotocopia de los títulos o diplomas debidamente legalizados, qué demuestren el nivel académico alcanzado.
3. Fotocopia del documento que demuestre que el programa académico cursado es de educación formal de carácter superior.
4. Fotocopia del pensum académico o asignaturas aprobadas que soporten los campos de acción de su formación.

Que la documentación presentada por **ARMANDO JAVIER ATENCIA SOTO**, lo (a) acredita para la Prestación de Servicios de Seguridad y Salud en él trabajo, como Ingeniero Industrial, Especialista en Higiene y Seguridad Industrial, en las áreas de:

- HIGIENE INDUSTRIAL
- SEGURIDAD INDUSTRIAL
- INVESTIGACIÓN EN AREA TECNICA
- INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO COMO PROFESIONAL EN INGENIERIA INDUSTRIAL
- EDUCACIÓN
- CAPACITACIÓN
- DISEÑO, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder renovación de la licencia para prestar Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo a **ARMANDO JAVIER ATENCIA SOTO**, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 10.765.955 expedida en Monteria (Cordoba) de acuerdo al perfil como Profesional en Ingeniería Industrial, Especialista en Higiene y Seguridad Industrial, en las áreas de: HIGIENE INDUSTRIAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL, INVESTIGACIÓN EN AREA TECNICA, INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO COMO INGENIERIO INDUSTRIAL, EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y DISEÑO, ADMINISTRACIÓN Y

Continuacion RESOLUCIÓN Nº [redacted] 0238

EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

ARTICULO SEGUNDO: La licencia de que trata el articulo anterior, se concede por un término de 10 años, contados a partir de la ejecución de la presente Resolución y podrá ser renovada por un término igual, siempre y cuando cumplan con los requisitos estipulados por las normas vigentes al momento de la renovación.

PARAGARAFO: a) Esta licencia es válida en todo el territorio Nacional y tendrá carácter personal e intransferible.

b) El titular de la licencia debe notificar a la Secretaria de Salud, las modificaciones de alguno de los requisitos acreditados en la presente licencia, treinta (30) dias de antelación a su ocurrencia

c) Los titulares de las licencias, deberán cumplir en el ejercicio de sus actividades con las normas legales, técnicas y éticas para la prestación de servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo, que para tal fin expida el Ministerio de Salud y Protección Social

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente Resolución proceden los recursos de de ley.

Notifiquese y Cúmplase.

Dado en Montería, a los 30 JUL 2019

EMBERT AMAYA PRETELT
Secretario de Desarrollo de la Salud

Elaboró: Zobeida Alvarado C. – Profesional Especializado S.O
Proyecto: Z.A.C
Revisó: – C Marsiglia – Abogado Contratista
Aprobó: Jairo Vargas - Ref. Oficina Juridica

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2023-2160384

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que ARMANDO JAVIER ATENCIA SOTO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 10765955, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA INDUSTRIAL con MATRICULA PROFESIONAL 22228-184607 desde el 15 de Abril de 2010, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 393.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los diecinueve (19) días del mes de Julio del año dos mil veintitres (2023).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA

COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.

22228184607COR

INGENIERO INDUSTRIAL

DE FECHA 15/04 2010

ARMANDO JAVIER
ATENCIA SOTO
C.C. 10766956
UNIVERSIDAD DE CORDOBA

PRESIDENTE DEL CONSEJO

CONSORCIO PAVICAR

SOFÁN — DUMAR

CONSORCIO PAVICAR
NIT 901.071.846-6

CERTIFICA

Por medio de la presente hago constar que el señor **ARMANDO JAVIER ATENCIA SOTO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 110.765.955 de montería (Córdoba), laboró en esta empresa desde el día 13 de junio de 2018 hasta el día 30 de octubre de 2019, desempeñando el cargo de **ESPECIALISTA EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO** en los siguientes contratos:

- Contrato No. 426 – 2017, Mejoramiento de la Carretera Tierralta – Caserío el 15 y Rehabilitación de la Carretera Ye de los Morales – Río Sinú en la vía a Valencia, en el Departamento de Córdoba, Tramo No. 4.

- Contrato No. 969 - 2017, Mejoramiento de la carretera Tierralta - caserío el 15 y rehabilitación de la carretera ye de los morales - río Sinú en la vía a valencia en el departamento de córdoba - tramo No. 5

Para constancia se firma en Montería a los diez y ocho (18) días del mes de marzo de 2020.

Atentamente,

CARLOS DUMAR RODRIGUEZ
Representante Legal
Consorcio Pavicar

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 64# No. 7-07
PBX: 57+4 +7831177
MONTERÍA (CÓRDOBA)

OFICINA SUCURSAL: Kr 13# No. 89-38
Of. 414 Edificio Mippon center
PBX: 57+1+7437007
BOGOTÁ D.C.

E-mails: consorciodumarsofan@hotmail.com

Montería 21 de julio de 2023

Sres.
C.C.P INGENIEROS S.A.S
Rep. Legal ELIANA MARGARITA OTERO PEREZ
Montería – córdoba

REFERENCIA: **"LP-SPM-019-2022- MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LOS BARRIOS PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA."**

ASUNTO: **HOMOLOGACION DE PROFESIONALES DE OBRA**

Cordial saludo.

Esta interventoría en cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo a la verificación de los documentos técnicos del proyecto, y revisada la documentación remitida mediante oficio OF-CCP-003, se realiza la aprobación del personal de obra ya que cumple con la condiciones exigidas.

Cordialmente,

ALVARO HERNANDO VERA AYALA
CONSORCIO HIDRALMA
REPRESENTANTE LEGAL

C.C.P
INGENIEROS S.A.S

Pagos mensuales Seguridad Social y Parafiscales o afiliaciones del mes

Dirección: Carrera 6 No. 65-24
Email: ccpconstrucciones22@gmail.com
Montería, Córdoba - Colombia

Alcaldía de Montería
Secretaría de Infraestructura

PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, ELIANA MARGARITA OTERO PEREZ identificada con la cedula de ciudadanía No. 1.064.985.667 de Cereté, en mi condición de representante legal de la empresa C.C.P INGENIEROS S.A.S identificada con NIT 901.595.820-4, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante el periodo comprendido entre 27/02/2023 hasta el 18/08/2023.

Para constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Montería a los 14 días del mes de septiembre del año 2023.

Eliana Otero P

ELIANA MARGARITA OTERO
REP. LEGAL C.C.P INGENIEROS S.A.S

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901595820	4	C.C.P INGENIEROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CCP INGENIEROS SAS	CR 6 65 24 OF 331	MONTERIA-CORDOBA	3014441670	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	9454824113	9454824113	E	2023/08/04	2023/08/11	BANCO DE BOGOTA	7	$11,599,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: CCP INGENIEROS SAS (31 Afiliados)						$37,157,334	$5,946,400			$37,157,334	$1,486,600			$37,157,334	$1,486,600			$37,157,334	$2,588,200		$0	$0
Centro de Trabajo: MOCARI (31 Afiliados)						$37,157,334	$5,946,400			$37,157,334	$1,486,600			$37,157,334	$1,486,600			$37,157,334	$2,588,200		$0	$0
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (31 Afiliados)						$37,157,334	$5,946,400			$37,157,334	$1,486,600			$37,157,334	$1,486,600			$37,157,334	$2,588,200		$0	$0
1	CC	1064606239	ALVAREZ GAVIRIA DOMINGO ANTONIO	230301	21	$812,000	$130,000	ESSC07	21	$812,000	$32,500	CCF16	21	$812,000	$32,500	14-11	21	$812,000	$56,600	21	$0	$0
2	CC	50925652	ALVAREZ MANCHEGO PATRICIA DE JESUS	230301	21	$1,960,000	$313,600	ESSC07	21	$1,960,000	$78,400	CCF16	21	$1,960,000	$78,400	14-11	21	$1,960,000	$136,500	21	$0	$0
3	CC	10765955	ATENCIA SOTO ARMANDO JAVIER	230301	21	$1,960,000	$313,600	EPS002	21	$1,960,000	$78,400	CCF16	21	$1,960,000	$78,400	14-11	21	$1,960,000	$136,500	21	$0	$0
4	CC	1128268092	AVILEZ PADILLA ANGELA MARIA	230201	21	$812,000	$130,000	EPS005	21	$812,000	$32,500	CCF16	21	$812,000	$32,500	14-11	21	$812,000	$56,600	21	$0	$0
5	CC	1193223977	AYUBB RAMOS MOISES	25-14	21	$1,400,000	$224,000	EPS005	21	$1,400,000	$56,000	CCF16	21	$1,400,000	$56,000	14-11	21	$1,400,000	$97,500	21	$0	$0
6	PT	4948063	BELLORIN IBARRA DEIKER ALEXANDER	230301	21	$812,000	$130,000	ESSC07	21	$812,000	$32,500	CCF16	21	$812,000	$32,500	14-11	21	$812,000	$56,600	21	$0	$0
7	CC	1067948764	BOLAÑO MARTINEZ GLIDER YULIETH	230301	21	$812,000	$130,000	EPS002	21	$812,000	$32,500	CCF16	21	$812,000	$32,500	14-11	21	$812,000	$56,600	21	$0	$0
8	CC	30685544	CARVAJAL PINEDA CLAUDIA STELLA	25-14	21	$3,850,000	$616,000	EPS037	21	$3,850,000	$154,000	CCF16	21	$3,850,000	$154,000	14-11	21	$3,850,000	$268,000	21	$0	$0
9	CC	73143152	CASTILLA NEGRETE PABLO EUGENIO	25-14	21	$812,000	$130,000	EPS005	21	$812,000	$32,500	CCF16	21	$812,000	$32,500	14-11	21	$812,000	$56,600	21	$0	$0
10	CC	78693762	CHIMA GOMEZ OSCAR LUIS	230301	21	$1,400,000	$224,000	EPS041	21	$1,400,000	$56,000	CCF16	21	$1,400,000	$56,000	14-11	21	$1,400,000	$97,500	21	$0	$0
11	CC	78060039	DIAZ HERNANDEZ ERNAN ANTONIO	230301	21	$1,400,000	$224,000	ESSC07	21	$1,400,000	$56,000	CCF16	21	$1,400,000	$56,000	14-11	21	$1,400,000	$97,500	21	$0	$0
12	CC	78034100	FERNANDEZ PEREZ JAAM	25-14	21	$812,000	$130,000	EPS002	21	$812,000	$32,500	CCF16	21	$812,000	$32,500	14-11	21	$812,000	$56,600	21	$0	$0
13	CC	1137974763	GENES HOYOS NAYIB ENRIQUE	230301	21	$812,000	$130,000	ESSC07	21	$812,000	$32,500	CCF16	21	$812,000	$32,500	14-11	21	$812,000	$56,600	21	$0	$0
14	CC	78751878	GOMEZ PASTRANA EDUARDO ANDRES	25-14	21	$2,100,000	$336,000	EPS002	21	$2,100,000	$84,000	CCF16	21	$2,100,000	$84,000	14-11	21	$2,100,000	$146,200	21	$0	$0
15	CC	1067882786	GUERRERO CARE MAIRENA ESTHER	230301	21	$812,000	$130,000	EPS041	21	$812,000	$32,500	CCF16	21	$812,000	$32,500	14-11	21	$812,000	$56,600	21	$0	$0
16	CC	1000857854	GUERRERO LAMADRID SANTIAGO	230201	21	$1,400,000	$224,000	EPS041	21	$1,400,000	$56,000	CCF16	21	$1,400,000	$56,000	14-11	21	$1,400,000	$97,500	21	$0	$0
17	CC	1062681755	HERNANDEZ DURANGO MELISSA	230301	21	$1,400,000	$224,000	EPS037	21	$1,400,000	$56,000	CCF16	21	$1,400,000	$56,000	14-11	21	$1,400,000	$97,500	21	$0	$0
18	CC	1067925581	MELENDREZ CORONADO EDUARDO LUIS	230301	21	$1,400,000	$224,000	EPS002	21	$1,400,000	$56,000	CCF16	21	$1,400,000	$56,000	14-11	21	$1,400,000	$97,500	21	$0	$0
19	CC	1073998415	OBAJI BERNAL DAYANE MERCEDES	230301	21	$812,000	$130,000	EPS037	21	$812,000	$32,500	CCF16	21	$812,000	$32,500	14-11	21	$812,000	$56,600	21	$0	$0
20	CC	1062604597	PAYARES ESPITIA DANIELA PAOLA	230301	21	$812,000	$130,000	EPS037	21	$812,000	$32,500	CCF16	21	$812,000	$32,500	14-11	21	$812,000	$56,600	21	$0	$0
21	CC	1067937206	PEINADO FLOREZ JOSE LUIS	230201	4	$154,667	$24,800	EPS041	4	$154,667	$6,200	CCF16	4	$154,667	$6,200	14-11	4	$154,667	$10,800	4	$0	$0
22	CC	1065011191	PEREZ PEREZ JOSE GUILLERMO	230301	21	$812,000	$130,000	EPS002	21	$812,000	$32,500	CCF16	21	$812,000	$32,500	14-11	21	$812,000	$56,600	21	$0	$0
23	CC	78694199	PITALUA TAMARA JHON EDISSON	25-14	21	$840,000	$134,400	EPS005	21	$840,000	$33,600	CCF16	21	$840,000	$33,600	14-11	21	$840,000	$58,500	21	$0	$0
24	CC	80087842	PUCHE DIAZ RAFAEL ANDRES	231001	21	$2,100,000	$336,000	EPS037	21	$2,100,000	$84,000	CCF16	21	$2,100,000	$84,000	14-11	21	$2,100,000	$146,200	21	$0	$0
25	CC	1067924222	RIVERO BERRIO KELLY YOHANA	230301	21	$812,000	$130,000	EPS002	21	$812,000	$32,500	CCF16	21	$812,000	$32,500	14-11	21	$812,000	$56,600	21	$0	$0
26	CC	1067911549	RIZO OZUNA JOSE MIGUEL	231001	21	$840,000	$134,000	EPS002	21	$840,000	$33,600	CCF16	21	$840,000	$33,600	14-11	21	$840,000	$58,500	21	$0	$0
27	CC	1073971706	SPIR DEL CASTILLO JADER LUIS	230201	21	$840,000	$134,400	EPS041	21	$840,000	$33,600	CCF16	21	$840,000	$33,600	14-11	21	$840,000	$58,500	21	$0	$0
28	CC	1067881710	URANGO CHIMA ERNI ELIAS	231001	21	$840,000	$134,400	EPS002	21	$840,000	$33,600	CCF16	21	$840,000	$33,600	14-11	21	$840,000	$58,500	21	$0	$0

2023/08/14 07:53 AM

aportes en línea

Régimen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
29	CC	1065011515	VEGA CAVADIA ISMAEL ANDRES	230301	21	$812,000	$130,000	ESSC07	21	$812,000	$32,500	CCF16	21	$812,000	$32,500	14-11	21	$812,000	$56,600	21	$0	$0
30	CC	11052258	VERGARA DE LA OSSA RAFAEL DARIO	25-14	21	$2,590,000	$414,400	EPS037	21	$2,590,000	$103,600	CCF16	21	$2,590,000	$103,600	14-11	21	$2,590,000	$180,300	21	$0	$0
31	CC	1064982751	YORENTE MORALES JAVIER ENRIQUE	230301	4	$154,667	$24,800	EPS002	4	$154,667	$6,200	CCF16	4	$154,667	$6,200	14-11	4	$154,667	$10,800	4	$0	$0
Total	**Afiliados(31)**					**$37,157,334**	**$5,946,400**			**$37,157,334**	**$1,486,600**			**$37,157,334**	**$1,486,600**			**$37,157,334**	**$2,588,200**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901595820	4	C.C.P INGENIEROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CCP INGENIEROS SAS	CR 6 65 24 OF 331	MONTERIA-CORDOBA	3014441670	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	9454824113	9454824113	E	2023/08/04	2023/08/11	BANCO DE BOGOTA	7	$11,599,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				31	$5,946,400	$47,100	$0	$5,993,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$600,400	$4,800	$0	$605,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$1,984,800	$15,700	$0	$2,000,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	17	$2,848,000	$22,500	$0	$2,870,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$513,200	$4,100	$0	$517,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$2,588,200	$20,400	$0	$2,608,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	31	$2,588,200	$20,400	$0	$2,608,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$1,486,600	$11,700	$0	$1,498,300
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	31	$1,486,600	$11,700	$0	$1,498,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				31	$1,486,600	$12,000	$0	$1,498,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	6	$264,400	$2,100	$0	$266,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$462,600	$3,700	$0	$466,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	$184,300	$1,500	$0	$185,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	10	$420,700	$3,400	$0	$424,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$154,600	$1,300	$0	$155,900
TOTAL				31	$11,507,800	$91,200	$0	$11,599,000

2023/08/14 07:53 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901647860	3	CONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CL 31 4 67 O F 306	MONTERIA-CORDOBA	3135095698	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	9452916284	9452916284	E	2023/05/15	2023/06/29	BANCO BOGOTA	45	$10,147,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1010039590	ALMANZA RONAL		X																230301	28	$1,866,667	$298,700	ESSC07	28	$1,866,667	$74,700	CCF16	28	$1,866,667	$74,700	14-4	28	$1,866,667	$130,000	28	$0	$0	SI	$578,100
2	CC	1067880773	ARDILA ANTONIO		X																230301	28	$2,800,000	$448,000	EPS037	28	$2,800,000	$112,000	CCF16	28	$2,800,000	$112,000	14-4	28	$2,800,000	$194,900	28	$0	$0	SI	$866,900
3	CC	52794665	ASSIAS ARLENYS		X																230301	28	$2,613,334	$418,200	EPS037	28	$2,613,334	$104,600	CCF16	28	$2,613,334	$104,600	14-4	28	$2,613,334	$181,900	28	$0	$0	SI	$809,300
4	CC	1073981753	AVILES ALBEIRO		X																231001	28	$1,082,667	$173,300	EPS002	28	$1,082,667	$43,400	CCF16	28	$1,082,667	$43,400	14-4	28	$1,082,667	$75,400	28	$0	$0	SI	$335,500
5	CC	26227533	AVILEZ ANGELICA		X																230301	28	$3,453,334	$552,600	EPS037	28	$3,453,334	$138,200	CCF16	28	$3,453,334	$138,200	14-4	28	$3,453,334	$240,400	28	$0	$0	SI	$1,069,400
6	CC	50899733	ESPITIA AYDA		X																230201	28	$2,613,334	$418,200	EPS002	28	$2,613,334	$104,600	CCF16	28	$2,613,334	$104,600	14-4	28	$2,613,334	$181,900	28	$0	$0	SI	$809,300
7	CC	1067928482	FLOREZ LAUREN		X																230301	28	$1,082,667	$173,300	EPS002	28	$1,082,667	$43,400	CCF16	28	$1,082,667	$43,400	14-4	28	$1,082,667	$75,400	28	$0	$0	SI	$335,500
8	CC	10994144	LOPEZ DIONICIO		X																231001	28	$1,082,667	$173,300	EPS041	28	$1,082,667	$43,400	CCF16	28	$1,082,667	$43,400	14-4	28	$1,082,667	$75,400	28	$0	$0	SI	$335,500
9	CC	1067925581	MELENDREZ EDUARDO		X																230301	28	$1,866,667	$298,700	EPS002	28	$1,866,667	$74,700	CCF16	28	$1,866,667	$74,700	14-4	28	$1,866,667	$130,000	28	$0	$0	SI	$578,100
10	CC	15049291	MONTES EDWIN		X																230301	28	$1,866,667	$298,700	EPS037	28	$1,866,667	$74,700	CCF16	28	$1,866,667	$74,700	14-4	28	$1,866,667	$130,000	28	$0	$0	SI	$578,100
11	CC	1074011687	MORALES LUIS		X																230301	28	$1,866,667	$298,700	EPS037	28	$1,866,667	$74,700	CCF16	28	$1,866,667	$74,700	14-4	28	$1,866,667	$130,000	28	$0	$0	SI	$578,100
12	CC	1073988390	PADILLA JOSE		X																230301	28	$1,866,667	$298,700	ESSC07	28	$1,866,667	$74,700	CCF16	28	$1,866,667	$74,700	14-4	28	$1,866,667	$130,000	28	$0	$0	SI	$578,100
13	CC	1067890408	SOTELO LUIS		X																230201	28	$1,082,667	$173,300	EPS041	28	$1,082,667	$43,400	CCF16	28	$1,082,667	$43,400	14-4	28	$1,082,667	$75,400	28	$0	$0	SI	$335,500
14	CC	1073971706	SPIR JADER		X																230201	28	$1,120,000	$179,200	EPS037	28	$1,120,000	$44,800	CCF16	28	$1,120,000	$44,800	14-4	28	$1,120,000	$78,000	28	$0	$0	SI	$346,800
15	CC	1064981277	TORRES MOISES		X																230301	28	$1,082,667	$173,300	ESSC07	28	$1,082,667	$43,400	CCF16	28	$1,082,667	$43,400	14-4	28	$1,082,667	$75,400	28	$0	$0	SI	$335,500
16	CC	1067881710	URANGO ERNI		X																231001	28	$1,082,667	$173,300	EPS002	28	$1,082,667	$43,400	CCF16	28	$1,082,667	$43,400	14-4	28	$1,082,667	$75,400	28	$0	$0	SI	$335,500
17	CC	1065011515	VEGA ISMAEL		X																230301	28	$1,082,667	$173,300	ESSC07	28	$1,082,667	$43,400	CCF16	28	$1,082,667	$43,400	14-4	28	$1,082,667	$75,400	28	$0	$0	SI	$335,500
18	CC	1007527744	VELASCO CARLOS		X																230301	28	$1,082,667	$173,300	ESSC07	28	$1,082,667	$43,400	CCF16	28	$1,082,667	$43,400	14-4	28	$1,082,667	$75,400	28	$0	$0	SI	$335,500
19	CC	6843266	VILORIA JORGE		X																	0	$0	$0	EPS041	28	$1,082,667	$43,400	CCF16	28	$1,082,667	$43,400	14-4	28	$1,082,667	$75,400	28	$0	$0	SI	$162,200
Total	Afiliados(19)																						$30,594,673	$4,896,100			$31,677,340	$1,268,300			$31,677,340	$1,268,300			$31,677,340	$2,205,700		$0	$0		$9,638,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901647860	3	CONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CL 31 4 67 O F 306	MONTERIA-CORDOBA	3135095698	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	9452916284	9452916284	E	2023/05/15	2023/06/29	BANCO BOGOTA	45	$10,147,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				18	$4,896,100	$258,500	$0	$5,154,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$519,900	$27,500	$0	$547,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$3,605,500	$190,300	$0	$3,795,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$770,700	$40,700	$0	$811,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$2,205,700	$116,400	$0	$2,322,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	19	$2,205,700	$116,400	$0	$2,322,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$1,268,300	$67,000	$0	$1,335,300
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	19	$1,268,300	$67,000	$0	$1,335,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				19	$1,268,300	$67,100	$0	$1,335,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	$279,600	$14,800	$0	$294,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$549,000	$29,000	$0	$578,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$130,200	$6,900	$0	$137,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$309,500	$16,400	$0	$325,900
TOTAL				19	$9,638,400	$509,000	$0	$10,147,400

2023/09/05 07:26 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901647860	3	CONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CL 31 4 67 O F 306	MONTERIA-CORDOBA	3135095698	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	9456270469	9456270469	E	2023/05/15	2023/09/14	BANCO DE BOGOTA	122	$7,199,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	78031712	ROYETT GUSTAVO	230301	28	$1,082,667	$173,300	EPS002	28	$1,082,667	$43,400	CCF16	28	$1,082,667	$43,400	14-4	28	$1,082,667	$75,400	28	$0	$0
2	CC	78751878	GOMEZ EDUARDO	25-14	28	$2,800,000	$448,000	EPS002	28	$2,800,000	$112,000	CCF16	28	$2,800,000	$112,000	14-4	28	$2,800,000	$194,900	28	$0	$0
3	CC	1064998432	GONZALEZ GABRIEL	230301	28	$1,866,667	$298,700	ESSC07	28	$1,866,667	$74,700	CCF16	28	$1,866,667	$74,700	14-4	28	$1,866,667	$130,000	28	$0	$0
4	CC	1233338114	GONZALEZ MAYRA	230201	28	$2,426,667	$388,300	EPS002	28	$2,426,667	$97,100	CCF16	28	$2,426,667	$97,100	14-4	28	$2,426,667	$168,900	28	$0	$0
5	CC	78696446	HERNANDEZ CARLOS	231001	28	$1,082,667	$173,300	EPS002	28	$1,082,667	$135,400	CCF16	28	$1,082,667	$43,400	14-4	28	$1,082,667	$75,400	28	$1,082,667	$54,200
6	CC	78646722	MARTINEZ DALIM	230201	28	$1,120,000	$179,200	EPS010	28	$1,120,000	$44,800	CCF16	28	$1,120,000	$44,800	14-4	28	$1,120,000	$78,000	28	$0	$0
7	CC	1062425368	MISAS FERLIX	230301	28	$1,082,667	$173,300	CCFC55	28	$1,082,667	$135,400	CCF16	28	$1,082,667	$43,400	14-4	28	$1,082,667	$75,400	28	$1,082,667	$54,200
8	CC	1065003103	MURILLO YONY	230301	28	$1,120,000	$179,200	ESSC07	28	$1,120,000	$140,000	CCF16	28	$1,120,000	$44,800	14-4	28	$1,120,000	$78,000	28	$1,120,000	$56,000
9	CC	1073998415	OBAJI DAYANE	230301	28	$1,082,667	$173,300	EPS037	28	$1,082,667	$43,400	CCF16	28	$1,082,667	$43,400	14-4	28	$1,082,667	$75,400	28	$0	$0
10	CC	25801094	ROMERO CARMEN	25-14	28	$5,133,334	$872,800	EPS002	28	$5,133,334	$205,400	CCF16	28	$5,133,334	$205,400	14-4	28	$5,133,334	$357,300	28	$0	$0
Total	**Afiliados(10)**					**$18,797,336**	**$3,059,400**			**$18,797,336**	**$1,031,600**			**$18,797,336**	**$752,400**			**$18,797,336**	**$1,308,700**		**$3,285,334**	**$164,400**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$3,059,400	$427,600	$0	$3,487,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$173,300	$24,300	$0	$197,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$1,320,800	$184,600	$0	$1,505,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$997,800	$139,400	$0	$1,137,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$567,500	$79,300	$0	$646,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$1,308,700	$182,900	$0	$1,491,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	10	$1,308,700	$182,900	$0	$1,491,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$752,400	$105,200	$0	$857,600
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	10	$752,400	$105,200	$0	$857,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				10	$1,031,600	$144,300	$0	$1,175,900
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$135,400	$19,000	$0	$154,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$44,800	$6,300	$0	$51,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$214,700	$30,000	$0	$244,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$43,400	$6,100	$0	$49,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$593,300	$82,900	$0	$676,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$98,600	$13,800	$0	$112,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$98,600	$13,800	$0	$112,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$65,800	$9,200	$0	$75,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$65,800	$9,200	$0	$75,000
TOTAL				10	$6,316,500	$883,000	$0	$7,199,500

2023/09/14 05:39 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901647860	3	CONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CL 31 4 67 O F 306	MONTERIA-CORDOBA	3135095698	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-04	49698295	9449698295	E	2023/04/18	2023/04/19	BANCO AV VILLAS	1	$12,616,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1010039590	ALMANZA RONAL																		230301	30	$2,000,000	$320,000	ESSC07	30	$2,000,000	$80,000	CCF16	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
2	CC	1064606239	ALVAREZ DOMINGO	X	X																230301	2	$77,334	$12,400	ESSC07	2	$77,334	$3,100	CCF16	2	$77,334	$3,100	14-4	2	$77,334	$5,400	2	$0	$0	SI	$24,000
3	CC	10904230	ASSIAS ALEJANDRO	X	X																231001	8	$309,334	$49,500	ESSC07	8	$309,334	$12,400	CCF16	8	$309,334	$12,400	14-4	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0	SI	$95,900
4	CC	52794665	ASSIAS ARLENYS																		230301	30	$2,800,000	$448,000	EPS037	30	$2,800,000	$112,000	CCF16	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	$194,900	30	$0	$0	SI	$866,900
5	CC	1073971711	ASSIAS SAMIR	X	X																230201	6	$720,000	$115,200	EPS002	6	$720,000	$28,800	CCF16	6	$720,000	$28,800	14-4	6	$720,000	$50,200	6	$0	$0	SI	$223,000
6	CC	1073981753	AVILES ALBEIRO																		231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
7	CC	26227533	AVILEZ ANGELICA																		230301	30	$3,700,000	$592,000	EPS037	30	$3,700,000	$148,000	CCF16	30	$3,700,000	$148,000	14-4	30	$3,700,000	$257,600	30	$0	$0	SI	$1,145,600
8	CC	1067948764	BOLAÑO GLIDER	X	X																230301	10	$386,667	$61,900	EPS002	10	$386,667	$15,500	CCF16	10	$386,667	$15,500	14-4	10	$386,667	$27,000	10	$0	$0	SI	$119,900
9	CC	50899733	ESPITIA AYDA																		230201	30	$2,800,000	$448,000	EPS002	30	$2,800,000	$112,000	CCF16	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	$194,900	30	$0	$0	SI	$866,900
10	CC	1067928482	FLOREZ LAUREN																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
11	CC	1233338114	GONZALEZ MAYRA		X																230201	3	$260,000	$41,600	EPS002	3	$260,000	$10,400	CCF16	3	$260,000	$10,400	14-4	3	$260,000	$18,100	3	$0	$0	SI	$80,500
12	CC	1067882786	GUERRERO MAIRENA	X	X																230301	1	$38,667	$6,200	EPS041	1	$38,667	$1,600	CCF16	1	$38,667	$2,700	14-4	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0	SI	$12,100
13	CC	78696446	HERNANDEZ CARLOS		X																231001	6	$540,000	$86,400	EPS002	6	$540,000	$67,500	CCF16	6	$540,000	$21,600	14-4	6	$540,000	$37,600	6	$540,000	$27,000	No	$240,100
14	CC	10994144	LOPEZ DIONICIO																		231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
15	CC	78646722	MARTINEZ DALIM		X																230201	3	$120,000	$19,200	EPS010	3	$120,000	$4,800	CCF16	3	$120,000	$4,800	14-4	3	$120,000	$8,400	3	$0	$0	SI	$37,200
16	CC	1067925581	MELENDREZ EDUARDO																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF16	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
17	CC	1062425368	MISAS FERLIX		X																230301	25	$966,667	$154,700	CCFC55	25	$966,667	$120,900	CCF16	25	$966,667	$38,700	14-4	25	$966,667	$67,300	25	$966,667	$48,500	No	$430,100
18	CC	15049291	MONTES EDWIN																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF16	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
19	CC	1074011687	MORALES LUIS																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF16	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
20	CC	1073998415	OBAJI DAYANE		X																230301	9	$1,110,000	$177,600	EPS037	9	$1,110,000	$44,400	CCF16	9	$1,110,000	$44,400	14-4	9	$1,110,000	$77,300	9	$0	$0	SI	$343,700
21	CC	1015394016	OROZCO YENIS	X	X																230301	10	$386,667	$61,900	EPS002	10	$386,667	$15,500	CCF16	10	$386,667	$15,500	14-4	10	$386,667	$27,000	10	$0	$0	SI	$119,900
22	CC	1073988390	PADILLA JOSE																		230301	30	$2,000,000	$320,000	ESSC07	30	$2,000,000	$80,000	CCF16	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
23	CC	1067937206	PEINADO JOSE	X	X																230201	6	$232,000	$37,200	EPS041	6	$232,000	$9,300	CCF16	6	$232,000	$9,300	14-4	6	$232,000	$16,200	6	$0	$0	SI	$72,000
24	CC	1062432856	PORTILLO CAMILO	X	X																230201	10	$386,667	$61,900	ESSC07	10	$386,667	$15,500	CCF16	10	$386,667	$15,500	14-4	10	$386,667	$27,000	10	$0	$0	SI	$119,900
25	CC	25801094	ROMERO CARMEN																		25-14	30	$5,500,000	$935,000	EPS002	30	$5,500,000	$220,000	CCF16	30	$5,500,000	$220,000	14-4	30	$5,500,000	$382,800	30	$0	$0	SI	$1,757,800
26	CC	78031712	ROYETT GUSTAVO		X																231001	9	$1,110,000	$177,600	EPS005	9	$1,110,000	$44,400	CCF16	9	$1,110,000	$44,400	14-4	9	$1,110,000	$77,300	9	$0	$0	SI	$343,700
27	CC	1067890408	SOTELO LUIS	X																	230201	9	$348,000	$55,700	EPS041	9	$348,000	$14,000	CCF16	9	$348,000	$14,000	14-4	9	$348,000	$24,300	9	$0	$0	SI	$108,000
28	CC	1073971706	SPIR JADER																		230201	30	$1,200,000	$192,000	EPS037	30	$1,200,000	$48,000	CCF16	30	$1,200,000	$48,000	14-4	30	$1,200,000	$83,600	30	$0	$0	SI	$371,600
29	CC	1064981277	TORRES MOISES																		230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
30	CC	1067881710	URANGO ERNI																		231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
31	CC	1065011515	VEGA ISMAEL	X																	230301	7	$270,667	$43,400	ESSC07	7	$270,667	$10,900	CCF16	7	$270,667	$10,900	14-4	7	$270,667	$18,900	7	$0	$0	SI	$84,100
32	CC	1007527744	VELASCO CARLOS	X																	230301	6	$232,000	$37,200	ESSC07	6	$232,000	$9,300	CCF16	6	$232,000	$9,300	14-4	6	$232,000	$16,200	6	$0	$0	SI	$72,000
33	CC	6843266	VILORIA JORGE																			0	$0	$0	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$173,600
Total	Afiliados(33)																						$39,294,670	$6,342,600			$40,454,670	$1,746,700			$40,454,670	$1,618,600			$40,454,670	$2,817,100		$1,506,667	$75,500		$12,600,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901647860	3	CONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CL 31 4 67 O F 306	MONTERIA-CORDOBA	3135095698	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-04	49698295	9449698295	E	2023/04/18	2023/04/19	BANCO AV VILLAS	1	$12,616,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				32	$6,342,600	$8,000	$0	$6,350,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$870,300	$1,100	$0	$871,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$935,000	$1,300	$0	$936,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	17	$3,566,500	$4,400	$0	$3,570,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$970,800	$1,200	$0	$972,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				33	$2,817,100	$3,500	$0	$2,820,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	33	$2,817,100	$3,500	$0	$2,820,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				33	$1,618,600	$2,000	$0	$1,620,600
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	33	$1,618,600	$2,000	$0	$1,620,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				33	$1,746,700	$2,600	$0	$1,749,300
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$120,900	$200	$0	$121,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$4,800	$100	$0	$4,900
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	8	$257,600	$400	$0	$258,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$592,400	$800	$0	$593,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	$117,700	$200	$0	$117,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	10	$608,900	$800	$0	$609,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$44,400	$100	$0	$44,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$45,300	$100	$0	$45,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$45,300	$100	$0	$45,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$30,200	$100	$0	$30,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$30,200	$100	$0	$30,300
TOTAL				33	$12,600,500	$16,300	$0	$12,616,800

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901647860	3	CONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CL 31 4 67 O F 306	MONTERIA-CORDOBA	3135095698	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-04	9456270265	9456270265	E	2023/04/18	2023/09/14	BANCO DE BOGOTA	149	$3,950,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1067880773	ARDILA ANTONIO	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF16	30	$3,000,000	$120,000	14-4	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
2	CC	78031712	ROYETT GUSTAVO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
3	CC	78751878	GOMEZ EDUARDO	25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS002	30	$3,000,000	$120,000	CCF16	30	$3,000,000	$120,000	14-4	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
4	CC	1064998432	GONZALEZ GABRIEL	230301	30	$2,000,000	$320,000	ESSC07	30	$2,000,000	$80,000	CCF16	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
5	CC	1065003103	MURILLO YONY	230301	30	$1,200,000	$192,000	ESSC07	30	$1,200,000	$150,000	CCF16	30	$1,200,000	$48,000	14-4	30	$1,200,000	$83,600	30	$1,200,000	$60,000
Total			**Afiliados(5)**			**$10,360,000**	**$1,657,600**			**$10,360,000**	**$516,400**			**$10,360,000**	**$414,400**			**$10,360,000**	**$721,200**		**$1,200,000**	**$60,000**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$1,657,600	$285,600	$0	$1,943,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$480,000	$82,700	$0	$562,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,177,600	$202,900	$0	$1,380,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$721,200	$124,300	$0	$845,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	5	$721,200	$124,300	$0	$845,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$414,400	$71,400	$0	$485,800
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	5	$414,400	$71,400	$0	$485,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$516,400	$89,100	$0	$605,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$230,000	$39,700	$0	$269,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$120,000	$20,700	$0	$140,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$166,400	$28,700	$0	$195,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$36,000	$6,300	$0	$42,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$36,000	$6,300	$0	$42,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$24,000	$4,200	$0	$28,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$24,000	$4,200	$0	$28,200
TOTAL				5	$3,369,600	$580,900	$0	$3,950,500

2023/09/14 05:38 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901647860	3	CONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CL 31 4 67 O F 306	MONTERIA-CORDOBA	3135095698	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-04	9456270313	9456270313	N	2023/04/18	2023/09/14	BANCO DE BOGOTA	149	$1,146,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1233338114	GONZALEZ MAYRA	230201	3	($260,000)	($41,600)	EPS002	3	($260,000)	($10,400)	CCF16	3	($260,000)	($10,400)	14-4	3	($260,000)	($18,100)	3	$0	$0
2	CC	1233338114	GONZALEZ MAYRA	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
3	CC	78696446	HERNANDEZ CARLOS	231001	6	($540,000)	($86,400)	EPS002	6	($540,000)	($67,500)	CCF16	6	($540,000)	($21,600)	14-4	6	($540,000)	($37,600)	6	($540,000)	($27,000)
4	CC	78696446	HERNANDEZ CARLOS	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000
5	CC	78646722	MARTINEZ DALIM	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
6	CC	78646722	MARTINEZ DALIM	230201	3	($120,000)	($19,200)	EPS010	3	($120,000)	($4,800)	CCF16	3	($120,000)	($4,800)	14-4	3	($120,000)	($8,400)	3	$0	$0
7	CC	1062425368	MISAS FERLIX	230301	25	($966,667)	($154,700)	CCFC55	25	($966,667)	($120,900)	CCF16	25	($966,667)	($38,700)	14-4	25	($966,667)	($67,300)	25	($966,667)	($48,500)
8	CC	1062425368	MISAS FERLIX	230301	30	$1,160,000	$185,600	CCFC55	30	$1,160,000	$145,000	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000
9	CC	1073998415	OBAJI DAYANE	230301	9	($1,110,000)	($177,600)	EPS037	9	($1,110,000)	($44,400)	CCF16	9	($1,110,000)	($44,400)	14-4	9	($1,110,000)	($77,300)	9	$0	$0
10	CC	1073998415	OBAJI DAYANE	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
Total	**Afiliados(5)**					**$2,803,333**	**$448,500**			**$2,803,333**	**$181,200**			**$2,803,333**	**$112,100**			**$2,803,333**	**$195,300**		**$813,333**	**$40,500**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$448,500	$77,400	$0	$525,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$99,200	$17,100	$0	$116,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$38,900	$6,800	$0	$45,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$310,400	$53,500	$0	$363,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$195,300	$33,700	$0	$229,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	5	$195,300	$33,700	$0	$229,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$112,100	$19,400	$0	$131,500
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	5	$112,100	$19,400	$0	$131,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				5	$181,200	$31,400	$0	$212,600
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$24,100	$4,200	$0	$28,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$41,600	$7,200	$0	$48,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$2,000	$400	$0	$2,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$113,500	$19,600	$0	$133,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$24,300	$4,200	$0	$28,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$24,300	$4,200	$0	$28,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$16,200	$2,800	$0	$19,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$16,200	$2,800	$0	$19,000
TOTAL				5	$977,600	$168,900	$0	$1,146,500

2023/09/14 05:35 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901647860	3	CONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CL 31 4 67 O F 306	MONTERIA-CORDOBA	3135095698	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-03	1984222256	9448714898	E	2023/03/14	2023/03/23	BANCOLOMBIA	9	$3,235,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1010039590	ALMANZA RONAL	X																	230301	6	$400,000	$64,000	ESSC07	6	$400,000	$16,000	CCF16	6	$400,000	$16,000	14-4	6	$400,000	$27,900	6	$0	$0	SI	$123,900
2	CC	1067880773	ARDILA ANTONIO	X	X																230301	4	$400,000	$64,000	EPS037	4	$400,000	$16,000	CCF16	4	$400,000	$16,000	14-4	4	$400,000	$27,900	4	$0	$0	SI	$123,900
3	CC	52794665	ASSIAS ARLENYS	X	X																230301	4	$373,334	$59,800	EPS037	4	$373,334	$15,000	CCF16	4	$373,334	$15,000	14-4	4	$373,334	$26,000	4	$0	$0	SI	$115,800
4	CC	1073981753	AVILES ALBEIRO	X																	230301	6	$232,000	$37,200	EPS002	6	$232,000	$9,300	CCF16	6	$232,000	$9,300	14-4	6	$232,000	$16,200	6	$0	$0	SI	$72,000
5	CC	26227533	AVILEZ ANGELICA	X	X																230301	4	$493,334	$79,000	EPS037	4	$493,334	$19,800	CCF16	4	$493,334	$19,800	14-4	4	$493,334	$34,400	4	$0	$0	SI	$153,000
6	CC	50899733	ESPITIA AYDA	X	X																230201	4	$373,334	$59,800	EPS002	4	$373,334	$15,000	CCF16	4	$373,334	$15,000	14-4	4	$373,334	$26,000	4	$0	$0	SI	$115,800
7	CC	1067928482	FLOREZ LAUREN	X																	230301	6	$232,000	$37,200	EPS002	6	$232,000	$9,300	CCF16	6	$232,000	$9,300	14-4	6	$232,000	$16,200	6	$0	$0	SI	$72,000
8	CC	78751878	GOMEZ EDUARDO	X	X																25-14	4	$400,000	$64,000	EPS002	4	$400,000	$16,000	CCF16	4	$400,000	$16,000	14-4	4	$400,000	$27,900	4	$0	$0	SI	$123,900
9	CC	1064998432	GONZALEZ GABRIEL	X	X																230301	4	$266,667	$42,700	ESSC07	4	$266,667	$10,700	CCF16	4	$266,667	$10,700	14-4	4	$266,667	$18,600	4	$0	$0	SI	$82,700
10	CC	1233338114	GONZALEZ MAYRA	X	X																230201	4	$346,667	$55,500	EPS002	4	$346,667	$13,900	CCF16	4	$346,667	$13,900	14-4	4	$346,667	$24,200	4	$0	$0	SI	$107,500
11	CC	78696446	HERNANDEZ CARLOS	X																	231001	6	$540,000	$86,400	EPS002	6	$540,000	$67,500	CCF16	6	$540,000	$21,600	14-4	6	$540,000	$37,600	6	$540,000	$27,000	No	$240,100
12	CC	10994144	LOPEZ DIONICIO	X																	230301	6	$232,000	$37,200	EPS002	6	$232,000	$9,300	CCF16	6	$232,000	$9,300	14-4	6	$232,000	$16,200	6	$0	$0	SI	$72,000
13	CC	78646722	MARTINEZ DALIM	X																	230201	6	$240,000	$38,400	EPS010	6	$240,000	$9,600	CCF16	6	$240,000	$9,600	14-4	6	$240,000	$16,800	6	$0	$0	SI	$74,400
14	CC	1067925581	MELENDREZ EDUARDO	X																	230301	6	$400,000	$64,000	EPS002	6	$400,000	$16,000	CCF16	6	$400,000	$16,000	14-4	6	$400,000	$27,900	6	$0	$0	SI	$123,900
15	CC	1062425368	MISAS FERLIX	X																	230301	6	$232,000	$37,200	CCFC55	6	$232,000	$29,000	CCF16	6	$232,000	$9,300	14-4	6	$232,000	$16,200	6	$232,000	$11,700	No	$103,400
16	CC	15049291	MONTES EDWIN	X																	230301	6	$400,000	$64,000	EPS037	6	$400,000	$16,000	CCF16	6	$400,000	$16,000	14-4	6	$400,000	$27,900	6	$0	$0	SI	$123,900
17	CC	1074011687	MORALES LUIS	X																	230301	6	$400,000	$64,000	EPS037	6	$400,000	$16,000	CCF16	6	$400,000	$16,000	14-4	6	$400,000	$27,900	6	$0	$0	SI	$123,900
18	CC	1065003103	MURILLO YONY	X	X																230301	4	$160,000	$25,600	ESSC07	4	$160,000	$20,000	CCF16	4	$160,000	$6,400	14-4	4	$160,000	$11,200	4	$160,000	$8,000	No	$71,200
19	CC	1073998415	OBAJI DAYANE	X																	230301	6	$740,000	$118,400	EPS037	6	$740,000	$29,600	CCF16	6	$740,000	$29,600	14-4	6	$740,000	$51,600	6	$0	$0	SI	$229,200
20	CC	1073988390	PADILLA JOSE	X																	230301	6	$400,000	$64,000	ESSC07	6	$400,000	$16,000	CCF16	6	$400,000	$16,000	14-4	6	$400,000	$27,900	6	$0	$0	SI	$123,900
21	CC	25801094	ROMERO CARMEN	X																	25-14	6	$1,100,000	$176,000	EPS002	6	$1,100,000	$44,000	CCF16	6	$1,100,000	$44,000	14-4	6	$1,100,000	$76,600	6	$0	$0	SI	$340,600
22	CC	78031712	ROYETT GUSTAVO	X																	231001	6	$740,000	$118,400	EPS005	6	$740,000	$29,600	CCF16	6	$740,000	$29,600	14-4	6	$740,000	$51,600	6	$0	$0	SI	$229,200
23	CC	1073971706	SPIR JADER	X																	230201	6	$240,000	$38,400	EPS002	6	$240,000	$9,600	CCF16	6	$240,000	$9,600	14-4	6	$240,000	$16,800	6	$0	$0	SI	$74,400
24	CC	1064981277	TORRES MOISES	X																	230301	6	$232,000	$37,200	ESSC07	6	$232,000	$9,300	CCF16	6	$232,000	$9,300	14-4	6	$232,000	$16,200	6	$0	$0	SI	$72,000
25	CC	1067881710	URANGO ERNI	X																	231001	6	$232,000	$37,200	EPS002	6	$232,000	$9,300	CCF16	6	$232,000	$9,300	14-4	6	$232,000	$16,200	6	$0	$0	SI	$72,000
26	CC	6843266	VILORIA JORGE	X																		0	$0	$0	EPS002	6	$232,000	$9,300	CCF16	6	$232,000	$9,300	14-4	6	$232,000	$16,200	6	$0	$0	SI	$34,800
Total	**Afiliados(26)**																						$9,805,336	$1,569,600			$10,037,336	$481,100			$10,037,336	$401,900			$10,037,336	$700,100		$932,000	$46,700		$3,199,400

2023/03/24 09:47 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901647860	3	CONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CL 31 4 67 O F 306	MONTERIA-CORDOBA	3135095698	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-03	1984222256	9448714898	E	2023/03/14	2023/03/23	BANCOLOMBIA	9	$3,235,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				25	$1,569,600	$17,300	$0	$1,586,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$242,000	$2,700	$0	$244,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$240,000	$2,700	$0	$242,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	16	$895,500	$9,800	$0	$905,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$192,100	$2,100	$0	$194,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$700,100	$7,700	$0	$707,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	26	$700,100	$7,700	$0	$707,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$401,900	$4,400	$0	$406,300
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	26	$401,900	$4,400	$0	$406,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				26	$481,100	$5,600	$0	$486,700
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$29,000	$400	$0	$29,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$9,600	$200	$0	$9,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	$72,000	$800	$0	$72,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$112,400	$1,300	$0	$113,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	12	$228,500	$2,500	$0	$231,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$29,600	$400	$0	$30,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$28,000	$400	$0	$28,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$28,000	$400	$0	$28,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$18,700	$300	$0	$19,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$18,700	$300	$0	$19,000
TOTAL				26	$3,199,400	$35,700	$0	$3,235,100

2023/03/24 09:47 AM

C.C.P
INGENIEROS S.A.S

Copia de Acta de Inicio

Dirección: Carrera 6 No. 65-24
Email: ccpconstrucciones22@gmail.com
Montería, Córdoba - Colombia

ACTA DE INICIO

CONTRATO No:	LP-SPM-019-2022
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE
OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LOS BARRIOS PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
VALOR:	CUATRO MIL ONCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($4.011.661.268,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIO:	27 de febrero 2023
FECHA FINAL:	27 de junio 2023
FECHA PRESENTE ACTA:	27 de febrero 2023

En la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Montería, Departamento de Córdoba, a los veintisiete (27) días del mes de febrero del año 2023, y estando vigente el Contrato de Obra identificado en el encabezamiento de la presente Acta, se reunieron: La Secretaria de Infraestructura Municipal **MÓNICA MARÍA SEVERICHE NÚÑEZ**, el Interventor de la Obra **CONSORCIO HIDRALMA** Representado por **ALVARO HERNANDO VERA AYALA** y el Contratista **CONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE** Representado por **ANGÉLICA AVILEZ ARGEL** con el propósito de suscribir la presente Acta de Inicio del contrato de obra LP-SPM-019-2022, tal como se presenta a continuación:

Teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos previos para iniciar la ejecución del contrato citado, se deja a disposición del contratista para que dé inicio de las actividades de obra y queda bajo su responsabilidad el cumplimiento de los requerimientos legales mínimos establecidos dentro de la Minuta del Contrato; así como también:

1. Que el uniforme de los trabajadores que laboren en el desarrollo del proyecto deberá ser portado por todo el personal en el sitio de la obra durante la jornada laboral a partir de la fecha de suscripción de la presente Acta.

2. Los Elementos de Protección Personal (EPP) establecidos en el Plan de Seguridad Industrial del Contrato de Obra deberá ser portado por el personal que labore en la Obra durante la jornada laboral a partir de la fecha de suscripción de la presente Acta.

3. Que el contratista será responsable del mantenimiento de las vallas de tal forma que se asegure siempre su legibilidad.

4. Que el contratista mantenga el Área de construcción aislado y seguro, impidiendo la entrada de personal no autorizado.

Para constancia se firma en la ciudad de Montería a los 27 días del mes de febrero de 2023

ANGÉLICA AVILEZ ARGEL
CONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE
CONTRATISTA

ALVARO HERNANDO VERA AYALA
CONSORCIO HIDRALMA
INTERVENTOR

MÓNICA MARÍA SEVERICHE NÚÑEZ
Secretaria de Infraestructura
Municipio de Montería

Proyectó: Patricia Sánchez – Contratista SIM
Revisó: Khalil Petro – Contratista SIM

C.C.P
INGENIEROS S.A.S

Copia de Póliza del contrato, Aprobación de Póliza, Recibo pago de Pólizas

Dirección: Carrera 6 No. 65-24
Email: ccpconstrucciones22@gmail.com
Montería, Córdoba - Colombia

cesce

Seguros de Colombia S.A. Nit. 860.009.195-9

PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (LEY 80/93)

Actividad Económica 6511 – Seguros Generales.
No Somos Grandes Contribuyentes.
Responsable de IVA. No efectuar retención en la fuente por concepto de primas.

NIT: 860.009.195-9
Calle 72 nº 6-44 piso 12, Bogotá.
Tel: (571) 326 69 69
Fax: (571) 211 02 18
segurexpo@segurexpo.com
BOGOTÁ, D.C

FECHA EXP.	SUCURSAL	RAMO	PÓLIZA	CERTIFICADO	TIPO CERTIFICADO	NRO. ENDOSO	HOJAS
04/11/2022	BOGOTA	10	144354	4110046996	EXPEDICIÓN	0	1/1

TOMADOR	CONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE			NIT	9016478603	
DIRECCIÓN	CR 11 10 31 (233008) PUEBLO NUEVO - CÓRDOBA	TELÉFONO	+57 3007898276	CIUDAD	PUEBLO NUEVO	
GARANTIZADO	CONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE			NIT	9016478603	
DIRECCIÓN	CR 11 10 31 (233008) PUEBLO NUEVO - CÓRDOBA	TELÉFONO	+57 3007898276	CIUDAD	PUEBLO NUEVO	
ASEGURADO	MUNICIPIO DE MONTERIA			NIT	8000967341	
DIRECCIÓN	CALLE 27 NO 3 16 () MONTERIA -	TELÉFONO		CIUDAD	MONTERIA	

OBJETO:
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL TOMADOR/AFIANZADO, CONTENIDAS EN EL CONTRATO Nº LP-SPM-019-2022, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA; EL PAGO DE LOS PERJUICIOS, MULTAS Y/O CLAUSULA PENAL A QUE HAYA LUGAR, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LOS AMPAROS OTORGADOS.

TOMADOR: CONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE CONFORMADO POR:
- ALEXANDER THEVENING GARCES 721485658 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 90%
- CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERIAS S A S 9005065592 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 10%

AMPAROS	VALOR ASEGURADO (S-Pesos Colombianos)	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
Cumplimiento de contrato	401,166,126.90	31/10/2022	03/09/2023
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	802,332,253.80	31/10/2022	03/03/2026
Estabilidad y calidad de la obra	1,203,498,380.70	03/03/2023	03/03/2028

VALOR ASEGURADO			VIGENCIA DE LA PÓLIZA							
Valor Anterior	Aumento/ Disminución	Valor Actual	Desde las 00:00 Horas	31	10	2022	Hasta las 24:00 Horas	3	3	2028
0.00	0.00	2,406,996,761.40								

TRM: 1.00	Prima Neta: $ 22,619,175.04	Gastos Expedición: $ 10,000.00	IVA(19%): $ 4,299,543.26	Total a pagar: $ 26,928,718.30

INTERMEDIARIOS			COASEGURO (100% COMPAÑIA)		
Intermediario	Clave	%	Coasegurador	%	Valor Asegurado
PEDRO LUIS GUTIERREZ SANCHEZ	4233	100.00			

Usuario Cargue	MCO10667407526	Usuario de Autorización	MCO10667407526	Usuario de Expedición	MCO10667407526

LAS PARTES ACUERDAN QUE, SALVO PACTO EN CONTRARIO, EL PAGO DE LA PRIMA SE DEBERÁ HACER A MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA O, SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.

(415)7709998292686(8020)00144354000018411D046996(3902)0000026928718.30

Referencia de Pago :
00144354000018411D046996

LA PRESENTE PÓLIZA SE RIGE BAJO EL CLAUSULADO PRO FORMA - CU-07-2015, REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

Segurexpo - Representante Legal

Firma Tomador

Para validar los datos de la presente póliza ingresé a www.segurexpo.com - opción Servicios/Consulta Pólizas o leyendo el código

cesce

Seguros de Crédito S.A. Nit. 860.009.195-9

PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (LEY 80/93)

Actividad Económica 6511 – Seguros Generales.
No Somos Grandes Contribuyentes.
Responsable de IVA. No efectuar retención en la fuente por concepto de primas.

NIT: 860.009.195-9
Calle 72 nº 6-44 piso 12, Bogotá.
Tel: (571) 326 69 69
Fax: (571) 211 02 15
segurexpo@segurexpo.com
BOGOTÁ, D.C.

FECHA EXP.	SUCURSAL	RAMO	PÓLIZA	CERTIFICADO	TIPO CERTIFICADO	NRO. ENDOSO	HOJAS
07/12/2022	BOGOTA	10	144354		Traslado de Vigencia	1	1/1

TOMADOR	CONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE			NIT	9016478603
DIRECCIÓN	CR 11 10 31 (233008) PUEBLO NUEVO - CÓRDOBA	TELÉFONO	+57 3007898276	CIUDAD	PUEBLO NUEVO
GARANTIZADO	CONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE			NIT	9016478603
DIRECCIÓN	CR 11 10 31 (233008) PUEBLO NUEVO - CÓRDOBA	TELÉFONO	+57 3007898276	CIUDAD	PUEBLO NUEVO
ASEGURADO	MUNICIPIO DE MONTERIA			NIT	8000967341
DIRECCIÓN	CALLE 27 NO 3 16 () MONTERIA -	TELÉFONO		CIUDAD	MONTERIA

OBJETO:

OBJETO DE LA MODIFICACION:

SE AJUSTAN VIGENCIAS DE AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA

OBJETO DE CONTRATO:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL TOMADOR/AFIANZADO, CONTENIDAS EN EL CONTRATO Nº LP-SPM-019-2022, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA; EL PAGO DE LOS PERJUICIOS, MULTAS Y/O CLAUSULA PENAL A QUE HAYA LUGAR DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LOS AMPAROS OTORGADOS.

TOMADOR: CONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE CONFORMADO POR:
ALEXANDER RIEVENING GARCES 72148565B CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 90%
CONSTRUCCIONES TERTH INGENIERIAS S A S 900506592 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 10%

AMPAROS	VALOR ASEGURADO (S-Pesos Colombianos)	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
Cumplimiento de contrato	401,166,126.90	31/10/2022	03/09/2023
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	802,332,253.80	31/10/2022	03/03/2026
Estabilidad y calidad de la obra	1,203,498,380.70	02/03/2023	02/03/2028

VALOR ASEGURADO			VIGENCIA DE LA PÓLIZA								
Valor Anterior	Aumento/ Disminución	Valor Actual	Desde las 00:00 Horas	31	10	2022	Hasta las 24:00 Horas	2	3	2028
2,406,996,761.40	0.00	2,406,996,761.40								

TRM 1.00	Prima Neta: $ 0.00	Gastos Expedición: $ 0.00	IVA(0%): $ 0.00	Total a pagar: $ 0.00

INTERMEDIARIOS			COASEGURO (100% COMPAÑIA)		
Intermediario	Clave	%	Coasegurador	%	Valor Asegurado
PEDRO LUIS GUTIERREZ SANCHEZ	4233	100.00			

Usuario Cargue	MCO10667407526	Usuario de Autorización	LCO182	Usuario de Expedición	MCO10667407526

LAS PARTES ACUERDAN QUE, SALVO PACTO EN CONTRARIO, EL PAGO DE LA PRIMA SE DEBERÁ HACER A MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA POLIZA O, SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.

LA PRESENTE PÓLIZA SE RIGE BAJO EL CLAUSULADO PRO FORMA - CU-07-2015, REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

Segurexpo - Representante Legal

Firma Tomador

Para validar los datos de la presente póliza ingrese a www.segurexpo.com - opción Servicios/Consulta Pólizas o leyendo el código

cesce

Seguros de Colombia S.A. Nit. 860.009.195-9

PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (LEY 80/93)

Actividad Económica 6511 – Seguros Generales.
No Somos Grandes Contribuyentes.
Responsable de IVA. No efectuar retención en la fuente por concepto de primas.

NIT. 860.009.195-9
Calle 72 nº 6-44 piso 12. Bogotá.
Tel: (571) 326 69 69
Fax: (571) 211 02 18
segurexpo@segurexpo.com
BOGOTÁ, D.C.

FECHA EXP.	SUCURSAL	RAMO	PÓLIZA	CERTIFICADO	TIPO CERTIFICADO	NRO. ENDOSO	HOJAS
13/03/2023	BOGOTA	10	144354		Traslado de Vigencia	2	1/1

TOMADOR	CONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE			NIT	9016478603
DIRECCIÓN	CR 11 10 31 (233008) PUEBLO NUEVO - CÓRDOBA	TELÉFONO	+57 3007898276	CIUDAD	PUEBLO NUEVO
GARANTIZADO	CONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE			NIT	9016478603
DIRECCIÓN	CR 11 10 31 (233008) PUEBLO NUEVO - CÓRDOBA	TELÉFONO	+57 3007898276	CIUDAD	PUEBLO NUEVO
ASEGURADO	MUNICIPIO DE MONTERIA			NIT	8000987341
DIRECCIÓN	CALLE 27 NO 3 16 [] MONTERIA -	TELÉFONO		CIUDAD	MONTERIA

OBJETO:

OBJETO DE LA MODIFICACION:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZAN VIGENCIAS DE ACUERDO ACTA DE INICIO DE FECHA 27/02/2023. | | LOS DEMÁS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN MODIFICARSE.

OBJETO DE CONTRATO:

SE AJUSTAN VIGENCIAS DE AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL TOMADOR/AFIANZADO, CONTENIDAS EN EL CONTRATO N° LP-SPM-019-2022, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA; EL PAGO DE LOS PERJUICIOS, MULTAS Y/O CLAUSULA PENAL A QUE HAYA LUGAR, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LOS AMPAROS OTORGADOS.

TOMADOR: CONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE CONFORMADO POR:
- ALEXANDER THEVENING GARCES 721485658 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 90%
- CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERIAS S A S 900506592 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 10%

AMPAROS	VALOR ASEGURADO (S-Pesos Colombianos)	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
Cumplimiento de contrato	401,166,126.90	27/02/2023	31/12/2023
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	802,332,253.80	27/02/2023	30/06/2026
Estabilidad y calidad de la obra	1,203,498,380.70	27/06/2023	27/06/2028

VALOR ASEGURADO			VIGENCIA DE LA PÓLIZA							
Valor Anterior	Aumento/Disminución	Valor Actual	Desde las 00:00 Horas	27	2	2023	Hasta las 24:00 Horas	27	6	2028
2,406,996,761.40	0.00	2,406,996,761.40								

TRM: 1.00	Prima Neta: $ 0.00	Gastos Expedición: $ 0.00	IVA(0%): $ 0.00	Total a pagar: $ 0.00

INTERMEDIARIOS			COASEGURO (100% COMPAÑIA)		
Intermediario	Clave	%	Coasegurador	%	Valor Asegurado
PEDRO LUIS GUTIERREZ SANCHEZ	4233	100.00			

Usuario Cargue	MCO10667407526	Usuario de Autorización	ICO183	Usuario de Expedición	MCO10667407526

LAS PARTES ACUERDAN QUE, SALVO PACTO EN CONTRARIO, EL PAGO DE LA PRIMA SE DEBERÁ HACER A MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA O, SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.

LA PRESENTE PÓLIZA SE RIGE BAJO EL CLAUSULADO CUMESTRA0022022, REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

Segurexpo - Representante Legal

Angelica Cuellar

Firma Tomador

Para validar los datos de la presente póliza ingresé a www.segurexpo.com - opción Servicios/Consulta Pólizas o leyendo el código QR mostrado a la derecha.

DETALLE DE LA GARANTÍA

Aprobar garantía

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
1	Revisión Pólizas	Aprobado	alexandra barba hoyos	-	
2	Revisión Pólizas	Aprobado	LOLY LUCIA ALVAREZ MORALES	Loly Lucia Alvarez Morales	7 días de tiempo transcurrido (11/07/2023 3:53:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
1	Revision Pólizas - Profesional Universitario Oficina Asesora Juridica	Aprobado	WILLIAN FELIPE MONTES HERNANDEZ	WILLIAN FELIPE MONTES HERNANDEZ	7 días de tiempo transcurrido (11/07/2023 4:00:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
2	Aprobacion Poliza - Jefe Oficina Asesora Juridica	Aprobado	KARINA MARIA CARRASCAL SOCARRAS	KARINA MARIA CARRASCAL SOCARRAS	7 días de tiempo transcurrido (11/07/2023 4:10:45 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

cesce

Seguros de Colombia S.A. Nit: 860.069.195-9

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CONTRATOS CELEBRADOS CON ENTIDADES ESTATALES (LEY 80/93)

Actividad Económica 6511 – Seguros Generales.
No Somos Grandes Contribuyentes.
Responsable de IVA. No efectuar retención en la fuente por concepto de primas.

NIT: 860.069.195-9
Calle 72 nº 6-44 piso 12, Bogotá.
Tel: (571) 326 69 69
Fax: (571) 211 02 18
segurexpo@segurexpo.com
BOGOTÁ, D.C.

FECHA EXP.	SUCURSAL	RAMO	PÓLIZA	CERTIFICADO	TIPO CERTIFICADO	NRO. ENDOSO	HOJAS
07/12/2022	BOGOTA	24	11038		Aclaración datos	1	1/1

TOMADOR	CONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE			NIT	9016478603
DIRECCIÓN	CR 11 10 31 (233008) PUEBLO NUEVO - CORDOBA	TELÉFONO	+57 3007898276	CIUDAD	PUEBLO NUEVO
ASEGURADO	CONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE Y MUNICIPIO DE MONTERIA			NIT	9016478603
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE MONTERIA Y/O TERCEROS AFECTADOS			NIT	

OBJETO:

OBJETO DE LA MODIFICACION:

SE CONFIRMA QUE LA PRESENTE POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL CONTIENE LOS SIGUIENTES AMPAROS SEGUN CONDICIONES DECRETO 1082 DE 2015:

- PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES
- PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.
- PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.
- RESPONSABILIDAD SURGIDA POR ACTOS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS.
- AMPARO PATRONAL.
- VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS.

OBJETO DE CONTRATO:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL QUE SE GENERA POR RECLAMACIONES DE TERCEROS, COMO CONSECUENCIA DE ACTOS, HECHOS U OMISIONES DEL CONTRATISTA, DERIVADOS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO Nº LP-SPM-019-2022 CUYO OBJETO ES GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL TOMADOR/AFIANZADO, CONTENIDAS EN EL CONTRATO Nº LP-SPM-019-2022. CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

TOMADOR: CONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE CONFORMADO POR:
- ALEXANDER THEVENING GARCES 721485658 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 90%
- CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERIAS S A S 9005065592 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 10%

AMPAROS	VALOR ASEGURADO (S-Pesos Colombianos)	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE MINIMO(S-Pesos Colombianos)
Básico - Predios, labores y operaciones (PLO)	400,000,000.00	31/10/2022	03/03/2023	10.00	1,656,232.00
Vehículos propios y no propios	200,000,000.00	31/10/2022	03/03/2023	10.00	1,656,232.00
Patronal	200,000,000.00	31/10/2022	03/03/2023	10.00	1,656,232.00
Contratistas y subcontratistas	200,000,000.00	31/10/2022	03/03/2023	10.00	1,656,232.00

VALOR ASEGURADO			VIGENCIA DE LA PÓLIZA								
Valor Anterior	Aumento/ Disminución	Valor Actual	Desde las 00:00 Horas	31	10	2022	Hasta las 24:00 Horas	3	3	2023
400,000,000.00	0.00	400,000,000.00								

TRM: 1.00	Prima Neta: $ 0.00	Gastos Expedición: $ 0.00	IVA(0%): $ 0.00	Total a pagar: $ 0.00

INTERMEDIARIOS			COASEGURO (100% COMPAÑIA)		
Intermediario	Clave	%	Coasegurador	%	Valor Asegurado
PEDRO LUIS GUTIERREZ SANCHEZ	4233	100.00			

Usuario Cargue	MCO10667407526	Usuario de Autorización	MCO10667407526	Usuario de Expedición	MCO10667407526

LAS PARTES ACUERDAN QUE, SALVO PACTO EN CONTRARIO, EL PAGO DE LA PRIMA SE DEBERÁ HACER A MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INICIACION DE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA O, SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.

LA PRESENTE PÓLIZA SE RIGE BAJO EL CLAUSULADO PRO FORMA - 2 - 2009, REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

Segurexpo - Representante Legal

Firma Tomador

Para validar los datos de la presente póliza ingrese a www.segurexpo.com - opción Servicios/Consulta Pólizas o leyendo el código QR mostrado a la derecha

cesce

Segurexpo de Colombia S.A. Nit: 860.009.195-9

CERTIFICACIÓN

SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. certifica que la póliza de CUMPLIMIENTO N° 144354 CERTIFICADO emitida por la Compañía **NO EXPIRARÁ** por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento de ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Se firma en BOGOTÁ, D.C., a los 7 días del mes de Diciembre de 2022



Firma autorizada
SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.
ASEGURADORA DE CRÉDITO Y DEL COMERCIO EXTERIOR

1 folio

UTC-5 17:24:37
MUNICIPIO DE MONT...

Buscar...

... Contrato en edición

Id de página: 23000327 Ayuda

ÁREA DE APROBACIÓN

0335.

La lista del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 4

MOSTRAR DETALLES

1 Información general

Volver

Iniciar ejecución

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4122006
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	13/10/2022 7:19:01 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	LP-SPM-019-2022
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LOS BARRIOS PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	Sí No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	
Fecha de terminación del contrato	3/03/2023 11:59 PM
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	Sí No *
Obligaciones Ambientales	Sí No *
Obligaciones pos consumo	Sí No *
Reversión	Sí No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE MONTERIA

COLOMBIA Montería

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Cuenta bancaria del proveedor

Cuentas bancarias distintas por proveedor Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE.			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JULIO ANDRES BENAVIDES VERTEL* *Fecha de aprobación:* *31/10/2022 11:07:08 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CARLOS ALBERTO ORDOSGOITIA SANIN* *Fecha de aprobación:* *2/11/2022 11:14:24 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1 PCCNTR 4122006 Firmado

Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Licitación pública (Obra pública)
Unidad de contratación	UC - SECRETARÍA DE PLANEACION
Proceso de Contratación	LP-SPM-019-2022
Título de la oferta	CONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE.
Cuantía del contrato	4.011.661.268 COP

DETALLE DE LA GARANTÍA

Aprobar garantía

Nivel 1 - Sin Orden - 1 aprobación(es) requerida(s)

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	Revisión Pólizas	Aprobado	alexandra barba hoyos	-	
.2	Revisión Pólizas	Aprobado	LOLY LUCIA ALVAREZ MORALES	LOLY LUCIA ALVAREZ MORALES	5 días de tiempo transcurrido *(9/12/2022 5:23:54 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Nivel 2 - Con orden

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	Revision Pólizas - Profesional Universitario Oficina Asesora Juridica	Aprobado	WILLIAN FELIPE MONTES HERNANDEZ	WILLIAN FELIPE MONTES HERNANDEZ	5 días de tiempo transcurrido *(9/12/2022 5:27:54 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
.2	Aprobacion Poliza - Jefe Oficina Asesora Juridica	Aprobado	KARINA MARIA CARRASCAL SOCARRAS	KARINA MARIA CARRASCAL SOCARRAS	5 días de tiempo transcurrido *(9/12/2022 7:59:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

ACTA DE CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL

n Montería – Córdoba, siendo las 8:00 am del día 30 de enero de 2023, se reunieron **LEXANDER THEVENING GARCES**, identificado con cedula de ciudadanía N° 2.148.565 de Barranquilla, actuando en nombre propio y **BREYNER HAROLD ERNANDEZ HALLER**, identificado con cedula de ciudadanía N° 98.651.438 de aucasia – Antioquia, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de **ONSTRUCCIONES FERTH INGENIERIAS S.A.S** con Nit. 900.506.559-2, quienes onforma el **CONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE**, identificado con NIT 901647860-3, uien actualmente se encuentra ejecutando el contrato de obra N°LP-MSBV-006- 2022, uscrito con el municipio de MONTERIA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, cuyo objeto s "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS PAZ DEL NORTE Y 20 DE ULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA", a fin e proceder a realizar cambio en la representación legal principal del mencionado Consorcio, niendo en cuenta las siguientes condiciones:

I. Que el día 26 de julio de 2022, se conforma el **CONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE**, con el fin de participar en la convocatoria de licitación pública N° LP-SPM-019-2022, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA", de la siguiente manera:

Nombre del integrante	IDENTIFICACION	Compromiso (%) (2)
ALEXANDER THEVENING GARCES	72.148.565	90 %
CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERIAS S.A.S	900.506.559	10 %

II. Que como resultado de la convocatoria de Licitación Pública N° LP-SPM-019-2022, en el municipio de MONTERIA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, suscribo contrato de licitación pública N° LP-SPM-019-2022, junto con el **CONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE**, con el fin de ejecutar el objeto "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA", de conformidad con el convenio inter administrativo 1893 de 2021 suscrito con el instituto Nacional de Vías INVIAS.

II. Que, mediante acta consorcial indicada en el numeral I, se determino designar como representante legal principal del **CONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE**, al ingeniero civil **JULIO ANDRES BENAVIDES VERTEL**, identificado con CC. N° 1.067.289.872 expedida en Pueblo Nuevo.

V. Que es voluntad de los miembros del **CONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE**, mediante la presente acta, designar como NUEVO REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL del mismo, al ingeniero civil, **ANGELICA PATRICIA AVILEZ**

ARGEL, identificado con cedula de ciudadanía N° 26.227.533 expedida en Tierralta - Córdoba.

PRIMERO: nombro como nuevo **REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL** del **CONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE**, al ingeniero civil **ANGELICA PATRICIA AVILEZ ARGEL**, identificado con cedula de ciudadanía N° 26.227.533 expedida en Tierralta - Córdoba.

SEGUNDO: La presente acta se suscribe a la luz del principio de "PACTA SUNT SERVANDA" materializado en el artículo 1602 del código civil colombiano, entendidos como contrato para las partes, y solo podrá ser invalido por consentimiento mutuo de quienes lo celebran o por causales legales.

TERCERO: La presente acta se perfecciona con las firmas de las partes.

e firma en la ciudad de Montería – Córdoba a los treinta (30) días del mes de enero del año 02.

LEXANDER THEVENING GARCES
.C. No. 72.148.565 DE BARRANQUILLA
ROPONENTE 1

CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERIAS S.A.S.
R.L. BREYNER HAROLD FERNANDEZ HALLER
C.C. No. 98.651.438 DE CAUCASIA
PROPONENTE 2

CEPTANDO NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL

NGELICA PATRICIA AVILEZ ARGEL
.C. No. 26.227.533 de Tierralta - Córdoba
. L CONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO PRIVADO
Artículo 68 Decreto Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015

15382561

En la ciudad de Montelibano, Departamento de Córdoba, República de Colombia, el treinta (30) de enero de dos mil veintitres (2023), en la Notaría Única del Círculo de Montelibano, compareció: BREYNER HAROLD FERNANDEZ HALLER, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 98651438 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.

r7me1gv741zg
30/01/2023 - 15:36:55

- - - - - Firma autógrafa - - - - -

De conformidad con lo establecido en el Artículo 18 del Decreto - Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

De acuerdo a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Este folio se vincula al documento de ACTA DE CAMBIO DE REPRESANTE LEGAL signado por el compareciente.

EDILMA ROSA VILLORINA SALCEDO


Notario Único del Círculo de Montelibano, Departamento de Córdoba - Encargado

Consulte este documento en www.notariasegura.com.co
Número Único de Transacción: r7me1gv741zg

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO PRIVADO
Artículo 68 Decreto Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015

15698774

En la ciudad de Pueblo Nuevo, Departamento de Córdoba, República de Colombia, el dieciseis (16) de febrero de dos mil veintitres (2023), en la Notaría Única del Círculo de Pueblo Nuevo, compareció: ALEXANDER THEVENING GARCES, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 72148565 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.



60mvd5pqyqm3
16/02/2023 - 09:01:19



- - - - - Firma autógrafa - - - - -

Conforme al Artículo 18 del Decreto - Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal. relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Este folio se vincula al documento de ACTA DE CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL signado por el compareciente.



JORGE ANTONIO DE ARCOS HOYOS

Notario Único del Círculo de Pueblo Nuevo, Departamento de Córdoba

Consulte este documento en www.notariasegura.com.co
Número Único de Transacción: 60mvd5pqyqm3

11 julio 2023

cesce

Seguros de Colombia S.A. Nit. 860.009.195-9

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CONTRATOS CELEBRADOS CON ENTIDADES ESTATALES (LEY 80/93)

Actividad Económica 6511 – Seguros Generales.
No Somos Grandes Contribuyentes.
Responsable de IVA. No efectuar retención en la fuente por concepto de primas.

NIT. 860.009.195-9
Calle 72 nº 6-44 piso 12, Bogotá.
Tel: (571) 326 69 69
Fax: (571) 211 02 18
segurexpo@segurexpo.com
BOGOTÁ, D.C.

0153

FECHA EXP.	SUCURSAL	RAMO	PÓLIZA	CERTIFICADO	TIPO CERTIFICADO	NRO. ENDOSO	HOJAS
13/03/2023	BOGOTA	24	11038		Traslado de Vigencia	2	1/1

TOMADOR	CONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE			NIT	901647603	
DIRECCIÓN	CR 11 10 31 (233008) PUEBLO NUEVO - CÓRDOBA	TELÉFONO	+57 3007898276	CIUDAD	PUEBLO NUEVO	
ASEGURADO	CONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE Y MUNICIPIO DE MONTERIA.			NIT	901647603	
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE MONTERIA Y/O TERCEROS AFECTADOS			NIT		

OBJETO:

OBJETO DE LA MODIFICACION:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZAN VIGENCIAS DE ACUERDO ACTA DE INICIO DE FECHA 27/02/2023. | | LOS DEMÁS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN MODIFICARSE.

OBJETO DE CONTRATO:

SE CONFIRMA QUE LA PRESENTE POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL CONTIENE LOS SIGUIENTES AMPAROS SEGUN CONDICIONES DECRETO 1082 DE 2015:

- PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES
- PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.
- PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.
- RESPONSABILIDAD SURGIDA POR ACTOS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS.
- AMPARO PATRONAL.
- VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS.

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL QUE SE GENERA POR RECLAMACIONES DE TERCEROS, COMO CONSECUENCIA DE ACTOS, HECHOS U OMISIONES DEL CONTRATISTA DERIVADOS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO Nº LP-SPM-019-2022 CUYO OBJETO ES GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL TOMADOR/AFIANZADO, CONTENIDAS EN EL CONTRATO Nº LP-SPM-019-2022, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

TOMADOR: CONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE CONFORMADO POR:
- ALEXANDER THEVENING GARCES 72185658 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 90%
- CONSTRUCCIONES TERTH INGENIERIAS S A S 9005065592 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 10%

AMPAROS	VALOR ASEGURADO ($-Pesos Colombianos)	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE MINIMO($-Pesos Colombianos)
Básico - Predios, labores y operaciones (PLO)	400,000,000.00	27/02/2023	28/06/2023	10.00	1,656,232.00
Vehículos propios y no propios	200,000,000.00	27/02/2023	28/06/2023	10.00	1,656,232.00
Patronal	200,000,000.00	27/02/2023	28/06/2023	10.00	1,656,232.00
Contratistas y subcontratistas	200,000,000.00	27/02/2023	28/06/2023	10.00	1,656,232.00

VALOR ASEGURADO			VIGENCIA DE LA PÓLIZA							
Valor Anterior	Aumento/ Disminución	Valor Actual	Desde las 00:00 Horas	27	2	2023	Hasta las 24:00 Horas	28	6	2023
400,000,000.00	0.00	400,000,000.00								

TRM: 1.00	Prima Neta: $ 0.00	Gastos Expedición: $ 0.00	IVA(0%): $ 0.00	Total a pagar: $ 0.00

INTERMEDIARIOS			COASEGURO (100% COMPAÑIA)		
Intermediario	Clave	%	Coasegurador	%	Valor Asegurado
PEDRO LUIS GUTIERREZ SANCHEZ	4233	100.00			

Usuario Origen	MCO10667407526	Usuario de Autorización	ICO182	Usuario de Expedición	MCO10667407526

LAS PARTES ACUERDAN QUE, SALVO PACTO EN CONTRARIO, EL PAGO DE LA PRIMA SE DEBERÁ HACER A MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA, O SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.

LA PRESENTE PÓLIZA SE RIGE BAJO EL CLAUSULADO RCEPARTIC0022022, REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

Segurexpo - Representante Legal

Angelica Cuellar

Firma Tomador

Para validar los datos de la presente póliza ingresá a www.segurexpo.com - opción Servicios/Consulta Pólizas o leyendo el código QR mostrado a la derecha

cesce

Segurexpo de Colombia S.A. Nit. 860.003.195-9

CERTIFICACIÓN

SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. certifica que la póliza de CUMPLIMIENTO N° 144354 CERTIFICADO 4110046996 emitida por la Compañía **NO EXPIRARÁ** por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento de ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Se firma en BOGOTÁ, D.C., a los 4 días del mes de Noviembre de 2022

Firma autorizada
SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.
ASEGURADORA DE CRÉDITO Y DEL COMERCIO EXTERIOR

cesce

Seguros de Colombia S.A. nit 860.026.596-9

PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (LEY 80/93)

Actividad Económica 6511 – Seguros Generales
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA; No efectuar retención en la fuente por concepto de renta

Bancolombia

Registro de Operación: 772362766
SEGUROS CONVENIOS MASIVOS
Ciudad: MONTERIA
Fecha: 02/12/2022 Hora: 11:55
Código Convenio: 75515
Nombre Convenio: SEGURPYPO SEGUROS
Tipo Identificación Pagador: NIT
Identificación Pagador: 900547860
Valor Total: $ 0.00 ***
Medio de Pago: CHEQUE
Valor Efectivo: $ 27,419,800.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Costo Transacción: $ 0.00
Referencia 1: 0014455400001816112004
Referencia 2:
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACIÓN ORDENADA AL BANCO

FECHA EXP.	SUCURSAL	RAMO	PÓLIZA	CERTIFICADO	ESTADO	NOTAS
04/11/2022	BOGOTA	10	14454	41D046996		

TOMADOR	CONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE		
DIRECCIÓN	CR 11 10 31 (233008) PUEBLO NUEVO - CÓRDOBA	TELÉFONO	PUEBLO NUEVO
GARANTIZADO	CONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE		
DIRECCIÓN	CR 11 10 31 (233008) PUEBLO NUEVO - CÓRDOBA	TELÉFONO	PUEBLO NUEVO
ASEGURADO	MUNICIPIO DE MONTERIA		
DIRECCIÓN	CALLE 27 NO 3 16 () MONTERIA -	TELÉFONO	

COPIA PARA PAGO

EN BANCOS

NO NEGOCIABLE

VALOR ASEGURADO			VIGENCIA DE LA PÓLIZA								
Valor Anterior	Aumento/ Disminución	Valor Actual	Desde las 00:00 Horas	31	10	2022	Hasta las 24:00 Horas	3	3	2026
0.00	0.00	2,406,996,761.40								

TRM: 1.00	Prima Neta: $ 22,619,175.04	Gastos Expedición: $ 10,000.00	IVA (19%): $ 4,299,543.26	Total a pagar: $ 26,928,718.30

INTERMEDIARIOS			COASEGURO (100% COMPAÑIA)		
Intermediario	Clave	%	Coasegurador	%	Valor Asegurado
PEDRO LUIS GUTIERREZ SANCHEZ	14337				

INICIACIÓN DE LA VIGENCIA

cesce

Seguros de Crédito y de Riesgos Diversos S.A.

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CONTRATOS CELEBRADOS CON ENTIDADES ESTATALES (LEY 80 Y 93)

Actividad Económica 6511 – Seguros Generales.
No Somos Grandes Contribuyentes.
Responsable de IVA. No efectuar retención en la fuente por concepto de primas.

NIT. 860.009.595-9
Calle 72 No. 6-44 piso 12, Bogotá
Tel. (571) 326 66 66
Fax: (571) 321 02 12
seguros@cesce.com
BOGOTÁ, D.C.

FECHA EXP.	SUCURSAL	RAMO	PÓLIZA	CERTIFICADO	TIPO CERTIFICADO	NRO. ENDOSO	HOJAS
04/11/2022	BOGOTA	24	11038	4110046997	EXPEDICIÓN	0	1/1

TOMADOR	CONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE			NIT	901647560-3
DIRECCIÓN	CR 31 10 31 (233008) PUEBLO NUEVO - CÓRDOBA	TELÉFONO	+57 3007898276	CIUDAD	PUEBLO NUEVO
ASEGURADO	CONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE Y MUNICIPIO DE MONTERIA			NIT	901647560-3
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE MONTERIA Y/O TERCEROS AFECTADOS			NIT	

COPIA PARA PAGO
EN BANCOS
NO NEGOCIABLE

VALOR ASEGURADO			VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN								
Valor Anterior	Aumento/ Disminución	Valor Actual	Desde las 00:00 Horas	31	10	2022	Hasta las 24:00 horas	3	3	2023
0.00	0.00	400.000.000.00								

TRM: 1.00	Prima Neta: $ 407.671.23	Gastos Expedición: $ 5.000.00	IVA(19%): $ 78.407.53	Total a pagar: $ 491.078.76

INTERMEDIARIOS			COASEGURO (100% COMPAÑÍA)		
Intermediario	Clave	%	Coasegurador	%	Valor Asegurado
PEDRO LUIS GUTIERREZ SANCHEZ	4233	100.00			

LAS PARTES ACUERDAN QUE, SALVO PACTO EN CONTRARIO, EL PAGO DE LA PRIMA SE DEBERÁ HACER A MÁS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA O, SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.

(415)7709998219888(8020)000110380000014110046997(3902)000000491078.76

Referencia de Pago:
000110380000014110046997

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE	VALOR
EFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL		

Convenio de pago
BANCO DAVIVIENDA CUENTA AHORROS No. 0050-0014-0938
BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 03194541519
BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE No. 449097922

11 Julio 2023

cesce

Seguroxpo de Colombia S.A. NIT 860.009.195-9

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CONTRATOS CELEBRADOS CON ENTIDADES ESTATALES (LEY 80/93)

Actividad Económica 6511 – Seguros Generales.
No Somos Grandes Contribuyentes.
Responsable de IVA. No efectuar retención en la fuente por concepto de primas.

NIT: 860.009.195-9
Calle 72 n° 6-44 piso 12, Bogotá.
Tel: (571) 326 69 69
Fax: (571) 211 02 18
seguroxpo@seguroxpo.com
BOGOTÁ, D.C.

0153

FECHA EXP.	SUCURSAL	RAMO	PÓLIZA	CERTIFICADO	TIPO CERTIFICADO	NRO. ENDOSO	HOJAS
13/03/2023	BOGOTA	24	11038		Traslado de Vigencia	2	1/1

TOMADOR	CONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE			NIT	9016478603
DIRECCIÓN	CR 11 10 31 (233008) PUEBLO NUEVO - CÓRDOBA	TELÉFONO	+57 3007898276	CIUDAD	PUEBLO NUEVO
ASEGURADO	CONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE Y MUNICIPIO DE MONTERIA.			NIT	9016478603
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE MONTERIA Y/O TERCEROS AFECTADOS			NIT	

OBJETO:

OBJETO DE LA MODIFICACION:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZAN VIGENCIAS DE ACUERDO ACTA DE INICIO DE FECHA 27/02/2023. | | LOS DEMÁS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN MODIFICARSE.

OBJETO DE CONTRATO:

SE CONFIRMA QUE LA PRESENTE POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL CONTIENE LOS SIGUIENTES AMPAROS SEGUN CONDICIONES DECRETO 1082 DE 2015:

- PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES
- PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.
- PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.
- RESPONSABILIDAD SURGIDA POR ACTOS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS.
- AMPARO PATRONAL.
- VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS.

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL QUE SE GENERA POR RECLAMACIONES DE TERCEROS, COMO CONSECUENCIA DE ACTOS, HECHOS U OMISIONES DEL CONTRATISTA, DERIVADOS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO N° LP-SPM-019-2022 CUYO OBJETO ES GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL TOMADOR/AFIANZADO, CONTENIDAS EN EL CONTRATO N° LP-SPM-019-2022, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

TOMADOR: CONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE CONFORMADO POR:
- ALEXANDER THEVENING GARCES 72148565B CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 90%
- CONSTRUCCIONES FERTHINGENIERIAS S.A.S 9005065592 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 10%

AMPAROS	VALOR ASEGURADO (S-Pesos Colombianos)	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE MINIMO($-Pesos Colombianos)
Básico - Predios, labores y operaciones (PLO)	400,000,000.00	27/02/2023	28/06/2023	10.00	1,656,232.00
Vehículos propios y no propios	200,000,000.00	27/02/2023	28/06/2023	10.00	1,656,232.00
Patronal	200,000,000.00	27/02/2023	28/06/2023	10.00	1,656,232.00
Contratistas y subcontratistas	200,000,000.00	27/02/2023	28/06/2023	10.00	1,656,232.00

VALOR ASEGURADO			VIGENCIA DE LA PÓLIZA
Valor Anterior	Aumento/Disminución	Valor Actual	Desde las 00:00 Horas 27 - 2 - 2023 Hasta las 24:00 Horas 28 - 6 - 2023
400,000,000.00	0.00	400,000,000.00	

TRM: 1.00	Prima Neta: $ 0.00	Gastos Expedición: $ 0.00	IVA(0%): $ 0.00	Total a pagar: $ 0.00

INTERMEDIARIOS			COASEGURO (100% COMPAÑIA)		
Intermediario	Clave	%	Coasegurador	%	Valor Asegurado
PEDRO LUIS GUTIERREZ SANCHEZ	4233	100.00			

Usuario Cargue	MCO10667407526	Usuario de Autorización	ICO182	Usuario de Expedición	MCO10667407526

LAS PARTES ACUERDAN QUE, SALVO PACTO EN CONTRARIO, EL PAGO DE LA PRIMA SE DEBERÁ HACER A MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA O, SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.

LA PRESENTE PÓLIZA SE RIGE BAJO EL CLAUSULADO RCEPARTIC0022022, REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

Angelica Cuello

Seguroxpo - Representante Legal

Firma Tomador

Para validar los datos de la presente póliza ingresa a www.seguroxpo.com - opción Servicios/Consulta Pólizas o leyendo el código QR mostrado a la derecha

cesce

Seguirexpo de Colombia S.A. Nit. 860.009.195-9

PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (LEY 80/93)

Actividad Económica 6511 – Seguros Generales.
No Somos Grandes Contribuyentes.
Responsable de IVA. No efectuar retención en la fuente por concepto de primas.

NIT: 860.009.195-9
Calle 72 nº 6-44 piso 12, Bogotá.
Tel: (571) 326 69 69
Fax: (571) 211 02 18.
segurexpo@segurexpo.com
BOGOTÁ, D.C.

FECHA EXP.	SUCURSAL	RAMO	PÓLIZA	CERTIFICADO	TIPO CERTIFICADO	NRO. ENDOSO	HOJAS
13/03/2023	BOGOTA	10	14434		Traslado de Vigencia	2	1/1

TOMADOR	CONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE			NIT	9016478603
DIRECCIÓN	CR 11 10 31 (233008) PUEBLO NUEVO - CÓRDOBA	TELÉFONO	+57 3007898276	CIUDAD	PUEBLO NUEVO
GARANTIZADO	CONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE			NIT	9016478603
DIRECCIÓN	CR 11 10 31 (233008) PUEBLO NUEVO - CÓRDOBA	TELÉFONO	+57 3007898276	CIUDAD	PUEBLO NUEVO
ASEGURADO	MUNICIPIO DE MONTERIA			NIT	8000967341
DIRECCIÓN	CALLE 27 NO 3 161 MONTERÍA -	TELÉFONO		CIUDAD	MONTERIA

OBJETO:

OBJETO DE LA MODIFICACION:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZAN VIGENCIAS DE ACUERDO ACTA DE INICIO DE FECHA 27/02/2023. | | LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN MODIFICARSE.-

OBJETO DE CONTRATO:

SE AJUSTAN VIGENCIAS DE AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL TOMADOR/AFIANZADO, CONTENIDAS EN EL CONTRATO Nº LP-SPM-019-2022, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.; EL PAGO DE LOS PERJUICIOS, MULTAS Y/O CLAUSULA PENAL A QUE HAYA LUGAR, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LOS AMPAROS OTORGADOS:

TOMADOR: CONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE CONFORMADO POR:
- ALEXANDER THEVENING GARCES 72148565B CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 90%
- CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERIAS S A S 9005065592 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 10%

AMPAROS	VALOR ASEGURADO (S-Pesos Colombianos)	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
Cumplimiento de contrato	401,166,126.90	27/02/2023	31/12/2023
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	802,332,253.80	27/02/2023	30/06/2026
Estabilidad y calidad de la obra	1,203,498,380.70	27/06/2023	27/06/2028

VALOR ASEGURADO			VIGENCIA DE LA PÓLIZA							
Valor Anterior	Aumento/ Disminución	Valor Actual	Desde las 00:00 Horas	27	2	2023	Hasta las 24:00 Horas	27	6	2028
2,406,996,761.40	0.00	2,406,996,761.40								

TRM: 1.00	Prima Neta: $ 0.00	Gastos Expedición: $ 0.00	IVA(0%): $ 0.00	Total a pagar: $ 0.00

INTERMEDIARIOS			COASEGURO (100% COMPAÑIA)		
Intermediario	Clave	%	Coasegurador	%	Valor Asegurado
PEDRO LUIS GUTIERREZ SANCHEZ	4233	100.00			

Usuario Cargue	MCO10667407526	Usuario de Autorización	LCO183	Usuario de Expedición	MCO10667407526

LAS PARTES ACUERDAN QUE, SALVO PACTO EN CONTRARIO, EL PAGO DE LA PRIMA SE DEBERÁ HACER A MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA O, SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.

LA PRESENTE PÓLIZA SE RIGE BAJO EL CLAUSULADO CUMESTRA0022022, REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

Segurexpo - Representante Legal

Firma Tomador

Para validar los datos de la presente póliza ingrese a www.segurexpo.com - opción Servicios/Consulta Pólizas o leyendo el código QR mostrado a la derecha

DETALLE DE LA GARANTÍA

Aprobar garantia

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	Revisión Pólizas	Aprobado	alexandra barba hoyos		
.2	Revisión Pólizas	Aprobado	LOLY LUCIA ALVAREZ MORALES	Loly Lucia Alvarez Morales	7 días de tiempo transcurrido (11/07/2023 3:53:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	Revision Pólizas - Profesional Universitario Oficina Asesora Juridica	Aprobado	WILLIAN FELIPE MONTES HERNANDEZ	WILLIAN FELIPE MONTES HERNANDEZ	7 días de tiempo transcurrido (11/07/2023 4:00:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
.2	Aprobacion Poliza - Jefe Oficina Asesora Juridica	Aprobado	KARINA MARIA CARRASCAL SOCARRAS	KARINA MARIA CARRASCAL SOCARRAS	7 días de tiempo transcurrido (11/07/2023 4:10:43 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

cesce
Seguroxpo de Colombia S.A. Nit. 860.009.195-9

PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (LEY 80/93)

Actividad Económica 6511 – Seguros Generales.
No Somos Grandes Contribuyentes.
Responsable de IVA. No efectuar retención en la fuente por concepto de primas.

Calle 72 nº 6-44 piso 12, Bogotá.
Tel: (571) 326 69 69
Fax: (571) 211 02 18
segurexpo@segurexpo.com
BOGOTÁ, D.C.

FECHA EXP.	SUCURSAL	RAMO	PÓLIZA	CERTIFICADO	TIPO CERTIFICADO	NRO. ENDOSO	HOJAS
17/07/2023	BOGOTA	10	152237	4110066388	EXPEDICIÓN	0	1/1

TOMADOR	CCP INGENIEROS SAS			**NIT**	9015958204
DIRECCIÓN	CR 6 65 24 OF 331 (230019) MONTERIA - CÓRDOBA	**TELÉFONO**	+57 3014441670	**CIUDAD**	MONTERIA
GARANTIZADO	CCP INGENIEROS SAS			**NIT**	9015958204
DIRECCIÓN	CR 6 65 24 OF 331 (230019) MONTERIA - CÓRDOBA	**TELÉFONO**	+57 3014441670	**CIUDAD**	MONTERIA
ASEGURADO	MUNICIPIO DE MONTERIA			**NIT**	8000967341
DIRECCIÓN	CALLE 27 NO 3 16 () MONTERIA -	**TELÉFONO**		**CIUDAD**	MONTERIA

OBJETO:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL TOMADOR/AFIANZADO, CONTENIDAS EN EL CONTRATO Nº LP-SPM-019-2022, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LOS BARRIOS PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.; EL PAGO DE LOS PERJUICIOS, MULTAS Y/O CLAUSULA PENAL A QUE HAYA LUGAR, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LOS AMPAROS OTORGADOS.

AMPAROS	VALOR ASEGURADO (S-Pesos Colombianos)	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
Cumplimiento de contrato	401,166,126.80	10/07/2023	08/03/2024
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	802,332,253.60	10/07/2023	08/09/2026
Estabilidad y calidad de la obra	1,203,498,380.40	08/09/2023	08/09/2028

VALOR ASEGURADO			VIGENCIA DE LA PÓLIZA							
Valor Anterior	Aumento/ Disminución	Valor Actual	Desde las 00:00 Horas	10	7	2023	Hasta las 24:00 Horas	8	9	2028
0.00	0.00	2,406,996,760.80								

TRM 1.00	Prima Neta:$ 22,094,361.82	Gastos Expedición: $ 10,000.00	IVA(19%): $ 4,199,828.75	Total a pagar: $ 26,304,190.57

INTERMEDIARIOS			COASEGURO (100% COMPAÑIA)		
Intermediario	Clave	%	Coasegurador	%	Valor Asegurado
PEDRO LUIS GUTIERREZ SANCHEZ	4233	100.00			

Usuario Cargue	MCO10667407526	Usuario de Autorización	MCO10667407526	Usuario de Expedición	MCO10667407526

LAS PARTES ACUERDAN QUE, SALVO PACTO EN CONTRARIO, EL PAGO DE LA PRIMA SE DEBERÁ HACER A MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA O, SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.



(415)7709998292888(8020)00152237000001411006638(3902)00002630419057

Referencia de Pago :
00152237000001411006638

LA PRESENTE PÓLIZA SE RIGE BAJO EL CLAUSULADO CUMESTRA0022022, REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

Segurexpo - Representante Legal

Eliana Otero P

Firma Tomador

Para validar los datos de la presente póliza ingresé a www.segurexpo.com - opción Servicios/Consulta Pólizas o leyendo el código QR mostrado a la derecha

cesce
Segurexpo de Colombia S.A. Nit. 860.009.185-9

POLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (LEY 80/93)

Actividad Económica 6511 – Seguros Generales.
No Somos Grandes Contribuyentes.
Responsable de IVA. No efectuar retención en la fuente por concepto de primas.

Calle 72 nº 6-44 piso 12, Bogotá.
Tel: (571) 326 69 69
Fax: (571) 211 02 18
segurexpo@segurexpo.com
BOGOTÁ, D.C.

FECHA EXP.	SUCURSAL	RAMO	PÓLIZA	CERTIFICADO	TIPO CERTIFICADO	NRO. ENDOSO	HOJAS
17/07/2023	BOGOTA	10	152237	4110066388	EXPEDICIÓN	0	1/1

TOMADOR	CCP INGENIEROS SAS			**NIT**	9015958204
DIRECCIÓN	CR 6 65 24 OF 331 (230019) MONTERIA - CÓRDOBA	**TELÉFONO**	+57 3014441670	**CIUDAD**	MONTERIA
GARANTIZADO	CCP INGENIEROS SAS			**NIT**	9015958204
DIRECCIÓN	CR 6 65 24 OF 331 (230019) MONTERIA - CÓRDOBA	**TELÉFONO**	+57 3014441670	**CIUDAD**	MONTERIA
ASEGURADO	MUNICIPIO DE MONTERIA			**NIT**	8000967341
DIRECCIÓN	CALLE 27 NO 3 16 () MONTERIA -	**TELÉFONO**		**CIUDAD**	MONTERIA

COPIA PARA PAGO
EN BANCOS
NO NEGOCIABLE

VALOR ASEGURADO			VIGENCIA DE LA PÓLIZA								
Valor Anterior	Aumento/ Disminución	Valor Actual	Desde las 00:00 Horas	10	7	2023	Hasta las 24:00 Horas	8	9	2028
0.00	0.00	2,406,996,760.80								

TRM 1.00	Prima Neta:$ 22,094,361.82	Gastos Expedición: $ 10,000.00	IVA(19%): $ 4,199,828.75	Total a pagar: $ 26,304,190.57

INTERMEDIARIOS			COASEGURO (100% COMPAÑIA)		
Intermediario	Clave	%	Coasegurador	%	Valor Asegurado
PEDRO LUIS GUTIERREZ SANCHEZ	4233	100.00			

LAS PARTES ACUERDAN QUE, SALVO PACTO EN CONTRARIO, EL PAGO DE LA PRIMA SE DEBERÁ HACER A MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA O, SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.

(415)7709998292888(8020)00152237000001411006638 8(3902)0000263041905 7

Referencia de Pago :
00152237000001411006638 8

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE	VALOR
EFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL		

Convenio de pago
BANCO DAVIVIENDA CUENTA AHORROS No. 0050-0014-0938
BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 03194541519.
BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE No. 449097922

cesce

Segurexpo de Colombia S.A. Nit. 860.069.195-9

CERTIFICACIÓN

SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. certifica que la póliza de CUMPLIMIENTO Nº 152237 CERTIFICADO 4110066388 emitida por la Compañía **NO EXPIRARÁ** por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento de ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Se firma en BOGOTÁ, D.C., a los 17 días del mes de Julio de 2023

Firma autorizada
SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.
ASEGURADORA DE CRÉDITO Y DEL COMERCIO EXTERIOR

cesce
Seguroxpo de Colombia S.A. Nit. 860.009.196-9

POLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (LEY 80/93)

Actividad Económica 6511 – Seguros Generales.
No Somos Grandes Contribuyentes.
Responsable de IVA. No efectuar retención en la fuente por concepto de primas.

Calle 72 nº 6-44 piso 12, Bogotá.
Tel: (571) 326 69 69
Fax: (571) 211 02 18
segurexpo@segurexpo.com
BOGOTÁ, D.C.

FECHA EXP.	SUCURSAL	RAMO	PÓLIZA	CERTIFICADO	TIPO CERTIFICADO	NRO. ENDOSO	HOJAS
26/07/2023	BOGOTA	10	152237	4110066931	Prórroga vigencia	1	1/1

TOMADOR	CCP INGENIEROS SAS			**NIT**	9015958204
DIRECCIÓN	CR 6 65 24 OF 331 (230019) MONTERIA - CÓRDOBA	**TELÉFONO**	+57 3014441670	**CIUDAD**	MONTERIA
GARANTIZADO	CCP INGENIEROS SAS			**NIT**	9015958204
DIRECCIÓN	CR 6 65 24 OF 331 (230019) MONTERIA - CÓRDOBA	**TELÉFONO**	+57 3014441670	**CIUDAD**	MONTERIA
ASEGURADO	MUNICIPIO DE MONTERIA			**NIT**	8000967341
DIRECCIÓN	CALLE 27 NO 3 16 [] MONTERIA -	**TELÉFONO**		**CIUDAD**	MONTERIA

OBJETO:

OBJETO DE LA MODIFICACION:

SE AJUSTAN VIGENCIAS DE LA POLIZA.

OBJETO DE CONTRATO:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL TOMADOR/AFIANZADO, CONTENIDAS EN EL CONTRATO Nº LP-SPM-019-2022, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LOS BARRIOS PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.: EL PAGO DE LOS PERJUICIOS, MULTAS Y/O CLAUSULA PENAL A QUE HAYA LUGAR, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LOS AMPAROS OTORGADOS.

AMPAROS	VALOR ASEGURADO ($-Pesos Colombianos)	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
Cumplimiento de contrato	401,166,126.80	10/07/2023	09/03/2024
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	802,332,253.60	10/07/2023	09/09/2026
Estabilidad y calidad de la obra	1,203,498,380.40	08/09/2023	09/09/2028

VALOR ASEGURADO			VIGENCIA DE LA PÓLIZA								
Valor Anterior	Aumento/ Disminución	Valor Actual	Desde las 00:00 Horas	10	7	2023	Hasta las 24:00 Horas	9	9	2028
2,406,996,760.80	0.00	2,406,996,760.80								

TRM 1.00	Prima Neta:$ 0.00	Gastos Expedición: $ 10,000.00	IVA(19%): $ 1,900.00	Total a pagar: $ 11,900.00

INTERMEDIARIOS			COASEGURO (100% COMPAÑIA)		
Intermediario	Clave	%	Coasegurador	%	Valor Asegurado
PEDRO LUIS GUTIERREZ SANCHEZ	4233	100.00			

Usuario Cargue	MCO10667407526	Usuario de Autorización	ICO183	Usuario de Expedición	MCO10667407526

LAS PARTES ACUERDAN QUE, SALVO PACTO EN CONTRARIO, EL PAGO DE LA PRIMA SE DEBERÁ HACER A MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA O, SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.

(415)7709998292888(8020)00152237000002411006693 1(3902)000000011900 00

Referencia de Pago :
00152237000002411006693 1

LA PRESENTE PÓLIZA SE RIGE BAJO EL CLAUSULADO CUMESTRA0022022, REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

Segurexpo - Representante Legal

Elana Otero P

Firma Tomador

Para validar los datos de la presente póliza ingresé a www.segurexpo.com - opción Servicios/Consulta Pólizas o leyendo el código QR mostrado a la derecha

cesce
Segurexpo de Colombia S.A. Nit: 860.009196-9

POLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (LEY 80/93)

Actividad Económica 6511 – Seguros Generales.
No Somos Grandes Contribuyentes.
Responsable de IVA. No efectuar retención en la fuente por concepto de primas.

Calle 72 nº 6-44 piso 12, Bogotá.
Tel: (571) 326 69 69
Fax: (571) 211 02 18
segurexpo@segurexpo.com
BOGOTÁ, D.C.

FECHA EXP.	SUCURSAL	RAMO	PÓLIZA	CERTIFICADO	TIPO CERTIFICADO	NRO. ENDOSO	HOJAS
26/07/2023	BOGOTA	10	152237	4110066931	Prórroga vigencia	1	1/1

TOMADOR	CCP INGENIEROS SAS			NIT	9015958204
DIRECCIÓN	CR 6 65 24 OF 331 (230019) MONTERIA - CÓRDOBA	TELÉFONO	+57 3014441670	CIUDAD	MONTERIA
GARANTIZADO	CCP INGENIEROS SAS			NIT	9015958204
DIRECCIÓN	CR 6 65 24 OF 331 (230019) MONTERIA - CÓRDOBA	TELÉFONO	+57 3014441670	CIUDAD	MONTERIA
ASEGURADO	MUNICIPIO DE MONTERIA			NIT	8000967341
DIRECCIÓN	CALLE 27 NO 3 18) MONTERIA -	TELÉFONO		CIUDAD	MONTERIA

COPIA PARA PAGO
EN BANCOS
NO NEGOCIABLE

VALOR ASEGURADO			VIGENCIA DE LA PÓLIZA								
Valor Anterior	Aumento/ Disminución	Valor Actual	Desde las 00:00 Horas	10	7	2023	Hasta las 24:00 Horas	9	9	2028	
2,406,996,760.80	0.00	2,406,996,760.80									

TRM 1.00	Prima Neta:$ 0.00	Gastos Expedición: $ 10,000.00	IVA(19%): $ 1,900.00	Total a pagar: $ 11,900.00

INTERMEDIARIOS			COASEGURO (100% COMPAÑIA)		
Intermediario	Clave	%	Coasegurador	%	Valor Asegurado
PEDRO LUIS GUTIERREZ SANCHEZ	4233	100.00			

LAS PARTES ACUERDAN QUE, SALVO PACTO EN CONTRARIO, EL PAGO DE LA PRIMA SE DEBERÁ HACER A MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA O, SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.

(415)7709998292888(8020)001522370000024110066931(3902)00000001190000

Referencia de Pago :
001522370000024110066931

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE	VALOR
EFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL		

Convenio de pago
BANCO DAVIVIENDA CUENTA AHORROS No. 0050-0014-0938
BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 03194541519.
BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE No. 449097922

cesce

Seguroexpo de Colombia S.A. Nit. 860.069.186-9

CERTIFICACIÓN

SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. certifica que la póliza de CUMPLIMIENTO Nº 152237 CERTIFICADO 4110066388 emitida por la Compañía **NO EXPIRARÁ** por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento de ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Se firma en BOGOTÁ, D.C., a los 17 días del mes de Julio de 2023



Firma autorizada
SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.
ASEGURADORA DE CRÉDITO Y DEL COMERCIO EXTERIOR

cesce

Segurexpo de Colombia S.A. Nit. 860.064.196-9

CERTIFICACIÓN

SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. certifica que la póliza de CUMPLIMIENTO Nº 152237 CERTIFICADO 4110066931 emitida por la Compañía **NO EXPIRARÁ** por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento de ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Se firma en BOGOTÁ, D.C., a los 26 días del mes de Julio de 2023

Firma autorizada
SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.
ASEGURADORA DE CRÉDITO Y DEL COMERCIO EXTERIOR

cesce

Segurexpo de Colombia S.A. Nit. 860.009.195-9

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CONTRATOS CELEBRADOS CON ENTIDADES ESTATALES (LEY 80/93)

Actividad Económica 6511 – Seguros Generales.
No Somos Grandes Contribuyentes.
Responsable de IVA. No efectuar retención en la fuente por concepto de primas.

NIT: 860.009.195-9
Calle 72 nº 6-44 piso 12, Bogotá.
Tel: (571) 326 69 69
Fax: (571) 211 02 18
segurexpo@segurexpo.com
BOGOTÁ, D.C.

FECHA EXP.	SUCURSAL	RAMO	PÓLIZA	CERTIFICADO	TIPO CERTIFICADO	NRO. ENDOSO	HOJAS
17/07/2023	BOGOTA	24	12581	4110066390	EXPEDICIÓN	0	1/1

TOMADOR	CCP INGENIEROS SAS			**NIT**	9015958204
DIRECCIÓN	CR 6 65 24 OF 331 (230019) MONTERIA - CÓRDOBA	**TELÉFONO**	+57 3014441670	**CIUDAD**	MONTERIA.
ASEGURADO	CCP INGENIEROS SAS Y MUNICIPIO DE MONTERIA			**NIT**	9015958204
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE MONTERIA Y/O TERCEROS AFECTADOS			**NIT**	

OBJETO:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL QUE SE GENERA POR RECLAMACIONES DE TERCEROS, COMO CONSECUENCIA DE ACTOS, HECHOS U OMISIONES DEL CONTRATISTA, DERIVADOS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO Nº LP-SPM-019-2022 CUYO OBJETO ES GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL TOMADOR/AFIANZADO, CONTENIDAS EN EL CONTRATO Nº LP-SPM-019-2022, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LOS BARRIOS PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.; EL PAGO DE LOS PERJUICIOS, MULTAS Y/O CLAUSULA PENAL A QUE HAYA LUGAR, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LOS AMPAROS OTORGADOS.

AMPAROS	VALOR ASEGURADO ($-Pesos Colombianos)	VIGENCIA		DEDUCIBLE	
		DESDE	HASTA	%	MINIMO($-Pesos Colombianos)
Básico - Predios, labores y operaciones (PLO)	464,000,000.00	10/07/2023	08/09/2023	10.00	1,656,232.00
Vehículos propios y no propios	232,000,000.00	10/07/2023	08/09/2023	10.00	1,656,232.00
Patronal	232,000,000.00	10/07/2023	08/09/2023	10.00	1,656,232.00
Contratistas y subcontratistas	232,000,000.00	10/07/2023	08/09/2023	10.00	1,656,232.00

VALOR ASEGURADO			VIGENCIA DE LA PÓLIZA							
Valor Anterior	Aumento/ Disminución	Valor Actual	Desde las 00:00 Horas	10	7	2023	Hasta las 24:00 Horas	8	9	2023
0.00	0.00	464,000,000.00								

TRM 1.00	Prima Neta:$ 193,863.01	Gastos Expedición: $ 5,000.00	IVA(19%): $ 37,783.97	Total a pagar: $ 236,646.98

INTERMEDIARIOS			COASEGURO (100% COMPAÑIA)		
Intermediario	Clave	%	Coasegurador	%	Valor Asegurado
PEDRO LUIS GUTIERREZ SANCHEZ	4233	100.00			

Usuario Cargue	MCO10667407526	Usuario de Autorización	MCO10667407526	Usuario de Expedición	MCO10667407526

LAS PARTES ACUERDAN QUE, SALVO PACTO EN CONTRARIO, EL PAGO DE LA PRIMA SE DEBERÁ HACER A MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA O, SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.



Referencia de Pago :
000125810000014110066390

LA PRESENTE PÓLIZA SE RIGE BAJO EL CLAUSULADO RCEPARTIC0022022, REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

Segurexpo - Representante Legal

Elana Otero P

Firma Tomador

Para validar los datos de la presente póliza ingresé a www.segurexpo.com - opción Servicios/Consulta Pólizas o leyendo el código QR mostrado a la derecha

cesce

Segurexpo de Colombia S.A. Nit. 860.009.195-9

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CONTRATOS CELEBRADOS CON ENTIDADES ESTATALES (LEY 80/93)

Actividad Económica 6511 – Seguros Generales.
No Somos Grandes Contribuyentes.
Responsable de IVA. No efectuar retención en la fuente por concepto de primas.

NIT: 860.009.195-9
Calle 72 nº 6-44 piso 12, Bogotá.
Tel: (571) 326 69 69
Fax: (571) 211 02 18
segurexpo@segurexpo.com
BOGOTÁ, D.C.

FECHA EXP.	SUCURSAL	RAMO	PÓLIZA	CERTIFICADO	TIPO CERTIFICADO	NRO. ENDOSO	HOJAS
17/07/2023	BOGOTA	24	12581	4110066390	EXPEDICIÓN	0	1/1

TOMADOR	CCP INGENIEROS SAS			**NIT**	9015958204
DIRECCIÓN	CR 6 65 24 OF 331 (230019) MONTERIA - CÓRDOBA	**TELÉFONO**	+57 3014441670	**CIUDAD**	MONTERIA
ASEGURADO	CCP INGENIEROS SAS Y MUNICIPIO DE MONTERIA			**NIT**	9015958204
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE MONTERIA Y/O TERCEROS AFECTADOS			**NIT**	

COPIA PARA PAGO
EN BANCOS
NO NEGOCIABLE

VALOR ASEGURADO			VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN								
Valor Anterior	Aumento/ Disminución	Valor Actual	Desde las 00:00 Horas	10	7	2023	Hasta las 24:00 Horas	8	9	2023
0.00	0.00	464,000,000.00								

TRM 1.00	Prima Neta:$ 193,863.01	Gastos Expedición: $ 5,000.00	IVA(19%): $ 37,783.97	Total a pagar: $ 236,646.98

INTERMEDIARIOS			COASEGURO (100% COMPAÑIA)		
Intermediario	Clave	%	Coasegurador	%	Valor Asegurado
PEDRO LUIS GUTIERREZ SANCHEZ	4233	100.00			

LAS PARTES ACUERDAN QUE, SALVO PACTO EN CONTRARIO, EL PAGO DE LA PRIMA SE DEBERÁ HACER A MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA O, SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.

(415)7709998292868(8020)000125810000014110066390(3902)00000023664698

Referencia de Pago :
000125810000014110066390

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE	VALOR
EFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL		

Convenio de pago
BANCO DAVIVIENDA CUENTA AHORROS No. 0050-0014-0938
BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 03194541519.
BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE No. 449097922

cesce

Seguros de tu éxito

CERTIFICA QUE

La sociedad **CCP INGENIEROS SAS** identificado con **NIT 901.595.820-4** se encuentra al día con el pago de las primas sobre las pólizas del ramo de **CUMPLIMIENTO,** Póliza No **152237** **CERTIFICADO 4110066388** por todo concepto, por lo cual se encuentra **PAZ Y SALVO** con **SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. NIT** 860.009.195-9

Para constancia, se firma a los tres (03) días del mes de agosto del año 2023, en la ciudad de Bogotá, D.C.

Cordialmente,

SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.

ANALISTA CARTERA SEGUREXPO DE COLOMBIA
NESTOR GABRIEL MATIZ CANO
TEL: 60 1 3266969 Ext. 1107

cesce

Seguros de tu éxito

CERTIFICA QUE

La sociedad **CCP INGENIEROS SAS** identificado con **NIT 901.595.820-4** se encuentra al día con el pago de las primas sobre las pólizas del ramo de **RESPONSABILIDAD CIVIL,** Póliza No **12581 CERTIFICADO 4110066390** por todo concepto, por lo cual se encuentra **PAZ Y SALVO** con **SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. NIT** 860.009.195-9

Para constancia, se firma a los tres (03) días del mes de agosto del año 2023, en la ciudad de Bogotá, D.C.

Cordialmente,

SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.

ANALISTA CARTERA SEGUREXPO DE COLOMBIA
NESTOR GABRIEL MATIZ CANO
TEL: 60 1 3266969 Ext. 1107

SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.

RECIBO DE CAJA Nº. 2300007413

cesce
Segurexpo de Colombia S.A. Nit. 860.009.195-9

PAGADO

SUCURSAL COLOMBIA	FECHA DE PAGO 2/8/2023
RECIBIDO DE: 319284928 CCP INGENIEROS SAS	NIT o C.C. 9015958204
LA SUMA DE: VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS	**COP 26.546.788,00**
POR CONCEPTO DE: PAGA POLIZA 152237, 12581, 12581, CERTIFICADO 4110066388, 4110066390, 4110066755,	

FORMA DE PAGO	MONEDA	CHEQUE/TARJETA/ BOLETA	ENTIDAD	VALOR
PAYU	COP	2/8/2023		COP 26.546.788,00
			Total	**COP 26.546.788,00**

ESTE RECIBO NO REPRESENTA ACEPTACION DEL CHEQUE O TARJETA DE CREDITO POR PARTE DE LA COMPAÑIA, HASTA TANTO EL BANCO CONFIRME EL PAGO RESPECTIVO.
EN CONSECUENCIA, EN CASO DE DEVOLUCION DEL DOCUMENTO, SE ENTENDERA QUE LA OBLIGACION NO HA SIDO PAGADA.

Nº Transacción: 23122982 Pago automático

APROBACION DE POLIZA CONTRATO

Alcaldía de Montería
Oficina Asesora Jurídica

RESOLUCIÓN No. 0335 de 2022

POR LA CUAL SE APRUEBA UNA GARANTIA.

LA JEFE DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA,

en uso de la delegación de competencia para aprobación de pólizas otorgada mediante Resolución No. 0090 de Marzo 12 de 2012, proferida por el Alcalde de Montería, y

CONSIDERANDO:

Mediante Resolución No. 0090 de Marzo 12 de 2012, el Alcalde de Montería delegó la competencia de la aprobación de las pólizas de garantías suscritas para garantizar los diferentes contratos que celebre el Municipio de Montería en el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Alcaldía de Montería.

Que el Consorcio Vial Paz del Norte, identificado con el NIT No. 901.647.860-3, representado legalmente por Julio Andrés Benavides Vertel identificado (a) con la C.C. 1.067.289.872 expedida en Pueblo Nuevo, suscribió con el Municipio de Montería Contrato de Obra No. LP-SPM-019-2022, cuyo objeto es Mejoramiento de las vías en los barrios Paz del Norte y 20 de julio en el Municipio de Montería, Departamento de Córdoba.

Que el contratista constituyó la póliza de seguro de cumplimiento N° 144354 endoso 1, mediante la cual se garantiza el cumplimiento del contrato, el pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones y la estabilidad y calidad de la obra y de responsabilidad civil extracontractual N° 11038 endoso 1, mediante la cual se garantiza el amparo de la responsabilidad civil extracontractual, expedidas por Segurexpo de Colombia S.A. – CESCE, las cuales se ajustan a las preceptivas legales y contractuales.

Que las anteriores pólizas fueron aprobadas en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II) el día nueve (9) de diciembre de 2022.

Que el artículo 41 de la Ley 80 de 1.993, dispone que para la ejecución del contrato se requiere de la aprobación de la Garantía.

Por lo anterior, se

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la póliza de seguro de cumplimiento N° 144354 endoso 1, expedida por Segurexpo de Colombia S.A. – CESCE, tomada a favor del Municipio de Montería por el Consorcio Vial Paz del Norte, identificado con el NIT No. 901.647.860-3, representado legalmente por Julio Andrés Benavides Vertel identificado (a) con la C.C. 1.067.289.872 expedida en Pueblo Nuevo, mediante la cual se garantizan

Alcaldía de Montería
Oficina Asesora Jurídica

los amparos de cumplimiento del contrato, el pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones y la estabilidad y calidad de la obra, del Contrato de Obra No. LP-SPM-019-2022.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar la póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual N° 11038 endoso 1, expedida por Segurexpo de Colombia S.A. – CESCE, tomada a favor del Municipio de Montería por el Consorcio Vial Paz del Norte, identificado con el NIT No. 901.647.860-3, representado legalmente por Julio Andrés Benavides Vertel, mediante la cual se garantiza el amparo de responsabilidad civil extracontractual del Contrato de Obra No. LP-SPM-019-2022.

ARTÍCULO TERCERO: Esta Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Expedida en Montería a los nueve (9) días del mes de diciembre de 2022.

CÚMPLASE

KARINA MARIA CARRASCAL SOCARRAS
Jefe Oficina de Asesoría Jurídica

Proyectó: Loly Alvarez – Contratista OAJ
Revisó: William Montes – Profesional Universitario Oficina Asesora Jurídica

Alcaldía de Montería
Oficina Asesora Jurídica

R E S O L U C I Ó N No. 0188 de 2023

POR LA CUAL SE APRUEBA UNA GARANTIA.

LA JEFE DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA,

en uso de la delegación de competencia para aprobación de pólizas otorgada mediante Resolución No. 0090 de Marzo 12 de 2012, proferida por el Alcalde de Montería, y.

C O N S I D E R A N D O:

Mediante Resolución No. 0090 de Marzo 12 de 2012, el Alcalde de Montería delegó la competencia de la aprobación de las pólizas de garantías suscritas para garantizar los diferentes contratos que celebre el Municipio de Montería en el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Alcaldía de Montería.

Que el Consorcio Vial Paz del Norte, identificado con el NIT No. 901.647.860-3, representado legalmente por Julio Andrés Benavides Vertel identificado (a) con la C.C. 1.067.289.872 expedida en Pueblo Nuevo, suscribió con el Municipio de Montería Contrato de Obra No. LP-SPM-019-2022, cuyo objeto es Mejoramiento de las vías en los barrios Paz del Norte y 20 de julio en el Municipio de Montería, Departamento de Córdoba.

Que el contratista constituyó la póliza de seguro de cumplimiento N° 144354 endoso 1, mediante la cual se garantiza el cumplimiento del contrato, el pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones y la estabilidad y calidad de la obra y de responsabilidad civil extracontractual N° 11038 endoso 1, mediante la cual se garantiza el amparo de la responsabilidad civil extracontractual, expedidas por Segurexpo de Colombia S.A. - CESCE, las cuales fueron aprobadas en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II) el día nueve (9) de diciembre de 2022 y resolución N° 0335.

Que en fecha veintisiete (27) de febrero de 2023 se suscribió acta de inicio del contrato, por lo cual el contratista actualizó las vigencias de los amparos, las cuales fueron aprobadas en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II) el día once (11) de julio de 2023 y resolución N° 0153.

Que en fecha once (11) de julio de 2023, el Consorcio Vial Paz del Norte, identificado con el NIT No. 901.647.860-3, representado legalmente por Julio Andrés Benav[illegible] C.C. 1.067.289.872 expedida en Pueb[illegible] LP-SPM-019-2022 al CCP Ingeniero. 901.595.820-4, representado legalmente por Eliana Margarita Otero Pérez, identificada con

cs_646_save_doc cs_646_edit_doc cs_646_download_pdf

C.C. Nº 1.128.268.092 expedida en Cereté.

Que el contratista constituyó póliza de seguro de cumplimiento Nº 152237 endoso Nº 1 mediante la cual se garantiza el cumplimiento del contrato, el pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones y la estabilidad y calidad de la obra y póliza de seguro de Responsabilidad civil

Alcaldía de Montería

Oficina Asesora Jurídica

R E S O L U C I Ó N No. 0153 de 2023

POR LA CUAL SE APRUEBA UNA GARANTIA.

LA JEFE DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA,

en uso de la delegación de competencia para aprobación de pólizas otorgada mediante Resolución No. 0090 de Marzo 12 de 2012, proferida por el Alcalde de Montería, y

C O N S I D E R A N D O:

Mediante Resolución No. 0090 de Marzo 12 de 2012, el Alcalde de Montería delegó la competencia de la aprobación de las pólizas de garantías suscritas para garantizar los diferentes contratos que celebre el Municipio de Montería en el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Alcaldía de Montería.

Que el Consorcio Vial Paz del Norte, identificado con el NIT No. 901.647.860-3, representado legalmente por Julio Andrés Benavides Vertel identificado (a) con la C.C. 1.067.289.872 expedida en Pueblo Nuevo, suscribió con el Municipio de Montería Contrato de Obra No. LP-SPM-019-2022, cuyo objeto es Mejoramiento de las vías en los barrios Paz del Norte y 20 de julio en el Municipio de Montería, Departamento de Córdoba.

Que el contratista constituyó la póliza de seguro de cumplimiento N° 144354 endoso 1, mediante la cual se garantiza el cumplimiento del contrato, el pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones y la estabilidad y calidad de la obra y de responsabilidad civil extracontractual Nº 11038 endoso 1, mediante la cual se garantiza el amparo de la responsabilidad civil extracontractual, expedidas por Segurexpo de Colombia S.A. – CESCE, las cuales fueron aprobadas en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II) el día nueve (9) de diciembre de 2022 y resolución N° 0335.

Que en fecha veintisiete (27) de febrero de 2023 se suscribió acta de inicio del contrato.

Que el contratista actualizó las vigencias de los amparos conforme al acta de inicio, las cuales corresponden al endoso N° 2 de la póliza de seguro de cumplimiento Nº 144354, mediante la cual se garantiza el cumplimiento del contrato, el pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones y la estabilidad y calidad de la obra y el endoso N° 2 de la póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual N° 11038, mediante la cual se garantiza el amparo de la responsabilidad civil extracontractual, expedidas por Segurexpo de Colombia S.A. – CESCE, las cuales se ajustan a las preceptivas legales y contractuales

Que las anteriores pólizas fueron aprobadas en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II) el día once (11) de julio de 2023.

Que el artículo 41 de la Ley 80 de 1.993, dispone que para la ejecución del contrato se requiere de la aprobación de la Garantía.

Por lo anterior, se

R E S U E L V E:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar endoso N° 2 de la póliza de seguro de cumplimiento N° 144354, expedida por Segurexpo de Colombia S.A. – CESCE, tomada a favor del Municipio de Montería por el Consorcio Vial Paz del Norte, identificado con el NIT No. 901.647.860-3, representado legalmente por Julio Andrés Benavides Vertel identificado (a) con la C.C. 1.067.289.872 expedida en Pueblo Nuevo, mediante la cual se garantizan los amparos de cumplimiento del contrato, el pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones y la estabilidad y calidad de la obra, del Contrato de Obra No. LP-SPM-019-2022.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el endoso N° 2 de la póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual N° 11038, expedida por Segurexpo de Colombia S.A. – CESCE, tomada a favor del Municipio de Montería por el Consorcio Vial Paz del Norte, identificado con el NIT No. 901.647.860-3, representado legalmente por Julio Andrés Benavides Vertel, mediante la cual se garantiza el amparo de responsabilidad civil extracontractual del Contrato de Obra No. LP-SPM-019-2022.

ARTÍCULO TERCERO: Esta Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Expedida en Montería a los once (11) días del mes de julio de 2023.

CÚMPLASE

KARINA MARIA CARRASCAL SOCARRAS
Jefe Oficina de Asesoría Jurídica

Proyectó: Loly Alvarez – Contratista OAJ
Revisó: William Montes – Profesional Universitario Oficina Asesora Jurídica

C.C.P
INGENIEROS S.A.S

Copia Contrato y/o modificaciones

Dirección: Carrera 6 No. 65-24
Email: ccpconstrucciones22@gmail.com
Montería, Córdoba - Colombia

CONTRATO DE OBRA N° LP-SPM-019-2022

TABLA DE CONTENIDO

CLÁUSULA 1.	DEFINICIONES
CLÁUSULA 2.	OBJETO
CLÁUSULA 3.	ALCANCE DEL OBJETO
CLÁUSULA 4.	PLAZO DEL CONTRATO
CLÁUSULA 5.	VALOR DEL CONTRATO
CLÁUSULA 6.	ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
CLÁUSULA 7.	APROPIACIÓN PRESUPUESTAL
CLÁUSULA 8.	FORMA DE PAGO
CLÁUSULA 9.	OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 10.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 11.	DERECHOS DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 12.	OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
CLÁUSULA 13.	RESPONSABILIDAD
CLÁUSULA 14.	INDEMNIDAD
CLÁUSULA 15.	MULTAS
CLÁUSULA 16.	CLÁUSULA PENAL
CLÁUSULA 17.	CLÁUSULAS EXCEPCIONALES
CLÁUSULA 18.	GARANTÍAS
CLÁUSULA 19.	INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 20.	INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA
CLÁUSULA 21.	CESIÓN
CLÁUSULA 22.	LIQUIDACIÓN
CLÁUSULA 23.	SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN
CLÁUSULA 24.	LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL
CLÁUSULA 25.	DOCUMENTOS

Entre el señor **CARLOS ORDOSGOITIA SANIN,** persona mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.969.238 de Bogotá, quien para los efectos del presente acto obra en nombre y representación del **MUNICIPIO DE MONTERIA** (en adelante la "Entidad"), por una parte; y, por la otra, el señor JULIO ANDRES BENAVIDES VERTEL identificado con C.C.N°1.067.289.872 de PUEBLO NUEVO, obrando en mi calidad de Representante Legal del CONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE identificado con NIT 9 0 1 6 4 7 8 6 0 - 3 (en adelante el "Contratista"), identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

2

I. Que mediante Resolución No. 0571 de fecha 21 de julio de 2022 la Entidad abrió el Proceso de Contratación número LP-SPM-019-2022.

II. Que mediante Resolución No. 0828 del 10 de octubre de 2022 la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la "Parte", conjuntamente las "Partes"), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLÁUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es: "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. LP-SPM-019-2022, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato es de cuatro (04) meses, contados a partir del acta de inicio previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma CUATRO MIL ONCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($4.011.661.268,00). incluido el valor del AIU, PGIO Y PAPSO. Equivalentes a 4.011 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2022 suma que se discrimina de la siguiente manera:

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1.00				PRELIMINARES				
1,01	201,8	201	201,1	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	M	155,00	$10.836,47	$1.679.653,00
1,02			1,02	CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10m&0.15M CON CORTADORA	M	155,00	$28.575,16	$4.429.151,00
1,03	201,8	201	201,9	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	M2	124,00	$25.207,95	$3.125.787,00
1,04				INSTALACIÓN DE CERCA EN MADERA DE ASTILLA DE 3"X3" Y 2.2 M DE ALTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M	257,00	$20.924,26	$5.536.778,00
1,05	201,8	201	201,7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	18,02	$157.292,49	$2.834.411,00
1,06				EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB- RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	M3	954,53	$21.145,55	$20.184.060,00
1,07	210,8	210	210,2,2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	2.568,56	$10.572,77	$27.156.804,00
1,08			1,06	CARQUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	4.966,15	$19.407,55	$96.380.781,00
1,09	201,8	201	201,12	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS)	UND.	8,00	$313.395,57	$2.507.165,00
1,10	201,8	201	201,12	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)	UND.	7,00	$473.727,95	$3.316.096,00
1,11				REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 10.1M A 15M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)	UND.	1,00	$714.453,80	$714.454,00
1,12				SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	UND.	160,00	$100.194,71	$16.031.154,00

Subtotal								$183.946.294,80
2.00				SUBRASANTE Y SUBBASE				
2,01	320,8	320	320,3	TERRAPLEN	M3	1.506,32	$61.819,43	$93.119.837,00
2,02	320,6	320	320,3	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	M3	1.641,89	$140.476,73	$230.647.345,00
2,03	320,6	320	320,3	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	1.532,48	$131.924,30	$202.171.045,00
2,04	231,8	231	231,1	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	10.456,62	$12.859,38	$134.465.622,00
Subtotal								$660.403.849,00
3.00				PAVIMENTO, BORDILLOS Y ANDENES				
3,01	500,8	500	500,1	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (3.8 Mpa)	M3	1.271,60	$953.783,71	$1.212.831.368,00
3,02			3,02	ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND.	15,00	$397.865,20	$5.964.978,00
3,03	672,8	672	672,4	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	2.298,47	$98.159,82	$225.617.404,00
3,04	640,8	640	640,1	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	6.378,65	$9.125,21	$58.236.499,00
Subtotal								$1.502.628.249,00
4.00				SEÑALIZACION				
4,01	710,8	710	710,1	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETRORREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND.	9,00	$435.358,20	$3.918.224,00
4,02	710,8	710	710,1	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETRORREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND.	1,00	$728.058,17	$728.058,00
4,03	700,8	700	700,3	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO	M2	30,00	$138.822,56	$4.164.677,00
4,04	700,8	700	700,3	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	M	3.561,71	$15.237,25	$54.270.702,00
4,05	700,8	700	700,3	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADO	M	37,50	$386.734,69	$14.502.551,00
Subtotal								$77.578.212,00
5.00				CUNETAS Y SUMIDEROS				
5,01			5,01	EXCAVACION MANUAL	M3	336,71	$32.225,43	$10.850.625,00
5,02			5,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	437,73	$19.407,55	$8.495.265,00
5,03	231,8	231	231,1	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	364,77	$12.859,38	$4.690.715,00
5,04			5,04	RELLENO PARA FILTROS EN GRAVA TIPO ARENA	M3	30,86	$92.403,67	$2.851.577,00
5,05			5,05	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	136,89	$77.268,11	$10.734.546,00
5,06	640,8	640	640,1	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	8.362,51	$9.125,21	$76.310.544,00
5,07	671,8	671	671,1	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	88,39	$902.542,75	$79.775.977,00
5,08				SUMIDERO LATERAL TIPO VENTANA VACIADO IN SITU, INCLUYE REFUERZO	UND.	7,00	$861.017,69	$6.027.124,00
5,09				CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE G (PARA PIEDRA PEGADA)	M3	3,20	$500.357,66	$1.601.145,00
5,10				BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	40,20	$98.159,82	$3.946.025,00
Subtotal								$205.283.543,00
6.00				ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS				
6,01			6,01	S8 TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.05m COLOR AMARILLO TIPO ACANALADA (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H:=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS	M	1.387,53	$44.009,74	$61.064.830,00
6,02				FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H:=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	M	1.387,53	$35.438,69	$49.172.237,00
6,03			6,02	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO ENSITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE, Y TODO LO NECESARIO PARA SUCORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2	1.079,67	$102.436,85	$110.601.576,00
6,04			6,03	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	UND.	10,00	$861.801,41	$8.618.014,00
6,05			6,04	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA ENCONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UND.	5,00	$1.198.283,38	$5.991.417,00
6,06			6,05	S9 BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - 800 EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND.	30,00	$233.431,77	$7.002.953,00
Subtotal								$242.991.027,00

7.00					OTRAS ACTIVIDADES				
7,01	600,8	600	600,2	4	SUTUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	M	24,00	$54.057,88	$1.297.389,00
7,02			7,02		REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND.	16,00	$79.896,50	$1.278.344,00
7,03	231,8	231	231,1		REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	UND.	16,00	$301.886,95	$4.830.191,00
7,04					BARANDA METÁLICA PARA TRÁFICO VEHICULAR	M	605,00	$629.571,03	$380.830.473,00
Subtotal									$388.298.397,00
8.00					REDES ELECTRICAS				
8.1					RED DE MEDIA TENSION (13.2KV) V.				
8.1.01.					LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE MEDIA TENSION.	M.	1.000,00	$ 4.705,06	$4.705.055,00
8.1.02					SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 M - 750 KGF).	UND.	4,00	$ 3.616.256,61	$14.465.026,00
8.1.03					SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 M - 750 KGF).	UND.	4,00	$ 777.392,55	$3.109.570,00
8.1.04					SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 M - 1050 KGF).	UND.	2,00	$ 4.253.672,46	$8.507.345,00
8.1.05					SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 M - 1050 KGF).	UND.	2,00	$ 995.077,19	$1.990.154,00
8.1.06					SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN DERIVACION COMPACTA CON DISPOSICIÓN CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND.	1,00	$ 4.899.580,42	$4.899.580,00
8.1.07					SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION COMPACTA CON DISPOSICIÓN CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND.	1,00	$ 2.756.268,81	$2.756.269,00
8.1.08					SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION CON DISPOSICIÓN EN BANDERA BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND.	2,00	$ 2.998.894,53	$5.997.790,00
8.1.09					SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANGULO CON DISPOSICIÓN EN BANDERA A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND.	1,00	$ 4.463.864,43	$4.463.864,00
8.1.10					SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANCLAJE COMPACTA CON DISPOSICIÓN CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND.	1,00	$ 4.618.604,82	$4.618.605,00
8.1.11					SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN FIN DE LINEA COMPACTA CON DISPOSICIÓN CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND.	1,00	$ 3.629.200,81	$3.629.201,00
8.1.13					SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m	UND.	1,00	$ 5.615.114,82	$5.615.115,00
8.1.14					INSTALACION CON TENSION A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO	UND.	1,00	$ 8.007.835,53	$8.007.836,00
Subtotal									$72.795.459,00
8.2					RED DE BAJA TENSION (240/120 V.				
8.2.01					LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE BAJA TENSION.	M.	750,00	$ 2.854,57	$2.140.925,00
8.2.02					SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 M - 510 KGF).	UND.	13,00	$ 2.730.231,04	$35.493.003,00
8.2.03					SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 M - 510 KGF).	UND.	13,00	$ 495.256,55	$6.438.881,00
8.2.04					SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 V.	UND.	20,00	$ 727.495,74	$14.549.915,00
8.2.05					SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANCLAJE PARA BT A 240/120 V.	UND.	1,00	$ 678.195,00	$678.196,00
8.2.06					SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 2 AWG.	M.	780,00	$ 74.408,65	$58.038.748,00
8.2.07					SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 1/0 AWG.	M.	230,00	$ 79.910,33	$18.379.376,00
8.2.08					SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 M.	UND.	5,00	$ 1.472.514,41	$7.362.572,00
8.2.09					SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PUESTA A TIERRA DE RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL., EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND.	1,00	$ 959.292,77	$959.293,00
8.2.10					SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A RED TRENSADA DE BT A 120/240 V.	UND.	4,00	$ 1.979.916,29	$7.919.665,00
Subtotal									$152.168.574,00

8.3					SUBESTACIONES ELECTRICAS (13.2KV/480/120) V.				
8.3.01					SUMINISTRO, PUEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. 6) AWG	ML	402,00	$ 58.670,74	$23.595.636,00
8.3.02					SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REUBICACION DE MEDIDOR (240/120) V.	UND.	10,00	$ 927.745,94	$9.277.459,00
8.3.03					SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO.	UND.	19,00	$ 731.936,17	$13.906.787,00
Subtotal									$46.769.882,00
9									
9.1					OBRAS DE ALCANTARILLADO				
9.1.01					LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	Ml	401,00	$6.637,39	$2.661.644,00
9.1.02					EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA (A MAQUINA)	M3	1.333,13	$23.379,60	$31.168.041,00
9.1.03					RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	224,56	$77.288,11	$17.355.619,00
9.1.04					RELLENO CON MATERIAL DE SITIO	M3	283,02	$33.827,90	$30.208.950,00
9.1.05					RELLENO PARA FILTROS EN GRAVA TIPO ARENA	M3	14,04	$92.403,67	$1.297.347,00
9.1.06					RELLENO CON MATERIAL TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR	M3	91,41	$143.476,73	$12.540.978,00
9.1.07					CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	440,11	$19.407,55	$8.541.455,00
9.1.08					S/I TUBERIA ALCANTARILLADO CORRUGADA DE 10" (250mm)	Ml	401,00	$135.927,50	$54.506.927,00
9.1.09					CAMARA DE INSPECCION PREFABRICADA ALCANTARILLADO EN CONCRETO	UND.	6,00	$3.806.107,39	$22.836.644,00
9.1.10					S/I DE ENTIBADO (APUNTALAMIENTO EN LAMINA METALICA) x 3 USOS	M2	1.157,93	$76.352,26	$88.410.578,00
9.1.11					GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS Y CAPAS GRANULARES	M2	1.203,00	$12.859,38	$15.469.831,00
9.1.12					S/I DOMICILIARIA ALCANTARILLADO	UND.	3,00	$839.554,69	$2.518.964,00
Subtotal									$287.837.248,00
9.2					OBRAS DE ACUEDUCTO				
9.2.01					LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	Ml	367,00	$6.637,39	$2.434.273,00
9.2.02					EXCAVACION MANUAL	M3	146,80	$32.225,43	$4.730.653,00
9.2.03					RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	73,40	$77.288,11	$5.672.947,00
9.2.04					RELLENO CON MATERIAL DE SITIO	M3	55,05	$33.827,90	$1.862.226,00
9.2.05					RELLENO PARA FILTROS EN GRAVA TIPO ARENA	M3	18,35	$92.403,67	$1.695.607,00
9.2.06					CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	91,75	$19.407,55	$1.780.642,00
9.2.07					S/I TUBERIA PEAD PE 100 I PN 8 (RDE 21) - D = 160 mm	Ml	367,00	$121.564,75	$44.618.424,00
9.2.08					S/I ACCESORIOS DETALLE 1 - DERIVACION	UND.	2,00	$3.691.343,86	$7.382.688,00
9.2.09					S/I ACCESORIOS DETALLE 2 - TAPON	UND.	1,00	$305.795,40	$305.795,00
9.2.10					S/I ACCESORIOS DETALLE 3 - HIDRANTE	UND.	2,00	$5.218.957,97	$10.437.915,00
Subtotal									$81.691.198,00
					SUBTOTAL OBRAS				$3.981.251.855,00

IMPLEMENTACIÓN DE GESTION DE OBRA (Seguridad y salud en el Trabajo, Plan de manejo Ambiental y Plan de aseguramiento de calidad-plan manejo de trafico)	$60.293.050,00
PAPSO	$25.704.323,00
TRAMITES Y LEGALIZACION AFINIA (INMODIFICABLE)	$6.400.000,00
TRAMITES AMBIENTALES (INMODIFICABLE)	$17.980.000,00
VALOR TOTAL OBRAS	$4.091.629.228,00

VALOR TOTAL EN LETRAS:	CUATRO MIL ONCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	DESCRIPCION	PORCENTAJE	
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	ADMINISTRACION	A=	27,0000%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	IMPREVISTO	I=	1,0000%
NOTA 4: El valor del PGIO Y PAPSO es modificable, en todo caso durante la ejecucion de l contrato se debera garantizar las especificaciones de estos planes de acuerdo con lo previsto por la entidad en el cuadro que descrimina las actividades del mismo.	UTILIDAD	U=	5,0000%
NOTA 5: Los valores de tramites ambientales y de legalizacion de afinia no son modificables, so pena rechazo.	TOTAL A.I.U.	A.I.U.=	33,0000%

CONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE
REP LEGAL: JULIO ANDRES BENAVIDES VERTEL
C. C. No.: 1.067.293.872 DE PUEBLO NUEVO

El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

7

CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

En el presente proceso de contratación la entidad no entregará al contratista anticipo y/o pago anticipado.

CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Numero certificado disponibilidad presupuestal	Fecha certificado disponibilidad presupuestal	Valor certificado de disponibilidad presupuestal
22001403	06/06/2022	$4.341.625.306.00

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO

El Municipio de Montería pagará el valor del presente contrato por el sistema de precios unitarios sin fórmula de reajuste. No tiene previsto la entrega de anticipo y el imprevisto establecido para este contrato es del 1%.

La entidad no ha previsto la entrega de anticipo, toda vez que de acuerdo a los indicadores financieros que estipulan la matriz 3 de los pliegos tipo, el contratista debe contar con capacidad financiera que le permita solventar los gastos iniciales de ejecución de obra hasta en un 20%, tiempo en el cual podrá presentar acta parcial.

Se previó un imprevisto del 1%, para sufragar los costos o gastos menores de la obra no previstos en el contrato, que no tienen un valor contractual asignado pero que son normales del negocio, lo cual no da lugar a solicitar indemnización a la entidad contratante y que deben ser asumidos por el contratista con cargo a este rubro.

Por lo anterior, la forma de pago se ha establecido de la siguiente manera:

EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, le desembolsará a **EL CONTRATISTA** la suma descrita en la cláusula de forma de pago de la siguiente manera: **1.- PAGOS PARCIALES Y/O FINAL,** de hasta el 90% del valor del contrato. La primera acta parcial de ejecución se pagará con avance superior al 20%, no obstante, este requisito no será aplicable a los siguientes pagos parciales, pues éstos se realizarán conforme al porcentaje de ejecución respectivo. Será requerido certificado de cumplido a satisfacción expedido por el Interventor del contrato, donde conste expresamente el porcentaje de ejecución, la acreditación del pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud, pensiones y riesgos profesionales del personal que emplee en la ejecución de la obra conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a la Ley 789 de 2002, el Decreto 510 de 2003 y demás a que haya lugar. **2.- PAGO FINAL,** equivalente al 10% del valor del contrato, una vez se haya cumplido a cabalidad el objeto contractual, para lo cual deberá

entregarse informe final del Interventor del contrato acompañado del certificado de cumplido a satisfacción, acta de liquidación del contrato, la acreditación del pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud, pensiones y riesgos profesionales del personal que emplee en la ejecución de la obra conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a la Ley 789 de 2002, el Decreto 510 de 2003 y demás a que haya lugar y, liquidación del contrato**. PARÁGRAFO PRIMERO.- EL CONTRATISTA** deberá presentar la afiliación a salud y pensión, en los términos de Ley, al Interventor del contrato, del personal que haya empleado en la ejecución del objeto contractual. **PARÁGRAFO SEGUNDO.-** Para efectuar los pagos, se deberán adjuntar las actas parciales y/o final, debidamente firmadas por las partes y por el Interventor. Los pagos se efectuarán previa presentación de la factura de venta que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario, en el caso de personas jurídicas y naturales obligados a facturar. En el caso de personas naturales inscritas en el régimen simplificado, el pago se efectuará previa presentación de la cuenta de cobro. Las facturas y/o cuentas de cobro deberán corresponder a las labores desarrolladas, a las cuales se les descontará el porcentaje proporcional correspondiente al anticipo, como amortización del mismo, hasta completar el monto total. Estas facturas y/o cuentas de cobro deberán ir acompañadas de todos los comprobantes y documentos de soporte necesarios para sustentar los avances de la consultoría durante el período de las actas. **PARÁGRAFO TERCERO.-** El valor total de este contrato incluye todos los costos y gastos en que tenga que incurrir **EL CONTRATISTA**, para el cumplimiento de su objeto, por lo cual no habrá lugar a reconocimiento adicional alguno, exceptuando la fuerza mayor y el caso fortuito. **PARAGRAFO CUARTO:** El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste. En consecuencia, el precio incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación de la totalidad del equipo de trabajo; desplazamiento, transporte y almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios, honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrato; computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar y en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para la cumplida ejecución del contrato. NOTA: EL MUNICIPIO no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta. **PARÁGRAFO QUINTO.-** El valor total de este contrato incluye todos los costos y gastos en que tenga que incurrir EL CONTRATISTA, para el cumplimiento de su objeto, por lo cual no habrá lugar a reconocimiento adicional alguno, excepto lo previsto en el análisis de riesgo, la fuerza mayor y el caso fortuito previa deducción del imprevisto. La sola suscripción del contrato autoriza al Municipio para que, en el momento del pago, automáticamente y sin previo aviso realice el correspondiente cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto. Los pagos están condicionados a la existencia de recursos en la caja y a los trámites administrativos correspondientes.

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del proceso, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al diez por ciento (10%), de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a

la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5% de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres.

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.
5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
6. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).
7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.
8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.
9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.
11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.
12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.
13. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).
14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.
15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
16. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.
17. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco (05) hábiles siguientes a la suscripción del contrato.
18. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad.
19. Incorporar como mínimo cuarenta por ciento (40 %), del personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

a. Ejecutar el objeto de acuerdo a los precios unitarios y fijos.

b. Las demás obligaciones específicas que surjan del proceso de contratación.

CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato.

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad está obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.
3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato.

4. Exigir a los contratistas el cumplimiento de la Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios y las normas que las reemplacen, adicionen y complementen relacionadas con el manejo ambiental.
5. Exigir al contratista de la obra que en los procesos constructivos se cumplan las especificaciones técnicas y se realicen los ensayos a los materiales cumpliendo las especificaciones INVIAS vigentes y aplicables para tal efecto.
6. Exigir al contratista de obra la colocación de vallas informativas, en cada uno de los sitios donde se adelante la obra, con base en las especificaciones señaladas en la normatividad vigente, emanada del Ministerio de Transporte.
7. Exigir al contratista de obra vincular laboralmente, para el desarrollo del presente contrato, en el evento en que las condiciones del proyecto lo permitan, de la nómina de mano de obra no calificada requerida para el proyecto, a personas vinculadas a los procesos de reintegración y reincorporación liderados por la Agencia para la Reincorporación y la Normalidad – ARN. Para el efecto La ENTIDAD TERRITORIAL solicitará a Prosperidad Social el listado de personas pertenecientes a dichos programas que residan en la zona de influencia de la obra para su respectivo proceso de selección.
8. Exigir al contratista de obra la inclusión de personal perteneciente a la población beneficiaria de los programas de Prosperidad Social: Familias en Acción, Jóvenes en Acción y/o Estrategia Unidos y mujeres que residan en la zona de influencia de la obra. Para el efecto, La ENTIDAD TERRITORIAL solicitará a Prosperidad Social el listado de personas pertenecientes a dichos programas que residan en la zona de influencia de la obra para su respectivo proceso de selección. La ENTIDAD TERRITORIAL remitirá al Interventor el reporte de los contratos de las personas que cumplen con esta condición, junto con sus respectivas afiliaciones de seguridad social.
9. Garantizar y exigir al contratista de obra el cumplimiento de los protocolos de Bioseguridad de conformidad con la normatividad vigente.

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD

Mantener indemne al MUNICIPIO DE MONTERÍA.

CLÁUSULA 15. MULTAS

Incumplir la obligación de incluir mínimamente el diez por ciento (10%) de mano de obra no calificada de la región durante la ejecución del contrato, de conformidad con la obligación 1 de las "obligaciones generales del contratista", causará multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al [1% del valor total del contrato].

Se causarán multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al [cinco por ciento 5%] del valor del contrato.

Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las siguientes multas:
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.
3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al [0,2%] del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.
4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada], se causará una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada.
5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.
6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada orden incumplida.
7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, [por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación].

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato.
9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 1 salario mínimos mensual legal vigente, [por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación].

12

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.

Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato.

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas.

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios.

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios

ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.

Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato.

CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

CLÁUSULA 18. GARANTÍAS

18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:

<table>
<tr><th>Característica</th><th>Condición</th></tr>
<tr><td>Clase</td><td>Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria.</td></tr>
<tr><td>Asegurado/ beneficiario</td><td>MUNICIPIO DE MONTERÍA, identificada con NIT. No. 800096734-1</td></tr>
<tr><td>Amparos, vigencia y valores asegurados</td><td>
<table>
<tr><th>Amparo</th><th>Vigencia</th><th>Valor Asegurado</th></tr>
<tr><td>Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan</td><td>Hasta la liquidación del contrato</td><td>10% del valor del contrato.</td></tr>
<tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacionalpara la ejecución del contrato</td><td>Plazo del contrato ytres (3) años más.</td><td>20% del valor del contrato</td></tr>
<tr><td>Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción, correspondientes a las actividades de mejoramiento</td><td>Cinco años contados a partir de la fecha del acta de entrega y</td><td>30% del valor del contrato</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Característica	Condición
	yde puente construido en vía terciaria mejorada | recibo definitivo de obra |
Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA

El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (05) años contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el período de garantía.

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.

18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:

Característica	Condición
Clase	Contrato de seguro contenido en una póliza
Asegurados	MUNICIPIO DE MONTERÍA, identificada con NIT. No. 800096734-1, y el Contratista
Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Valor	Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil quinientos (2.500) SMMLV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV.
Vigencia	Igual al período de ejecución del contrato.
Beneficiarios	Terceros afectados, MUNICIPIO DE MONTERÍA, identificada con NIT. No. 800096734-1.
Amparos	Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3° del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles.

El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLÁUSULA 21. CESIÓN

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN

El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será el establecido en la ley.

Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el MUNICIPIO DE MONTERIA y el domicilio contractual es MONTERIA, CORDOBA.

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el Contratista.
4. Las garantías debidamente aprobadas.
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato.

Proyectó Jurídicamente. R.L. MARÍA ANGELICA NEGRETE ARRAZOLA.
ARRAZOLA ABOGADOS ASOCIADOS Y CONSULTORES S.A.S. R/L MARÍA ANGELICA NEGRETE ARRAZOLA.
Asesores Externos
Vo Bo KARINA CARRASCAL SOCARRAS, Jefe oficina jurídica.

CESIÓN DEL CONTRATO DE OBRA Nº LP-SPM-019-2022 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERÍA – CEDENTE: CONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE – CESIONARIO: C.C.P INGENIEROS S.A.S.

Entre los suscritos a saber, **DR. CARLOS ALBERTO ORDOSGOITIA SANIN**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 79.969.238 de Bogotá D.C, quien actúa, en su calidad de Alcalde Municipal, como consta en el Acta de posesión de fecha 1º de enero de 2020, en uso de sus facultades constitucionales y legales, quien obra en nombre y representación del **MUNICIPIO DE MONTERÍA**, entidad territorial del orden local, identificada con NIT. 800.096.734 - 1, quien para los efectos del presente acuerdo se denominará **EL MUNICIPIO**, y el **CONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE**, identificado con NIT No. 901.647.860-3, Representado Legalmente por **ANGÉLICA PATRICIA AVILEZ ARGEL**, identificada con cédula de ciudadanía No. 26.227.533 de Tierralta, quien en adelante y para efectos de este contrato se denominará **EL CEDENTE**, y **C.C.P INGENIEROS S.A.S** identificada con NIT. 901.595.820-4 representada legalmente por **ELIANA MARGARITA OTERO PÉREZ** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.128.268.092 de Cerete, quien en adelante y para efectos de este contrato se denominará **EL CESIONARIO** hemos convenido celebrar la presente cesión del Contrato de Obra Nº LP-SPM-019-2022 previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA: Que entre el **MUNICIPIO DE MONTERÍA** y el **CONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE**, se celebró Contrato de Obra Nº LP-SPM-019-2022 de fecha 27 de febrero de 2023, cuyo objeto es ***"MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LOS BARRIOS PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"***, por un valor de **CUATRO MIL ONCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($4.011.661.268,00)** y un plazo inicial de ejecución de cuatro (04) meses.

SEGUNDA: Que el contrato de Contrato de Obra Nº LP-SPM-019-2022, tiene acta de inicio de fecha 27 de febrero de 2023.

TERCERA: Que, mediante acta de suspensión del día veintiocho 28 de abril de 2023, las partes, de mutuo acuerdo, decidieron suspender la ejecución del Contrato.

CUARTA: Que la señora **ANGÉLICA PATRICIA AVILEZ ARGEL**, identificada con cédula de ciudadanía No. 26.227.533 de Tierralta, representante legal del **CONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE** mediante oficio No. 010 2023 CPN del 30 de mayo de 2023, solicitó al Municipio de Montería la autorización de la cesión total de los derechos técnicos, jurídicos, y financieros del Contrato de Obra Nº LP-SPM-019-2022 a favor de la empresa **C.C.P INGENIEROS S.A.S** identificada con NIT. 901.595.820-4.

CUARTA: Que mediante oficio No. CI.SIM-241-2023 la Secretaría de Infraestructura en calidad de supervisor del contrato dio traslado a la Oficina Asesora Jurídica de la solicitud de cesión, con todos los documentos soporte de aquella.

QUINTA: Que la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad contratante, solicitó a los miembros del comité evaluador, la verificación de las condiciones técnicas, financieras, y jurídicas del cesionario de conformidad a lo establecido en la licitación pública No. LP-SPM-019-2022.

SEXTA: Que, el Comité Evaluador del Contratante, mediante informe de verificación de requisitos habilitantes y evaluación de factores ponderables diferentes al económico de fecha 29 de junio de 2023, conceptúo que el cesionario **CUMPLE** con las condiciones técnicas, financieras, y jurídicas definidas en la Licitación Pública.

ALCALDÍA DE MONTERÍA OFICINA ASESORÍA JURÍDICA

CESIÓN DEL CONTRATO DE OBRA Nº LP-SPM-019-2022 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERÍA – CEDENTE: CONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE – CESIONARIO: C.C.P INGENIEROS S.A.S.

SÉPTIMA: Que el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 señala que los contratos estatales son *"intuito personae"* y en consecuencia una vez celebrados no pueden cederse sin previa autorización de la entidad contratante.

OCTAVA: Que la cláusula vigésima primera del Contrato de Obra Nº LP-SPM-019-2022, contempla la cesión así: *"CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. – CESIÓN: El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia."*

NOVENA: Que analizada la idoneidad del CESIONARIO, se encontró que es apto para que continúe con la ejecución del contrato y se acepta la Cesión de acuerdo con la Ley 80 de 1993, en su artículo 3, que define los fines de la contratación estatal, así: *"ARTÍCULO 3o. DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, **las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines."*** (negrilla y subraya fuera de texto).

DECIMA: Que es necesario para EL MUNICIPIO, que el objeto contractual se ejecute en su totalidad, por lo cual, analizadas las razones que impiden al CEDENTE, su continuidad, se procede a la cesión del contrato a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución al CESIONARIO **C.C.P INGENIEROS S.A.S** identificada con NIT. 901.595.820-4, en consideración a lo estipulado en el inciso 3° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y a la cláusula vigésima primera del contrato.

Que de conformidad con las anteriores consideraciones las partes proceden a la cesión del contrato conforme a las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA – AUTORIZACIÓN: mediante el presente documento EL MUNICIPIO, autoriza y acepta expresamente la cesión del contrato de Contrato de Obra Nº LP-SPM-019-2022, a favor de **C.C.P INGENIEROS S.A.S** identificada con NIT. 901.595.820-4.

CLAUSULA SEGUNDA – CESIÓN: EL CEDENTE: ceder a favor del **CESIONARIO,** el Contrato de Obra Nº LP-SPM-019-2022, con todos los derechos y obligaciones que del mismo se deriven.

CLAUSULA TERCERA: ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO: Que según el oficio de fecha 4 de julio de 2023 presentado por el CONSORCIO HIDRALMA en calidad de interventor del Contrato de Obra Nº LP-SPM-019-2022, y de acuerdo a lo manifestado en el informe semanal No 8, se presenta un avance físico de obra del 12.57% y no se ha emitido ninguna factura de cobro por lo que el avance financiero es del 0%.

CLAUSULA CUARTA – INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD: EL CESIONARIO, declara bajo gravedad de juramento que se entiende surtido con la firma de la cesión del contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad, conflicto de intereses o impedimento, señaladas en la constitución, la Ley, o normatividad vigente.

ALCALDÍA DE MONTERÍA
DESPACHO
ASESORÍA JURÍDICA

CESIÓN DEL CONTRATO DE OBRA Nº LP-SPM-019-2022 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERÍA – CEDENTE: CONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE – CESIONARIO: C.C.P INGENIEROS S.A.S.

CLAUSULA QUINTA– VIGENCIA: Las cláusulas del Contrato de Obra Nº LP-SPM-019-2022, objeto de la presente cesión conservan plena vigencia.

CLAUSULA SEXTA – GARANTÍA: EL CESIONARIO deberá constituir la respectiva garantía única, conforme a los términos estipulados en el ítem correspondiente a la configuración financiera – garantías que se encuentra referenciada en el formulario de condiciones de la Plataforma SECOP II y allegarla al MUNICIPIO, para su aprobación, dentro de los términos establecidos.

CLAUSULA SÉPTIMA – LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN: para todos los efectos legales a que hubiera lugar, se entenderá que la presente cesión de contrato se encuentra legalizada con la suscripción por las partes contratantes, inicia su ejecución con la aprobación de la garantía por parte del MUNICIPIO y la modificación en el registro presupuestal, para lo cual la secretaría de Infraestructura deberá enviar copia de la presente cesión a la Secretaría de Hacienda Municipal para los fines pertinentes.

Se firma en Montería a los, diez (10) días del mes de julio de 2023

CARLOS ALBERTO ORDOSGOITIA SANIN
Alcalde
MUNICIPIO DE MONTERÍA

Alcalde de MONTERÍA Gobierno de la GENTE

ANGÉLICA PATRICIA AVILEZ ARGEL
Representante
CONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE
NIT No. 901.647.860-3
EL CEDENTE

ELIANA MARGARITA OTERO PÉREZ
R/L C.C.P INGENIEROS S.A.S
NIT. 901.595.820-4
EL CESIONARIO

Proyectó: Monica Cantillo.- Abogada Contratista OAJ
Revisó Jurídicamente: Daniel Patrón.- Abogado Asesor SPM
Vo. Bo.: Karina Carrascal S – Jefe Oficina Asesora Jurídica

ALCALDÍA DE MONTERÍA OFICINA ASESORA JURÍDICA

ACTA DE SUSPENSIÓN DE OBRA No. 01

CONTRATO No:	LP - SPM - 019 - 2022
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE, Rep. legal Angelica Patricia Avilez Argel
OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LOS BARRIOS PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
VALOR:	CUATRO MIL ONCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE ($4.011.661.268,00).
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIO 1:	27 DE FEBRERO DE 2023
FECHA FINAL INICIAL:	27 DE JUNIO DE 2023
FECHA PRESENTE ACTA:	28 DE ABRIL DE 2023

En la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Montería, Departamento de Córdoba, a los veintiocho (28) días del mes de Abril del año 2023 y estando vigente el Contrato de Obra identificado en el encabezamiento de la presente Acta, se reunieron: La Secretaria de Infraestructura Municipal **MÓNICA SEVERICHE NÚÑEZ**, la firma interventora de Obra **CONSORCIO HIDRALMA** Representado por **ALVARO HERNANDO VERA AYALA** y el Contratista de obra **CONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE** Representado por **ANGÉLICA PATRICIA AVILEZ ARGEL** con el propósito de suscribir la presente Acta de suspensión del contrato de obra LP- SPM - 019 - 2022, de acuerdo a las observaciones expuesta a continuación:

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 0571 de fecha 21 de julio de 2022 El Municipio de Montería, Departamento de Córdoba abrió el Proceso de Contratación número LP-SPM-019-2022, cuyo objeto reza *"MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"*.

Que mediante Resolución No. 0828 del 10 de octubre de 2022 la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista **CONSCONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE** identificado con NIT 901647860–3.

Que en fecha 27 de febrero de 2023, se reunieron la Secretaria de Infraestructura Municipal **MÓNICA SEVERICHE NÚÑEZ**, la firma interventora de Obra **CONSORCIO HIDRALMA** Representado por **ALVARO HERNANDO VERA AYALA** y el Contratista de obra **CONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE** Representado por **ANGÉLICA PATRICIA AVILEZ ARGEL** a fin de suscribir Acta de Inicio del Contrato de Obra LP- SPM - 019 – 2022.

Que mediante oficio N° 008-2023-CPN, ANGÉLICA MARÍA AVILEZ ARGEL actuando en calidad de representante Legal del **CONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE**, notifica al Municipio de Montería, el fallecimiento del señor **ALEXANDER THEVENING GARCES** identificado con cedula de ciudadanía N°72.148.565 expedida en Barranquilla, deceso que ocurrió el día 3 de abril de 2023 como consta en el Registro Civil de Defunción Serial No. 11593246 integrante del **CONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE** con participación del 90%.

Que, de igual forma, mediante oficio N° 008-2023-CPN fue notificado por parte de **CONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE** a la firma Interventora **CONSORCIO HIDRALMA** identificada con NIT. 901.653.836-0, con ocasión a las obligaciones que le asisten dentro del contrato de interventoría CMA-SPM-022-2022.

Que mediante oficio N° 012 y N° 013 adiado 27 de abril de 2023, ALVARO HERNANDO VERA AYALA en calidad de Representante Legal de **CONSORCIO HIDRALMA** notifica a esta Secretaria Cese de actividades por parte del Contratista y emite pronunciamiento frente a la Suspensión del Contrato de Obra LP-SPM-019-2022.

Que conforme a lo establecido en el artículo 7 numeral 6 de la Ley 80 de 1993, dentro de un consorcio, los consorciados son solidariamente responsables de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman.

Que en consecuencia de lo anterior y con fundamento a la muerte de uno de los miembros del consorcio, el municipio de Montería con fundamento en el principio de autonomía de la voluntad se ve en la necesidad de revisar jurídicamente la situación acontecida a fin de tomar una decisión frente al Contrato de obra suscrito.

Es así que, mediante oficio SIM - 151 – 2023 la Secretaría de Infraestructura Municipal remitió a la oficina jurídica del Municipio de Montería para su revisión los documentos allegados por parte de **CONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE.**

Que, en virtud de las consideraciones expuestas, las partes

ACUERDAN

PRIMERO: Realizar la suspensión del contrato de obra No. LP-SPM-019-2022 hasta tanto, se revise jurídicamente las circunstancias considerada por la Administración para la menciona suspensión.

Para constancia de la presente Acta se firma por los que en ella intervinieron,

ANGELICA PATRICIA AVILEZ ARGEL
CONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE
CONTRATISTA

ALVARO HERNANDO VERA AYALA
CONCORCIO HIDRALMA
INTERVENTOR

MÓNICA SEVERICHE NÚÑEZ
Secretaria de Infraestructura

Elaboró: Jorge Sotomayor – Contratista SIM
Revisado para firma por: Patricia Sánchez – Contratista SIM
Marggy Noguera – Contratista SIM

Quienes proyectamos y revisamos declaramos que el documento lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

ACTA DE REINCIO No. 1

CONTRATO N°	LP - SPM - 019 - 2022
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE, Rep. legal Angélica Patricia Aviléz Argel
OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LOS BARRIOS PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
VALOR:	CUATRO MIL ONCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE ($4.011.661.268,00).
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIO:	27 DE FEBRERO DE 2023
SUSPENSIÓN 1:	28 ABRIL DE 2023
FECHA PRESENTE ACTA:	10 DE JULIO DE 2023

En la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Montería, Departamento de Córdoba, a los DIEZ (10) días del mes de JULIO del año 2023, y estando suspendido el Contrato de Obra identificado en el encabezamiento de la presente Acta, se reunieron: la Secretaria de Infraestructura Municipal **IRIS SPATH CAMAÑO**, el interventor CONSORCIO HIDRALMA representado legalmente por **ALVARO VERA AYALA** y el contratista CONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE, representado legalmente de **ANGELICA AVILEZ ARGEL** con el propósito de dar reinicio al contrato de obra **LP-SPM-019-2022**, de acuerdo a las siguientes:

CONSIDERACIONES

Que mediante Resolución No. 0571 de fecha 21 de julio de 2022 El Municipio de Montería, Departamento de Córdoba abrió el Proceso de Contratación número LP-SPM-019-2022, cuyo objeto reza "*MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA*".

Que mediante Resolución No. 0828 del 10 de octubre de 2022 la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista **CONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE** identificado con NIT 901647860-3.

Que en fecha 27 de febrero de 2023, se reunieron la Secretaria de Infraestructura Municipal del momento **MÓNICA SEVERICHE NÚÑEZ**, la firma interventora de Obra **CONSORCIO HIDRALMA** Representado por **ALVARO HERNANDO VERA AYALA** y el Contratista de obra **CONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE** Representado por **ANGÉLICA PATRICIA AVILEZ ARGEL** a fin de suscribir Acta de Inicio del Contrato de Obra LP - SPM - 019 – 2022.

Que mediante oficio N° 008-2023-CPN, ANGÉLICA MARIA AVILEZ ARGEL actuando en calidad de representante Legal del **CONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE**, notifica al Municipio de Montería, el fallecimiento del señor **ALEXANDER THEVENING GARCES** identificado con cedula de ciudadanía N°72.148.565 expedida en Barranquilla, deceso que ocurrió el día 3 de abril de 2023 como consta en el Registro Civil de Defunción Serial No. 11593246 integrante del **CONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE** con participación del 90%.

Que, de igual forma, mediante oficio N° 008-2023-CPN fue notificado por parte de **CONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE** a la firma Interventora **CONSORCIO HIDRALMA** identificada con NIT. 901.653.836-0, con ocasión a las obligaciones que le asisten dentro del contrato de interventoría CMA-SPM-022-2022.

Que mediante oficio N° 012 y N° 013 adiado 27 de abril de 2023, ALVARO HERNANDO VERA AYALA en calidad de Representante Legal de **CONSORCIO HIDRALMA** notifica a esta Secretaria Cese de actividades por parte del Contratista **y** emite pronunciamiento frente a la Suspensión del Contrato de Obra LP-SPM-019-2022.

Que conforme a lo establecido en el artículo 7 numeral 6 de la Ley 80 de 1993, dentro de un consorcio, los consorciados son solidariamente responsables de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman.

Que en consecuencia de lo anterior y con fundamento a la muerte de uno de los miembros del consorcio, el municipio de Montería con fundamento en el principio de autonomía de la voluntad se ve en la necesidad de revisar jurídicamente la situación acontecida a fin de tomar una decisión frente al Contrato de obra suscrito.

Que mediante oficio SIM - 151 – 2023 la Secretaría de Infraestructura Municipal remitió a la oficina jurídica del Municipio de Montería para su revisión los documentos allegados por parte de **CONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE.**

Que mediante acta No 1 de fecha 28 de abril de 2023 se suspendió el contrato LP-SPM-019-2022 con ocasión a lo antes referido.

Que la Señora ANGELICA AVILEZ ARGEL, representante legal del CONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE mediante oficio No 010-2023 CPN del 30 de mayo de 2023, solicitó al Municipio de Montería la autorización de cesión total de los derechos técnicos, jurídicos y financieros del contrato de obra LP-SPM-019-2022 favor de la empresa C.C.P ingenieros S.A.S.

Que mediante cesión del contrato LP-SPM-019-2022 de fecha 10 de julio de 2023, el municipio de monte ría autoriza y acepta expresamente la cesión del contrato de obra a favor de C.C.P ingenieros S.A.S. identificado con Nit 901.595.820-4

ACUERDAN

PRIMERO: Teniendo en cuenta la superación de los impases que generaron la suspensión ya mencionada, reiniciar el contrato de obra No. LP-SPM-019-2022. Cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LOS BARRIOS PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN ELMUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA." a partir del 10 de julio de 2023, con el fin de dar cumplimiento a todas las obligaciones establecidas en la minuta del contrato y conforme a que se realizaron los trámites jurídicos necesarios para la debida ejecución del contrato referido.

SEGUNDO: El contratista se compromete a presentar para su aprobación los certificados de modificación de la garantía única y el seguro constituidos en los cuales se tenga en cuenta la nueva fecha de vencimiento del plazo contractual

Para constancia de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron,

ANGELICA AVILEZ ARGEL
CONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE
Contratista De Obra

ALVARO VERA AYALA
CONSORCIO HIDRALMA
Contratista de Interventoría

IRIS SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura
Municipio de Montería

Proyectado por: = Apoyo a la Supervisión SIM

C.C.P
INGENIEROS S.A.S

Copia RUT (actualizado)

Dirección: Carrera 6 No. 65-24
Email: ccpconstrucciones22@gmail.com
Montería, Córdoba - Colombia

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14871162233

(415)7707212489984(8020) 000001487116223 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 9 5 8 2 0	4	Impuestos y Aduanas de Montería 1 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
C.C.P INGENIEROS S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	Montería 0 0 1

41. Dirección principal
CR 6 65 24 OF 331

42. Correo electrónico CCPCONSTRUCCIONES22@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 1 4 4 4 1 6 7 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 2 0 5 1 3	4 2 1 0	2 0 2 2 0 5 1 3	4 1 1 2	7 1 1 2		0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha 2022-10-25 17:35:36

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre OTERO PEREZ ELIANA MARGARITA
985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14871162233

(415)7707212489984(8020) 000001487116223 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 9 5 8 2 0	4	Impuestos y Aduanas de Montería	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o Institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 2 2 0 3 1 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 2 0 5 1 8	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 1 9 7 6 4 2	
78. Departamento	2 3	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 2 0 5 1 8
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 2 0 5 1 3		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14871162233

(415)7707212489984(8020) 000001487116223 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 9 5 8 2 0	4	Impuestos y Aduanas de Montería	1 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 5 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 6 4 9 8 5 6 6 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
OTERO	PEREZ	ELIANA	MARGARITA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 0 5 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 1 2 8 2 6 8 0 9 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AVILEZ	PADILLA	ANGELA	MARIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

C.C.P
INGENIEROS S.A.S

COPIA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA

Dirección: Carrera 6 No. 65-24
Email: ccpconstrucciones22@gmail.com
Montería, Córdoba - Colombia

Cámara de Comercio de Montería
Para Córdoba!

CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 13/08/2023 - 15:18:53
Recibo No. S000867490, Valor 7200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN r6WEQxv5MB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=22 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : C.C.P INGENIEROS S.A.S
Nit : 901595820-4
Domicilio: Montería, Córdoba

MATRÍCULA

Matrícula No: 197642
Fecha de matrícula: 18 de mayo de 2022
Ultimo año renovado: 2023
Fecha de renovación: 08 de febrero de 2023
Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CR 6 65 24 OF 331 - Otro
Municipio : Montería, Córdoba
Correo electrónico : ccpconstrucciones22@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3014441670
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CR 6 65 24 OF 331 - Otro
Municipio : Montería, Córdoba
Correo electrónico de notificación : ccpconstrucciones22@gmail.com
Teléfono para notificación 1 : 3014441670
Teléfono notificación 2 : No reportó.
Teléfono notificación 3 : No reportó.

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado del 18 de marzo de 2022 del Accionista Único de Monteria, inscrito en esta Cámara de Comercio el 18 de mayo de 2022, con el No. 56561 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada C.C.P INGENIEROS S.A.S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

Objeto Social: La sociedad tendrá como objeto: construcción, mejoramiento, mantenimiento, adecuación, estudio y levantamiento topográfico, diseños, saneamiento básico, planeación, interventoría y consultorías de: obras civiles para entidades del sector público y privado, infraestructura vial, estabilización de suelos, edificaciones, edificaciones institucionales, edificaciones culturales, edificios privados, cerramientos, estructuras metálicas, centros culturales, bibliotecas, hospitales, edificaciones comerciales, centros comerciales, viviendas, viviendas de interes social, obras de urbanismo, obras de espacio público, parques, escenarios deportivos, puntes vehiculares y peatonales, puertos, pistas de aeropuerto, viaductos, túmeles, sistemas de acueducto, sistemas de alcantarillado, unidades sanitarias, infraestructura fluvial, sistemas de riesgo, obras hidráulicas, canales, degrado de canales, limpieza de canales, obras eléctricas, obras de control erosión, espolones, gaviones, balsacreto, colcha gaviones, obras de protección de taludes, muros de contención, obras de control de inundaciones, obras de manejo ambiental, diques, presas, terraplenes, jarrillones, movimientos de tierra y todo lo relacionado con el desarrollo de actividades de ingeniería civil, arquitectura, ingeniería eléctrica, ingeniería sanitaria y ambiental, geología, hidrología. actividades relacionadas con la prestación de servicios públicos domiciliarios como acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas, combustible, telefonía pública, básica conmutada t telefonía móvil. actividades relacionadas con los servicios de de mantenimiento de inmuebles a entidades públicas y privadas, actividades relacionadas con la construcción, ingenierías, consultorías e interventorías en proyectos de salud, educación, saneamiento básico, vías, aeropuertos, vías, puentes, gaviones, movimientos de tierra y sus conexidades. además la compraventa, arriendo, administración de bienes muebles e inmuebles, así mismos podrá prestar los servicios de arrendamiento de equipos de construcción, suministro de materiales para la construcción y materiales eléctricos, también podrá instalar, cosntruir, manejar, comprar y vender todo tipo de materiales eléctricos y sus partes en obras civiles, montaje de sistemas eléctricos y de iluminación, actividades relacionadas con la distribución. arrendamiento de maquinaria y transporte de materiales para construcción, señalización de carreteras y vías. construcción mecánica y eléctrica de instalaciones insdustriales; montaje y mantenimiento preventivo y corecctivo de sistemas de refrigeración, y sus componentes mecánicos y eléctricos; construcción y montaje de obras para la generación de energía eléctrica, construcción de líneas de trasmisión eléctrica; construcción y montaje de subestaciones eléctricas en todos los niveles de tensión; construcción de redes de distribución de energía eléctrica en todos los niveles de tensión, consultoría de estudios y diseños de arquitectura, ingeniería civil, ambiental, mecánica, eléctriva; consultoría e interventoría de construccón de obras; consultoría en gerencia de proyectos; consultoría en asesorías, asesorías contables y financieras, asesorías y consultorías en desarrollo de proyectos, asesorías y consultorías en la implementación, mantenimiento y mejora de sistemas de gestión de calidad; diseño y fabriacación de productos metálicos para su para usu estructural, diseños y desarrollo de programas de mantenimiento de maquinarias y equipos mecánicos, eléctricos, electromecánicos y biomedicos, diagnostico de problemas en maquinaria y equipos, mejoramiento de maquinaria y equipos; desarrollo de proyectos educativos, pisicultura, horticultura,hidroponia y acuaponía, ganadería tecnificada, especies menores, silvicultura, planes de manejo agropecuario integrado con visón sostenible, gestión ambiental, conversión a sistemas de producción ecológica y acceso a mercados verdes, maneho integral de vertimientos, residuos solidos, bioremediación de agua, aire y suelos, suministro y comercialización de artículos para oficina; administración y suministro de vehículos de transporte y maquinaria pesada, suministro de seguridad y protección, diseños y construcción de redes eléctricas, suministro y construcción de insumos eléctricos, diseño y construcción de redes informáticas. En el desarrollo del mismo podrá la sociedad ejecutar todos los actos o contratos que fueren convenientes o necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto mencionado. Así mismo, en

virtud de la Ley 1258 de 2008 podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias.

CAPITAL

	* CAPITAL AUTORIZADO *
Valor	$ 1.500.000.000,00
No. Acciones	1.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 1.500.000,00
	* CAPITAL SUSCRITO *
Valor	$ 1.500.000.000,00
No. Acciones	1.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 1.500.000,00
	* CAPITAL PAGADO *
Valor	$ 1.500.000.000,00
No. Acciones	1.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 1.500.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

Administración y Representación Legal: Representación Legal. - La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien tendrá un suplente, este suplente tendrá los mismos derechos y obligaciones del representante legal principal en caso de que este NO pueda ejercer el cargo por cualquier motivo. El representante legal principal y el representante legal suplente serán designados por run término de un (1) año por la asamblea general de accionistas, las funciones del Representante legal principal y suplente serán las siguientes: 1- Representar jurídicamente a la sociedad por acciones simplificada ante todo ente de control. 2- Realizar todas las diligencias comerciales a que da lugar la creación de la sociedad, tales como registro mercantil, impuestos y demás obligaciones generadas. 3- Citar a juntas ordinarias y extraordinarias cuando sea necesario y como están en los mismos estatutos. 4- Velar por el buen funcionamiento civil, fiscal y financiero de la sociedad, es decir, que todos los actos realizados se hagan enmarcados en ámbito legal. 5- Asistir a las reuniones e invitaciones q reciba la sociedad de carácter comercial y jurídico. 6- Las demás funciones que genere la representación legal de una sociedad por acciones simplificada. Las funciones del representante legal principal y suplente terminarán en caso de dimisión o revocación por parte de la asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad en aquellos casos en que el representante legal sea una persona natural y en caso de liquidación privada o judicial, cuando el representante legal sea una persona jurídica. La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del Representante legal. - La sociedad será gerenciada y administrada ante terceros

por el Representante legal quien podrá ser accionista o NO y será nombrado por la asamblea de accionistas, quien NO tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el Representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. Representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el Representante legal.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por documento privado del 18 de marzo de 2022 del Accionista Único, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 18 de mayo de 2022 con el No. 56561 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	ELIANA MARGARITA OTERO PEREZ	C.C. No. 1.064.985.667
SUPLENTE	ANGELA MARIA AVILEZ PADILLA	C.C. No. 1.128.268.092

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 003 del 18 de mayo de 2023 de la Asamblea General De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 01 de junio de 2023 con el No. 60457 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL	LINA PAOLA AGUIRRE SOTO	C.C. No. 1.067.289.288	248873-T

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERIA, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

Por documento privado del 13 de mayo de 2022 de la Accionista Unico Controlante , inscrito en esta Cámara de Comercio el 18 de mayo de 2022, con el No. 56562 del Libro IX, se inscribió la comunicación que se ha configurado una situación de control : Situacion de control subordinada.
** **EMPRESA MATRIZ / CONTROLANTE** : CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA

Identificación: 30685544
Nacionalidad: Colombiano/a
Domicilio: 23001 - Monteria
Dirección : Cra 15 n. 54-31 Apto 201
País: Colombia
Descripción de la actividad: INGENIERIA CIVIL
Fecha de configuración de la situación: 18/05/2022
Presupuesto que da lugar a la situación de control y/o al grupo empresarial: Por tener más del 50% del capital de la subordinada: "numeral 1 Artículo 261 Código de Comercio".

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: F4290
Actividad secundaria Código CIIU: F4210
Otras actividades Código CIIU: F4112 M7112

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $4.152.033.655,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4290.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA - REPORTE A ENTIDADES

INFORMACION COMPLEMENTARIA a. Que los datos del empresario y/o establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES. b. Se realizo la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificación Tributaria (RIT) Este certificado refleja la situación jurídica registral de la persona natural, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su

Cámara de Comercio de Montería
Para Colombia

CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 13/08/2023 - 15:18:53
Recibo No. S000867490, Valor 7200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN r6WEQxv5MB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=22 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERIA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.



SANDRA SIERRA BUELVAS

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

C.C.P
INGENIEROS S.A.S

JURIDICO

Dirección: Carrera 6 No. 65-24
Email: ccpconstrucciones22@gmail.com
Montería, Córdoba - Colombia

C.C.P
INGENIEROS S.A.S

Declaración Juramentada de pagos de seguridad social y aportes parafiscales. Firmada por el Representante

Dirección: Carrera 6 No. 65-24
Email: ccpconstrucciones22@gmail.com
Montería, Córdoba - Colombia

C.C.P
INGENIEROS S.A.S

DECLARACION JURAMENTADA

Montería, septiembre 14 de 2023

Señores
Alcaldía de Montería
Montería

Asunto: Declaración juramentada del pago de salarios, seguridad social y aportes parafiscales.

Yo, ELIANA MARGARITA OTERO PEREZ, identificado como aparece al pie de mi firma, en representación de la empresa C.C.P INGENIEROS S.A.S, Nit: 901.595.820-4 , declaro bajo la gravedad de juramento que he cumplido y me encuentro al día con mis obligaciones provenientes del pago en materia de salarios, seguridad social del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje; A la fecha todo el personal propuesto, se encuentra afiliado como se detalla a continuación:

Planilla No.	Periodo cotizado	Valor de la Planilla	Cargo	Salud	Pensión	ARL	CCF, Sena, ICBF
9448714898	Febrero	$340.600	Director	Salud total	Colpensiones	Colpatria	ok
9448714898	Febrero	$123.900	Residente 1	Nueva EPS	Porvenir	Colpatria	ok
9448714898	Febrero	$123.900	Residente 2	Salud total	Colpensiones	Colpatria	ok
9448714898	Febrero	$123.900	Inspector de obra 1	Nueva EPS	Porvenir	Colpatria	ok
9448714898	Febrero	$123.900	Inspector de obra 2	Mutual Ser	Porvenir	Colpatria	ok
9448714898	Febrero	$229.200	Ingeniero con postgrado en vías	Nueva EPS	Porvenir	Colpatria	ok
9448714898	Febrero	$240.100	Ingeniero residente eléctrico	Salud total	Colfondos	Colpatria	ok
9448714898	Febrero	$229.200	Ingeniero con postgrado en Geotecnia	Sanitas	Colfondos	Colpatria	ok

9448714898	Febrero	$153.000	Ingeniero con postgrado ambiental	Nueva EPS	Porvenir	Colpatria	ok
9448714898	Febrero	$115.800	Trabajadora social	Nueva EPS	Porvenir	Colpatria	ok
9448714898	Febrero	$115.800	Profesional Sisoma	Salud total	Protección	Colpatria	ok
9448714898	Febrero	$123.900	Topógrafo 1	Nueva EPS	Porvenir	Colpatria	ok
9448714898	Febrero	$123.900	Topógrafo 2	Nueva EPS	Porvenir	Colpatria	ok
9448714898	Febrero	$103.400	Cadenero 1	Cajacopi	Porvenir	Colpatria	ok
9448714898	Febrero	$72.000	Cadenero 2	Salud total	Colfondos	Colpatria	ok
9448714898	Febrero	$72.000	Cadenero 3	Nueva EPS	Porvenir	Colpatria	ok
9448714898	Febrero	$34.800	Cadenero 4	Nueva EPS	Porvenir	Colpatria	ok
9448714898	Febrero	$82.700	Maestro de obra 1	Mutual Ser	Porvenir	Colpatria	ok
9448714898	Febrero	$123.900	Maestro de obra 2	Nueva EPS	Porvenir	Colpatria	ok
9448714898	Febrero	$74.400	Almacenista	Nueva EPS	Protección	Colpatria	ok
9448714898	Febrero	$71.200	Vigilante	Mutual Ser	Porvenir	Colpatria	ok
9448714898	Febrero	$72.000	Secretaria	Salud total	Porvenir	Colpatria	ok
9448714898	Febrero	$107.500	Auxiliar contable	Salud total	Protección	Colpatria	ok
9448714898	Febrero	$74.400	Abogado	Salud total	Protección	Colpatria	ok
9448714898	Febrero	$72.000	Conductor	Suraméri ca	Porvenir	Colpatria	ok
9448714898	Febrero	$72.000	Mensajero	Mutual Ser	Porvenir	Colpatria	ok

Planilla No.	Periodo cotizado	Valor de la Planilla	Cargo	Salud	Pensión	ARL	CCF, Sena, ICBF
9449698295	Marzo	$1.157.800	Director	Salud total	Colpensiones	Colpatria	ok
9456270265	Marzo	$928.000	Residente 1	Nueva EPS	Porvenir	Colpatria	ok
9456270265	Marzo	$928.000	Residente 2	Salud total	Colpensiones	Colpatria	ok
9449698295	Marzo	$619.200	Inspector de obra 1	Nueva EPS	Porvenir	Colpatria	ok
9449698295	Marzo	$619.200	Inspector de obra 2	Mutual Ser	Porvenir	Colpatria	ok
9449698295	Marzo	$515.800	Ingeniero con postgrado en vías	Nueva EPS	Porvenir	Colpatria	ok
9456270313	Marzo	$515.800	Ingeniero residente eléctrico	Salud total	Colfondos	Colpatria	ok
9449698295	Marzo	$343.700	Ingeniero con postgrado en Geotecnia	Sanitas	Colfondos	Colpatria	ok
9449698295	Marzo	$1.145.600	Ingeniero con postgrado ambiental	Nueva EPS	Porvenir	Colpatria	ok
9449698295	Marzo	$866.900	Trabajadora social	Nueva EPS	Porvenir	Colpatria	ok
9449698295	Marzo	$866.900	Profesional Sisoma	Salud total	Protección	Colpatria	ok
9449698295	Marzo	$619.200	Topógrafo 1	Nueva EPS	Porvenir	Colpatria	ok
9449698295	Marzo	$619.200	Topógrafo 2	Nueva EPS	Porvenir	Colpatria	ok
9449698295	Marzo	$359.200	Cadenero 1	Cajacopi	Porvenir	Colpatria	ok
9449698295	Marzo	$359.200	Cadenero 2	Salud total	Colfondos	Colpatria	ok
9449698295	Marzo	$359.200	Cadenero 3	Nueva EPS	Porvenir	Colpatria	ok
9449698295	Marzo	$173.600	Cadenero 4	Nueva EPS	Porvenir	Colpatria	ok
9456270265	Marzo	$2.000.000	Maestro de obra 1	Mutual Ser	Porvenir	Colpatria	ok

9449698295	Marzo	$619.200	Maestro de obra 2	Nueva EPS	Porvenir	Colpatria	ok
9449698295	Marzo	$371.600	Almacenista	Nueva EPS	Protección	Colpatria	ok
9449698295	Marzo	$359.200	Secretaria	Salud total	Porvenir	Colpatria	ok
9456270313	Marzo	$359.200	Auxiliar contable	Salud total	Protección	Colpatria	ok
9449698295	Marzo	$359.200	Abogado	Salud total	Protección	Colpatria	ok
9449698295	Marzo	$359.200	Conductor	Suramérica	Porvenir	Colpatria	ok
9456270265	Marzo	$1.200.000	Vigilante	Mutual Ser	Porvenir	Colpatria	ok
9449698295	Marzo	$359.200	Mensajero	Mutual Ser	Porvenir	Colpatria	ok

Planilla No.	Periodo cotizado	Valor de la Planilla	Cargo	Salud	Pensión	ARL	CCF, Sena, ICBF
9456270469	Abril	$1.640.900	Director	Salud total	Colpensiones	Colpatria	ok
9452916284	Abril	$866,900	Residente 1	Nueva EPS	Porvenir	Colpatria	ok
9456270469	Abril	$866,900	Residente 2	Salud total	Colpensiones	Colpatria	ok
9452916284	Abril	$578,100	Inspector de obra 1	Nueva EPS	Porvenir	Colpatria	ok
9452916284	Abril	$578,100	Inspector de obra 2	Mutual Ser	Porvenir	Colpatria	ok
9456270469	Abril	$481.700	Ingeniero con postgrado en vías	Nueva EPS	Porvenir	Colpatria	ok
9456270469	Abril	$481.700	Ingeniero residente eléctrico	Salud total	Colfondos	Colpatria	ok
9452916284	Abril	$1,069,400	Ingeniero con postgrado ambiental	Nueva EPS	Porvenir	Colpatria	ok
9456270469	Abril	$481.700	Ingeniero con postgrado en Geotecnia	Sanitas	Colfondos	Colpatria	ok
9452916284	Abril	$809,300	Trabajadora social	Nueva EPS	Porvenir	Colpatria	ok
9452916284	Abril	$809,300	Profesional Sisoma	Salud total	Protección	Colpatria	ok

9452916284	Abril	$578,100	Topógrafo 1	Nueva EPS	Porvenir	Colpatria	ok
9452916284	Abril	$578,100	Topógrafo 2	Nueva EPS	Porvenir	Colpatria	ok
9456270469	Abril	$481.700	Cadenero 1	Cajacopi	Porvenir	Colpatria	ok
9452916284	Abril	$335,500	Cadenero 2	Salud total	Colfondos	Colpatria	ok
9452916284	Abril	$335,500	Cadenero 3	Nueva EPS	Porvenir	Colpatria	ok
9452916284	Abril	$162,200	Cadenero 4	Nueva EPS	Porvenir	Colpatria	ok
9456270469	Abril	$578,100	Maestro de obra 1	Mutual Ser	Porvenir	Colpatria	ok
9452916284	Abril	$578,100	Maestro de obra 2	Nueva EPS	Porvenir	Colpatria	ok
9456270469	Abril	$751.400	Auxiliar contable	Salud total	Protección	Colpatria	ok
9452916284	Abril	$346,800	Almacenista	Nueva EPS	Protección	Colpatria	ok
9456270469	Abril	$346,800	Vigilante	Mutual Ser	Porvenir	Colpatria	ok
9452916284	Abril	$335,500	Secretaria	Salud total	Porvenir	Colpatria	ok
9456270469	Abril	$346,800	Abogado	Salud total	Protección	Colpatria	ok
9452916284	Abril	$335,500	Conductor	Suramérica	Porvenir	Colpatria	ok
9452916284	Abril	$335,500	Mensajero	Mutual Ser	Porvenir	Colpatria	ok

Planilla No.	Periodo cotizado	Valor de la Planilla	Cargo	Salud	Pensión	ARL	CCF, Sena, ICBF
9454824113	julio	$1.192.200	Director	Nueva EPS	Colpensiones	SURA	ok
9454824113	julio	$650.200	Residente 1	Nueva EPS	Colfondos	SURA	ok
9454824113	julio	$650.200	Residente 2	Salud total	Colpensiones	SURA	ok
9454824113	julio	$433.500	Inspector de obra 1	Nueva EPS	Porvenir	SURA	ok
9454824113	julio	$433.500	Inspector de obra 2	Sanitas	Colpensiones	SURA	ok
9454824113	julio	$251.600	Ingeniero con postgrado en vías	Nueva EPS	Porvenir	SURA	ok
9454824113	julio	$251.600	Ingeniero residente eléctrico	Salud Total	Colpensiones	SURA	ok

9454824113	julio	$251.600	Ingeniero con postgrado en Geotecnia	Sanitas	Colpensiones	SURA	ok
9454824113	julio	$801.900	Ingeniero con postgrado ambiental	Nueva EPS	Colpensiones	SURA	ok
9454824113	julio	$606.900	Trabajadora social	Mutual Ser	Porvenir	SURA	ok
9454824113	julio	$606.900	Profesional Sisoma	Salud total	Porvenir	SURA	ok
9454824113	julio	$433.500	Topógrafo 1	Mutual Ser	Porvenir	SURA	ok
9454824113	julio	$433.500	Topógrafo 2	Nueva EPS	Protección	SURA	ok
9454824113	julio	$251.600	Cadenero 1	Nueva EPS	Porvenir	SURA	ok
9454824113	julio	$251.600	Cadenero 2	Mutual Ser	Porvenir	SURA	ok
9454824113	julio	$251.600	Cadenero 3	Mutual Ser	Porvenir	SURA	ok
9454824113	julio	$251.600	Cadenero 4	Mutual Ser	Porvenir	SURA	ok
9454824113	julio	$433.500	Maestro de obra 1	Salud total	Porvenir	SURA	ok
9454824113	julio	$433.500	Maestro de obra 2	Nueva EPS	Porvenir	SURA	ok
9454824113	julio	$260.100	Almacenista	Nueva EPS	Protección	SURA	ok
9454824113	julio	$260.100	Vigilante	Salud Total	Colfondos	SURA	ok
9454824113	julio	$251.600	Secretaria	Salud total	Porvenir	SURA	ok
9454824113	julio	$251.600	Auxiliar contable	Nueva EPS	Porvenir	SURA	ok
9454824113	julio	$251.600	Abogado	Sanitas	Protección	SURA	ok
9454824113	julio	$260.100	Conductor	Sanitas	Colpensiones	SURA	ok
9454824113	julio	$251.600	Mensajero	Salud total	Porvenir	SURA	ok

C.C.P
INGENIEROS S.A.S

Se adjunta soporte de pago.

Atentamente,

Eliana Otero P

C.C.P INGENIEROS S.A.S
ELIANA MARGARITA OTERO PEREZ
C.C. N° 1.064.985.667 de Cereté

Dirección: Carrera 6 No. 65-24
Email: ccpconstrucciones22@gmail.com
Montería, Córdoba - Colombia

C.C.P
INGENIEROS S.A.S

CERTIFICADO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL POR LA INTERVENTORIA

Dirección: Carrera 6 No. 65-24
Email: ccpconstrucciones22@gmail.com
Montería, Córdoba - Colombia

EL SUSCRITO INTERVENTOR DEL CONTRATO DE OBRA N° LP-SPM-019 DE 2022

INICIADO EL 27 DE FEBRERO DE 2023

CERTIFICA QUE,

Las obras ejecutadas por la empresa C.C.P INGENIEROS S.A.S identificado con Nit 901.595.820-4, representado por ELIANA MARGARITA OTERO PEREZ, con cedula de ciudadanía número 1.064.985.667 expedida en Cereté; presentan a detalle el siguiente avance de obra:

% de Avance acumulado Programado durante el periodo del 27/02/2023 hasta 18/08/2023	% de Avance acumulado Ejecutado durante el periodo del 27/02/2023 hasta 18/08/2023
27,14%	29,98%

Por lo que esta Interventoría recibe a satisfacción las obras del porcentaje indicado anteriormente. De igual forma el contratista de obra ha cumplido con el pago en materia de salarios y seguridad social. Así como la inscripción y los pagos de los aportes parafiscales, aportes de seguridad social, salud, pensiones y riesgos laborales del personal propuesto en obra.

PLANILLAS N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO
1984222256	Carmen Romero	Director de Obra
1984222256	Antonio Ardila	Residente de obra 1
1984222256	Eduardo Gómez	Residente de obra 2
1984222256	Luis Morales	Inspector de obra 1

1984222256	José Padilla	Inspector de obra 2
1984222256	Dayane Obaji	Ingeniero con postgrado en Vías
1984222256	Carlos Hernández	Ingeniero residente eléctrico
1984222256	Gustavo Royett	Ingeniero con postgrado Geotecnia
1984222256	Angelica Avilez	Ingeniero con postgrado ambiental
1984222256	Arlenys Assias	Trabajadora social
1984222256	Ayda Espitia	Profesional Sisoma
1984222256	Ronal Almanza	Topógrafo 1
1984222256	Edwin Montes	Topógrafo 2
1984222256	Félix Misas	Cadenero 1
1984222256	Erny Urango	Cadenero 2
1984222256	Dionisio López	Cadenero 3
1984222256	Jorge Viloria	Cadenero 4
1984222256	Gabriel Gonzales	Maestro de obra 1
1984222256	Eduardo Melendrez	Maestro de obra 2
1984222256	Jader Spir	Almacenista
1984222256	Yoni Murillo	Vigilante
1984222256	Lauren Flórez	Secretaria
1984222256	Maira Gonzales	Auxiliar contable
1984222256	Dalim Martinez	Abogado
1984222256	Albeiro Avilez	Conductor
1984222256	Moisés Torres	Mensajero

PLANILLAS N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO
9449698295	Carmen Romero	Director de Obra
9449698295	Antonio Ardila	Residente de obra 1
9449698295	Eduardo Gómez	Residente de obra 2
9449698295	Luis Morales	Inspector de obra 1
9449698295	José Padilla	Inspector de obra 2
9449698295	Dayane Obaji	Ingeniero con postgrado en Vías
9449698295	Carlos Hernández	Ingeniero residente eléctrico
9449698295	Gustavo Royett	Ingeniero con postgrado Geotecnia
9449698295	Angelica Avilez	Ingeniero con postgrado ambiental
9449698295	Arlenys Assias	Trabajadora social
9449698295	Ayda Espitia	Profesional Sisoma
9449698295	Ronal Almanza	Topógrafo 1
9449698295	Edwin Montes	Topógrafo 2
9449698295	Félix Misas	Cadenero 1
9449698295	Erny Urango	Cadenero 2
9449698295	Dionisio López	Cadenero 3
9449698295	Jorge Viloria	Cadenero 4
9449698295	Gabriel Gonzales	Maestro de obra 1
9449698295	Eduardo Melendrez	Maestro de obra 2
9449698295	Jader Spir	Almacenista
9449698295	Yoni Murillo	Vigilante
9449698295	Lauren Flórez	Secretaria

9449698295	Maira Gonzales	Auxiliar contable
9449698295	Dalim Martinez	Abogado
9449698295	Albeiro Avilez	Conductor
9449698295	Moisés Torres	Mensajero

PLANILLAS N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO
9452916284	Carmen Romero	Director de Obra
9452916284	Antonio Ardila	Residente de obra 1
9452916284	Eduardo Gómez	Residente de obra 2
9452916284	Luis Morales	Inspector de obra 1
9452916284	José Padilla	Inspector de obra 2
9452916284	Dayane Obaji	Ingeniero con postgrado en Vías
9452916284	Carlos Hernández	Ingeniero residente eléctrico
9452916284	Gustavo Royett	Ingeniero con postgrado Geotecnia
9452916284	Angelica Avilez	Ingeniero con postgrado ambiental
9452916284	Arlenys Assias	Trabajadora social
9452916284	Ayda Espitia	Profesional Sisoma
9452916284	Ronal Almanza	Topógrafo 1
9452916284	Edwin Montes	Topógrafo 2
9452916284	Félix Misas	Cadenero 1
9452916284	Erny Urango	Cadenero 2
9452916284	Dionisio López	Cadenero 3
9452916284	Jorge Viloria	Cadenero 4

9452916284	Gabriel Gonzales	Maestro de obra 1
9452916284	Eduardo Melendrez	Maestro de obra 2
9452916284	Jader Spir	Almacenista
9452916284	Yoni Murillo	Vigilante
9452916284	Lauren Flórez	Secretaria
9452916284	Maira Gonzales	Auxiliar contable
9452916284	Dalim Martinez	Abogado
9452916284	Albeiro Avilez	Conductor
9452916284	Moisés Torres	Mensajero

PLANILLAS N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO
9454824113	Claudia Stella Carvajal Pineda	Director de Obra
9454824113	Rafael Andrés Puche Díaz	Residente de obra 1
9454824113	Eduardo Andrés Gómez Pastrana	Residente de obra 2
9454824113	Melissa Hernández Durango	Inspector de obra 1
9454824113	Moisés Ayubb Ramos	Inspector de obra 2
9454824113	Dayane Obají Bernal	Ingeniero con postgrado en Vías
9454824113	Jaam Fernández Pérez	Ingeniero residente eléctrico
9454824113	Pablo Eugenio Castilla Negrete	Ingeniero con postgrado Geotecnia
9454824113	Rafael Dario Vergara de la Ossa	Ingeniero con postgrado ambiental
9454824113	Patricia Álvarez Manchego	Trabajadora social
9454824113	Armando Javier Atencia Soto	Profesional Sisoma

9454824113	Ernan Antonio Díaz Hernández	Topógrafo 1
9454824113	Santiago Guerrero Lamadrid	Topógrafo 2
9454824113	Deiker Bellorin Ibarra	Cadenero 1
9454824113	Nayib Enrique Genes Hoyos	Cadenero 2
9454824113	Domingo Antonio Álvarez Gaviria	Cadenero 3
9454824113	Ismael Andrés Vega	Cadenero 4
9454824113	Eduardo Melendrez Coronado	Maestro de obra 1
9454824113	Oscar Luis Chima Gómez	Maestro de obra 2
9454824113	Jader Luis Spir del Castillo	Almacenista
9454824113	José Miguel Ozuna Rizo	Vigilante
9454824113	Erni Elias Urango Chima	Vigilante
9454824113	Kelly Yohana Rivero Berrio	Secretaria
9454824113	Daniela Paola Payares Espitia	Auxiliar contable
9454824113	Angela Maria Avilez Padilla	Abogado
9454824113	Jhon Edisson Pitalua Tamara	Conductor
9454824113	Jose Guillermo Perez Perez	Mensajero

Para constancia se firma en la ciudad de Montería a los 14 días del mes de septiembre de 2023

CONSORCIO HIDRALMA
ALVARO VERA AYALA
C.C. N° 1.022.329.221

C.C.P
INGENIEROS S.A.S

Certificado de Cumplimiento para pago por parte de interventoría

Dirección: Carrera 6 No. 65-24
Email: ccpconstrucciones22@gmail.com
Montería, Córdoba - Colombia

EL SUSCRITO INTERVENTOR DEL CONTRATO DE OBRA N° LP-SPM-019 DE 2022

INICIADO EL 27 DE FEBRERO DE 2023

CERTIFICA QUE,

Las obras ejecutadas por la empresa C.C.P INGENIEROS S.A.S identificado con Nit 901.595.820-4, representado por ELIANA MARGARITA OTERO PEREZ, con cedula de ciudadanía número 1.064.985.667 expedida en Cereté; presentan un avance ejecutado en el periodo correspondiente al 29,98%, bajo los parámetros técnicos, especificaciones técnicas y calidad establecidas por la Alcaldía de Montería, por lo que esta Interventoría recibe a satisfacción las obras del porcentaje indicado al inicio.

De igual forma el contratista de obra ha cumplido con la inscripción y los pagos de aportes a Seguridad Social, EPS, AFP, ARL y parafiscales desde el inicio del contrato de obra a la presente fecha.

Para constancia se firma a los 14 días del mes de septiembre de 2023

CONSORCIO HIDRALMA
ALVARO VERA AYALA
C.C. N° 1.022.329.221

C.C.P
INGENIEROS S.A.S

Modificaciones/actualizaciones a Licencias y/o Permisos que apliquen

Dirección: Carrera 6 No. 65-24
Email: ccpconstrucciones22@gmail.com
Montería, Córdoba - Colombia

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE – CVS

RESOLUCIÓN N.º 302

FECHA: 14 AGOSTO 2023

"POR LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ÁRBOLES AISLADOS"

EL PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 18 DEL ÁREA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE CVS. EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE RESOLUCIÓN 1.2501 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2008, LAS MODIFICACIONES HECHAS EN LA RESOLUCIÓN 1.4165 DEL 30 DE ABRIL DEL 2010 Y LAS MODIFICACIONES HECHAS MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 2-3307 DEL 27 DE ABRIL DEL 2017 Y;

CONSIDERANDO

ANTECEDENTES

Que mediante oficio radicado con N°20221103825 del 28 de abril 2022, la secretaría de planeación del municipio de Montería, a través del señor **HUGO FERNANDO KERGUELEN GARCIA**, solicitó a la CAR-CVS, permiso de aprovechamiento forestal de árboles aislados forestal para el proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS PAZ DEL NORTE, 20 DE JULIO, LAS PARCELAS Y MOCARI EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".**

A través de oficio 20222106482 del 10 de mayo del año 2022, la CAR-CVS, envía al solicitante liquidación por concepto de evaluación ambiental.

Que a través de oficio radicado 20231100774 del 26 de enero del año 2023, el solicitante hace llegar recibo de pago por concepto de evaluación ambiental.

Mediante Auto N°022 del 15 de febrero de 2023, se inició un trámite administrativo de árboles aislados, no obstante, en el mismo se estableció el siguiente condicionamiento:

"(...) CONDICIONAMIENTO

Teniendo en cuenta que dentro de la documentación presentada por el solicitante no se encuentra lo referente a la Flora Silvestre en Veda (Epifitas Vasculares y no vasculares) y con el fin de cumplir con el lleno de los requisitos del trámite, se condiciona la elaboración del concepto técnico a la presentación de la caracterización de la flora silvestre en veda, cumpliendo la metodología propuesta en los términos de referencia de la Corporación estableciendo una propuesta de medida de manejo, el documento será evaluado, de estar correcto se procederá a la elaboración del concepto o si es necesario alguna modificación del mismo se requerirá a través de oficio...".

El día 23 de febrero de 2023, se realiza visita de inspección de verificación, por medio del cual se rinde el presente concepto técnico.

A través de oficio con radicado número 20231104703 del 9 de mayo de 2023 el solicitante remite la caracterización de la flora silvestre en veda, como respuesta al

condicionamiento estipulado en el artículo primero del auto de inicio número 022 del 15 de febrero de 2023.

Que, en atención a la solicitud referenciada, el Ingeniero Forestal contratista Convenio U. Distrital – CAR-CVS, DANIEL JOSÉ BERROCAL VERGARA, y la Bióloga contratista Convenio Fundación Omacha – CAR-CVS, MARÍA LUISA SANCHEZ BANDA, efectuaron visita técnica el día 23 de febrero de 2023, generándose el Concepto Técnico N°2023-795 del 29 de mayo del 2023, en el cual se describieron los siguientes aspectos:

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

El solicitante indica que el aprovechamiento forestal se llevará a cabo dentro área de diseño del proyecto, en ambos costados de la vía existente; puesto que los árboles se encuentran dentro de la zona donde se proyectan los andenes (1,20 m de ancho desde el borde de la vía) a lo largo de una longitud aproximada de 1373 m, cabe mencionar que la vía presenta un ancho 7,4 metros (con un ancho de calza de 5 m y andenes de 1,20 m), los árboles se localizan en ambos costados lo cual interrumpen la correcta movilidad de peatones y personas con baja movilidad o discapacidad. Como soporte de este numeral se encuentra el acta de socialización y concertación con la comunidad, a la cual se le explicó la necesidad del aprovechamiento de los árboles que estaban dentro del trazado de la vía. Actualmente el área de influencia del proyecto es espacio público.

En total se solicita la intervención mediante actividad de tala de CUARENTA Y NUEVE (49) árboles que corresponden a un volumen total de OCHO PUNTO VEINTE (8.20 m^3) metros cúbicos de madera.

Imagen 1. Ubicación espacial de los árboles solicitados para aprovechamiento.



Tomado del documento técnico de aprovechamiento.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE – CVS

RESOLUCIÓN N.º 302

FECHA: 14 AGOSTO 2023

ACTIVIDADES REALIZADAS

EVALUACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO PARA APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS.

Luego de realizar la evaluación al EL ESTUDIO TÉCNICO DE APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS para la ejecución del proyecto **"MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS PAZ DEL NORTE, 20 DE JULIO, LAS PARCELAS Y MOCARI EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"**, solicitado por el municipio de Montería, identificado con Nit 800096734-1, representado legalmente por el Doctor **CARLOS ORDOSGOITIA SANÍN**, identificado con cédula de ciudadanía N°79.969.238 de Bogotá D.C, y con el fin de desarrollar el proyecto tomando como base el Decreto 1076 de 2015, "Por medio del cual se establece el Régimen de Aprovechamiento Forestal", y las guías técnicas desarrolladas por la Corporación para la Elaboración de Planes de Aprovechamiento Forestal, estudios técnicos de aprovechamiento en árboles aislados, de Manejo Forestal y de las Consideraciones Ambientales, se concluye que cumple con los TREINTA Y OCHO (38) ítems requeridos por la Corporación para la presentación de este tipo de aprovechamiento.

Durante la visita, se efectuó la valoración de cuarenta y nueve (49) individuos distribuidos en veinticinco especies distintas, los cuales se relaciona en la Tabla 1.

Tabla 1 . Especies con N° árboles y volumen del Inventario forestal solicitado a aprovechar.

Familia	Nombre común	Nombre científico	Cantidad	VOLUMEN TOTAL (m3)
Anacardiaceae	Mango	*Mangifera indica*	5	2.23
Arecaceae	Palma real	*Roystonea regia*	2	1.11
Bignoniaceae	Totumo	*Crescentia cujete*	6	0.21
Boraginaceae	San joaquin	*Cordia sebestena*	1	0.03
Capparidaceae	Narajuelo	*Capparis odoratissima*	1	0.29
Chrysobalanaceae	Oiti	*Licania tomentosa*	7	0.30
Combretaceae	Almendro	*Terminalia catappa*	5	1.82
	Mangle zaragoza	*Conocarpus erectus*	15	1.05
Euphorbiaceae	Ñipi	*Sapium haematospermum*	1	0.47
Fabaceae	Florisanto	*Brownea ariza*	1	0.10
Muntingiaceae	Ninguito	*Muntingia calabura*	1	0.19
Myrtaceae	Pera	*Syzygium malaccense*	1	0.10
Nyctaginaceae	Veranera	*Bougainvillea glabra*	1	0.04

Phyllanthaceae	Pimiento	*Phyllanthus elsiae*	1	0.08
Rutaceae	Naranjo	*Citrus × sinensis*	1	0.20
TOTAL			**49**	**8.20**

Se evaluaron los individuos arbóreos que requieren de actividades de tala, los criterios seleccionados y evaluados fueron los siguientes: diseños arquitectónicos, estado fitosanitario, riesgo de volcamiento y afectación a infraestructuras aledañas, se identificó que se requiere ejecutar las actividades de tala de CUARENTA Y NUEVE (49) árboles que corresponden a un volumen total de OCHO PUNTO VEINTE (8,20 m3) metros cúbicos de madera.

VISITA DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN

En la visita de inspección ocular de los árboles solicitados para aprovechamiento forestal, ubicados en la zona de intervención del proyecto, se verificó una muestra aleatoria de los individuos arbóreos presentes en el inventario 100%, y como producto de ello se evidencia que los árboles están debidamente marcados y localizados en las coordenadas indicadas dentro de la solicitud de aprovechamiento. Asimismo, la inspección y verificación fueron acompañadas por personal de la entidad solicitante.

Dentro de las actividades realizadas, se llevó a cabo la verificación muestral en relación con las especies y variables dendrométricas tales en como DAP, altura y coordenadas presentadas dentro del inventario forestal; encontrando que la información presentada es consistente con lo verificado en campo, con un error de +- 2 cm en términos de DAP y Altura, debido a la diferencia de instrumentación utilizada.

Adicionalmente, mediante visita de campo se constata que el área está representada por la cobertura de pastos arbolados y tejido urbano continuo.

Información de número de individuos y volumen

Los árboles objeto de la solicitud de aprovechamiento, presentan un buen estado fitosanitario, sin problemas radiculares o volcamiento, estos se encuentran ubicados bajo las coberturas antes mencionadas: pastos arbolados y tejido urbano continúo.

Verificación árboles solicitados para tala:

En el área de intervención del aprovechamiento contempla un total de cuarenta y nueve (49) individuos inventariados, los cuales se encuentran ubicados en inmediaciones de la vía a intervenir en el desarrollo del proyecto.

Las principales especies que caracterizan las áreas de intervención y que solicitan ser aprovechados son, de acuerdo al inventario forestal: Mango (*Mangifera indica*), Oiti (*Licania tomentosa*), Totumo (*Crescentia cujete*), Almendro (*Terminalia catappa*) y Mangle zaragoza (*Conocarpus erectus*).

Tabla 2. Descripción árboles solicitados para actividad de tala.

ID	Nombre común	Familia	*Nombre científico*	DAP (m)	HT (m) Altura Total Calculada	Vol. (m3) Total	X	Y
1	Mango	Anacardiaceae	*Mangifera indica*	0.26	8	0.27	1134073.47	1465682.57
2	Mango	Anacardiaceae	*Mangifera indica*	0.38	9	0.67	1134081.04	1465686.73
3	Almendro	Combretaceae	*Terminalia catappa*	0.42	8	0.72	1134095.35	1465687.43
4	Almendro	Combretaceae	*Terminalia catappa*	0.31	8	0.39	1134099.00	1465689.28
5	Mango	Anacardiaceae	*Mangifera indica*	0.32	11	0.59	1134098.68	1465696.55
6	Palma real	Arecaceae	*Roystonea regia*	0.16	5	0.06	1134130.59	1465704.20
7	Mango	Anacardiaceae	*Mangifera indica*	0.29	8	0.34	1134144.00,	1465718.48
8	Totumo	Bignoniaceae	*Crescentia cujete*	0.14	5	0.05	1134163.97	1465720.73
9	Totumo	Bignoniaceae	*Crescentia cujete*	0.11	4.5	0.03	1134375.69	1465818.51
10	Totumo	Bignoniaceae	*Crescentia cujete*	0.13	4.5	0.04	1134382.21	1465814.49
11	Totumo	Bignoniaceae	*Crescentia cujete*	0.16	4.5	0.06	1134385.50	1465795.55
12	Mangle zaragoza	Combretaceae	*Conocarpus erectus*	0.13	4.5	0.04	1134379.32	1465793.92
13	Totumo	Bignoniaceae	*Crescentia cujete*	0.10	4	0.02	1134387.80	1465781.02
14	Totumo	Bignoniaceae	*Crescentia cujete*	0.10	4	0.02	1134388.26	1465777.30
15	Almendro	Combretaceae	*Terminalia catappa*	0.19	9	0.17	1134389.98	1465753.47
16	Almendro	Combretaceae	*Terminalia catappa*	0.29	9	0.38	1134390.25	1465753.08
17	Mangle zaragoza	Combretaceae	*Conocarpus erectus*	0.11	4.5	0.03	1134390.16	1465717.15
18	Mangle zaragoza	Combretaceae	*Conocarpus erectus*	0.14	4.5	0.04	1134398.22	1465702.41
19	Mangle zaragoza	Combretaceae	*Conocarpus erectus*	0.11	3.5	0.02	1134398.84	1465698.49
20	Mangle zaragoza	Combretaceae	*Conocarpus erectus*	0.24	3.5	0.10	1134400.90	1465683.97

ID	Nombre común	Familia	*Nombre científico*	DAP (m)	HT (m) Altura Total Calculada	Vol. (m3) Total	X	Y
21	Mangle zaragoza	Combretaceae	*Conocarpus erectus*	0.13	4	0.04	1134405.31	1465655.45
22	Veranera	Nyctaginaceae	*Bougainvillea glabra*	0.14	4	0.04	1134403.68	1465619.87
23	Mangle zaragoza	Combretaceae	*Conocarpus erectus*	0.19	3	0.06	1134410.69	1465613.56
24	Mangle zaragoza	Combretaceae	*Conocarpus erectus*	0.22	4.5	0.11	1134411.49	1465608.52
25	Mangle zaragoza	Combretaceae	*Conocarpus erectus*	0.18	4.5	0.07	1134416.74	1465572.07
26	Mangle zaragoza	Combretaceae	*Conocarpus erectus*	0.19	4.5	0.08	1134420.34	1465540.92
27	Mangle zaragoza	Combretaceae	*Conocarpus erectus*	0.25	4	0.13	1134414.25	1465541.35
28	Pimiento	Phyllanthaceae	*Phyllanthus elsiae*	0.20	4	0.08	1134417.65	1465522.48
29	Florisanto	Fabaceae	*Brownea ariza*	0.18	6	0.10	1134418.71	1465509.10
30	Mangle zaragoza	Combretaceae	*Conocarpus erectus*	0.20	3.5	0.07	1134428.18	1465485.12
31	Almendro	Combretaceae	*Terminalia catappa*	0.21	7	0.16	1134430.46	1465473.00
32	Mangle zaragoza	Combretaceae	*Conocarpus erectus*	0.23	4.5	0.13	1134436.01	1465457.48
33	Mango	Anacardiaceae	*Mangifera indica*	0.32	7	0.36	1134429.90	1465443.85
34	Ñipi	Euphorbiaceae	*Sapium haematospermum*	0.48	4	0.47	1134436.70	1465443.38
35	Oiti	Chrysobalanaceae	*Licania tomentosa*	0.16	4.5	0.06	1134437.12	1465429.95
36	Palma real	Arecaceae	*Roystonea regia*	0.54	7	1.05	1134437.76	1465406.23
37	Mangle zaragoza	Combretaceae	*Conocarpus erectus*	0.19	4	0.07	1134455.56	1465270.19
38	Mangle zaragoza	Combretaceae	*Conocarpus erectus*	0.14	4.5	0.04	1134452.64	1465251.21
39	Ninguito	Muntingiaceae	*Muntingia calabura*	0.22	8	0.19	1134434.70	1465195.03
40	Naranjo	Rutaceae	*Citrus × sinensis*	0.25	6	0.20	1134435.45	1465194.86
41	Narajuelo	Capparidaceae	*Capparis odoratissima*	0.26	8	0.29	1134433.661	1465187.122

ID	Nombre común	Familia	*Nombre científico*	DAP (m)	HT (m) Altura Total Calculada	Vol. (m3) Total	X	Y
42	Oiti	Chrysobalanaceae	*Licania tomentosa*	0.09	4.5	0.02	1134138.07	1465697.60
43	San joaquin	Boraginaceae	*Cordia sebestena*	0.10	5	0.03	1134136.36	1465674.22
44	Oiti	Chrysobalanaceae	*Licania tomentosa*	0.11	4.5	0.03	1134136.39	1465672.19
45	Oiti	Chrysobalanaceae	*Licania tomentosa*	0.10	4.5	0.02	1134136.92	1465667.88
46	Oiti	Chrysobalanaceae	*Licania tomentosa*	0.11	4	0.03	1134142.94	1465662.35
47	Oiti	Chrysobalanaceae	*Licania tomentosa*	0.11	4	0.02	1134143.75	1465657.47
48	Pera	Myrtaceae	*Syzygium malaccense*	0.16	8	0.10	1134139.03	1465649.82
49	Oiti	Chrysobalanaceae	*Licania tomentosa*	0.17	8	0.12	1134139.13	1465645.92
TOTAL						8.20		

De los cuarenta y nueve (49) árboles mencionados, seis (6) pertenecen a dos especies que poseen características leñosas y frutales (*Mangifera indica* y *Syzygium malaccense*). Según lo estipulado en el Decreto 1532 de 2019, se establece lo siguiente: las especies frutales con características leñosas pueden ser objeto de aprovechamiento para la obtención de productos forestales, siempre y cuando se cumpla con el requisito del Salvoconducto Único Nacional en línea (SUNL), de acuerdo con las Resoluciones 1909 de 2017 y 081 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Para la movilización de los productos maderables obtenidos del aprovechamiento y sus residuos, debe solicitarse el respectivo Salvoconducto Único Nacional en Línea – SUNL, de acuerdo a los siguientes requisitos y procedimiento:

Requisitos:

1. Solicitud de Salvoconducto Único Nacional en Línea – SUNL, en el FORMATO ÚNICO NACIONAL DE SOLICITUD DE SALVOCONDUCTO ÚNICO NACIONAL EN LÍNEA PARA ESPECÍMENES DE FLORA OBTENIDOS POR EL APROVECHAMIENTO DE CERCAS VIVAS, BARRERAS ROMPEVIENTOS y/o ESPECIES FRUTALES de conformidad a la Resolución 213 del 09 de marzo de 2020.
2. Fotocopia de documento de identificación del solicitante.
3. En caso de ser persona jurídica fotocopia del documento de identificación del representante legal.
4. Copia del certificado de existencia y representación legal cuya fecha de expedición no sea superior a treinta (30) días calendarios (SI APLICA)

5. Certificado de tradición y libertad, cuya fecha de expedición no sea superior a treinta (30) días calendario, previos a la solicitud de registro.
6. En caso de ser tenedor allegar autorización del titular del predio.

Lineamientos para el procedimiento:

1. Una vez recibida la solicitud, el Área de Seguimiento Ambiental a través del profesional jurídico revisará la documentación allegada y si está completa, le dará traslado al profesional técnico para que se haga la liquidación de la visita técnica y este le remitirá el oficio de liquidación respectivo. En caso de que no esté completa, conforme a la Ley 1755 de 2015 se le requerirá al solicitante que complemente o aclare la solicitud y allegue la documentación necesaria para iniciar con el trámite correspondiente.
2. Posterior a que el usuario aporte el recibo de caja correspondiente, el profesional técnico se desplazará al sitio objeto de solicitud, para realizar visita técnica y emitir concepto técnico
3. Seguidamente el concepto técnico será remitido al profesional delegado para que sean cargados los volúmenes autorizados en la plataforma VITAL, junto con el formato único de solicitud de SUNL. Cabe resaltar que usted deberá acercarse a la oficina de Planeación de la CAR-CVS para lo pertinente a la creación de usuario y contraseña para el uso de la plataforma VITAL, siendo en todo caso, su responsabilidad el buen uso y manejo de estos, con el fin cargar los volúmenes, para que posteriormente pueda solicitar los salvoconductos Únicos Nacionales en línea (SUNL).
4. Por último, cada vez que requiera movilizar los volúmenes autorizados en el concepto técnico, deberá cancelar a la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge CVS por concepto de los servicios de evaluación y seguimiento por la expedición del Salvoconducto Único Nacional para la Movilización de especímenes de la biodiversidad biológica, un valor de SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/Cte ($7,733), valor que deberá ser consignado en el Banco de Occidente, convenio 8586 cuenta Corriente N.° 89004387-0, a nombre de la CVS. Con base a la Resolución N°1909 de 2017 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que establece el Salvoconducto Único Nacional en Línea (SUNL).

En este sentido, estos los siguientes individuos inventariados no requieren permiso para su aprovechamiento. Los árboles que no requiere permiso para disponer del recurso en el marco de la ejecución del proyecto se muestran a continuación:

Tabla 3. Árbol que no necesita permiso para su aprovechamiento.

ID	Nombre común	Familia	*Nombre científico*	DAP (m)	HT (m) Altura Total Calculada	Vol. (m3) Total	X	Y
1	Mango	Anacardiaceae	*Mangifera indica*	0.26	8	0.27	1134073.47	1465682.57

2	Mango	Anacardiaceae	*Mangifera indica*	0.38	9	0.67	1134081.04	1465686.73
5	Mango	Anacardiaceae	*Mangifera indica*	0.32	11	0.59	1134098.68	1465696.55
7	Mango	Anacardiaceae	*Mangifera indica*	0.29	8	0.34	1134144.00	1465718.48
33	Mango	Anacardiaceae	*Mangifera indica*	0.32	7	0.36	1134429.90	1465443.85
48	Pera	Myrtaceae	*Syzygium malaccense*	0.16	8	0.10	1134139.03	1465649.82

Imagen 2. Registro fotográfico de los árboles solicitados.







TASA POR CONCEPTO APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ACUERDO AL DECRETO 1390 DEL 02 DE AGOSTO DE 2018 Y RESOLUCIÓN 1479 DEL 03 DE AGOSTO DE 2018.

Dentro de las especies solicitadas para actividad de tala y que fueron caracterizadas; se distribuyen entre las categorías especiales (1) y otras (12), como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 4. Categorización de las especies solicitadas.

Nombre común	Nombre científico	Cantidad	VOLUMEN TOTAL (m3)	Categoría
Palma real	*Roystonea regia*	2	1.11	Otras especies
Totumo	*Crescentia cujete*	6	0.21	Especie Especial
San joaquin	*Cordia sebestena*	1	0.03	Otras especies
Narajuelo	*Capparis odoratissima*	1	0.29	Otras especies
Oiti	*Licania tomentosa*	7	0.30	Otras especies
Almendro	*Terminalia catappa*	5	1.82	Otras especies
Mangle zaragoza	*Conocarpus erectus*	15	1.05	Otras especies
Ñipi	*Sapium haematospermum*	1	0.47	Otras especies
Florisanto	*Brownea ariza*	1	0.10	Otras especies
Ninguito	*Muntingia calabura*	1	0.19	Otras especies

Veranera	*Bougainvillea glabra*	1	0.04	Otras especies
Pimiento	*Phyllanthus elsiae*	1	0.08	Otras especies
Naranjo	*Citrus × sinensis*	1	0.20	Otras especies
TOTAL		**43**	**5.87**	

Tabla 5. Tasa por concepto de aprovechamiento de árboles aislados.

Tarifa mínima 2023	COEFICIENTES								TAFM ($/M3)	M3 del permiso	Valor a cobrar
	CUM	Variable de nacionalidad	CDRB	CEB	CE	CCE	CAA	FR			
$ 38,346	0.5	0	2	0.0009	Muy especial	2.7	1	0.95	$ 36,428.7	0.00	$ -
					Especial	1.7		0.6	$ 23,646.7	0.21	$ 4,966
					Otras especies	1		0.5	$ 19,173.0	5.66	$ 108,519

Para un total de **CINCO COMA OCHENTA Y SIETE METROS CÚBICOS (5,87 m³)** de madera, se debe cancelar **CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/Cte ($113,485)**. Los cuales deberán consignarse, a favor de la CAR-CVS, en la cuenta de ahorros No. 438-51221– 2 del Banco de Bogotá o a través de la plataforma PSE en la página web www.cvs.gov.co - enlace "Trámites y Servicios" > "Pagos en Línea".

SEGUIMIENTO AMBIENTAL

Para realizar las actividades de seguimiento, durante los TRES (03) años que dura el mantenimiento de las especies establecidas a manera de reposición el autorizado deberá cancelar durante los TRES (03) años o hasta que la reposición sea entregada y registrada como plantación protectora ante la Corporación, y con aumento del IPC en cada año y a partir del primer año, dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación del presente acto administrativo la suma **TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO M/Cte ($ 3,372,234),** los cuales deberán consignarse, a favor de la CAR-CVS en la cuenta de ahorros No. 438-75432 – 7 del Banco de Bogotá o a través de la plataforma PSE en la página web www.cvs.gov.co - enlace "Trámites y Servicios" > "Pagos en Línea".

IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES EN CATEGORÍA DE AMENAZA Y EN VEDA

ESPECIES EN CATEGORÍA DE AMENAZA

Según la Resolución 1912 del 15 de septiembre del 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible "*Por la cual se establece el listado de especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana continental y marino costera que se encuentran en el territorio nacional, y se dictan otras disposiciones*", Apéndices CITES y

según la Unión Internacional para la conservación de la naturaleza, la cual es una organización internacional dedicada a la conservación de los recursos naturales, se constató que dentro de las especies a intervenir no se encuentran especies en algún grado de amenaza.

ESPECIES EN VEDA NACIONAL

En relación a las especies en veda (Epifitas vasculares y no vasculares), las cuales son especies relevantes que cumplen funciones ecológicas específicas, como la regulación delflujo hídrico, acumulación y administración de sus nutrientes, se realizó la evaluación respectiva frente a los árboles solicitados a aprovechar. Dentro dela visita de verificación se evidenció que hay registros de epifitas no vasculares (Musgos y líquenes) en los árboles evaluados conforme a lo indicado en la caracterización de flora silvestre en veda; por lo tanto, se considerará la medida de manejo bajo una compensación de árboles.

El trabajo de caracterización de la flora vascular y no vascular de hábito epífito, rupícola y facultativo terrestre en veda se desarrolló en tres fases, una fase de pre-campo, la cual se basó en la revisión de información secundaria del área del proyecto y elaboración de la metodología de campo, una fase de campo, donde se desarrollaron los muestreos propuestos y una de post-campo, en la cual se incluyeron el trabajo en herbario y el procesamiento de la información, junto con la elaboración del documento de caracterización de las especies vasculares y no vasculares de hábito epífito, rupícola y facultativo terrestre presente en las coberturas muestreadas en el área de intervención del proyecto.

La relación de número de forófitos para definir el tamaño de la muestra se empleó hasta llegar a la relación de ocho (8) árboles forófitos por área, teniendo en cuenta que es una cobertura de pastos arbolados se toma el 40% del área para muestreo.

Tabla 6. Número de forófitos dentro del área de aprovechamiento.

ZONA DE VIDA	COBERTURA	AREA (HA)	N° de Forofitos / HA	N° de forofitos muestreados
Bosque Seco Tropical	Pastos arbolados	0.9	8	16
TOTAL		**0.9**		**16**


Para la definición de los sitios de muestreo, se efectuó una definición preliminar de coberturas de la tierra con presencia de vegetación arbórea, con base en la cartografía de la zona disponible, estableciendo un número de árboles forófitos a muestrear significativo bajo los parámetros de la metodología RRED (Gradstein et al, 2003) para la caracterización de la flora vascular y no vascular de hábito epífito en veda, lo cual está directamente relacionado con la disponibilidad de vegetación arbórea y/o arbustiva en cada cobertura, con el fin de muestrear un número de forófitos directamente relacionado al área de intervención de cada cobertura, guardando la relación de la metodología

RRED (Gradstein et al, 2003) de caracterizar al menos ocho (8) arboles forófitos a caracterizar en ecosistemas tropicales.

- **Muestreo de epífitas vasculares en veda**

La metodología más usada para la cuantificación de la abundancia de las especies de epífitas vasculares en veda se encuentra el conteo del número de individuos presentes en el forófito (Sugden & Robins, 1979; Gentry & Dodson, 1987; Zimmerman & Olmsted, 1992). Las categorías de abundancia para los cinco (5) estratos verticales propuestos por Johansson (1974), fueron determinadas por la abundancia de todas las especies registradas, analizada en el plano vertical (estrato de los forófitos) y horizontal (entre coberturas). Debido a la baja altura de los forófitos presentes en el área de intervención y caracterizados, el conteo fue realizado en el estrato del dosel con la ayuda de binoculares y cámara fotográfica profesional, con un lente zoom que permitió visualizar todos los individuos de especies vasculares epífitas.

Figura 1 . Estratificación del forófito para muestreo de las epífitas vasculares y no vasculares en veda

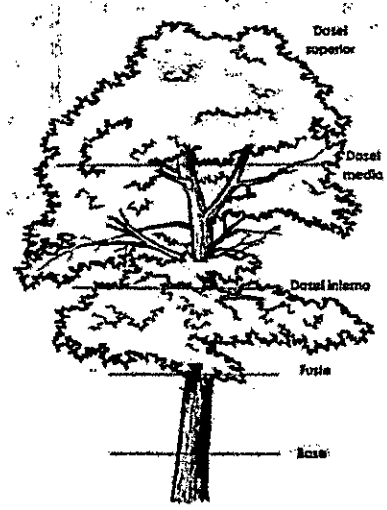

Fuente: Tomado de documento técnico, adaptado de johansson (1974); Gradstein et al, (1996) y Gradstein et al, (2003).

- **Muestreo de epífitas no vasculares en veda**
- **Briofitos y Líquenes Cortícolas**

La mayoría de los briofitos de áreas tropicales son epífitas cortícolas, habitando la corteza de árboles, lianas, arbustos, arbolitos, entre otros. Por su parte, gran parte de los líquenes cortícolas de los Bosques Tropicales son líquenes costrosos, que forman una capa delgada sobre la corteza o incluso ocurren dentro de las células de la corteza periférica. Estos se colectaron desprendiendo un trozo de corteza con un objeto

cortopunzante. El método de colecta para los líquenes más conspicuos y mejor conocidos, los cuales son los foliosos y filamentosos, fue desprenderlos manualmente, debido a que estaban ligeramente adheridos al sustrato. Dadas las características morfo-fisiológicas de las plantas no vasculares y su consideración como grupos clónales, autores como Gradstein et al, (1996) y Gradstein et al, (2003), abordan la representatividad de estos organismos bajo los parámetros de presencia-ausencia y señalan que ésta es una manera eficiente y robusta para establecer análisis de diversidad.

Conteo y registro de la frecuencia (presencia/ausencia) de especies no vasculares en dos (2) de los cinco (5) estratos propuestos por Johansson, 1974):

Se registró la frecuencia de morfoespecies de las epífitas no vasculares en dos (2) de los estratos propuestos por Johansson (1974), la base y el tronco, registrando cada aparición de un individuo de especies no vascular con el número uno (1) en la base de datos de campo, registrando de esta manera cada evento de registro de frecuencia por estrato vertical del forófito. Para el estrato del dosel esta labor no fue realizada ante la imposibilidad de acceder al estrato del dosel para realizar las colectas.

Cuantificación de la cobertura de las epífitas no vasculares en cm^2 para el estrato trono (en los 4 puntos cardinales y a la altura del pecho)

Debido a la necesidad de realizar cuantificaciones de cobertura (cm^2) de las epífitas no vasculares sobre los forófitos, a que a la densidad de especies epífitas de briofitos es alta y a que las plantas son pequeñas, las parcelas para dicho muestreo pueden ser pequeñas (Gradstein et al, 1996), por lo cual se utilizó la metodología de la plantilla de acetato transparente con una cuadricula de 400 cm^2 (20 x 20 cm) (modificado de Iwatsuki, 1960), donde cada cuadro representó un 1%, es decir, 4 cm^2 (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.); esta se ubicó directamente sobre el forófito a muestrear en el estrato del "Tronco", contabilizando el número de cuadros ocupados por cada una de las especies de epífitas no vasculares (Gradstein et. al, 2003). En cada uno de los forófitos se establecieron cuatro (4) de estas plantillas en el tronco, una en cada punto cardinal (norte, sur, este y oeste). Con los datos obtenidos a través de esta metodología, se estimó la cobertura de las especies epifitas no vasculares en centímetros cuadrados (cm^2) para cada cobertura caracterizada.

Las muestras tomadas de cada especie fueron depositadas en bolsas de papel Kraft para su envió al herbario para identificación y disposición final.

Principales resultados

Especies vasculares

No se registraron en los 28 individuos muestreados presencia de epifitas vasculares de interés o en veda nacional.

Especies no vasculares

En total se registraron epífitas no vasculares de un grupo perteneciente a Líquenes, agrupados en cinco (05) familias, cinco (5) géneros y 5 especies. Mostrando una concentración de diversidad en la familia Pertusariaceae con 1 género y 1 especie.

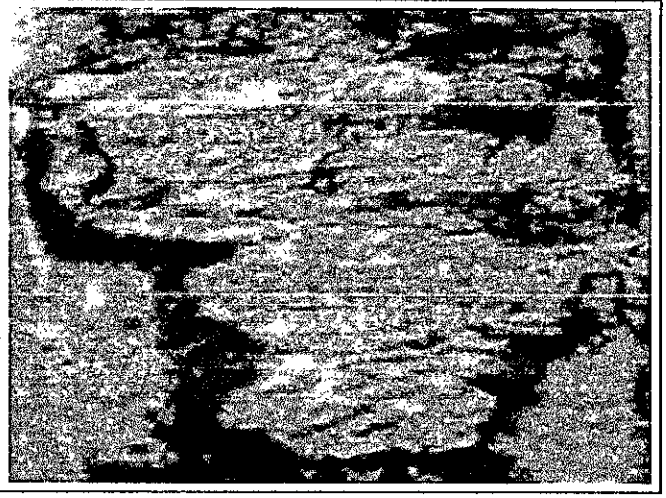
Graphidaceae con 1 género y 3 especies, también la familia Physciaceae con 2 géneros y 2 especies.



Tabla 7. Listado taxonómico de especies de epífitas no vasculares presentes en el área de intervención.


Tipo de organismo	Familia	Genero	Epifita no vascular	Cobertura %
Liquen	Pertusariaceae	Pertusaria	Pertusaria sp.	2144
Liquen	Monoblastiaceae	Anisomeridium	Anisomeridium subprostans	306
Liquen	Caliciaceae	Pyxine	Pyxine cocoes	107
Liquen	Arthoniaceae	Herpothallon	Herpothallon aff. granulare	78
Liquen	Verrucariaceae	Psoroglaena	Psoroglaena sp.	22

Fuente: Tomado de documento técnico, 2022

Imagen 3 . Registro fotográfico de epifitas no vasculares

EPIFITA NO VASCULAR	REGISTRO FOTOGRAFICO
Pertusaria sp.	

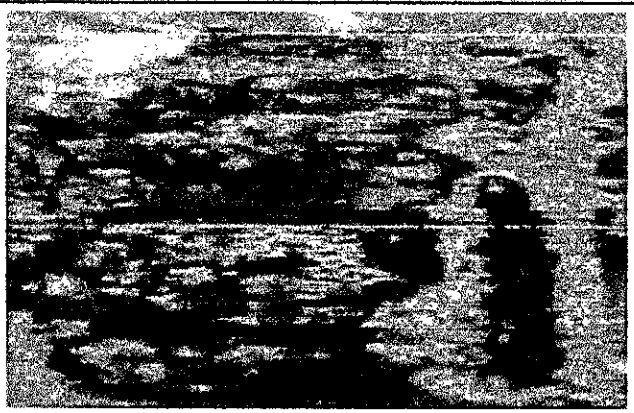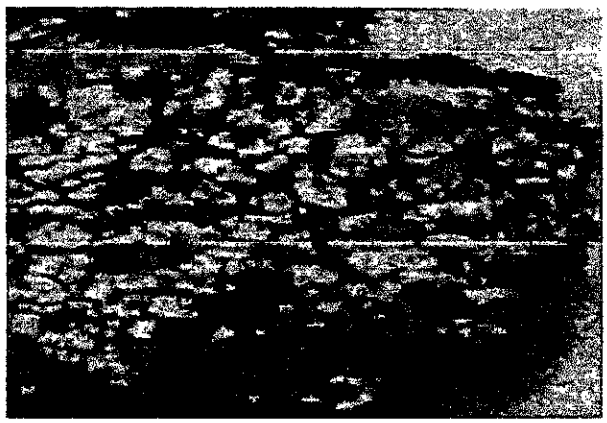EPIFITA NO VASCULAR	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Anisomeridium subprostans	
Pyxine cocoes	
Herpothallon aff. granulare	

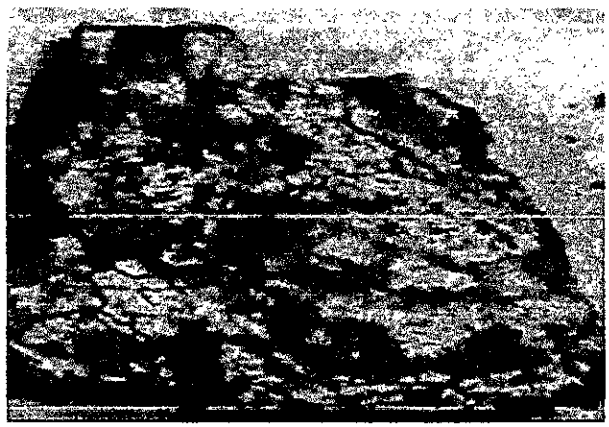EPIFITA NO VASCULAR	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Psoroglaena sp.	

Concepto técnico de la caracterización de veda

Se evidencia dentro de la caracterización de la Flora silvestre en veda (Epifitas vasculares y no vasculares) dentro del estudio, de acuerdo al artículo 125 del decreto 2106 de 2019, donde la información técnica presentada cumple con los requerimientos técnicos solicitados, por tanto, se considera suficiente y confiable para la representación del sitio.

Para el caso de las especies no vasculares, todas se encuentran en veda conforme a la Resolución 213 de 1977 del INDERENA se decreta la veda a nivel nacional para los musgos, líquenes, lamas, parásitas, quichés y orquídeas.

COMPONENTE FAUNA

Debido a que la zona en donde se va a realizar el aprovechamiento forestal está dentro el casco urbano de Montería, donde se presentan movimientos continuos de personal y vehículos y se generan estresantes entrópicos como ruidos y luces, que han generado el ahuyentamiento de parte de las especies. Sin embargo, se evidenciaron algunas especies como:

Tabla 8. Listado de fauna observada en campo.

N°	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO
1	Torcaza	*Zenaida auriculata*
2	Colibrí común	*Colibri coruscans*
3	Toche	*Icterus chrysater*
4	Perico	*Brotogeris jugularis*

N°	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO
5	Golero	*Coragyps atratus*
6	Golondrina común	*Hirundo rustica*
7	Iguana	*Iguana iguana*
8	Rana	*Agalychnis spurrelli*
9	Sapo común	*Bufo marinus*
10	Lobo	*Cnemidophorus enemidophours*
11	Chupa huevo	*Campylorhynchus griseus*
12	Azulejo	*Thraupis episcopus*
13	Sirí común	*Tyranus melancholicus*
14	Lobito de líneas	*Cnemidophorus lemniscatus*

Fuente: Tomado de documento técnico.

ESPECIES AMENAZADAS

No se registraron especies de anfibios, reptiles, aves que se encuentren bajo categoría de amenaza de acuerdo a la resolución 1912 de 2017.

IDENTIFICACIÓN DE NIDOS, MADRIGUERAS

Se hizo identificación de distintos nidos de aves nidos y madrigueras en búsqueda de la presencia de fauna silvestre debido a que estos lugares representan para los animales un hábitat adecuado para su desarrollo. Sin embargo, en el área no se registraron este tipo de hábitats.

PROGRAMA MANEJO Y SALVAMENTO DE FAUNA

Previo a las etapas de aprovechamiento forestal, se adelantará un programa de capacitaciones al personal con el fin de optimizar las actividades de identificación, caracterización, salvamento, reubicación de fauna, normas de seguridad industrial, disposición de residuos, manejo de herramientas forestales, medidas de manejo orientadas a minimizar los impactos que se puedan generar durante y después de las labores de aprovechamiento.

Con el fin de prevenir situaciones de peligro para la seguridad del personal que realizará el proceso de traslado de fauna y debido a la reacción de los animales (mordedura de serpientes) o cortes con las ramas, se dispondrá de medicamentos tales como sueros antiofídicos y botiquín de emergencias. Así mismo en la fase de captura, se utilizarán

elementos como garfios y jaulas, que evitarán el riesgo para los participantes y las especies animales hasta su reubicación final.

PLAN DE AHUYENTAMIENTO

El plan de ahuyentamiento se realizará en el área directa de intervención, mediante la producción de ruido que técnica aleja aves, mamíferos y algunos reptiles. A su vez, se realizará remoción controlada de biomasa existente, apoyados en la identificación de los posibles refugios de la fauna (árboles huecos, palmas, árboles frondosos con presencia de matorrales, y la vegetación que hace parte de la alimentación). Lo que se busca con esta estrategia es remover la vegetación que crea un ambiente propicio para albergar fauna, así como destruir madrigueras y comederos, con el fin de provocar su desplazamiento de la zona, de esta forma la fauna sale de sus refugios y se dirige a los lugares previamente seleccionados, utilizando corredores artificiales hechos con pantallas de telas o anjeo para direccionar su huida.

CAPTURA

Mamíferos

La captura de mamíferos se hará usando trampas tipo Toma-Hawk y tipo Sherman de cierre por acción mecánica, las cuales varían en su objetivo según el cebo plantado; de este tipo de trampas para mamíferos se contempla el uso y distribución en el área de trampas pequeñas, medianas y grandes, que pueden ser usadas de forma alterna para herbívoros y carnívoros. Se definirá el sitio de localización de la trampa, posteriormente se procederá cebar a las especies mamíferas con frutas y/o verduras en los lugares de tránsito y en los defecaderos; posteriormente se ubicarán las trampas en los mismos lugares donde se pusieron los cebos, pero con las trampas abiertas, cebadas e inactivas, de este modo se acostumbrarán a la presencia de las trampas y deberían terminar consumiendo los cebos dentro de éstas. Una vez confirmado el ingreso de la especie a las trampas para consumir el cebo, se activará la trampa automáticamente. Como implementos de restricción se deberán utilizar nasas de diferentes tamaños y redes de nylon grueso.

Si se llegasen a encontrar mamíferos adultos o madrigueras habitadas, bajo la asesoría del experto, el personal reubicará a los individuos o a los cachorros por fuera del área a intervenir o si esto no es posible, serán entregados a la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge - CVS para su traslado al centro de atención y valoración de fauna silvestre (CAV).

Herpetofauna

Para reptiles y anfibios se hará uso de trampas de caída principalmente, las cuales contarán con diferentes tamaños que se puedan ajustar al hábitat y la heterogeneidad espacial del mismo.

En todos los casos las metodologías implementadas seguirán los parámetros establecidos para la caracterización de biodiversidad de grupos biológicos como los que

se rescatarán, tal es el caso de las planteadas por el Instituto Humboldt y Conservación Internacional Colombia.

Quedará terminantemente prohibido la caza, la pesca o captura de especies con fines comerciales o de manutención.

Avifauna y mamíferos voladores

En el caso de ser necesario para estos grupos de animales voladores se utilizarán redes de niebla de 10 x 3 mts en horarios diurnos para las aves y nocturnos para los murciélagos. El número de redes dependerá de la abundancia de animales en el área.

MANEJO Y REUBICACIÓN DE LA FAUNA CAPTURADA

Para la liberación se harán en zonas verdes del municipio de Montería específicamente en áreas aledañas a la vía de intervención, los ejemplares serán transportados en sus trampas, garantizando la seguridad física y salud de los animales, posterior al diagnóstico veterinario, serán llevados en vehículos con sus respectivos registros de captura al sitio de liberación y registro de atención medica en caso de dirigirse al (CAV).

La elección donde serán reubicadas las especies se evaluará con criterios biológicos tales como: Distribución geográfica, demanda de alimentación, hábitat preferido, área de dominio vital y recorrido diario.

CARACTERIZACIÓN DEL PAREA PARA REUBICACIONES

Para la reubicación de las especies capturadas se identificó un posible sitio receptor, localizado en áreas aledañas al proyecto, se presenta una cobertura de vegetación de pastos arbolados, específicamente en predios aledaños a la vía.

Es importante tener en cuenta que la fauna silvestre a reubicar se ha desarrollado en un hábitat con una fuerte intervención antrópica, por lo que el hábitat adecuado para su traslado debe tener condiciones que le permitan un óptimo desarrollo de su ciclo de vida.

FICHAS DE SALVAMENTO DE FAUNA SILVESTRE ACTIVIDADES DE TALA

MANEJO DE FAUNA DURANTE LAS LABORES DEL APROVECHAMIENTO FORESTAL, DESMONTE Y LIMPIEZA	
Objetivo	Establecer los requerimientos y procedimientos para el salvamento de fauna, mediante captura, ahuyentamiento, reubicación, etc., de manera previa y durante las labores de desmonte y limpieza del terreno donde se desarrollará el proyecto de riego.
Objetivos específicos	– Prevenir daños a la fauna silvestre. – Prevenir accidentes asociados a la presencia de fauna en las áreas a intervenir, en particular accidentes ofídicos.

MANEJO DE FAUNA DURANTE LAS LABORES DEL APROVECHAMIENTO FORESTAL, DESMONTE Y LIMPIEZA						
Metas	– Realizar ahuyentamiento o reubicación del 100% de la fauna encontrada, previo a las labores del aprovechamiento forestal.					
Impactos a controlar	– Perdida de cobertura vegetal – Perturbación de la fauna por vibraciones					
Fase	Construcción	x	Operación	X	Desmantelamiento	X
Acciones a desarrollar	Para iniciar las actividades, el personal de cada frente de obra, deberá haber recibido el Taller de Capacitación Ambiental, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y durante toda la labor, participar en las charlas de 5 minutos antes de empezar sus actividades diarias. Dentro de los temas a tratar en el taller, están los relacionados a incentivar al personal de trabajadores en la toma de conciencia sobre preservación del medio ambiente, y para el caso de los trabajadores que participarán en el desmonte y limpieza del terreno, recalcarles la importancia de rescatar la flora susceptible de trasplantar o conservar, identificada durante las labores del inventario forestal y de ahuyentar o reubicar la fauna que se encuentren durante el desarrollo de su actividad. Este personal deberá ser capacitado en las técnicas para ahuyentar o reubicar la fauna silvestre que se llegase a encontrar. En caso de encontrar animales silvestres durante el desmonte y limpieza del terreno, su ahuyentamiento o reubicación será realizada por personal de la obra bajo la asesoría de un especialista con experiencia en manejo de fauna, quien implementará protocolos para estas actividades, con el propósito de que se realicen en forma segura, salvaguardando la vida de los trabajadores y las de los especímenes encontrados. Si se llegasen a encontrar mamíferos adultos o madrigueras habitadas, bajo la asesoría del experto, el personal reubicará a los individuos o a los cachorros por fuera del área a intervenir o si esto no es posible, serán entregados a la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge CVS para su traslado al centro de atención y valoración de fauna silvestre (CAV). Cuando se trate de serpientes, estás deberán manejarse en forma adecuada, para evitar una mordedura, en especial si el espécimen es venenoso. Como parte del Plan de Respuesta a Emergencias Médicas, el proyecto dispondrá debidamente refrigerado, como mínimo de 6 dosis de suero polivalente. También se tendrá una provisión de ganchos de aluminio acondicionados para la captura de serpientes y recipientes plásticos con tapa y perforaciones debidamente rotulados (indicando la presencia de serpientes). Se dejará constancia por escrito del número de individuos entregados o liberados de acuerdo con las instrucciones de la CVS al respecto. Se conservará un registro fotográfico de las diferentes especies encontradas. Quedará terminantemente prohibido la caza, la pesca o captura de especies con						

MANEJO DE FAUNA DURANTE LAS LABORES DEL APROVECHAMIENTO FORESTAL, DESMONTE Y LIMPIEZA				
	fines comerciales o de manutención.			
Tipo de medidas	Preventivas		Compensativas	
	Correctivas	X	De mitigación	X
Lugar de aplicación	Terreno intervenido por el Proyecto			
Población beneficiada	Habitantes aledaños al área de influencia directa.			
Mecanismos y estrategias participativas	– Educación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional para todos los empleados, conductores, operadores y trabajadores de la obra. – Charlas de 5', recalcando al personal los aspectos, impactos y riesgos presentes, con sus acciones de control.			
Cronograma	La presente ficha estará vigente durante las labores de desmonte y limpieza y de aprovechamiento forestal.			
Responsable de ejecución	Personal de contratistas encargados de estas actividades.			
Seguimiento y monitoreo	- Inspector Ambiental. Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. - Programa de Monitoreo Operativo.			
Indicadores				Metas
Número de individuos ahuyentados o reubicados por especies / Número de individuos encontrados o avistados por especies				100%
Número de actas de entrega o de liberación de fauna de acuerdo con instrucciones de la CVS.				
Personal requerido	- 1 inspector Ambiente, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. - 1 experto en manejar la flora y fauna silvestre.			
Presupuesto	Los costos asociados formarán parte de los costos operativos de la obra.			

IDENTIFICACIÓN DE DETERMINANTES AMBIENTALES DENTRO DEL PROYECTO
De acuerdo con la nota interna con radicado N°20233101707, se manifiesta lo siguiente:

Una vez realizada la georreferenciación de las coordenadas de los puntos solicitados, referidos en la Nota Interna, 20233101672, sobre verificación de los determinantes ambientales y luego de consultadas las fuentes de información de la Corporación se pudo constatar que:

Los puntos solicitados NO se encuentran localizados dentro del sistema nacional de áreas protegidas inscritas en el RUNAP, Distritos de Conservación de suelos, Distritos de Manejo Integrado, Parques Nacionales Naturales o Reservas Forestales Nacionales

Según la zonificación Ambiental del POMCA Sinú, el polígono solicitado se encuentra clasificado así:

ZONA DE USO Y MANEJO	SUBZONA DE USO Y MANEJO
Áreas Urbanas	Áreas urbanas, municipales y distritales

Los puntos solicitados NO se encuentran en zona de recarga de acuíferos.

Según el plan general de ordenación Forestal - PGOF, el punto solicitado se encuentra clasificado como Áreas No Forestales.

Según el POT Vigente del municipio de Montería, plano 08_G (Amenaza de inundación urbana) y 28_U(áreas de actividad), los puntos solicitados con ID de 14 al 35 se encuentran en zona de amenaza ALTA por inundación, el resto de puntos se encuentran en zona de amenaza MEDIA por inundación, igualmente los puntos se encuentran en zona con Área de actividad residencial mixto.

Después de analizar los determinantes ambientales correspondientes, se ha determinado que no existen limitaciones para el aprovechamiento forestal de los individuos solicitados. Esto se debe a que los árboles en cuestión se encuentran ubicados en áreas categorizadas como no forestales, donde el aprovechamiento forestal no está sujeto a restricciones. Además, es importante destacar que estas áreas se encuentran dentro de zonas urbanas.

Sin embargo, es fundamental que se cumplan rigurosamente todas las obligaciones y recomendaciones ambientales emitidas en el presente concepto. Estas medidas tienen como objetivo garantizar la protección y preservación del entorno ambiental durante el proceso de aprovechamiento forestal.

Imagen 4. Actividades POT

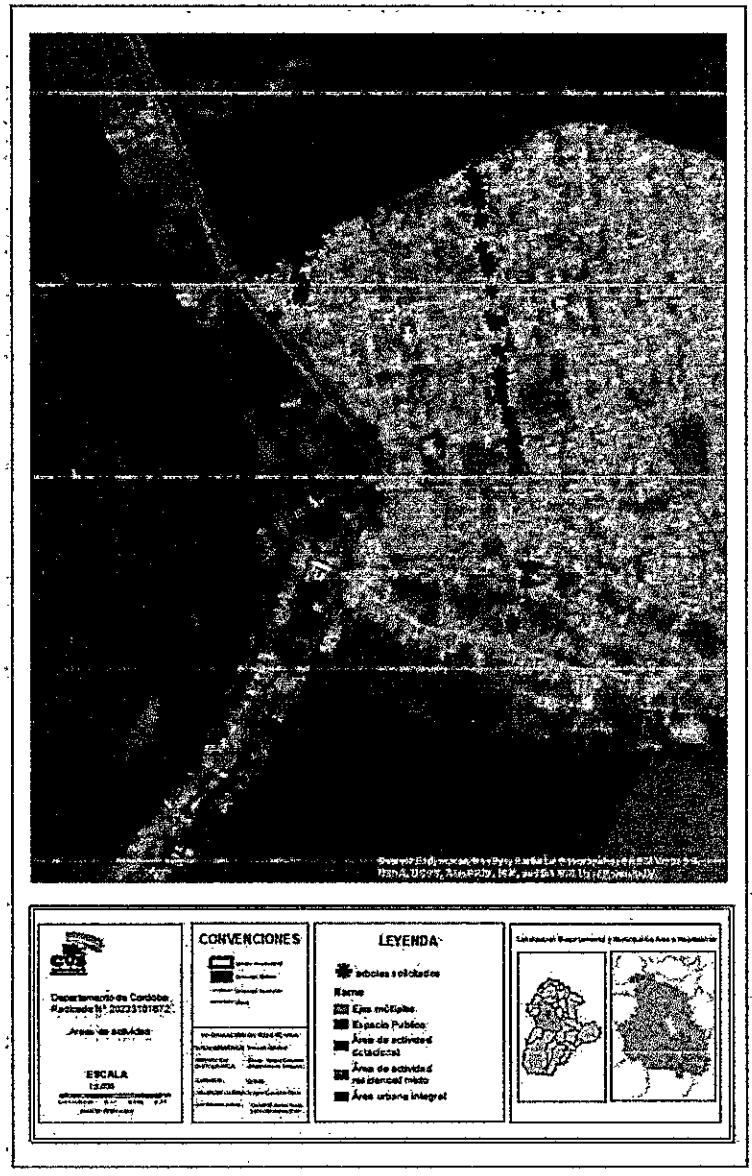


Imagen 5. Amenaza de inundación

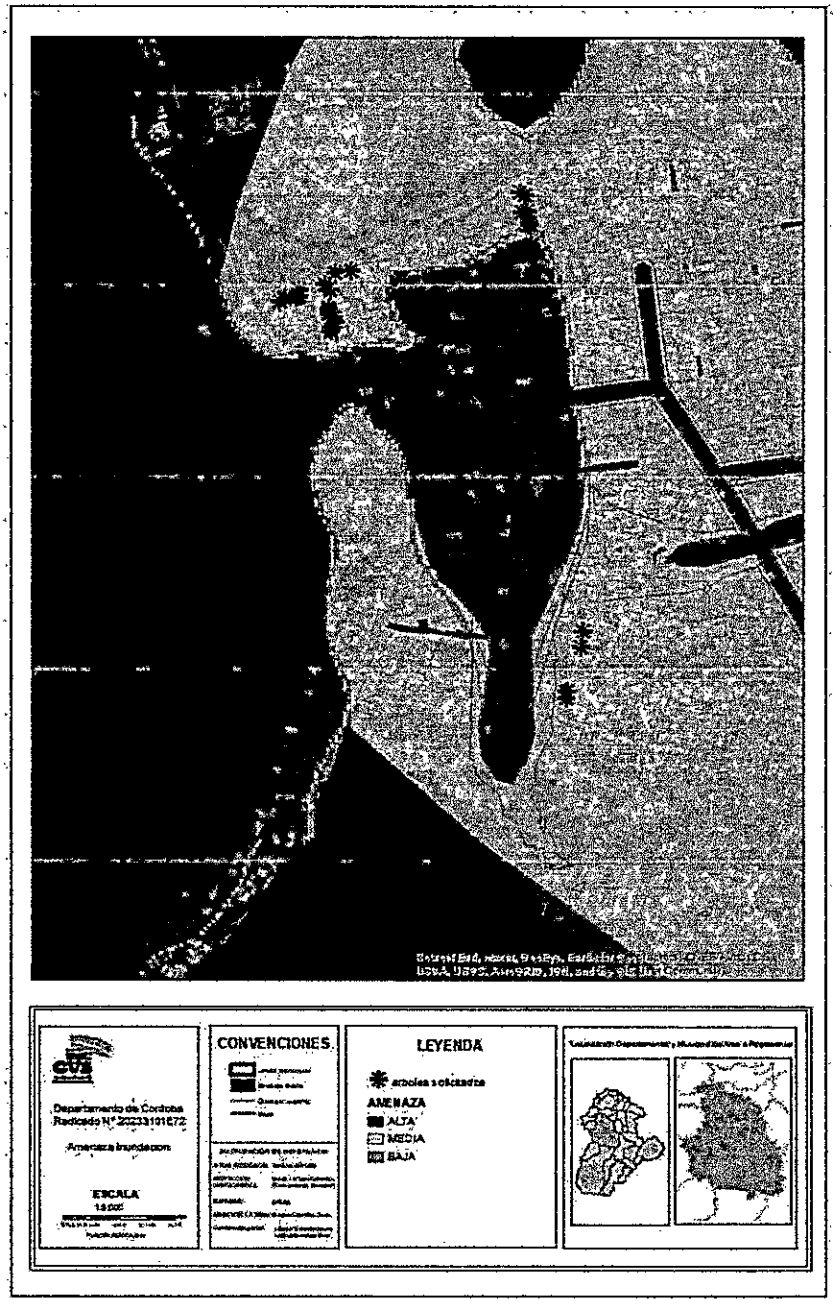


Imagen 6. Zonificación ambiental


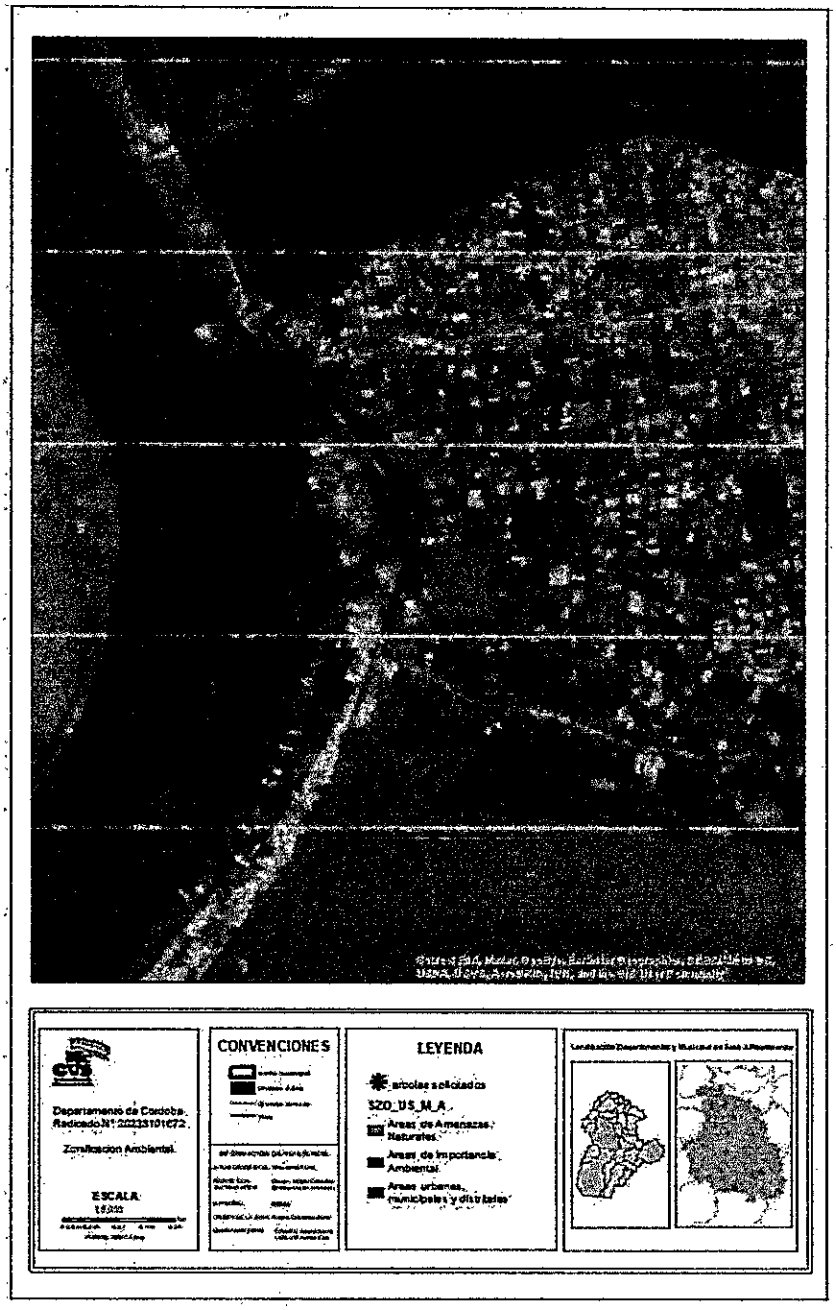


Imagen 7. Zonificación forestal

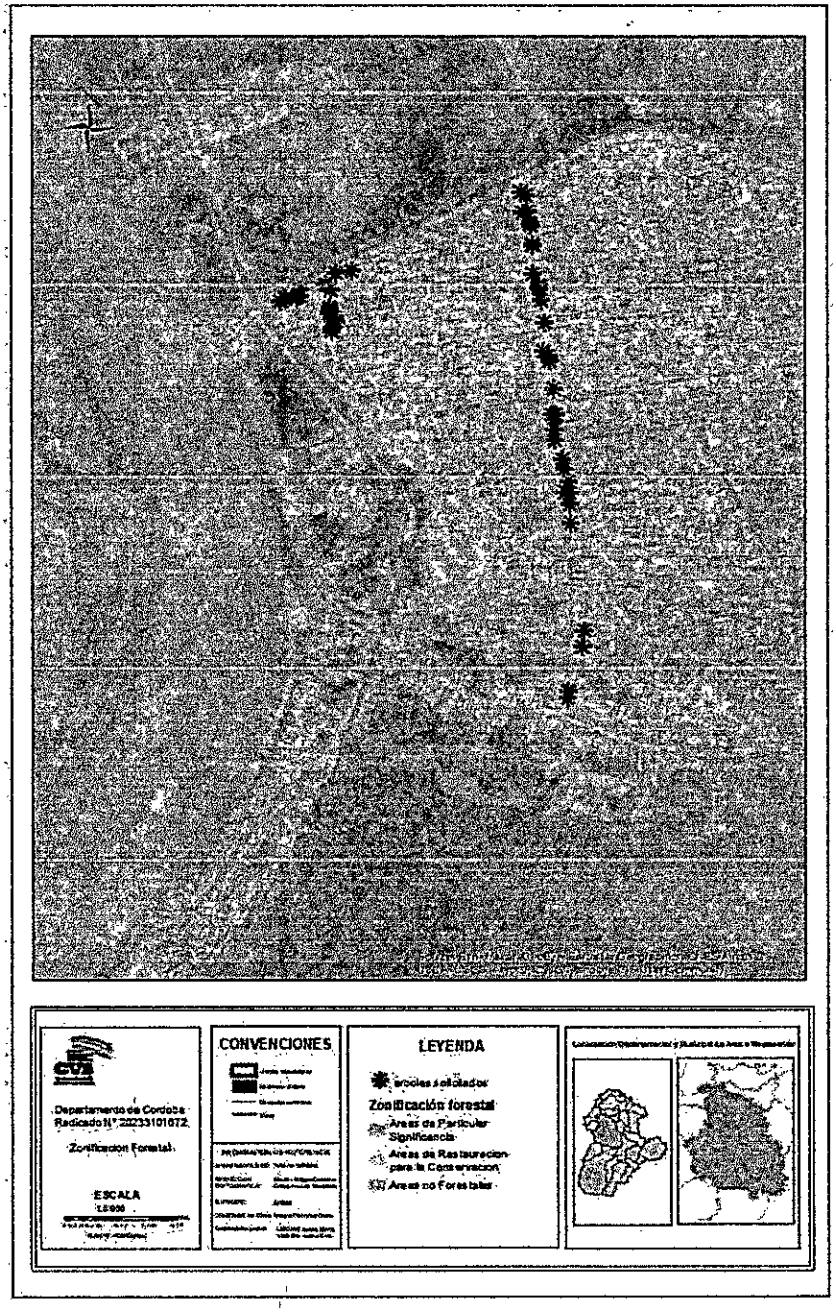

CONCLUSIONES

Se verificó del inventario forestal 100 % los individuos en cuanto a especie, DAP, altura y coordenadas presentadas dentro del plan de aprovechamiento forestal; encontrando que

la información presentada es adecuada y veraz con un error de +/ 2 cm en términos de DAP y Altura, debido a la diferencia de instrumentación utilizada.

La justificación para el aprovechamiento de los árboles se basa en la necesidad de garantizar la movilidad adecuada de los peatones y personas con baja movilidad o discapacidad en el área de diseño del proyecto. Este enfoque está respaldado por el acta de socialización y concertación con la comunidad, así como por la consideración del área como espacio público.

En total se solicita la intervención a cuarenta y nueve (49) individuos donde, representados en veinticinco especies, donde las más representativas son: Mango (*Mangifera indica*), Oiti (*Licania tomentosa*), Totumo (*Crescentia cujete*), Almendro (*Terminalia catappa*) y Mangle zaragoza (*Conocarpus erectus*).

Que los individuos de la especie Mango (*Mangifera indica*) y Pera (*Syzygium malaccense*), como especies frutales no necesitan permiso o autorización para su aprovechamiento, según el Decreto 1532 del 2019 el cual indica que: las especies frutales con características leñosas podrán ser objeto de aprovechamiento para obtener productos forestales, caso en el cual requerirán únicamente el Salvoconducto Único Nacional en línea SUNL, de conformidad con las Resoluciones 1909 de 2017 y 081 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Que se otorgará permiso a cuarenta y tres (43) árboles para su aprovechamiento forestal.

Con relación al aprovechamiento de los árboles en el área de diseño del proyecto, desde un punto de vista técnico, se justifica su eliminación debido a que su ubicación dentro de la zona destinada a los andenes restringe la movilidad y accesibilidad de peatones y personas con baja movilidad o discapacidad. Además, su presencia representa un riesgo para la seguridad vial, ya que obstaculizan la visibilidad y podrían generar accidentes. Cumpliendo con normativas y estándares de infraestructura vial, la remoción de estos árboles contribuirá a mejorar la funcionalidad y seguridad de la vía.

RECOMENDACIONES

Otorgar permiso de aprovechamiento forestal de árboles aislados, al municipio de Montería, representando legalmente por el doctor **CARLOS ALBERTO ORDOSGOITIA SANÍN**, en calidad de alcalde, de cuarenta y tres (43) árboles de diferentes especies, que corresponden a un total de CINCO COMA OCHENTA Y SIETE METROS CÚBICOS (5.87 m^3) DE MADERA, para el desarrollo del **"MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS PAZ DEL NORTE, 20 DE JULIO, LAS PARCELAS Y MOCARI EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".**

INDIVIDUOS PARA APROVECHAMIENTO FORESTAL

Tabla 9. Volumen total del aprovechamiento forestal solicitado.

N° de Árboles	Área (ha)	Volumen (m^3)
43	0.90	5.87 m^3

Tabla 10. Datos dendrométricos de los árboles autorizados para aprovechamiento forestal.

Número de árboles	ID	Nombre común	Familia	*Nombre científico*	DAP (m)	HT (m) Altura Total Calculada	Vol. (m3) Total	X	Y
1	3	Almendro	Combretaceae	*Terminalia catappa*	0.42	8	0.72	1134095.35	1465687.43
2	4	Almendro	Combretaceae	*Terminalia catappa*	0.31	8	0.39	1134099.00	1465689.28
3	6	Palma real	Arecaceae	*Roystonea regia*	0.16	5	0.06	1134130.59	1465704.20
4	8	Totumo	Bignoniaceae	*Crescentia cujete*	0.14	5	0.05	1134163.97	1465720.73
5	9	Totumo	Bignoniaceae	*Crescentia cujete*	0.11	4.5	0.03	1134375.69	1465818.51
6	10	Totumo	Bignoniaceae	*Crescentia cujete*	0.13	4.5	0.04	1134382.21	1465814.49
7	11	Totumo	Bignoniaceae	*Crescentia cujete*	0.16	4.5	0.06	1134385.50	1465795.55
8	12	Mangle zaragoza	Combretaceae	*Conocarpus erectus*	0.13	4.5	0.04	1134379.32	1465793.92
9	13	Totumo	Bignoniaceae	*Crescentia cujete*	0.10	4	0.02	1134387.80	1465781.02
10	14	Totumo	Bignoniaceae	*Crescentia cujete*	0.10	4	0.02	1134388.26	1465777.30
11	15	Almendro	Combretaceae	*Terminalia catappa*	0.19	9	0.17	1134389.98	1465753.47
12	16	Almendro	Combretaceae	*Terminalia catappa*	0.29	9	0.38	1134390.25	1465753.08
13	17	Mangle zaragoza	Combretaceae	*Conocarpus erectus*	0.11	4.5	0.03	1134390.16	1465717.15
14	18	Mangle zaragoza	Combretaceae	*Conocarpus erectus*	0.14	4.5	0.04	1134398.22	1465702.41
15	19	Mangle zaragoza	Combretaceae	*Conocarpus erectus*	0.11	3.5	0.02	1134398.84	1465698.49
16	20	Mangle zaragoza	Combretaceae	*Conocarpus erectus*	0.24	3.5	0.10	1134400.90	1465683.97
17	21	Mangle zaragoza	Combretaceae	*Conocarpus erectus*	0.13	4	0.04	1134405.31	1465655.45
18	22	Veranera	Nyctaginaceae	*Bougainvillea glabra*	0.14	4	0.04	1134403.68	1465619.87
19	23	Mangle zaragoza	Combretaceae	*Conocarpus erectus*	0.19	3	0.06	1134410.69	1465613.56
20	24	Mangle zaragoza	Combretaceae	*Conocarpus erectus*	0.22	4.5	0.11	1134411.49	1465608.52

Número de árboles	ID	Nombre común	Familia	*Nombre científico*	DAP (m)	HT (m) Altura Total Calculada	Vol. (m3) Total	X	Y
21	25	Mangle zaragoza	Combretaceae	*Conocarpus erectus*	0.18	4.5	0.07	1134416.74	1465572.07
22	26	Mangle zaragoza	Combretaceae	*Conocarpus erectus*	0.19	4.5	0.08	1134420.34	1465540.92
23	27	Mangle zaragoza	Combretaceae	*Conocarpus erectus*	0.25	4	0.13	1134414.25	1465541.35
24	28	Pimiento	Phyllanthaceae	*Phyllanthus elsiae*	0.20	4	0.08	1134417.65	1465522.48
25	29	Florisanto	Fabaceae	*Brownea ariza*	0.18	6	0.10	1134418.71	1465509.10
26	30	Mangle zaragoza	Combretaceae	*Conocarpus erectus*	0.20	3.5	0.07	1134428.18	1465485.12
27	31	Almendro	Combretaceae	*Terminalia catappa*	0.21	7	0.16	1134430.46	1465473.00
28	32	Mangle zaragoza	Combretaceae	*Conocarpus erectus*	0.23	4.5	0.13	1134436.01	1465457.48
29	34	Ñipi	Euphorbiaceae	*Sapium haematospermum*	0.48	4	0.47	1134436.70	1465443.38
30	35	Oiti	Chrysobalanaceae	*Licania tomentosa*	0.16	4.5	0.06	1134437.12	1465429.95
31	36	Palma real	Arecaceae	*Roystonea regia*	0.54	7	1.05	1134437.76	1465406.23
32	37	Mangle zaragoza	Combretaceae	*Conocarpus erectus*	0.19	4	0.07	1134455.56	1465270.19
33	38	Mangle zaragoza	Combretaceae	*Conocarpus erectus*	0.14	4.5	0.04	1134452.64	1465251.21
34	39	Ninguito	Muntingiaceae	*Muntingia calabura*	0.22	8	0.19	1134434.70	1465195.03
35	40	Naranjo	Rutaceae	*Citrus × sinensis*	0.25	6	0.20	1134435.45	1465194.86
36	41	Narajuelo	Capparidaceae	*Capparis odoratissima*	0.26	8	0.29	1134433.661	1465187.122
37	42	Oiti	Chrysobalanaceae	*Licania tomentosa*	0.09	4.5	0.02	1134138.07	1465697.60
38	43	San joaquin	Boraginaceae	*Cordia sebestena*	0.10	5	0.03	1134136.36	1465674.22
39	44	Oiti	Chrysobalanaceae	*Licania tomentosa*	0.11	4.5	0.03	1134136.39	1465672.19
40	45	Oiti	Chrysobalanaceae	*Licania tomentosa*	0.10	4.5	0.02	1134136.92	1465667.88
41	46	Oiti	Chrysobalanaceae	*Licania tomentosa*	0.11	4	0.03	1134142.94	1465662.35
42	47	Oiti	Chrysobalanaceae	*Licania tomentosa*	0.11	4	0.02	1134143.75	1465657.47
43	49	Oiti	Chrysobalanaceae	*Licania tomentosa*	0.17	8	0.12	1134139.13	1465645.92

Número de árboles	ID	Nombre común	Familia	*Nombre científico*	DAP (m)	HT (m) Altura Total Calculada	Vol. (m3) Total	X	Y
TOTAL							5.87		

PERIODO DE APROVECHAMIENTO Y MOVILIZACIÓN

Para las actividades de aprovechamiento forestal (tala) y la movilización de los productos y/o residuos, se otorga un tiempo de OCHO (08) meses calendario desde la ejecutoria del acto administrativo.

Que la Corporación autoriza la comercialización de dichos productos. No obstante, los productos obtenidos también podrán ser destinados para uso netamente doméstico en calidad de donación o uso del titular del aprovechamiento y deberán aportarse las actas de donación en el informe de cumplimiento ambiental.

Para la movilización de productos de primer grado de transformación, se deberá tramitar el Salvoconducto Único Nacional en Línea – SUNL conforme a la resolución 1909 de 2017.

ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL

El MUNICIPIO DE MONTERÍA, para el desarrollo de las actividades de aprovechamiento forestal deberá implementar las siguientes medidas de manejo ambiental:

- Sólo se podrán aprovechar aquellos individuos pertenecientes a las especies identificadas y aprobadas en el inventario forestal presentado.
- Se deberá recuperar la capa de suelo orgánica para ser empleada en los procesos de rehabilitación de áreas dentro del proyecto a desarrollar.
- El material vegetal resultante del aprovechamiento forestal que no sea utilizado dentro del proceso deberá ser empleado, mediante su descomposición como aporte de materia orgánica a los suelos recuperados. Este material no podrá ser dispuesto bajo ninguna circunstancia en los botaderos.
- El material vegetal resultante de las actividades de aprovechamiento forestal lo mismo que el suelo recuperado del descapote, deberán ser dispuestos en lugares apropiados con el propósito de garantizar que los mismos no causen taponamiento a los drenajes naturales de la zona o interfiera el flujo normal y natural de los mismos.
- No realizar quemas del material vegetal cortado.
- No realizar la disposición directa de materiales estériles o suelos sobre áreas cubiertas con vegetación.
- La operación de remoción de vegetación deberá realizarse de manera selectiva con herramientas manuales y de manera gradual con el propósito de permitir el desplazamiento de la fauna que pueda encontrase dentro del área a intervenir.

El corte de los árboles con diámetros mayores a 10 centímetros de DAP deberá realizarse con motosierras y/o herramientas manuales (hachas, machetes, barras y cuñas), con el propósito de obtener la mayor cantidad de productos posibles para ser empleados de acuerdo con los usos propuestos. Por lo anterior dicha actividad no podrá efectuarse con tractores de orugas, bulldozer o retroexcavadoras.

- Se deberá brindar capacitación al personal que ejecutará las actividades contempladas dentro del aprovechamiento forestal autorizado con el propósito de garantizar la seguridad de los mismos y reducir los impactos ambientales negativos causados por el desarrollo de las diferentes actividades (Acta de Capacitaciones).
- Los residuos tanto domésticos (papel, cartón, plásticos, etc.) e industriales (lubricantes, estopas impregnadas de aceite, entre otros), que se puedan generar durante el aprovechamiento, deberán ser dispuestos adecuadamente, de acuerdo al plan de gestión de residuos sólidos de la empresa.

La persona autorizada debe coordinar con las entidades prestadoras de servicios públicos, en el caso de requerir el retiro de acometidas o la interrupción del servicio durante el tiempo que dure actividad, así como con la Policía, en caso de que sea necesario el cierre de la vía aledaña a donde se localizan los árboles, para evitar accidentes durante el desarrollo de la misma.

MEDIDA DE REPOSICIÓN

Para calcular el número de árboles a reponer se procedió con la metodología establecida por la CVS, a través de la Resolución 3-0235 del 28 de diciembre de 2022 para el cálculo del factor de reposición forestal, se establece:

$$N° \, de \, árboles \, a \, reponer = \sum (N_i * sp_1 * FR, \ldots + N_i * sp_i * FR)$$

Donde,

Ni = número de árboles a intervenir por especie
Sp1 = número de árboles por especie autorizada
FR = Factor de reposición forestal (mínimo 4 – máximo 15)

El factor de reposición forestal se calculará acorde con la siguiente expresión:

$$FRF = \sum (C + Z + I + P)$$

Donde,
C = Cobertura (valores entre 1 y 4)
Z = Zona de vida (Holdrige) (valores entre 1 y 4)
I = Importancia (valores entre 1 y 4)
P = Procedencia (valores entre 1 y 3)

Para proceder con la metodología de determinación del Factor de Reposición Forestal (FRF), se determinó para cada variable lo siguiente lo siguiente:

Cobertura: Se identificó la cobertura vegetal ocupado por las especies autorizadas (Pastos arbolados).

Zona de Vida: Se verificará la zona de vida en la cual se encuentra el proyecto, la obra o actividad (Bosque seco tropical, valor 4).

c) Importancia: Se verificó, en primera instancia si las especies solicitadas se encontraban en algún grado de amenaza (Resolución 1912 del 15 de septiembre de 2017, Lista Roja de Plantas o CITES), si su aprovechamiento se encuentra vedado o si corresponde a una especie endémica, para lo cual se asignó un valor de importancia 2 para la especie *Crescentia cujete,* y un valor de 1 para las demás especies.

Expuesto lo anterior se tiene:

Especie	Variables						Número de árboles a reponer
	Cobertura	Zona de vida	Importancia de la especie	Procedencia	FRF	Número de árboles por especie autorizados	
Roystonea regia	2	4	1	2	9	2	18
Crescentia cujete	2	4	2	3	11	6	66
Cordia sebestena	2	4	1	3	10	1	10
Capparis odoratissima	2	4	1	3	10	1	10
Licania tomentosa	2	4	1	2	9	7	63
Terminalia catappa	2	4	1	2	9	5	45
Conocarpus erectus	2	4	1	3	10	15	150
Sapium haematospermum	2	4	1	3	10	1	10
Brownea ariza	2	4	1	3	10	1	10
Muntingia calabura	2	4	1	3	10	1	10
Bougainvillea glabra	2	4	1	2	9	1	9
Phyllanthus elsiae	2	4	1	2	9	1	9
Citrus × sinensis	2	4	1	2	9	1	9

Condicionar al MUNICIPIO DE MONTERÍA, identificado con Nit 800096734-1, representado legalmente por el Doctor CARLOS ALBERTO ORDOSGOITIA SANÍN, identificado con cédula de ciudadanía N°79969238 de Bogotá D.C, en calidad de alcalde, o quien haga sus veces, que, como medida de reposición al aprovechamiento forestal

autorizado, deberá reponer un total de cuatrocientos diecinueve (419) árboles de especies nativas, conforme a la metodología indicada en la Resolución 3-0235 del 28 de diciembre de 2022.

Se deberá adelantar el "Documento técnico de la medida de reposición", incluyendo las actividades de aislamiento, mantenimiento y seguimiento necesarias durante la vida útil del proyecto, tiempo en el cual alcanzar unas condiciones similares o iguales a las encontradas antes de realizar la afectación por las actividades de aprovechamiento por lo menos durante un periodo mínimo de tres (03) años.

El autorizado en un término NO MAYOR A DOS (02) MESES a partir de la ejecutoria del acto administrativo por el cual se otorga el aprovechamiento forestal deberá enviar para su evaluación y aprobación del Documento técnico de la medida de reposición; el cual debe contener como mínimo lo siguiente:

- Objetivos y alcances del documento.
- Descripción del área e individuos a intervenir (Incluyendo la contextualización del aprovechamiento (Cantidad, especies e información relevante de la actividad)
- Delimitación en polígono (formato shapefile) del área seleccionada para la plantación.
- Caracterización físico-biótica del área seleccionada para ejecutar la plantación (incluyendo ecosistemas, coberturas, fauna y flora asociada).
- Especies a establecer, los criterios de selección de las mismas y las características de cada una de ellas. Se deben proponer como mínimo 10 especies diferentes.
- Diseños y arreglos forestales según la acción seleccionada (Restauración, Rehabilitación, Enriquecimiento y otros).
- Plan de establecimiento, características de los individuos a establecer, obtención del material vegetal, labores pre y pos trasplante, plantación, productos empleados, protección contra incendios forestales, aislamiento de la plantación etc.
- Plan de mantenimiento, el cual incluirá: visitas técnicas, limpieza, plateo, fertilización, control de plagas, reposición, podas, protección contra incendios forestales y aislamiento de la plantación, entre otras que se requieran de acuerdo a las características del sitio.
- Plan de monitoreo y seguimiento: Indicadores de sobrevivencia, crecimiento y desarrollo de la plantación.
- Si el área a plantar se encontrase en predios que no sean de propiedad de la persona autorizada se levantarán actas de acuerdo y compromiso con los propietarios de los predios, donde se establezca que las plantaciones deberán poseer un carácter protector. Se deberán aportar documentos de propiedad.
- Cronograma de ejecución, donde se detallen las actividades de aislamiento, establecimiento, mantenimiento y monitoreo de la plantación.
- Costos estipulados para el desarrollo de cada una de las actividades a desarrollar durante la implementación del Programa de reposición.

- Propuesta de manejo a largo plazo que garantice que la plantación sea autosostenible y perdure en el tiempo.

De igual manera, se debe garantizar el mantenimiento de la reposición por el termino de tres (03) años o hasta ser entregada a la Corporación y se requiere la presentación de los informes de mantenimiento los primeros cinco (05) días de cada mes en una periodicidad semestral, durante los tres (03) años de ejecución de dicho mantenimiento.

El acreedor de la obligación debe garantizar la presencia de la reposición ante eventos fortuitos como incendios, inundaciones entre otros. En el caso, que estos eventos se presenten debe comunicarle a la Corporación por escrito aportando las evidencias que demuestren lo ocurrido y solicitar la ampliación del tiempo de mantenimiento que se tenga pendiente al momento del evento, al cabo de la terminación del mantenimiento se debe entregar para el cierre el 95% de sobrevivencia de la reposición impuesta.

Cabe resaltar que, si la siembra no sobrevive en el tiempo estipulado por malas prácticas de mantenimiento será responsabilidad del condicionado su reposición, por ende, el tiempo empezará a contarse desde el día en que se realice la siembra de los individuos arbóreos nuevamente.

De igual manera se indica que, la reposición deberá ser registrada como plantación protectora ante la Corporación conforme al Decreto 1532 de 2019 del Ministerio De Ambiente Y Desarrollo Sostenible (MADS), por tanto, el usuario previo a la entrega y cumplimiento del tiempo de mantenimiento solicitará a la CVS el registro.

En caso de considerar aplicar una propuesta diferente a restauración, rehabilitación y uso sostenible en el marco de alguna de las seis (6) estrategias de compensación indicadas en la Resolución 3-0235 del 28 de diciembre que define los lineamientos de compensación para el departamento de Córdoba; se deberá presentar el documento técnico de reposición bajo la misma estructura, pero desarrollando la propuesta que se escoja por parte del autorizado.

INFORME DE CUMPLIMIENTO PARA ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO

El MUNICIPIO DE MONTERÍA, deberá presentar un informe de cumplimiento, donde se presenten los resultados de las actividades de aprovechamiento forestal (tala) desarrolladas durante el periodo reportado y que deberán incluir como mínimo la siguiente información:

- Áreas y volúmenes aprovechados a la fecha.
- Individuos aprovechados en el periodo con su respectivo volumen, ID y coordenada de ubicación.
- Destino de los productos obtenidos por el desarrollo del aprovechamiento forestal con sus respectivos registros y salvoconductos en caso de requerirse la movilización de productos.
- Área aprovechada durante el periodo reportado, anexando mapa con polígonos georreferenciados.

- Ubicación georreferenciada de los sitios donde han sido almacenados los subproductos del material cortado y el suelo recuperado.
- Medidas de mitigación y acciones complementarias implementadas durante el desarrollo del aprovechamiento forestal, con sus respectivos soportes.
- Registro de la capacitación brindada al personal encargado de realizar el aprovechamiento forestal autorizado y el manejo de fauna encontrada, y que incluya entre otros aspectos las medidas orientadas a la seguridad en la operación y a la disminución de los impactos que puedan generarse de la actividad.
- Registro fotográfico completo de las diferentes actividades desarrolladas.
- Presentar la información solicitada en medio físico y magnético

INFORMES DE CUMPLIMIENTO MEDIDA DE REPOSICIÓN

La reposición se deberá ejecutar en un tiempo máximo de seis (06) meses desde la realización del aprovechamiento forestal, y cumplido los seis (06) meses o apenas se haga la siembra se deberá entregar un informe del establecimiento con mínimo lo siguiente:

Informe de establecimiento

- Acto administrativo que impone la obligación.
- Descripción de las actividades ejecutadas de establecimiento de manera detallada indicando fechas, forma de ejecución e insumos y su respectivo soporte fotográfico por actividad.
- Números de árboles plantados por especie y por sitio establecido.
- Diseños de plantación y arreglos espaciales de las actividades de plantación ejecutados, en el cual se indique el número de árboles por especie y por cada sitio.
- Área efectivamente plantada con su registro fotográfico.
- Soportes de adquisición de postes para los aislamientos en lugares autorizados de carácter legal.
- Aportar la delimitación de las áreas de reposición en formato shapefile y/o kmz.
- Cronograma de mantenimiento.

De igual manera, se debe garantizar el mantenimiento de la reposición por el término de tres (03) años y se requiere la presentación de los informes de mantenimiento los primeros cinco (05) días de cada mes en una periodicidad semestral, durante los tres (03) años de ejecución de dicho mantenimiento, indicando mínimo lo siguiente:

Informe de mantenimiento

- Acto administrativo que impone la obligación.

- Descripción de las actividades ejecutadas de mantenimiento de manera detallada indicando fecha, forma de ejecución e insumos y su respectivo soporte fotográfico por actividad.
- Números de árboles por especie y por sitio remanentes.
- Porcentaje de mortalidad y/o porcentaje de supervivencia de la plantación.
- Indicadores de crecimiento y desarrollo.
- Historial de las labores de mantenimiento ejecutadas.
- Área efectivamente mantenida con su registro fotográfico.
- Aportar la delimitación de las áreas de reposición remanente en formato shapefile y/o kmz (En caso de pérdida).
- Avance del cronograma de mantenimiento y/o modificaciones.

MEDIDAS DE MANEJO PARA LA FLORA VASCULAR Y NO VASCULAR

OBLIGACIÓN 1:

El titular del permiso, **en caso de registrar individuos en el momento del aprovechamiento** deberá realizar el rescate y traslado de como mínimo el 70%de los individuos de epifitas vasculares en veda encontrados de la familia ORCHIDACEAE y BROMELIACEAE, así mismo la ejecución de un plan de seguimiento y monitoreo proyectado para un periodo mínimo de tres (3) años.

Se debe presentar los reportes del monitoreo y seguimiento donde se incluya indicadores de seguimiento orientados a la medición de la mortalidad y sobrevivencia, la aparición de nuevos individuos o agregados, la floración, el estado fitosanitario, el marchitamiento y/o la presencia de enfermedades o patógenos, describiendo las medidas de corrección y manejo adaptativo del caso, en una periodicidad semestral durante los 3 años.

CON LAS SIGUIENTES DIRECTRICES:

1. Rescatar, trasladar y reubicar el 70% de los individuos de las especies de orquídeas y Bromelias.
2. Rescatar, trasladar y reubicar el 70% de los individuos de las especies de orquídeas y Bromelias que hayan sido encontradas durante el desarrollo de las actividades del proyecto y que no se identificaron por altura del dosel.
3. La selección de las especies para el rescate, traslado y reubicación deberán estar bajo los criterios de diversidad, fitosanitarios, reproductivos y de senescencia y acorde al ciclo de vida de las especies.
4. Los porcentajes de rescate deberán realizarse sobre el total de individuos o coberturas hallados en el área de intervención y no sobre la abundancia estimada en el muestreo realizado.
5. Diseñar e implementar estrategias de manejo adaptativo que incluyan, entre otras, acciones de mantenimiento de las especies luego de la reubicación, tales como, el riego para control en épocas secas y el control de luz.

6. Propender por la supervivencia de alrededor del 80% de los individuos de bromelias y orquídeas que sean objeto de rescate, traslado y reubicación.
7. Para el rescate de epifitas se deberá realizar el ascenso a los hospederos previo a la tala, o en su lugar, realizar una tala controlada, con el fin de garantizar que el material a rescatar no se pierda y será reportado en los informes de seguimiento.
8. Garantizar la no afectación de los forófitos que albergaran los especímenes trasladados, estableciendo porcentajes máximos de reubicación por grupo para cada forófitos receptor y de acuerdo por la población epifitica ya existente en el forófitos.
9. Marcar y georreferenciar los nuevos hospederos para su posterior ubicación y seguimiento
10. Marcar y registrar los especímenes reubicados con el fin de hacer el adecuado monitoreo y seguimiento del traslado y reubicación de las especies objeto de veda.
11. Adelantar la recolección del material de amarre (no biodegradable).
12. Los sitios a seleccionar para llevar a cabo esta medida deberán presentar en un término de 30 días previo al desarrollo de la actividad de traslado y reubicación:

➢ Coberturas de bosques de galería asociados a franjas de protección de drenajes, quebradas, preferiblemente en áreas bajo figura de protección que existan en área de influencia directa o indirecta del proyecto.

➢ Características físicas y bióticas de las nuevas áreas similares a las áreas de rescate, preferiblemente con hospederos de las mismas especies de forófitos de sitio de extracción.

OBLIGACIÓN 2:

Para la medida de manejo por la afectación de la flora epifita no vascular, la medida empleada es la rehabilitación ecológica de un área equivalente al área intervenida, con el fin de preservar el acervo genético de las especies de epífitas no vasculares y recuperar la funcionalidad, el suministro de servicios ecosistémicos y el favorecimiento de la conectividad con otros ecosistemas o áreas con algún grado de protección.
Para ello, se debe imponer a la titular la obligación de presentar una propuesta de restauración.
Es preciso indicar que el cálculo del área a implementar las acciones de rehabilitación ecológica se realizó bajo los lineamientos establecidos por la circular MADS 8201-2-808 del 9 de diciembre de 2019 en su Anexo 1.

Tabla 11 . Relación de área a retribuir por afectación de hábitats de especies de flora en veda.

Coberturas de intervención	Área (ha)	Relación en área a retribuir	Área a retribuir (ha)

Pastos arbolados	0.90	0.3	0.27
Área a rehabilitar (ha)			**0.27**

En este orden de ideas, el titular del permiso, como medida compensatoria por la afectación, se deberá realizar acciones de recuperación, rehabilitación y restauración un área de **0.27 ha**, siguiendo los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Restauración: Restauración Ecológica, Rehabilitación y Recuperación de áreas Disturbadas (MADS, 2015). Así mismo, se debe ejecutar un mantenimiento y seguimiento por un tiempo de 3 años desde el establecimiento. Por otra parte, se deben presentar informe de establecimiento de la rehabilitación una vez se ejecute y los informes de mantenimiento en periodicidad semestral durante los 3 años de mantenimiento. La densidad de la rehabilitación es de 825 árboles por hectárea, equivalentes al establecimiento de doscientos veintitrés (223) árboles.

Con las siguientes directrices:

- La rehabilitación deberá realizarse en áreas con remanentes de coberturas asociados a rondas hídricas, ríos y/o quebradas, preferiblemente ubicados en áreas de ecosistemas sensibles y áreas naturales protegidas.
- Si el área escogida para llevar a cabo las acciones de rehabilitación es de carácter privado, se deberá establecer con el propietario el mecanismo para asegurar que las acciones perduren en el tiempo.
- Registrar ante la Corporación, según corresponda, las plantaciones forestales, cerca viva, barrera rompevientos o sombríos de finalidad protectora o protectora – productora que se realicen en el proceso de enriquecimiento.

INFORME SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA TRASLADO

1. Descripción específica de cada una de las actividades realizadas
2. Indicadores de seguimiento al proceso (Índice de supervivencia, estado fitosanitario, vigor o estado de desarrollo del organismo reubicado, entre otros)
3. Indicadores de seguimiento al desarrollo, tales como, la aparición de nuevos individuos, floración, fructificación y la presencia de hijuelos, marchitamiento, presencia de plagas (Hongos o insectos)
4. Cronograma con la proyección de fechas actualizadas y ajustada al cronograma de ejecución del monitoreo y seguimiento
5. Descripción del sitio o sitios potenciales del traslado y reubicación de los organismos rescatados, el cual deberá contener las siguientes informaciones:

- Justificación técnica de la selección del sitio
- Localización y área
- Caracterización la composición florística y de especies de epifitas presentes
- Registro fotográfico

- Cartografía en escala entre 1:5000 a 1:10.000 con coberturas, cuerpos de agua y curvas de nivel.

INFORME SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA REHABILITACIÓN

1. Polígono georreferenciado de las áreas de implementación de la medida
2. Superficie plantada con sus fechas, indicando: número de individuos plantados, nombre científico y familia, y su clasificación en especies nativas y/o potencial forófitos.
3. Avances a la fecha de los arreglos florísticos establecidos, de acuerdo con la vegetación existente en el área seleccionada y su estado con respecto al grado de disturbio que está presente
4. Informar la procedencia del material vegetal a emplear
5. Reportar el análisis de crecimiento de los individuos establecidos (Alturas y diámetros)
6. Seguimiento de indicadores de supervivencia y estado fitosanitario. En el caso de registrar una supervivencia inferior al 95%, se debe documentar las causas y describir las acciones correctivas que tomen.
7. Reporte de las actividades de mantenimiento programadas y realizadas
8. Registro fotográfico
9. Cartografía impresa con escala grafica entre 1:2000 a 1:10.000 de la localización y delimitación del área incluyendo las coberturas acompañado del archivo Shape.
10. Descripción y análisis de la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo
11. Verificar y reportar las especies presentes en los estratos de dosel, mediante una adecuada colecta e identificación botánica en laboratorio y presentar el análisis de la estratificación vertical correspondiente.

INFORME FINAL DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO (Al finalizar los 3 años)

1. Compilar los resultados y análisis de resultados de todas las acciones desarrolladas en cumplimiento de las medidas establecidas, con el respectivo análisis de efectividad.
2. Realizar una caracterización de epifitas dentro del área en proceso de rehabilitación, considerando un análisis comparativo con los datos iniciales del área de intervención del proyecto. La identificación taxonómica de las especies a reportar deberá estar soportado por certificado de herbario
3. Presentar el análisis de los indicadores de seguimiento y monitoreo que permita establecer el porcentaje de colonización que presenten las especies de bromelias, musgos, líquenes y hepáticas, sobre los árboles y otros hábitos establecidos ene le objeto de intervención por las actividades del proyecto y del área seleccionada para el desarrollo de la medida de rehabilitación.
4. Describir cualitativamente la eficiencia de las medidas de manejo realizadas, teniendo en cuenta los resultados encontrados en el tiempo de seguimiento

5. Presenta evidencias de los mecanismos realizados para asegurar la permanencia de las medidas de manejo establecidas como acuerdos, convenios y otros.

RECOMENDACIONES DEL COMPONENTE DE FAUNA

- Se considera procedente aprobar la implementación de la metodología de ahuyentamiento propuesta para garantizar el bienestar de los ejemplares de fauna silvestre asociados a la zona de intervención. Días previos y durante las actividades de aprovechamiento forestal, el MUNICIPIO DE MONTERÍA, debe implementar medidas de ahuyentamiento de fauna, esto con el fin de que los organismos sean ahuyentados, capturados y/o reubicados en el sitio apropiado.

- Solo serán objeto de reubicación y manipulación aquellas especies que no respondan a los métodos de ahuyentamiento implementados. Por tanto, aquellas especies que no generen situaciones de riesgo a la comunidad, y/o no se vea afectado su bienestar, no deberán ser trasladadas de sitio.

- El MUNICIPIO DE MONTERÍA, deberá reportar la información de los animales ahuyentados y/o rescatados, en formatos de campo, indicando lugar y coordenadas de origen y de disposición final, nombre científico y nombre común, estado de salud, método de transporte, fecha y hora de captura y de liberación, fotos y cualquier otra información que consideren pertinentes para conocer la historia de cada uno de los animales.

- El MUNICIPIO DE MONTERÍA, deberá remitir a la CVS un (1) informe específico en materia de aplicación de las medidas de ahuyentamiento, rescate y reubicación de la Fauna Silvestre en el marco de las actividades de aprovechamiento forestal.

- Previo al aprovechamiento forestal se deberá realizar el rescate de nidos, neonatos, polluelos y juveniles, hallados en la zona de intervención. En lo posible, reubicar los nidos activos en árboles cercanos para que continúen su ciclo en el área de donde provienen. En caso de requerirse la reubicación de crías y/o polluelos, y atención de casos de fauna lesionada puede contactarse con el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre CAV de la CVS, para su recepción, al número 7890605 Extensión 122.

- Las especies capturadas o rescatadas no se podrán retener por mucho tiempo, máximo de 12 horas, las cuales deberán ser identificadas y reportadas a la CVS.

- El MUNICIPIO DE MONTERÍA, identificado con cédula de ciudadanía N° 71.667.307, deberá encargarse de la logística para el traslado y reubicación de la fauna silvestre si así se requiere.

- El transporte de los especímenes a reubicar debe ser lo más rápido posible y en compartimentos apropiados, tales como: guacales, jaulas, trampas, bolsas de tela,

entre otros. Los especímenes diurnos deben transportarse y liberarse en las primeras horas de la mañana, y nunca se debe exponer ningún ejemplar directamente al sol, ni mucho menos a altas temperaturas. No se deben realizar liberaciones masivas.

- Tener en cuenta que, el MUNICIPIO DE MONTERÍA, es responsable del bienestar de los animales asociados al área de influencia del área de intervención, por lo tanto, por ningún motivo debe darse la muerte de ejemplares de fauna silvestre durante la fase de aprovechamiento forestal y de las actividades de ahuyentamiento. Los casos de muerte de animales que sucedan en el marco del permiso de aprovechamiento deberán reportarse a la Corporación indicando las causas de los hechos. Por lo tanto, sus productos deben ser dispuestos siguiendo las indicaciones de la Resolución 2064 de 2010 y las consideraciones previas concertadas con la CVS.

El manejo técnico y reubicación de los ejemplares de fauna silvestre deberá ser atendido por un profesional en Biología o Zootecnia con experiencia u especialidad en fauna Silvestre y un profesional en veterinaria que realice la respectiva valoración médica veterinaria de los especímenes capturados, lo anterior con el fin de que todas las actividades se desarrollen técnicamente y con máxima seguridad

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que de acuerdo con el artículo 30 de la Ley 99 de 1993 corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes en materia de administración, manejo y aprovechamiento de los Recursos Naturales Renovables.

Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS, es la entidad competente para resolver la solicitud antes señalada de acuerdo con lo previsto en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, que señala: "otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva".

Que según el artículo 2.2.1.1.9.4 del Decreto 1076 del 2015. Cuando se requiera talar, trasplantar o reubicar árboles aislados localizados en centros urbanos, para la realización, remodelación o ampliación de obras públicas o privadas de infraestructura, construcciones, instalaciones y similares, se solicitara autorización ante la Corporación respectiva, ante las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o ante las autoridades municipales, según el caso, las cuales tramitaran la solicitud, previa visita realizada por un funcionario competente, quien verificará la necesidad de tala o reubicación aducida por el interesado, para lo cual emitirá concepto técnico.

La autoridad competente podrá utilizar dichas actividades, consagrando la obligación de reponer las especies que se autoriza talar. Igualmente, señalará las condiciones de la reubicación o trasplante cuando sea factible.

Parágrafo. Para expedir o negar la autorización de que trata el presente artículo, la autoridad ambiental deberá valorar entre otros aspectos, las razones de orden histórico, cultural o paisajístico, relacionadas con las especies objeto de solicitud.".

Que a su vez el Decreto 1076 de 2015 señala: "...Los productos que se obtengan de la tala o poda de árboles aislados, en las circunstancias descritas en el presente capítulo, podrán comercializarse, a criterio de la autoridad ambiental competente".

En virtud de lo anterior y acogiendo lo establecido en el Concepto Técnico N°2023-795 del 29 de mayo del 2023, se considera procedente otorgar el aprovechamiento de árboles aislados.

En mérito de lo expuesto se,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ÁRBOLES AISLADOS POR OBRA PÚBLICA, al MUNICIPIO DE MONTERÍA, identificado con Nit 800096734-1, como entidad administradora del espacio público, representado legalmente por el Doctor **CARLOS ALBERTO ORDOSGOITIA SANÍN,** para que realice el aprovechamiento de cuarenta y tres (43) árboles de diferentes especies, que corresponden a un total de CINCO COMA OCHENTA Y SIETE METROS CÚBICOS (5.87 m^3) DE MADERA, para el desarrollo del **"MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS PAZ DEL NORTE, 20 DE JULIO, LAS PARCELAS Y MOCARI EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".**

INDIVIDUOS PARA APROVECHAMIENTO FORESTAL.

Tabla 12. Volumen total del aprovechamiento forestal solicitado.

N° de Árboles	Área (ha)	Volumen (m^3)
43	0.90	5.87 m^3

Tabla 13. Datos dendrométricos de los árboles autorizados para aprovechamiento forestal.

Número de árboles	ID	Nombre común	Familia	*Nombre científico*	DAP (m)	HT (m) Altura Total Calculada	Vol. (m3) Total	X	Y
1	3	Almendro	Combretaceae	*Terminalia catappa*	0.42	8	0.72	1134095.35	1465687.43
2	4	Almendro	Combretaceae	*Terminalia catappa*	0.31	8	0.39	1134099.00	1465689.28
3	6	Palma real	Arecaceae	*Roystonea regia*	0.16	5	0.06	1134130.59	1465704.20
4	8	Totumo	Bignoniaceae	*Crescentia cujete*	0.14	5	0.05	1134163.97	1465720.73

Número de árboles	ID	Nombre común	Familia	*Nombre científico*	DAP (m)	HT (m) Altura Total Calculada	Vol. (m3) Total	X	Y
5	9	Totumo	Bignoniaceae	*Crescentia cujete*	0.11	4.5	0.03	1134375.69	1465818.51
6	10	Totumo	Bignoniaceae	*Crescentia cujete*	0.13	4.5	0.04	1134382.21	1465814.49
7	11	Totumo	Bignoniaceae	*Crescentia cujete*	0.16	4.5	0.06	1134385.50	1465795.55
8	12	Mangle zaragoza	Combretaceae	*Conocarpus erectus*	0.13	4.5	0.04	1134379.32	1465793.92
9	13	Totumo	Bignoniaceae	*Crescentia cujete*	0.10	4	0.02	1134387.80	1465781.02
10	14	Totumo	Bignoniaceae	*Crescentia cujete*	0.10	4	0.02	1134388.26	1465777.30
11	15	Almendro	Combretaceae	*Terminalia catappa*	0.19	9	0.17	1134389.98	1465753.47
12	16	Almendro	Combretaceae	*Terminalia catappa*	0.29	9	0.38	1134390.25	1465753.08
13	17	Mangle zaragoza	Combretaceae	*Conocarpus erectus*	0.11	4.5	0.03	1134390.16	1465717.15
14	18	Mangle zaragoza	Combretaceae	*Conocarpus erectus*	0.14	4.5	0.04	1134398.22	1465702.41
15	19	Mangle zaragoza	Combretaceae	*Conocarpus erectus*	0.11	3.5	0.02	1134398.84	1465698.49
16	20	Mangle zaragoza	Combretaceae	*Conocarpus erectus*	0.24	3.5	0.10	1134400.90	1465683.97
17	21	Mangle zaragoza	Combretaceae	*Conocarpus erectus*	0.13	4	0.04	1134405.31	1465655.45
18	22	Veranera	Nyctaginaceae	*Bougainvillea glabra*	0.14	4	0.04	1134403.68	1465619.87
19	23	Mangle zaragoza	Combretaceae	*Conocarpus erectus*	0.19	3	0.06	1134410.69	1465613.56
20	24	Mangle zaragoza	Combretaceae	*Conocarpus erectus*	0.22	4.5	0.11	1134411.49	1465608.52
21	25	Mangle zaragoza	Combretaceae	*Conocarpus erectus*	0.18	4.5	0.07	1134416.74	1465572.07
22	26	Mangle zaragoza	Combretaceae	*Conocarpus erectus*	0.19	4.5	0.08	1134420.34	1465540.92
23	27	Mangle zaragoza	Combretaceae	*Conocarpus erectus*	0.25	4	0.13	1134414.25	1465541.35
24	28	Pimiento	Phyllanthaceae	*Phyllanthus elsiae*	0.20	4	0.08	1134417.65	1465522.48
25	29	Florisanto	Fabaceae	*Brownea ariza*	0.18	6	0.10	1134418.71	1465509.10
26	30	Mangle zaragoza	Combretaceae	*Conocarpus erectus*	0.20	3.5	0.07	1134428.18	1465485.12

Número de árboles	ID	Nombre común	Familia	*Nombre científico*	DAP (m)	HT (m) Altura Total Calculada	Vol. (m3) Total	X	Y
27	31	Almendro	Combretaceae	*Terminalia catappa*	0.21	7	0.16	1134430.46	1465473.00
28	32	Mangle zaragoza	Combretaceae	*Conocarpus erectus*	0.23	4.5	0.13	1134436.01	1465457.48
29	34	Ñipi	Euphorbiaceae	*Sapium haematospermum*	0.48	4	0.47	1134436.70	1465443.38
30	35	Olti	Chrysobalanaceae	*Licania tomentosa*	0.16	4.5	0.06	1134437.12	1465429.95
31	36	Palma real	Arecaceae	*Roystonea regia*	0.54	7	1.05	1134437.76	1465406.23
32	37	Mangle zaragoza	Combretaceae	*Conocarpus erectus*	0.19	4	0.07	1134455.56	1465270.19
33	38	Mangle zaragoza	Combretaceae	*Conocarpus erectus*	0.14	4.5	0.04	1134452.64	1465251.21
34	39	Ninguito	Muntingiaceae	*Muntingia calabura*	0.22	8	0.19	1134434.70	1465195.03
35	40	Naranjo	Rutaceae	*Citrus × sinensis*	0.25	6	0.20	1134435.45	1465194.86
36	41	Narajuelo	Capparidaceae	*Capparis odoratissima*	0.26	8	0.29	1134433.661	1465187.122
37	42	Olti	Chrysobalanaceae	*Licania tomentosa*	0.09	4.5	0.02	1134138.07	1465697.60
38	43	San joaquin	Boraginaceae	*Cordia sebestena*	0.10	5	0.03	1134136.36	1465674.22
39	44	Olti	Chrysobalanaceae	*Licania tomentosa*	0.11	4.5	0.03	1134136.39	1465672.19
40	45	Olti	Chrysobalanaceae	*Licania tomentosa*	0.10	4.5	0.02	1134136.92	1465667.88
41	46	Olti	Chrysobalanaceae	*Licania tomentosa*	0.11	4	0.03	1134142.94	1465662.35
42	47	Olti	Chrysobalanaceae	*Licania tomentosa*	0.11	4	0.02	1134143.75	1465657.47
43	49	Olti	Chrysobalanaceae	*Licania tomentosa*	0.17	8	0.12	1134139.13	1465645.92
TOTAL							**5.87**		

PERIODO DE APROVECHAMIENTO Y MOVILIZACIÓN

Para las actividades de aprovechamiento forestal (tala) y la movilización de los productos y/o residuos, se otorga un tiempo de OCHO (08) meses calendario desde la ejecutoria del acto administrativo.

Que la Corporación autoriza la comercialización de dichos productos. No obstante, los productos obtenidos también podrán ser destinados para uso netamente doméstico en

calidad de donación o uso del titular del aprovechamiento y deberán aportarse las actas de donación en el informe de cumplimiento ambiental.

Para la movilización de productos de primer grado de transformación, se deberá tramitar el Salvoconducto Único Nacional en Línea – SUNL conforme a la resolución 1909 de 2017.

PARÁGRAFO 1: Se le informa a la parte interesada que sólo podrá aprovechar los árboles mencionados en el artículo primero del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO 2: El interesado podrá solicitar prórroga, con cinco (05) días antes del vencimiento de la misma de conformidad al Decreto 19 del 2012.

ARTÍCULO SEGUNDO: RECOMENDACIONES DE APROVECHAMIENTO FORESTAL

El MUNICIPIO DE MONTERÍA, para el desarrollo de las actividades de aprovechamiento forestal deberá implementar las siguientes medidas de manejo ambiental:

- Sólo se podrán aprovechar aquellos individuos pertenecientes a las especies identificadas y aprobadas en el inventario forestal presentado.
- Se deberá recuperar la capa de suelo orgánica para ser empleada en los procesos de rehabilitación de áreas dentro del proyecto a desarrollar.
- El material vegetal resultante del aprovechamiento forestal que no sea utilizado dentro del proceso deberá ser empleado, mediante su descomposición como aporte de materia orgánica a los suelos recuperados. Este material no podrá ser dispuesto bajo ninguna circunstancia en los botaderos.
- El material vegetal resultante de las actividades de aprovechamiento forestal lo mismo que el suelo recuperado del descapote, deberán ser dispuestos en lugares apropiados con el propósito de garantizar que los mismos no causen taponamiento a los drenajes naturales de la zona o interfiera el flujo normal y natural de los mismos.
- No realizar quemas del material vegetal cortado.
- No realizar la disposición directa de materiales estériles o suelos sobre áreas cubiertas con vegetación.
- La operación de remoción de vegetación deberá realizarse de manera selectiva con herramientas manuales y de manera gradual con el propósito de permitir el desplazamiento de la fauna que pueda encontrase dentro del área a intervenir. El corte de los árboles con diámetros mayores a 10 centímetros de DAP deberá realizarse con motosierras y/o herramientas manuales (hachas, machetes, barras y cuñas), con el propósito de obtener la mayor cantidad de productos posibles para ser empleados de acuerdo con los usos propuestos. Por lo anterior dicha actividad no podrá efectuarse con tractores de orugas, bulldozer o retroexcavadoras.
- Se deberá brindar capacitación al personal que ejecutará las actividades contempladas dentro del aprovechamiento forestal autorizado con el propósito de garantizar la seguridad de los mismos y reducir los impactos ambientales

negativos causados por el desarrollo de las diferentes actividades (Acta de Capacitaciones).

- Los residuos tanto domésticos (papel, cartón, plásticos, etc.) e industriales (lubricantes, estopas impregnadas de aceite, entre otros), que se puedan generar durante el aprovechamiento, deberán ser dispuestos adecuadamente, de acuerdo al plan de gestión de residuos sólidos de la empresa.

La persona autorizada debe coordinar con las entidades prestadoras de servicios públicos, en el caso de requerir el retiro de acometidas o la interrupción del servicio durante el tiempo que dure actividad, así como con la Policía, en caso de que sea necesario el cierre de la vía aledaña a donde se localizan los árboles, para evitar accidentes durante el desarrollo de la misma.

ARTÍCULO TERCERO: RECOMENDACIONES DEL COMPONENTE DE FAUNA

- Se considera procedente aprobar la implementación de la metodología de ahuyentamiento propuesta para garantizar el bienestar de los ejemplares de fauna silvestre asociados a la zona de intervención. Días previos y durante las actividades de aprovechamiento forestal, el MUNICIPIO DE MONTERÍA, debe implementar medidas de ahuyentamiento de fauna, esto con el fin de que los organismos sean ahuyentados, capturados y/o reubicados en el sitio apropiado.

- Solo serán objeto de reubicación y manipulación aquellas especies que no respondan a los métodos de ahuyentamiento implementados. Por tanto, aquellas especies que no generen situaciones de riesgo a la comunidad, y/o no se vea afectado su bienestar, no deberán ser trasladadas de sitio.

- El MUNICIPIO DE MONTERÍA, deberá reportar la información de los animales ahuyentados y/o rescatados, en formatos de campo, indicando lugar y coordenadas de origen y de disposición final, nombre científico y nombre común, estado de salud, método de transporte, fecha y hora de captura y de liberación, fotos y cualquier otra información que consideren pertinentes para conocer la historia de cada uno de los animales.

- El MUNICIPIO DE MONTERÍA, deberá remitir a la CVS un (1) informe específico en materia de aplicación de las medidas de ahuyentamiento, rescate y reubicación de la Fauna Silvestre en el marco de las actividades de aprovechamiento forestal.
- Previo al aprovechamiento forestal se deberá realizar el rescate de nidos, neonatos, polluelos y juveniles, hallados en la zona de intervención. En lo posible, reubicar los nidos activos en árboles cercanos para que continúen su ciclo en el área de donde provienen. En caso de requerirse la reubicación de crías y/o polluelos, y atención de casos de fauna lesionada puede contactarse con el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre CAV de la CVS, para su recepción, al número 7890605 Extensión 122.

- Las especies capturadas o rescatadas no se podrán retener por mucho tiempo, máximo de 12 horas, las cuales deberán ser identificadas y reportadas a la CVS.

- El MUNICIPIO DE MONTERÍA, identificado con cédula de ciudadanía N° 71.667.307, deberá encargarse de la logística para el traslado y reubicación de la fauna silvestre si así se requiere.

- El transporte de los especímenes a reubicar debe ser lo más rápido posible y en compartimentos apropiados, tales como: guacales, jaulas, trampas, bolsas de tela, entre otros. Los especímenes diurnos deben transportarse y liberarse en las primeras horas de la mañana, y nunca se debe exponer ningún ejemplar directamente al sol, ni mucho menos a altas temperaturas. No se deben realizar liberaciones masivas.

- Tener en cuenta que, el MUNICIPIO DE MONTERÍA, es responsable del bienestar de los animales asociados al área de influencia del área de intervención, por lo tanto, por ningún motivo debe darse la muerte de ejemplares de fauna silvestre durante la fase de aprovechamiento forestal y de las actividades de ahuyentamiento. Los casos de muerte de animales que sucedan en el marco del permiso de aprovechamiento deberán reportarse a la Corporación indicando las causas de los hechos. Por lo tanto, sus productos deben ser dispuestos siguiendo las indicaciones de la Resolución 2064 de 2010 y las consideraciones previas concertadas con la CVS.

El manejo técnico y reubicación de los ejemplares de fauna silvestre deberá ser atendido por un profesional en Biología o Zootecnia con experiencia u especialidad en fauna Silvestre y un profesional en veterinaria que realice la respectiva valoración médica veterinaria de los especímenes capturados, lo anterior con el fin de que todas las actividades se desarrollen técnicamente y con máxima seguridad

ARTÍCULO CUARTO: Informar al usuario que durante la actividad debe contar con las medidas de seguridad apropiadas, realizando cerramiento del área de influencia de los trabajos con cinta de protección. Finalizado los trabajos, de TALA se deberán retirar inmediatamente o en su defecto en un plazo máximo de 24 horas los escombros y residuos del aprovechamiento forestal, haciendo el correcto manejo y disposición de los residuos vegetales que sean generados durante la actividad.
Igualmente, los trabajos realizados deberán ejecutarse de tal manera que no causen daño a otras especies forestales, transeúntes y/o estructuras, y se deberá coordinar con los entes encargados de la administración de los servicios públicos el retiro de acometidas o cables que sean necesarios para llevar a la actividad permisionada.

ARTÍCULO QUINTO: Informar al interesado, que el producto del aprovechamiento puede ser comercializado y/o transportado, por lo tanto, CVS entregará salvoconductos de movilización de madera, previa solicitud del interesado.

No obstante, los productos obtenidos también podrán ser destinados para uso netamente domésticos en calidad de donación.

PARÁGRAFO 1: De conformidad con la Resolución 1909 del 2017, modificada mediante Resolución 81 del 2018, expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por medio de la cual se estable el Salvoconducto Único Nacional en Línea, los usuarios que a partir del 20 de abril del 2018, requieran movilizar productos maderables provenientes de aprovechamientos forestales, deberán solicitar los Salvoconductos Únicos Nacionales en Línea, a través de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea (Vital).

PARÁGRAFO 2: El Subdirector de Gestión Ambiental de la CVS, conforme a la Resolución N°2-6777 del 11 de diciembre de 2019, está facultado para la expedición de salvoconductos.

PARÁGRAFO 3: Por la expedición del Salvoconducto Único Nacional para la Movilización de especímenes de la biodiversidad biológica, el interesado deberá cancelar un valor de SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($7.733), cada vez que pretenda movilizar el producto autorizado en el presente acto administrativo, valor que deberá ser consignado en el banco de Occidente, convenio 8586 cuenta corriente N.° 89004387-0, a nombre de la CVS, con base a la Resolución N°1909 de 2017 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que establece el Salvoconducto Único Nacional en Línea (SUNL).

ARTÍCULO SEXTO: MEDIDA DE REPOSICIÓN

Para calcular el número de árboles a reponer se procedió con la metodología establecida por la CVS, a través de la Resolución 3-0235 del 28 de diciembre de 2022 para el cálculo del factor de reposición forestal, se establece:

$$N° \, de \, árboles \, a \, reponer = \sum (N_i * sp_1 * FR, \ldots + N_i * sp_i * FR)$$

Donde,

Ni = número de árboles a intervenir por especie
Sp1 = número de árboles por especie autorizada
FR = Factor de reposición forestal (mínimo 4 – máximo 15)

El factor de reposición forestal se calculará acorde con la siguiente expresión:

$$FRF = \sum (C + Z + I + P)$$

Donde,
C = Cobertura (valores entre 1 y 4)
Z = Zona de vida (Holdrige) (valores entre 1 y 4)
I = Importancia (valores entre 1 y 4)
P = Procedencia (valores entre 1 y 3)

Para proceder con la metodología de determinación del Factor de Reposición Forestal (FRF), se determinó para cada variable lo siguiente lo siguiente:

Cobertura: Se identificó la cobertura vegetal ocupado por las especies autorizadas (Pastos arbolados).

Zona de Vida: Se verificará la zona de vida en la cual se encuentra el proyecto, la obra o actividad (Bosque seco tropical, valor 4).

c) Importancia: Se verificó, en primera instancia si las especies solicitadas se encontraban en algún grado de amenaza (Resolución 1912 del 15 de septiembre de 2017, Lista Roja de Plantas o CITES), si su aprovechamiento se encuentra vedado o si corresponde a una especie endémica, para lo cual se asignó un valor de importancia 2 para la especie *Crescentia cujete*, y un valor de 1 para las demás especies.

Expuesto lo anterior se tiene:

Especie	Variables						Número de árboles a reponer
	Cobertura	Zona de vida	Importancia de la especie	Procedencia	FRF	Número de árboles por especie autorizados	
Roystonea regia	2	4	1	2	9	2	18
Crescentia cujete	2	4	2	3	11	6	66
Cordia sebestena	2	4	1	3	10	1	10
Capparis odoratissima	2	4	1	3	10	1	10
Licania tomentosa	2	4	1	2	9	7	63
Terminalia catappa	2	4	1	2	9	5	45
Conocarpus erectus	2	4	1	3	10	15	150
Sapium haematospermum	2	4	1	3	10	1	10
Brownea ariza	2	4	1	3	10	1	10
Muntingia calabura	2	4	1	3	10	1	10
Bougainvillea glabra	2	4	1	2	9	1	9
Phyllanthus elsiae	2	4	1	2	9	1	9
Citrus × sinensis	2	4	1	2	9	1	9

Condicionar al MUNICIPIO DE MONTERÍA, identificado con Nit 800096734-1, representado legalmente por el Doctor CARLOS ALBERTO ORDOSGOITIA SANÍN,

identificado con cédula de ciudadanía N°79969238 de Bogotá D.C, en calidad de alcalde, o quien haga sus veces, que, como medida de reposición al aprovechamiento forestal autorizado, deberá reponer un total de cuatrocientos diecinueve (419) árboles de especies nativas, conforme a la metodología indicada en la Resolución 3-0235 del 28 de diciembre de 2022.

Se deberá adelantar el "Documento técnico de la medida de reposición", incluyendo las actividades de aislamiento, mantenimiento y seguimiento necesarias durante la vida útil del proyecto, tiempo en el cual alcanzar unas condiciones similares o iguales a las encontradas antes de realizar la afectación por las actividades de aprovechamiento por lo menos durante un periodo mínimo de tres (03) años.

El autorizado en un término NO MAYOR A DOS (02) MESES a partir de la ejecutoria del acto administrativo por el cual se otorga el aprovechamiento forestal deberá enviar para su evaluación y aprobación del Documento técnico de la medida de reposición; el cual debe contener como mínimo lo siguiente:

- Objetivos y alcances del documento.
- Descripción del área e individuos a intervenir (Incluyendo la contextualización del aprovechamiento (Cantidad, especies e información relevante de la actividad)
- Delimitación en polígono (formato shapefile) del área seleccionada para la plantación.
- Caracterización físico-biótica del área seleccionada para ejecutar la plantación (incluyendo ecosistemas, coberturas, fauna y flora asociada).
- Especies a establecer, los criterios de selección de las mismas y las características de cada una de ellas. Se deben proponer como mínimo 10 especies diferentes.
- Diseños y arreglos forestales según la acción seleccionada (Restauración, Rehabilitación, Enriquecimiento y otros).
- Plan de establecimiento, características de los individuos a establecer, obtención del material vegetal, labores pre y pos trasplante, plantación, productos empleados, protección contra incendios forestales, aislamiento de la plantación etc.
- Plan de mantenimiento, el cual incluirá: visitas técnicas, limpieza, plateo, fertilización, control de plagas, reposición, podas, protección contra incendios forestales y aislamiento de la plantación, entre otras que se requieran de acuerdo a las características del sitio.
- Plan de monitoreo y seguimiento: Indicadores de sobrevivencia, crecimiento y desarrollo de la plantación.
- Si el área a plantar se encontrase en predios que no sean de propiedad de la persona autorizada se levantarán actas de acuerdo y compromiso con los propietarios de los predios, donde se establezca que las plantaciones deberán poseer un carácter protector. Se deberán aportar documentos de propiedad.
- Cronograma de ejecución, donde se detallen las actividades de aislamiento, establecimiento, mantenimiento y monitoreo de la plantación.

- Costos estipulados para el desarrollo de cada una de las actividades a desarrollar durante la implementación del Programa de reposición.
- Propuesta de manejo a largo plazo que garantice que la plantación sea autosostenible y perdure en el tiempo.

De igual manera, se debe garantizar el mantenimiento de la reposición por el termino de tres (03) años o hasta ser entregada a la Corporación y se requiere la presentación de los informes de mantenimiento los primeros cinco (05) días de cada mes en una periodicidad semestral, durante los tres (03) años de ejecución de dicho mantenimiento.

El acreedor de la obligación debe garantizar la presencia de la reposición ante eventos fortuitos como incendios, inundaciones entre otros. En el caso, que estos eventos se presenten debe comunicarle a la Corporación por escrito aportando las evidencias que demuestren lo ocurrido y solicitar la ampliación del tiempo de mantenimiento que se tenga pendiente al momento del evento, al cabo de la terminación del mantenimiento se debe entregar para el cierre el 95% de sobrevivencia de la reposición impuesta.

Cabe resaltar que, si la siembra no sobrevive en el tiempo estipulado por malas prácticas de mantenimiento será responsabilidad del condicionado su reposición, por ende, el tiempo empezará a contarse desde el día en que se realice la siembra de los individuos arbóreos nuevamente.

De igual manera se indica que, la reposición deberá ser registrada como plantación protectora ante la Corporación conforme al Decreto 1532 de 2019 del Ministerio De Ambiente Y Desarrollo Sostenible (MADS), por tanto, el usuario previo a la entrega y cumplimiento del tiempo de mantenimiento solicitará a la CVS el registro.

En caso de considerar aplicar una propuesta diferente a restauración, rehabilitación y uso sostenible en el marco de alguna de las seis (6) estrategias de compensación indicadas en la Resolución 3-0235 del 28 de diciembre que define los lineamientos de compensación para el departamento de Córdoba; se deberá presentar el documento técnico de reposición bajo la misma estructura, pero desarrollando la propuesta que se escoja por parte del autorizado.

INFORME DE CUMPLIMIENTO PARA ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO

El MUNICIPIO DE MONTERÍA, deberá presentar un informe de cumplimiento, donde se presenten los resultados de las actividades de aprovechamiento forestal (tala) desarrolladas durante el periodo reportado y que deberán incluir como mínimo la siguiente información:

- Áreas y volúmenes aprovechados a la fecha.
- Individuos aprovechados en el periodo con su respectivo volumen, ID y coordenada de ubicación.
- Destino de los productos obtenidos por el desarrollo del aprovechamiento forestal con sus respectivos registros y salvoconductos en caso de requerirse la movilización de productos.

- Área aprovechada durante el periodo reportado, anexando mapa con polígonos georreferenciados.
- Ubicación georreferenciada de los sitios donde han sido almacenados los subproductos del material cortado y el suelo recuperado.
- Medidas de mitigación y acciones complementarias implementadas durante el desarrollo del aprovechamiento forestal, con sus respectivos soportes.
- Registro de la capacitación brindada al personal encargado de realizar el aprovechamiento forestal autorizado y el manejo de fauna encontrada, y que incluya entre otros aspectos las medidas orientadas a la seguridad en la operación y a la disminución de los impactos que puedan generarse de la actividad.
- Registro fotográfico completo de las diferentes actividades desarrolladas.
- Presentar la información solicitada en medio físico y magnético

INFORMES DE CUMPLIMIENTO MEDIDA DE REPOSICIÓN

La reposición se deberá ejecutar en un tiempo máximo de seis (06) meses desde la realización del aprovechamiento forestal, y cumplido los seis (06) meses o apenas se haga la siembra se deberá entregar un informe del establecimiento con mínimo lo siguiente:

Informe de establecimiento

- Acto administrativo que impone la obligación.
- Descripción de las actividades ejecutadas de establecimiento de manera detallada indicando fechas, forma de ejecución e insumos y su respectivo soporte fotográfico por actividad.
- Números de árboles plantados por especie y por sitio establecido.
- Diseños de plantación y arreglos espaciales de las actividades de plantación ejecutados, en el cual se indique el número de árboles por especie y por cada sitio.
- Área efectivamente plantada con su registro fotográfico.
- Soportes de adquisición de postes para los aislamientos en lugares autorizados de carácter legal.
- Aportar la delimitación de las áreas de reposición en formato shapefile y/o kmz.
- Cronograma de mantenimiento.

De igual manera, se debe garantizar el mantenimiento de la reposición por el término de tres (03) años y se requiere la presentación de los informes de mantenimiento los primeros cinco (05) días de cada mes en una periodicidad semestral, durante los tres (03) años de ejecución de dicho mantenimiento, indicando mínimo lo siguiente:

Informe de mantenimiento

- Acto administrativo que impone la obligación.

- Descripción de las actividades ejecutadas de mantenimiento de manera detallada indicando fecha, forma de ejecución e insumos y su respectivo soporte fotográfico por actividad.
- Números de árboles por especie y por sitio remanentes.
- Porcentaje de mortalidad y/o porcentaje de supervivencia de la plantación.
- Indicadores de crecimiento y desarrollo.
- Historial de las labores de mantenimiento ejecutadas.
- Área efectivamente mantenida con su registro fotográfico.
- Aportar la delimitación de las áreas de reposición remanente en formato shapefile y/o kmz (En caso de pérdida).
- Avance del cronograma de mantenimiento y/o modificaciones.

PARÁGRAFO: La CVS realizará visitas de Control y Seguimiento en cualquier momento con el fin de verificar el cumplimiento de la medida de reposición y lo concerniente a las demás obligaciones técnicas estipuladas.

ARTÍCULO SÉPTIMO: MEDIDAS DE MANEJO PARA LA FLORA VASCULAR Y NO VASCULAR

OBLIGACIÓN 1:

El titular del permiso, **en caso de registrar individuos en el momento del aprovechamiento** deberá realizar el rescate y traslado de como mínimo el 70% de los individuos de epifitas vasculares en veda encontrados de la familia ORCHIDACEAE y BROMELIACEAE, así mismo la ejecución de un plan de seguimiento y monitoreo proyectado para un periodo mínimo de tres (3) años.

Se debe presentar los reportes del monitoreo y seguimiento donde se incluya indicadores de seguimiento orientados a la medición de la mortalidad y sobrevivencia, la aparición de nuevos individuos o agregados, la floración, el estado fitosanitario, el marchitamiento y/o la presencia de enfermedades o patógenos, describiendo las medidas de corrección y manejo adaptativo del caso, en una periodicidad semestral durante los 3 años.
CON LAS SIGUIENTES DIRECTRICES:

13. Rescatar, trasladar y reubicar el 70% de los individuos de las especies de orquídeas y Bromelias.
14. Rescatar, trasladar y reubicar el 70% de los individuos de las especies de orquídeas y Bromelias que hayan sido encontradas durante el desarrollo de las actividades del proyecto y que no se identificaron por altura del dosel.
15. La selección de las especies para el rescate, traslado y reubicación deberán estar bajo los criterios de diversidad, fitosanitarios, reproductivos y de senescencia y acorde al ciclo de vida de las especies.
16. Los porcentajes de rescate deberán realizarse sobre el total de individuos o coberturas hallados en el área de intervención y no sobre la abundancia estimada en el muestreo realizado.

17. Diseñar e implementar estrategias de manejo adaptativo que incluyan, entre otras, acciones de mantenimiento de las especies luego de la reubicación, tales como, el riego para control en épocas secas y el control de luz.
18. Propender por la supervivencia de alrededor del 80% de los individuos de bromelias y orquídeas que sean objeto de rescate, traslado y reubicación.
19. Para el rescate de epifitas se deberá realizar el ascenso a los hospederos previo a la tala, o en su lugar, realizar una tala controlada, con el fin de garantizar que el material a rescatar no se pierda y será reportado en los informes de seguimiento.
20. Garantizar la no afectación de los forófitos que albergaran los especímenes trasladados, estableciendo porcentajes máximos de reubicación por grupo para cada forófitos receptor y de acuerdo por la población epifítica ya existente en el forófitos.
21. Marcar y georreferenciar los nuevos hospederos para su posterior ubicación y seguimiento
22. Marcar y registrar los especímenes reubicados con el fin de hacer el adecuado monitoreo y seguimiento del traslado y reubicación de las especies objeto de veda.
23. Adelantar la recolección del material de amarre (no biodegradable).
24. Los sitios a seleccionar para llevar a cabo esta medida deberán presentar en un término de 30 días previo al desarrollo de la actividad de traslado y reubicación:

- Coberturas de bosques de galería asociados a franjas de protección de drenajes, quebradas, preferiblemente en áreas bajo figura de protección que existan en área de influencia directa o indirecta del proyecto.

- Características físicas y bióticas de las nuevas áreas similares a las áreas de rescate, preferiblemente con hospederos de las mismas especies de forófitos de sitio de extracción.

OBLIGACIÓN 2:

Para la medida de manejo por la afectación de la flora epifita no vascular, la medida empleada es la rehabilitación ecológica de un área equivalente al área intervenida, con el fin de preservar el acervo genético de las especies de epífitas no vasculares y recuperar la funcionalidad, el suministro de servicios ecosistémicos y el favorecimiento de la conectividad con otros ecosistemas o áreas con algún grado de protección.
Para ello, se debe imponer a la titular la obligación de presentar una propuesta de restauración.
Es preciso indicar que el cálculo del área a implementar las acciones de rehabilitación ecológica se realizó bajo los lineamientos establecidos por la circular MADS 8201-2-808 del 9 de diciembre de 2019 en su Anexo 1.

Tabla 14 . Relación de área a retribuir por afectación de hábitats de especies de flora en veda.

Coberturas de intervención	Área (ha)	Relación en área a retribuir	Área a retribuir (ha)
Pastos arbolados	0.90	0.3	0.27
Área a rehabilitar (ha)			**0.27**

En este orden de ideas, el titular del permiso, como medida compensatoria por la afectación, se deberá realizar acciones de recuperación, rehabilitación y restauración un área de **0.27 ha**, siguiendo los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Restauración: Restauración Ecológica, Rehabilitación y Recuperación de áreas Disturbadas (MADS, 2015). Así mismo, se debe ejecutar un mantenimiento y seguimiento por un tiempo de 3 años desde el establecimiento. Por otra parte, se deben presentar informe de establecimiento de la rehabilitación una vez se ejecute y los informes de mantenimiento en periodicidad semestral durante los 3 años de mantenimiento. La densidad de la rehabilitación es de 825 árboles por hectárea, equivalentes al establecimiento de doscientos veintitrés (223) árboles.

Con las siguientes directrices:

- La rehabilitación deberá realizarse en áreas con remanentes de coberturas asociados a rondas hídricas, ríos y/o quebradas, preferiblemente ubicados en áreas de ecosistemas sensibles y áreas naturales protegidas.
- Si el área escogida para llevar a cabo las acciones de rehabilitación es de carácter privado, se deberá establecer con el propietario el mecanismo para asegurar que las acciones perduren en el tiempo.
- Registrar ante la Corporación, según corresponda, las plantaciones forestales, cerca viva, barrera rompevientos o sombríos de finalidad protectora o protectora – productora que se realicen en el proceso de enriquecimiento.

INFORME SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA TRASLADO

6. Descripción específica de cada una de las actividades realizadas
7. Indicadores de seguimiento al proceso (Índice de supervivencia, estado fitosanitario, vigor o estado de desarrollo del organismo reubicado, entre otros)
8. Indicadores de seguimiento al desarrollo, tales como, la aparición de nuevos individuos, floración, fructificación y la presencia de hijuelos, marchitamiento, presencia de plagas (Hongos o insectos)
9. Cronograma con la proyección de fechas actualizadas y ajustada al cronograma de ejecución del monitoreo y seguimiento
10. Descripción del sitio o sitios potenciales del traslado y reubicación de los organismos rescatados, el cual deberá contener las siguientes informaciones:

- Justificación técnica de la selección del sitio
- Localización y área
- Caracterización la composición florística y de especies de epifitas presentes

- Registro fotográfico
- Cartografía en escala entre 1:5000 a 1:10.000 con coberturas, cuerpos de agua y curvas de nivel.

INFORME SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA REHABILITACIÓN

12. Polígono georreferenciado de las áreas de implementación de la medida
13. Superficie plantada con sus fechas, indicando: número de individuos plantados, nombre científico y familia, y su clasificación en especies nativas y/o potencial forófitos.
14. Avances a la fecha de los arreglos florísticos establecidos, de acuerdo con la vegetación existente en el área seleccionada y su estado con respecto al grado de disturbio que está presente
15. Informar la procedencia del material vegetal a emplear
16. Reportar el análisis de crecimiento de los individuos establecidos (Alturas y diámetros)
17. Seguimiento de indicadores de supervivencia y estado fitosanitario. En el caso de registrar una supervivencia inferior al 95%, se debe documentar las causas y describir las acciones correctivas que tomen.
18. Reporte de las actividades de mantenimiento programadas y realizadas
19. Registro fotográfico
20. Cartografía impresa con escala grafica entre 1:2000 a 1:10.000 de la localización y delimitación del área incluyendo las coberturas acompañado del archivo Shape.
21. Descripción y análisis de la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo
22. Verificar y reportar las especies presentes en los estratos de dosel, mediante una adecuada colecta e identificación botánica en laboratorio y presentar el análisis de la estratificación vertical correspondiente.

INFORME FINAL DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO (Al finalizar los 3 años)

6. Compilar los resultados y análisis de resultados de todas las acciones desarrolladas en cumplimiento de las medidas establecidas, con el respectivo análisis de efectividad.
7. Realizar una caracterización de epifitas dentro del área en proceso de rehabilitación, considerando un análisis comparativo con los datos iniciales del área de intervención del proyecto. La identificación taxonómica de las especies a reportar deberá estar soportado por certificado de herbario
8. Presentar el análisis de los indicadores de seguimiento y monitoreo que permita establecer el porcentaje de colonización que presenten las especies de bromelias, musgos, líquenes y hepáticas, sobre los árboles y otros hábitos establecidos ene le objeto de intervención por las actividades del proyecto y del área seleccionada para el desarrollo de la medida de rehabilitación.

9. Describir cualitativamente la eficiencia de las medidas de manejo realizadas, teniendo en cuenta los resultados encontrados en el tiempo de seguimiento
10. Presenta evidencias de los mecanismos realizados para asegurar la permanencia de las medidas de manejo establecidas como acuerdos, convenios y otros.

ARTICULO OCTAVO: Advertir a los interesados, que cualquier incumplimiento a los términos, condiciones, obligaciones y requisitos establecidos en el presente acto administrativo, dará lugar a la adopción de las sanciones y medidas previstas en la Ley 1333 de 2009, previo adelanto del trámite administrativo sancionatorio correspondiente.

ARTÍCULO NOVENO: El **MUNICIPIO DE MONTERÍA**, identificado con Nit 800096734-1 como entidad administradora del espacio público, representado legalmente por el Doctor **CARLOS ALBERTO ORDOSGOITIA SANÍN**, o quien haga sus veces, deberá cancelar a la Corporación la tasa por aprovechamiento por un volumen de **CINCO COMA OCHENTA Y SIETE METROS CÚBICOS (5,87 m^3)** de madera, se debe cancelar **CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/Cte ($113,485),** los cuales deberán ser cancelados en el banco de Bogotá, cuenta de ahorros N°438-512212, o a través de la plataforma PSE en la página web www.cvs.gov.co - enlace "Trámites y Servicios" > "Pagos en Línea", dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes del envió de la factura.

ARTÍCULO DÉCIMO: Para realizar las actividades de seguimiento, a la actividad autorizada y durante los tres (03) años que dura el mantenimiento de las especies establecidas a manera de reposición, el **MUNICIPIO DE MONTERÍA**, identificado con Nit 800096734-1 como entidad administradora del espacio público, representado legalmente por el Doctor **CARLOS ALBERTO ORDOSGOITIA SANÍN**, o quien haga sus veces, deberá cancelar anualmente durante tres (03) años con incremento anual del IPC, la suma descrita a continuación siendo el primer pago dentro de los treinta (30) días siguientes una vez notificado del presente acto administrativo, la suma de **TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO M/Cte. ($ 3,372,234),** los cuales deberán consignarse, a favor de la CAR-CVS en la cuenta de ahorros No. 438-75432 – 7 del Banco de Bogotá o a través de la plataforma PSE en la página web www.cvs.gov.co - enlace "Trámites y Servicios" > "Pagos en Línea".

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Notificar personalmente o por el medio más expedito el contenido de la presente Resolución de conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011, al **MUNICIPIO DE MONTERÍA**, identificado con Nit 800096734-1, como entidad administradora del espacio público, representado legalmente por el Doctor **CARLOS ALBERTO ORDOSGOITIA SANÍN**, o a su apoderado debidamente constituido.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Envíese copia de la Resolución al equipo técnico para que realice el respectivo seguimiento a las obligaciones interpuestas y presente informe al Área de Seguimiento Ambiental CVS.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Indicar que contra la presente resolución procede el recurso de Reposición, ante el Área de Seguimiento Ambiental de la Corporación, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación, de acuerdo con los requisitos establecidos en el artículo 74 y concordantes de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El presente acto Administrativo será publicado en la página Web de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado digitalmente por Rafael Espinosa Forero Resolución 302 Agosto 14/23

RAFAEL HERNANDO ESPINOSA FORERO
Profesional Especializado
Área de Seguimiento Ambiental CVS

Radicado: 20221103825
Dependencia: ÁREA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL- SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
Asunto: APROVECHAMIENTO FORESTAL ÁRBOLES AISLADOS
Proyectó: L. Martínez / Abogada contratista U. Distrital.
Revisó: Laura Monsalve / Abogada contratista U. Distrital.
Técnico: Daniel Berrocal / Contratista U. Distrital.
Concepto: 2023-795 del 29 de mayo del 2023

C.C.P
INGENIEROS S.A.S

FINANCIERO/CONTABLE

Dirección: Carrera 6 No. 65-24
Email: ccpconstrucciones22@gmail.com
Montería, Córdoba - Colombia

C.C.P
INGENIEROS S.A.S

Copia Certificación Bancaria

Dirección: Carrera 6 No. 65-24
Email: ccpconstrucciones22@gmail.com
Montería, Córdoba - Colombia

Certificado
Bancario

Miércoles, 24 de mayo de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que C.C.P INGENIEROS SAS identificado(a) con NIT 901595820, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	56900004081	2022/11/29	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO

C.C.P
INGENIEROS S.A.S

Factura Original o Cuenta de Cobro

Dirección: Carrera 6 No. 65-24
Email: ccpconstrucciones22@gmail.com
Montería, Córdoba - Colombia

CCP INGENIEROS SAS
NIT 901.595.820-4
CR 6 65 24 OF 331
Tel: (3014441670) undefined - Ext. undefined
Montería - Colombia
ccpconstrucciones22@gmail.com

Detalle de producto
No. FEC 17

Señores	MUNICIPIO DE MONTERIA			**Fecha**
NIT	800.096.734-1	**Teléfono**	(604) 6047924545 - Ext. 000	2023-09-11
Dirección	CALLE 27 CRA 3 ESQUINA	**Ciudad**	Montería - Colombia	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SUBTOTAL OBRAS	1.00	1,177,014,814.34
2	IMPLEMENTACION DE GESTION DE OBRA (seguridad y salud en el trabajo, Plan de manejo ambiental y Plan de aseguramiento de calidad-plan manejo de trafico)	1.00	18,190,373.60
3	TRAMITES Y LEGALIZACION AFINIA (INMODIFICABLE)	1.00	1,930,875.84
4	TRAMITES AMBIENTALES (INMODIFICABLES	1.00	5,424,554.22

DETALLE DE PRODUCTO NO ES FACTURA

Total items: 4

Valor en Letras:
Mil doscientos dos millones quinientos sesenta mil seiscientos dieciocho pesos m/cte

Total Bruto	1,202,560,618.00
Total a Pagar	1,202,560,618.00

Condiciones de Pago:
TRANSFERENCIA ELECTRONICA $ 1,202,560,618.00

Observaciones:
ACTA N°1 DEL CONTRATO LP-SPM-019-2022 QUE TIENE POR OBJETO MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIONEN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Este es un detalle de producto para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente. Exija su factura o documento equivalente.

C.C.P
INGENIEROS S.A.S

TECNICO

Dirección: Carrera 6 No. 65-24
Email: ccpconstrucciones22@gmail.com
Montería, Córdoba - Colombia

C.C.P
INGENIEROS S.A.S

Certificado detallado de avance de obra y planilla de seguridad social

Dirección: Carrera 6 No. 65-24
Email: ccpconstrucciones22@gmail.com
Montería, Córdoba - Colombia

EL SUSCRITO INTERVENTOR DEL CONTRATO DE OBRA N° LP-SPM-019 DE 2022

INICIADO EL 27 DE FEBRERO DE 2023

CERTIFICA QUE,

Las obras ejecutadas por la empresa C.C.P INGENIEROS S.A.S identificado con Nit 901.595.820-4, representado por ELIANA MARGARITA OTERO PEREZ, con cedula de ciudadanía número 1.064.985.667 expedida en Cereté; presentan a detalle el siguiente avance de obra:

% de Avance acumulado Programado durante el periodo del 27/02/2023 hasta 18/08/2023	% de Avance acumulado Ejecutado durante el periodo del 27/02/2023 hasta 18/08/2023
27.14%	29,98%

Por lo que esta Interventoría recibe a satisfacción las obras del porcentaje indicado anteriormente. De igual forma el contratista de obra ha cumplido con el pago en materia de salarios y seguridad social. Así como la inscripción y los pagos de los aportes parafiscales, aportes de seguridad social, salud, pensiones y riesgos laborales del personal propuesto en obra.

PLANILLAS N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO
1984222256	Carmen Romero	Director de Obra
1984222256	Antonio Ardila	Residente de obra 1
1984222256	Eduardo Gómez	Residente de obra 2
1984222256	Luis Morales	Inspector de obra 1

1984222256	José Padilla	Inspector de obra 2
1984222256	Dayane Obaji	Ingeniero con postgrado en Vías
1984222256	Carlos Hernández	Ingeniero residente eléctrico
1984222256	Gustavo Royett	Ingeniero con postgrado Geotecnia
1984222256	Angelica Avilez	Ingeniero con postgrado ambiental
1984222256	Arlenys Assias	Trabajadora social
1984222256	Ayda Espitia	Profesional Sisoma
1984222256	Ronal Almanza	Topógrafo 1
1984222256	Edwin Montes	Topógrafo 2
1984222256	Félix Misas	Cadenero 1
1984222256	Erny Urango	Cadenero 2
1984222256	Dionisio López	Cadenero 3
1984222256	Jorge Viloria	Cadenero 4
1984222256	Gabriel Gonzales	Maestro de obra 1
1984222256	Eduardo Melendrez	Maestro de obra 2
1984222256	Jader Spir	Almacenista
1984222256	Yoni Murillo	Vigilante
1984222256	Lauren Flórez	Secretaria
1984222256	Maira Gonzales	Auxiliar contable
1984222256	Dalim Martinez	Abogado
1984222256	Albeiro Avilez	Conductor
1984222256	Moisés Torres	Mensajero

PLANILLAS N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO
9449698295	Carmen Romero	Director de Obra
9449698295	Antonio Ardila	Residente de obra 1
9449698295	Eduardo Gómez	Residente de obra 2
9449698295	Luis Morales	Inspector de obra 1
9449698295	José Padilla	Inspector de obra 2
9449698295	Dayane Obaji	Ingeniero con postgrado en Vías
9449698295	Carlos Hernández	Ingeniero residente eléctrico
9449698295	Gustavo Royett	Ingeniero con postgrado Geotecnia
9449698295	Angelica Avilez	Ingeniero con postgrado ambiental
9449698295	Arlenys Assias	Trabajadora social
9449698295	Ayda Espitia	Profesional Sisoma
9449698295	Ronal Almanza	Topógrafo 1
9449698295	Edwin Montes	Topógrafo 2
9449698295	Félix Misas	Cadenero 1
9449698295	Erny Urango	Cadenero 2
9449698295	Dionisio López	Cadenero 3
9449698295	Jorge Viloria	Cadenero 4
9449698295	Gabriel Gonzales	Maestro de obra 1
9449698295	Eduardo Melendrez	Maestro de obra 2
9449698295	Jader Spir	Almacenista
9449698295	Yoni Murillo	Vigilante
9449698295	Lauren Flórez	Secretaria

9449698295	Maira Gonzales	Auxiliar contable
9449698295	Dalim Martinez	Abogado
9449698295	Albeiro Avilez	Conductor
9449698295	Moisés Torres	Mensajero

PLANILLAS N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO
9452916284	Carmen Romero	Director de Obra
9452916284	Antonio Ardila	Residente de obra 1
9452916284	Eduardo Gómez	Residente de obra 2
9452916284	Luis Morales	Inspector de obra 1
9452916284	José Padilla	Inspector de obra 2
9452916284	Dayane Obaji	Ingeniero con postgrado en Vías
9452916284	Carlos Hernández	Ingeniero residente eléctrico
9452916284	Gustavo Royett	Ingeniero con postgrado Geotecnia
9452916284	Angelica Avilez	Ingeniero con postgrado ambiental
9452916284	Arlenys Assias	Trabajadora social
9452916284	Ayda Espitia	Profesional Sisoma
9452916284	Ronal Almanza	Topógrafo 1
9452916284	Edwin Montes	Topógrafo 2
9452916284	Félix Misas	Cadenero 1
9452916284	Erny Urango	Cadenero 2
9452916284	Dionisio López	Cadenero 3
9452916284	Jorge Viloria	Cadenero 4

9452916284	Gabriel Gonzales	Maestro de obra 1
9452916284	Eduardo Melendrez	Maestro de obra 2
9452916284	Jader Spir	Almacenista
9452916284	Yoni Murillo	Vigilante
9452916284	Lauren Flórez	Secretaria
9452916284	Maira Gonzales	Auxiliar contable
9452916284	Dalim Martinez	Abogado
9452916284	Albeiro Avilez	Conductor
9452916284	Moisés Torres	Mensajero

PLANILLAS N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO
9454824113	Claudia Stella Carvajal Pineda	Director de Obra
9454824113	Rafael Andrés Puche Díaz	Residente de obra 1
9454824113	Eduardo Andrés Gómez Pastrana	Residente de obra 2
9454824113	Melissa Hernández Durango	Inspector de obra 1
9454824113	Moisés Ayubb Ramos	Inspector de obra 2
9454824113	Dayane Obají Bernal	Ingeniero con postgrado en Vías
9454824113	Jaam Fernández Pérez	Ingeniero residente eléctrico
9454824113	Pablo Eugenio Castilla Negrete	Ingeniero con postgrado Geotecnia
9454824113	Rafael Dario Vergara de la Ossa	Ingeniero con postgrado ambiental
9454824113	Patricia Álvarez Manchego	Trabajadora social
9454824113	Armando Javier Atencia Soto	Profesional Sisoma

9454824113	Ernan Antonio Díaz Hernández	Topógrafo 1
9454824113	Santiago Guerrero Lamadrid	Topógrafo 2
9454824113	Deiker Bellorin Ibarra	Cadenero 1
9454824113	Nayib Enrique Genes Hoyos	Cadenero 2
9454824113	Domingo Antonio Álvarez Gaviria	Cadenero 3
9454824113	Ismael Andrés Vega	Cadenero 4
9454824113	Eduardo Melendrez Coronado	Maestro de obra 1
9454824113	Oscar Luis Chima Gómez	Maestro de obra 2
9454824113	Jader Luis Spir del Castillo	Almacenista
9454824113	José Miguel Ozuna Rizo	Vigilante
9454824113	Erni Elias Urango Chima	Vigilante
9454824113	Kelly Yohana Rivero Berrio	Secretaria
9454824113	Daniela Paola Payares Espitia	Auxiliar contable
9454824113	Angela Maria Avilez Padilla	Abogado
9454824113	Jhon Edisson Pitalua Tamara	Conductor
9454824113	Jose Guillermo Perez Perez	Mensajero

Para constancia se firma en la ciudad de Montería a los 14 días del mes de septiembre de 2023

CONSORCIO HIDRALMA
ALVARO VERA AYALA
C.C. N° 1.022.329.221

C.C.P
INGENIEROS S.A.S

Certificado de ensayos según normas técnicas vigentes realizados por la interventoría y el contratista de obra, se anexan ensayos

Dirección: Carrera 6 No. 65-24
Email: ccpconstrucciones22@gmail.com
Montería, Córdoba - Colombia

EL SUSCRITO INTERVENTOR DEL CONTRATO DE OBRA N° LP-SPM-019 DE 2022

INICIADO EL 27 DE FEBRERO DE 2023

CERTIFICA QUE,

Las obras ejecutadas por la empresa C.C.P INGENIEROS S.A.S identificado con Nit 901.595.820-4, representado por ELIANA MARGARITA OTERO PEREZ, con cedula de ciudadanía numero 1.064.985.667 expedida en Cereté; presentó los siguientes ensayos realizados en obra que a continuación se relacionan.

DESCRIPCIÓN ENSAYO	NORMA	CUMPLIMIENTO
CLASIFICACIÓN PARA BASE GRANULAR ART.330-13 DE INVIAS	INV-E-123-13 - E-214-13 - E-125-13 - E-126-13 - E-122-13	SI
DENSIDAD EN CAMPO CON CONO Y ARENA	INV-161-13	SI
ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACIÓN	INV E-142-07	SI
ANÁLISIS GRANULOMETRICO DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS	INVIAS ART.320-13 SUB-BASE GRANULAR	SI
ENSAYO DE RESISTENCIA CONCRETO	INV E-421	SI

Los anteriores ensayos presentan cumplimiento de acuerdo a los parámetros establecidos y normativa vigente.

Para constancia se firma en la ciudad de Montería a los 14 días del mes de septiembre de 2023

CONSORCIO HIDRALMA
ALVARO VERA AYALA
C.C. N° 1.022.329.221

Consultorías y Ambiental	RESULTADO PRUEBA DE RESISTENCIA PARA VIGUETAS	V1
FECHA DE EMISIÓN: 01 de septiembre de 2023	PROCESO: GESTIÓN DE MATERIALES	

EQUIPO:	MÁQUINA DIGITAL DOBLE RANGO PARA ENSAYOS DE CONCRETO MODELO PC - 42D SERIE 179
PROCEDIMIENTO:	INVIAS E-414-13
PROYECTO:	MEJORAMIENTO VIAL BARRIOS PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO
LOCALIZACIÓN:	MONTERÍA - CÓRDOBA
CONTRATISTA:	C.C.P. INGENIEROS S.A.S.
OBSERVACIÓN:	MUESTRA SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

Nº	CÓDIGO	ELEMENTO QUE REPRESENTA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE FABRICA	EDAD (DIAS)	FECHA DE FALLA	RESISTENCIA ESPERADA (MR)	BASE (CM)	ALTURA (CM)	LONGITUD (CM)	LONGITUD ENTRE APOYOS (CM)	CARGA (KN)	TIPO DE FALLA	RESISTENCIA (MPa)	RESISTENCIA (MR)	PORCENTAJE DE RESISTENCIA REAL (%)
1	-	CARRIL DERECHO TRAMO 7	2/08/2023	28/07/2023	14	11/08/2023	38.00	15.20	15.25	50.30	48.00	26.01	TERCIO MEDIO	3.53	35.31	93%
2	-	CARRIL DERECHO TRAMO 7	2/08/2023	28/07/2023	28	25/08/2023	38.00	16.50	15.60	61.10	48.00	33.58	TERCIO MEDIO	4.01	40.14	106%
2	-	CARRIL DERECHO TRAMO 7	2/08/2023	1/08/2023	14	15/08/2023	38.00	15.10	15.30	50.40	48.00	25.63	TERCIO MEDIO	3.48	34.81	92%
4	-	CARRIL DERECHO TRAMO 7	2/08/2023	1/08/2023	28	29/08/2023	38.00	15.60	16.00	61.00	48.00	31.87	TERCIO MEDIO	3.83	38.31	101%

Ing. Civil NATHALIA HERNANDEZ
M.P. 2220216675SCOR

Ing. Geotecnista PABLO CASTILLA NEGRETE
M.P. 1320251172BLV

E-Mail: Consultoriasgeotecniayambiente@gmail.com / Teléfono-Celular: 781 6379 - 300 816 1966 / Calle 27 # 6-12 Centro de Montería, Cordoba

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN DE ESTE LABORATORIO

Consultorías Geotécnica y Ambiental	RESULTADO PRUEBA DE RESISTENCIA PARA VIGUETAS	V1
FECHA DE EMISIÓN: 4 de septiembre de 2023	PROCESO: GESTIÓN DE MATERIALES	

EQUIPO:	MÁQUINA DIGITAL DOBLE RANGO PARA ENSAYOS DE CONCRETO MODELO PC - 42D SERIE 179
PROCEDIMIENTO:	INVIAS E-414-13
PROYECTO:	MEJORAMIENTO VIAL BARRIOS PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO
LOCALIZACIÓN:	MONTERÍA - CÓRDOBA
CONTRATISTA:	C.C.P. INGENIEROS S.A.S.
OBSERVACION:	MUESTRA SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

Nº	CÓDIGO	ELEMENTO QUE REPRESENTA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE FABRICA	EDAD (DIAS)	FECHA DE FALLA	RESISTENCIA ESPERADA (MR)	BASE (CM)	ALTURA (CM)	LONGITUD (CM)	LONGITUD ENTRE APOYOS (CM)	CARGA (KN)	TIPO DE FALLA	RESISTENCIA (MPa)	RESISTENCIA (MR)	PORCENTAJE DE RESISTENCIA REAL (%)
1	-	CARRIL DERECHO TRAMO 7	17/08/2023	4/08/2023	14	18/08/2023	38.00	15.50	15.80	61.10	48.00	27.84	TERCIO MEDIO	3.45	34.53	91%
2	-	CARRIL DERECHO TRAMO 7	17/08/2023	4/08/2023	28	1/09/2023	38.00	15.50	15.40	50.50	48.00	30.25	TERCIO MEDIO	3.95	39.49	104%
3	-	CARRIL DERECHO TRAMO 7	17/08/2023	5/08/2023	14	19/08/2023	38.00	15.50	15.50	60.50	48.00	28.42	TERCIO MEDIO	3.66	36.63	96%
4	-	CARRIL DERECHO TRAMO 7	17/08/2023	5/08/2023	28	2/09/2023	38.00	15.50	15.50	50.50	48.00	31.05	TERCIO MEDIO	4.00	40.02	105%
5	-	CARRIL IZQUIERDO TRAMO 7	17/08/2023	6/08/2023	14	20/08/2023	38.00	16.00	16.00	61.00	48.00	29.89	TERCIO MEDIO	3.50	35.03	92%
6	-	CARRIL IZQUIERDO TRAMO 2	17/08/2023	9/08/2023	14	23/08/2023	38.00	15.80	15.70	61.00	48.00	27.74	TERCIO MEDIO	3.41	34.19	90%
7	-	CARRIL IZQUIERDO TRAMO 2	17/08/2023	9/08/2023	28	6/09/2023	38.00	15.50	15.30	50.20	48.00	29.03	TERCIO MEDIO	3.84	38.40	101%
8	-	CARRIL IZQUIERDO TRAMO 2	17/08/2023	11/08/2023	14	25/08/2023	38.00	15.50	15.70	61.00	48.00	28.16	TERCIO MEDIO	3.53	35.38	93%
9	-	CARRIL IZQUIERDO TRAMO 2	17/08/2023	14/08/2023	14	28/08/2023	38.00	15.80	15.50	61.00	48.00	28.69	TERCIO MEDIO	3.62	36.28	95%

Ing. Civil NATHALIA HERNANDEZ
M.P. 2220216678SCOR

Ing. Geotecnista PABLO CASTILLA NEGRETE
M.P. 1320251172BLV

E-Mail: Consultoriasgeotecniayambiental@gmail.com / Teléfono-Celular: 781 6378 - 300 510 1960 / Calle 27 # 6-12 Centro de Montería, Cordoba

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN DE ESTE LABORATORIO

Consultorías y Ambiente	RESULTADO PRUEBA DE RESISTENCIA PARA VIGUETAS	V1
FECHA DE EMISIÓN: 08 de septiembre de 2023	PROCESO: GESTIÓN DE MATERIALES	

EQUIPO:	MÁQUINA DIGITAL DOBLE RANGO PARA ENSAYOS DE CONCRETO MODELO PC - 42D SERIE 179
PROCEDIMIENTO:	INVIAS E-414-13
PROYECTO:	MEJORAMIENTO VIAL BARRIOS PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO
LOCALIZACIÓN:	MONTERÍA - CÓRDOBA
CONTRATISTA:	C.C.P. INGENIEROS S.A.S.
OBSERVACION:	MUESTRA SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

Nº	CÓDIGO	ELEMENTO QUE REPRESENTA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE FABRICA	EDAD (DIAS)	FECHA DE FALLA	RESISTENCIA ESPERADA (MR)	BASE (CM)	ALTURA (CM)	LONGITUD (CM)	LONGITUD ENTRE APOYOS (CM)	CARGA (KN)	TIPO DE FALLA	RESISTENCIA (MPa)	RESISTENCIA (MR)	PORCENTAJE DE RESISTENCIA REAL (%)
1	-	CARRIL IZQUIERDO TRAMO 1	22/08/2023	19/08/2023	14	2/09/2023	38.00	16.20	15.30	60.50	48.00	27.54	TERCIO MEDIO	3.48	34.86	92%

Ing. Civil NATHALIA HERNANDEZ
M.P. 2220218678SCOR

Ing. Geotecnista PABLO CASTILLA NEGRETE
M.P. 1320251172BLV

E-Mail: Consultoriasgeotecniayambiente@gmail.com / Teléfono-Celular: 781 6379 - 300 810 1966 / Calle 27 # 6-12 Centro de Montería, Cordoba

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN DE ESTE LABORATORIO

Consultorías y Ambiente	RESULTADO PRUEBA DE RESISTENCIA PARA VIGUETAS	V1
FECHA DE EMISIÓN: 08 de septiembre de 2023	PROCESO: GESTIÓN DE MATERIALES	

EQUIPO:	MÁQUINA DIGITAL DOBLE RANGO PARA ENSAYOS DE CONCRETO MODELO PC - 42D SERIE 179
PROCEDIMIENTO:	INVIAS E-414-13
PROYECTO:	MEJORAMIENTO VIAL BARRIOS PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO
LOCALIZACIÓN:	MONTERÍA - CÓRDOBA
CONTRATISTA:	C.C.P. INGENIEROS S.A.S.
OBSERVACION:	MUESTRA SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

Nº	CÓDIGO	ELEMENTO QUE REPRESENTA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE FABRICA	EDAD (DIAS)	FECHA DE FALLA	RESISTENCIA ESPERADA (MR)	BASE (CM)	ALTURA (CM)	LONGITUD (CM)	LONGITUD ENTRE APOYOS (CM)	CARGA (KN)	TIPO DE FALLA	RESISTENCIA (MPa)	RESISTENCIA (MR)	PORCENTAJE DE RESISTENCIA REAL (%)
1	-	CARRIL DERECHO TRAMO 1	5/09/2023	22/08/2023	14	5/09/2023	38.00	16.46	15.40	60.60	48.00	33.18	TERCIO MEDIO	4.06	40.80	107%
2	-	CARRIL IZQUIERDO TRAMO 1	5/09/2023	23/08/2023	14	6/09/2023	38.00	16.20	15.70	60.30	48.00	32.54	TERCIO MEDIO	3.91	39.15	103%
3	-	CARRIL DERECHO TRAMO 1	5/09/2023	19/08/2023	14	2/09/2023	38.00	15.74	15.50	50.40	48.00	29.08	TERCIO MEDIO	3.70	37.01	97%

Ing. Civil NATHALIA HERNANDEZ
M.P. 2220216678SCOR

Ing. Geotecnista PABLO CASTILLA NEGRETE
M.P. 1320251172BLV

E-Mail: Consultoriasgeotecniayambiente@gmail.com / Teléfono-Celular: 781 6378 - 300 810 1960 / Calle 27 # 6-12 Centro de Montería, Cordoba

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN DE ESTE LABORATORIO

Consultorias y Ambiente	ENSAYO DE DENSIDAD EN EL CAMPO (CONO Y ARENA)	V2
FECHA DE EMISIÓN: 17/01/2022	PROCESO: GESTIÓN DE MATERIALES	

PROYECTO:	MEJORAMIENTO VIAL BARRIOS PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO
LOCALIZACIÓN:	MONTERÍA - CÓRDOBA
FECHA:	8/08/2023
CONTRATISTA:	CCP INGENIEROS
CANTERA:	VILLA CARMEN

Método de Ensayo de Referencia: I.N.V. E 161-13

PRUEBAS		Nº1	Nº2	Nº3
LOCALIZACIÓN	UBICACIÓN	K0+240 CARRIL IZQUIERDO	K0+202 CARRIL IZQUIERDO	K0+230 CARRIL DERECHO
PESO DEL FRASCO + ARENA INICIAL	(gr)	6210	6195	6175
PESO DEL FRASCO + ARENA FINAL	(gr)	3795	3360	3080
PESO DE LA ARENA RESTANTE	(gr)	2415	2835	3095
CONSTANTE DEL CONO	(gr)	1585	1585	1585
DENSIDAD DE LA ARENA	(gr/cm3)	1.43	1.43	1.43
VOLUMEN DEL HUECO	(cm3)	580.42	874.13	1055.94
PESO DEL SUELO EXTRAIDO DEL HUECO	(gr)	1355	1815	2495
DENSIDAD HUMEDA	(gr/cm3)	2.33	2.08	2.36
HUMEDAD	(%)	8.70	6.40	7.00
DENSIDAD SECA	(gr/cm3)	2.15	1.95	2.21
DENSIDAD SECA DE LABORATORIO	(gr/cm3)	2.17	2.17	2.17
COMPACTACION DE CAMPO	(%)	98.97	89.93	101.76
ESPECIFICACIÓN NORMATIVA	(%)	95.00	95.00	95.00
OBSERVACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE

Ing. Civil NATHALIA HERNANDEZ R.
M.P. 22202166765COR

Ing. de control. PABLO CASTILLA NEGRETE
M.P. 1320251172BLV

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN DE ESTE LABORATORIO

Consultorias y Ambiente	ENSAYO DE DENSIDAD EN EL CAMPO (CONO Y ARENA)	V2
FECHA DE EMISIÓN: 17/01/2022	PROCESO: GESTIÓN DE MATERIALES	

PROYECTO:	MEJORAMIENTO VIAL BARRIOS PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO
LOCALIZACIÓN:	MONTERÍA - CÓRDOBA
FECHA:	25/07/2023
CONTRATISTA:	CCP INGENIEROS
CANTERA:	VILLA CARMEN

Método de Ensayo de Referencia: I.N.V. E 161-13

PRUEBAS		Nº1	Nº2
LOCALIZACIÓN	UBICACIÓN	K0+010	K0+030
PESO DEL FRASCO + ARENA INICIAL	(gr)	6215	6215
PESO DEL FRASCO + ARENA FINAL	(gr)	3180	3190
PESO DE LA ARENA RESTANTE	(gr)	3035	3025
CONSTANTE DEL CONO	(gr)	1585	1585
DENSIDAD DE LA ARENA	(gr/cm3)	1.43	1.43
VOLUMEN DEL HUECO	(cm3)	1013.99	1006.99
PESO DEL SUELO EXTRAIDO DEL HUECO	(gr)	2315	2460
DENSIDAD HUMEDA	(gr/cm3)	2.28	2.44
HUMEDAD	(%)	7.90	8.80
DENSIDAD SECA	(gr/cm3)	2.12	2.25
DENSIDAD SECA DE LABORATORIO	(gr/cm3)	2.17	2.17
COMPACTACION DE CAMPO	(%)	97.51	103.47
ESPECIFICACIÓN NORMATIVA	(%)	95.00	95.00
OBSERVACIÓN		CUMPLE	CUMPLE

Ing. Civil NATHALIA HERNANDEZ R.
M.P. 22202166765COR

Ing. de control. PABLO CASTILLA NEGRETE
M.P. 1320251172BLV

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN DE ESTE LABORATORIO

Consultorías y Ambiente	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO	V4
FECHA DE EMISIÓN: 18 de julio de 2022	PROCESO: GESTIÓN DE MATERIALES	

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO VIAL BARRIOS PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MONTERÍA - CÓRDOBA
CONTRATISTA:	CCP INGENIEROS
FECHA:	26/07/2023
CANTERA:	VILLA CARMEN
OBSERVACIÓN:	MATERIAL SUMINISTRADO POR EL CLIENTE

Método de Ensayo de Referencia: INV E - 213-13


GRANULOMETRÍA

W rec:	285.00
W rec + m:	7990.00
Peso Seco Inicial (grs) =	7705.0

W ret Nº200+rec:	7230.0
W ret Nº200:	6945.0
SUMA PESOS RET:	6945.0

Tamiz	Tamaño (mm)	Peso Ret. (gr)	Peso Ret. corregido (gr)	Retenido (%)	Ret. Acum. (%)	Pasa (%)
3½"	88.90	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
3"	76.20	1355.00	1355.00	17.59	17.59	82.41
2½"	63.50	0.00	0.00	0.00	17.59	82.41
2"	50.80	770.00	770.00	9.99	27.58	72.42
1½"	38.10	800.00	800.00	10.38	37.96	62.04
1"	25.40	930.00	930.00	12.07	50.03	49.97
3/4"	19.05	505.00	505.00	6.55	56.59	43.41
1/2"	12.70	570.00	570.00	7.40	63.98	36.02
3/8"	9.52	290.00	290.00	3.76	67.75	32.25
Nº4	4.75	540.00	540.00	7.01	74.76	25.24
Nº10	2.00	435.00	435.00	5.65	80.40	19.60
Nº16	1.19	190.00	190.00	2.47	82.87	17.13
Nº30	0.60	180.00	180.00	2.34	85.20	14.80
Nº40	0.43	85.00	85.00	1.10	86.31	13.69
N ° 100	0.15	190.00	190.00	2.47	88.77	11.23
N ° 200	0.07	105.00	105.00	1.36	90.14	9.86
Fondo	0.00	760.00	760.00	9.86	100.00	0.00
Total		7705.00	7705.00			

CURVA GRANULOMÉTRICA

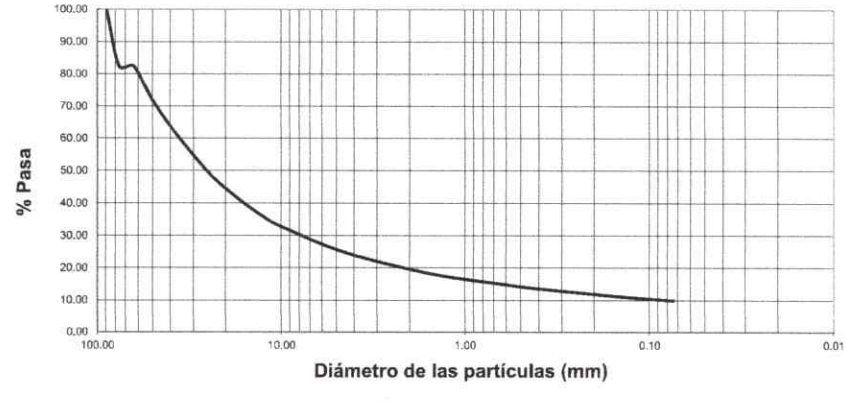

TAMIZ Nº4:	25.24%	LL:	23.00%
TAMIZ Nº200:	9.86%	IP:	7.00%

Clasificación Sistema Unificado:	GP - GC
GRAVA ARENO ARCILLOSA MAL GRADUADA	

Ing. Civil NATHALIA HERNANDEZ
M.P. 22202166765COR

Ing. Geotecnista PABLO CASTILLA NEGRETE
M.P. 1320251172BLV

PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACION DE ESTE LABORATORIO

Consultorias Geotécnica y Ambiente	**LÍMITES DE ATTERBERG**	**V4**
FECHA DE EMISIÓN: 18 de julio de 2022	**PROCESO: GESTIÓN DE MATERIALES**	

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO VIAL BARRIOS PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MONTERÍA - CÓRDOBA
CONTRATISTA:	CCP INGENIEROS
FECHA:	26/07/2023
CANTERA:	VILLA CARMEN
OBSERVACIÓN:	MATERIAL SUMINISTRADO POR EL CLIENTE

Método de Ensayo de Referencia: INV E - 122, 125 y 126 - 13

HUMEDAD NATURAL


PRUEBA N°	CÁPSULA N°	PESO DE CÁPSULA	P. CÁPSULA + SUELO HÚMEDO	P. CÁPSULA + SUELO SECO	PESO DEL AGUA	PESO DEL SUELO SECO	CONTENIDO DE AGUA (W)
		gr.	gr.	gr.	gr.	gr.	%
1	HN	75.00	770.00	725.00	45.00	650.00	6.92%
							7.00%

LÍMITE LÍQUIDO

PRUEBA N°	CÁPSULA N°	N° DE GOLPES	PESO DE CÁPSULA	P. CÁPSULA + SUELO HÚMEDO	P. CÁPSULA + SUELO SECO	PESO DEL AGUA	PESO DEL SUELO SECO	CONTENIDO DE AGUA (W)
			gr.	gr.	gr.	gr.	gr.	%
1	X15	35	26.62	37.12	35.28	1.84	8.66	21.25%
2	L4	30	26.57	37.04	35.13	1.91	8.56	22.31%
3	Ñ8	25	26.56	37.02	35.03	1.99	8.47	23.49%
4	A9	15	26.60	37.08	34.94	2.14	8.34	25.66%
								23.00%

LÍMITE PLÁSTICO

PRUEBA N°	CÁPSULA N°	PESO DE CÁPSULA	P. CÁPSULA + SUELO HÚMEDO	P. CÁPSULA + SUELO SECO	PESO DEL AGUA	PESO DEL SUELO SECO	CONTENIDO DE AGUA (W)
		gr.	gr.	gr.	gr.	gr.	%
1	LL3	13.87	17.23	16.76	0.47	2.89	16.26%
2	LP3	13.51	17.19	16.67	0.52	3.16	16.46%
3	LP8	13.53	17.22	16.70	0.52	3.17	16.40%
4	LL7	13.90	17.25	16.77	0.48	2.87	16.72%
							16.00%

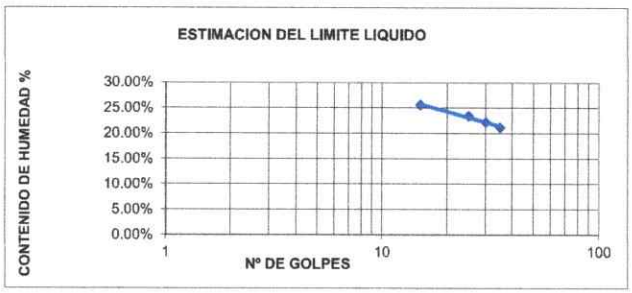

W =	7.00%
LL =	23.00%
LP =	16.00%
I_p =	7.00%
% PASA N°4=	25.24%
% PASA N°200=	9.86%
CLASIF. S.U.C.S:	GP - GC

Ing. Civil NATHALIA HERNANDEZ
M.P. 22202166765COR

Ing. de control PABLO CASTILLA NEGRETE
M.P. 1320251172BLV

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN DE ESTE LABORATORIO

Consultorías Geotecnia y Ambiente S.A.S	**PROCTOR MODIFICADO**	**V4**
FECHA DE EMISIÓN: 18 de julio de 2022	**PROCESO: GESTIÓN DE MATERIALES**	

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO VIAL BARRIOS PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MONTERÍA - CÓRDOBA
CONTRATISTA:	CCP INGENIEROS
FECHA:	26/07/2023
CANTERA:	VILLA CARMEN
OBSERVACIÓN:	MATERIAL SUMINISTRADO POR EL CLIENTE

Método de Ensayo de Referencia: INV E - 142-13

PRUEBA Nº 1

CONTENIDO DE HUMEDAD

Nº Recipiente	H15
Peso Recipiente (gr)	14.14
Peso Recipiente + Suelo Húmedo (gr)	100.81
Peso Recipiente + Suelo Seco (gr)	95.63
Humedad (%)	**6.36**

Peso Molde + Base (gr)	6150
Diámetro Molde (cm)	15.2
Altura Molde (cm)	11.6
Volumen Molde (cm^3)	2104.92
Peso Molde + Muestra Compactada (gr)	10785
Peso Muestra Compactada (gr)	4635
Densidad Húmeda (gr/cm^3)	2.20
Densidad Seca (gr/cm^3)	**2.07**

PRUEBA Nº 2

CONTENIDO DE HUMEDAD

Nº Recipiente	S45
Peso Recipiente (gr)	27.97
Peso Recipiente + Suelo Húmedo (gr)	83.1
Peso Recipiente + Suelo Seco (gr)	78.19
Humedad (%)	**9.78**

Peso Molde + Base (gr)	6150
Diámetro Molde (cm)	15.2
Altura Molde (cm)	11.6
Volumen Molde (cm^3)	2104.92
Peso Molde + Muestra Compactada (gr)	11170
Peso Muestra Compactada (gr)	5020
Densidad Húmeda (gr/cm^3)	2.38
Densidad Seca (gr/cm^3)	**2.17**

PRUEBA Nº 3

CONTENIDO DE HUMEDAD

Nº Recipiente	Y72
Peso Recipiente (gr)	28.04
Peso Recipiente + Suelo Húmedo (gr)	94.03
Peso Recipiente + Suelo Seco (gr)	86.50
Humedad (%)	**12.88**

Peso Molde + Base (gr)	6150
Diámetro Molde (cm)	15.2
Altura Molde (cm)	11.6
Volumen Molde (cm^3)	2104.92
Peso Molde + Muestra Compactada (gr)	10980
Peso Muestra Compactada (gr)	4830
Densidad Húmeda (gr/cm^3)	2.29
Densidad Seca (gr/cm^3)	**2.03**

Consultorías y Ambiente	PROCTOR MODIFICADO	V3
FECHA DE EMISION: 18 de julio de 2022	PROCESO: GESTIÓN DE MATERIALES	


GRÁFICA ENSAYO PRÓCTOR

DENSIDAD SECA (gr/cm^3)	HUMEDAD (%)
2.07	6.36%
2.17	9.78%
2.03	12.88%

GRADO DE COMPACTACIÓN	HUMEDAD (%)		
100%	9.78%		
95%	6.26%	-	12.47%
90%	5.00%	-	13.74%

Humedad óptima (%):	9.78
Densidad seca máxima (Ton/m3):	2.17

GRÁFICA ENSAYO PRÓCTOR MODIFICADO

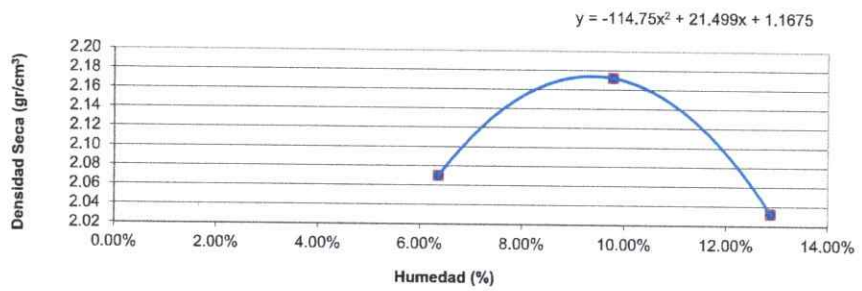

Ing. Civil NATHALIA HERNANDEZ
M.P. 222021667650OR

Ing. de control PABLO CASTILLA NEGRETE
M.P. 1320251172BLV

PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACION DE ESTE LABORATORIO

C.C.P
INGENIEROS S.A.S

Informes semanales de interventoria correspondientes al periodo a cobrar

Dirección: Carrera 6 No. 65-24
Email: ccpconstrucciones22@gmail.com
Montería, Córdoba - Colombia

ALCALDIA DE MONTERIA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Código:	
Versión:	1
Fecha de aprobación:	9/08/2022

CONTRATO No: LP – SPM – 019 -2023 **OBJETO:** MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LOS BARRIOS PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

FECHA: 7 (Día) 3 (Mes) 2023 (Año)

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Semana: 1 Del: 27/02/2023 Al: 5/03/2023

Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato: 6

Nombre de los Supervisores: MONICA MARIA SEVERICHE NUÑEZ

VÍA A INTERVENIR CON EL CONTRATO	LONGITUD (M)
VIAS DE INGRESO DEL BARRIO PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	1187,24

EJECUCIÓN DE OBRA

Los valores se remiten al costo incluido AIU DEL 33%

OBRA PROGRAMADA	EJECUTADO EN LA SEMANA		VALOR EJECUTADO ACUMULADO	EJECUTADO A COSTO DIRECTO ACUMULADO A LA FECHA		
	PROGRAMADA	EJECUTADA		EJECUTADO	PROGRAMADO	BALANCE OBRA (+ o -)
Obra Financiera %	0,17%	0,02%	Obra Ejecutada Acumulada %	0,02%	0,17%	-0,15%
Valor de la Obra programada:	$ 6.819.824	$ 821.263,12	Obra ejecutada acumulada a la fecha	$ 821.263	$ 6.819.824	$ (5.998.561,00)
Valor de Interventoría	$ 15.509.577,61	$ 15.509.577,61	Valor Interventoría.	$ 15.509.577,61	Ejecución física a la fecha presenta desfase en -0,18%	5,56%
			Ejecución física programada:	5,56%		0,00%

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	C.C.P INGENIEROS S.A.S	Interventor:	CONSORCIO HIDRALMA
Contrato N°:	LP – SPM – 019 -2022	Contrato N°:	CMA-SPM-022-2022
Valor total:	$4.011.661.268,00	Valor total:	$279.172.397,00
Plazo total :	4 MESES	Plazo total :	4 MESES
Fecha de Inicio	$44.984,00	Fecha de Inicio:	27/02/2023
Fecha de terminación:	$45.104,00	Fecha de terminación	27/06/2023

NOMBRE DE LA VÍA:	VIAS DE INGRESO DEL BARRIO PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
LONGITUD DEL CORREDOR: (m)	1187,24	DESCRIPCION	Vía Existente En Terreno Natural

Actividad:


MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	
EXCAVADORA DE LLANTAS CATERPILLAR	1
VIBROCOMPACTADOR	1
MINICARGADOR	1
VOLQUETAS	1
	4

PERSONAL OBRA		PERSONAL NO CALIFICADO DE LA VIA		PERSONAL INTERVENTORIA	
PROFESIONALES APROBADOS	11	AUXILIARES Y OFICINA	7	DIRECTOR	1
		MAESTRO	2	RESIDENTE	1
		OFICIOS VARIOS	0	SG-SST	1
		AYUDANTES	4	COMISION TOPOGRAFICA	1
		COMISION TOPOGRAFICA	2	OFICINA	4
		OPERADOR DE MAQUINARIA	3	ESPECIALISTA	3
PERSONAL DE LA ZONA	11	LABORANDO	18	TOTAL INTERVENTORIA	11

INFORMACION TECNICA

REPRESENTACION GRAFICA INVERSION SEMANAL

CURVA DE INVERSION		
SEMANA	EJECUTADO	PROGRAMADO
SEMANA 1	$ -	$ 6.819.824,16
SEMANA 2	$ -	$ 16.046.645,07
SEMANA 3	$ -	$ 62.983.081,91
SEMANA 4	$ -	$ 188.949.245,72
SEMANA 5	$ -	$ 360.648.347,99
SEMANA 6	$ -	$ 536.359.111,53
SEMANA 7	$ -	$ 713.674.539,58
SEMANA 8	$ -	$ 937.124.072,20
SEMANA 9	$ -	$ 1.156.963.109,69
SEMANA 10	$ -	$ 1.470.675.020,85
SEMANA 11	$ -	$ 1.776.363.609,47
SEMANA 12	$ -	$ 2.104.116.335,07
SEMANA 13	$ -	$ 2.452.328.533,13
SEMANA 14	$ -	$ 2.880.773.956,55
SEMANA 15	$ -	$ 3.140.729.606,72
SEMANA 16	$ -	$ 3.582.413.512,32
SEMANA 17	$ -	$ 3.934.637.371,65
SEMANA 18	$ -	$ 4.011.661.268,00

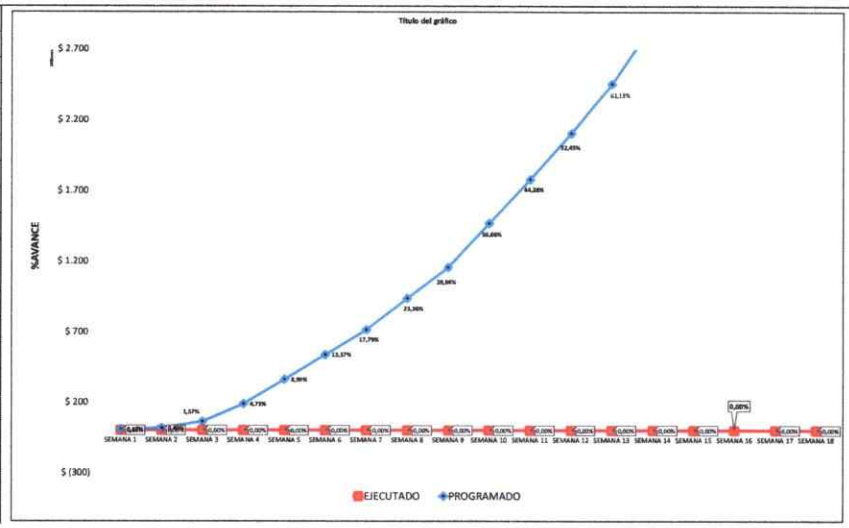

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA:

Fase preeliminar del inicio de obras, realizaron diferentes actividades administrativas, organizacionales y técnicas, tales como:

- Localización y replanteo
- Actas de vecindad
- Cierres viales y campañas de movilidad
- Vinculación de personal en obra

Ninguna actividad realizada impactó la ejecución de los ítems contemplados de la obra.

MONTERÍA Gobierno de la GENTE	**ALCALDIA DE MONTERIA** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Código:	
		Versión:	1
		Fecha de aprobación:	9/08/2022

CONTRATO No: LP – SPM – 019 -2023 **OBJETO:** MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LOS BARRIOS PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

FECHA: 7 (Día) | 3 (Mes) | 2023 (Año)

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Semana: 1 Del: 27/02/2023 Al: 5/03/2023

Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato: 6

Nombre de los Supervisores: MONICA MARIA SEVERICHE NUÑEZ

VÍA A INTERVENIR CON EL CONTRATO	LONGITUD (M)
VIAS DE INGRESO DEL BARRIO PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	1187,24

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA



ACTAS DE VECINDAD



LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO



VERIFICACION DE PERSONAL

Observaciones:

En comité N2 de fecha 28 de febrero del 2023, se solicitó: Agilizar inicio de obras, realizar cierres viales preventivos e instalar las señales verticales y pasacalles, realizar y entregar informe topográfico para evidenciar ejecución de la localización y replanteo, compromiso de llegada de maquinaria y se hizo solicitud del plande inspecciones de ensayos de laboratorio.

DIRECTOR INTERVENTORIA

ALVARO HERNANDO VERA AYALA

ALCALDIA DE MONTERIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Código:	
Versión:	1
Fecha de aprobación:	9/06/2022

CONTRATO No: LP – SPM – 019 -2023

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LOS BARRIOS PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

FECHA: 13 (Día) 3 (Mes) 2023 (Año)

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Semana:	2	Del:	6/03/2023	Al:	12/03/2023
Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato:					13
Nombre de los Supervisores:			MONICA MARIA SEVERICHE NUÑEZ		

VÍA A INTERVENIR CON EL CONTRATO	LONGITUD (M)
VIAS DE INGRESO DEL BARRIO PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA	1187,24

EJECUCIÓN DE OBRA

Los valores no remiten al costo incluido AIU DEL 33%

OBRA PROGRAMADA	EJECUTADO EN LA SEMANA		VALOR EJECUTADO ACUMULADO	EJECUTADO A COSTO DIRECTO ACUMULADO A LA FECHA		
	PROGRAMADA	EJECUTADA		EJECUTADO	PROGRAMADO	BALANCE OBRA (+ a -)
Obra Financiera %	0,23%	1,14%	Obra Ejecutada Acumulada %	1,16%	0,40%	0,76%
Valor de la Obra programada:	$ 9.226.821	$ 45.905.002,65	Obra ejecutada acumulada a la fecha	$ 46.726.266	$ 16.046.645	$ 30.679.621,90
Valor de Interventoría	$ 15.509.577,61	$ 15.509.577,61	Valor Interventoría.	$ 31.019.155,22	Ejecución física a la fecha presenta desfase en 0,76%	11,11%
			Ejecución física programada	11,11%		0,00%

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	C.C.P INGENIEROS S.A.S.	Interventor:	CONSORCIO HIDRALMA
Contrato N°:	LP – SPM – 019 -2022	Contrato N°:	CMA-SPM-022-2022
Valor total:	$4.011.661.268,00	Valor total:	$279.172.397,00
Plazo total :	4 MESES	Plazo total :	4 MESES
Fecha de Inicio	$44.984,00	Fecha de Inicio:	27/02/2023
Fecha de terminación:	$45.104,00	Fecha de terminación	27/06/2023

NOMBRE DE LA VÍA:	VIAS DE INGRESO DEL BARRIO PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
LONGITUD DEL CORREDOR: (m)	1187,24	DESCRIPCION	Vía Existente En Terreno Natural

Actividad:

					SEMANA 06/03 - 12/03			
					CANTIDAD SEMA	CANTIDAD ACUM	AVANCE ACTIVIDAD	AVANCE GENERAL
1,00	DEMOLICIONES MECANICAS CON RECUPERACION PARA RELLENO DE BOX CULVERTS, PARA ANCHOS > 50CM HASTA 80CM INCLUYE CARGUE	MB	864,74	1	31.394.499,00	1	864,74	0,00%
1,01	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA REPARACIÓN Y FINALES	M3	2508,39	0	27.000.000,00	1922,39	3822,455	0,00%
1,06	CORTE Y RETIRO DE MATERIAL SUBBASE GRANULAR	M3	4492,51	1	16.385.262,50	365	1251,11	7,76%
1,07	TERRAPLEN	M3	1918,07	1	10.316.423,00	2538	3438,5	0,00%
1,08	SUMINISTRO DE SUBBASE GRANULAR CON DISTRIBUCION GRANULOMETRICA TIPO "A" (INV. 452-07)	M3	3445,39	1	200.097.340,00	0	3441,39	0,00%
1,09	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	3282,46	1	222.372.450,00	943	943,36	0,00%
1,04	SISTEMA PARA GENERACION DE FLUJOS DE SUMINISTRO Y CONTROLGRAVA GUIAS	M3	4492,52	1	104.466.223,00	854,46	2358,05	0,19%
1,05	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO RIGIDO ESPESOR	M3	1777,41	0	1.743.661.500,00	0	1777,4	0,00%
1,04	ACERO DE REFUERZO FLL-1100 Mpa	KG	4478,39	1	36.000.000,00	0	4478,39	0,00%
6,1,03	DEMOLICIONES Y RETIROS DE MUROS DE MAMPOSTERIA	M	1098	1	4.725.000,00	1000	2098	52,2%
6,2,03	DEMOLICIONES Y REPARACIONES DE BOCAS DE AGUA TORRENTAL	M	762,00	1	2.540.000,00	762	1524	0,00%
9,1,03	DEMOLICIÓN, TRASLADO Y REPARACIÓN	M	894,70	1	3.580.000,00	762	894	0,07%
9,1,03	DEMOLICIÓN, TRASLADO Y REPARACIÓN	M	893,97	0	3.454.275,00	787	794	0,00%
4,04,1	SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA	GLO	1,00	1	45.000.000,00	1,00	1,00000000	0,00%
4,04,2	SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA	GLO	1,00	1	4.000.000,00	1,00	1,00000000	0,00%
4,04,3	TRANSITO Y DESVIACIÓN VEHICULAR	GLO	1,00	1	15.000.000,00	1,00	1,00000000	0,00%
4,04,4	TRANSITO PEATONAL	GLO	1,00	1	17.000.000,00	0,00	1,00000000	0,00%


MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	
EXCAVADORA DE LLANTAS CATERPILLAR	1
VIBROCOMPACTADOR	1
MINICARGADOR	1
VOLQUETAS	1
	4

PERSONAL OBRA		PERSONAL NO CALIFICADO DE LA VIA		PERSONAL INTERVENTORIA	
PROFESIONALES APROBADOS	11	AUXILIARES Y OFICINA	7	DIRECTOR	1
		MAESTRO	2	RESIDENTE	1
		OFICIOS VARIOS	0	SG-SST	1
		AYUDANTES	4	COMISION TOPOGRAFICA	1
		COMISION TOPOGRAFICA	2	OFICINA	4
		OPERADOR DE MAQUINARIA	3	ESPECIALISTA	3
PERSONAL DE LA ZONA	11	LABORANDO	18	TOTAL INTERVENTORIA	11

INFORMACION TECNICA

REPRESENTACION GRAFICA INVERSION SEMANAL

CURVA DE INVERSION		
SEMANA	EJECUTADO	PROGRAMADO
SEMANA 1	$ -	$ 6.819.824,16
SEMANA 2	$ 45.905.003	$ 16.046.645,07
SEMANA 3	$ -	$ 62.983.081,91
SEMANA 4	$ -	$ 188.948.245,72
SEMANA 5	$ -	$ 360.648.347,99
SEMANA 6	$ -	$ 536.359.111,53
SEMANA 7	$ -	$ 713.674.539,58
SEMANA 8	$ -	$ 937.124.072,20
SEMANA 9	$ -	$ 1.156.963.109,69
SEMANA 10	$ -	$ 1.470.675.020,85
SEMANA 11	$ -	$ 1.776.363.609,47
SEMANA 12	$ -	$ 2.104.116.335,07
SEMANA 13	$ -	$ 2.452.328.533,13
SEMANA 14	$ -	$ 2.880.773.956,55
SEMANA 15	$ -	$ 3.140.729.606,72
SEMANA 16	$ -	$ 3.582.413.512,32
SEMANA 17	$ -	$ 3.934.637.371,65
SEMANA 18	$ -	$ 4.011.661.268,00

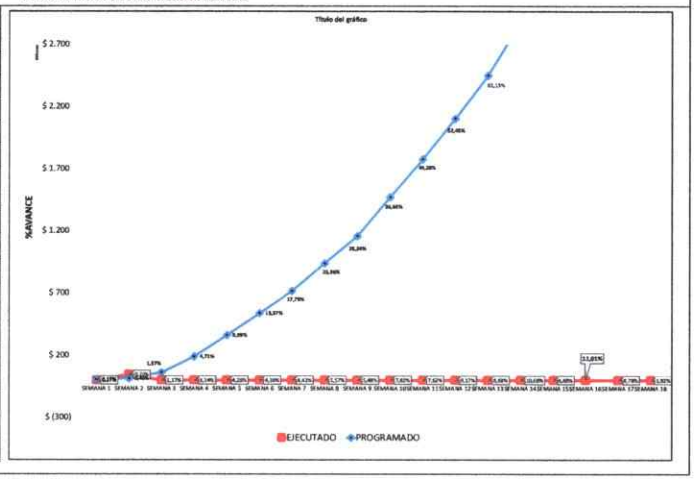

	ALCALDIA DE MONTERIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Código:	
		Versión:	1
		Fecha de aprobación:	9/06/2023

CONTRATO No: LP – SPM – 019 -2023 OBJETO: MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LOS BARRIOS PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. FECHA: 13 (Día) 3 (Mes) 2023 (Año)

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Semana: 2	Del: 6/03/2023	Al: 12/03/2023	VÍA A INTERVENIR CON EL CONTRATO	LONGITUD (M)
Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato:		13		
Nombre de los Supervisores:	MONICA MARIA SEVERICHE NUÑEZ		VIAS DE INGRESO DEL BARRIO PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA	1187,34

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA



REVISIÓN DE PERSONAL AFILIADO



INICIO DE LABORES CON MAQUINARIA



EXTENSIÓN DE MATERIAL SIPO SUBBASE



CONFORMACIÓN DE CAPA SUBBASE



CONECCIÓN FRAUDULANTE ENCONTRADA SUPERFICIAL



FALLO GENERADO POR ROTURA DE TUBERÍA DE AGUA FRAUDULENTA



Observaciones:

DIRECTOR INTERVENTORIA

ALVARO HERNANDO VERA AYALA

ALCALDIA DE MONTERIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Código:	
Versión:	1
Fecha de aprobación:	8/08/2022

CONTRATO No: LP – SPM – 019 -2023 OBJETO: MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LOS BARRIOS PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

FECHA: 20 (Día) 2 (Mes) 2023 (Año)

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Semana: 3 Del: 13/03/2023 Al: 19/03/2023

Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato: 25

Nombre de los Supervisores: MONICA MARIA SEVERICHE NUÑEZ

VÍA A INTERVENIR CON EL CONTRATO	LONGITUD (M)
VIAS DE INGRESO DEL BARRIO PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA	1187,24

EJECUCIÓN DE OBRA

Los valores se remiten el costo incluido AIU DEL 23%

OBRA PROGRAMADA	EJECUTADO EN LA SEMANA		VALOR EJECUTADO ACUMULADO	EJECUTADO A COSTO DIRECTO ACUMULADO A LA FECHA		
	PROGRAMADA	EJECUTADA		EJECUTADO	PROGRAMADO	BALANCE OBRA (+ o -)
Obra Financiera %	1,17%	0,46%	Obra Ejecutada Acumulada %	1,63%	1,57%	0,18%
Valor de la Obra programada:	$ 46.936.437	$ 18.046.758,24	Obra ejecutada acumulada a la fecha	$ 65.373.023,86	$ 62.983.082	$ 7.060.515,90
Valor de interventoría	$ 15.509.577,81	$ 15.509.577,81	Valor interventoría.	$ 46.528.732,83	Ejecución física a la fecha	16,67%
			Ejecución física programada	16,67%	Presenta desfase en 0,18%	0,00%

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	C.C.P INGENIEROS S.A.S	Interventor:	CONSORCIO HIDRALMA
Contrato N°:	LP – SPM – 019 -2022	Contrato N°:	CMA-SPM-022-2022
Valor total:	$4.011.661.268,00	Valor total:	$279.172.387,00
Plazo total :	4 MESES	Plazo total :	4 MESES
Fecha de Inicio	$44.984,00	Fecha de Inicio:	27/02/2023
Fecha de terminación:	$45.104,00	Fecha de terminación	27/06/2023

NOMBRE DE LA VÍA:	VIAS DE INGRESO DEL BARRIO PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
LONGITUD DEL CORREDOR (m)	1187,24	DESCRIPCION	Vía Existente En Terreno Natural

Actividad:

					SEMANA 3 DEL 13/03 AL 19/03		
ITEM	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD SEMANA	CANTIDAD ACUMULADA	AVANCE ACTIVIDAD
1.00	MEJORAMIENTO MATERIAL DE EXCAVACION, CARGUE, TALUD DE 3:4, SUELTO, PERFILADO Y EN UN ACCESO NORTE	KM	0,47	$ 39.109.000,00	0,00	0	0,00%
1.01	EXCAVACION MATERIAL COMUN EN CUALQUIERA Y CARGUE	M3	2.000,00	$ 20.000,00	99,00	99,00	1,65%
1.02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE (DIA NORMALMENTE)	M3	1000,00	$ 30.000,00	99,00	99,00	1,65%
1.03	CERRAMOS	M2	2176,00	$ 40.000,00	0,00	0,00	0,00%
1.04	ADECUACIONES DE LA SUBRASANTE Y CON AGREGADO SUPERIOR CON FIBRA ANCHO 7 MTS (e=0	ML	1187,00	$ 200.000,00	0,00	0,00	0,00%
1.05	TUBOS DE 24 PARA ALCANTARILLAS	ML	200,00	$ 200.000,00	0,00	0,00	0,00%
1.06	SOBRE EL PERFILADO Y COMPACTACION DE TERRENO (LABORES Y OPERADORES)	KM	0,47	$ 1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
1.07	PERFILADO, RECONFORMACION, NIVELACION, MEJORAMIENTO Y COMPACTACION	M2	5312,00	$ 2.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
1.08	SUMINISTRO DE AGREGADOS Y EXTENDIDO	M3	1187,00	$ 30.000,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.01	EXCAVACION MATERIAL DE MEJORAMIENTO DE BANCOS	M3	4000	$ 4.700.000,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.01	EXCAVACION MATERIAL DE MEJORAMIENTO DE BANCOS	M3	1000	$ 2.000.000,00	99,00	99,00	1,65%
2.1.01	EXCAVACION EN TERRENO Y REFLANTEO	M2	5312,00	$ 1.000.000,00	99,00	99,00	1,65%
2.1.01	EXCAVACIONES, TRANSITO Y REFLANTEO	M	4872,00	$ 2.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
Item	IMPRIMACION CON EL ASFALTO (4 LITROS)	KM	0,47	$ 1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
4000	PINTURA	KM	0,47	$ 2.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
4000	PINTURA Y DEMARCACION VIAL	KM	0,47	$ 2.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
4000	TRANSPORTE DE MATERIAL	KM	0,47	$ 2.000.000,00	0,00	0,00	0,00%


MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	
EXCAVADORA DE LLANTAS CATERPILLAR	1
VIBROCOMPACTADOR	1
MINICARGADOR	1
VOLQUETAS	1
	4

PERSONAL OBRA		PERSONAL NO CALIFICADO DE LA VÍA		PERSONAL INTERVENTORIA	
PROFESIONALES APROBADOS	11	AUXILIARES Y OFICINA	7	DIRECTOR	1
		MAESTRO	2	RESIDENTE	1
		OFICIOS VARIOS	6	SG-SST	1
		AYUDANTES	4	COMISION TOPOGRAFICA	1
		COMISION TOPOGRAFICA	2	OFICINA	4
		OPERADOR DE MAQUINARIA	3	ESPECIALISTA	3
PERSONAL DE LA ZONA	11	LABORANDO	18	TOTAL INTERVENTORIA	11

INFORMACION TECNICA

REPRESENTACION GRAFICA INVERSION SEMANAL

CURVA DE INVERSION		
SEMANA	EJECUTADO	PROGRAMADO
SEMANA 1	$ -	$ 6.819.824,16
SEMANA 2	$ 45.905.003	$ 18.046.645,07
SEMANA 3	$ 65.373.024	$ 62.983.081,91
SEMANA 4	$ -	$ 188.949.245,72
SEMANA 5	$ -	$ 360.648.347,99
SEMANA 6	$ -	$ 536.359.111,53
SEMANA 7	$ -	$ 713.674.539,58
SEMANA 8	$ -	$ 937.124.072,20
SEMANA 9	$ -	$ 1.156.963.109,69
SEMANA 10	$ -	$ 1.470.675.020,85
SEMANA 11	$ -	$ 1.776.363.609,47
SEMANA 12	$ -	$ 2.104.116.335,07
SEMANA 13	$ -	$ 2.452.328.533,13
SEMANA 14	$ -	$ 2.880.773.956,55
SEMANA 15	$ -	$ 3.140.729.606,72
SEMANA 16	$ -	$ 3.582.413.512,32
SEMANA 17	$ -	$ 3.934.637.371,65
SEMANA 18	$ -	$ 4.011.661.268,00

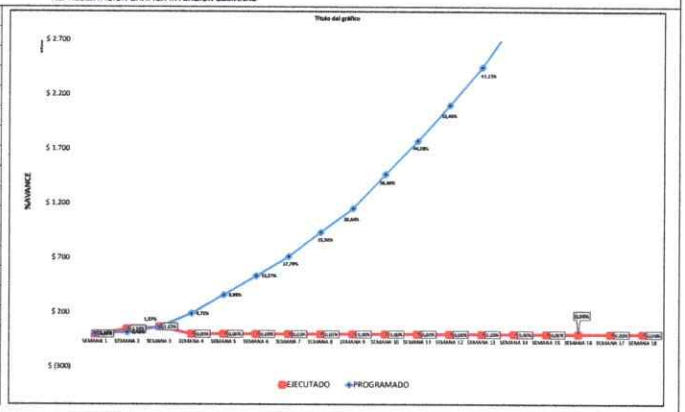

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA





EXCAVACIÓN MATERIAL COMÚN HASTA ABS 465 + ABS 377 1 CARRIL





EXISTÉNCIA DE INVASIÓN ADYACENTE AL PROYECTO



INSTALACIÓN GEOTEXTIL HASTA ABS 390







SUMINISTRO Y CONFORMACIÓN DE SUBBASE

Observaciones:

Se presentó invasión en un lote adyacente al proyecto, el cual retrasó el inicio de labores por parte del contratista por un día, y además no permitió iniciar nuevo frente de trabajo del tramo

DIRECTOR INTERVENTORIA

ALVARO HERNANDO VERA AYALA

ALCALDIA DE MONTERIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Código:	
Versión:	1
Fecha de aprobación:	9/08/2022

CONTRATO No: LP – SPM – 019 -2023 **OBJETO:** MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LOS BARRIOS PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

FECHA: 27 (Día) 3 (Mes) 2023 (Año)

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Semana: 4 Del: 20/03/2023 Al: 26/03/2023

Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato: 32

Nombre de los Supervisores: MONICA MARIA SEVERICHE NUÑEZ

VÍA A INTERVENIR CON EL CONTRATO	LONGITUD (M)
VIAS DE INGRESO DEL BARRIO PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	1187,24

EJECUCIÓN DE OBRA

Los valores se remiten al costo incluido AIU DEL 33%

OBRA PROGRAMADA	EJECUTADO EN LA SEMANA	
	PROGRAMADA	EJECUTADA
Obra Financiera %	3,14%	2,53%
Valor de la Obra programada:	$ 125.966.164	$ 101.405.677,05
Valor de interventoría	$ 15.509.577,61	$ 15.509.577,61

VALOR EJECUTADO ACUMULADO	EJECUTADO A COSTO DIRECTO ACUMULADO A LA FECHA		
	EJECUTADO	PROGRAMADO	BALANCE OBRA (+ o -)
Obra Ejecutada Acumulada %	4,16%	4,60%	-0,44%
Obra ejecutada acumulada a la fecha	$ 166.778.701	$ 184.589.551	$ (17.810.850,00)
Valor interventoría.	$ 62.038.310,44	Ejecución física a la fecha presenta desfase en -0,44%	22,22%
Ejecución física programada	22,22%		0,00%

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	C.C.P INGENIEROS S.A.S	Interventor:	CONSORCIO HIDRALMA
Contrato N°:	LP – SPM – 019 -2022	Contrato N°:	CMA-SPM-022-2022
Valor total:	$4.011.661.268,00	Valor total:	$279.172.367,00
Plazo total :	4 MESES	Plazo total :	4 MESES
Fecha de Inicio	$44.984.00	Fecha de Inicio:	27/02/2023
Fecha de terminación:	$45.104,00	Fecha de terminación	27/06/2023

NOMBRE DE LA VÍA:	VIAS DE INGRESO DEL BARRIO PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
LONGITUD DEL CORREDOR: (m)	1187,24	DESCRIPCION	Vía Existente En Terreno Natural

Actividad:

					SEMANA 20/03 - 26/03			
ITEM	DESCRIPCION DE ITEMS	UNIDAD	CANTIDAD OBRA	VALOR TOTAL	CANTIDAD SEMA	CANTIDAD ACUM	AVANCE ACTIVIDAD	AVANCE GENERAL
1.0.0	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON ESCARIADORA PARA FALLAS EN SUB RASANTE, PROFUNDIDAD = 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	MS	354,00	$ 32.291.250,00	109,56	393,2925	16,38%	0,13%
1.0.7	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN (A LA EXPLANACIÓN Y CANALES)	M3	2168,34	$ 17.108.304,00	328,52	464,682	16,38%	0,13%
1.0.9	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	4969,13	$ 95.785.751,00	214,54	902,8225	17,31%	0,42%
1.0.0	TERRAPLEN	M3	2168,33	$ 95.335.897,00	31,79	95,35	5,10%	0,13%
2.0.0	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA BALON O SIMILAR)	M3	3841,50	$ 291.647.340,00	0,00	0	0,00%	0,00%
2.0.5	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	2553,90	$ 302.575.479,00	141,75	346,75	13,58%	0,81%
3.0.0	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y LOPAS GRANULARES	M2	30456,83	$ 334.467.422,00	375,00	1750,271	16,36%	0,55%
3.0.1	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR (3,5 Mpa)	MV	5371,8	$ 1.212.921.368,00	66,57	66,57	5,40%	1,23%
3.0.0	ACERO DE REFUERZO fy = 420 Mpa	KG	6078,00	$ 18.356.400,00	65,57	65,57	1,21%	0,00%
6.1.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE MEDIA TENSION	ML	1000	$ 4.705.000,00	0,00	2000	100,00%	0,23%
6.3.03	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE BAJA TENSION	ML	700,00	$ 2.149.625,00	66,57	700	100,00%	0,09%
6.1.05	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	M	400,00	$ 2.881.544,00	66,57	400	100,00%	0,07%
6.2.01	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	M	967,00	$ 2.454.274,00	66,57	967	100,00%	0,06%
ADM1	IMPLEMENTACION DE GESTION DE OBRAS	GLO	1,00	$ 80.289.554,00	0,06	0,2353941118	23,53%	0,03%
ADM2	PAPEL	GLO	1,00	$ 3.400.000,00	0,06	0,2353941118	23,53%	0,03%
ADM3	TRAMITES Y COLOCACION APIRA	GLO	1,00	$ 21.704.320,00	0,06	0,2353941118	23,53%	0,03%
ADM4	TRAMITES AMBIENTALES	GLO	1,00	$ 17.984.000,00	0,06	0,2353941118	23,53%	0,03%
								4,16%

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	
EXCAVADORA DE LLANTAS CATERPILLAR	1
VIBROCOMPACTADOR	1
MINICARGADOR	1
VOLQUETAS	1
	4


PERSONAL OBRA		PERSONAL NO CALIFICADO DE LA VIA		PERSONAL INTERVENTORIA	
PROFESIONALES APROBADOS	11	AUXILIARES Y OFICINA	7	DIRECTOR	1
		MAESTRO	2	RESIDENTE	1
		OFICIOS VARIOS	0	SG-SST	1
		AYUDANTES	4	COMISION TOPOGRAFICA	1
		COMISION TOPOGRAFICA	2	OFICINA	4
		OPERADOR DE MAQUINARIA	3	ESPECIALISTA	3
PERSONAL DE LA ZONA	11	LABORANDO	18	TOTAL INTERVENTORIA	11

INFORMACION TECNICA

REPRESENTACION GRAFICA INVERSION SEMANAL

CURVA DE INVERSION

SEMANA	EJECUTADO	PROGRAMADO
SEMANA 1	$ -	$ 6.819.824,16
SEMANA 2	$ 45.905.002	$ 16.046.645,07
SEMANA 3	$ 65.373.024	$ 62.983.081,91
SEMANA 4	$ 166.778.701	$ 188.949.245,72
SEMANA 5	$ -	$ 360.648.347,99
SEMANA 6	$ -	$ 536.359.111,53
SEMANA 7	$ -	$ 713.674.539,58
SEMANA 8	$ -	$ 937.124.072,20
SEMANA 9	$ -	$ 1.156.963.109,69
SEMANA 10	$ -	$ 1.470.675.020,85
SEMANA 11	$ -	$ 1.776.363.609,47
SEMANA 12	$ -	$ 2.104.116.335,07
SEMANA 13	$ -	$ 2.452.328.533,13
SEMANA 14	$ -	$ 2.880.773.956,55
SEMANA 15	$ -	$ 3.140.729.606,72
SEMANA 16	$ -	$ 3.582.413.512,32
SEMANA 17	$ -	$ 3.934.637.371,65
SEMANA 18	$ -	$ 4.011.661.268,00

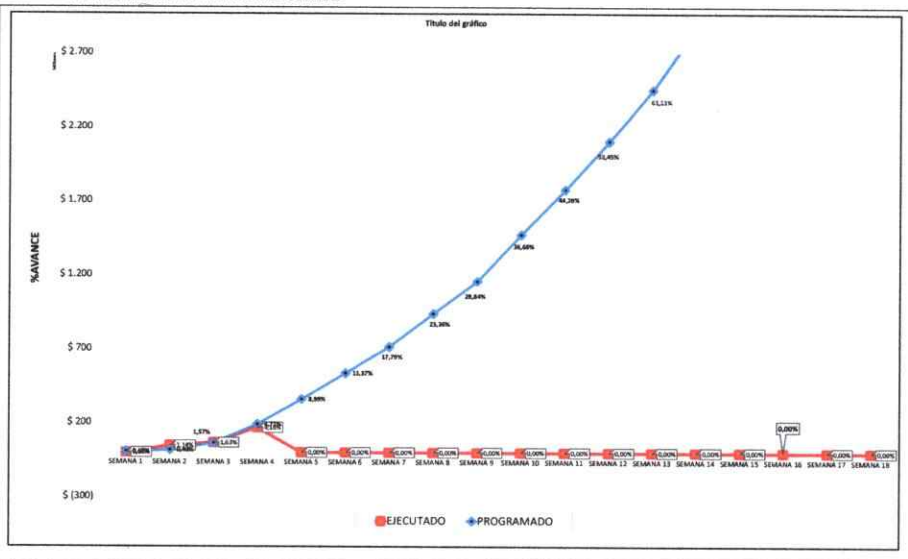

ALCALDIA DE MONTERIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Código:	
Versión:	1
Fecha de aprobación:	9/08/2022

CONTRATO No: LP – SPM – 019 -2023 **OBJETO:** MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LOS BARRIOS PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

FECHA: 27 (Día) 3 (Mes) 2023 (Año)

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Semana: 4 Del: 20/03/2023 Al: 26/03/2023

Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato: 32

Nombre de los Supervisores: MONICA MARIA SEVERICHE NUÑEZ

VÍA A INTERVENIR CON EL CONTRATO	LONGITUD (M)
VIAS DE INGRESO DEL BARRIO PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	1187,34

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA







EXCAVACIÓN MATERIAL COMÚN HASTA ABS 377 + ABS 300 1 CARRIL

ENSAYOS DE DENSIDAD PARA DETERMINAR COMPACTACIÓN








FUNDIDA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 68 M3





SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO





MOVIMIENTOS DE TIERRA Y CONFORMACIÓN DE SUBBASE

Observaciones:

DIRECTOR INTERVENTORIA

ALVARO HERNANDO VERA AYALA

ALCALDIA DE MONTERIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Código:	
Versión:	1
Fecha de aprobación:	9/08/2022

FECHA: 3 (Día) | 4 (Mes) | 2023 (Año)

CONTRATO No: LP – SPM – 019 -2023 **OBJETO:** MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LOS BARRIOS PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Semana: 5 Del: 27/03/2023 Al: 2/04/2023

Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato: 39

Nombre de los Supervisores: MONICA MARIA SEVERICHE NUÑEZ

VÍA A INTERVENIR CON EL CONTRATO	LONGITUD (M)
VIAS DE INGRESO DEL BARRIO PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	1187,24

EJECUCIÓN DE OBRA

Los valores se remiten al costo incluido AIU DEL 33%

OBRA PROGRAMADA	EJECUTADO EN LA SEMANA		VALOR EJECUTADO ACUMULADO	EJECUTADO A COSTO DIRECTO ACUMULADO A LA FECHA		
	PROGRAMADA	EJECUTADA		EJECUTADO	PROGRAMADO	BALANCE OBRA (+ o -)
Obra Financiera %	4,28%	3,46%	Obra Ejecutada Acumulada %	7,62%	8,99%	-1,37%
Valor de la Obra programada:	$ 171.699.102	$ 138.871.465,28	Obra ejecutada acumulada a la fecha	$ 305.650.166	$ 360.648.348	$ (54.998.182,00)
Valor de interventoría	$ 15.509.577,61	$ 15.509.577,61	Valor interventoría.	$ 77.547.888,06	Ejecución física a la fecha presenta desfase en -1,37%	27,78%
			Ejecución física programada	27,78%		0,00%

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	C.C.P INGENIEROS S.A.S	Interventor:	CONSORCIO HIDRALMA
Contrato N°:	LP – SPM – 019 -2022	Contrato N°:	CMA-SPM-022-2022
Valor total:	$4.011.661.268,00	Valor total:	$279.172.397,00
Plazo total :	4 MESES	Plazo total :	4 MESES
Fecha de Inicio	$44.984,00	Fecha de Inicio:	27/02/2023
Fecha de terminación:	$45.104,00	Fecha de terminación	27/06/2023

NOMBRE DE LA VÍA:	VIAS DE INGRESO DEL BARRIO PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
LONGITUD DEL CORREDOR: (m)	1187,24	DESCRIPCION	Vía Existente En Terreno Natural

Actividad:

						SEMANA 27/03 - 2/04			
						CANTIDAD SEMA	CANTIDAD ACUM	AVANCE ACTIVIDAD	AVANCE GENERAL
1,26	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON RETROEXCAVADORA PARA VALORES EN SUB RASANTE PROFUNDIDAD < 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	M3	9243,51	$	20.194.242,29	85,37	585,67	27,93%	0,14%
1,27	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA CONFORMACIÓN Y CANALES	M3	2598,56	$	27.356.868,28	121,65	599,28	21,28%	0,14%
1,28	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO < 5KM	M3	4883,13	$	96.380.781,75	217,37	1130,184	23,36%	0,34%
2,01	TERRAPLEN	M3	3996,23	$	55.139.287,63	1,33	69,47	5,01%	0,13%
2,02	UBICACIÓN/ASENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIAL(TIPO TESBA, RALCO O SIMILAR)	M3	5241,89	$	290.647.345,08	0,00	0	0,00%	0,00%
2,03	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	7513,68	$	202.171.045,20	173,75	1083	24,13%	1,33%
3,04	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	85858,43	$	134.460.422,09	588,46	2307,073	21,88%	0,76%
3,05	PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO f'c=280 (3,5 Mpa)	M3	5373,4	$	1.317.251.366,80	113,01	176,529	14,13%	1,71%
3,04	ACERO DE REFUERZO fy = 420 Mpa	KG	6078,65	$	58.208.498,65	83,67	167,34	3,43%	0,04%
6,1.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE MEDIA TENSION	ML	1000	$	4.100.053,00	0,00	1000	100,00%	0,12%
6,1.02	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE BAJA TENSION	ML	750,00	$	3.140.333,00	0,00	750	100,00%	0,09%
9,1.01	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	M	481,00	$	1.480.044,00	0,00	481	100,00%	0,01%
9,2.01	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	M	367,00	$	2.434.273,00	0,00	367	100,00%	0,06%
AIU4	IMPLEMENTACION DE GESTION DE OBRAS	GLO	1,00	$	60.253.000,00	0,09	0,29617647	29,62%	0,03%
AIU4	PAPEO	GLO	1,00	$	9.450.000,00	0,09	0,29617647	29,62%	0,04%
AIU4	TRANSITO Y LOGALIZACION AEREA	GLO	1,00	$	25.704.323,00	0,09	0,29617647	29,62%	0,03%
AIU4	TRANSITO, AMBIENTALES	GLO	1,00	$	27.000.000,00	0,09	0,29617647	29,62%	0,03%
									7,62%


MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	
EXCAVADORA DE LLANTAS CATERPILLAR	1
VIBROCOMPACTADOR	1
MINICARGADOR	1
VOLQUETAS	1
	4

PERSONAL OBRA		PERSONAL NO CALIFICADO DE LA VIA		PERSONAL INTERVENTORIA	
PROFESIONALES APROBADOS	11	AUXILIARES Y OFICINA	7	DIRECTOR	1
		MAESTRO	2	RESIDENTE	1
		OFICIOS VARIOS	0	SG-SST	1
		AYUDANTES	4	COMISION TOPOGRAFICA	1
		COMISION TOPOGRAFICA	2	OFICINA	4
		OPERADOR DE MAQUINARIA	3	ESPECIALISTA	3
PERSONAL DE LA ZONA	11	LABORANDO	18	TOTAL INTERVENTORIA	11

INFORMACION TECNICA

REPRESENTACION GRAFICA INVERSION SEMANAL

CURVA DE INVERSION		
SEMANA	EJECUTADO	PROGRAMADO
SEMANA 1	$ -	$ 6.819.824,16
SEMANA 2	$ 45.905.002	$ 16.046.645,07
SEMANA 3	$ 65.373.024	$ 62.983.081,91
SEMANA 4	$ 166.778.701	$ 188.949.245,72
SEMANA 5	$ 305.650.166	$ 360.648.347,99
SEMANA 6	$ -	$ 536.359.111,53
SEMANA 7	$ -	$ 713.674.539,58
SEMANA 8	$ -	$ 937.124.072,20
SEMANA 9	$ -	$ 1.156.963.109,69
SEMANA 10	$ -	$ 1.470.675.020,85
SEMANA 11	$ -	$ 1.776.363.609,47
SEMANA 12	$ -	$ 2.104.116.335,07
SEMANA 13	$ -	$ 2.452.328.533,13
SEMANA 14	$ -	$ 2.880.773.956,55
SEMANA 15	$ -	$ 3.140.729.606,72
SEMANA 16	$ -	$ 3.582.413.512,32
SEMANA 17	$ -	$ 3.934.637.371,65
SEMANA 18	$ -	$ 4.011.661.268,00

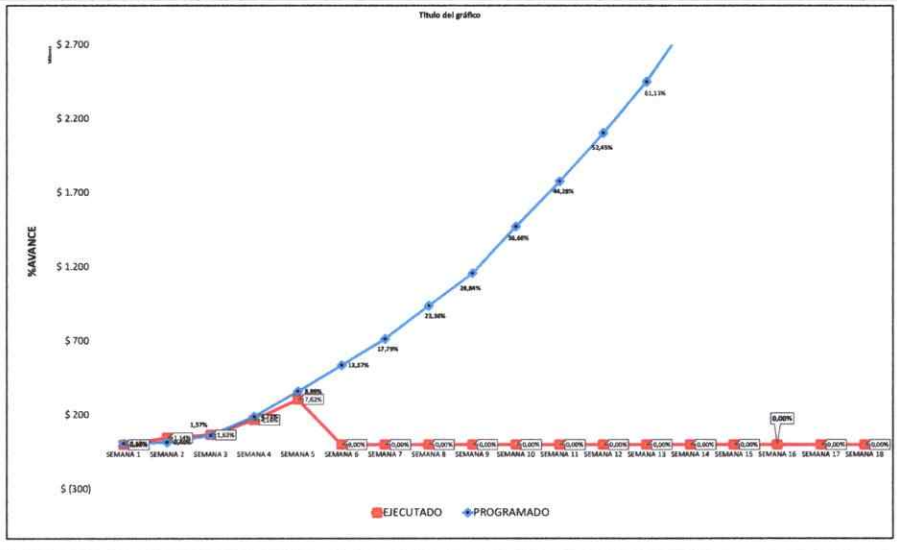

	ALCALDIA DE MONTERIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Código:	
		Versión:	1
		Fecha de aprobación:	9/08/2022

CONTRATO No: LP – SPM – 019 -2023 **OBJETO:** MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LOS BARRIOS PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

FECHA: 3 (Día) 4 (Mes) 2023 (Año)

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Semana: 5 Del: 27/03/2023 Al: 2/04/2023

Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato: 39

Nombre de los Supervisores: MONICA MARIA SEVERICHE NUÑEZ

VÍA A INTERVENIR CON EL CONTRATO	LONGITUD (M)
VIAS DE INGRESO DEL BARRIO PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	1187,24

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA







FUNDIDA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO








EXCAVACIÓN MATERIAL COMÚN, CONFORMACIÓN DE SUBBASE







TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS

Observaciones:

Se tomó muestras del concreto suministrado, un total de 3 muestras y un testigo.

DIRECTOR INTERVENTORIA

ALVARO HERNANDO VERA AYALA

ALCALDIA DE MONTERIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Código:	
Versión:	1
Fecha de aprobación:	9/08/2022

CONTRATO No: LP – SPM – 019 -2023 **OBJETO:** MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LOS BARRIOS PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

FECHA: 11 (Día) 4 (Mes) 2023 (Año)

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Semana:	6	Del:	3/04/2023	Al:	9/04/2023
Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato:			46		
Nombre de los Supervisores:	MONICA MARIA SEVERICHE NUÑEZ				

VÍA A INTERVENIR CON EL CONTRATO	LONGITUD (M)
VIAS DE INGRESO DEL BARRIO PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	1187,24

EJECUCIÓN DE OBRA

Los valores se remiten al costo incluido AIU DEL 33%

OBRA PROGRAMADA	EJECUTADO EN LA SEMANA		VALOR EJECUTADO ACUMULADO	EJECUTADO A COSTO DIRECTO ACUMULADO A LA FECHA		
	PROGRAMADA	EJECUTADA		EJECUTADO	PROGRAMADO	BALANCE OBRA (+ o -)
Obra Financiera %	4,38%	1,33%	Obra Ejecutada Acumulada %	8,95%	13,37%	-4,42%
Valor de la Obra programada:	$ 175.710.764	$ 53.507.266,24	Obra ejecutada acumulada a la fecha	$ 359.157.432	$ 536.359.112	$ (177.201.679,00)
Valor de interventoría	$ 15.509.577,61	$ 15.509.577,61	Valor interventoría.	$ 93.057.465,67	Ejecución física a la fecha presenta destrase en -4,42%	33,33%
			Ejecución física programada	33,33%		0,00%

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	C.C.P INGENIEROS S.A.S	Interventor:	CONSORCIO HIDRALMA
Contrato N°:	LP – SPM – 019 -2022	Contrato N°:	CMA-SPM-022-2022
Valor total:	$4.011.661.268,00	Valor total:	$279.172.397,00
Plazo total :	4 MESES	Plazo total :	4 MESES
Fecha de Inicio	27/02/2023	Fecha de Inicio:	27/02/2023
Fecha de terminación:	27/06/2023	Fecha de terminación	27/06/2023

NOMBRE DE LA VÍA:	VIAS DE INGRESO DEL BARRIO PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
LONGITUD DEL CORREDOR: (m)	1187,24	DESCRIPCION	Vía Existente En Terreno Natural

Actividad:

						SEMANA 3/04 - 8/04			
						CANTIDAD SEMA	CANTIDAD ACUM	AVANCE ACTIVIDAD	AVANCE GENERAL
1,06	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON DESCARGADA PARA FALLOS EN SUS MASAS H2, PROFUNDIDAD > 30 CM, NO INCLUYE RETIRO	M3	924,53	$	30.399.240,09	0,00	382,47	0,36	0,11%
1,07	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	2958,76	$	27.155.994,05	0,00	594,18	0,21	0,18%
1,08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO 1.5KM	M3	4960,13	$	94.385.751,20	0,00	1236,18	0,25	0,74%
2,05	TERRAPLEN	M3	1996,21	$	89.119.937,00	0,00	94,47	0,05	0,13%
3,02	MEJORAMIENTO O RELLENO CON ADICIÓN DE MATERIAL (TIPO TIERRA AMARILLA O SIMILAR)	M3	6141,59	$	192.447.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3,05	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	2524,46	$	202.170.445,00	0,00	445,58	0,24	1,33%
3,06	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	22454,43	$	134.453.633,00	0,00	2167,27	0,21	0,76%
5,01	SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 38 (5,5 Mpa)	M3	1171,8	$	1.757.830.368,00	56,52	105,48	0,53	3,83%
5,04	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	5179,65	$	52.200.478,65	0,00	147,34	0,03	0,04%
8.1.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE MEDIA TENSION	ML	1080	$	4.700.493,00	0,00	1035,00	1,00	0,57%
8.3.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE BAJA TENSION	ML	750,00	$	3.140.925,00	0,00	750,00	1,00	0,23%
9.1.01	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	M	453,00	$	2.001.944,00	0,00	453,00	1,00	0,07%
9.2.01	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	M	367,00	$	1.634.275,00	0,00	367,00	1,00	0,04%
ADM	IMPLEMENTACION DE GESTION DE OBRAS	GLO	1,00	$	40.263.036,00	0,00	0,29	0,29	0,07%
ADM	RAPID	GLO	1,00	$	6.480.000,00	0,00	0,79	0,79	0,19%
ADM	TRAMITES Y LEGALIZACION AFRAS	GLO	1,00	$	25.701.313,00	0,00	0,29	0,29	0,07%
ADM	TRAMITES AMBIENTALES	GLO	1,00	$	21.000.000,00	0,00	0,29	0,29	0,07%
									8,95%


MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	
EXCAVADORA DE LLANTAS CATERPILLAR	1
VIBROCOMPACTADOR	1
MINICARGADOR	1
VOLQUETAS	1
	4

PERSONAL OBRA		PERSONAL NO CALIFICADO DE LA VIA		PERSONAL INTERVENTORIA	
PROFESIONALES APROBADOS	11	AUXILIARES Y OFICINA	7	DIRECTOR	1
		MAESTRO	2	RESIDENTE	1
		OFICIOS VARIOS	0	SG-SST	1
		AYUDANTES	4	COMISION TOPOGRAFICA	1
		COMISION TOPOGRAFICA	2	OFICINA	4
		OPERADOR DE MAQUINARIA	3	ESPECIALISTA	3
PERSONAL DE LA ZONA	11	LABORANDO	18	TOTAL INTERVENTORIA	11

INFORMACION TECNICA

REPRESENTACION GRAFICA INVERSION SEMANAL

CURVA DE INVERSION		
SEMANA	EJECUTADO	PROGRAMADO
SEMANA 1	$ -	$ 6.819.824,16
SEMANA 2	$ 45.905.002	$ 16.046.645,07
SEMANA 3	$ 65.373.024	$ 62.983.081,91
SEMANA 4	$ 166.778.701	$ 188.949.245,72
SEMANA 5	$ 305.650.166	$ 360.648.347,99
SEMANA 6	$ 359.157.432	$ 536.359.111,53
SEMANA 7	$ -	$ 713.674.539,58
SEMANA 8	$ -	$ 937.124.072,20
SEMANA 9	$ -	$ 1.156.963.109,69
SEMANA 10	$ -	$ 1.470.675.020,85
SEMANA 11	$ -	$ 1.776.363.609,47
SEMANA 12	$ -	$ 2.104.116.335,07
SEMANA 13	$ -	$ 2.452.328.533,13
SEMANA 14	$ -	$ 2.880.773.956,55
SEMANA 15	$ -	$ 3.140.729.606,72
SEMANA 16	$ -	$ 3.582.413.512,32
SEMANA 17	$ -	$ 3.934.637.371,65
SEMANA 18	$ -	$ 4.011.661.268,00

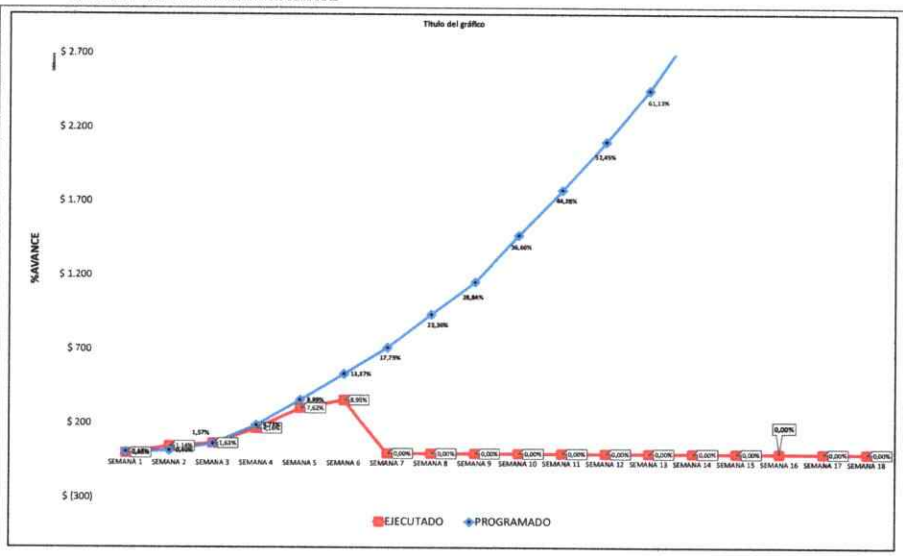

MONTERÍA Gobierno de la GENTE	**ALCALDIA DE MONTERIA** SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Código:	
		Versión:	1
		Fecha de aprobación:	9/08/2022

CONTRATO No: LP – SPM – 019 -2023 **OBJETO:** MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LOS BARRIOS PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

FECHA: 11 (Día) 4 (Mes) 2023 (Año)

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Semana:	6	Del:	3/04/2023	Al:	9/04/2023
Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato:			46		
Nombre de los Supervisores:	MONICA MARIA SEVERICHE NUÑEZ				

VÍA A INTERVENIR CON EL CONTRATO	LONGITUD (M)
VIAS DE INGRESO DEL BARRIO PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	1187,34

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA





ENSAYOS DE SUELOS







FUNDIDA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO



Observaciones:

Se cesó actividades desde el 05/04 hasta el 08/04 por motivo de semana santa

DIRECTOR INTERVENTORIA

ALVARO HERNANDO VERA AYALA

ALCALDIA DE MONTERIA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Código:	
Versión:	1
Fecha de aprobación:	9/08/2022

CONTRATO No: LP – SPM – 019 -2023 **OBJETO:** MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LOS BARRIOS PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

FECHA: 17 (Día) 4 (Mes) 2023 (Año)

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Semana: 7 Del: 10/04/2023 Al: 16/04/2023

Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato: 53

Nombre de los Supervisores: MONICA MARIA SEVERICHE NUÑEZ

VÍA A INTERVENIR CON EL CONTRATO	LONGITUD (M)
VIAS DE INGRESO DEL BARRIO PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	1187,24

EJECUCIÓN DE OBRA

Los valores se remiten al costo incluido AIU DEL 33%

OBRA PROGRAMADA	EJECUTADO EN LA SEMANA		VALOR EJECUTADO ACUMULADO	EJECUTADO A COSTO DIRECTO ACUMULADO A LA FECHA		
	PROGRAMADA	EJECUTADA		EJECUTADO	PROGRAMADO	BALANCE OBRA (+ o -)
Obra Financiera %	4,42%	1,84%	Obra Ejecutada Acumulada %	10,79%	17,79%	-7,00%
Valor de la Obra programada:	$ 177.315.428	$ 73.888.870,09	Obra ejecutada acumulada a la fecha	$ 433.046.303	$ 713.674.540	$ (280.628.237,00)
Valor de interventoría	$ 15.509.577,61	$ 15.509.577,61	Valor interventoría.	$ 108.567.043,28	Ejecución física a la fecha presenta desfase en -7%	38,89%
			Ejecución física programada	38,89%		0,00%

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	C.C.P INGENIEROS S.A.S	Interventor:	CONSORCIO HIDRALMA
Contrato N°:	LP – SPM – 019 -2022	Contrato N°:	CMA-SPM-022-2022
Valor total:	$4.011.661.268,00	Valor total:	$279.172.397,00
Plazo total :	4 MESES	Plazo total :	4 MESES
Fecha de Inicio	27/02/2023	Fecha de Inicio:	27/02/2023
Fecha de terminación:	27/06/2023	Fecha de terminación	27/06/2023

NOMBRE DE LA VÍA:	VIAS DE INGRESO DEL BARRIO PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
LONGITUD DEL CORREDOR: (m)	1187,24	DESCRIPCION	Vía Existente En Terreno Natural

Actividad:

Item	Descripción	Unidad	Cantidad Obra	Valor Parcial	SEMANA 27/03 - 2/04			
					CANTIDAD SEMA	CANTIDAD ACUM	AVANCE ACTIVIDAD	AVANCE GENERAL
1.06	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON ENTIBADORA PARA VALLES CON SUB. RASANTE PROBLEMÁTICO + RELLENO AGO INCLUYE RETIRO	M3	3042,5	$ 22.184.250,00	0,84	374,83	28,77%	0,14%
1.07	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN EN LA CONFORMACIÓN Y CANALES	M3	2568,56	$ 37.336.856,56	0,00	586,03	21,20%	0,08%
1.08	CARQUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO < 5000	M3	4966,13	$ 96.388.781,20	13,89	1535,91	30,79%	0,53%
3.05	TERRAPLÉN	M3	1596,53	$ 93.118.897,90	0,00	84,97	5,64%	0,13%
3.10	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIAL ESTABILIZADO TIPO PIEDRA BALASTO O SIMILAR	M3	1845,88	$ 103.647.345,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.20	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	1520,98	$ 260.171.645,00	0,00	365,00	24,11%	1,33%
3.09	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	10758,62	$ 324.465.432,00	0,00	1367,27	11,89%	0,79%
4.01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO E=0 MR 21,5 MPa	M3	1277,4	$ 1.277.883.966,00	77,00	313,86	24,09%	1,43%
5.04	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	6379,68	$ 58.306.409,04	0,00	107,24	1,65%	0,09%
8.1.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES DE MEDIA TENSIÓN.	ML	1000	$ 4.785.380,00	0,00	1000,00	100,00%	0,12%
8.2.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES DE BAJA TENSIÓN	ML	750,00	$ 3.589.035,00	0,00	750,00	100,00%	0,09%
8.3.01	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	M	400,00	$ 1.913.840,00	0,00	400,00	100,00%	0,07%
8.3.01.	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	M	827,00	$ 3.958.273,92	0,00	827,00	100,00%	0,09%
ADM	IMPLEMENTACION DE GESTION DE OBRAS	GLO	1,00	$ 60.000.000,00	0,00	0,35	35,41%	0,09%
ADM	PATIO	GLO	1,00	$ 6.449.000,00	0,00	0,35	35,41%	0,04%
ADM	TRAMITES Y LEGALIZACION AÉREA	GLO	1,00	$ 15.749.525,00	0,00	0,35	35,41%	0,03%
ADM	TRAMITES AMBIENTALES	GLO	1,00	$ 17.980.000,00	0,00	0,35	35,41%	0,03%
								38,89%

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	
EXCAVADORA DE LLANTAS CATERPILLAR	0
VIBROCOMPACTADOR	0
MINICARGADOR	1
VOLQUETAS	1
	2


PERSONAL OBRA		PERSONAL NO CALIFICADO DE LA VIA		PERSONAL INTERVENTORIA	
PROFESIONALES APROBADOS	11	AUXILIARES Y OFICINA	7	DIRECTOR	1
		MAESTRO	2	RESIDENTE	1
		OFICIOS VARIOS	0	SG-SST	1
		AYUDANTES	4	COMISION TOPOGRAFICA	1
		COMISION TOPOGRAFICA	2	OFICINA	4
		OPERADOR DE MAQUINARIA	3	ESPECIALISTA	3
PERSONAL DE LA ZONA	11	LABORANDO	18	TOTAL INTERVENTORIA	11

INFORMACION TECNICA

CURVA DE INVERSION

SEMANA	EJECUTADO	PROGRAMADO
SEMANA 1	$ -	$ 6.819.824,16
SEMANA 2	$ 45.905.002	$ 16.046.645,07
SEMANA 3	$ 65.373.024	$ 62.983.081,91
SEMANA 4	$ 166.778.701	$ 188.949.245,72
SEMANA 5	$ 305.650.166	$ 360.648.347,99
SEMANA 6	$ 359.157.432	$ 536.359.111,53
SEMANA 7	$ 433.046.303	$ 713.674.539,58
SEMANA 8	$ -	$ 937.124.072,20
SEMANA 9	$ -	$ 1.156.963.109,69
SEMANA 10	$ -	$ 1.470.675.020,85
SEMANA 11	$ -	$ 1.776.363.609,47
SEMANA 12	$ -	$ 2.104.116.335,07
SEMANA 13	$ -	$ 2.452.328.533,13
SEMANA 14	$ -	$ 2.880.773.956,55
SEMANA 15	$ -	$ 3.140.729.606,72
SEMANA 16	$ -	$ 3.582.413.512,32
SEMANA 17	$ -	$ 3.934.637.371,65
SEMANA 18	$ -	$ 4.011.661.268,00

REPRESENTACION GRAFICA INVERSION SEMANAL

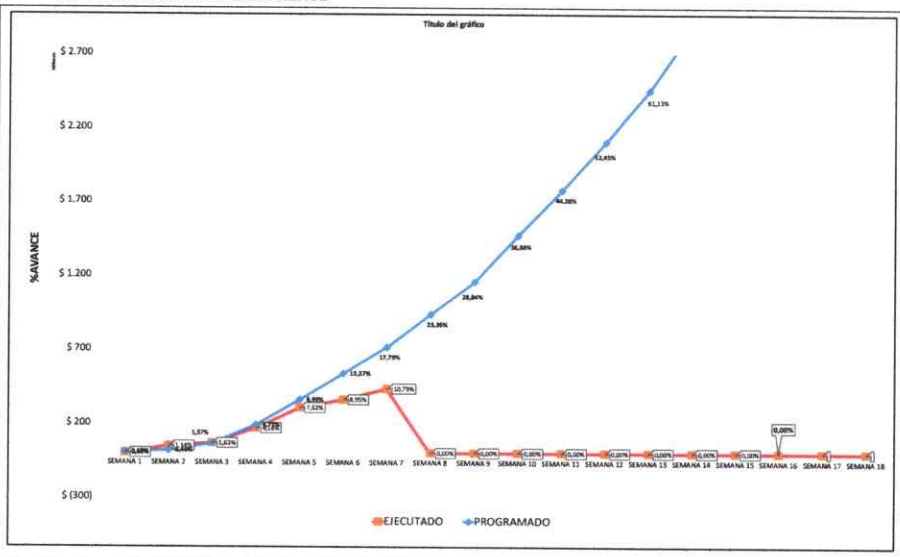

MONTERÍA Gobierno de la GENTE	**ALCALDIA DE MONTERIA** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Código:	
		Versión:	1
		Fecha de aprobación:	9/08/2022

CONTRATO No: LP – SPM – 019 -2023 **OBJETO:** MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LOS BARRIOS PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

FECHA: 17 (Día) 4 (Mes) 2023 (Año)

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Semana:	7	Del: 10/04/2023	Al:	16/04/2023	
Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato:			53		
Nombre de los Supervisores:	MONICA MARIA SEVERICHE NUÑEZ			**VÍA A INTERVENIR CON EL CONTRATO**	**LONGITUD (M)**
				VIAS DE INGRESO DEL BARRIO PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.	1187,24

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA





ENSAYOS DE SUELOS





FUNDIDA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO



Observaciones:

Se evidencia retraso en las actividades generales debido a falta de maquinaria requerida para aumentar los rendimientos tales como retroexcavadora y vibrocompactador, equipo que está siendo suplido por un accesorio del minicargador

DIRECTOR INTERVENTORIA

ALVARO HERNANDO VERA AYALA

ALCALDIA DE MONTERIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Código:	
Versión:	1
Fecha de aprobación:	8/08/2022

CONTRATO No: LP – SPM – 019 -2023 **OBJETO:** MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LOS BARRIOS PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

FECHA: 17 (Día) 4 (Mes) 2023 (Año)

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Semana: 8 Del: 17/04/2023 Al: 23/04/2023

Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato: 60

Nombre de los Supervisores: MONICA MARIA SEVERICHE NUÑEZ

VÍA A INTERVENIR CON EL CONTRATO	LONGITUD (M)
VIAS DE INGRESO DEL BARRIO PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	1187,24

EJECUCIÓN DE OBRA

Los valores se remiten al costo incluido AIU DEL 33%

OBRA PROGRAMADA	EJECUTADO EN LA SEMANA		VALOR EJECUTADO ACUMULADO	EJECUTADO A COSTO DIRECTO ACUMULADO A LA FECHA		
	PROGRAMADA	EJECUTADA		EJECUTADO	PROGRAMADO	BALANCE OBRA (+ o -)
Obra Financiera %	4,42%	1,84%	Obra Ejecutada Acumulada %	10,79%	23,36%	-12,57%
Valor de la Obra programada:	$ 177.315.428	$ 73.888.870,09	Obra ejecutada acumulada a la fecha	$ 433.046.303	$ 937.124.072	$ (504.077.770,00)
Valor de interventoría	$ 15.509.577,61	$ 15.509.577,61	Valor interventoría.	$ 124.076.620,89	Ejecución física a la fecha presenta desfase en -12,57%	44,44%
			Ejecución física programada	44,44%		0,00%

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	C.C.P INGENIEROS S.A.S	Interventor:	CONSORCIO HIDRALMA
Contrato N°:	LP – SPM – 019 -2022	Contrato N°:	CMA-SPM-022-2022
Valor total:	$4.011.661.268,00	Valor total:	$278.172.397,00
Plazo total :	4 MESES	Plazo total :	4 MESES
Fecha de Inicio	27/02/2023	Fecha de Inicio:	27/02/2023
Fecha de terminación:	27/06/2023	Fecha de terminación	27/06/2023

NOMBRE DE LA VÍA:	VIAS DE INGRESO DEL BARRIO PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
LONGITUD DEL CORREDOR: (m)	1187,24	DESCRIPCION	Vía Existente En Terreno Natural

Actividad:

Item	Descripción de la Obra	Unidad	Cantidad Total	Valor Total	SEMANA 27/03 - 2/04			
					CANTIDAD SEMA	CANTIDAD ACUM	AVANCE ACTIVIDAD	AVANCE GENERAL
1,06	EXCAVACIONES MECANICAS CON EXCAVADORA PARA VALOS EN SUB RASANTE PROFUNDIDAD > 1,5 CMS NO INCLUYE RETIRO	HR	954,54	$ 30.284.994,00	8,59	174,65	18,27%	0,34%
1,07	ENCAMADO EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACION Y CAMAS D1	M3	2948,56	$ 37.336.004,00	0,00	586,20	21,29%	0,38%
1,08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO <8KM	M3	4966,13	$ 95.380.781,60	12,00	1131,61	22,79%	0,51%
2,01	TERRAPLEN	M3	1596,32	$ 95.118.897,00	0,00	84,37	5,04%	0,13%
2,02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIAL(TIPO RECEBA RAIZO 2" SIMILAR)	M3	1641,00	$ 150.697.395,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2,03	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	3542,40	$ 261.171.845,00	0,00	605,10	24,11%	1,31%
2,04	SECTETA PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	32458,00	$ 134.405.623,00	0,00	2327,27	21,08%	0,73%
4,01	REPARCHEO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 35 (5,0 MPa)	M3	1177,4	$ 1.311.855.768,00	77,00	112,86	24,39%	7,33%
5,01	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	6370,89	$ 58.266.499,68	0,00	127,34	3,60%	0,04%
8.1.01	LOCALIZACION Y REPARTIDO DE REDES DE MEDIA TENSION.	VA	1000	$ 4.765.253,00	0,00	1000,00	100,00%	0,12%
8.2.01	LOCALIZACION Y REPARTIDO DE REDES DE BAJA TENSION.	VA	750,00	$ 3.349.923,00	0,00	750,00	100,00%	0,09%
8.3.01	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	M	853,00	$ 1.007.444,00	0,00	405,30	106,99%	0,07%
8.2.01	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	M	367,00	$ 1.454.273,00	0,00	367,00	100,00%	0,09%
ADM	IMPLEMENTACION DE GESTION DE OBRAS	GLO	1,00	$ 90.251.334,00	0,00	0,29	28,41%	0,25%
ADM	PAPES	GLO	1,00	$ 6.400.000,00	0,00	0,29	28,41%	0,04%
ADM	TRAMITES LICALIZACION AFRAM	GLO	1,00	$ 33.764.123,00	0,00	0,29	28,41%	0,03%
ADM	TRAMITES AMBIENTALES	GLO	1,00	$ 17.000.000,00	0,00	0,29	28,41%	0,01%
								10,79%


MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	
EXCAVADORA DE LLANTAS CATERPILLAR	0
VIBROCOMPACTADOR	0
MINICARGADOR	1
VOLQUETAS	1
	2

PERSONAL OBRA		PERSONAL NO CALIFICADO DE LA VIA		PERSONAL INTERVENTORIA	
PROFESIONALES APROBADOS	11	AUXILIARES Y OFICINA	7	DIRECTOR	1
		MAESTRO	2	RESIDENTE	1
		OFICIOS VARIOS	0	SG-SST	1
		AYUDANTES	4	COMISION TOPOGRAFICA	1
		COMISION TOPOGRAFICA	2	OFICINA	4
		OPERADOR DE MAQUINARIA	3	ESPECIALISTA	3
PERSONAL DE LA ZONA	11	LABORANDO	18	TOTAL INTERVENTORIA	11

INFORMACION TECNICA

REPRESENTACION GRAFICA INVERSION SEMANAL

CURVA DE INVERSION		
SEMANA	EJECUTADO	PROGRAMADO
SEMANA 1	$ -	$ 6.819.824,16
SEMANA 2	$ 45.905.002	$ 16.046.645,07
SEMANA 3	$ 65.373.024	$ 62.983.081,91
SEMANA 4	$ 166.778.701	$ 188.949.245,72
SEMANA 5	$ 305.650.166	$ 360.648.347,99
SEMANA 6	$ 359.157.432	$ 536.359.111,53
SEMANA 7	$ 433.046.303	$ 713.674.539,58
SEMANA 8	$ 433.046.303	$ 937.124.072,20
SEMANA 9	$ -	$ 1.156.963.109,69
SEMANA 10	$ -	$ 1.470.675.020,85
SEMANA 11	$ -	$ 1.776.363.609,47
SEMANA 12	$ -	$ 2.104.116.335,07
SEMANA 13	$ -	$ 2.452.328.533,13
SEMANA 14	$ -	$ 2.880.773.956,55
SEMANA 15	$ -	$ 3.140.729.606,72
SEMANA 16	$ -	$ 3.582.413.512,32
SEMANA 17	$ -	$ 3.934.637.371,65
SEMANA 18	$ -	$ 4.011.661.268,00

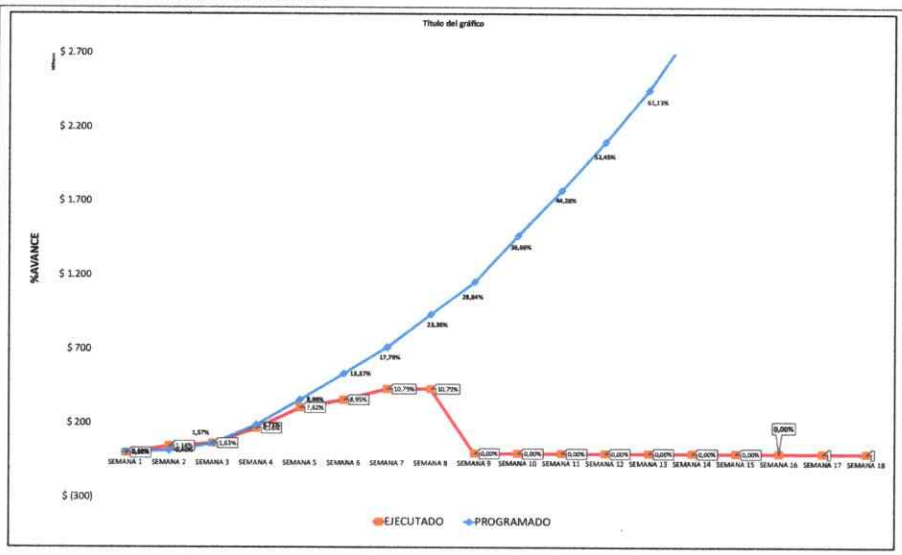

MONTERÍA Gobierno de la GENTE	**ALCALDIA DE MONTERIA** SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Código:	
		Versión:	1
		Fecha de aprobación:	9/08/2022

CONTRATO No:	LP – SPM – 019 -2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LOS BARRIOS PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.	**FECHA**	17 (Día)	4 (Mes)	2023 (Año)

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Semana:	8	Del:	17/04/2023	Al:	23/04/2023	
Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato:					60	
Nombre de los Supervisores:		MONICA MARIA SEVERICHE NUÑEZ				

VÍA A INTERVENIR CON EL CONTRATO	**LONGITUD (M)**
VIAS DE INGRESO DEL BARRIO PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	1187,24

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA







Observaciones:

el contratista de obra no ejecuta actividades durante esta semana, el contrato de obra e interventoria es suspendido el dia 28 de abril ya que se presenta el fallecimiento de un participante consorcial cuya participacion era mayoritaria. Se realiza la suspension hasta que se revise juridicamente el procedimiento a seguir frente a la situacion presentada

DIRECTOR INTERVENTORIA

ALVARO HERNANDO VERA AYALA

ALCALDIA DE MONTERIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Código:	
Versión:	1
Fecha de aprobación:	9/08/2022

CONTRATO No: LP – SPM – 019 -2023 **OBJETO:** MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LOS BARRIOS PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

FECHA: 25 (Día) 4 (Mes) 2023 (Año)

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Semana: 9 Del: 24/04/2023 Al: 28/04/2023

Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato: 65

Nombre de los Supervisores: MONICA MARIA SEVERICHE NUÑEZ

VÍA A INTERVENIR CON EL CONTRATO	LONGITUD (M)
VIAS DE INGRESO DEL BARRIO PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	1187,24

EJECUCIÓN DE OBRA

Los valores se remiten al costo incluido AIU DEL 33%

OBRA PROGRAMADA	EJECUTADO EN LA SEMANA		VALOR EJECUTADO ACUMULADO	EJECUTADO A COSTO DIRECTO ACUMULADO A LA FECHA		
	PROGRAMADA	EJECUTADA		EJECUTADO	PROGRAMADO	BALANCE OBRA (+ o -)
Obra Financiera %	5,57%	1,33%	Obra Ejecutada Acumulada %	12,57%	23,36%	-10,79%
Valor de la Obra programada:	$ 223.449.533	$ 53.507.266,24	Obra ejecutada acumulada a la fecha	$ 504.067.899	$ 937.124.072	$ (433.056.173,00)
Valor de interventoría	$ 15.509.577,61	$ 15.509.577,61	Valor interventoría.	$ 139.586.198,50	Ejecución física a la fecha presenta desfase en -10,79%	50,00%
			Ejecución física programada	50,00%		0,00%

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	C.C.P INGENIEROS S.A.S.	Interventor:	CONSORCIO HIDRALMA
Contrato N°:	LP – SPM – 019 -2022	Contrato N°:	CMA-SPM-022-2022
Valor total:	$4.011.661.268,00	Valor total:	$279.172.397,00
Plazo total :	4 MESES	Plazo total :	4 MESES
Fecha de Inicio	27/02/2023	Fecha de Inicio:	27/02/2023
Fecha de terminación:	27/06/2023	Fecha de terminación	27/06/2023

NOMBRE DE LA VÍA:	VIAS DE INGRESO DEL BARRIO PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
LONGITUD DEL CORREDOR: (m)	1187,24	DESCRIPCION	Via Existente En Terreno Natural

Actividad:

					SEMANA 27/03 - 2/04			
					CANTIDAD SEMA	CANTIDAD ACUM	AVANCE ACTIVIDAD	AVANCE GENERAL
1,00	DEMOLICIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLAS EN SUS RASANTE PROFUNDIDAD > 50 CM. INCLUYE RETIRO	MS	854,53	$ 30.290.260,00	0,00	274,65	28,77%	0,24%
1,01	DEMOLICIÓN DE MATERIAL CONCRETO DE LA DEMOLICIÓN Y CARGADO	MS	2998,56	$ 27.576.804,00	0,00	590,55	21,29%	0,15%
1,08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	MS	4985,13	$ 46.285.791,00	0,00	1252,51	22,79%	0,70%
2,00	TERRAPLEN	MS	1568,11	$ 69.118.837,00	0,00	86,97	5,68%	0,13%
2,02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIAL(TITO PEDRA RAJON O SIMILAR)	MS	3241,88	$ 250.647.345,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2,03	SUBBASE GRANULAR CLASE C	MS	1550,48	$ 203.175.045,00	0,00	360,50	24,13%	1,32%
3,00	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	30470,63	$ 334.403.222,00	0,00	2397,07	71,69%	0,75%
5,01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR (5,5 Mpa)	MS	5277,4	$ 1.351.833.348,00	74,40	387,13	30,44%	0,23%
5,04	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	8375,69	$ 58.306.498,00	0,00	167,34	3,83%	0,00%
6.1.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE MEDIA TENSION	ML	1080	$ 4.705.092,00	0,00	1080,00	100,00%	0,12%
6.2.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE BAJA TENSION.	ML	750,00	$ 3.140.520,00	0,00	750,00	100,00%	0,08%
9.1.01	LOCALIZACIÓN, TRASLADO Y REPLANTEO	M	450,00	$ 1.881.844,00	0,00	450,00	100,00%	0,01%
9.2.01	LOCALIZACIÓN, TRASLADO Y REPLANTEO	M	387,00	$ 2.454.270,00	0,00	387,00	100,00%	0,06%
AIU1	IMPLEMENTACION DE GESTION DE OBRAS	GLO	1,00	$ 40.293.590,00	0,00	0,29	29,41%	0,00%
AIU2	PAPEL	GLO	1,00	$ 4.900.000,00	0,00	0,29	29,41%	0,00%
AIU3	TRAMITES Y LICENCIACION AMBIE	GLO	1,00	$ 25.704.320,00	0,00	0,29	29,41%	0,00%
AIU4	TRAMITES AMBIENTALES	GLO	1,00	$ 17.980.000,00	0,00	0,29	29,41%	0,00%
								12,57%

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	
EXCAVADORA DE LLANTAS CATERPILLAR	0
VIBROCOMPACTADOR	0
MINICARGADOR	1
VOLQUETAS	0
	1


PERSONAL OBRA		PERSONAL NO CALIFICADO DE LA VIA		PERSONAL INTERVENTORIA	
PROFESIONALES APROBADOS	11	AUXILIARES Y OFICINA	7	DIRECTOR	1
		MAESTRO	2	RESIDENTE	1
		OFICIOS VARIOS	0	SG-SST	1
		AYUDANTES	4	COMISION TOPOGRAFICA	1
		COMISION TOPOGRAFICA	2	OFICINA	4
		OPERADOR DE MAQUINARIA	3	ESPECIALISTA	3
PERSONAL DE LA ZONA	11	LABORANDO	18	TOTAL INTERVENTORIA	11

INFORMACION TECNICA

REPRESENTACION GRAFICA INVERSION SEMANAL

CURVA DE INVERSION

SEMANA	EJECUTADO	PROGRAMADO
SEMANA 1	$ -	$ 6.819.824,16
SEMANA 2	$ 45.905.002	$ 16.046.645,07
SEMANA 3	$ 65.373.024	$ 62.983.081,91
SEMANA 4	$ 166.778.701	$ 188.949.245,72
SEMANA 5	$ 305.650.166	$ 360.648.347,99
SEMANA 6	$ 359.157.432	$ 536.359.111,53
SEMANA 7	$ 433.046.302	$ 713.674.539,58
SEMANA 8	$ 433.046.302	$ 937.124.072,20
SEMANA 9	$ 504.067.899	$ 1.156.963.109,69
SEMANA 10	$ -	$ 1.470.675.020,85
SEMANA 11	$ -	$ 1.776.363.609,47
SEMANA 12	$ -	$ 2.104.116.335,07
SEMANA 13	$ -	$ 2.452.328.533,13
SEMANA 14	$ -	$ 2.880.773.956,55
SEMANA 15	$ -	$ 3.140.729.606,72
SEMANA 16	$ -	$ 3.582.413.512,32
SEMANA 17	$ -	$ 3.934.637.371,65
SEMANA 18	$ -	$ 4.011.661.268,00

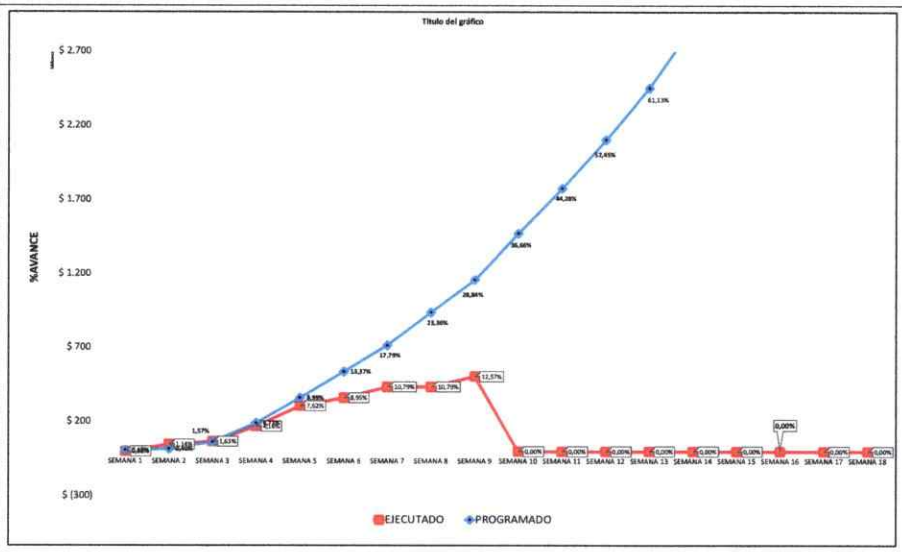

ALCALDIA DE MONTERIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Código:	
Versión:	1
Fecha de aprobación:	9/08/2022

CONTRATO No: LP – SPM – 019 -2023 **OBJETO:** MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LOS BARRIOS PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

FECHA: 25 (Día) 4 (Mes) 2023 (Año)

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Semana: 9 Del: 24/04/2023 Al: 28/04/2023

Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato: 65

Nombre de los Supervisores: MONICA MARIA SEVERICHE NUÑEZ


VÍA A INTERVENIR CON EL CONTRATO	LONGITUD (M)
VIAS DE INGRESO DEL BARRIO PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA	1187,24

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA







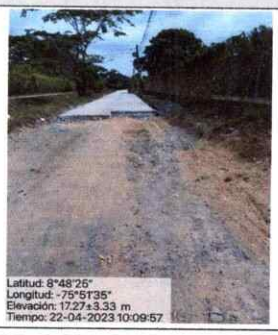

FUNDIDA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO

Observaciones:

Se evidencia significadtivo atraso en la ejecución de las actividades, teniendo de igual manera un cese de actividades desde el día sábado, lo cual impactó negativamente el rendimiento y el porcentaje de avance de las obras.

DIRECTOR INTERVENTORIA

ALVARO HERNANDO VERA

ALCALDIA DE MONTERIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Código	
Versión	1
Fecha de aprobación	9/08/2022

CONTRATO No: LP – SPM – 019 -2023 **OBJETO:** MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA. **FECHA:** 20 (Día) / 6 (Mes) / 2023 (Año)

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Semana: 8 Del: 17/07/2023 Al: 23/07/2023

Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato: 151

Nombre de los Supervisores: MONICA MARIA SEVERICHE NUÑEZ

VÍA A INTERVENIR CON EL CONTRATO	LONGITUD (M)
VIAS DE INGRESO DEL BARRIO PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA	1167,24

EJECUCIÓN DE OBRA

Los valores se remiten al costo incluido AIU DEL 33%

OBRA PROGRAMADA	EJECUTADO EN LA SEMANA		VALOR EJECUTADO ACUMULADO	EJECUTADO A COSTO DIRECTO ACUMULADO A LA FECHA		
	PROGRAMADA	EJECUTADA		EJECUTADO	PROGRAMADO	BALANCE OBRA (+ o -)
Obra Financiera %	5,57%	1,33%	Obra Ejecutada Acumulada %	14,40%	26,80%	-12,40%
Valor de la Obra programada:	$ 223.449.533	$ 53.607.266,24	Obra ejecutada acumulada a la fecha	$ 577.781.751	$ 1.070.293.732	$ (487.591.881,00)
Valor de Interventoría	$ 15.509.577,81	$ 15.509.577,81	Valor interventoría.	$ 124.076.620,89	Ejecución física a la fecha	44,44%
			Ejecución física programada	44,44%	Diferencia del Mes en -12,4%	0,00%

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	CONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE	Interventor:	CONSORCIO HIDRALMA
Contrato N°:	LP – SPM – 019 -2023	Contrato N°:	CMA-SPM-022-2022
Valor total:	$4.011.661.268,00	Valor total:	$279.172.397,00
Plazo total:	4 MESES	Plazo total:	4 MESES
Fecha de Inicio	27/02/2023	Fecha de Inicio:	27/02/2023
Fecha de terminación:	27/06/2023	Fecha de terminación	27/06/2023

NOMBRE DE LA VÍA:	VIAS DE INGRESO DEL BARRIO PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
LONGITUD DEL CORREDOR: (m)	1167,24	DESCRIPCION	Vía Existente En Terreno Natural

Actividad

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	SEMANA 13/07 - 23/07			
						CANTIDAD SEMA	CANTIDAD ACUM	AVANCE ACTIVIDAD	AVANCE GENERAL
1.01	OBRAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO	GL	1	4.870.000,00	4.870.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.02	DEMOLICIÓN DE PISO - HORMIGÓN CONCRETO	M2	2.500	5.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.03	TRASLADO, INSTALACIÓN Y/O DESMONTAJE TIPO VALLA DE SUS SOPORTE PROPORCIONADO ENTRE EN ALQUILER/VENTA	UN	24,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.04	EXCAVACIÓN MATERIAL ARMADO, CLASIFICACIÓN Y CARGUE	M3	2.000,00	21.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.05	CARGUE MATERIAL DE DESECHO, LOS ACOMODADO	M3	1.000,00	45.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.06	TRASLADO	M3	1.000,00	50.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.07	RETRANSPORTE DE LA EXCAVACIÓN QUE SOBRAN DE LA EXCAVACIÓN Y DESECHADAS A VERTEDERO	M3	1.000,00	75.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.08	SUMINISTRO DE AGUA	UN	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.01	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	2.500,00	15.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.02	SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR	M3	1.000,00	150.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.03	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, ESPESOR 0,15 m	M2	2.500,00	120.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.04	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y EXTENDIDO	M3	371,00	1.200.000,00	445.200.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.05	CURADO CON MEMBRANA DE CURADO	M2	2.500,00	5.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.01	SUMINISTRO, TENDIDO Y PERFILADO	M	1.000,00	1.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.02	EXCAVACIÓN, TENDIDO Y PERFILADO	M	1.000,00	1.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.01	IMPERMEABILIZACIÓN DE PERFILES EXTRU	M	1.000,00	1.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.02	CAPA	M2	1.167,24	40.000,00	46.689.600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.03	TRAMITES Y APROBACIÓN AMBIE	M2	1.167,24	40.000,00	46.689.600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.04	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	M2	1.167,24	40.000,00	46.689.600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
									74,56%


MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	
EXCAVADORA DE LLANTAS CATERPILLAR	0
VIBROCOMPACTADOR	0
MINICARGADOR	1
VOLQUETAS	1
	2

PERSONAL OBRA		PERSONAL NO CALIFICADO DE LA VIA		PERSONAL INTERVENTORIA	
PROFESIONALES APROBADOS	11	AUXILIARES Y OFICINA	3	DIRECTOR	1
		MAESTRO	2	RESIDENTE	1
		OFICIOS VARIOS	6	SG-SST	1
		AYUDANTES	4	COMISION TOPOGRAFICA	1
		COMISION TOPOGRAFICA	2	OFICINA	4
		OPERADOR DE MAQUINARIA	3	ESPECIALISTA	3
PERSONAL DE LA ZONA	11	LABORANDO	18	TOTAL INTERVENTORIA	11

INFORMACION TECNICA

REPRESENTACION GRAFICA INVERSION SEMANAL

CURVA DE INVERSION		
SEMANA	EJECUTADO	PROGRAMADO
SEMANA 1	$ -	$ 6.819.824,16
SEMANA 2	$ 45.905.002	$ 16.046.645,07
SEMANA 3	$ 65.373.024	$ 62.983.081,91
SEMANA 4	$ 166.778.701	$ 188.949.245,72
SEMANA 5	$ 305.650.166	$ 360.646.347,99
SEMANA 6	$ 359.157.432	$ 536.359.111,53
SEMANA 7	$ 433.046.302	$ 713.674.539,58
SEMANA 8	$ 504.067.899	$ 937.124.072,20
SEMANA 9	$ 506.672.818	$ 1.156.963.109,69
SEMANA 10	$ 577.781.751	$ 1.470.675.020,85
SEMANA 11	$ -	$ 1.776.363.609,47
SEMANA 12	$ -	$ 2.104.116.335,07
SEMANA 13	$ -	$ 2.452.328.533,13
SEMANA 14	$ -	$ 2.880.773.956,55
SEMANA 15	$ -	$ 3.140.729.606,72
SEMANA 16	$ -	$ 3.582.413.512,32
SEMANA 17	$ -	$ 3.934.637.371,65
SEMANA 18	$ -	$ 4.011.661.268,00

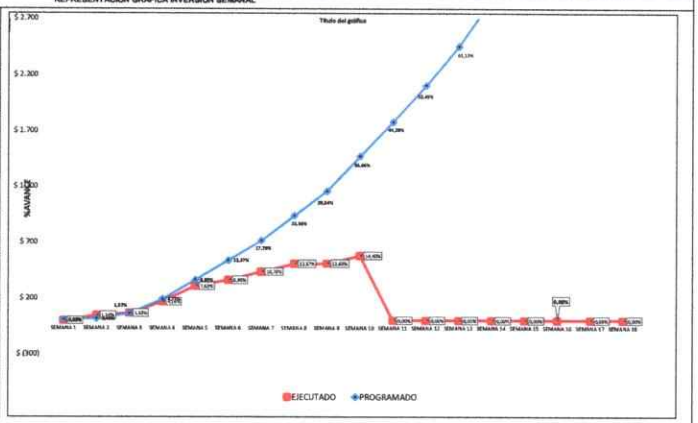

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA







Observaciones:

Se evidencia significativo atraso en la ejecución de las actividades, teniendo de igual manera un cese de actividades desde el día sábado, lo cual impactó negativamente el rendimiento y el porcentaje de avance de las obras.

DIRECTOR INTERVENTORIA

ALVARO HERNANDO VERA AYALA

ALCALDIA DE MONTERIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Código:	
Versión:	1
Fecha de aprobación:	9/08/2022

CONTRATO No: LP – SPM – 019 -2023 **OBJETO:** MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LOS BARRIOS PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. **FECHA:** 31 (Día) 7 (Mes) 2023 (Año)

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Semana: 11 Del: 24/07/2023 Al: 30/07/2023

Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato: 158

Nombre de los Supervisores: MONICA MARIA SEVERICHE NUÑEZ

VÍA A INTERVENIR CON EL CONTRATO	LONGITUD (M)
VIAS DE INGRESO DEL BARRIO PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	1187,24

EJECUCIÓN DE OBRA

Los valores se remiten al costo incluido AIU DEL 33%

OBRA PROGRAMADA	EJECUTADO EN LA SEMANA		VALOR EJECUTADO ACUMULADO	EJECUTADO A COSTO DIRECTO ACUMULADO A LA FECHA		
	PROGRAMADA	EJECUTADA		EJECUTADO	PROGRAMADO	BALANCE OBRA (+ o -)
Obra Financiera %	5,57%	1,33%	Obra Ejecutada Acumulada %	16,07%	18,37%	-2,30%
Valor de la Obra programada:	$ 223.449.533	$ 53.507.266,24	Obra ejecutada acumulada a la fecha	$ 644.673.966	$ 737.032.398	$ (92.358.432,00)
Valor de interventoría	$ 15.509.577,61	$ 15.509.577,61	Valor Interventoría.	$ 170.606.353,72	Ejecución física a la fecha presenta desfase en -2,3%	61,11%
			Ejecución física programada	61,11%		0,00%

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	CONSORCIO VIAL PAZ DEL NORTE	Interventor:	CONSORCIO HIDRALMA
Contrato N°:	LP – SPM – 019 -2022	Contrato N°:	CMA-SPM-022-2022
Valor total:	$4.011.661.268,00	Valor total:	$279.172.397,00
Plazo total :	4 MESES	Plazo total :	4 MESES
Fecha de Inicio	27/02/2023	Fecha de Inicio:	27/02/2023
Fecha de terminación:	9/09/2023	Fecha de terminación	9/09/2023

NOMBRE DE LA VÍA:	VIAS DE INGRESO DEL BARRIO PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
LONGITUD DEL CORREDOR: (m)	1187,24	DESCRIPCION	Vía Existente En Terreno Natural

Actividad:

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	SEMANA 24/07 - 30/07			
						CANTIDAD SEMA	CANTIDAD ACUM	AVANCE ACTIVIDAD	AVANCE GENERAL
1.01	DEMOLICIÓN DE CONCRETO EXISTENTE	M	129,00	$	$ 1.979.423,22	10,32	112	9%	0,54%
1.02	CORTE DE PAVIMENTO RÍGIDO Y FLEXIBLE EXISTENTE (INCLUYE DISPOSICIÓN)	M	120,00	$	$ 30.576,18	45,00	45	38%	0,54%
2.01	EXCAVACIÓN EN TIERRA Y ARENOSA DE CUNETAS	M3	126,00	$	$ 1.132.767,84	18,90	159	13%	1,37%
3.08	PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO DE 3000 PSI, INCLUYE: SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, FORMALETA, CURADO, JUNTAS, ACERO DE REFUERZO, ANCLAJES, DOBLE MALLA ELECTROSOLDADA, ACABADO ESCOBEADO, INCLUYE: TRANSPORTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	664,53	$	$ 51.199.455,00	347,13	373	56%	0,93%
3.07	EXCAVACIÓN EN SUB-RASANTE CONFIN DE LA SEPARACIÓN Y CHAFLÁN	M3	2.508,24	$	$ 37.139.451,84	418,04	1288	51%	3,24%
3.08	CAPA SUB-BASE GRANULAR, INCLUYE: SUMINISTRO, EXTENDIDO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN	M3	1.188,72	$	$ 86.282.787,24	1.188,72	2787	100%	7,01%
3.09	IMPRIMACIÓN	M2	1.556,37	$	$ 6.130.567,04	1.556,37	1556	100%	3,91%
3.10	RIEGO DE LIGA	M2	1.556,37	$	$ 22.537.342,08	1.556,37	1556	100%	3,91%
3.11	CARPETA ASFÁLTICA E=0,05 M	M3	233,46	$	$ 69.171.455,88	23,35	73	10%	0,18%
3.12	SEÑALIZACIÓN VERTICAL	UND	3.023,00	$	$ 324.171.455,88	1.511,50	456	50%	1,15%
3.13	DEMARCACIÓN EN LÍNEA DE SEPARACIÓN DE SENTIDOS DE CIRCULACIÓN Y LÍNEA DE PARADA	ML	3.023,00	$	$ 108.465.422,88	3.023,00	3023	100%	7,60%
3.14	PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO E=0,20 M	M2	1.275,21	$	$ 1.101.851.168,80	637,60	1088	85%	2,74%
3.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA	M	4.076,00	$	$ 56.200.000,00	1.357,33	1357	33%	3,41%
3.16	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE POZOS DE VISITA TIPO 2A	UND	1,00	$	$ 4.700.000,00	1,00	1	100%	0,02%
3.17	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE POZOS DE VISITA TIPO 2B	M	750,00	$	$ 3.240.000,00	750,00	750	100%	1,89%
3.18	RESTAURACIÓN, TRASLADO Y REPLANTEO	M	403,00	$	$ 2.500.000,00	403,00	403	100%	1,01%
3.19	DESTRUCCIÓN, TRASLADO Y REPLANTEO	M	403,00	$	$ 2.500.000,00	403,00	403	100%	1,01%
3.20	IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN	GLB	1,00	$	$ 2.434.270,00	0,00	0	0%	0,00%
4.01	AIU	GLB	1,00	$	$ 84.390.000,00	0,00	0	0%	0,00%
4.02	TRANSITO Y ACUARTELAMIENTO	GLB	1,00	$	$ 5.400.000,00	0,00	0	0%	0,00%
4.03	TRANSITO AMBIENTALES	GLB	1,00	$	$ 21.000.000,00	0,00	0	0%	0,00%
					$ 17.500.000,00	0,00	0	0%	0,00%
									61,11%


MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	
EXCAVADORA DE LLANTAS CATERPILLAR	0
VIBROCOMPACTADOR	0
MINICARGADOR	1
VOLQUETAS	1
	2

PERSONAL OBRA		PERSONAL NO CALIFICADO DE LA VÍA		PERSONAL INTERVENTORIA	
PROFESIONALES APROBADOS	11	AUXILIARES Y OFICINA	7	DIRECTOR	1
		MAESTRO	2	RESIDENTE	1
		OFICIOS VARIOS	0	SG-SST	1
		AYUDANTES	4	COMISION TOPOGRAFICA	1
		COMISION TOPOGRAFICA	2	OFICINA	4
		OPERADOR DE MAQUINARIA	3	ESPECIALISTA	3
PERSONAL DE LA ZONA	11	LABORAMOS	18	TOTAL INTERVENTORIA	11

INFORMACION TECNICA

REPRESENTACION GRAFICA INVERSION SEMANAL

CURVA DE INVERSION		
SEMANA	EJECUTADO	PROGRAMADO
SEMANA 1	$ -	$ 6.819.824,16
SEMANA 2	$ 45.905.002	$ 16.046.645,07
SEMANA 3	$ 65.373.024	$ 62.983.081,91
SEMANA 4	$ 166.778.701	$ 188.949.245,72
SEMANA 5	$ 305.650.166	$ 360.648.347,99
SEMANA 6	$ 359.157.432	$ 536.359.111,53
SEMANA 7	$ 433.046.302	$ 713.674.539,58
SEMANA 8	$ 504.067.899	$ 937.124.072,20
SEMANA 9	$ 506.672.818	$ 715.774.008,00
SEMANA 10	$ 577.679.223	$ 737.032.398,00
SEMANA 11	$ 644.673.966	$ 757.549.676,00
SEMANA 12	$ -	$ 782.513.485,00
SEMANA 13	$ -	$ 961.211.987,00
SEMANA 14	$ -	$ 1.531.976.404,00
SEMANA 15	$ -	$ 2.216.246.483,00
SEMANA 16	$ -	$ 3.125.643.275,00
SEMANA 17	$ -	$ 4.011.661.268,00

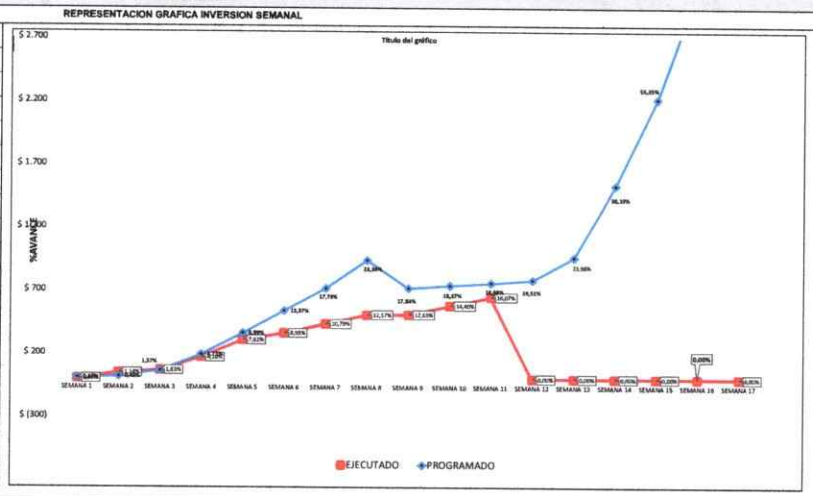

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA



CRISTIAN MAURICIO CUELLAR

Observaciones:

Se evidencia significadtivo atraso en la ejecución de las actividades, teniendo de igual manera un cese de actividades desde el día sábado, lo cual impactó negativamente el rendimiento y el porcentaje de avance de las obras.

DIRECTOR INTERVENTORIA

CRISTIAN MAURICIO CUELLAR L.

ALCALDIA DE MONTERIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

CONTRATO No:	LP – SPN – 019 -2023
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LOS BARRIOS PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA
FECHA	(Día) 8 (Mes) (Año) 2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Semana:	12	Del:	31/07/2023
Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato:			
Nombre de los Supervisores:	MONICA MARIA SEVERICHE NUÑEZ		

Al:	6/08/2023		
	965		
VIA A INTERVENIR CON EL CONTRATO		LONGITUD (M)	
VIAS DE INGRESO DEL BARRIO PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA			1187,24

EJECUCIÓN DE OBRA

Los valores se rentan el costo incluido Alc. DEL 23%

OBRA PROGRAMADA		EJECUTADO EN LA SEMANA		VALOR EJECUTADO ACUMULADO		EJECUTADO A COSTO DIRECTO ACUMULADO A LA FECHA			
		PROGRAMADA	EJECUTADA			EJECUTADO	PROGRAMADO	BALANCE OBRA (+ o -)	
Obra Financiera %		0,62%		2,93%	Obra Ejecutada Acumulada %		15,00%	16,11%	-0,50%
Valor de la Obra programada:	$	24.963.805	$ 117.639.666,53		Obra ejecutada acumulada a la fecha	$ 762.313.632	$ 782.513.485	$	(20.199.853,00)
Valor de interventoria	$	15.509.577,61	$ 15.509.577,61	Valor interventoria		$ 186.114.921,33			66,67%
				Ejecución física programada					0,00%

CONTRATO DE OBRA

		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	C.C.P.INGENIEROS S.A.S	Interventor:	CONSORCIO HIDRALMA
Contrato N°:	LP – SPN – 019 -2022	Contrato N°:	CMA-SPM-C22-2022
Valor total:	$ 4.011.661.268,00	Valor total:	$275.172.397,00
Plazo total :	4 MESES	Plazo total :	4 MESES
Fecha de inicio:	27/02/2023	Fecha de inicio:	27/02/2023
Fecha de terminación:	8/09/2023	Fecha de terminación:	8/09/2023

NOMBRE DE LA VIA:	VIAS DE INGRESO DEL BARRIO PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA
LONGITUD DEL CORREDOR (m)	1187,24
DESCRIPCION	Via Existente En Terreno Natural

Actividad



SEMANA 12 DEL 31/07 - 06/08				
	CANTIDAD SEMA	CANTIDAD ACUM	AVANCE ACTIVIDAD	AVANCE GENERAL

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	
EXCAVADORA CELULAR TIPO CATERPILLAR	1
VIBROCOMPACTADOR	1
MINICARGADOR	1
VOLQUETAS	2
	2


PERSONAL OBRA		PERSONAL NO CALIFICADO DE LA VIA		PERSONAL INTERVENTORIA	
PROFESIONALES APROBADOS	11	AUXILIARES Y OFICINA	7	DIRECTOR	1
		MAESTRO	2	RESIDENTE	1
		OFICIOS VARIOS	4	SG-SST	1
		AYUDANTES	7	COMISION TOPOGRAFICA	1
		COMISION TOPOGRAFICA	2	OFICINA	4
		OPERADOR DE MAQUINARIA	3	ESPECIALISTA	3
PERSONAL DE LA ZONA	11	LABORANCO	28	TOTAL INTERVENTORIA	11

INFORMACION TECNICA

REPRESENTACION GRAFICA INVERSION SEMANAL

CURVA DE INVERSION

SEMANA	EJECUTADO	PROGRAMADO
SEMANA 1	$ -	$ 6 819 824,16
SEMANA 2	$ 45.905.002	$ 16 046 645,07
SEMANA 3	$ 65.373.024	$ 62 983 081,91
SEMANA 4	$ 166.778.701	$ 188 949 245,72
SEMANA 5	$ 305.650.166	$ 360 648 347,99
SEMANA 6	$ 359.157.432	$ 536 359 111,53
SEMANA 7	$ 433.046.302	$ 713 674 539,58
SEMANA 8	$ 504.067.899	$ 937 124 072,20
SEMANA 9	$ 506.672.818	$ 715 774 008,00
SEMANA 10	$ 577.879.223	$ 737 032 398,00
SEMANA 11	$ 644.673.966	$ 757 549 676,00
SEMANA 12	$ 762.313.632	$ 782 513 485,00
SEMANA 13	$ -	$ 961 211 987,00
SEMANA 14	$ -	$ 1 531 976 404,00
SEMANA 15	$ -	$ 2 216 246 483,00
SEMANA 16	$ -	$ 3 125 643 275,00
SEMANA 17	$ -	$ 4 011 661 268,00

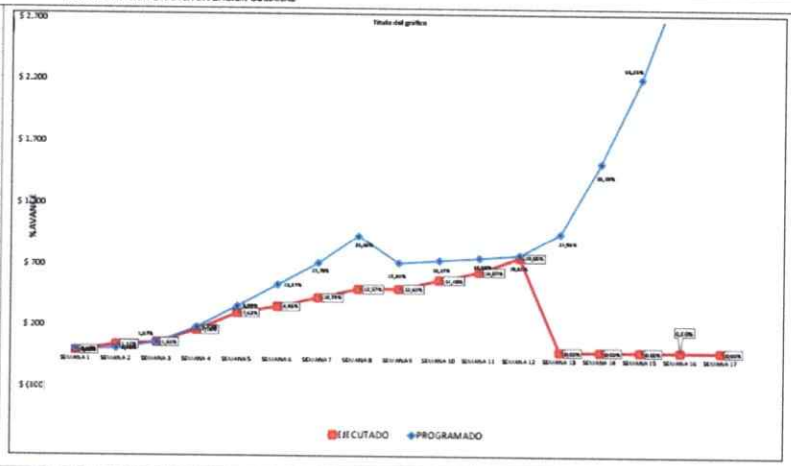

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA



Observaciones:

Se continua el mejoramiento, toma de muestras y fundida del tramo 7, se espera certificado de la entidad Vecka donde se da viabilidad para continuar excavaciones en tramo 1 y 2.

DIRECTOR INTERVENTORIA

CRISTIAN MEDRANO COELLAR

ALCALDIA DE MONTERIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Código:	
Versión:	1
Fecha de aprobación:	9/08/2022

CONTRATO No: LP – SPM – 019 -2023 **OBJETO:** MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LOS BARRIOS PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

FECHA	7	8	2023
	(Día)	(Mes)	(Año)

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Semana: 13	Del: 31/07/2023	Al: 6/08/2023	**VÍA A INTERVENIR CON EL CONTRATO**	**LONGITUD (M)**
Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato:		165	VIAS DE INGRESO DEL BARRIO PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	1187,24
Nombre de los Supervisores:	MONICA MARIA SEVERICHE NUÑEZ			

EJECUCIÓN DE OBRA

Los valores se rinden al costo incluido AIU DEL 33%

OBRA PROGRAMADA	EJECUTADO EN LA SEMANA		VALOR EJECUTADO ACUMULADO	EJECUTADO A COSTO DIRECTO ACUMULADO A LA FECHA		
	PROGRAMADA	EJECUTADA		EJECUTADO	PROGRAMADO	BALANCE OBRA (+ o -)
Obra Financiera %	0,62%	2,93%	Obra Ejecutada Acumulada %	19,00%	23,96%	-4,96%
Valor de la Obra programada:	$ 24.963.809	$ 117.639.666,53	Obra ejecutada acumulada a la fecha	$ 762.313.632	$ 961.211.987	$ (198.898.355,00)
Valor de interventoría	$ 15.509.577,61	$ 15.509.577,61	Valor interventoría	$ 201.624.508,94	Ejecución física a la fecha presenta desfase en -4,96%	72,22%
			Ejecución física programada	72,22%		0,00%

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	C.C.P INGENIEROS S.A.S	Interventor:	CONSORCIO HIDRALMA
Contrato N°:	LP – SPM – 019 -2022	Contrato N°:	CMA-SPM-022-2022
Valor total:	$4.011.661.268,00	Valor total:	$279.172.397,00
Plazo total :	4 MESES	Plazo total :	4 MESES
Fecha de Inicio	27/02/2023	Fecha de Inicio:	27/02/2023
Fecha de terminación:	8/09/2023	Fecha de terminación	8/09/2023

NOMBRE DE LA VÍA:	**VIAS DE INGRESO DEL BARRIO PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA**		
LONGITUD DEL CORREDOR: (m)	1187,24	**DESCRIPCION**	Via Existente En Terreno Natural

Actividad:

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SEMANA 31/07 - 06/08			
					CANTIDAD SEMA	CANTIDAD ACUM	AVANCE ACTIVIDAD	AVANCE GENERAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]


MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	
EXCAVADORA DE LLANTAS CATERPILLAR	1
VIBROCOMPACTADOR	1
MINICARGADOR	1
VOLQUETAS	2
	2

PERSONAL OBRA		PERSONAL NO CALIFICADO DE LA VIA		PERSONAL INTERVENTORIA	
PROFESIONALES APROBADOS	11	AUXILIARES Y OFICINA	7	DIRECTOR	1
		MAESTRO	2	RESIDENTE	1
		OFICIOS VARIOS	4	SG-SST	1
		AYUDANTES	7	COMISION TOPOGRAFICA	1
		COMISION TOPOGRAFICA	2	OFICINA	4
		OPERADOR DE MAQUINARIA	3	ESPECIALISTA	3
PERSONAL DE LA ZONA	11	**LABORANDO**	25	**TOTAL INTERVENTORIA**	11

INFORMACION TECNICA

REPRESENTACION GRAFICA INVERSION SEMANAL

CURVA DE INVERSION		
SEMANA	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**
SEMANA 1	$ -	$ 6.819.824,16
SEMANA 2	$ 45.905.002	$ 16.046.645,07
SEMANA 3	$ 65.373.024	$ 62.983.081,91
SEMANA 4	$ 166.778.701	$ 188.949.245,72
SEMANA 5	$ 305.650.166	$ 360.648.347,99
SEMANA 6	$ 359.157.432	$ 536.359.111,53
SEMANA 7	$ 433.046.302	$ 713.674.539,58
SEMANA 8	$ 433.046.302	$ 937.124.072,20
SEMANA 9	$ 504.067.899	$ 715.774.008,00
SEMANA 10	$ 506.672.818	$ 737.032.398,00
SEMANA 11	$ 577.679.223	$ 757.549.676,00
SEMANA 12	$ 644.673.966	$ 782.513.485,00
SEMANA 13	$ 762.313.632	$ 961.211.987,00
SEMANA 14	$ -	$ 1.531.976.404,00
SEMANA 15	$ -	$ 2.216.246.483,00
SEMANA 16	$ -	$ 3.125.643.275,00
SEMANA 17	$ -	$ 4.011.661.268,00

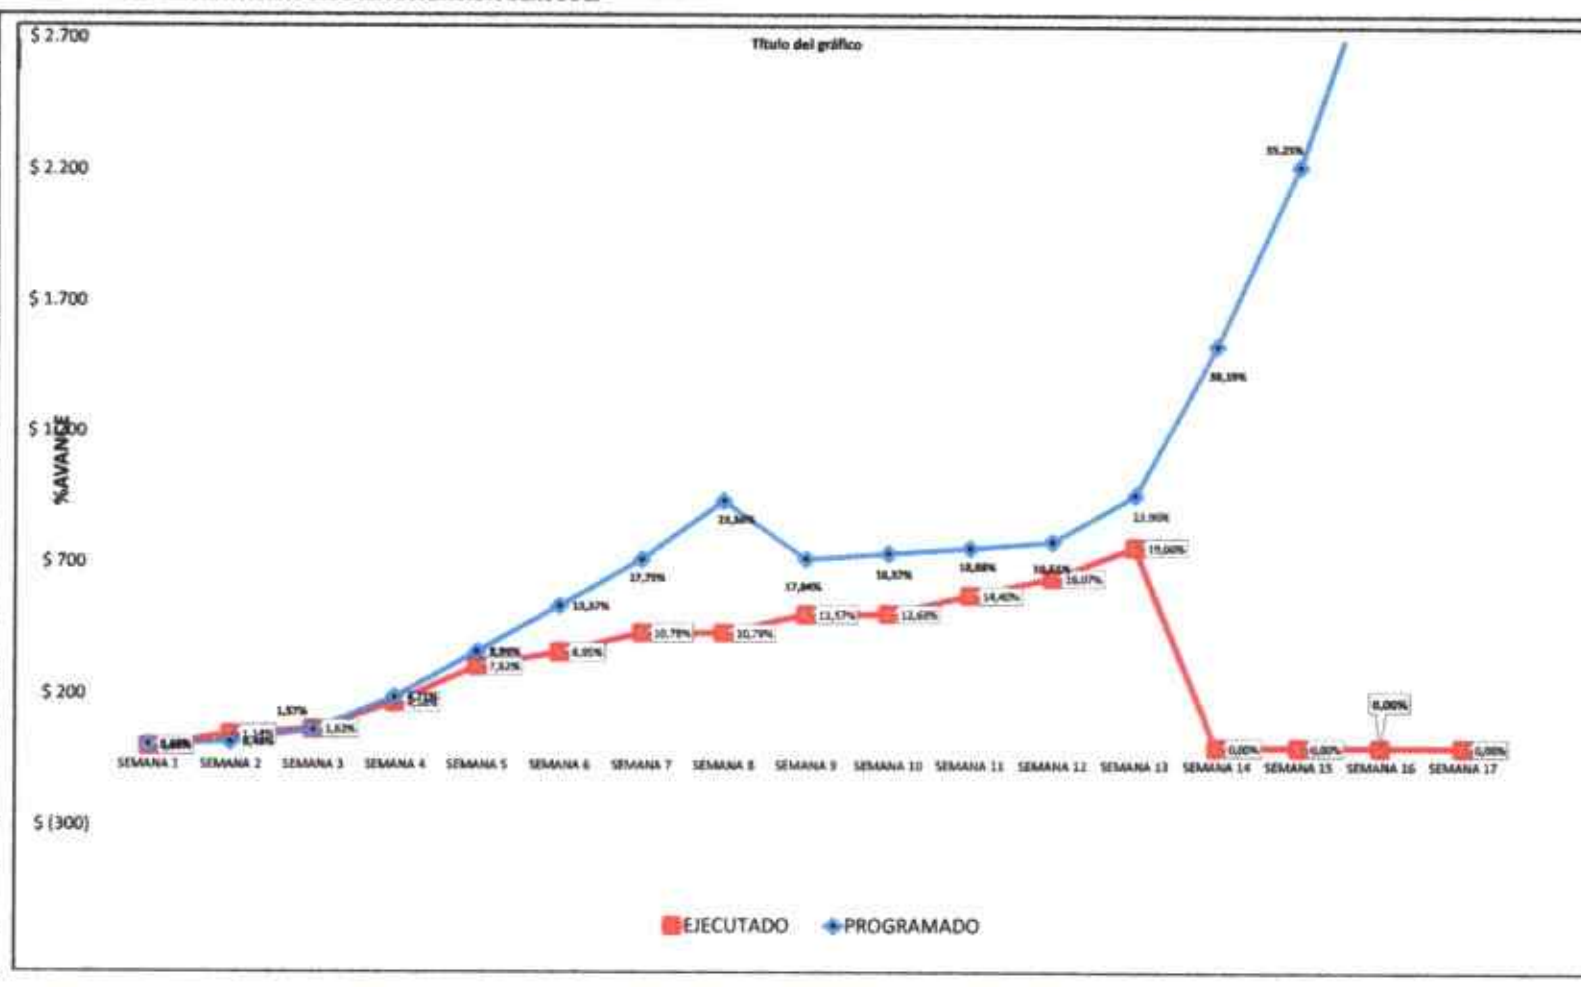

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA



Observaciones:

Se continua el mejoramiento, toma de muestras y fundida del tramo 7, se espera certificado de la entidad Veolia donde se da viabilidad para continuar excavaciones en tramo 1 y 2.

DIRECTOR INTERVENTORIA

CRISTIAN MAURICIO CUELLAR L.

ALCALDIA DE MONTERIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Código:	
Versión:	1
Fecha de aprobación:	9/08/2023

CONTRATO No: LP – SPM – 019 -2023 OBJETO: MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LOS BARRIOS PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

FECHA: 14 (Día) 8 (Mes) 2023 (Año)

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Semana: 13 Del: 7/08/2023 Al: 13/08/2023

Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato: 172

Nombre de los Supervisores: MONICA MARIA SEVERICHE NUÑEZ

VÍA A INTERVENIR CON EL CONTRATO	LONGITUD (M)
VIAS DE INGRESO DEL BARRIO PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA	1187,24

EJECUCIÓN DE OBRA

Los valores se reflejan al costo incluido A&U DEL 33%

OBRA PROGRAMADA	EJECUTADO EN LA SEMANA		VALOR EJECUTADO ACUMULADO	EJECUTADO A COSTO DIRECTO ACUMULADO A LA FECHA		
	PROGRAMADA	EJECUTADA		EJECUTADO	PROGRAMADO	BALANCE OBRA (+ o -)
Obra Financiera %	4,45%	7,02%	Obra Ejecutada Acumulada %	26,02%	38,19%	-12,17%
Valor de la Obra programada:	$ 178.998.502	$ 281.631.485,62	Obra ejecutada acumulada a la fecha	$ 1.043.845.118	$ 1.531.976.404	$ (488.131.286,00)
Valor de Interventoría	$ 15.509.577,61	$ 15.509.577,61	Valor interventoría.	$ 201.624.508,94	Ejecución física a la fecha presente diseñase en:	72,22%
			Ejecución física programada	72,22%	12,17%	0,00%

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	C.C.P INGENIEROS S.A.S	Interventor:	CONSORCIO HIDRALMA
Contrato N°:	LP – SPM – 019 -2022	Contrato N°:	CMA-SPM-022-2022
Valor total:	$4.011.861.268,00	Valor total:	$279.172.397,00
Plazo total :	4 MESES	Plazo total :	4 MESES
Fecha de Inicio:	27/02/2023	Fecha de Inicio:	27/02/2023
Fecha de terminación:	8/09/2023	Fecha de terminación	8/09/2023

NOMBRE DE LA VÍA:	VIAS DE INGRESO DEL BARRIO PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
LONGITUD DEL CORREDOR: (m)	1187,24	DESCRIPCION	Vía Existente En Terreno Natural

Actividad

					SEMANA 13 DIST - OBRA			
					CANTIDAD SEMA	CANTIDAD ACUM	AVANCE ACTIVIDAD	AVANCE CONTRAT
1.01	PRELIMINARES							
1.01	LIMPIEZA MECANICA DE TERRENO	M2	7.516,80	1	1.503,36	451	30%	0,04%
1.01	EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL COMUN	M3	1.516,80	1	303,36	106	35%	0,01%
1.01	DEMOLICION DE CONCRETO	M3	1.516,80	1	303,36	91	30%	0,01%
1.01	TRANSPORTE DE MATERIAL DE DEMOLICION	M3	1.516,80	1	303,36	91	30%	0,01%
1.01	EXCAVACION DE LA VIA	M3	1.516,80	1	303,36	91	30%	0,01%
1.01	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	1.516,80	1	303,36	91	30%	0,01%
1.01	TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE	M3	1.516,80	1	303,36	91	30%	0,01%
1.01	SUBBASE GRANULAR	M3	1.516,80	1	303,36	91	30%	0,01%
1.01	BASE GRANULAR	M3	1.516,80	1	303,36	91	30%	0,01%
1.01	IMPRIMACION	M2	7.516,80	1	1.503,36	451	30%	0,04%
1.01	PAVIMENTO EN CONCRETO	M2	7.516,80	1	1.503,36	451	30%	0,04%
1.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANDEN EN CONCRETO	M2	1.516,80	1	303,36	91	30%	0,01%
1.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SARDINEL EN CONCRETO	ML	1.516,80	1	303,36	91	30%	0,01%
1.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RAMPAS EN CONCRETO	UN	1.516,80	1	303,36	91	30%	0,01%
1.01	SEÑALIZACION VERTICAL	UN	1.516,80	1	303,36	91	30%	0,01%
1.01	SEÑALIZACION HORIZONTAL	UN	1.516,80	1	303,36	91	30%	0,01%
1.01	SEÑALIZACION PREVENTIVA	UN	1.516,80	1	303,36	91	30%	0,01%
1.01	SEÑALIZACION INFORMATIVA	UN	1.516,80	1	303,36	91	30%	0,01%
1.01	SEÑALIZACION DE ADVERTENCIA	UN	1.516,80	1	303,36	91	30%	0,01%
1.01	SEÑALIZACION REGLAMENTARIA	UN	1.516,80	1	303,36	91	30%	0,01%
1.01	SEÑALIZACION DE OBRA	UN	1.516,80	1	303,36	91	30%	0,01%
1.01	PINTURA	UN	1.516,80	1	303,36	91	30%	0,01%
1.01	TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL	UN	1.516,80	1	303,36	91	30%	0,01%
1.01	TRANSITO ALTERNATIVO	UN	1.516,80	1	303,36	91	30%	0,01%


MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	
EXCAVADORA DE LLANTAS CATERPILLAR	1
VIBROCOMPACTADOR	1
MINICARGADOR	1
VOLQUETAS	2
	2

PERSONAL OBRA		PERSONAL NO CALIFICADO DE LA VIA		PERSONAL INTERVENTORIA	
PROFESIONALES APROBADOS	11	AUXILIARES Y OFICINA	7	DIRECTOR	1
		MAESTRO	2	RESIDENTE	1
		OFICIOS VARIOS	4	SO-SST	1
		AYUDANTES	7	COMISION TOPOGRAFICA	1
		COMISION TOPOGRAFICA	2	OFICINA	4
		OPERADOR DE MAQUINARIA	3	ESPECIALISTA	3
PERSONAL DE LA ZONA	11	LABORANDO	25	TOTAL INTERVENTORIA	11

INFORMACION TECNICA

REPRESENTACION GRAFICA INVERSION SEMANAL

CURVA DE INVERSION		
SEMANA	EJECUTADO	PROGRAMADO
SEMANA 1	$ -	$ 6.819.824,16
SEMANA 2	$ 45.905.002	$ 16.046.645,07
SEMANA 3	$ 65.373.024	$ 62.983.081,91
SEMANA 4	$ 166.778.701	$ 188.949.245,72
SEMANA 5	$ 305.650.166	$ 360.848.347,99
SEMANA 6	$ 359.157.432	$ 536.359.111,53
SEMANA 7	$ 433.046.302	$ 713.674.539,58
SEMANA 8	$ 433.046.302	$ 937.124.072,20
SEMANA 9	$ 504.067.899	$ 715.774.008,00
SEMANA 10	$ 506.672.818	$ 737.032.398,00
SEMANA 11	$ 577.679.223	$ 757.549.876,00
SEMANA 12	$ 644.673.966	$ 782.513.485,00
SEMANA 13	$ 762.313.632	$ 961.211.987,00
SEMANA 14	$ 1.043.845.118	$ 1.531.976.404,00
SEMANA 15	$ -	$ 2.216.246.483,00
SEMANA 16	$ -	$ 3.125.643.275,00
SEMANA 17	$ -	$ 4.011.861.268,00

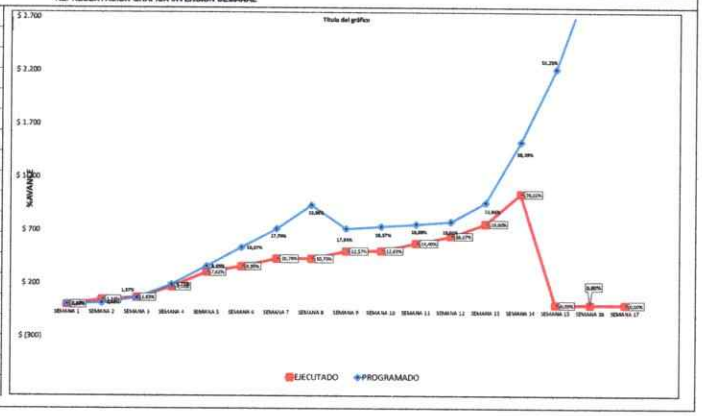

ALCALDIA DE MONTERIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Código:	
Versión:	1
Fecha de aprobación:	9/05/2023

CONTRATO No: LP – SPM – 018 -2023

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LOS BARRIOS PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

FECHA: 15 (Día) / 9 (Mes) / 2023 (Año)

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Semana: 13 Del: 7/09/2023 Al: 13/09/2023

Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato: 172


Nombre de los Supervisores: MONICA MARIA SEVERICHE NUÑEZ

VÍA A INTERVENIR CON EL CONTRATO	LONGITUD (M)
VIAS DE INGRESO DEL BARRIO PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.	1197,84

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA





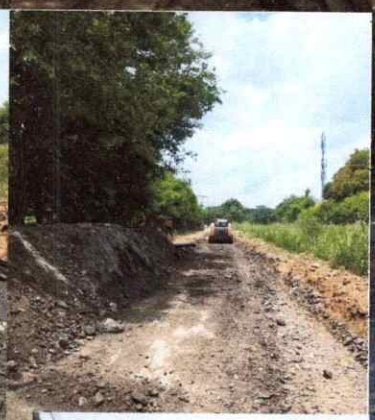





Observaciones:

Se inician excavaciones, mejoramiento de subbase, toma de densidades, muestras y fundida en tramo 2, donde tambien se realizara rehubicacion de tubería de acueducto y gas.

DIRECTOR INTERVENTORIA

CRISTIAN MAURICIO CUELLAR

ALCALDIA DE MONTERIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Código:	
Versión:	1
Fecha de aprobación:	8/08/2023

CONTRATO No: LP – SPM – 019 -2023

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LOS BARRIOS PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

FECHA: 27 (Día) | 9 (Mes) | 2023 (Año)

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Semana: 15 Del: 14/08/2023 Al: 20/08/2023

Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato: 179

Nombre de los Supervisores: MONICA MARIA SEVERICHE NUÑEZ

VÍA A INTERVENIR CON EL CONTRATO	LONGITUD (M)
VIAS DE INGRESO DEL BARRIO PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	1187,24

EJECUCIÓN DE OBRA

Los valores se reflejan al costo incluido A/U DEL 33%

OBRA PROGRAMADA	EJECUTADO EN LA SEMANA		VALOR EJECUTADO ACUMULADO	EJECUTADO A COSTO DIRECTO ACUMULADO A LA FECHA		
	PROGRAMADA	EJECUTADA		EJECUTADO	PROGRAMADO	BALANCE OBRA (+ o -)
Obra Financiera %	14,23%	7,02%	Obra Ejecutada Acumulada %	33,04%	55,25%	-22,21%
Valor de la Obra programada:	$ 570.764.417	$ 281.475.616,24	Obra ejecutada acumulada a la fecha	$ 1.325.320.734	$ 2.216.246.483	$ (890.925.749,00)
Valor de Interventoría	$ 15.508.577,81	$ 15.508.577,81	Valor interventoría.	$ 232.643.884,17	Ejecución física a la fecha presente diciembre en -	83,33%
			Ejecución física programada	83,33%	22,21%	0,00%

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	C.C.P INGENIEROS S.A.S	Interventor:	CONSORCIO HIDRALMA
Contrato N°:	LP – SPM – 019 -2022	Contrato N°:	CMA-SPM-022-2022
Valor total:	$4.011.661.268,00	Valor total:	$279.172.397,00
Plazo total:	4 MESES	Plazo total	4 MESES
Fecha de Inicio	27/02/2023	Fecha de Inicio:	27/02/2023
Fecha de terminación:	8/09/2023	Fecha de terminación	8/09/2023

NOMBRE DE LA VÍA:	VIAS DE INGRESO DEL BARRIO PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
LONGITUD DEL CORREDOR: (m)	1187,24	DESCRIPCION	Vía Existente En Terreno Natural

Actividad:

						SEMANA 15/07 - 08/08			
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD SEMANA	CANTIDAD ACUM	AVANCE ACTIVIDAD	AVANCE GENERAL
1.01	PRELIMINARES MANEJO DE TRANSITO								
1.01	DISEÑO ESTRUCTURAL Y ARQUITECTONICO DE LA OBRA	GL	GLOBAL	1	$ 170.000,00		0,5	50%	0,04%
1.02	DEMOLICIONES	M2	DEMOLICIONES	1	$ 2.376,00		0,5	50%	0,04%
1.03	EXCAVACIONES MANUALES	M3	EXCAVACIONES	1	$ 1.000.000,00		0	0%	0,00%
1.04	TRANSPORTE MATERIALES CON TRACTOMULA, PARA RECIBIR LOS DE TIERRA, PROVENIENTE CORTES ACEPTADO POR	M3	TRANSPORTE	1	$ 40.000,00		0,5	50%	0,04%
1.07									
1.08	CONFORMACION MEJORAMIENTO CON SUBRASANTE (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION DE SOBRANTES)	M2	PRELIMINARES	1	$ 15.000,00	500,00	500	50%	0,04%
1.09	CAMA DE PIEDRA DE RIO PARA TUBERIAS, CON ACARREO	M3	PRELIMINARES	1	$ 80.000,00	500,00	500	50%	0,04%
1.10	SUMINISTRO DE ARENA GRANULOMETRIA 1 PARA ACARREO	M3	PRELIMINARES	1	$ 80.000,00	500,00	500	50%	0,04%
1.11	TRAMITES	UNI	UNIDAD	1	$ 1.000.000,00	1	1	50%	0,04%
1.12	SUMINISTRO DE CONCRETO DE 3000 PSI DE RESISTENCIA PARA SOLO O MAZOS	M3	CONCRETO	1	$ 1.000.000,00	500,00	500	50%	0,04%
1.13	SUMINISTRO DE CONCRETO DE 3000 PSI DE RESISTENCIA PARA VIGAS Y MUROS	M3	CONCRETO	1	$ 1.000.000,00	500,00	500	50%	0,04%
1.14	SUMINISTRO DE CONCRETO DE 3000 PSI DE RESISTENCIA PARA LOSA DE CONTRAPISO	M3	CONCRETO	1	$ 1.000.000,00	500,00	500	50%	0,04%
1.15	SUMINISTRO DE CONCRETO DE 3000 PSI DE RESISTENCIA PARA LOSA DE ENTREPISO	M3	CONCRETO	1	$ 1.000.000,00	500,00	500	50%	0,04%
1.16	SUMINISTRO DE CONCRETO DE 3000 PSI DE RESISTENCIA PARA LOSA DE CUBIERTA	M3	CONCRETO	1	$ 1.000.000,00	500,00	500	50%	0,04%
1.17	SUMINISTRO DE CONCRETO DE 3000 PSI DE RESISTENCIA PARA ESCALERAS	M3	CONCRETO	1	$ 1.000.000,00	500,00	500	50%	0,04%
1.18	SUMINISTRO DE CONCRETO DE 3000 PSI DE RESISTENCIA PARA CAMARA DE INSPECCION	M3	CONCRETO	1	$ 1.000.000,00	500,00	500	50%	0,04%
1.19	SUMINISTRO DE CONCRETO DE 3000 PSI DE RESISTENCIA PARA SOLADOS	M3	CONCRETO	1	$ 1.000.000,00	500,00	500	50%	0,04%
1.20	SUMINISTRO DE CONCRETO DE 3000 PSI DE RESISTENCIA PARA CAJAS DE ALCANTARILLAS	M3	CONCRETO	1	$ 1.000.000,00	500,00	500	50%	0,04%
1.21	SUMINISTRO DE CONCRETO DE 3000 PSI DE RESISTENCIA PARA CUNETAS	M3	CONCRETO	1	$ 1.000.000,00	500,00	500	50%	0,04%
1.22	SUMINISTRO DE CONCRETO DE 3000 PSI DE RESISTENCIA PARA CABEZALES	M3	CONCRETO	1	$ 1.000.000,00	500,00	500	50%	0,04%
1.23	SUMINISTRO DE CONCRETO DE 3000 PSI DE RESISTENCIA PARA ANDENES	M3	CONCRETO	1	$ 1.000.000,00	500,00	500	50%	0,04%
1.24	SUMINISTRO DE CONCRETO DE 3000 PSI DE RESISTENCIA PARA BORDILLOS	M3	CONCRETO	1	$ 1.000.000,00	500,00	500	50%	0,04%
1.25	SUMINISTRO DE CONCRETO DE 3000 PSI DE RESISTENCIA PARA PAVIMENTO RIGIDO	M3	CONCRETO	1	$ 1.000.000,00	500,00	500	50%	0,04%
1.26	SUMINISTRO DE CONCRETO DE 3000 PSI DE RESISTENCIA PARA MUROS DE CONTENCION	M3	CONCRETO	1	$ 1.000.000,00	500,00	500	50%	0,04%
1.27	SUMINISTRO DE CONCRETO DE 3000 PSI DE RESISTENCIA PARA CAMARA DE INSPECCION	M3	CONCRETO	1	$ 1.000.000,00	500,00	500	50%	0,04%
1.28	SUMINISTRO DE CONCRETO DE 3000 PSI DE RESISTENCIA PARA SOLADOS	M3	CONCRETO	1	$ 1.000.000,00	500,00	500	50%	0,04%
1.29	SUMINISTRO DE CONCRETO DE 3000 PSI DE RESISTENCIA PARA CAJAS DE ALCANTARILLAS	M3	CONCRETO	1	$ 1.000.000,00	500,00	500	50%	0,04%
1.30	SUMINISTRO DE CONCRETO DE 3000 PSI DE RESISTENCIA PARA CUNETAS	M3	CONCRETO	1	$ 1.000.000,00	500,00	500	50%	0,04%
1.31	SUMINISTRO DE CONCRETO DE 3000 PSI DE RESISTENCIA PARA CABEZALES	M3	CONCRETO	1	$ 1.000.000,00	500,00	500	50%	0,04%
1.32	SUMINISTRO DE CONCRETO DE 3000 PSI DE RESISTENCIA PARA ANDENES	M3	CONCRETO	1	$ 1.000.000,00	500,00	500	50%	0,04%
1.33	SUMINISTRO DE CONCRETO DE 3000 PSI DE RESISTENCIA PARA BORDILLOS	M3	CONCRETO	1	$ 1.000.000,00	500,00	500	50%	0,04%
1.34	SUMINISTRO DE CONCRETO DE 3000 PSI DE RESISTENCIA PARA PAVIMENTO RIGIDO	M3	CONCRETO	1	$ 1.000.000,00	500,00	500	50%	0,04%
1.35	SUMINISTRO DE CONCRETO DE 3000 PSI DE RESISTENCIA PARA MUROS DE CONTENCION	M3	CONCRETO	1	$ 1.000.000,00	500,00	500	50%	0,04%
1.36	SUMINISTRO DE CONCRETO DE 3000 PSI DE RESISTENCIA PARA CAMARA DE INSPECCION	M3	CONCRETO	1	$ 1.000.000,00	500,00	500	50%	0,04%
1.37	SUMINISTRO DE CONCRETO DE 3000 PSI DE RESISTENCIA PARA SOLADOS	M3	CONCRETO	1	$ 1.000.000,00	500,00	500	50%	0,04%
1.38	SUMINISTRO DE CONCRETO DE 3000 PSI DE RESISTENCIA PARA CAJAS DE ALCANTARILLAS	M3	CONCRETO	1	$ 1.000.000,00	500,00	500	50%	0,04%
1.39	SUMINISTRO DE CONCRETO DE 3000 PSI DE RESISTENCIA PARA CUNETAS	M3	CONCRETO	1	$ 1.000.000,00	500,00	500	50%	0,04%
1.40	SUMINISTRO DE CONCRETO DE 3000 PSI DE RESISTENCIA PARA CABEZALES	M3	CONCRETO	1	$ 1.000.000,00	500,00	500	50%	0,04%
1.41	SUMINISTRO DE CONCRETO DE 3000 PSI DE RESISTENCIA PARA ANDENES	M3	CONCRETO	1	$ 1.000.000,00	500,00	500	50%	0,04%
1.42	SUMINISTRO DE CONCRETO DE 3000 PSI DE RESISTENCIA PARA BORDILLOS	M3	CONCRETO	1	$ 1.000.000,00	500,00	500	50%	0,04%
1.43	SUMINISTRO DE CONCRETO DE 3000 PSI DE RESISTENCIA PARA PAVIMENTO RIGIDO	M3	CONCRETO	1	$ 1.000.000,00	500,00	500	50%	0,04%
1.44	SUMINISTRO DE CONCRETO DE 3000 PSI DE RESISTENCIA PARA MUROS DE CONTENCION	M3	CONCRETO	1	$ 1.000.000,00	500,00	500	50%	0,04%
1.45	SUMINISTRO DE CONCRETO DE 3000 PSI DE RESISTENCIA PARA CAMARA DE INSPECCION	M3	CONCRETO	1	$ 1.000.000,00	500,00	500	50%	0,04%
1.46	SUMINISTRO DE CONCRETO DE 3000 PSI DE RESISTENCIA PARA SOLADOS	M3	CONCRETO	1	$ 1.000.000,00	500,00	500	50%	0,04%
1.47	SUMINISTRO DE CONCRETO DE 3000 PSI DE RESISTENCIA PARA CAJAS DE ALCANTARILLAS	M3	CONCRETO	1	$ 1.000.000,00	500,00	500	50%	0,04%
1.48	SUMINISTRO DE CONCRETO DE 3000 PSI DE RESISTENCIA PARA CUNETAS	M3	CONCRETO	1	$ 1.000.000,00	500,00	500	50%	0,04%
1.49	SUMINISTRO DE CONCRETO DE 3000 PSI DE RESISTENCIA PARA CABEZALES	M3	CONCRETO	1	$ 1.000.000,00	500,00	500	50%	0,04%
1.50	SUMINISTRO DE CONCRETO DE 3000 PSI DE RESISTENCIA PARA ANDENES	M3	CONCRETO	1	$ 1.000.000,00	500,00	500	50%	0,04%
1.51	SUMINISTRO DE CONCRETO DE 3000 PSI DE RESISTENCIA PARA BORDILLOS	M3	CONCRETO	1	$ 1.000.000,00	500,00	500	50%	0,04%
1.52	SUMINISTRO DE CONCRETO DE 3000 PSI DE RESISTENCIA PARA PAVIMENTO RIGIDO	M3	CONCRETO	1	$ 1.000.000,00	500,00	500	50%	0,04%
1.53	SUMINISTRO DE CONCRETO DE 3000 PSI DE RESISTENCIA PARA MUROS DE CONTENCION	M3	CONCRETO	1	$ 1.000.000,00	500,00	500	50%	0,04%
1.54	SUMINISTRO DE CONCRETO DE 3000 PSI DE RESISTENCIA PARA CAMARA DE INSPECCION	M3	CONCRETO	1	$ 1.000.000,00	500,00	500	50%	0,04%
1.55	SUMINISTRO DE CONCRETO DE 3000 PSI DE RESISTENCIA PARA SOLADOS	M3	CONCRETO	1	$ 1.000.000,00	500,00	500	50%	0,04%
1.56	SUMINISTRO DE CONCRETO DE 3000 PSI DE RESISTENCIA PARA CAJAS DE ALCANTARILLAS	M3	CONCRETO	1	$ 1.000.000,00	500,00	500	50%	0,04%
1.57	SUMINISTRO DE CONCRETO DE 3000 PSI DE RESISTENCIA PARA CUNETAS	M3	CONCRETO	1	$ 1.000.000,00	500,00	500	50%	0,04%
1.58	SUMINISTRO DE CONCRETO DE 3000 PSI DE RESISTENCIA PARA CABEZALES	M3	CONCRETO	1	$ 1.000.000,00	500,00	500	50%	0,04%
1.59	SUMINISTRO DE CONCRETO DE 3000 PSI DE RESISTENCIA PARA ANDENES	M3	CONCRETO	1	$ 1.000.000,00	500,00	500	50%	0,04%
1.60	SUMINISTRO DE CONCRETO DE 3000 PSI DE RESISTENCIA PARA BORDILLOS	M3	CONCRETO	1	$ 1.000.000,00	500,00	500	50%	0,04%
1.61	SUMINISTRO DE CONCRETO DE 3000 PSI DE RESISTENCIA PARA PAVIMENTO RIGIDO	M3	CONCRETO	1	$ 1.000.000,00	500,00	500	50%	0,04%
1.62	SUMINISTRO DE CONCRETO DE 3000 PSI DE RESISTENCIA PARA MUROS DE CONTENCION	M3	CONCRETO	1	$ 1.000.000,00	500,00	500	50%	0,04%
1.63	SUMINISTRO DE CONCRETO DE 3000 PSI DE RESISTENCIA PARA CAMARA DE INSPECCION	M3	CONCRETO	1	$ 1.000.000,00	500,00	500	50%	0,04%
1.64	SUMINISTRO DE CONCRETO DE 3000 PSI DE RESISTENCIA PARA SOLADOS	M3	CONCRETO	1	$ 1.000.000,00	500,00	500	50%	0,04%
								Suma	


MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	
EXCAVADORA DE LLANTAS CATERPILLAR	1
VIBROCOMPACTADOR	1
MINICARGADOR	1
VOLQUETAS	2
	2

PERSONAL OBRA		PERSONAL NO CALIFICADO DE LA VÍA		PERSONAL INTERVENTORIA	
PROFESIONALES APROBADOS	11	AUXILIARES Y OFICINA	7	DIRECTOR	1
		MAESTRO	2	RESIDENTE	1
		OFICIOS VARIOS	4	SG-SST	1
		AYUDANTES	7	COMISION TOPOGRAFICA	1
		COMISION TOPOGRAFICA	2	OFICINA	1
		OPERADOR DE MAQUINARIA	3	ESPECIALISTA	3
PERSONAL DE LA ZONA	11	LABORANDO	26	TOTAL INTERVENTORIA	11

INFORMACION TECNICA

REPRESENTACION GRAFICA INVERSION SEMANAL

CURVA DE INVERSION		
SEMANA	EJECUTADO	PROGRAMADO
SEMANA 1	$ -	$ 6.819.824,16
SEMANA 2	$ 45.905.002	$ 16.046.845,07
SEMANA 3	$ 65.373.024	$ 62.983.081,91
SEMANA 4	$ 166.778.701	$ 188.949.245,72
SEMANA 5	$ 305.650.166	$ 360.648.347,99
SEMANA 6	$ 359.157.432	$ 536.359.111,53
SEMANA 7	$ 433.046.302	$ 713.874.539,58
SEMANA 8	$ 433.046.302	$ 937.124.072,20
SEMANA 9	$ 504.067.899	$ 715.774.008,00
SEMANA 10	$ 506.672.818	$ 737.032.398,00
SEMANA 11	$ 577.679.223	$ 757.549.676,00
SEMANA 12	$ 644.673.986	$ 782.513.485,00
SEMANA 13	$ 762.313.632	$ 961.211.987,00
SEMANA 14	$ 1.043.845.118	$ 1.531.976.404,00
SEMANA 15	$ 1.325.320.734	$ 2.216.246.483,00
SEMANA 16	$ -	$ 3.125.643.275,00
SEMANA 17	$ -	$ 4.011.661.268,00

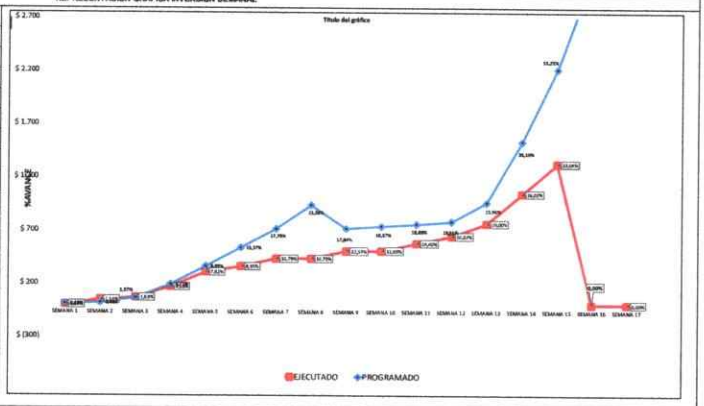

ALCALDIA DE MONTERIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Código:	
Versión:	1
Fecha de aprobación:	8/08/2022

CONTRATO No: LP – SPM – 018 -2023

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LOS BARRIOS PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

FECHA: 22 (Día) | 8 (Mes) | 2023 (Año)

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Semana: 15 Del: 14/08/2023 Al: 20/08/2023

Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato: 179

Nombre de los Supervisores: MONICA MARIA SEVERICHE NUÑEZ

VÍA A INTERVENIR CON EL CONTRATO	LONGITUD (M)
VIAS DE INGRESO DEL BARRIO PAZ DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	1187,24

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA



Observaciones:

Se continuan excavaciones, mejoramiento de subbase, toma de densidades muestra y fundida en tramo 2. Se inician excavaciones, mejoramiento de subbase, toma de densidades, muestras y fundida en tramo 1.

DIRECTOR INTERVENTORIA

CRISTIAN MAURICIO [illegible]

C.C.P
INGENIEROS S.A.S

Bitácora de obra del periodo a cobrar

Dirección: Carrera 6 No. 65-24
Email: ccpconstrucciones22@gmail.com
Montería, Córdoba - Colombia

Zones, 27 de Febrero de 2023

Estado del clima : Soleado

Personal en obra

- Residentes de obra (2)
- Director de obra
- Inspector de obra (2)
- Maestro de obra (2)
- Almacenista
- Vigilante.
- Trabajadora social
- SISO
- comisión topografica
- Residente de Interventoria
- SISO Interventoria

Maquinaria y equipos

- Retroexcavadora
- Minicargadores
- Herramientas menores
- Equipos de Topografia
- Volquetas.

Actividades Realizadas:

- Se realizan actividades de Localización y replanteo
- Se levantan actas de vecindad
- Se realizan cierres viales y campañas de movilidad
- Vinculación de personal en obra

Eduardo Gomez P.
Residente de obra

Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

Hatillo, 22 de febrero 2023

Estado del clima: Soleado

Personal en obra

- Residentes de obra (2)
- Director de obra
- Inspector de obra (2)
- Maestro de obra (2)
- Almacenista
- Vigilante
- Trabajadores social
- SISO
- Comisión topografía
- Residente interventoría
- SISO interventoría

Maquinaria y equipos

- Retroexcavadora
- Minicargadores
- Herramientas menores
- Equipos de topografía
- Volquetas

Actividades realizadas.

- Se continuan actividades de localización y replanteo.
- Se continúan con levantamiento de actas de vecindad
- Se realiza comité de obra con interventoría y la supervisión por parte de la entidad contratante.

Eduardo Gomez P.
Residente de obra

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

Mercedes, 04 de Marzo de 2023

Estado del clima : Soleado

Personal en obra :

· Residente de obra (2)	: Trabajadora social
· Director de obra	: SISO
· Inspector de obra (2)	: Comisión topográfica
· Maestro de obra (2)	: Residente interventoría
· Almacenista	: SISO interventoría
· Vigilante	

Maquinaria y equipos

· Retroexcavadora · Herramientas menores · Volquetas.
Minicargadores · Equipos de topografía

Actividades Realizadas.

Se continuan actividades de localización y replanteo.
Se continuan levantando actas de vecindad.
Se realizan cierres viales y campañas de movilidad.

Antonio Avila
Residente de obra

Residente de interventoría

Powered by CamScanner

Jueves, 02 de marzo de 2023

Estado del clima : Soleado

Personal en obra :

- Residente de obra (2)
- Director de obra
- Inspector de obra
- Maestro de obra (2)
- Almacenista
- Vigilante
- Trabajadora Social
- SISO
- comisión topográfica
- Residente interventoría
- SISO interventoría

Maquinaria en obra

- Se realizan actividades de localización y replanteo de anclajes en tramo 7
- Se continuan actividades de cierres viales e instalación de señalización vial
- Se continuan levantamientos de actas de vecindad.

Antonio Ardila
Residente de obra

Residente de interventoría

Powered by CamScanner

Viernes 03 de marzo de 2023

Estado del clima : Lluvioso - alturas de la mañana

Personal en obra

- Director de obra
- Residentes de obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Maestro de obra (1)
- Almacenista
- Vigilante
- Trabajadora Social
- SISO
- Comisión Topográfica
- SISO interventoría
- Residente interventoría

Maquinaria y equipos

- Retroexcavadora
- Minicargadores
- Herramientas menores
- Equipos Topografía
- Volquetas

Actividades Realizadas.

- Se realiza localización y replanteo de andenes zona 7
- Se continua con levantamiento de actas de vecindad
- Se continua instalación de señalización vial

Eduardo Gomez P.
Residente de obra

Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

Sabado, 04 de marzo de 2023

Estado del clima: Soleado

Personal en obra:

- Director de obra
- Residentes de obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Maestro de obra (2)
- Almacenista
- Vigilante
- Trabajadora social
- SISO
- Comisionista topografica
- Residente interventoria
- SISO interventoria

Maquinaria y equipos

- Retroexcavadora
- Minicargadores
- Herramientos menores
- Equipos topografia
- Volquetas

Actividades Realizadas

- Se continuan y finalizan actividades de localizacion y replanteo
- Se finalizan levantamiento de actas de vecindad.

Antonio Avila
Residente de obra

Residente de interventoria

Powered by CamScanner

Domingo, 05 de Marzo

No se laboró.

Lunes, 06 de Marzo

Estado del clima: Soleado
Personal en obra:

- Director de obra
- Residentes de obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Maestro de obra (2)
- Almacenista
- Vigilante
- Trabajadora social
- SISO
- Residente interventoría
- Comisión topografía
- SISO interventoría

Actividades Realizadas:

- Se inician actividades de excavaciones mecánicas en material común de la explanación en tramo 2
- Se realizan actividades de cargue de material sobrante
- Se generan fallos por rotura de tubería de acueducto en tramo 2.

Eduardo Gomez P.
Residente de obra

Residente de interventoría

Powered by CamScanner

Martes, 07 de marzo de 2023

Estado del clima: Soleado.

Personal en obra:

- Director de obra
- Residente de obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Maestro de obra (2)
- Almacenista
- Vigilante
- Trabajadores social
- SISO
- Residente interventoria
- SISO interventoria
- comisión. Topografo

Actividades Realizadas

- Se continuan actividades de excavaciones mecanicas en material común de la explanación y para fallos en tramo 2.
- Se realizan actividades de cargue de material Solorante
- Se realizan mejoramientos de fallos con material de piedra rajon en tramo 2.
- Se realiza comite de obra con interventoria y supervisión por parte de la entidad contratante.

Antonio Avila
Residente de obra

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

Miercoles, 08 de Marzo de 2023

Estado del clima : Soleado

Personal en obra:

- Director de obra
- Residentes de obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Maestro de obra (1)
- Almacenista
- Vigilante
- Trabajadora social
- SISO
- Comisión Topografía
- Residente Interventoría
- SISO Interventoría

Maquinaria y equipos: Retroexcavadora, vibrocompactador, minicargador, volqueta

Actividades Realizadas

- Se continuan actividades de excavaciones mecánicas para la explanación y fallos.
- Se realizan actividades de cargue de material sobrante.
- Se ejecutan actividades de instalación de geotextil.
- Se realiza extendido y compactación del material de subbase granular en tramo 2.

Eduardo Gomez P.
Residente de obra

Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

Jueves, 09 de Marzo de 2023

Estado del clima: Soleado
Personal en obra:
- Director de obra
- Residente de obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Maestro de obra (2)
- Almacenista
- Vigilante
- Trabajadora Social
- SISO
- Residente interventoria
- SISO interventoria
- comision topografica.

Maquinaria y equipo: Retroexcavadora, vibrocompactador, minicargador, volqueta
Actividades Realizadas

- Se continuan actividades de instalacion de geotextil en tramo 2
- Se continuan actividades de extension y compactacion de material de subbase granular para llegar a nivel de capa de pavimento.

Antonio Ardila
Residente de obra

Residente de interventoria

Powered by CamScanner

Viernes, 10 de marzo de 2023

Estado del clima: Soleado

Personal en obra

- Director de obra
- Residente de obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Maestro de obra (2)
- Almacenista
- Vigilante
- Trabajadora social
- SISO
- Comisión topografía
- SISO interventoría
- Residente interventoría

Maquinaria y equipos

- Retroexcavadora
- Minicargador
- Herramientas menores
- Equipos de topografía
- Volcos.

Actividades Realizadas

- Humectación y compactación de subbase granular.
- Se realizan toma de densidades en TH2
- Se realiza instalación de rieles metálicos.

Eduardo Gomez P.
Residente de obra

Residente de interventoría

Powered by CamScanner

Sabado, 11 de marzo de 2023

Estado del clima: Soleado

Personal en obra:

- Director de obra
- Residente de obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Maestro de obra (2)
- Almacenista
- Vigilante
- Trabajadora social
- SISO
- Comisión topografica
- Residente interventoria
- SISO interventoria

Maquinaria y Equipos

- Retroexcavadora
- Minicargador
- Herramientas menores
- Equipos topografia
- Volcos

Actividades ejecutadas:

- Se realizan actividades de cerco en tramo 2
- Se realizan actividades de excavaciones mecanicas en material comun de la explanacion.

Antonio Avidia
Residente de obra

Residente interventoria

Powered by CamScanner

Domingo, 12 de Marzo de 2023.

No se laboró

Lunes, 13 de Marzo de 2023

Estado del clima: Soleado

Personal en obra:

- Director de obra
- Residente de obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Ingeniero Ambiental
- Ingeniero Electrico
- Maestro de obra (2).
- Almacenista
- Vigilante
- Trabajadora Social
- SISO
- Comisión Topografica
- Residente Interventoria
- SISO interventoria

Maquinaria y Equipos:

- Retroexcavadora
- Minicargador
- Herramientas menores
- Equipos de Topografia
- Volteo
- Vibrocompactador

Actividades Realizadas

- Se realizan actividades de excavaciones mecanicas en material común y para fallos debidas a rotura de tuberias de acueducto en tramo 2.
- Instalación de geotextil
- Compactacion de material de subbase granular

Antonio Ardila
Residente de obra

Residente de interventoria

Powered by CamScanner

Martes, 14 de Marzo de 2023

Estado del clima: Soleado
Personal en obra:

- Director de obra
- Residente de obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Ingeniero Ambiental
- Ingeniero Electrico
- Ingeniero suelos
- Almacenista
- Vigilante
- Trabajadora Social
- SISO
- comisión Topografica
- Residente Interventoria
- SISO Interventoria

Maquinaria y equipos

- Retroexcavadora
- Vibrocompactador
- Volqueta
- Minicargador
- Herramientas menores
- Equip. Top.

Actividades Realizadas

- Realización de comite con personal de obra, interventoria y supervisión.
- No es posible aperturar el Tramo 3 por problemas de orden publico debido a invasión en la zona del tramo 3.
- Se continua avance en la instalación de geotextil en tramo 2

Eduardo Gomez P.
Residente de obra

Residente de interventoria

Powered by CamScanner

Miercoles, 15 de Marzo de 2023

Estado del clima: Soleado

Personal en obra

- Director de obra
- Residente de obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Maestro de obra (2)
- Almacenista
- Vigilante.
- Trabajadora social
- SISO
- Comisión Topográfica
- Residente Interventoría
- SISO. Interventoría

Maquinaria y Equipos

- Retroexcavadora
- Minicargador
- Vibrocompactador
- Herramientas menores
- Volcos
- Equip. Topografía

Actividades Realizadas

- Humectación y compactación de subbase granular
- Se realizan toma de densidades
- Se continúa con instalación de geotextil

Eduardo Gomez P.
Residente de obra

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

Jueves, 16 de marzo de 2023

Estado del clima: Soleado

Personal en obra:

- Director de obra
- Residente de obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Maestro de obra (2)
- Almacenista
- Vigilante
- Trabajadora Social
- SISO
- Comisión Topografía
- Residente Interventoría
- SISO Interventoría

Maquinaria y Equipos

- Retroexcavadora
- Minicargador
- Volco
- Vibrocompactador
- Herramientas menores
- Equip. Top

Actividades Realizadas

- Se realizan mejoramientos de fallos: Llenar material de piedra rajón y se extiende material de relleno tipo terraplen en K2
- Se ejecuta instalación de geotextil

Antonio Avendaño
Residente de obra

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

Viernes 17 de marzo de 2023

Estado del Tiempo: Soleado

Personal de obra:

- Director de obra
- Residente de obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Ingeniero Ambiental
- Ingeniero Electrico
- Almacenista
- Vigilante
- Trabajadora social
- SSSO
- Comision Topografica
- Residente Interventoria
- SSO Interventoria

Maquinaria y Equipos

- Retroexcavadora
- Vibrocompactador
- Minicargador
- Herramientas menores
- Volcos

Actividades realizadas

- Invasion aledaña al tramo 2 no permitio realizar actividades lo que genero atrasos en la ejecucion de las actividades programadas.

Eduardo Gomez P.
Residente de obra

Residente Interventoria

Powered by CamScanner

Sábado, 18 de Marzo de 2023

No se laboró por alteraciones de orden público en zonas cercana a las áreas de trabajo.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Domingo, 19 de Marzo de 2023

No se laboró

Lunes, 20 de Marzo de 2023

No se laboró, Día festivo

Powered by CamScanner

Martes, 21 de Marzo de 2023

Estado del clima: Soleado

Personal de obra

- Director de obra
- Residente de obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Maestro de obra (2)
- Almacenista
- Vigilante
- Trabajadora Social
- SISO
- Comisión Topográfica
- Residente Interventoría
- SISO Interventoría

Maquinaria y Equipos

- Retroexcavadora
- Vibrocompactador
- Mixer
- Minicargador
- Herramientas Menores
- Volqueta
- Equip. Top.

Actividades Realizadas

- Se realizan excavaciones mecanicas en material comun de la explanación.
- Se realizan toma de densidades
- Se realiza suministro e instalación de concreto hidráulico en Tramo 2.

Antonio Avila
Residente de obra

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

Miercoles, 22 de Marzo de 2023

Estado del clima: Soleado

Personal de obra

- Director de obra
- Residente de obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Ing. Ambiental
- Ing. Suelos
- Almacenista
- Vigilante
- Trabajadora social
- SISO
- Residente Interventoría
- SISO Interventoría
- Comisión Topográfica

Maquinaria y Equipos

- Retroexcavadora
- Minicargador
- Volco
- Vibrocompactador
- Herramientas menores
- Equip. Top.

Actividades Realizadas

- Se realiza instalación de rieles en TZ
- Se realiza suministro e instalación de concreto hidráulico en tramo 2
- Se realizan actividades de texturizado y corte de placas en concreto.

Antonio Ardila
Residente de obra

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

Jueves, 23 de Marzo de 2023

Estado del clima: Soleado

Personal en obra:

- Director de obra.
- Ingeniero Residente de obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Maestro de obra (2)
- Almacenista
- Vigilante
- Trabajadora Social
- SISO
- Comisión Topográfica
- Residente Interventoría
- SISO Interventoría

Maquinaria y Equipos

- Retroexcavadora
- Motovolgador
- Volqueta
- Vibrocompactador
- Herramientas menores
- Equip. Top.

Actividades realizadas.

- Se realiza toma de densidades en T2
- Se realiza fundida de concreto hidraulico en T2
- Se realiza instalación de acero de refuerzo para placas reaqueteres

Eduardo Gomez P.
Residente de obra

Residente Interventoría

Powered by CamScanner

Viernes, 24 de Marzo de 2023

Estado del clima: Soleado

Personal en obra

- Director de obra
- Residente de obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Ing. Ambiental
- Ing. Electrico
- Maestro de obra (2)
- Almacenista
- Vigilante
- Trabajadora social
- SISO
- Comisión Topografica
- Residente interventoria
- SISO Interventoria

Maquinaria y Equipos

- Retroexcavadora
- Vibrocompactador
- Minicargador
- Herramientas menores
- Volcos
- Equip. Top.

Actividades Realizadas

- Se realiza Fundida de concreto hidraulico en T.2
- Se realiza instalación de acero de refuerzo para placas irregulares

Antonio Ardila
Residente de obra

Residente de interventoria

Powered by CamScanner

Sábado, 25 de marzo de 2023

Estado del clima: Soleado

Personal de obra
- Director de obra
- Residente de obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Maestro de obra (2)
- Almacenista
- Vigilante
- Trabajadora social
- SISO
- Comisión Topográfica
- Residente Interventoría
- SISO Interventoría

Maquinaria y Equipos
- Retroexcavadora
- Minicargador
- Volvos
- Vibrocompactador
- Herram. menores
- Equipo Topo.

Actividades Realizadas
- Actividades de corte de placas de concreto.
- Actividades de excavación mecánica en material común de la explanación
- Actividades de cargue y retiro de material sobrante.

Antonio Ardila
Residente de obra

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

Domingo, 26 de marzo de 2023.

No se laboró.

Lunes, 27 de marzo de 2023

Estado del clima: Soleado

Personal en obra:

- Director de obra
- Ing. Residente obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Ing. Ambiental
- Ing. Electrico
- Maestro de obra (2)
- Almacenista
- Vigilante
- Trabajadora social
- SISO
- Comisión Topografia
- Residente interventoria
- SISO interventoria

Maquinaria y Equipos

- Retroexcavadora
- Minicargador
- Volquetas
- Vibrocompactador
- Herram. menores
- Equipo Topografico

Actividades ejecutadas

- Instalación de geotextil
- Toma de densidades en T2
- Humectación y compactación de subbase granular

Eduardo Gomez P.
Residente de obra

Residente de interventoria

Powered by CamScanner

Martes, 28 de Marzo de 2023.

Estado del clima: Soleado

Personal en obra:

- Director de obra
- Residente de obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Maestro de obra (2)
- Almacenista
- Vigilante
- Trabajadores Social
- SISO
- Comisión Topografía
- Residente interventoría
- SISO interventoría

Maquinaria y equipos

- Retroexcavadora
- Vibrocompactador
- Minicargador
- Herramientas menores
- Volcos
- Equipo Topo.

Actividades Realizadas

- Se realiza fundida de concreto hidraulico
- Se realiza instalacion de acero de refuerzo para losas irregulares.
- Se toman muestras de concreto para ensayos de resistencia.

Antonio Ardila
Residente de obra

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

Miercoles, 29 de marzo de 2023

Estado del clima: Soleado

Personal en obra:

- Director de obra
- Residente de obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Ing. ambiental
- Ing. Electrico
- Almacenista
- Vigilante
- Trabajadora social
- SISO
- Comision Topografica
- Residente interventoria
- SISO interventoria

Maquinaria y equipos

- Retroexcavadora
- Vibrocompactador
- Minicargador
- Herramientas menores
- Volcos
- Equipos Topografia

Actividades Realizadas

- Se realizan actividades de corte de placas de concreto
- Se ejecuta fundida de concreto hidraulico en J:2

Edwardo Gomez P.
Residente de obra

Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

Jueves, 30 de marzo de 2023

Estado del clima: Soleado

Personal en obra:

- Director de obra
- Residente de obra (2)
- Residente de Interventoria
- Inspector de obra (2)
- Maestro de obra (2)
- Almacenista
- Vigilante
- Trabajadora social
- SISO
- SISO Interventoria

Maquinaria y equipos

- Retroexcavadora
- Vibrocompactadora
- Minicargador
- Herram. menores
- Volcos
- Equipos de Top.

Actividades realizadas

- Se realizan actividades de excavaciones mecanicas en material comun de la explanacion.
- Cargue y retiro de material de material sobrante.
- Instalacion de geotextil.

Antonio Ardila
Residente de obra

Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

Viernes, 31 de Marzo de 2023

Estado del clima: soleado

Personal en obra

- Director de obra
- Residente de obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Maestro de obra (2)
- Almacenista
- Vigilante
- Trabajadora social
- SISO
- Comisión Topográfica
- Residente Interventoría
- SISO Interventoría

Maquinaria y Equipos

- Retroexcavadora
- Minicargador
- Volcos
- Vibrocompactador
- Herram. menores
- Equip. Topog.

Actividades Ejecutadas

- Instalación de rieles y cerca
- Fundida de concreto hidráulico en T2

Eduardo Gomez P.
Residente de obra

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

Sabado, 01 de Abril de 2023

Estado del clima: Soleado

Personal en obra:

- Director de obra
- Residente de obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Ing. Ambiental
- Ing. Subs
- Almacenista
- Vigilante
- Trabajadora social
- SISO
- Comisión Topografía
- SISO Interventoría
- Residente Interventoría

Maquinaria y Equipos

- Retroexcavadora
- Vibrocompactador
- Minicargador
- Herram. menores
- Volcos
- Equipos Top.

Actividades Realizadas

- Corte de placas de concretos
- Instalación de rieles
- Instalación de geotextil

Eduardo Gomez P.
Residente de obra

Residente Interventoría

Powered by CamScanner

Domingo, 02 de Abril de 2023

No se laboró

Lunes, 03 de Abril de 2023

Estado del clima: Soleado

Personal en obra:

- Director de obra
- Residente de obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Maestro de obra (2)
- Almacenista
- Vigilante
- Trabajadora social
- SISO
- Comisión Topográfica
- Residente interventoría
- SISO interventoría

Maquinaria y Equipos

- Retroexcavadora
- Minicargador
- Volteo
- Vibrocompactador
- Herramientas menores
- Equipos Top.

Actividades ejecutadas

- Fundida de concreto hidraulico en T2
- Se toman muestras de concreto para ensayos de resistencia
- Se realizan actividades de texturizado y suministro de Antisol

Antonio Ardila
Residente de obra

Residente de interventoría

Powered by CamScanner

Viernes, 21 de abril de 2023

Estado del clima: Soleado

Personal en obra

- Director de obra
- Residente de obra (2)
- Inspector de obra (2)
- Maestro de obra (2)
- Almacenista
- Vigilante
- Trabajadora Social
- SISO
- Comisión Topográfica
- Residente Interventoría
- SISO Interventoría

Maquinaria y Equipos

- Minicargador
- Herram. menores
- Volcos
- Equip. Top.

Actividades ejecutadas

- Corte de losas de concreto

Eduardo Gomez P.
Residente de obra

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner
