1. FECHA ELABORACIÓN:	17	9	2023	2. No. INFORME	28	3. SEMANA No.	28
4. INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE:	11/09/2023 AL 17/09/2023			5. ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	0756-23	7. FECHA CONTRATO:	23	2	2023	8. VALOR CONTRATO:	$ 3.684.062.560,88		
9. FECHA ACTA INICIO:	6	3	2023	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	5	3	2024	11. PLAZO:	12 Meses
12. PRORROGAS:	N/A	13. SUSPENSIONES:	N/A	Meses/días		14. ADICIONES:	N/A		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA								
16. CONTRATISTA:	WRUSSY INGENIEROS S.A.S								
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	0757-23	18. FECHA CONTRATO:	22	2	2023	19. VALOR CONTRATO:	$ 272.766.458		
20. FECHA ACTA INICIO:	6	3	2023	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	5	3	2024	22. PLAZO:	12 Meses
23. PRORROGAS:	N/A	24. SUSPENSIONES:	N/A	Meses/días		25. ADICIONES:	N/A		
26. INTEVENTORÍA:	UT INTERCOMEDOR ITSI								
27. SUPERVISOR :	ARQ. ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA								

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	VALOR DEL CAPITULO	Peso en % del capitulo en relación al valor total del contrato (costos directos) (A)	% Acumulado programado por capitulo (B)	% Total Programado del capitulo (C)=AxB	% Acumulado de ejecución física por capitulo (D)	% Total ejecutado por capitulo (E)=AxD	(% Ejecución Física - % Acumulado programado) (F)= D-B	% Total de adelanto o atraso (G)=E-C
PRELIMINARES	$ 61.936.457,11	2,36%	100,00%	2,36%	100,00%	2,36%	0,00%	0,00%
MOVIMIENTO DE TIERRA	$ 146.367.647,15	5,57%	100,00%	5,57%	100,00%	5,57%	0,00%	0,00%
ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y ACERO	$ 907.316.630,93	34,55%	27,00%	9,33%	27,03%	9,34%	0,03%	0,01%
MAMPOSTERIA Y FRISOS	$ 67.044.377,70	2,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ARQUITECTURA Y ACABADO	$ 655.506.499,83	24,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES HIDRAULICAS	$ 25.370.591,46	0,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES SANITARIAS	$ 35.349.760,01	1,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ALCANTARILLADO	$ 37.892.628,70	1,44%	82,00%	1,18%	82,00%	1,18%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES DE GAS	$ 17.555.284,59	0,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 126.700.117,79	4,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EQUIPOS COCINA	$ 93.135.731,10	3,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OTROS	$ 424.437.934,82	16,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DOTACIÓN	$ 6.226.480,00	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ITEM NO PREVISTOS	$ 21.499.495,00	0,82%	100,00%	0,82%	100,00%	0,82%	0,00%	0,00%
TOTAL	$ 2.626.339.636,19	100,00%		19,26%		19,27%		0,01%

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA


EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	19,08%	18,92%	0,16%
Durante el periodo	0,19%	0,34%	-0,15%
Acumulado Actual	19,27%	19,26%	0,01%

33.1. CONSOLIDADO AVANCE PRESUPUESTAL

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,34%	19,26%
Valor de la Obra Programada	$ 8.929.554,76	$ 505.851.045,15

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,19%	19,27%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 4.990.045,31	$ 506.123.240,13

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

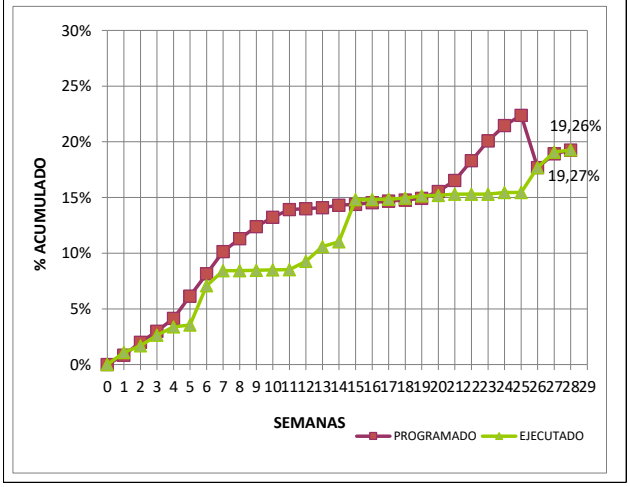

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CANTIDAD	DIA	ESTADO
OBREROS	15	DEMOLEDOR ELECTRICO	0	LUNES	S
TÉCNICO ELÉCTRICO	0	HERRAMIENTA MENOR	20	MARTES	S
PERSONAL SST Y AMBIENTAL	2	PULIDORA	1	MIERCOLES	S
MAESTRO	1	RETROCARGADOR O BOBCAT	1	JUEVES	L
OFICIAL	3	MOTOBOMBA	1	VIERNES	F
TRABAJADORA SOCIAL	1	COMPACTADOR TIPO SALTARÍN	2	SÁBADO	S
RESIDENTE	1	VOLQUETA	4	LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. TECNICO

1. Llega minicargador a la obra para apoyar con las actividades de retiro de material sobrante y rellenos con Recebo.
2. Se realiza la actividad de relleno con recebo compactado según especificación ténica.
3. Se realizan retiros de material sobrante proveniente de las excavaciones.
4. Se realiza acompañamiento diario por parte de interventoría, verificando que las actividades se realicen de manera segura y siguiendo las especificaciones técnicas.
5. Se realiza desencofrado de las columnas fundidas y se inicia el armado de formaleta de las columnas faltantes.
6. Por parte de interventoría se realiza verificación de la formaleta instalada y se da aval para la fundida.
7. Se realiza fundida en concreto de 3000 Psi de las columnas armadas.
8. Se continúa con los trabajos de excavación manual para las zapatas pendientes.
9. Se continúa con los trabajos de demolición, armado, y traslado del portón de entrada a la obra.

E. ADMINISTRATIVO

1. La interventoría en conjunto con el contratista, realizan el registro diario en Bitácora, de todas las actividades ejecutadas y decisiones tomadas en obra.
2. Se realiza comité semanal de obra con todo el equipo de trabajo del contratista, interventoría, asesor del despacho y supervisor.

F. FINANCIERA

1. Durante el periodo de este informe se radicó el acta parcial de cobro N°1 del contrato de obra 0756-23.
2. Durante el periodo de este informe se radicó el acta parcial de cobro N°1 del contrato de interventoría 0757-23.

G. SOCIAL

1. Durante el periodo de este informe no se realizan actividades del componente social.

H. SST

1. Durante este periodo se realizan las respectivas charlas diarias de SST, impartidas por el profesional HSE.
2. Por parte del contratista, el profesional HSE, realiza recambio continuo y entrega de EPP's que se encuentran en mal estado.
3. Se realiza jornada de orden y aseo general en la obra y bodega.
4. El contratista continúa con la vigilancia nocturna para los trabajos de traslado del portón de ingreso a la obra.

I. AMBIENTAL

1. Se realiza limpieza continua de los baños portátiles y se realiza la disposición final de los residuos obtenidos por parde de la empresa ASSEAR.
2. Las basuras generadas por la obra, son debidamente recogidas y llevadas al sitio adecuado para que sean recogidas continuamente por el camión de basura.
3. Se realizan retiros de material sobrante de las excavaciones y se llevan a disposición final en escombrera certificada.

J. CONTABLE

1. A la fecha de corte del presente informe no se han registrado pagos por ningún concepto al contratista ni a la interventoría.

K. JURIDICA

1. En el período no se presentan modificaciones al contrato de interventoría 0757-23.
2. Hasta la fecha de este informe se ha firmado el acta de pactación de precios e item no previstos N°1 y el acta de modificación de cantidades de mayores y menores e item no previstos N°1 del contrato de obra 0756-23.

Nombre: **LEONARDO MANTILLA NOGUERA**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Nombre: **ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA**
SUPERVISOR DEL CONTRATO

UT. INTERCOMEDOR ITSI	FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Página: 1 de 1

FECHA ELABORACIÓN:	17 / 9 / 2023	No. INFORME	28	SEMANA No.	28
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA				
CONTRATO OBRA No:	0756-23	CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	0757-23	INTEVENTORÍA	UT INTERCOMEDOR ITSI		

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 11 de septiembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Retiro de material sobrante de forma mecánica.



FECHA FOTO: 11 de septiembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Armado y alineado de formaleta para columnas.



FECHA FOTO: 12 de septiembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Fundida en concreto de 3000 Psi para columnas.



FECHA FOTO: 12 de septiembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Relleno con recebo y compactación del mismo.



FECHA FOTO: 15 de septiembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Aplome y corrección de columna fundida.



FECHA FOTO: 17 de septiembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Construcción de muro perimetral.
