EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P.

INFORME MENSUAL 7

Periodo Del 10-07-2023 Hasta El 09-08-2023

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERADMINISTRATIVO No. CONV MP 011 2022

OBJETO

"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A E.S.P. PARA REPOSICIÓN DE REDES Y/O SISTEMAS PARA MANEJO DE AGUAS SANITARIAS Y/O PLUVIALES Y/O DE ACUEDUCTO Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PAIPA – BOYACA"

LOCALIZACION

Casco urbano –Rural del municipio de Paipa

PAIPA 2023

Km 1 Vía Francisco Montaña
Cel. 3208585284 Código Postal 150440
comercial@redvitalpaipasaesp.com
secretariagerencia@redvitalpaipasaesp.com

CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 3

2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3

3 ALCANCE DEL CONVENIO 4

3.1 LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO 4

3.2 LOCALIZACIÓN ESPECIFICA: 5

ILUSTRACIÓN 2 LOCALIZACIÓN ESPECIFICA DE LOS SECTORES A INTERVENIR 6

4 JUSTIFICACION 6

5 ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO 7

6 SEGURIDAD INTEGRAL TRABAJADORES DURANTE EL PERIODO 8

7 ANEXOS 9

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Localización Municipio de Paipa 5

Ilustración 2 Localización especifica de los Sectores a Intervenir 6

1 INTRODUCCIÓN

Dentro del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 "CON SUMERCÉ PODEMOS AVANZAR" se encuentra la estrategia; CON SUMERCÉ PODEMOS PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE, el Programa; MANEJO INTEGRAL DE RECURSO HÍDRICO y el Subprograma; MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA con el indicador de resultado; optimización de la vida útil de redes de Alcantarillado y pozos sépticos, estrategia para mejorar la funcionabilidad de las redes de Alcantarillados y eliminación de pozos sépticos

En la actualidad las tuberías existentes en diferentes sectores del Municipio de Paipa datan más de 40 años de servicio en su mayoría de material de gres y concreto, con problemas de insuficiencia hidráulica, velocidad y fuerza tractiva, dichos tramos no responde a los mantenimientos que realiza la Empresa de Servicios Públicos Red Vital Paipa S.A E.S. P en forma periódica, de allí los inconvenientes que se presentan a diario y/o cuando se presentan fuertes lluvias en el Municipio, afectan en gran medida la calidad de vida de la población Paipana.

El Municipio de Paipa debe garantizar la prestación efectiva de los servicios de acueducto y alcantarillado, en cumplimiento de sus funciones, obligaciones y deberes, cuyo objeto principal es mejorar las condiciones de cobertura, continuidad, calidad y eficiencia de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en el municipio.

Por tal razón el municipio de Paipa junto con la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P. estructuró el CONVENIO 011 /2022 PARA REPOSICIÓN DE REDES Y/O SISTEMAS PARA MANEJO DE AGUAS SANITARIAS Y/O PLUVIALES Y/O DE ACUEDUCTO Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PAIPA – BOYACA.

2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

Cuadro No 1. Informe General del Convenio

	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERADMINISTRATIVO No CONV 11 2022
FECHA CONVENIO:	27 DE OCTUBRE 2022
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A E.S.P. PARA REPOSICIÓN DE REDES Y/O SISTEMAS PARA MANEJO DE AGUAS SANITARIAS Y/O PLUVIALES Y/O DE ACUEDUCTO Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PAIPA – BOYACA
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PAIPA
NIT	891.801.240-1
CONTRATISTA	RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P.
NIT	900259348-5
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	Setecientos unos millones doscientos cincuenta y unos mil seiscientos nueve pesos con sesenta y seis centavos ($ 701.251.609,66) m/cte

Km 1 Vía Francisco Montaña
Cel. 3208585284 Código Postal 150440
comercial@redvitalpaipasaesp.com
secretariagerencia@redvitalpaipasaesp.com

VALOR ADICIONAL	Doscientos treinta millones ciento treinta y dos mil seiscientos trece pesos con cuarenta y siete centavos ($230.132.613,47) m/cte
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	dos (2) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
FECHA TERMINACION SEGÚN CONTRATO	10 DE ENERO DE 2023
ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	11 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1	29 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE REINICIO N° 1	18 DE ENERO DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 2	15 DE MAYO DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 2	10 DE JULIO DE 2023
ADICIONAL EN PLAZO N° 1	27 DE ENERO DE 2023 UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO MÁS
ADICIONAL EN PLAZO N° 2	27 DE FEBRERO DE 2023 DOS (2) MESES MÁS
ADICIONAL EN PLAZO N° 3 Y ADICIONAL EN VALOR N° 1	10 DE JULIO DE 2023 UN (MES) MÁS Y ($ 230.132.613,47)
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	10 DE AGOSTO DE 2023

3 ALCANCE DEL CONVENIO


El proyecto pretende mejorar la calidad de vida de la población de algunos barrios y sectores del casco Urbano y rural del municipio, de igual forma se mejora la operación del sistema implementando la REPOSICIÓN DE REDES Y/O SISTEMAS PARA MANEJO DE AGUAS SANITARIAS Y/O PLUVIALES Y/O DE ACUEDUCTO Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PAIPA - BOYACA.

3.1 LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO

El municipio de Paipa está localizado en el valle de Sogamoso, uno de los valles internos más importantes de la región andina, en la parte centro oriental del país y noroccidental del departamento de Boyacá a 2525 m.s.n.m., dista aproximadamente 184 km. de Bogotá y 40 km de Tunja. Su cabecera municipal se encuentra a los 5°47' de Latitud Norte y 73° 06' de Longitud Oeste. Abarca en total, una extensión de 30.592,41 has aproximadamente, localizada en la Cordillera Oriental de Colombia.

Km 1 Vía Francisco Montaña
Cel. 3208585284 Código Postal 150440
comercial@redvitalpaipasaesp.com
secretariagerencia@redvitalpaipasaesp.com

ILUSTRACIÓN 1 LOCALIZACIÓN MUNICIPIO DE PAIPA

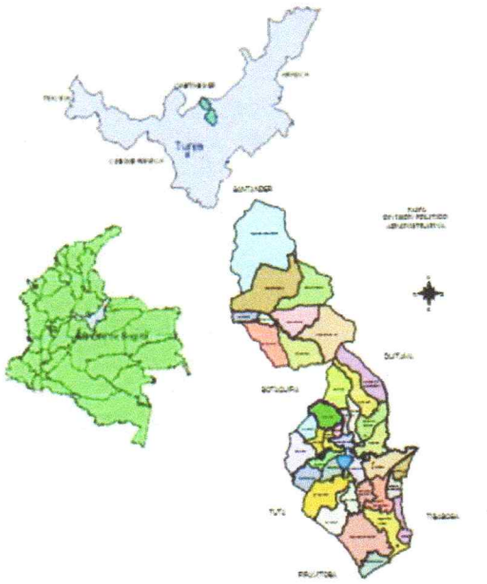

Fuente. http://www.paipa-boyaca.gov.co/MiMunicipio/GaleriaDeMapas/Mapa_Paipa_en_Sur

3.2 LOCALIZACIÓN ESPECIFICA:

Sector el Tamanaco sobre la calle 23 entre carrera 19 y carrera 18 cuenta con redes de alcantarillado de 24 pulgadas en deficientes condiciones, construidas con tubería en concreto las cuales llevan en funcionamiento un tiempo mayor a 40 años. debido a esto la tubería se encuentra en malas condiciones y colapsadas por las aguas lluvias que son evacuadas por las redes de alcantarillado combinado estas redes han perdido la capacidad hidráulica debido al sedimento que existe en la tubería.

Barrio primero de mayo sobre la Carrera 17 entre calle 25 y 26 las redes se construyeron hace más de 50 años en concreto diámetro 18 pulgadas y funcionan como redes combinadas, pero con el paso del tiempo la red de alcantarillado ha sufrido problemas de desgaste de la tubería, colapso, falta de capacidad hidráulica y degradación que tiene por consecuencia daños estructurales, inundaciones, impactos en la circulación vehicular.

Al igual la red de distribución de agua potable en el sector Barrio primero de mayo sobre la Carrera 17 entre calle 25 y 26 ya cumplió su vida útil de servicio ya que fue construida hace más de 50 años en material de asbesto cemento lo que ha generado disminución en sus capacidades de transporte hidráulico al igual constantemente se han realizado varias reparaciones en la tuberías la cual generan pérdidas volumétricas de agua irrecuperables, contaminación de la red Es necesario, llevar a cabo su reposición con sus respectivas domiciliarias

Calle 27: las redes se construyeron hace más de 50 años en concreto diámetro 12 pulgadas y funcionan como redes combinadas, pero con el paso del tiempo la red de alcantarillado ha sufrido problemas de desgaste de la tubería, colapso, falta de capacidad hidráulica y degradación que tiene por consecuencia daños estructurales, inundaciones, impactos en la circulación vehicular.


Calle 33: Vía Francisco Montaña: Construcción de sistema de recolección de aguas por escorrentía producto de las fuertes lluvias e impedir el ingreso de elementos solidos de gran tamaño que discurren por las vías

Km 1 Vía Francisco Montaña
Cel. 3208585284 Código Postal 150440
comercial@redvitalpaipasaesp.com
secretariagerencia@redvitalpaipasaesp.com

Sector Dársena: construcción alcantarillado pluvial para el manejo control y conducción adecuada de las aguas de escorrentía ubicado Vía francisco Montaña y calle 25

Sector Unidad de Atención Integral de Paipa: construcción de alcantarillado Pluvial Ubicado en la vereda el rosal vía que conduce del casco urbano del municipio hacia el corregimiento de Palermo.

Ilustración 2 Localización especifica de los Sectores a Intervenir

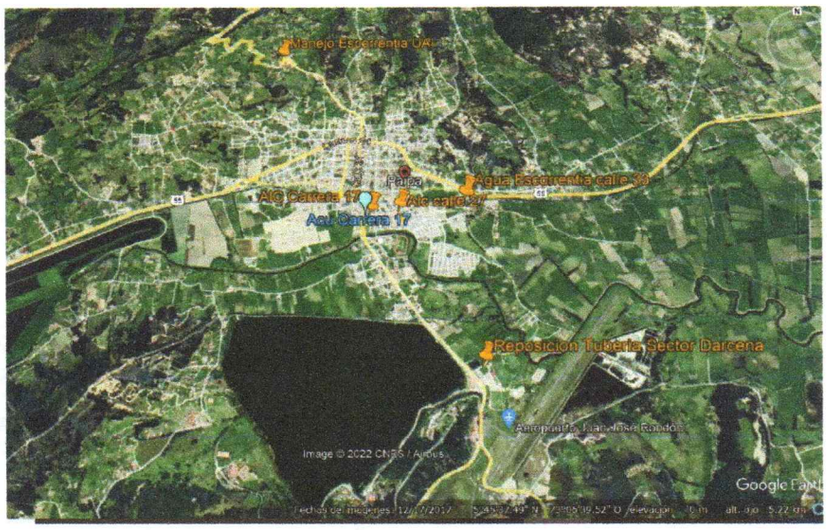

4 JUSTIFICACION

En la actualidad las tuberías existentes en diferentes sectores del Municipio de Paipa datan más de 40 años de servicio en su mayoría de material de gres, concreto con problemas de insuficiencia hidráulica, velocidad y fuerza tractiva, dichos tramos no responde a los mantenimientos que realiza la Empresa de Servicios Públicos Red Vital Paipa S.A E.S. P en forma periódica, de allí los inconvenientes que se presentan a diario y/o cuando se presentan fuertes lluvias en el Municipio.

Al igual la temporada invernal ha traído varios inconvenientes en el funcionamiento y operación de las redes de alcantarillado sanitario, pluvial y en las redes de acueducto, provocando reboses, rupturas, filtraciones y afectaciones en el saneamiento básico de la comunidad Paipana.

En busca de mejorar las condiciones de operación y fortalecer el sistema de las redes de alcantarillado sanitario y pluvial se proyectó la reposición de las redes en sectores afectados en los cuales se ha evidenciado deterioro por el tiempo útil de las tuberías, las cuales se encuentran obsoletas y en un material que no es eficiente para el adecuado funcionamiento.

Por tal razón es necesario fortalecer estas actividades y promover este tipo de obras que mejoren y optimicen la prestación del servicio.

Km 1 Vía Francisco Montaña
Cel. 3208585284 Código Postal 150440
comercial@redvitalpaipasaesp.com
secretariagerencia@redvitalpaipasaesp.com

5 ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO

La Empresa Red Vital Paipa S.A E.S. P se encuentra adelantando las siguientes actividades dentro de la ejecución del convenio 011, las cuales se vienen adelantando de acuerdo a la programación y logística de materiales y mano de obra con la que cuenta la empresa de Servicios Públicos Red Vital.

- Sector carrera 17 entre calles 25 y 26:

En este tramo se realizó la reposición de redes de alcantarillado sanitario, correspondiente a una longitud aproximada de 63 metros lineales, donde se reemplazó también la tubería correspondiente a las acometidas sanitarias de cada predio, conectándolas a la red principal de alcantarillado sanitario; dentro del cual se realizó la demolición del asfalto en todo el tramo, en aproximadamente 100 metros lineales, excavaciones tanto mecánicas como manuales, con la instalación de tubería en la red principal y de cada una de las domiciliarias, se realizaron los rellenos de cada una de estas con la compactación requerida, posterior a esto y teniendo en cuenta las varias intervenciones sobre la vía, fue necesario realizar el reemplazo del material de relleno y la reposición de la estructura de pavimento, con una nueva estructura, con el fin de garantizar obra en la reposición de las redes del tramo y de la misma manera realizar la reposición de la carpeta asfáltica, como parte integral y del proyecto.

Adicional se realizó la inspección y verificación de la red de acueducto principal, de aproximadamente 83 metros lineales.

- Sector calle 27 entre carreras 17 y 18:

En este tramo se realizó la reposición de redes de alcantarillado sanitario, correspondiente a una longitud aproximada de 100 metros lineales, donde se reemplazó también la tubería correspondiente a las acometidas sanitarias de cada predio, conectándolas a la red principal de alcantarillado sanitario.

Teniendo en cuenta lo anterior y considerando el adecuado proceso de relleno para las redes, durante la ejecución se identificó la inestabilidad del terreno y la presencia de agua a lo largo del tramo, por lo que fue necesario la construcción de un pedraplen compacto y filtros sobre los dos costados de la vía, para aislar y la humedad de las capas de la estructura de la vía y evitar que se produzcan fallos.

- Sector unidad de atención inmediata- UAI:

Para este sector, debido a la construcción aledaña que se viene ejecutando, fue necesario prolongar la red pluvial que se ubica al costado norte del proyecto, canalizando las aguas lluvias generadas mediante tubería corrugada PVC de 18" en una longitud aproximada de 126 metros lineales y la construcción de 1 caja de paso o de transición inicial con 3 pozos de inspección a lo largo del tramo; a lo largo del tramo se tuvo que realizar excavación manual por la complejidad en el área de intervención, se instaló arena para la cimentación de la tubería y atraque de la misma y se hizo relleno con material de afirmado, el cual se compactó hasta el nivel adecuado.

- Sector calle 33 con carrera 18:

Teniendo en cuenta que la vía férrea es una de las más importantes para el transporte terrestre y de cierta manera de los más antiguos para el transporte de carga y debido al

proceso de concesión que se tiene con la Agencia Nacional de Infraestructura, requiere de permisos y aprobaciones para cualquier intervención, sumado a que se debe contar con obras adecuadas para el manejo de aguas lluvias que no permita que dañen o afecten la movilidad de la vía férrea, es necesario realizar algunas obras que eliminen el agua lluvia de la zona de protección y eviten que se infiltre el agua, por lo que se realizó la construcción de cunetas pozos de inspección, sumidero transversal o cárcamo, rellenos para aislar la vía de la zona de protección e instalación de tuberías de conexión de redes pluviales, lo anterior busca dar una solución definitiva en materia de manejo de aguas pluviales y de escorrentía que se presentan en la calle 33 en las inmediaciones de la intersección glorieta del barrio Corinto ya que presenta una necesidad de manejo adecuado de aguas de escorrentía ya que el manejo actual se realiza con una estructura muy sencilla que no permite la recolección adecuada ni total de las aguas que allí convergen.

Teniendo en cuenta lo anterior descrito de las actividades y suministro de materiales con respecto al convenio, se tiene un porcentaje de avance en este periodo del 47.62% y un avance de ejecución acumulado del convenio del 73.34%

Se anexan registros fotográficos, prueba de cada una de las actividades ejecutadas en el transcurso de la obra en el periodo en cuestión

6 SEGURIDAD INTEGRAL TRABAJADORES DURANTE EL PERIODO

En el siguiente cuadro se relaciona la afiliación al Sistema integral de seguridad social se anexan planillas.

PERSONAL DE OBRA MES DE MARZO						
	Nombre	**Documento De Identidad**	**Salud**	**Pensión**	**ARL**	**Fecha de Pago**
1	Camargo Luis	4.192.865	Famisanar	Colpensiones	Positiva	2023-04-14
2	Cañadulce Uriel	74.360.447	Nueva E.P.S	Porvenir	Positiva	2023-04-14
3	Malaver Héctor	74.373.225	Sanitas	Colpensiones	Positiva	2023-04-14
4	Ochoa Wilfredy	1.053.615.891	Nueva E.P.S	Protección	Positiva	2023-04-14
5	Tibata Yovany	1.053.610.862	Famisanar	Colfondos	Positiva	2023-04-14
6	Corredor Edwin	1.053.613.769	Famisanar	Porvenir	Positiva	2023-04-14
7	Becerra Wilson	1.052.396.359	Nueva E.P.S	Colpensiones	Positiva	2023-03-17
8	López Adolfo	89.004.430	Famisanar	Protección	Positiva	2023-04-14
9	Corchuelo Ludy	1.053.606.061	Famisanar	Protección	Positiva	2023-04-14

Se anexa

1. Archivo en Excel de avance de Obra
2. Memorias de cantidades
3. Pago de seguridad Social: junio y julio de 2023

Emite	**TITO DUSTANO CURREA VALDERRAMA**
Empleo	Gerente General

Validación	*Nombre Completo / Empleo*	*Vo.Bo.*		*No*	*Anexos*	*Folios*
Elaboró	*Ludy Janith Corchuelo Lara Subgerente Operativa*			*1*		
Revisó	*Ludy Janith Corchuelo Lara Subgerente Operativa*			*2*		
Aprobó	*Tito Dustano Currea Valderrama Gerente General*			*3*		

7 ANEXOS


REGISTRO FOTOGRÁFICO


Sector carrera 17 entre calles 25 y 26








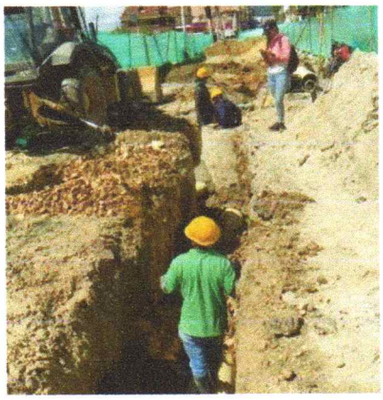


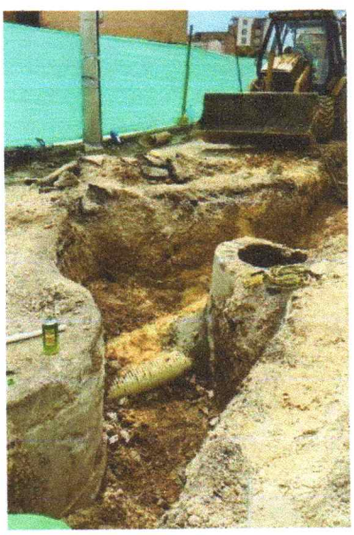





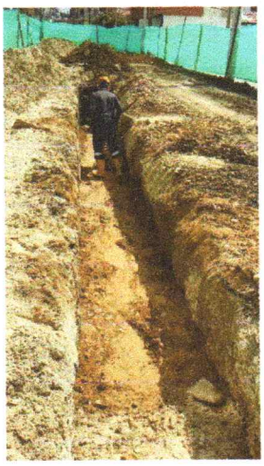

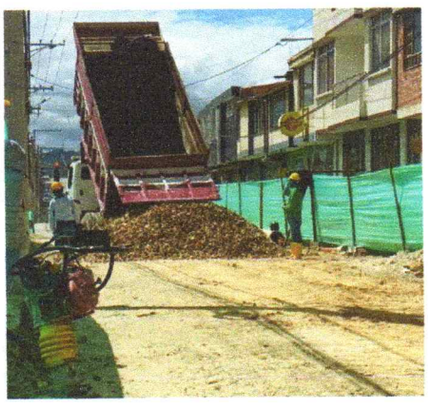


















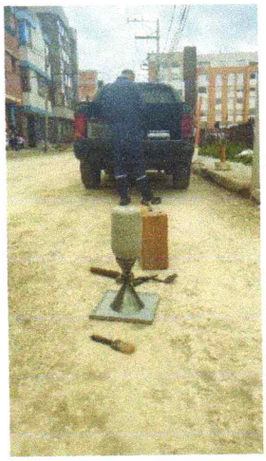


Sector calle 27 entre carreras 17 y 18








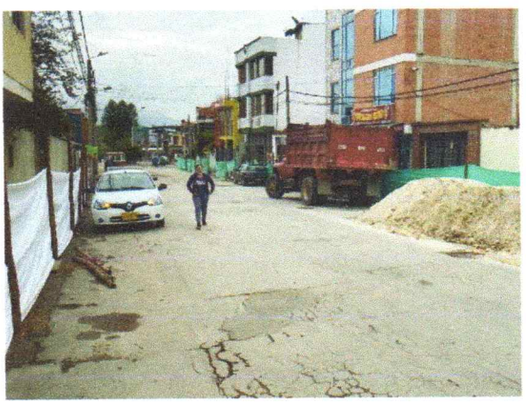








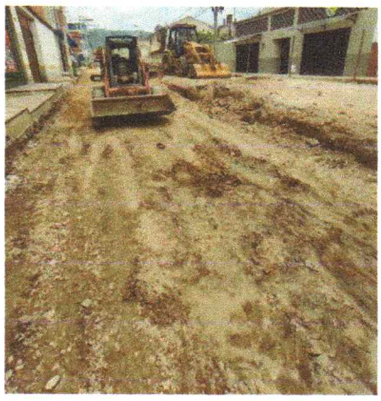

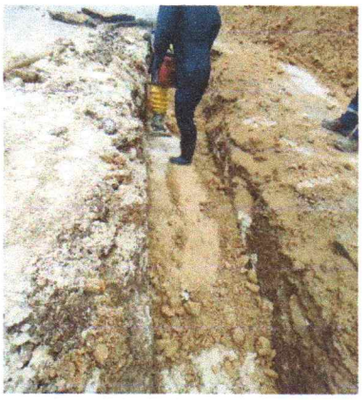












Km 1 Vía Francisco Montaña
Cel. 3208585284 Código Postal 150440
comercial@redvitalpaipasaesp.com
secretariagerencia@redvitalpaipasaesp.com







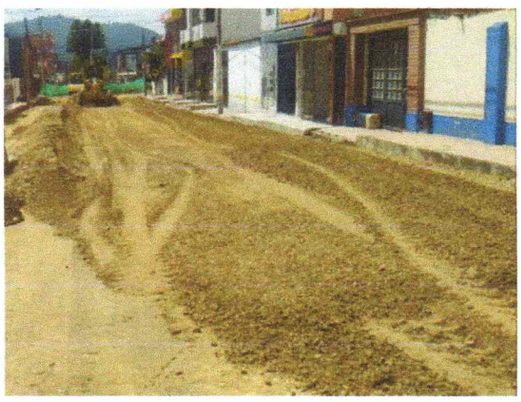
















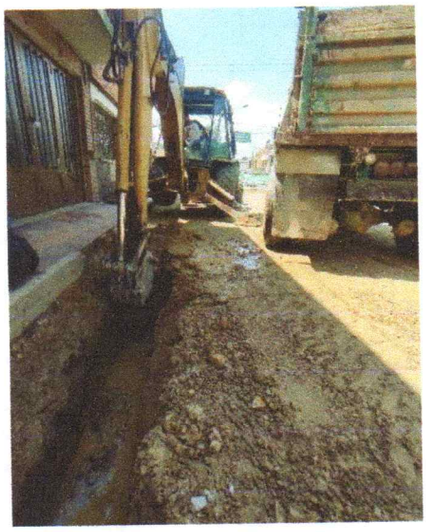



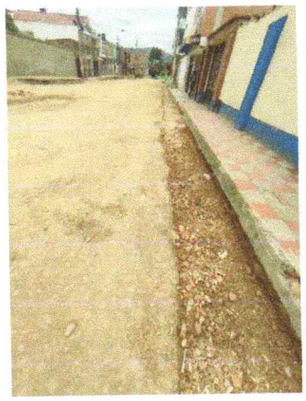

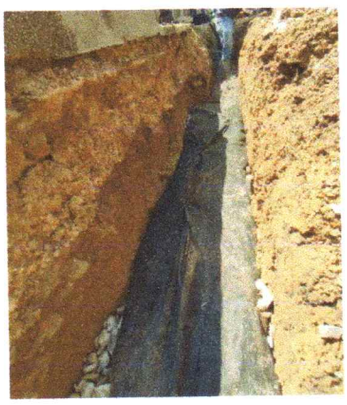












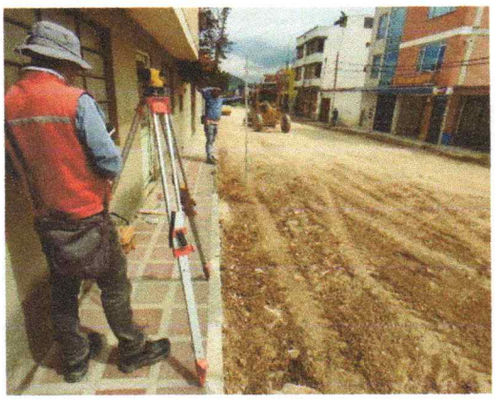

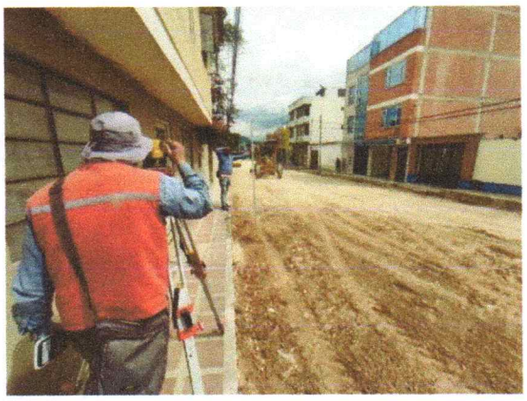

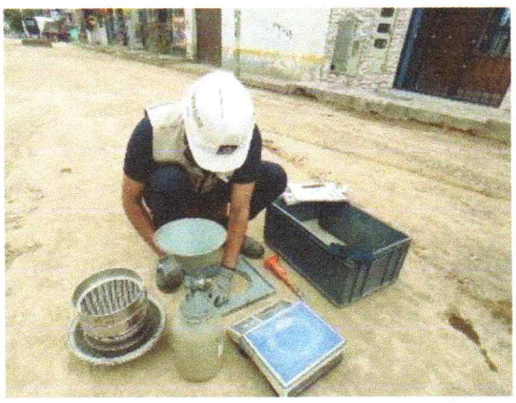

Sector unidad de atención inmediata- UAI:








Sector calle 33 con carrera 18


















Km 1 Vía Francisco Montaña
Cel. 3208585284 Código Postal 150440
comercial@redvitalpaipasaesp.com
secretariagerencia@redvitalpaipasaesp.com


	PLANEACIÓN Y PROYECTOS	PAIPA S.A. E.S.P. Red Vital AL SERVICIO DE SUMERCÉ	
Municipio de Paipa / podemos	INFORME DE AVANCE DE OBRA CONV 011/2022	FECHA	01/04/2022
		PÁGINA	20 de 20



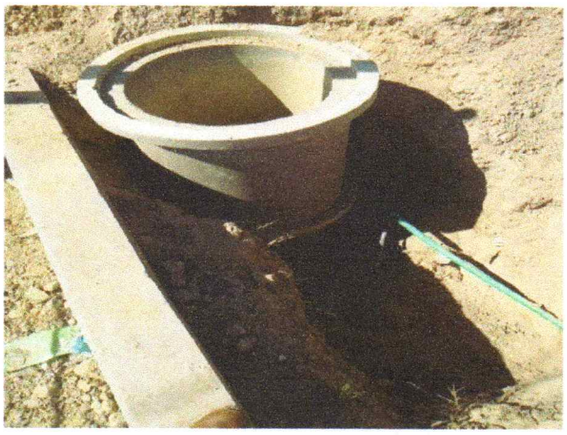





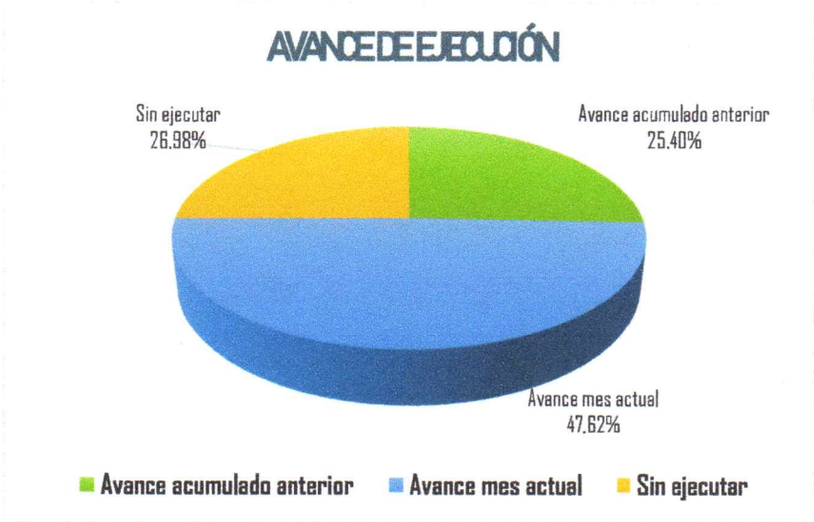

CONDICIONES ACTUALIZADAS								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE INFORME DE AVANCE 7					ACUMULADO TOTAL		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNIT	RED VITAL	MUNIPIO	VR. TOTAL	CANTIDAD ANTERIOR	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA	RED VITAL	MUNICIPIO	VR. TOTAL	ACUMULADO TOTAL	RED VITAL	MUNICIPIO	VR. TOTAL
1.00	SUMINISTRO TUBERIA																
1.10	TUBO ALACANTARILLADO NOVAFORT 200mm (Gm)	UND	122.00	$ 241.397.97		$ 29.450.552.34	$ 29.450.552.34	122.00	$ 29.450.552.34	0.00			$ 0.00	122.00		$ 29.450.552.34	$ 29.450.552.34
1.20	TUBO ALACANTARILLADO NOVAFORT 250mm (Gm)	UND	83	$ 352.593.35		$ 29.265.248.05	$ 29.265.248.05	83.00	$ 29.265.248.05	0.00			$ 0.00	83.00		$ 29.265.248.05	$ 29.265.248.05
1.30	TUBO ALACANTARILLADO NOVAFORT 315mm (Gm)	UND	83	$ 507.333.00		$ 42.108.639.00	$ 42.108.639.00	83.00	$ 42.108.639.00	0.00			$ 0.00	83.00		$ 42.108.639.00	$ 42.108.639.00
1.40	TUBO EN CONCRETO 24 "	ML	255	$ 162.480.00		$ 41.432.400.00	$ 41.432.400.00	210.00	$ 34.120.800.00	45.00		$ 7.311.600.00	$ 7.311.600.00	255.00		$ 41.432.400.00	$ 41.432.400.00
NP (1.5)	TUBO ALCANTARILLADO NOVAFORT 160 MM (GM)	UND	10	$ 215.128.50		$ 2.151.285.00	$ 2.151.285.00		$ -	10.00		$ 2.151.285.00	$ 2.151.285.00	10.00		$ 2.151.285.00	$ 2.151.285.00
NP (1.6)	TUBO ALCANTARILLADO NOVAFORT 350 MM (GM)	UND	12	$ 967.492.00		$ 11.609.904.00	$ 11.609.904.00		$ -	12.00		$ 11.609.904.00	$ 11.609.904.00	12.00		$ 11.609.904.00	$ 11.609.904.00
NP (1.7)	TUBO ALCANTARILLADO NOVAFORT 450 MM (GM)	UND	8	$ 1.529.725.50		$ 12.237.804.00	$ 12.237.804.00		$ -	8.00		$ 12.237.804.00	$ 12.237.804.00	8.00		$ 12.237.804.00	$ 12.237.804.00
				SUBTOTAL		$ 168.255.832.39	$ 168.255.832.39		$ 134.945.239.39		$ 0.00	$ 33.310.593.00	$ 33.310.593.00		$ 0.00	$ 168.255.832.39	$ 168.255.832.39
				IVA		$ 31.968.608.15	$ 31.968.608.15		$ 25.639.595.48		$ 0.00	$ 6.329.012.67	$ 6.329.012.67			$ 31.968.608.15	$ 31.968.608.15
				SUBTOTAL + IVA		$ 200.224.440.54	$ 200.224.440.54		$ 160.584.834.87		$ 0.00	$ 39.639.605.67	$ 39.639.605.67			$ 200.224.440.54	$ 200.224.440.54
2.00	REPOSICIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO																
A	PRESUPUESTO REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO COMBINADO SECTOR TAMANACO DEL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ																
	PRELIMINARES																
2.20	3.01.04 LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	km	0.02876	$ 2.813.077.04	$ 12.492.17	$ 68.411.93	$ 80.904.10	0.02876	$ 80.904.10	0.00			$ 0.00	0.02876	$ 12.492.17	$ 68.411.93	$ 80.904.10
	SUB TOTAL PRELIMINARES				$ 12.492.17	$ 68.411.93	$ 80.904.10		$ 80.904.10		$ -	$ -	$ -		$ 12.492.17	$ 68.411.93	$ 80.904.10
B	PRESUPUESTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ACUEDUCTO EN CARRERA 17-PAIPAN DEL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ																
	PRELIMINARES																
2.14	2.01.05 LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE ACUEDUCTO (INCLUYE CARTERAS Y PLANOS)	ML	86.30	$ 800.60	$ 10.668.26	$ 58.423.52	$ 69.091.78	86.30	$ 69.091.78	0.00			$ 0.00	86.30	$ 10.668.26	$ 58.423.52	$ 69.091.78
	SUB TOTAL PRELIMINARES				$ 10.668.26	$ 58.423.52	$ 69.091.78		$ 69.091.78		$ -	$ -	$ -		$ 10.668.26	$ 58.423.52	$ 69.091.78
	PRELIMINARES																
2.21	3.13.09 CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 DISTANCIA ENTRE POSTES 2 MTS	ML	216.00	$ 41.795.16	$ 906.841.35	$ 8.120.913.21	$ 9.027.754.56	140.57	$ 5.873.055.88	75.48		$ 3.154.698.68	$ 3.154.698.68	216.00	$ 906.841.35	$ 8.120.913.21	$ 9.027.754.56
2.22	3.01.04 LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	km	0.06	$ 2.813.077.04	$ 27.043.19	$ 141.741.43	$ 168.784.62	0.06	$ 168.784.62	0.00		$ 0.00	$ 0.00	0.06	$ 27.043.19	$ 141.741.43	$ 168.784.62
2.23	3.13.17 DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFALTICO E<=10 CMS(INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5 KM	M2	840.00	$ 21.447.25	$ 164.944.54	$ 17.850.745.46	$ 18.015.690.00	48.00	$ 1.029.468.00	792.00		$ 16.986.222.00	$ 16.986.222.00	840.00	$ 164.944.54	$ 17.850.745.46	$ 18.015.690.00
	SUB TOTAL PRELIMINARES				$ 1.098.829.08	$ 26.113.400.10	$ 27.212.229.18		$ 7.071.308.50		$ -	$ 20.140.920.68	$ 20.140.920.68		$ 1.098.829.08	$ 26.113.400.10	$ 27.212.229.18
	EXCAVACIONES																
2.23	1.02.15 EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE A CARRED LIBRE DE 5 KM	M³	329.59	$ 16.320.25	$ 225.925.70	$ 5.153.065.50	$ 5.378.991.20	67.08	$ 1.094.762.37	262.51		$ 4.284.228.83	$ 4.284.228.83	329.59	$ 225.925.70	$ 5.153.065.50	$ 5.378.991.20
	SUB TOTAL EXCAVACIONES				$ 225.925.70	$ 5.153.065.50	$ 5.378.991.20		$ 1.094.762.37		$ -	$ 4.284.228.83	$ 4.284.228.83		$ 225.925.70	$ 5.153.065.50	$ 5.378.991.20
	RELLENOS																
2.24	3.13.36 RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, UMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M³	23.87	$ 105.811.37	$ 357.606.69	$ 2.168.110.71	$ 2.525.717.40	20.60	$ 2.179.714.22	3.27		$ 346.003.18	$ 346.003.18	23.87	$ 357.606.69	$ 2.168.110.71	$ 2.525.717.40
2.26	3.03.15 RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA	M³	40.81	$ 73.050.70	$ 432.051.71	$ 2.549.147.36	$ 2.981.199.07	35.56	$ 2.597.682.89	5.25		$ 383.516.18	$ 383.516.18	40.81	$ 432.051.71	$ 2.549.147.36	$ 2.981.199.07
NP (2.26)	RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE	M³	17.43	$ 114.699.52	$ 459.818.91	$ 1.539.393.72	$ 1.999.212.63	0.00	$ -	17.43	$ 459.818.91	$ 1.539.393.72	$ 1.999.212.63	17.43	$ 459.818.91	$ 1.539.393.72	$ 1.999.212.63
NP (2.27)	3.03.12 MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	M³	57.62	$ 100.304.20	$ 1.329.291.44	$ 4.450.236.56	$ 5.779.528.00	0.00	$ -	57.62	$ 1.329.291.44	$ 4.450.236.56	$ 5.779.528.00	57.62	$ 1.329.291.44	$ 4.450.236.56	$ 5.779.528.00
NP (2.28)	3.04.06 SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	M³	126.00	$ 100.571.48	$ 2.438.533.62	$ 10.233.472.86	$ 12.672.006.48	0.00	$ -	126.00	$ 2.438.533.62	$ 10.233.472.86	$ 12.672.006.48	126.00	$ 2.438.533.62	$ 10.233.472.86	$ 12.672.006.48
NP (2.29)	3.12.03 TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M³-KM	6.923.13	$ 2.312.50		$ 16.009.738.13	$ 16.009.738.13	0.00	$ -	5666.56	$ 0.00	$ 13.103.920.00	$ 13.103.920.00	5666.56		$ 13.103.920.00	$ 13.103.920.00
NP (2.30)	3.12.04. TRANSPORTE DE MATERIALES MEDIDOS EN BANCO PRODUCTO DE EXCAVACIONES DE CORTES. CANALES Y PRESTAMOS.	M³-KM	2.059.94	$ 2.312.50		$ 4.763.611.25	$ 4.763.611.25	0.00	$ -	2059.94	$ 0.00	$ 4.763.611.25	$ 4.763.611.25	2059.94		$ 4.763.611.25	$ 4.763.611.25
	SUB TOTAL RELLENOS				$ 5.017.302.37	$ 41.713.710.59	$ 46.731.012.96		$ 4.777.397.11		$ 4.227.543.97	$ 34.820.153.75	$ 39.047.797.72		$ 5.017.302.37	$ 38.807.892.47	$ 43.825.194.84
	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO																
2.27	2.05.57 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=18"	ML	62.26	$ 315.599.07	$ 3.033.974.85	$ 16.615.220.14	$ 19.649.194.99	55.00	$ 17.357.946.10	7.26		$ 2.291.248.89	$ 2.291.248.89	62.26	$ 3.033.974.85	$ 16.615.220.14	$ 19.649.194.99
	SUB TOTAL INSTALACION DE TUBERIAS				$ 3.033.974.85	$ 16.615.220.14	$ 19.649.194.99		$ 17.357.946.10			$ 2.291.248.89	$ 2.291.248.89		$ 3.033.974.85	$ 16.615.220.14	$ 19.649.194.99
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO Y DESAGUES																
2.28	2.06.18 RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE EN CONCRETO DIAMETRO PULGADAS	ML	62.26	$ 19.978.21	$ 192.058.22	$ 1.051.785.13	$ 1.243.843.35	55.00	$ 1.098.801.55	7.26		$ 145.041.80	$ 145.041.80	62.26	$ 192.058.22	$ 1.051.785.13	$ 1.243.843.35
2.29	2.06.04 CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO. INC. TUBERIA Y ACCESORIOS DE CONEXION TUBERIA	UND	8.00	$ 359.721.13	$ 444.347.92	$ 2.433.421.12	$ 2.877.769.04	3.00	$ 1.079.163.39	5.00		$ 1.798.605.65	$ 1.798.605.65	8.00	$ 444.347.92	$ 2.433.421.12	$ 2.877.769.04
	SUB TOTAL OTRAS OBRAS				$ 636.406.14	$ 3.485.206.25	$ 4.121.612.39		$ 2.177.964.94		$ -	$ 1.943.647.45	$ 1.943.647.45		$ 636.406.14	$ 3.485.206.25	$ 4.121.612.39
	OBRAS COMPLEMETARIAS																
2.30	3.06.09 IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1H	m²	840.00	$ 3.399.59	$ 587.911.26	$ 2.267.744.34	$ 2.855.655.60	0.00	$ -				$ 0.00	0.00		$ -	$ 0.00
2.31	3.06.03 CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE. INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**)	m³	67.20	$ 792.018.75	$ 11.622.604.51	$ 41.601.055.49	$ 53.223.660.00	0.00	$ -				$ 0.00	0.00		$ -	$ 0.00
NP (2.32)	3.12.05. TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA DESPUES DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCION DE DISEÑO)	M3 - KM	3191.77	$ 2.978.75		$ 9.507.484.89	$ 9.507.484.89	0.00	$ -				$ 0.00	0.00		$ -	$ 0.00
	SUBTOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS				$ 12.210.515.77	$ 53.376.284.72	$ 65.586.800.49		$ -		$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -
C	PRESUPUESTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ACUEDUCTO EN CALLE 27 DEL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ																
	PRELIMINARES																
2.32	3.13.09 CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 DISTANCIA ENTRE POSTES 2 MTS	ML	224.01	$ 41.795.16	$ 1.518.268.71	$ 7.844.265.08	$ 9.362.533.79	224.00	$ 9.362.115.84	0.01		$ 417.95	$ 417.95	224.01	$ 1.518.268.71	$ 7.844.265.08	$ 9.362.533.79
2.33	3.01.04 LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	km	0.10	$ 2.813.077.04	$ 43.435.90	$ 237.871.80	$ 281.307.70	0.10	$ 281.307.70	0.00		$ 0.00	$ 0.00	0.10	$ 43.435.90	$ 237.871.80	$ 281.307.70
2.34	3.13.17 DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFALTICO E<=10 CMS(INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5 KM	M2	1.080.00	$ 21.447.25	$ 264.928.58	$ 22.898.101.42	$ 23.163.030.00	64.00	$ 1.372.624.00	1016.00		$ 21.790.406.00	$ 21.790.406.00	1080.00	$ 264.928.58	$ 22.898.101.42	$ 23.163.030.00
	SUB TOTAL PRELIMINARES				$ 1.826.633.19	$ 30.980.238.30	$ 32.806.871.49		$ 11.016.047.54		$ -	$ 21.790.823.95	$ 21.790.823.95		$ 1.826.633.19	$ 30.980.238.30	$ 32.806.871.49
	EXCAVACIONES																
2.35	1.02.15 EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE A CARRED LIBRE DE 5 KM	M³	723.56	$ 16.320.25	$ 302.395.46	$ 11.506.284.63	$ 11.808.680.09	80.20	$ 1.308.884.05	637.48		$ 10.403.832.97	$ 10.403.832.97	717.68	$ 302.395.46	$ 11.410.321.56	$ 11.712.717.02
	SUB TOTAL EXCAVACIONES				$ 302.395.48	$ 11.506.284.63	$ 11.808.680.09		$ 1.308.884.05		$ -	$ 10.403.832.97	$ 10.403.832.97		$ 302.395.46	$ 11.410.321.56	$ 11.712.717.02

CONDICIONES ACTUALIZADAS								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE INFORME DE AVANCE 7				ACUMULADO TOTAL			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNIT	RED VITAL	MUNIIPIO	VR. TOTAL	CANTIDAD ANTERIOR	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA	RED VITAL	MUNICIPIO	VR. TOTAL	ACUMULADO TOTAL	RED VITAL	MUNICIPIO	VR. TOTAL
								RELLENOS									
2.36	3.13.36 RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO. EXTENDIDO. UMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M³	43.90	$ 105.811.37	$ 522.816.79	$ 4.122.302.35	$ 4.645.119.14	31.33	$ 3.315.070.22	9.58		$ 1.013.672.92	$ 1.013.672.92	40.91	$ 522.816.79	$ 4.122.302.35	$ 4.645.119.14
2.38	3.03.15 RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA	M³	66.56	$ 73.050.70	$ 631.654.54	$ 4.230.600.05	$ 4.862.254.59	0.00	$ -	63.68	$ 421.268.53	$ 4.230.600.05	$ 4.651.868.58	63.68	$ 631.654.54	$ 4.230.600.05	$ 4.862.254.59
NP (2.39)	3.03.12. MEJORAMIENTO DE PISO CON METERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA . INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	M3	91.0008356	$ 100.304.20		$ 9.127.766.01	$ 9.127.766.01	0.00	$ -	90.72		$ 9.099.597.02	$ 9.099.597.02	90.72		$ 9.099.597.02	$ 9.099.597.02
NP (2.40)	3.04.06 SUMINISTRO. EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM)	M3	189.00	$ 100.571.48	$ 4.368.947.96	$ 14.639.061.76	$ 19.008.009.72	0.00	$ -	189.00	$ 4.368.947.96	$ 14.639.061.76	$ 19.008.009.72	189.00	$ 4.368.947.96	$ 14.639.061.76	$ 19.008.009.72
NP (2.41)	3.12.04 TRANSPORTE DE MATERIALES MEDIDOS EN BANCO PRODUCTO DE EXCAVACIONES DE CORTES. CANALES Y PRESTAMOS	M3-KM	4.522.25	$ 2.312.50	$ 2.405.271.72	$ 8.052.431.41	$ 10.457.703.13	0.00	$ -	4485.50	$ 2.320.287.34	$ 8.052.431.41	$ 10.372.718.75	4485.50	$ 2.320.287.34	$ 8.052.431.41	$ 10.372.718.75
NP (2.42)	3.02.10 PEDRAPLEN COMPACTO	M3	165.00	$ 119.390.07	$ 4.530.853.16	$ 15.168.508.39	$ 19.699.361.55	0.00	$ -	165.00	$ 4.530.853.16	$ 15.168.508.39	$ 19.699.361.55	165.00	$ 4.530.853.16	$ 15.168.508.39	$ 19.699.361.55
NP (2.43)	RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE	M³	24.00	$ 114.699.52	$ 412.918.27	$ 2.339.870.21	$ 2.752.788.48	0.00	$ -	24.00	$ 412.918.27	$ 2.339.870.21	$ 2.752.788.48	24.00	$ 412.918.27	$ 2.339.870.21	$ 2.752.788.48
NP (2.44)	3.03.12 MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	M³	192.38	$ 100.304.20	$ 6.450.335.36	$ 12.846.186.64	$ 19.296.522.00	0.00	$ -	192.38	$ 6.450.335.36	$ 12.846.186.64	$ 19.296.522.00	192.38	$ 6.450.335.36	$ 12.846.186.64	$ 19.296.522.00
NP (2.45)	3.03.07. CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD. CON MATERIAL FILTRANTE SEGUN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACION. INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	M³	32.00	$ 236.298.83	$ 2.863.442.13	$ 4.698.120.43	$ 7.561.562.56	0.00	$ -	32.00	$ 2.863.442.13	$ 4.698.120.43	$ 7.561.562.56	32.00	$ 2.863.442.13	$ 4.698.120.43	$ 7.561.562.56
NP (2.46)	3.12.03 TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M³	12.455.50	$ 2.312.50		$ 28.803.343.75	$ 28.803.343.75	0.00	$ -	10269.70		$ 23.748.681.25	$ 23.748.681.25	10269.70		$ 23.748.681.25	$ 23.748.681.25
NP (2.47)	3.12.02 TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO	M³-KM	2.062.50	$ 1.850.00		$ 3.815.625.00	$ 3.815.625.00	0.00	$ -	2062.50		$ 3.815.625.00	$ 3.815.625.00	2062.50		$ 3.815.625.00	$ 3.815.625.00
				SUB TOTAL RELLENOS	$ 22.186.239.93	$ 107.843.816.00	$ 130.030.055.93		$ 3.315.070.22		$ 21.388.052.75	$ 99.652.355.08	$ 121.020.407.83		$ 22.101.255.55	$ 102.760.384.51	$ 124.862.240.06
								SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO									
2.39	2.05.54 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=12"	ML	100.03	$ 167.900.70	$ 2.592.505.70	$ 14.202.601.32	$ 16.795.107.02	80.00	$ 13.432.056.00	20.03		$ 3.363.051.02	$ 3.363.051.02	100.03	$ 2.592.505.70	$ 14.202.601.32	$ 16.795.107.02
				SUB TOTAL INSTALACION DE TUBERIAS	$ 2.592.505.70	$ 14.202.601.32	$ 16.795.107.02		$ 13.432.056.00		$ -	$ 3.363.051.02	$ 3.363.051.02		$ 2.592.505.70	$ 14.202.601.32	$ 16.795.107.02
								OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO Y DESAGUES									
2.40	2.06.19 RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE EN CONCRETO 8" A 12"	ML	100.00	$ 9.308.45	$ 143.729.06	$ 787.115.94	$ 930.845.00	80.00	$ 744.676.00	20.00		$ 186.169.00	$ 186.169.00	100.00	$ 143.729.06	$ 787.115.94	$ 930.845.00
2.41	2.06.04 CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO. INC. TUBERIA Y ACCESORIOS DE CONEXION TUBERIA	UND	22.00	$ 359.721.30	$ 1.206.129.61	$ 6.707.738.99	$ 7.913.868.60	10.00	$ 3.597.213.00	6.00		$ 2.158.327.80	$ 2.158.327.80	16.00	$ 1.206.129.61	$ 6.707.738.99	$ 7.913.868.60
				SUB TOTAL OTRAS OBRAS	$ 1.349.858.67	$ 7.494.854.93	$ 8.844.713.60		$ 4.341.889.00		$ -	$ 2.344.496.80	$ 2.344.496.80		$ 1.349.858.67	$ 7.494.854.93	$ 8.844.713.60
								OBRAS COMPLEMETARIAS									
2.42	3.06.09 IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1H	m²	1134.00	$ 3.399.59	$ 419.936.82	$ 3.435.198.44	$ 3.855.135.06	0.00	$ -				$ 0.00	0.00			
2.43	3.06.03 CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE. INCLUYE BARRIDO. SUMINISTRO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**)	m²	94.614	$ 792.018.75	$ 9.526.274.80	$ 65.409.787.21	$ 74.936.062.01	0.00	$ -				$ 0.00	0.00			
NP (2.44)	3.12.05 TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 5 KM. (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M³-KM	4493.980	$ 2.978.75		$ 13.386.442.93	$ 13.386.442.93	0.00	$ -				$ 0.00	0.00			
				SUBTOTAL OBRAS COMPLEMENTARIA	$ 9.946.211.42	$ 82.231.428.58	$ 92.177.640.00		$ -			$ -	$ -		$ -	$ -	$ -
D								REPOSICION TUBERIA DE 24" PCV SECTOR DÁRSENA									
2.44	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	m3	117.99	$ 14.301.40	$ 353.355.01	$ 1.334.067.18	$ 1.687.422.19	0.00	$ -				$ 0.00				
2.45	PEDRAPLEN COMPACTO	m3	10.8	$ 88.793.55	$ 630.676.26	$ 328.294.08	$ 958.970.34	0.00	$ -				$ 0.00				
2.46	SUMINISTRO . EXTENDIDA DE MATERIAL DE AFIRMADO CON DIAMETRO HASTA 2" Y UN INDICE PLASTICO MENOR AL 9% Y COMPACTADO AL 95 % PROCTOR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	m3	51.12	$ 74.810.75	$ 525.584.59	$ 3.298.740.95	$ 3.824.325.54	0.00	$ -				$ 0.00				
2.49	SUMINISTRO. EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL DE SUB BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO HASTA 5 KM)	m3	51.12	$ 111.672.11	$ 258.644.47	$ 5.450.033.79	$ 5.708.678.26	0.00	$ -				$ 0.00				
2.51	3.12.03 TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-Km	3195.00	$ 1.656.25	$ 2.272.860.17	$ 3.018.858.58	$ 5.291.718.75	0.00	$ -				$ 0.00				
2.52	3.12.03 TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-Km	3840.00	$ 1.656.25	$ 982.029.04	$ 5.377.970.96	$ 6.360.000.00	0.00	$ -				$ 0.00				
NP (2.53)	3.05.07 CONCRETO MR 4.2 MPA NORMAL TAMAÑO MAXIMO AGREGADO 25MM, RESISTENCIA A 28 DIAS, ASENTAMIENTO 10CM +/- 2.5CM (MR 42 NORMAL)	M³	5.40	$ 846.145.85		$ 4.569.187.59	$ 4.569.187.59	0.00	$ -				$ 0.00				
NP (2.54)	2.05.55. SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=14"	ML	18.00	$ 246.259.76		$ 4.432.675.68	$ 4.432.675.68	0.00	$ -				$ 0.00				
NP (2.55)	3.13.20 EMPRADIZACION DE TALUDES CON BLOQUES DE CESPED SEGUN NORMA INVIAS	M²	1200.00	$ 22.098.25		$ 26.517.900.00	$ 26.517.900.00	0.00	$ -				$ 0.00				
				SUBTORAL REPOSICION TUBERIA	$ 5.023.149.54	$ 54.327.728.81	$ 59.350.878.35		$ -		$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -
				SUBTOTAL	$ 65.473.108.25	$ 455.170.675.33	$ 520.643.783.58		$ 66.043.321.71		$ 25.595.696.72	$ 201.034.758.42	$ 226.630.456.14		$ 38.208.247.14	$ 257.150.620.52	$ 295.358.867.66
				A	$ 3.273.855.41	$ 22.758.533.77	$ 26.032.189.18		$ 3.302.166.09		$ 1.279.784.84	$ 10.051.737.97	$ 11.331.522.81		$ 1.910.412.36	$ 12.857.531.03	$ 14.767.943.38
				I	$ 1.309.462.17	$ 9.103.413.51	$ 10.412.875.67		$ 1.320.866.43		$ 511.913.93	$ 4.020.695.19	$ 4.532.609.12		$ 764.164.94	$ 5.143.012.41	$ 5.907.177.35
				U	$ 1.964.193.25	$ 13.655.120.26	$ 15.619.313.51		$ 1.981.299.65		$ 767.870.90	$ 6.031.042.78	$ 6.798.913.68		$ 1.146.247.41	$ 7.714.518.62	$ 8.860.766.03
				SUBTOTAL + AIU	$ 72.020.419.08	$ 500.687.742.87	$ 572.708.161.94		$ 72.647.653.88		$ 28.155.266.39	$ 221.138.235.36	$ 249.293.501.75		$ 42.029.071.85	$ 282.865.682.58	$ 324.894.754.42

CONDICIONES ACTUALIZADAS								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE INFORME DE AVANCE 7				ACUMULADO TOTAL			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNIT	RED VITAL	MUNIPIO	VR. TOTAL	CANTIDAD ANTERIOR	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA	RED VITAL	MUNICIPIO	VR. TOTAL	ACUMULADO TOTAL	RED VITAL	MUNICIPIO	VR. TOTAL
3.00	REPOSICION DE SISTEMA DE DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS DE ESCORRENTIA CALLE 33																
3.20	3.03.05 CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	m^3	6.35	$ 576.367,23	$ 1.310.896,27	$ 2.349.035,64	$ 3.659.931,91	0.00	$ -	6.35	$ 1.310.896,27	$ 2.349.035,64	$ 3.659.931,91	6.35	$ 1.310.896,27	$ 2.349.035,64	$ 3.659.931,91
3.50	5.03.02 SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	Kg	1845.95	$ 6.603,09	$ 596.911,57	$ 11.592.062,42	$ 12.188.973,99	0.00	$ -	1845.95	$ 596.911,57	$ 11.592.062,42	$ 12.188.973,99	1845.95	$ 596.911,57	$ 11.592.062,42	$ 12.188.973,99
3.60	REJA PARA CARCAMO	UND	1.00	$ 25.430.000,00	$ 3.672.272,07	$ 21.757.727,93	$ 25.430.000,00	0.00	$ -	1.00	$ 3.672.272,07	$ 21.757.727,93	$ 25.430.000,00	1.00	$ 3.672.272,07	$ 21.757.727,93	$ 25.430.000,00
NP (3.8)	3.01.04 LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	KM	0.20	$ 3.708.675,90		$ 741.735,18	$ 741.735,18	0.00	$ -	0.20	$ 0.00	$ 741.735,18	$ 741.735,18	0.20		$ 741.735,18	$ 741.735,18
NP (3.9)	3.02.02 EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	M^3	58.74	$ 25.449,98		$ 1.494.931,83	$ 1.494.931,83	0.00	$ -	58.74	$ 0.00	$ 1.494.931,83	$ 1.494.931,83	58.74		$ 1.494.931,83	$ 1.494.931,83
NP (3.10)	2.05.53 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=10"	ML	2.00	$ 137.109,86		$ 274.219,72	$ 274.219,72	0.00	$ -	2.00	$ 0.00	$ 274.219,72	$ 274.219,72	2.00		$ 274.219,72	$ 274.219,72
NP (3.11)	3.05.07 CONCRETO MR 4.2 MPA NORMAL, TAMAÑO MAXIMO AGREGADO 25MM, RESISTENCIA A 28 DIAS, ASENTAMIENTO (OCM +/- 2.5CM (MR 42 NORMAL)	M^3	11.60	$ 846.145,85		$ 9.815.291,86	$ 9.815.291,86	0.00	$ -	11.60	$ 0.00	$ 9.815.291,86	$ 9.815.291,86	11.60		$ 9.815.291,86	$ 9.815.291,86
NP (3.12)	2.05.05 POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M, 1.50 < H < 2.00	UND	1.00	$ 2.473.851,75		$ 2.473.851,75	$ 2.473.851,75	0.00	$ -	1.00	$ 0.00	$ 2.473.851,75	$ 2.473.851,75	1.00		$ 2.473.851,75	$ 2.473.851,75
NP (3.13)	3.08.19 SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO A-10, INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGUN NORMA NTC-4109	ML	35.96	$ 52.796,51		$ 1.898.562,50	$ 1.898.562,50	0.00	$ -	35.96	$ 0.00	$ 1.898.562,50	$ 1.898.562,50	35.96		$ 1.898.562,50	$ 1.898.562,50
NP (3.14)	3.03.15 RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR	M^3	104.28	$ 90.646,13		$ 9.452.578,44	$ 9.452.578,44	0.00	$ -	104.28	$ 0.00	$ 9.452.578,44	$ 9.452.578,44	104.28		$ 9.452.578,44	$ 9.452.578,44
NP (3.15)	1.02.17 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M^3	32.76	$ 51.943,58		$ 1.701.671,68	$ 1.701.671,68	0.00	$ -	32.76	$ 0.00	$ 1.701.671,68	$ 1.701.671,68	32.76		$ 1.701.671,68	$ 1.701.671,68
NP (3.16)	1.02.28 SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI)	M^3	1.00	$ 34.625,90		$ 34.625,90	$ 34.625,90	0.00	$ -	1.00	$ 0.00	$ 34.625,90	$ 34.625,90	1.00		$ 34.625,90	$ 34.625,90
NP (3.17)	2.01.05 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE PLANCHA VIBRADORA	M^3	37.80	$ 26.055,23		$ 984.887,69	$ 984.887,69	0.00	$ -	37.80	$ 0.00	$ 984.887,69	$ 984.887,69	37.80		$ 984.887,69	$ 984.887,69
NP (3.18)	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL DE SUB BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO HASTA 5 KM)	M^3	7.20	$ 111.672,11		$ 804.039,19	$ 804.039,19	0.00	$ -	7.20	$ 0.00	$ 804.039,19	$ 804.039,19	7.20		$ 804.039,19	$ 804.039,19
NP (3.19)	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO HASTA 5 KM)	M^3	15.00	$ 100.571,48		$ 1.508.572,20	$ 1.508.572,20	0.00	$ -	15.00	$ 0.00	$ 1.508.572,20	$ 1.508.572,20	15.00		$ 1.508.572,20	$ 1.508.572,20
NP (3.20)	2.05.56 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=4"	ML	3.00	$ 34.777,61		$ 104.332,83	$ 104.332,83	0.00	$ -	3.00	$ 0.00	$ 104.332,83	$ 104.332,83	3.00		$ 104.332,83	$ 104.332,83
NP (3.21)	1.02.03 CAJAS DE INSPECCION DE 1.20 X 1.20 X 1.20 MTS LADRILLO	UND	2.00	$ 717.673,97		$ 1.435.347,94	$ 1.435.347,94	0.00	$ -	2.00	$ 0.00	$ 1.435.347,94	$ 1.435.347,94	2.00		$ 1.435.347,94	$ 1.435.347,94
NP (3.22)	3.12.03 TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO)...	M^3-KM	3952.50	$ 2.312,50		$ 9.140.156,25	$ 9.140.156,25	0.00	$ -	3952.50	$ 0.00	$ 9.140.156,25	$ 9.140.156,25	3952.50		$ 9.140.156,25	$ 9.140.156,25
NP (3.23)	2.05.54 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=12"	ML	12.00	$ 202.745,55		$ 2.432.946,60	$ 2.432.946,60	0.00	$ -	12.00	$ 0.00	$ 2.432.946,60	$ 2.432.946,60	12.00		$ 2.432.946,60	$ 2.432.946,60
				SUBTOTAL	$ 5.580.079,91	$ 79.996.577,55	$ 85.576.657,46		$ 0,00		$ 5.580.079,91	$ 79.996.577,55	$ 85.576.657,46		$ 5.580.079,91	$ 79.996.577,55	$ 85.576.657,46
				A	$ 279.004,00	$ 3.999.828,88	$ 4.278.832,87		$ 0,00		$ 279.004,00	$ 3.999.828,88	$ 4.278.832,87		$ 279.004,00	$ 3.999.828,88	$ 4.278.832,87
				I	$ 111.601,60	$ 1.599.931,55	$ 1.711.533,15		$ 0,00		$ 111.601,60	$ 1.599.931,55	$ 1.711.533,15		$ 111.601,60	$ 1.599.931,55	$ 1.711.533,15
				U	$ 167.402,40	$ 2.399.897,33	$ 2.567.299,72		$ 0,00		$ 167.402,40	$ 2.399.897,33	$ 2.567.299,72		$ 167.402,40	$ 2.399.897,33	$ 2.567.299,72
				SUBTOTAL + AIU	$ 6.138.087,91	$ 87.996.235,31	$ 94.134.323,20		$ 0,00		$ 6.138.087,91	$ 87.996.235,31	$ 94.134.323,20		$ 6.138.087,91	$ 87.996.235,31	$ 94.134.323,20
4.00	REPOSICIÓN DE SISTEMA DEMANEJO DE AGUAS DE ESCORRENTIA SECTOR UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DE PAIPA																
4.10	2.06.12 POZO DE INSPECCION D= 1.20 MH 1.00 1.50 M	UND	3	$ 1.011.536,11	$ 963.204,72	$ 2.071.403,61	$ 3.034.608,33	3.00	$ 3.034.608,33	0.00		$ 0.00	$ 0.00	3.00	$ 963.204,72	$ 2.071.403,61	$ 3.034.608,33
4.20	2.05.57 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=16"	ml	126	$ 315.599,02	$ 3.633.970,30	$ 36.131.506,22	$ 39.765.476,52	0.00	$ -	126.00	$ 3.633.970,30	$ 36.131.506,22	$ 39.765.476,52	126.00	$ 3.633.970,30	$ 36.131.506,22	$ 39.765.476,52
NP (4.4)	1.02.17 EXCAVACION EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	60	$ 51.943,58	$ 2.054.122,87	$ 1.062.491,93	$ 3.116.614,80	0.00	$ -	60.00	$ 2.054.122,87	$ 1.062.491,93	$ 3.116.614,80	60.00	$ 2.054.122,87	$ 1.062.491,93	$ 3.116.614,80
NP (4.5)	1.02.17 EXCAVACION EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	40.8	$ 51.943,58	$ 1.611.016,13	$ 508.281,93	$ 2.119.298,06	0.00		40.80	$ 1.611.016,13	$ 508.281,93	$ 2.119.298,06	40.80	$ 1.611.016,13	$ 508.281,93	$ 2.119.298,06
NP (4.6)	3.13.36 RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, UMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M^3	34.57	$ 105.811,37	$ 2.194.739,44	$ 1.463.159,62	$ 3.657.899,06	0.00	$ -	34.57	$ 2.194.739,44	$ 1.463.159,62	$ 3.657.899,06	34.57	$ 2.194.739,44	$ 1.463.159,62	$ 3.657.899,06
NP (4.7)	3.03.15 RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA	M^3	50.4	$ 73.050,70	$ 2.209.053,17	$ 1.472.702,11	$ 3.681.755,28	0.00	$ -	50.40	$ 2.209.053,17	$ 1.472.702,11	$ 3.681.755,28	50.40	$ 2.209.053,17	$ 1.472.702,11	$ 3.681.755,28
NP (4.8)	3.12.03 TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO)...	M^3	630	$ 2.312,50		$ 1.456.875,00	$ 1.456.875,00	0.00	$ -	441.00	$ 0.00	$ 1.019.812,50	$ 1.019.812,50	441.00		$ 1.019.812,50	$ 1.019.812,50
NP (4.9)	CAJAS DE INSPECCION MH 1.00 1.50 M	UND	1	$ 1.627.743,35	$ 951.998,22	$ 685.745,13	$ 1.637.743,35	0.00	$ -	1.00	$ 951.998,22	$ 685.745,13	$ 1.637.743,35	1.00	$ 951.998,22	$ 685.745,13	$ 1.637.743,35
				SUB-TOTAL	$ 13.618.104,85	$ 44.852.165,55	$ 58.470.270,40		$ 3.034.608,33		$ 12.654.900,13	$ 42.343.699,44	$ 54.998.599,57		$ 13.618.104,85	$ 44.445.103,05	$ 58.033.207,90
				A	$ 680.905,24	$ 2.242.608,28	$ 2.923.513,52		$ 151.730,42		$ 632.745,01	$ 2.117.184,97	$ 2.749.929,98		$ 680.905,24	$ 2.220.755,15	$ 2.901.660,40
				I	$ 272.362,10	$ 897.043,31	$ 1.169.405,41		$ 60.692,17		$ 253.098,00	$ 846.873,96	$ 1.099.971,96		$ 272.362,10	$ 888.302,06	$ 1.160.664,16
				U	$ 408.543,15	$ 1.345.564,97	$ 1.754.108,11		$ 91.038,25		$ 379.647,00	$ 1.270.310,98	$ 1.649.957,98		$ 408.543,15	$ 1.332.453,08	$ 1.740.996,24
				SUBTOTAL + AIU	$ 14.979.915,34	$ 49.337.382,11	$ 64.317.297,44		$ 3.338.069,17		$ 13.920.390,14	$ 46.578.069,38	$ 60.498.459,53		$ 14.979.915,34	$ 48.856.613,35	$ 63.836.528,70

COSTO DIRECTO SUMINISTRO	$ 168.255.832,39	$ 168.255.832,39	$ 134.345.239,39
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA (19%)	$ 31.968.608,15	$ 31.968.608,15	$ 25.639.595,48
COSTO TOTAL SUMINISTRO	$ 200.224.440,54	$ 200.224.440,54	$ 160.584.834,87

			RED VITAL	ALCALDIA	TOTAL												
COSTO DIRECTO OBRA			$ 84.671.293,01	$ 580.019.418,42	$ 664.690.711,43		$ 69.077.930,04		$ 43.830.676,76	$ 323.375.036,41	$ 367.205.713,17		$ 57.406.431,90	$ 391.562.301,12	$ 448.968.733,02
A.I.U. 10%	ADMINISTRACION (5%)		$ 4.233.564,65	$ 29.000.970,92	$ 33.234.535,57		$ 3.453.896,51		$ 2.191.533,85	$ 16.168.751,87	$ 18.360.285,66		$ 2.870.321,60	$ 19.078.115,08	$ 21.948.436,65 $
	IMPREVISTOS (2%)		1.693.425,86	$ 11.600.388,37	$ 13.293.814,23		$ 1.381.558,60		$ 876.613,53	$ 6.467.500,73	$ 7.344.114,26		$ 1.148.128,64	$ 7.631.246,07	$ 8.779.374,66	
	UTILIDAD (3%)		$ 2.540.138,75	$ 17.400.582,55	$ 19.940.721,34		$ 2.072.337,90		$ 1.314.920,30	$ 9.701.251,09	$ 11.016.171,39		$ 1.722.192,96	$ 11.446.869,03	$ 13.169.061,98	
COSTO TOTAL OBRA			$ 93.138.422,31	$ 638.021.360,27	$ 731.159.782,58		$ 75.985.723,05		$ 48.213.744,44	$ 355.712.540,05	$ 403.926.284,48		$ 63.147.075,09	$ 481.718.531,23	$ 482.865.506,32	
TOTAL COSTO OBRA + SUMINISTRO			$ 93.138.422,31	$ 838.245.800,80	$ 931.384.223,13		$ 236.570.557,92		$ 48.213.744,44	$ 395.352.145,72	$ 443.565.890,15		$ 63.147.075,09	$ 619.942.971,77	$ 683.090.046,86	

TITO DUSTANO CURREA VALDERRAMA
RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P.

JOSÉ UBALDO CASTRO ACOSTA
SUPERVISOR

CARLOS EDUARDO ROBLES SAENZ
INTERVENTOR

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS RED VITAL S.A E.S.P PAIPA

INFORME DE AVANCE 7

MEMORIA DE CANTIDADES CONVENIO MP 011 DE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.40	TUBO EN CONCRETO 24 "	UN

REGISTRO Y EVIDENCIA



CÁLCULO DE CANTIDADES Y/O DIMENSIONES

Suministro de tubería

Cantidad		total
45		45
TOTAL		45

Vo Bo CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTORIA

Vo Bo SUPERVISIÓN

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS RED VITAL S.A E.S.P PAIPA

INFORME DE AVANCE 7

MEMORIA DE CANTIDADES CONVENIO MP 011 DE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.5	TUBO ALACANTARILLADO NOVAFORT 160mm (6m)	UN

REGISTRO Y EVIDENCIA



CALCULO DE CANTIDADES Y/O DIMENSIONES

Suministro de tubería de 160 mm

Cantidad		total
10		10
TOTAL		10

Vo Bo CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTORIA

Vo Bo SUPERVISIÓN


EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS RED VITAL S.A E.S.P PAIPA

INFORME DE AVANCE 7

MEMORIA DE CANTIDADES CONVENIO MP 011 DE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.6	TUBO ALACANTARILLADO NOVAFORT 350mm (6m)	UN

REGISTRO Y EVIDENCIA

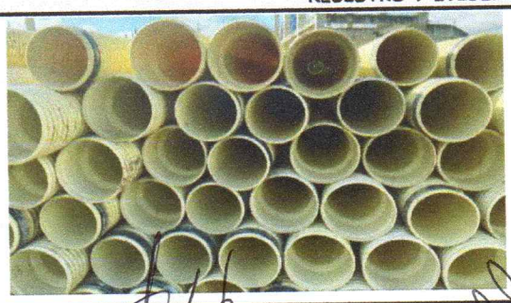

CALCULO DE CANTIDADES Y/O DIMENSIONES

Suministro de tubería de 350 mm

Cantidad		total
12		12
TOTAL		12

Vo Bo CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTORIA

Vo Bo SUPERVISIÓN

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS RED VITAL S.A E.S.P PAIPA

INFORME DE AVANCE 7

MEMORIA DE CANTIDADES CONVENIO MP 011 DE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.7	TUBO ALACANTARILLADO NOVAFORT 450mm (6m)	UN

REGISTRO Y EVIDENCIA



CALCULO DE CANTIDADES Y/O DIMENSIONES

Suministro de tubería de 450 mm

Cantidad		total
8		8
TOTAL		8

Vo Bo CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTORIA

Vo Bo SUPERVISIÓN

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS RED VITAL S.A E.S.P PAIPA

INFORME DE AVANCE 7

MEMORIA DE CANTIDADES CONVENIO MP 011 DE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.21	3.13.09 CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1,50 DISTANCIA ENTRE POSTES 2 MTS	ML

REGISTRO Y EVIDENCIA



CÁLCULO DE CANTIDADES Y/O DIMENSIONES

Perímetro del tramo

Long		total
75.48		75.48
TOTAL		**75.48**

Vo Bo CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTORIA

Vo Bo SUPERVISIÓN

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS RED VITAL S.A E.S.P PAIPA

INFORME DE AVANCE 7

MEMORIA DE CANTIDADES CONVENIO MP 011 DE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.23	3.13.17 DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO E<=10 CMS(INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5 KM	M2

REGISTRO Y EVIDENCIA



CÁLCULO DE CANTIDADES Y/O

Área del tramo

Long prom	ancho	total
60	7.6	456
40	8.4	336
TOTAL		**792.00**

Vo Bo CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTORIA

Vo Bo SUPERVISIÓN

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS RED VITAL S.A
E.S.P PAIPA

INFORME DE AVANCE 7

MEMORIA DE CANTIDADES CONVENIO MP 011 DE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.23	1.02.15 EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE A CARREO LIBRE DE 5 KM	M3

REGISTRO Y EVIDENCIA



CÁLCULO DE CANTIDADES Y/O DIMENSIONES

total del tramo

Descripción Especifica	cantidad	Long prom	ancho prom	prof prom	total
Excavación para red principal de alcantarillad		7.26	0.8	1.5	8.71
Excavación para domiciliarias de alcantarillad	5	2	0.3	0.6	1.8
Cajeo para la estructura de la vía		100	8.4	0.3	252
TOTAL					262.51

Vo Bo CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTORIA

Vo Bo SUPERVISIÓN

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS RED VITAL S.A
E.S.P PAIPA

INFORME DE AVANCE 7

MEMORIA DE CANTIDADES CONVENIO MP 011 DE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.24	3.13.36 RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, UMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M3

REGISTRO Y EVIDENCIA



CÁLCULO DE CANTIDADES Y/O DIMENSIONES

total del tramo

Descripción	cantidad	Long prom	ancho	prof prom	total
Red principal de alcantarillad o		7.26	0.8	0.65	3.78
Área para descontar del tubo		7.26		0.151976	1.10
Relleno acometidas domiciliarias de alcantarillad	5	2	0.2	0.3	0.6
TOTAL					3.27

Vo Bo CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTORIA

Vo Bo SUPERVISIÓN

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS RED VITAL S.A E.S.P PAIPA

INFORME DE AVANCE 7

MEMORIA DE CANTIDADES CONVENIO MP 011 DE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.26	3.03.15 RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA	M3

REGISTRO Y EVIDENCIA



CÁLCULO DE CANTIDADES Y/O DIMENSIONES

total del tramo

Descripción Especifica	cantidad	Long prom	ancho prom	prof prom	total
Red principal		7.26	0.8	0.8	4.65
Relleno acometidas	5	2	0.2	0.3	0.6
TOTAL					5.25

Vo Bo CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTORIA

Vo Bo SUPERVISIÓN


EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS RED VITAL S.A E.S.P PAIPA

INFORME DE AVANCE 7

MEMORIA DE CANTIDADES CONVENIO MP 011 DE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 2.26	RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE	M3

REGISTRO Y EVIDENCIA

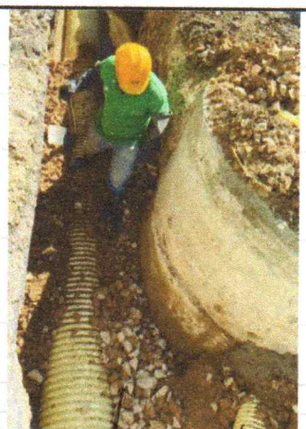

CÁLCULO DE CANTIDADES Y/O DIMENSIONES

total del tramo

Descripción Especifica	Long prom	ancho prom	prof prom	total
Red principal	62.26	0.8	0.35	17.43
TOTAL				17.43

Vo Bo CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTORIA

Vo Bo SUPERVISIÓN

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS RED VITAL S.A E.S.P PAIPA

INFORME DE AVANCE 7

MEMORIA DE CANTIDADES CONVENIO MP 011 DE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 2.27	3.03.12 MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	M3

REGISTRO Y EVIDENCIA



CÁLCULO DE CANTIDADES Y/O DIMENSIONES

total del tramo

Descripción Especifica	Long prom	ancho prom	prof prom	total
Red principal	98	8.4	0.07	57.62
TOTAL				57.62

Vo Bo CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTORIA

Vo Bo SUPERVISIÓN


EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS RED VITAL S.A E.S.P PAIPA

INFORME DE AVANCE 7

MEMORIA DE CANTIDADES CONVENIO MP 011 DE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 2.28	3.04.06 SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	M3

REGISTRO Y EVIDENCIA

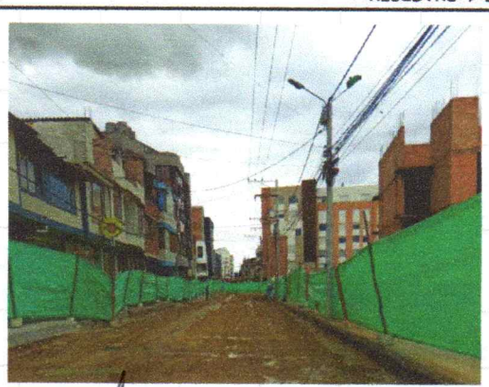

CÁLCULO DE CANTIDADES Y/O DIMENSIONES

total del tramo

Descripción Especifica	Long prom	ancho prom	prof prom	total
Red principal	100	8.4	0.15	126.00
TOTAL				126.00

Vo Bo CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTORIA

Vo Bo SUPERVISIÓN

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS RED VITAL S.A E.S.P PAIPA

INFORME DE AVANCE 7

MEMORIA DE CANTIDADES CONVENIO MP 011 DE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 2.29	3.12.03 TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO)..	M3-KM

REGISTRO Y EVIDENCIA



CÁLCULO DE CANTIDADES Y/O DIMENSIONES

total del tramo

Descripción Especifica	cant	exp	dist	total
base granular	126.00	1.25	33	5197.50
afirmado	57.62	1.25	5	360.13
material filtrante	17.43	1.25	5	108.94
TOTAL				5666.56

Vo Bo CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTORIA

Vo Bo SUPERVISIÓN

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS RED VITAL S.A E.S.P PAIPA

INFORME DE AVANCE 7

MEMORIA DE CANTIDADES CONVENIO MP 011 DE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 2.30	3.12.04. TRANSPORTE DE MATERIALES MEDIDOS EN BANCO PRODUCTO DE EXCAVACIONES DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS	M3-KM

REGISTRO Y EVIDENCIA



CÁLCULO DE CANTIDADES Y/O DIMENSIONES

total del tramo

Descripción Especifica	cant	exp	dist	total
Producto de excavación para reposicoón de redes de alcantarillado sanitario	329.59	1.25	5	2059.94
TOTAL				2059.94

Vo Bo CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTORIA

Vo Bo SUPERVISIÓN

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
RED VITAL S.A E.S.P PAIPA

INFORME DE AVANCE 7

MEMORIA DE CANTIDADES CONVENIO MP 011 DE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.27	2.05.57 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=18"	ML

REGISTRO Y EVIDENCIA



CÁLCULO DE CANTIDADES Y/O DIMENSIONES		
longitud del tramo		
Long red ppal		total
7.26		7.26
TOTAL		7.26

Vo Bo CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTORIA

Vo Bo SUPERVISIÓN


EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
RED VITAL S.A E.S.P PAIPA

INFORME DE AVANCE 7

MEMORIA DE CANTIDADES CONVENIO MP 011 DE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.28	2.06.18 RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE EN CONCRETO DIAMETRO PULGADAS	ML

REGISTRO Y EVIDENCIA

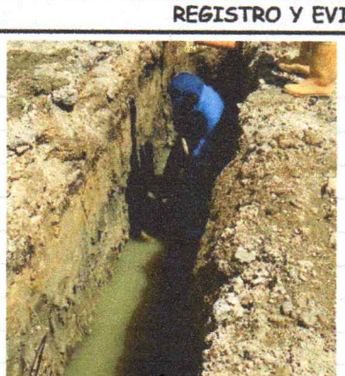

CÁLCULO DE CANTIDADES Y/O DIMENSIONES		
longitud del tramo		
Long red ppal		total
7.26		7.26
TOTAL		7.26

Vo Bo CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTORIA

Vo Bo SUPERVISIÓN


EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
RED VITAL S.A E.S.P PAIPA

INFORME DE AVANCE 7

MEMORIA DE CANTIDADES CONVENIO MP 011 DE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.29	2.06.04 CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO. INC. TUBERIA Y ACCESORIOS DE CONEXION TUBERIA	UN

REGISTRO Y EVIDENCIA

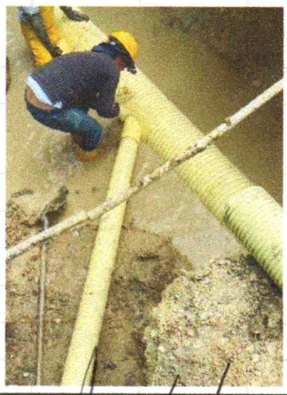

CÁLCULO DE CANTIDADES Y/O DIMENSIONES		
longitud del tramo		
cantidad domiciliarias		total
5		5
TOTAL		5.00

Vo Bo CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTORIA

Vo Bo SUPERVISIÓN

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS RED VITAL S.A E.S.P PAIPA

INFORME DE AVANCE 7

MEMORIA DE CANTIDADES CONVENIO MP 011 DE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.32	3.13.09 CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1,50 DISTANCIA ENTRE POSTES 2 MTS	ML

REGISTRO Y EVIDENCIA



CALCULO DE CANTIDADES Y/O DIMENSIONES

Perímetro del tramo

tramo		total
0.01		0.01
TOTAL		0.01

Vo Bo CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTORIA

Vo Bo SUPERVISIÓN

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS RED VITAL S.A E.S.P PAIPA

INFORME DE AVANCE 7

MEMORIA DE CANTIDADES CONVENIO MP 011 DE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.34	3.13.17 DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFALTICO E<=10 CMS(INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5 KM	M2

REGISTRO Y EVIDENCIA



CALCULO DE CANTIDADES Y/O

Área del tramo

Long prom	ancho	total
80	10	800
20	10.8	216
TOTAL		1016.00

Vo Bo CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTORIA

Vo Bo SUPERVISIÓN

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS RED VITAL S.A
E.S.P PAIPA

INFORME DE AVANCE 7

MEMORIA DE CANTIDADES CONVENIO MP 011 DE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.35	1.02.15 EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE A CARREO LIBRE DE 5 KM M	M3

REGISTRO Y EVIDENCIA



CÁLCULO DE CANTIDADES Y/O DIMENSIONES

total del tramo

Descripción Especifica	cantidad	Long prom	ancho prom	prof prom	total
Para red principal sanitaria		20	0.8	1.10	17.6
Acometidas domiciliarias	6	4	0.35	0.70	5.88
Filtros laterales a cada costado de la vía	2	100	0.4	0.40	32
Pedraplen		75	5	0.40	150
cajeo para estructura de vía		100	10.8	0.40	432
TOTAL					**637.48**

Vo Bo CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTORIA

Vo Bo SUPERVISIÓN


EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS RED VITAL S.A
E.S.P PAIPA

INFORME DE AVANCE 7

MEMORIA DE CANTIDADES CONVENIO MP 011 DE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.36	3.13.36 RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, UMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M3

REGISTRO Y EVIDENCIA

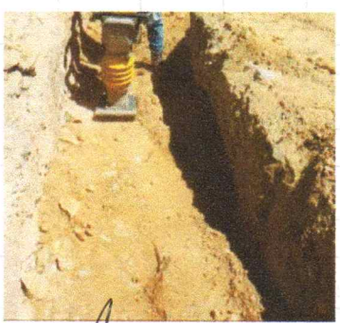

CÁLCULO DE CANTIDADES Y/O DIMENSIONES

total del tramo

Descripción Especifica	cantidad	Long prom	ancho prom	prof prom	total
piso y atraque		20	0.8	0.50	8.00
Área para descontar tubo 12"		20	0.07065		1.41
Acometidas	6	4	0.4	0.35	3.36
Área para descontar tubo 6"	6	4	0.015386		0.37
TOTAL					**9.58**

Vo Bo CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTORIA

Vo Bo SUPERVISIÓN

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS RED VITAL S.A E.S.P PAIPA

INFORME DE AVANCE 7

MEMORIA DE CANTIDADES CONVENIO MP 011 DE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.38	3.03.15 RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA	M3

REGISTRO Y EVIDENCIA



CÁLCULO DE CANTIDADES Y/O DIMENSIONES

total del tramo

Descripción Especifica	cantidad	Long prom	ancho prom	prof prom	total
Relleno hasta nivel de vía red principal		100	0.8	0.70	56.00
Relleno acometidas	16	4	0.4	0.3	7.68
TOTAL					63.68

Vo Bo CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTORIA

Vo Bo SUPERVISIÓN

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS RED VITAL S.A E.S.P PAIPA

INFORME DE AVANCE 7

MEMORIA DE CANTIDADES CONVENIO MP 011 DE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 2.39	3.03.12 MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	M3

REGISTRO Y EVIDENCIA



CÁLCULO DE CANTIDADES Y/O DIMENSIONES

total del tramo

Descripción Especifica	Long prom	ancho prom	prof prom	total
Red principal	105	10.8	0.08	90.72
TOTAL				90.72

Vo Bo CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTORIA

Vo Bo SUPERVISIÓN

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS RED VITAL S.A E.S.P PAIPA

INFORME DE AVANCE 7

MEMORIA DE CANTIDADES CONVENIO MP 011 DE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 2.40	3.04.06 SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	M3

REGISTRO Y EVIDENCIA



CÁLCULO DE CANTIDADES Y/O DIMENSIONES

total del tramo

Descripción Especifica	Long prom	ancho prom	prof prom	total
Red principal	107	11.04	0.16	189.00
TOTAL				189.00

Vo Bo CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTORIA

Vo Bo SUPERVISIÓN

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS RED VITAL S.A E.S.P PAIPA

INFORME DE AVANCE 7

MEMORIA DE CANTIDADES CONVENIO MP 011 DE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 2.41	3.12.04. TRANSPORTE DE MATERIALES MEDIDOS EN BANCO PRODUCTO DE EXCAVACIONES DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS	M3-KM

REGISTRO Y EVIDENCIA



CÁLCULO DE CANTIDADES Y/O DIMENSIONES

total del tramo

Descripción Especifica	cant	exp	dist	total
Material producto de excavaciones para reposición de redes	717.68	1.25	5	4485.50
TOTAL				4485.50

Vo Bo CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTORIA

Vo Bo SUPERVISIÓN

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS RED VITAL S.A E.S.P
PAIPA

INFORME DE AVANCE 7

MEMORIA DE CANTIDADES CONVENIO MP 011 DE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 2.42	3.02.10 PEDRAPLEN COMPACTO	M3

REGISTRO Y EVIDENCIA



CÁLCULO DE CANTIDADES Y/O DIMENSIONES

total del tramo

Descripció	cant	exp	dist	total
Se realiza tramos adectados - izquierdo sentido N-S	50.00	5.5	0.4	110.00
Se realiza tramos adectados - derecho sentido N-S	25	5.5	0.4	55.00
TOTAL				165.00

Vo Bo CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTORIA

Vo Bo SUPERVISIÓN


EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS RED VITAL S.A E.S.P
PAIPA

INFORME DE AVANCE 7

MEMORIA DE CANTIDADES CONVENIO MP 011 DE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 2.43	RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE	M3

REGISTRO Y EVIDENCIA



CÁLCULO DE CANTIDADES Y/O DIMENSIONES

total del tramo

Descripció	cant	exp	dist	total
red principal	100.00	0.8	0.3	24.00
TOTAL				24.00

Vo Bo CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTORIA

Vo Bo SUPERVISIÓN

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS RED VITAL S.A E.S.P
PAIPA

INFORME DE AVANCE 7

MEMORIA DE CANTIDADES CONVENIO MP 011 DE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 2.44	3.03.12 MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	M3

REGISTRO Y EVIDENCIA



CALCULO DE CANTIDADES Y/O DIMENSIONES

total del tramo

Descripció	cant	exp	dist	total
área total del tramo	105.00	10.78	0.17	192.38
TOTAL				192.38

Vo Bo CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTORIA

Vo Bo SUPERVISIÓN

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS RED VITAL S.A E.S.P PAIPA

INFORME DE AVANCE 7

MEMORIA DE CANTIDADES CONVENIO MP 011 DE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 2.45	3.03.02. CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGUN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACION, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	M3

REGISTRO Y EVIDENCIA



CALCULO DE CANTIDADES Y/O DIMENSIONES

total del tramo

Descripció	cant	exp	dist	prof	total
A lo largo del tramo por los dos costados	2.00	100.00	0.4	0.4	32.00
TOTAL					32.00

Vo Bo CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTORIA

Vo Bo SUPERVISIÓN

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS RED VITAL S.A E.S.P PAIPA

INFORME DE AVANCE 7

MEMORIA DE CANTIDADES CONVENIO MP 011 DE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 2.46	3.12.03 TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO)..	M3-KM

REGISTRO Y EVIDENCIA



CÁLCULO DE CANTIDADES Y/O DIMENSIONES

total del tramo

Descripción Especifica	cant	exp	dist	total
Transporte de material de afirmado para rellenos	63.68	1.25	5	398.00
Transporte de material de afirmado para mejoramoento de la vía	90.72	1.25	5	567.00
Transporte de material de base para la vía	189.00	1.25	33	7796.25
Transporte de material para filtros	32.00	1.30	5	208.00
Transporte de material de afirmado para mejoramiento de piso	192.38	1.25	5	1300.45
TOTAL				10269.70

Vo Bo CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTORIA

Vo Bo SUPERVISIÓN


EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS RED VITAL S.A E.S.P PAIPA

INFORME DE AVANCE 7

MEMORIA DE CANTIDADES CONVENIO MP 011 DE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 2.47	3.12.02 TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO	M3-KM

REGISTRO Y EVIDENCIA

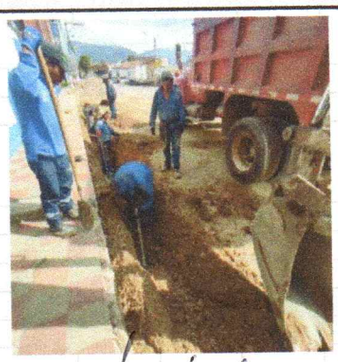

CÁLCULO DE CANTIDADES Y/O DIMENSIONES

total del tramo

Descripción Especifica	cant	exp	dist	total
Transporte de material de piedra para pedraplen	165.00	1.25	10	2062.50
TOTAL				2062.50

Vo Bo CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTORIA

Vo Bo SUPERVISIÓN

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
RED VITAL S.A E.S.P PAIPA

INFORME DE AVANCE 7

MEMORIA DE CANTIDADES CONVENIO MP 011 DE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.39	2.05.54 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=12"	ML

REGISTRO Y EVIDENCIA



CÁLCULO DE CANTIDADES Y/O DIMENSIONES

longitud del tramo

long		total
20.03		20.03
TOTAL		**20.03**

Vo Bo CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTORIA

Vo Bo SUPERVISIÓN

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
RED VITAL S.A E.S.P PAIPA

INFORME DE AVANCE 7

MEMORIA DE CANTIDADES CONVENIO MP 011 DE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.40	2.06.19 RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE EN CONCRETO 8" A 12"	ML

REGISTRO Y EVIDENCIA



CÁLCULO DE CANTIDADES Y/O DIMENSIONES

longitud del tramo

long		total
20		20
TOTAL		**20.00**

Vo Bo CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTORIA

Vo Bo SUPERVISIÓN


EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
RED VITAL S.A E.S.P PAIPA

INFORME DE AVANCE 7

MEMORIA DE CANTIDADES CONVENIO MP 011 DE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.41	2.06.04 CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO. INC. TUBERIA Y ACCESORIOS DE CONEXION TUBERIA	UN

REGISTRO Y EVIDENCIA

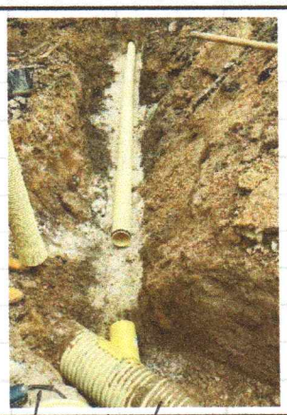

CÁLCULO DE CANTIDADES Y/O DIMENSIONES		
longitud del tramo		
cantidad		total
6		6
TOTAL		6.00

Vo Bo CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTORIA

Vo Bo SUPERVISIÓN

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS RED VITAL S.A
E.S.P PAIPA

PAIPA S.A. E.S.P. Red Vital AL SERVICIO DE SUMERCÉ

INFORME DE AVANCE 7

MEMORIA DE CANTIDADES CONVENIO MP 011 DE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3.2	3.03.05 CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	M3

REGISTRO Y EVIDENCIA



CÁLCULO DE CANTIDADES Y/O DIMENSIONES

total del tramo

Descripción Especifica	Long prom	ancho prom	esp prom	total
cuneta borde de caseta	5.2	0.45	0.15	0.35
Cuneta borde de via ferrea	20	2	0.15	6.00
TOTAL				**6.35**

Vo Bo CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTORIA

Vo Bo SUPERVISION

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS RED VITAL S.A
E.S.P PAIPA

PAIPA S.A. E.S.P. Red Vital AL SERVICIO DE SUMERCÉ

INFORME DE AVANCE 7

MEMORIA DE CANTIDADES CONVENIO MP 011 DE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3.5	3.03.05 CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE	KG

REGISTRO Y EVIDENCIA



CÁLCULO DE CANTIDADES Y/O DIMENSIONES

total del tramo

Descripción Especifica	Long	peso	No	total
Varillas #8	2	3.973	95	754.87
Varillas #4	19	0.994	10	188.86
Varillas #8	2	3.973	100	794.60
Varillas #4	20	0.094	10	18.80
Varillas adicionales para traslapos extensoras	0.3	3.973	46	54.83
Varillas adicionales para traslapos extensoras	2.85	0.994	12	33.99
TOTAL				**1845.95**

Vo Bo CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTORIA

Vo Bo SUPERVISIÓN

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS RED VITAL S.A
E.S.P PAIPA

INFORME DE AVANCE 7

MEMORIA DE CANTIDADES CONVENIO MP 011 DE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDA
3.6	REJA PARA CÁRCAMO	UN

REGISTRO Y EVIDENCIA



CÁLCULO DE CANTIDADES Y/O

total del tramo

Descripción Especifica	cantida	total
Reja reforzada instalada para sumidero transversal de recolección de aguas lluvias para tráfico pesado	1	1.00
TOTAL		1.00

Vo Bo CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTORIA

Vo Bo SUPERVISIÓN

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS RED VITAL S.A
E.S.P PAIPA

INFORME DE AVANCE 7

MEMORIA DE CANTIDADES CONVENIO MP 011 DE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDA
INP 3.8	3.01.04 LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	KM

REGISTRO Y EVIDENCIA



CÁLCULO DE CANTIDADES Y/O

total del tramo

Descripción Especifica	cantida	total
Nivelación y localización para estructuras de drenaje	0.10	0.10
nivelación y localización de redes de alcantarillado pluvial	0.10	0.10
TOTAL		0.20

Vo Bo CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTORIA

Vo Bo SUPERVISIÓN


EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS RED VITAL S.A
E.S.P PAIPA

INFORME DE AVANCE 7

MEMORIA DE CANTIDADES CONVENIO MP 011 DE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 3,9	3.02.02 EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	M3

REGISTRO Y EVIDENCIA

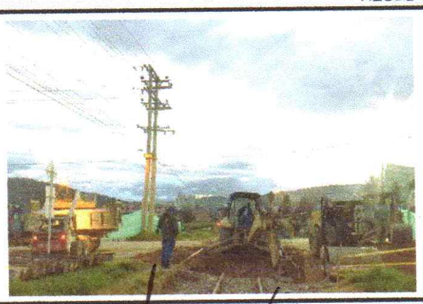

CÁLCULO DE CANTIDADES Y/O DIMENSIONES

total del tramo

Descripción Especifica	Long	ancho	esp	total
Excavación para cárcamo	19	1	1	19.00
Excavación instalación tuberia transversal via en el K0+850 al Pozo.	12	1	2	24.00
Excavación de canaleta trapezoidal	16	1.23	0.8	15.74
TOTAL				58.74

Vo Bo CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTORIA

Vo Bo SUPERVISIÓN

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS RED VITAL S.A
E.S.P PAIPA

INFORME DE AVANCE 7

MEMORIA DE CANTIDADES CONVENIO MP 011 DE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDA
INP 3.10	2.05.53 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=10"	ML

REGISTRO Y EVIDENCIA



CÁLCULO DE CANTIDADES Y/O

total del tramo

Descripción Especifica	longitu	total
Tuberia de 10" diagonal entre el pozo de 24"y la canaleta transversal	2	2.00
TOTAL		2.00

Vo Bo CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTORIA

Vo Bo SUPERVISIÓN

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS RED VITAL S.A
E.S.P PAIPA

INFORME DE AVANCE 7

MEMORIA DE CANTIDADES CONVENIO MP 011 DE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 3,11	3.05.07 CONCRETO MR 4.2 MPA NORMAL, TAMAÑO MAXIMO AGREGADO 25MM, RESISTENCIA A 28 DIAS, ASENTAMIENTO 10CM +/- 2.5CM (MR 42 NORMAL)	M3

REGISTRO Y EVIDENCIA



CALCULO DE CANTIDADES Y/O DIMENSIONES

total del tramo

Descripción Especifica	Long	ancho	esp	total
En el sector de paso nivel	13.2	1.84	0.15	3.64
Base o piso	13.2	1.84	0.01	0.36
canal del cárcamo	19	2	0.2	7.60
TOTAL				11.60

Vo Bo CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTORIA

Vo Bo SUPERVISIÓN


EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS RED VITAL S.A
E.S.P PAIPA

INFORME DE AVANCE 7

MEMORIA DE CANTIDADES CONVENIO MP 011 DE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDA
INP 3.12	2.05.05 POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M, 1.50 < H < 2.00	UN

REGISTRO Y EVIDENCIA

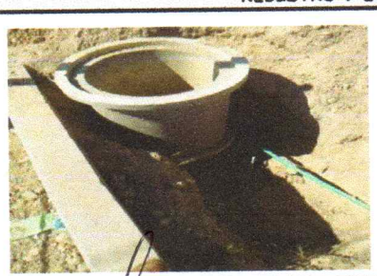

CÁLCULO DE CANTIDADES Y/O

total del tramo

Descripción Especifica	cantida	total
ubicado a dos metros de la canaleta	1	1.00
TOTAL		1.00

Vo Bo CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTORIA

Vo Bo SUPERVISIÓN


EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS RED VITAL S.A
E.S.P PAIPA

INFORME DE AVANCE 7

MEMORIA DE CANTIDADES CONVENIO MP 011 DE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDA
INP 3.13	3.08.19 SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO A-10, INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGUN NORMA NTC-4109	ML

REGISTRO Y EVIDENCIA

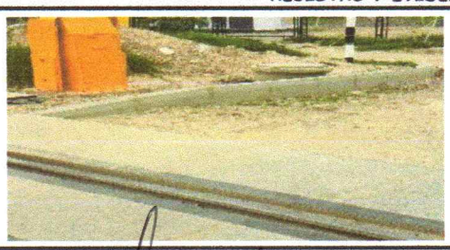

CÁLCULO DE CANTIDADES Y/O

total del tramo

Descripción Especifica	cantida	total
instalacion de bordillo A-80 sardinel incluye mano de obra, al borde de la vía existente	35.96	35.96
TOTAL		**35.96**

Vo Bo CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTORIA

Vo Bo SUPERVISIÓN

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS RED VITAL S.A
E.S.P PAIPA

INFORME DE AVANCE 7

MEMORIA DE CANTIDADES CONVENIO MP 011 DE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 3,14	3.03.15 RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR	M3

REGISTRO Y EVIDENCIA



CÁLCULO DE CANTIDADES Y/O DIMENSIONES

total del tramo

Descripción Especifica	Long	ancho	esp	total
Relleno en construcción de urbanismo	15	6.5	0.91	88.73
Relleno en construcción de carcamo	19	1	0.25	4.75
Relleno instalación tuberia transversal via en el K0+850 al Pozo.	18	1	0.6	10.80
TOTAL				**104.28**

Vo Bo CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTORIA

Vo Bo SUPERVISIÓN


EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS RED VITAL S.A
E.S.P PAIPA

INFORME DE AVANCE 7

MEMORIA DE CANTIDADES CONVENIO MP 011 DE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 3,15	1.02.17 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3

REGISTRO Y EVIDENCIA

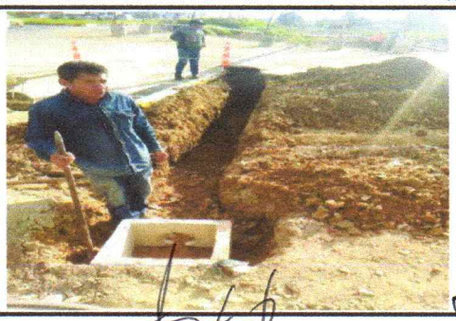

CÁLCULO DE CANTIDADES Y/O DIMENSIONES

total del tramo

Descripción Especifica	Long	ancho	esp	cant	total
Excavación de cunetas en caseta	5.2	1	0.25	2	2.60
Excavación cuneta de concreto borde via	20	1	0.5	1	10.00
Excavación de caja de inspección	1.2	1.2	1	4	5.76
Excavacion tuberia de 14"	8	1.2	1.5	1	14.40
TOTAL					32.76

Vo Bo CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTORIA

Vo Bo SUPERVISIÓN

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS RED VITAL S.A
E.S.P PAIPA

INFORME DE AVANCE 7

MEMORIA DE CANTIDADES CONVENIO MP 011 DE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 3,16	1.02.28 SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI)	M3

REGISTRO Y EVIDENCIA



CÁLCULO DE CANTIDADES Y/O DIMENSIONES

total del tramo

Descripción Especifica	Long	ancho	esp	total
Solado de concreto base de carcamo	20	1	0.05	1.00
TOTAL				1.00

Vo Bo CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTORIA

Vo Bo SUPERVISIÓN

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS RED VITAL S.A
E.S.P PAIPA

INFORME DE AVANCE 7

MEMORIA DE CANTIDADES CONVENIO MP 011 DE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 3,17	2.01.09 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3

REGISTRO Y EVIDENCIA



CÁLCULO DE CANTIDADES Y/O DIMENSIONES

total del tramo

Descripción Especifica	Long	ancho	prof	total
Relleno sobre tubo de 4 "	3.00	0.60	0.60	1.08
Relleno sobre tubo de 14 " Descarga Carcamo	8.00	1.20	1.20	11.52
Relleno sobre tubo de 14 " de Cuneta a tubo de 14"	4.00	1.20	1.20	5.76
Relleno sobre tubo de 14 " transversal via al Pozo	18.00	1.20	0.90	19.44
TOTAL				37.80

Vo Bo CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTORIA

Vo Bo SUPERVISION

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS RED VITAL S.A
E.S.P PAIPA

INFORME DE AVANCE 7

MEMORIA DE CANTIDADES CONVENIO MP 011 DE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 3,18	SUMINISTRO. EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL DE SUB BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO HASTA 5 KM)	M3

REGISTRO Y EVIDENCIA



CÁLCULO DE CANTIDADES Y/O DIMENSIONES

total del tramo

Descripción Especifica	Long	ancho	prof	total
Relleno sobre tubo de 4 "	18.00	1.00	0.40	7.20
TOTAL				7.20

Vo Bo CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTORIA

Vo Bo SUPERVISION


EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS RED VITAL S.A
E.S.P PAIPA

INFORME DE AVANCE 7

MEMORIA DE CANTIDADES CONVENIO MP 011 DE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 3,19	SUMINISTRO. EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO HASTA 5 KM)	M3

REGISTRO Y EVIDENCIA

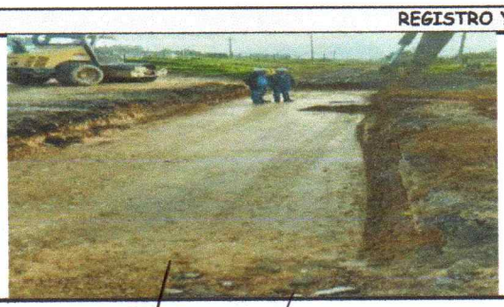

CALCULO DE CANTIDADES Y/O DIMENSIONES

total del tramo

Descripción Especifica	Long	ancho	prof	total
Relleno borde izquierdo del carcamo.	19.00	0.50	0.60	5.70
Relleno borde derecho del carcamo.	19.00	0.50	0.60	5.70
tranversal via de tubo al Pozo	18.00	1.00	0.20	3.60
TOTAL				15.00

Vo Bo CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTORIA

Vo Bo SUPERVISIÓN


EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS RED VITAL S.A
E.S.P PAIPA

INFORME DE AVANCE 7

MEMORIA DE CANTIDADES CONVENIO MP 011 DE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDA
INP 3.20	2.05.58 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=4"	ML

REGISTRO Y EVIDENCIA

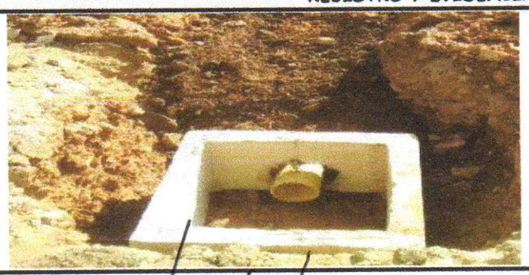

CÁLCULO DE CANTIDADES Y/O

total del tramo

Descripción Especifica	longitu	total
Tuberia de descargue entre cuneta de concreto de caseta y carcamo	3	3.00
TOTAL		3.00

Vo Bo CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTORIA

Vo Bo SUPERVISIÓN

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS RED VITAL S.A
E.S.P PAIPA

INFORME DE AVANCE 7

MEMORIA DE CANTIDADES CONVENIO MP 011 DE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDA
INP 3.21	1.02.03 CAJAS DE INSPECCION DE 1.20 X 1.20 X 1.20 MTS LADRILLO	UN

REGISTRO Y EVIDENCIA



CÁLCULO DE CANTIDADES Y/O

total del tramo

Descripción Especifica	cantida	total
iniciando cárcamo	1.00	1.00
terminando cárcamo	1.00	1.00
TOTAL		2.00

Vo Bo CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTORIA

Vo Bo SUPERVISIÓN

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS RED VITAL S.A
E.S.P PAIPA

INFORME DE AVANCE 7

MEMORIA DE CANTIDADES CONVENIO MP 011 DE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 3,22	3.12.03 TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO)..	M3-KM

REGISTRO Y EVIDENCIA



CÁLCULO DE CANTIDADES Y/O DIMENSIONES

total del tramo

Descripción Especifica	cant	expans	dist	total
material de afirmado	104.28	1.25	25	3258.75
material de subbase	7.20	1.25	25	225.00
material de base	15.00	1.25	25	468.75
TOTAL				3952.50

Vo Bo CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTORIA

Vo Bo SUPERVISIÓN


EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS RED VITAL S.A
E.S.P PAIPA

INFORME DE AVANCE 7

MEMORIA DE CANTIDADES CONVENIO MP 011 DE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDA
INP 3.23	2.05.54 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=12"	ML

REGISTRO Y EVIDENCIA

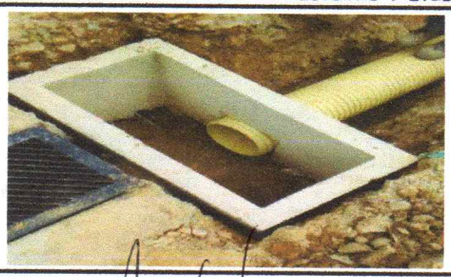

CÁLCULO DE CANTIDADES Y/O

total del tramo

Descripción Especifica	longitu	total
Tuberia descargue del carcamo al box	6.00	6.00
Tuberia entre caja y tubo existente	3.00	3.00
Tuberia transversal via al Pozo	3.00	3.00
TOTAL		12.00

Vo Bo CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTORIA

Vo Bo SUPERVISIÓN

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS RED VITAL S.A E.S.P PAIPA

INFORME DE AVANCE 7

MEMORIA DE CANTIDADES CONVENIO MP 011 DE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
4.20	2.05.57 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=18"	M3

REGISTRO Y EVIDENCIA



CÁLCULO DE CANTIDADES Y/O DIMENSIONES

total del tramo

Descripción Especifica	cantidad	total
Red principal de alcantarillado	126	126.00
TOTAL		126.00

Vo Bo CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTORIA

Vo Bo SUPERVISIÓN

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS RED VITAL S.A E.S.P PAIPA

INFORME DE AVANCE 7

MEMORIA DE CANTIDADES CONVENIO MP 011 DE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 4.4	1.02.17 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3

REGISTRO Y EVIDENCIA



CÁLCULO DE CANTIDADES Y/O DIMENSIONES

total del tramo

Descripción Especifica	Long prom	ancho prom	prof prom	total
Piso y protección de la tubería	75	0.8	1	60.00
TOTAL				60.00

Vo Bo CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTORIA

Vo Bo SUPERVISIÓN

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS RED VITAL S.A E.S.P PAIPA

INFORME DE AVANCE 7

MEMORIA DE CANTIDADES CONVENIO MP 011 DE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 4.5	1.02.17 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3

REGISTRO Y EVIDENCIA



CÁLCULO DE CANTIDADES Y/O DIMENSIONES

total del tramo

Descripción Especifica	Long prom	ancho prom	prof prom	total
Piso y protección de la tubería	51	0.8	1	40.80
TOTAL				40.80

Vo Bo CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTORIA

Vo Bo SUPERVISIÓN

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS RED VITAL S.A E.S.P PAIPA

INFORME DE AVANCE 7

MEMORIA DE CANTIDADES CONVENIO MP 011 DE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 4.6	3.13.36 RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, UMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M3

REGISTRO Y EVIDENCIA



CÁLCULO DE CANTIDADES Y/O DIMENSIONES

total del tramo

Descripción Especifica	Long prom	ancho prom	prof prom	total
Piso y protección de la tubería	126	0.8	0.5	50.40
Área para descontar del tubo	126	0.1256		15.83
TOTAL				34.57

Vo Bo CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTORIA

Vo Bo SUPERVISIÓN


EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS RED VITAL S.A E.S.P PAIPA

INFORME DE AVANCE 7

MEMORIA DE CANTIDADES CONVENIO MP 011 DE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 4.7	3.03.15 RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA	M3

REGISTRO Y EVIDENCIA

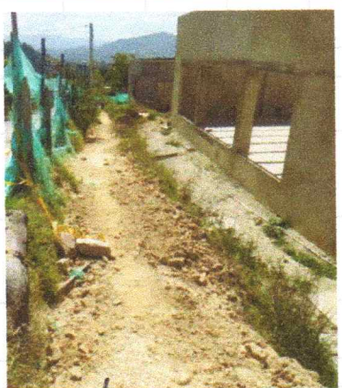

CÁLCULO DE CANTIDADES Y/O DIMENSIONES

total del tramo

Descripción Especifica	Long prom	ancho prom	prof prom	total
Piso y protección de la tubería	126	0.8	0.5	50.40
TOTAL				50.40

Vo Bo CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTORIA

Vo Bo SUPERVISIÓN

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS RED VITAL S.A E.S.P PAIPA

INFORME DE AVANCE 7

MEMORIA DE CANTIDADES CONVENIO MP 011 DE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 4.8	3.12.03 TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO)..	M3-KM

REGISTRO Y EVIDENCIA



CÁLCULO DE CANTIDADES Y/O DIMENSIONES

total del tramo

Descripción Especifica	cantidad	distancia	expansión	total
Transporte material de afirmado	50.40	7	1.25	441.00
TOTAL				441.00

Vo Bo CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTORIA

Vo Bo SUPERVISIÓN

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS RED VITAL S.A E.S.P PAIPA

INFORME DE AVANCE 7

MEMORIA DE CANTIDADES CONVENIO MP 011 DE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 4.9	CAJAS DE INSPECCION MH 1,00 1,50 M	UN

REGISTRO Y EVIDENCIA



CÁLCULO DE CANTIDADES Y/O DIMENSIONES

total del tramo

Descripción Especifica	cantidad	total
cajas construidas	1.00	1.00
TOTAL		1.00

Vo Bo CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTORIA

Vo Bo SUPERVISIÓN

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900259348	5	RED VITAL PAIPA SA E.S.P	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PAIPA COMFABOY	CRA 17A 23A 05	PAIPA-BOYACA	7853051	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	2135698455	9452250651	E	2023/06/13	2023/06/14	BANCOLOMBIA	1	$41,374,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.		Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PAIPA COMFABOY (95 Afiliados)						$157,443,333	$25,351,000			$157,443,333	$6,304,100			$167,094,967	$6,530,100			$157,443,333	$3,140,700		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (95 Afiliados)						$157,443,333	$25,351,000			$157,443,333	$6,304,100			$167,094,967	$6,530,100			$157,443,333	$3,140,700		$0	$0
Ciudad: PAIPA Depto: BOYACA (95 Afiliados)						$157,443,333	$25,351,000			$157,443,333	$6,304,100			$167,094,967	$6,530,100			$157,443,333	$3,140,700		$0	$0
1	CC	1053613405	ABREO JULIANA	231001	27	$2,610,000	$417,600	EPS005	27	$2,610,000	$104,400	CCF10	27	$2,610,000	$104,400	14-23	27	$2,610,000	$13,700	27	$0	$0
2	CC	74323988	ALFONSO JORGE	25-14	30	$1,700,606	$272,100	EPS037	30	$1,700,606	$68,100	CCF10	30	$1,773,355	$71,000	14-23	30	$1,700,606	$41,500	30	$0	$0
3	CC	74130745	ALVARADO ELKIN	230201	2	$106,705	$17,100	EPS005	2	$106,705	$4,300	CCF10	2	$0	$0	14-23	2	$106,705	$0	2	$0	$0
4	CC	74130745	ALVARADO ELKIN	230201	28	$1,400,500	$224,100	EPS005	28	$1,400,500	$56,100	CCF10	28	$1,468,399	$58,800	14-23	28	$1,400,500	$34,200	28	$0	$0
5	CC	52158241	AREVALO MIRYAM	25-14	30	$1,220,399	$195,300	EPS017	30	$1,220,399	$48,900	CCF10	30	$1,293,148	$51,800	14-23	30	$1,220,399	$29,800	30	$0	$0
6	CC	1053605825	ASAKURA ANDREW	230201	30	$2,550,905	$408,200	EPS017	30	$2,550,905	$102,100	CCF10	30	$2,550,905	$102,100	14-23	30	$2,550,905	$62,200	30	$0	$0
7	CC	23857282	AVILA MIREYA	25-14	30	$1,279,930	$204,800	EPS037	30	$1,279,930	$51,200	CCF10	30	$1,352,679	$54,200	14-23	30	$1,279,930	$31,200	30	$0	$0
8	CC	1053608342	BARON MANUEL	231001	30	$1,190,633	$190,600	EPS005	30	$1,190,633	$47,700	CCF10	30	$1,263,382	$50,600	14-23	30	$1,190,633	$29,100	30	$0	$0
9	CC	46681560	BECERRA MARYBEL	25-14	30	$1,461,655	$233,900	EPS005	30	$1,461,655	$58,500	CCF10	30	$1,534,404	$61,400	14-23	30	$1,461,655	$7,700	30	$0	$0
10	CC	74360014	BRIÑEZ JAMIX	231001	30	$1,510,971	$241,800	EPS037	30	$1,510,971	$60,500	CCF10	30	$1,583,720	$63,400	14-23	30	$1,510,971	$65,800	30	$0	$0
11	CC	4117063	CAMARGO JAVIER	25-14	18	$714,380	$114,400	EPS017	18	$714,380	$28,600	CCF10	18	$714,380	$0	14-23	18	$714,380	$0	18	$0	$0
12	CC	4117063	CAMARGO JAVIER	25-14	12	$476,254	$76,300	EPS017	12	$476,254	$19,100	CCF10	12	$2,103,519	$84,200	14-23	12	$476,254	$11,700	12	$0	$0
13	CC	74130567	CAMARGO JAVIER	230201	30	$1,500,535	$240,100	EPS005	30	$1,500,535	$60,100	CCF10	30	$1,573,284	$63,000	14-23	30	$1,500,535	$36,600	30	$0	$0
14	CC	1053612397	CAMARGO JULIETH	25-14	30	$2,550,905	$408,200	EPS017	30	$2,550,905	$102,100	CCF10	30	$2,550,905	$102,100	14-23	30	$2,550,905	$62,200	30	$0	$0
15	CC	4192865	CAMARGO LUIS	25-14	30	$1,500,535	$240,100	EPS017	30	$1,500,535	$60,100	CCF10	30	$1,573,284	$63,000	14-23	30	$1,500,535	$36,600	30	$0	$0
16	CC	74130492	CAMARGO SAUL	230301	8	$317,503	$50,900	EPS037	8	$317,503	$12,800	CCF10	8	$317,503	$0	14-23	8	$317,503	$0	8	$0	$0
17	CC	74130492	CAMARGO SAUL	230301	22	$873,131	$139,800	EPS037	22	$873,131	$35,000	CCF10	22	$2,476,954	$99,100	14-23	22	$873,131	$21,300	22	$0	$0
18	CC	74360447	CAÑADULCE URIEL	230301	11	$550,197	$88,100	EPS037	11	$550,197	$22,100	CCF10	11	$550,197	$0	14-23	11	$550,197	$0	11	$0	$0
19	CC	74360447	CAÑADULCE URIEL	230301	19	$1,150,410	$184,100	EPS037	19	$1,150,410	$46,100	CCF10	19	$1,196,485	$47,900	14-23	19	$1,150,410	$28,100	19	$0	$0
20	CC	4192800	CEPEDA CARLOS	231001	30	$1,349,384	$216,000	EPS017	30	$1,349,384	$54,000	CCF10	30	$1,422,133	$56,900	14-23	30	$1,349,384	$32,900	30	$0	$0
21	CC	1053606736	CHAPARRO LEIDY	230301	30	$1,309,696	$209,600	EPS041	30	$1,309,696	$52,400	CCF10	30	$1,382,445	$55,300	14-23	30	$1,309,696	$32,000	30	$0	$0
22	CC	74130511	CIPAGAUTA BERNARDO	230201	30	$1,270,009	$203,300	EPS017	30	$1,270,009	$50,900	CCF10	30	$1,342,758	$53,800	14-23	30	$1,270,009	$31,000	30	$0	$0
23	CC	46681864	CONTRERAS OLGA	230301	30	$1,279,930	$204,800	EPS017	30	$1,279,930	$51,200	CCF10	30	$1,352,679	$54,200	14-23	30	$1,279,930	$6,700	30	$0	$0
24	CC	1053606061	CORCHUELO LUDY	230201	30	$4,654,777	$791,400	EPS017	30	$4,654,777	$186,200	CCF10	30	$4,654,777	$186,200	14-23	30	$4,654,777	$113,400	30	$0	$0
25	CC	74322792	CURREA TITO	25-14	30	$6,121,038	$1,040,800	EPS005	30	$6,121,038	$244,900	CCF10	30	$6,121,038	$244,900	14-23	30	$6,121,038	$149,200	30	$0	$0
26	CC	1053604596	DIAZ SANDRA	25-14	30	$1,279,930	$204,800	EPS017	30	$1,279,930	$51,200	CCF10	30	$1,352,679	$54,200	14-23	30	$1,279,930	$31,200	30	$0	$0
27	CC	46681148	DUEÑEZ MAYERLINE	230301	30	$1,461,655	$233,900	EPS017	30	$1,461,655	$58,500	CCF10	30	$1,534,404	$61,400	14-23	30	$1,461,655	$7,700	30	$0	$0
28	CC	1049608486	ECHEVERRIA VICTOR	230201	30	$1,656,048	$265,000	CCFC55	30	$1,656,048	$66,300	CCF10	30	$1,728,797	$69,200	14-23	30	$1,656,048	$40,400	30	$0	$0
29	CC	1053608473	ESPEJO CARLOS	230201	30	$3,016,000	$482,600	EPS037	30	$3,016,000	$120,700	CCF10	30	$3,016,000	$120,700	14-23	30	$3,016,000	$15,800	30	$0	$0
30	CC	74359604	ESPEJO VICTOR	230301	30	$1,349,384	$216,000	EPS017	30	$1,349,384	$54,000	CCF10	30	$1,422,133	$56,900	14-23	30	$1,349,384	$32,900	30	$0	$0
31	CC	1053611961	ESPEJO YEISON	230301	30	$1,349,384	$216,000	EPS017	30	$1,349,384	$54,000	CCF10	30	$1,422,133	$56,900	14-23	30	$1,349,384	$32,900	30	$0	$0
32	CC	1053607571	FLOREZ DIEGO	230201	30	$1,500,535	$240,100	EPS017	30	$1,500,535	$60,100	CCF10	30	$1,573,284	$63,000	14-23	30	$1,500,535	$36,600	30	$0	$0
33	CC	74323433	FONSECA JORGE	230201	30	$1,961,786	$313,900	EPS017	30	$1,961,786	$78,500	CCF10	30	$2,034,535	$81,400	14-23	30	$1,961,786	$85,400	30	$0	$0
34	CC	1053607522	FORERO DIEGO	230201	30	$2,550,905	$408,200	EPS041	30	$2,550,905	$102,100	CCF10	30	$2,550,905	$102,100	14-23	30	$2,550,905	$13,400	30	$0	$0
35	CC	39662885	GACHA MARTHA	25-14	30	$1,309,696	$209,600	EPS017	30	$1,309,696	$52,400	CCF10	30	$1,382,445	$55,300	14-23	30	$1,309,696	$32,000	30	$0	$0
36	CC	30352577	GARCIA FANY	231001	5	$193,334	$31,000	EPS017	5	$193,334	$7,800	CCF10	5	$0	$0	14-23	5	$193,334	$0	5	$0	$0
37	CC	30352577	GARCIA FANY	231001	25	$992,195	$158,800	EPS017	25	$992,195	$39,700	CCF10	25	$1,052,819	$42,200	14-23	25	$992,195	$24,200	25	$0	$0
38	CC	1053604772	GARZON CAMILO	230201	30	$1,500,535	$240,100	EPS017	30	$1,500,535	$60,100	CCF10	30	$1,573,284	$63,000	14-23	30	$1,500,535	$36,600	30	$0	$0

en línea

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
39	CC	46680595	GOMEZ YENNY	231001	30	$1,279,930	$204,800	EPS017	30	$1,279,930	$51,200	CCF10	30	$1,352,679	$54,200	14-23	30	$1,279,930	$31,200	30	$0	$0
40	CC	74130530	GONZALEZ WILDER	230301	14	$555,629	$89,000	EPS017	14	$555,629	$22,300	CCF10	14	$555,629	$0	14-23	14	$555,629	$0	14	$0	$0
41	CC	74130530	GONZALEZ WILDER	230301	16	$714,380	$114,400	EPS017	16	$714,380	$28,600	CCF10	16	$753,180	$30,200	14-23	16	$714,380	$17,500	16	$0	$0
42	CC	51684052	GRANADOS FLOR	231001	16	$635,005	$101,700	EPS017	16	$635,005	$25,500	CCF10	16	$635,005	$0	14-23	16	$635,005	$0	16	$0	$0
43	CC	51684052	GRANADOS FLOR	231001	14	$555,629	$89,000	EPS017	14	$555,629	$22,300	CCF10	14	$2,188,504	$87,600	14-23	14	$555,629	$13,600	14	$0	$0
44	CC	1053613608	GRANADOS JIMMY	230201	30	$1,500,535	$240,100	EPS017	30	$1,500,535	$60,100	CCF10	30	$1,573,284	$63,000	14-23	30	$1,500,535	$36,600	30	$0	$0
45	CC	40019727	HERNANDEZ MARIA	231001	30	$1,190,633	$190,600	EPS017	30	$1,190,633	$47,700	CCF10	30	$1,263,382	$50,600	14-23	30	$1,190,633	$29,100	30	$0	$0
46	CC	23856706	HIGUERA NUBIA	230301	30	$1,190,633	$190,600	EPS017	30	$1,190,633	$47,700	CCF10	30	$1,263,382	$50,600	14-23	30	$1,190,633	$29,100	30	$0	$0
47	CC	1053610783	HURTADO WILMER	230301	30	$1,270,009	$203,300	EPS017	30	$1,270,009	$50,900	CCF10	30	$1,342,758	$53,800	14-23	30	$1,270,009	$31,000	30	$0	$0
48	CC	46683315	JIMENEZ LUZ	230301	30	$1,309,696	$209,600	EPS037	30	$1,309,696	$52,400	CCF10	30	$1,382,445	$55,300	14-23	30	$1,309,696	$32,000	30	$0	$0
49	CC	24069673	JIMENEZ MARIA	25-14	30	$1,190,633	$190,600	EPS017	30	$1,190,633	$47,700	CCF10	30	$1,263,382	$50,600	14-23	30	$1,190,633	$29,100	30	$0	$0
50	CC	1053615233	LA ROTTA PEDRO	25-14	2	$170,061	$27,300	EPS017	2	$170,061	$6,900	CCF10	2	$0	$0	14-23	2	$170,061	$0	2	$0	$0
51	CC	1053615233	LA ROTTA PEDRO	25-14	28	$2,380,845	$381,000	EPS017	28	$2,380,845	$95,300	CCF10	28	$2,380,845	$95,300	14-23	28	$2,380,845	$58,000	28	$0	$0
52	CC	16458219	LANDAZURI DANIEL	230201	30	$1,270,009	$203,300	EPS005	30	$1,270,009	$50,900	CCF10	30	$1,342,758	$53,800	14-23	30	$1,270,009	$31,000	30	$0	$0
53	CC	74322520	LARA LUIS	230301	30	$1,500,535	$240,100	EPS005	30	$1,500,535	$60,100	CCF10	30	$1,573,284	$63,000	14-23	30	$1,500,535	$36,600	30	$0	$0
54	CC	89004430	LOPEZ ALITH	230201	30	$2,550,905	$408,200	EPS017	30	$2,550,905	$102,100	CCF10	30	$2,550,905	$102,100	14-23	30	$2,550,905	$62,200	30	$0	$0
55	CC	40395482	LOPEZ ROSALBA	230201	30	$1,279,930	$204,800	EPS037	30	$1,279,930	$51,200	CCF10	30	$1,352,679	$54,200	14-23	30	$1,279,930	$31,200	30	$0	$0
56	CC	1051588795	MACHUCA JOHNN	25-14	30	$1,688,038	$270,100	EPS017	30	$1,688,038	$67,600	CCF10	30	$1,760,787	$70,500	14-23	30	$1,688,038	$73,500	30	$0	$0
57	CC	74373225	MALAVER HECTOR	25-14	30	$1,775,633	$284,200	EPS005	30	$1,775,633	$71,100	CCF10	30	$1,848,382	$74,000	14-23	30	$1,775,633	$43,300	30	$0	$0
58	CC	73120570	MATEUS CESAR	25-14	30	$1,500,535	$240,100	EPS005	30	$1,500,535	$60,100	CCF10	30	$1,573,284	$63,000	14-23	30	$1,500,535	$36,600	30	$0	$0
59	CC	1053614130	MONROY BENJAMIN	230301	30	$1,190,633	$190,600	EPS037	30	$1,190,633	$47,700	CCF10	30	$1,263,382	$50,600	14-23	30	$1,190,633	$6,300	30	$0	$0
60	CC	4192455	MONROY EDILBERTO	25-14	30	$1,190,633	$190,600	EPS041	30	$1,190,633	$47,700	CCF10	30	$1,263,382	$50,600	14-23	30	$1,190,633	$29,100	30	$0	$0
61	CC	4192776	MONROY HERNANDO	230201	30	$1,600,571	$256,100	EPS017	30	$1,600,571	$64,100	CCF10	30	$1,673,320	$67,000	14-23	30	$1,600,571	$39,000	30	$0	$0
62	CC	1053606329	MONROY PAOLA	230201	30	$1,461,655	$233,900	EPS005	30	$1,461,655	$58,500	CCF10	30	$1,534,404	$61,400	14-23	30	$1,461,655	$7,700	30	$0	$0
63	CC	1053605548	MORALES JESSICA	25-14	30	$2,714,717	$434,400	EPS005	30	$2,714,717	$108,600	CCF10	30	$2,714,717	$108,600	14-23	30	$2,714,717	$14,200	30	$0	$0
64	CC	1053609837	OCHOA JAVIER	230201	6	$283,307	$45,400	EPS017	6	$283,307	$11,400	CCF10	6	$283,307	$0	14-23	6	$283,307	$0	6	$0	$0
65	CC	1053609837	OCHOA JAVIER	230201	24	$1,133,228	$181,400	EPS017	24	$1,133,228	$45,400	CCF10	24	$1,191,428	$47,700	14-23	24	$1,133,228	$49,300	24	$0	$0
66	CC	1002538428	OCHOA MARIA	25-14	30	$1,461,655	$233,900	EPS017	30	$1,461,655	$58,500	CCF10	30	$1,534,404	$61,400	14-23	30	$1,461,655	$7,700	30	$0	$0
67	CC	4191851	OCHOA RODRIGO	25-14	30	$4,654,777	$791,400	EPS017	30	$4,654,777	$186,200	CCF10	30	$4,654,777	$186,200	14-23	30	$4,654,777	$24,300	30	$0	$0
68	CC	1053615891	OCHOA WILFREDY	230201	30	$1,500,535	$240,100	EPS037	30	$1,500,535	$60,100	CCF10	30	$1,573,284	$63,000	14-23	30	$1,500,535	$36,600	30	$0	$0
69	CC	93124198	ORJUELA JOSE	25-14	8	$317,503	$50,900	EPS017	8	$317,503	$12,800	CCF10	8	$317,503	$0	14-23	8	$317,503	$0	8	$0	$0
70	CC	93124198	ORJUELA JOSE	25-14	22	$873,131	$139,800	EPS017	22	$873,131	$35,000	CCF10	22	$2,476,954	$99,100	14-23	22	$873,131	$21,300	22	$0	$0
71	CC	46680659	PACHECO GLADYS	25-14	30	$1,461,655	$233,900	EPS005	30	$1,461,655	$58,500	CCF10	30	$1,534,404	$61,400	14-23	30	$1,461,655	$7,700	30	$0	$0
72	CC	60423066	PARRA BRIGIDA	230301	30	$1,279,930	$204,800	EPS017	30	$1,279,930	$51,200	CCF10	30	$1,352,679	$54,200	14-23	30	$1,279,930	$31,200	30	$0	$0
73	CC	46683468	PATARROYO ALICIA	230201	30	$1,279,930	$204,800	EPS017	30	$1,279,930	$51,200	CCF10	30	$1,352,679	$54,200	14-23	30	$1,279,930	$31,200	30	$0	$0
74	CC	74333939	PEREZ MARCO	230301	30	$1,500,535	$240,100	EPS037	30	$1,500,535	$60,100	CCF10	30	$1,573,284	$63,000	14-23	30	$1,500,535	$36,600	30	$0	$0
75	CC	4192439	PEREZ SANTIAGO	230301	30	$1,190,633	$190,600	ESSC24	30	$1,190,633	$47,700	CCF10	30	$1,263,382	$50,600	14-23	30	$1,190,633	$6,300	30	$0	$0
76	CC	35503777	PIRABAN FLOR	231001	25	$966,667	$154,700	EPS017	25	$966,667	$38,700	CCF10	25	$0	$0	14-23	25	$966,667	$0	25	$0	$0
77	CC	35503777	PIRABAN FLOR	231001	5	$193,334	$31,000	EPS017	5	$193,334	$7,800	CCF10	5	$0	$0	14-23	5	$193,334	$0	5	$0	$0
78	CC	4192111	RACHE JORGE	231001	30	$1,222,928	$195,700	EPS017	30	$1,222,928	$49,000	CCF10	30	$1,295,677	$51,900	14-23	30	$1,222,928	$29,800	30	$0	$0
79	CC	74360518	RACHE JOSE	230301	30	$1,190,633	$190,600	EPS041	30	$1,190,633	$47,700	CCF10	30	$1,263,382	$50,600	14-23	30	$1,190,633	$6,300	30	$0	$0
80	CC	1053612002	RAMIREZ YENNY	230201	30	$2,682,136	$429,200	EPS017	30	$2,682,136	$107,300	CCF10	30	$2,682,136	$107,300	14-23	30	$2,682,136	$14,100	30	$0	$0
81	CC	1053609802	RICO LINA	25-14	30	$2,714,717	$434,400	EPS017	30	$2,714,717	$108,600	CCF10	30	$2,714,717	$108,600	14-23	30	$2,714,717	$14,200	30	$0	$0
82	CC	1053613345	RODRIGUEZ DUVAN	230301	30	$1,700,606	$272,100	EPS017	30	$1,700,606	$68,100	CCF10	30	$1,773,355	$71,000	14-23	30	$1,700,606	$41,500	30	$0	$0
83	CC	1053615468	RODRIGUEZ DUVAN	230201	30	$1,500,535	$240,100	EPS037	30	$1,500,535	$60,100	CCF10	30	$1,573,284	$63,000	14-23	30	$1,500,535	$36,600	30	$0	$0
84	CC	7219471	RODRIGUEZ JULIO	25-14	30	$1,500,535	$240,100	EPS037	30	$1,500,535	$60,100	CCF10	30	$1,573,284	$63,000	14-23	30	$1,500,535	$36,600	30	$0	$0
85	CC	74322563	RODRIGUEZ PEDRO	230201	23	$896,855	$143,500	EPS037	23	$896,855	$35,900	CCF10	23	$0	$0	14-23	23	$896,855	$0	23	$0	$0
86	CC	74322563	RODRIGUEZ PEDRO	230201	7	$285,350	$45,700	EPS037	7	$285,350	$11,500	CCF10	7	$302,325	$12,100	14-23	7	$285,350	$7,000	7	$0	$0
87	CC	1053605397	ROJAS MARIO	231001	30	$1,605,406	$256,900	EPS017	30	$1,605,406	$64,300	CCF10	30	$1,678,155	$67,200	14-23	30	$1,605,406	$69,900	30	$0	$0
88	CC	74322163	ROMERO JAIME	25-14	30	$1,190,633	$190,600	EPS037	30	$1,190,633	$47,700	CCF10	30	$1,263,382	$50,600	14-23	30	$1,190,633	$29,100	30	$0	$0

en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
89	CC	1053604922	ROSAS JORGE	230301	10	$386,667	$61,900	EPS017	10	$386,667	$15,500	CCF10	10	$0	$0	14-23	10	$386,667	$0	10	$0	$0
90	CC	1053604922	ROSAS JORGE	230301	11	$425,334	$68,100	EPS017	11	$425,334	$17,100	CCF10	11	$0	$0	14-23	11	$425,334	$0	11	$0	$0
91	CC	1053604922	ROSAS JORGE	230301	9	$348,000	$55,700	EPS017	9	$348,000	$14,000	CCF10	9	$0	$0	14-23	9	$348,000	$0	9	$0	$0
92	CC	8731958	ROSAS SANTOS	230301	30	$1,605,406	$256,900	EPS005	30	$1,605,406	$64,300	CCF10	30	$1,678,155	$67,200	14-23	30	$1,605,406	$69,900	30	$0	$0
93	CC	74323801	RUIZ JOSE	25-14	30	$1,600,571	$256,100	EPS037	30	$1,600,571	$64,100	CCF10	30	$1,673,320	$67,000	14-23	30	$1,600,571	$39,000	30	$0	$0
94	CC	1053604273	RUIZ SANDRA	230201	30	$1,575,562	$252,100	EPS017	30	$1,575,562	$63,100	CCF10	30	$1,648,311	$66,000	14-23	30	$1,575,562	$38,400	30	$0	$0
95	CC	74324119	SALAMANCA GABRIEL	25-14	30	$1,500,535	$240,100	EPS017	30	$1,500,535	$60,100	CCF10	30	$1,573,284	$63,000	14-23	30	$1,500,535	$36,600	30	$0	$0
96	CC	4129932	SALAS VICTOR	230301	30	$1,222,928	$195,700	EPS017	30	$1,222,928	$49,000	CCF10	30	$1,295,677	$51,900	14-23	30	$1,222,928	$29,800	30	$0	$0
97	CC	74322662	SALAZAR HERNAN	230301	30	$1,222,928	$195,700	EPS017	30	$1,222,928	$49,000	CCF10	30	$1,295,677	$51,900	14-23	30	$1,222,928	$29,800	30	$0	$0
98	CC	46683220	SALCEDO NINI	230201	30	$1,309,696	$209,600	EPS041	30	$1,309,696	$52,400	CCF10	30	$1,382,445	$55,300	14-23	30	$1,309,696	$32,000	30	$0	$0
99	CC	74323507	SANA MIGUEL	25-14	30	$1,600,571	$256,100	EPS008	30	$1,600,571	$64,100	CCF10	30	$1,673,320	$67,000	14-23	30	$1,600,571	$39,000	30	$0	$0
100	CC	74322535	SANCHEZ HECTOR	25-14	30	$1,190,633	$190,600	EPS017	30	$1,190,633	$47,700	CCF10	30	$1,263,382	$50,600	14-23	30	$1,190,633	$29,100	30	$0	$0
101	CC	74130153	SUAREZ JOSE	230301	30	$1,349,384	$216,000	EPS037	30	$1,349,384	$54,000	CCF10	30	$1,422,133	$56,900	14-23	30	$1,349,384	$7,100	30	$0	$0
102	CC	1053610862	TIBATA YOVANY	231001	30	$1,600,571	$256,100	EPS017	30	$1,600,571	$64,100	CCF10	30	$1,673,320	$67,000	14-23	30	$1,600,571	$39,000	30	$0	$0
103	CC	1053613769	URIBE EDWIN	230301	30	$1,800,642	$288,200	EPS017	30	$1,800,642	$72,100	CCF10	30	$1,873,391	$75,000	14-23	30	$1,800,642	$43,900	30	$0	$0
104	CC	74359861	VALDERRAMA CARLOS	230201	30	$1,500,535	$240,100	EPS005	30	$1,500,535	$60,100	CCF10	30	$1,573,284	$63,000	14-23	30	$1,500,535	$36,600	30	$0	$0
105	CC	7226057	VALDERRAMA JOSE	230201	30	$1,190,633	$190,600	EPS008	30	$1,190,633	$47,700	CCF10	30	$1,263,382	$50,600	14-23	30	$1,190,633	$6,300	30	$0	$0
106	CC	23856977	VALDERRAMA MARIA	230301	30	$2,714,717	$434,400	EPS017	30	$2,714,717	$108,600	CCF10	30	$2,714,717	$108,600	14-23	30	$2,714,717	$66,200	30	$0	$0
107	CC	74322488	VARGAS JOSE	25-14	30	$1,500,535	$240,100	EPS008	30	$1,500,535	$60,100	CCF10	30	$1,573,284	$63,000	14-23	30	$1,500,535	$36,600	30	$0	$0
108	CC	1053614462	VARGAS MAICOL	230201	15	$595,317	$95,300	EPS037	15	$595,317	$23,900	CCF10	15	$595,317	$0	14-23	15	$595,317	$0	15	$0	$0
109	CC	1053614462	VARGAS MAICOL	230201	15	$674,692	$108,000	EPS037	15	$674,692	$27,000	CCF10	15	$2,309,992	$92,400	14-23	15	$674,692	$3,600	15	$0	$0
110	CC	74359989	VASQUEZ ANGEL	230301	30	$1,500,535	$240,100	EPS005	30	$1,500,535	$60,100	CCF10	30	$1,573,284	$63,000	14-23	30	$1,500,535	$36,600	30	$0	$0
Total	**Afiliados(95)**					**$157,443,333**	**$25,351,000**			**$157,443,333**	**$6,304,100**			**$167,094,967**	**$6,530,100**			**$157,443,333**	**$3,140,700**		**$0**	**$0**

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900259348	5	RED VITAL PAIPA SA E.S.P	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PAIPA COMFABOY	CRA 17A 23A 05	PAIPA-BOYACA	7853051	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	2135698455	9452250651	E	2023/06/13	2023/06/14	BANCOLOMBIA	1	$41,374,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				95	$25,351,000	$29,900	$0	$25,380,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	12	$2,736,300	$3,200	$0	$2,739,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	29	$8,716,600	$10,300	$0	$8,726,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	26	$5,891,700	$6,900	$0	$5,898,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	28	$8,006,400	$9,500	$0	$8,015,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				95	$3,140,700	$3,700	$0	$3,144,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	95	$3,140,700	$3,700	$0	$3,144,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				95	$6,530,100	$7,700	$0	$6,537,800
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	95	$6,530,100	$7,700	$0	$6,537,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				95	$6,304,100	$7,700	$0	$6,311,800
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$66,300	$100	$0	$66,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$171,900	$300	$0	$172,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$47,700	$100	$0	$47,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	51	$3,415,300	$4,000	$0	$3,419,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	18	$1,072,300	$1,300	$0	$1,073,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	$302,300	$400	$0	$302,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	16	$1,228,300	$1,500	$0	$1,229,800
TOTAL				95	$41,325,900	$49,000	$0	$41,374,900

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900259348	5	RED VITAL PAIPA SA E.S.P	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PAIPA COMFABOY	CRA 17A 23A 05	PAIPA-BOYACA	7853051	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	43595383	9453507434	E	2023/07/13	2023/07/13	BANCOLOMBIA	0	$47,126,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PAIPA COMFABOY (100 Afiliados)						$158,912,319	$25,587,100			$160,072,319	$6,855,600			$271,106,065	$10,595,500			$160,072,319	$3,094,800		$19,868,126	$993,700
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (100 Afiliados)						$158,912,319	$25,587,100			$160,072,319	$6,855,600			$271,106,065	$10,595,500			$160,072,319	$3,094,800		$19,868,126	$993,700
Ciudad: PAIPA Depto: BOYACA (100 Afiliados)						$158,912,319	$25,587,100			$160,072,319	$6,855,600			$271,106,065	$10,595,500			$160,072,319	$3,094,800		$19,868,126	$993,700
1	CC	1053613405	ABREO JULIANA	230301	30	$2,900,000	$464,000	EPS005	30	$2,900,000	$116,000	CCF10	30	$3,129,584	$125,200	14-23	30	$2,900,000	$15,200	30	$0	$0
2	CC	74323988	ALFONSO JORGE	25-14	16	$800,286	$128,100	EPS037	16	$800,286	$32,100	CCF10	16	$800,286	$0	14-23	16	$800,286	$0	16	$0	$0
3	CC	74323988	ALFONSO JORGE	25-14	14	$800,286	$128,100	EPS037	14	$800,286	$32,100	CCF10	14	$3,797,239	$151,900	14-23	14	$800,286	$19,500	14	$0	$0
4	CC	74130745	ALVARADO ELKIN	230201	30	$1,700,606	$272,100	EPS005	30	$1,700,606	$68,100	CCF10	30	$2,646,254	$105,900	14-23	30	$1,700,606	$41,500	30	$0	$0
5	CC	52158241	AREVALO MIRYAM	25-14	30	$1,190,633	$190,600	EPS017	30	$1,190,633	$47,700	CCF10	30	$1,981,330	$79,300	14-23	30	$1,190,633	$29,100	30	$0	$0
6	CC	1053605825	ASAKURA ANDREW	230201	30	$2,550,905	$408,200	EPS017	30	$2,550,905	$102,100	CCF10	30	$3,826,358	$153,100	14-23	30	$2,550,905	$62,200	30	$0	$0
7	CC	23857282	AVILA MIREYA	25-14	30	$1,250,165	$200,100	EPS037	30	$1,250,165	$50,100	CCF10	30	$2,040,862	$81,700	14-23	30	$1,250,165	$30,500	30	$0	$0
8	CC	1053608342	BARON MANUEL	231001	30	$1,349,384	$216,000	EPS005	30	$1,349,384	$54,000	CCF10	30	$1,778,566	$71,200	14-23	30	$1,349,384	$32,900	30	$0	$0
9	CC	46681560	BECERRA MARYBEL	25-14	30	$1,461,655	$233,900	EPS005	30	$1,461,655	$58,500	CCF10	30	$2,387,863	$95,600	14-23	30	$1,461,655	$7,700	30	$0	$0
10	CC	74360014	BRIÑEZ JAMIX	231001	30	$1,605,406	$256,900	EPS037	30	$1,605,406	$64,300	CCF10	30	$2,509,054	$100,400	14-23	30	$1,605,406	$69,900	30	$0	$0
11	CC	4117063	CAMARGO JAVIER	25-14	30	$1,190,633	$190,600	EPS017	30	$1,190,633	$47,700	CCF10	30	$1,981,330	$79,300	14-23	30	$1,190,633	$29,100	30	$0	$0
12	CC	74130567	CAMARGO JAVIER	230201	30	$1,600,571	$256,100	EPS005	30	$1,600,571	$64,100	CCF10	30	$2,546,219	$101,900	14-23	30	$1,600,571	$39,000	30	$0	$0
13	CC	1053612397	CAMARGO JULIETH	25-14	30	$2,550,905	$408,200	EPS017	30	$2,550,905	$102,100	CCF10	30	$3,082,344	$123,300	14-23	30	$2,550,905	$62,200	30	$0	$0
14	CC	4192865	CAMARGO LUIS	25-14	30	$1,600,571	$256,100	EPS017	30	$1,600,571	$64,100	CCF10	30	$2,546,219	$101,900	14-23	30	$1,600,571	$39,000	30	$0	$0
15	CC	74130492	CAMARGO SAUL	230301	8	$317,503	$50,900	EPS037	8	$317,503	$12,800	CCF10	8	$317,503	$0	14-23	8	$317,503	$0	8	$0	$0
16	CC	74130492	CAMARGO SAUL	230301	22	$873,131	$139,800	EPS037	22	$873,131	$35,000	CCF10	22	$1,641,592	$65,700	14-23	22	$873,131	$21,300	22	$0	$0
17	CC	74360447	CAÑADULCE URIEL	230301	30	$1,500,535	$240,100	EPS037	30	$1,500,535	$60,100	CCF10	30	$2,446,183	$97,900	14-23	30	$1,500,535	$36,600	30	$0	$0
18	CC	4192800	CEPEDA CARLOS	231001	30	$1,270,009	$203,300	EPS017	30	$1,270,009	$50,900	CCF10	30	$2,060,706	$82,500	14-23	30	$1,270,009	$31,000	30	$0	$0
19	CC	1053613469	CHAPARRO JUAN	25-14	3	$255,091	$40,900	EPS002	3	$255,091	$10,300	CCF10	3	$255,090	$10,300	14-23	3	$255,091	$1,400	3	$0	$0
20	CC	1053606736	CHAPARRO LEIDY	230301	30	$1,339,462	$214,400	EPS041	30	$1,339,462	$53,600	CCF10	30	$1,768,644	$70,800	14-23	30	$1,339,462	$32,700	30	$0	$0
21	CC	74130511	CIPAGAUTA BERNARDO	230201	30	$1,349,384	$216,000	EPS017	30	$1,349,384	$54,000	CCF10	30	$2,140,081	$85,700	14-23	30	$1,349,384	$32,900	30	$0	$0
22	CC	46681864	CONTRERAS OLGA	230301	30	$1,250,165	$200,100	EPS017	30	$1,250,165	$50,100	CCF10	30	$2,040,862	$81,700	14-23	30	$1,250,165	$6,600	30	$0	$0
23	CC	1053606061	CORCHUELO LUDY	230201	30	$4,654,777	$791,400	EPS017	30	$4,654,777	$186,200	CCF10	30	$6,594,268	$263,800	14-23	30	$4,654,777	$113,400	30	$0	$0
24	CC	74322792	CURREA TITO	25-14	30	$6,121,038	$1,040,800	EPS005	30	$6,121,038	$244,900	CCF10	30	$8,186,889	$327,500	14-23	30	$6,121,038	$149,200	30	$0	$0
25	CC	1053604596	DIAZ SANDRA	25-14	30	$1,279,930	$204,800	EPS017	30	$1,279,930	$51,200	CCF10	30	$1,709,112	$68,400	14-23	30	$1,279,930	$31,200	30	$0	$0
26	CC	46681148	DUEÑEZ MAYERLINE	230301	30	$1,461,655	$233,900	EPS017	30	$1,461,655	$58,500	CCF10	30	$2,387,863	$95,600	14-23	30	$1,461,655	$7,700	30	$0	$0
27	CC	1049608486	ECHEVERRIA VICTOR	230201	30	$1,630,571	$260,900	EPS005	30	$1,630,571	$65,300	CCF10	30	$2,437,416	$97,500	14-23	30	$1,630,571	$39,800	30	$0	$0
28	CC	1053608473	ESPEJO CARLOS	230201	21	$2,111,200	$337,800	EPS037	21	$2,111,200	$84,500	CCF10	21	$3,469,197	$138,800	14-23	21	$2,111,200	$11,100	21	$0	$0
29	CC	1053606149	ESPEJO ELKIN	230301	29	$2,465,875	$394,600	EPS017	29	$2,465,875	$98,700	CCF10	29	$2,568,620	$102,800	14-23	29	$2,465,875	$12,900	29	$0	$0
30	CC	74359604	ESPEJO VICTOR	230301	3	$119,064	$19,100	EPS017	3	$119,064	$4,800	CCF10	3	$0	$0	14-23	3	$119,064	$0	3	$0	$0
31	CC	74359604	ESPEJO VICTOR	230301	27	$1,230,321	$196,900	EPS017	27	$1,230,321	$49,300	CCF10	27	$3,633,603	$145,400	14-23	27	$1,230,321	$30,000	27	$0	$0
32	CC	1053611961	ESPEJO YEISON	230301	30	$1,349,384	$216,000	EPS017	30	$1,349,384	$54,000	CCF10	30	$2,140,081	$85,700	14-23	30	$1,349,384	$32,900	30	$0	$0
33	CC	1053607571	FLOREZ DIEGO	230201	30	$1,600,571	$256,100	EPS017	30	$1,600,571	$64,100	CCF10	30	$2,546,219	$101,900	14-23	30	$1,600,571	$39,000	30	$0	$0
34	CC	74323433	FONSECA JORGE	230201	30	$2,005,061	$320,900	EPS017	30	$2,005,061	$80,300	CCF10	30	$3,065,936	$122,700	14-23	30	$2,005,061	$87,300	30	$0	$0
35	CC	1053607522	FORERO DIEGO	230201	21	$1,785,634	$285,800	EPS041	21	$1,785,634	$223,300	CCF10	21	$10,460,335	$418,500	14-23	21	$1,785,634	$9,400	21	$10,460,335	$523,200
36	CC	39662885	GACHA MARTHA	25-14	30	$1,279,930	$204,800	EPS017	30	$1,279,930	$51,200	CCF10	30	$2,070,627	$82,900	14-23	30	$1,279,930	$31,200	30	$0	$0
37	CC	30352577	GARCIA FANY	231001	30	$1,190,633	$190,600	EPS017	30	$1,190,633	$47,700	CCF10	30	$1,981,330	$79,300	14-23	30	$1,190,633	$29,100	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
38	CC	1053604772	GARZON CAMILO	230201	7	$350,125	$56,100	EPS017	7	$350,125	$14,100	CCF10	7	$350,125	$0	14-23	7	$350,125	$0	7	$0	$0
39	CC	1053604772	GARZON CAMILO	230201	23	$1,150,411	$184,100	EPS017	23	$1,150,411	$46,100	CCF10	23	$4,112,500	$164,500	14-23	23	$1,150,411	$28,100	23	$0	$0
40	CC	46680595	GOMEZ YENNY	231001	30	$1,250,165	$200,100	EPS017	30	$1,250,165	$50,100	CCF10	30	$2,040,862	$81,700	14-23	30	$1,250,165	$30,500	30	$0	$0
41	CC	74130530	GONZALEZ WILDER	230301	30	$1,190,633	$190,600	EPS017	30	$1,190,633	$47,700	CCF10	30	$1,981,330	$79,300	14-23	30	$1,190,633	$29,100	30	$0	$0
42	CC	51684052	GRANADOS FLOR	231001	1	$39,688	$6,400	EPS017	1	$39,688	$1,600	CCF10	1	$39,688	$0	14-23	1	$39,688	$0	1	$0	$0
43	CC	51684052	GRANADOS FLOR	231001	29	$1,150,946	$184,200	EPS017	29	$1,150,946	$46,100	CCF10	29	$1,938,863	$77,600	14-23	29	$1,150,946	$28,100	29	$0	$0
44	CC	1053613608	GRANADOS JIMMY	230201	30	$1,700,606	$272,100	EPS017	30	$1,700,606	$68,100	CCF10	30	$2,646,254	$105,900	14-23	30	$1,700,606	$41,500	30	$0	$0
45	CC	40019727	HERNANDEZ MARIA	231001	30	$1,190,633	$190,600	EPS017	30	$1,190,633	$47,700	CCF10	30	$1,981,330	$79,300	14-23	30	$1,190,633	$29,100	30	$0	$0
46	CC	23856706	HIGUERA NUBIA	230301	30	$1,190,633	$190,600	EPS017	30	$1,190,633	$47,700	CCF10	30	$1,981,330	$79,300	14-23	30	$1,190,633	$29,100	30	$0	$0
47	CC	1053610783	HURTADO WILMER	230301	30	$1,349,384	$216,000	EPS017	30	$1,349,384	$54,000	CCF10	30	$1,778,566	$71,200	14-23	30	$1,349,384	$32,900	30	$0	$0
48	CC	46683315	JIMENEZ LUZ	230301	30	$1,279,930	$204,800	EPS037	30	$1,279,930	$51,200	CCF10	30	$2,070,627	$82,900	14-23	30	$1,279,930	$31,200	30	$0	$0
49	CC	24069673	JIMENEZ MARIA	25-14	16	$635,005	$101,700	EPS017	16	$635,005	$25,500	CCF10	16	$635,005	$0	14-23	16	$635,005	$0	16	$0	$0
50	CC	24069673	JIMENEZ MARIA	25-14	14	$555,629	$89,000	EPS017	14	$555,629	$22,300	CCF10	14	$3,021,015	$120,900	14-23	14	$555,629	$13,600	14	$0	$0
51	CC	1053615233	LA ROTTA PEDRO	25-14	27	$2,295,815	$367,400	EPS017	27	$2,295,815	$287,000	CCF10	27	$9,407,791	$376,400	14-23	27	$2,295,815	$56,000	27	$9,407,791	$470,500
52	CC	16458219	LANDAZURI DANIEL	230201	16	$635,005	$101,700	EPS005	16	$635,005	$25,500	CCF10	16	$635,005	$0	14-23	16	$635,005	$0	16	$0	$0
53	CC	16458219	LANDAZURI DANIEL	230201	14	$555,629	$89,000	EPS005	14	$555,629	$22,300	CCF10	14	$3,021,015	$120,900	14-23	14	$555,629	$13,600	14	$0	$0
54	CC	74322520	LARA LUIS	230301	30	$1,500,535	$240,100	EPS005	30	$1,500,535	$60,100	CCF10	30	$2,446,183	$97,900	14-23	30	$1,500,535	$36,600	30	$0	$0
55	CC	89004430	LOPEZ ALITH	230201	30	$2,550,905	$408,200	EPS017	30	$2,550,905	$102,100	CCF10	30	$3,826,358	$153,100	14-23	30	$2,550,905	$62,200	30	$0	$0
56	CC	40395482	LOPEZ ROSALBA	230201	30	$1,250,165	$200,100	EPS037	30	$1,250,165	$50,100	CCF10	30	$2,040,862	$81,700	14-23	30	$1,250,165	$30,500	30	$0	$0
57	CC	1051588795	MACHUCA JOHNN	25-14	11	$519,397	$83,200	EPS017	11	$519,397	$20,800	CCF10	11	$519,397	$0	14-23	11	$519,397	$0	11	$0	$0
58	CC	1051588795	MACHUCA JOHNN	25-14	19	$1,310,295	$209,700	EPS017	19	$1,310,295	$52,500	CCF10	19	$4,063,138	$162,600	14-23	19	$1,310,295	$57,000	19	$0	$0
59	CC	74373225	MALAVER HECTOR	25-14	10	$386,667	$61,900	EPS005	10	$386,667	$15,500	CCF10	10	$0	$0	14-23	10	$386,667	$0	10	$0	$0
60	CC	74373225	MALAVER HECTOR	25-14	20	$1,000,357	$160,100	EPS005	20	$1,000,357	$40,100	CCF10	20	$1,918,210	$76,800	14-23	20	$1,000,357	$24,400	20	$0	$0
61	CC	73120570	MATEUS CESAR	25-14	4	$166,727	$26,700	EPS005	4	$166,727	$6,700	CCF10	4	$0	$0	14-23	4	$166,727	$0	4	$0	$0
62	CC	73120570	MATEUS CESAR	25-14	26	$1,300,464	$208,100	EPS005	26	$1,300,464	$52,100	CCF10	26	$2,234,994	$89,400	14-23	26	$1,300,464	$31,700	26	$0	$0
63	CC	1053614130	MONROY BENJAMIN	230301	30	$1,190,633	$190,600	EPS037	30	$1,190,633	$47,700	CCF10	30	$1,981,330	$79,300	14-23	30	$1,190,633	$6,300	30	$0	$0
64	CC	4192455	MONROY EDILBERTO	25-14	30	$1,190,633	$190,600	EPS041	30	$1,190,633	$47,700	CCF10	30	$1,619,815	$64,800	14-23	30	$1,190,633	$29,100	30	$0	$0
65	CC	4192776	MONROY HERNANDO	230201	30	$1,500,535	$240,100	EPS017	30	$1,500,535	$60,100	CCF10	30	$2,446,183	$97,900	14-23	30	$1,500,535	$36,600	30	$0	$0
66	CC	1053606329	MONROY PAOLA	230201	30	$1,461,655	$233,900	EPS005	30	$1,461,655	$58,500	CCF10	30	$2,382,545	$95,400	14-23	30	$1,461,655	$7,700	30	$0	$0
67	CC	1053605548	MORALES JESSICA	25-14	30	$2,714,717	$434,400	EPS005	30	$2,714,717	$108,600	CCF10	30	$3,393,397	$135,800	14-23	30	$2,714,717	$14,200	30	$0	$0
68	CC	1053609837	OCHOA JAVIER	230201	30	$1,416,535	$226,700	EPS017	30	$1,416,535	$56,700	CCF10	30	$2,320,183	$92,900	14-23	30	$1,416,535	$61,700	30	$0	$0
69	CC	1002538428	OCHOA MARIA	25-14	30	$1,461,655	$233,900	EPS017	30	$1,461,655	$58,500	CCF10	30	$1,957,087	$78,300	14-23	30	$1,461,655	$7,700	30	$0	$0
70	CC	4191851	OCHOA RODRIGO	25-14	30	$4,654,777	$791,400	EPS017	30	$4,654,777	$186,200	CCF10	30	$7,050,048	$282,100	14-23	30	$4,654,777	$24,300	30	$0	$0
71	CC	1053615891	OCHOA WILFREDY	230201	5	$250,090	$40,100	EPS037	5	$250,090	$10,100	CCF10	5	$250,090	$0	14-23	5	$250,090	$0	5	$0	$0
72	CC	1053615891	OCHOA WILFREDY	230201	25	$1,350,482	$216,100	EPS037	25	$1,350,482	$54,100	CCF10	25	$4,258,252	$170,400	14-23	25	$1,350,482	$32,900	25	$0	$0
73	CC	93124198	ORJUELA JOSE	25-14	8	$317,503	$50,900	EPS017	8	$317,503	$12,800	CCF10	8	$317,503	$0	14-23	8	$317,503	$0	8	$0	$0
74	CC	93124198	ORJUELA JOSE	25-14	22	$992,194	$158,800	EPS017	22	$992,194	$39,700	CCF10	22	$1,760,655	$70,500	14-23	22	$992,194	$24,200	22	$0	$0
75	CC	46680659	PACHECO GLADYS	25-14	30	$1,461,655	$233,900	EPS005	30	$1,461,655	$58,500	CCF10	30	$1,896,217	$75,900	14-23	30	$1,461,655	$7,700	30	$0	$0
76	CC	60423066	PARRA BRIGIDA	230301	20	$793,756	$127,100	EPS017	20	$793,756	$31,800	CCF10	20	$793,756	$0	14-23	20	$793,756	$0	20	$0	$0
77	CC	60423066	PARRA BRIGIDA	230301	10	$396,878	$63,600	EPS017	10	$396,878	$15,900	CCF10	10	$2,851,146	$114,100	14-23	10	$396,878	$9,700	10	$0	$0
78	CC	46683468	PATARROYO ALICIA	230201	30	$1,250,165	$200,100	EPS017	30	$1,250,165	$50,100	CCF10	30	$2,040,862	$81,700	14-23	30	$1,250,165	$30,500	30	$0	$0
79	CC	74130943	PATARROYO JUAN	230201	3	$119,064	$19,100	CCFC55	3	$119,064	$4,800	CCF10	3	$127,402	$5,100	14-23	3	$119,064	$3,000	3	$0	$0
80	CC	74333939	PEREZ MARCO	230301	30	$1,500,535	$240,100	EPS037	30	$1,500,535	$60,100	CCF10	30	$2,446,183	$97,900	14-23	30	$1,500,535	$36,600	30	$0	$0
81	CC	4192439	PEREZ SANTIAGO	230301	30	$1,270,009	$203,300	ESSC24	30	$1,270,009	$50,900	CCF10	30	$2,060,706	$82,500	14-23	30	$1,270,009	$6,700	30	$0	$0
82	CC	35503777	PIRABAN FLOR	231001	25	$992,195	$158,800	EPS017	25	$992,195	$39,700	CCF10	25	$0	$0	14-23	25	$992,195	$0	25	$0	$0
83	CC	35503777	PIRABAN FLOR	231001	5	$198,439	$31,800	EPS017	5	$198,439	$8,000	CCF10	5	$0	$0	14-23	5	$198,439	$0	5	$0	$0
84	CC	4192111	RACHE JORGE	231001	30	$1,222,928	$195,700	EPS017	30	$1,222,928	$49,000	CCF10	30	$2,029,773	$81,200	14-23	30	$1,222,928	$29,800	30	$0	$0
85	CC	74360518	RACHE JOSE	230301	30	$1,349,384	$216,000	EPS041	30	$1,349,384	$54,000	CCF10	30	$2,140,081	$85,700	14-23	30	$1,349,384	$7,100	30	$0	$0
86	CC	1053612002	RAMIREZ YENNY	230201	30	$2,682,136	$429,200	EPS017	30	$2,682,136	$107,300	CCF10	30	$4,062,319	$162,500	14-23	30	$2,682,136	$14,100	30	$0	$0
87	CC	1053609802	RICO LINA	25-14	30	$2,714,717	$434,400	EPS017	30	$2,714,717	$108,600	CCF10	30	$3,393,397	$135,800	14-23	30	$2,714,717	$14,200	30	$0	$0

en línea

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
88	CC	1002551514	RODRIGUEZ DEYSI		0	$0	$0	EPS008	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
89	CC	1053613345	RODRIGUEZ DUVAN	230301	30	$1,500,535	$240,100	EPS017	30	$1,500,535	$60,100	CCF10	30	$2,446,183	$97,900	14-23	30	$1,500,535	$36,600	30	$0	$0
90	CC	1053615468	RODRIGUEZ DUVAN	230201	30	$1,600,571	$256,100	EPS037	30	$1,600,571	$64,100	CCF10	30	$2,546,219	$101,900	14-23	30	$1,600,571	$39,000	30	$0	$0
91	CC	7219471	RODRIGUEZ JULIO	25-14	30	$1,500,535	$240,100	EPS037	30	$1,500,535	$60,100	CCF10	30	$2,446,183	$97,900	14-23	30	$1,500,535	$36,600	30	$0	$0
92	CC	74322563	RODRIGUEZ PEDRO	230201	6	$232,000	$37,200	EPS037	6	$232,000	$9,300	CCF10	6	$0	$0	14-23	6	$232,000	$0	6	$0	$0
93	CC	74322563	RODRIGUEZ PEDRO	230201	24	$978,343	$156,600	EPS037	24	$978,343	$39,200	CCF10	24	$1,768,510	$70,800	14-23	24	$978,343	$23,900	24	$0	$0
94	CC	1053605397	ROJAS MARIO	231001	30	$1,605,406	$256,900	EPS017	30	$1,605,406	$64,300	CCF10	30	$4,366,607	$174,700	14-23	30	$1,605,406	$69,900	30	$0	$0
95	CC	74322163	ROMERO JAIME	25-14	30	$1,190,633	$190,600	EPS037	30	$1,190,633	$47,700	CCF10	30	$1,981,330	$79,300	14-23	30	$1,190,633	$29,100	30	$0	$0
96	CC	1053604922	ROSAS JORGE	230301	19	$734,667	$117,600	EPS017	19	$734,667	$29,400	CCF10	19	$0	$0	14-23	19	$734,667	$0	19	$0	$0
97	CC	1053604922	ROSAS JORGE	230301	11	$425,334	$68,100	EPS017	11	$425,334	$17,100	CCF10	11	$0	$0	14-23	11	$425,334	$0	11	$0	$0
98	CC	8731958	ROSAS SANTOS	230301	30	$1,605,406	$256,900	EPS005	30	$1,605,406	$64,300	CCF10	30	$1,893,857	$75,800	14-23	30	$1,605,406	$69,900	30	$0	$0
99	CC	74323801	RUIZ JOSE	25-14	30	$1,600,571	$256,100	EPS037	30	$1,600,571	$64,100	CCF10	30	$2,546,219	$101,900	14-23	30	$1,600,571	$39,000	30	$0	$0
100	CC	1053604273	RUIZ SANDRA	230201	30	$1,547,427	$247,600	EPS017	30	$1,547,427	$61,900	CCF10	30	$2,493,075	$99,800	14-23	30	$1,547,427	$37,700	30	$0	$0
101	CC	74324119	SALAMANCA GABRIEL	25-14	30	$1,500,535	$240,100	EPS017	30	$1,500,535	$60,100	CCF10	30	$2,446,183	$97,900	14-23	30	$1,500,535	$36,600	30	$0	$0
102	CC	4129932	SALAS VICTOR	230301	15	$611,464	$97,900	EPS017	15	$611,464	$24,500	CCF10	15	$611,464	$0	14-23	15	$611,464	$0	15	$0	$0
103	CC	4129932	SALAS VICTOR	230301	15	$611,464	$97,900	EPS017	15	$611,464	$24,500	CCF10	15	$3,135,025	$125,500	14-23	15	$611,464	$14,900	15	$0	$0
104	CC	74322662	SALAZAR HERNAN	230301	30	$1,222,928	$195,700	EPS017	30	$1,222,928	$49,000	CCF10	30	$2,029,773	$81,200	14-23	30	$1,222,928	$29,800	30	$0	$0
105	CC	46683220	SALCEDO NINI	230201	30	$1,279,930	$204,800	EPS041	30	$1,279,930	$51,200	CCF10	30	$1,709,112	$68,400	14-23	30	$1,279,930	$31,200	30	$0	$0
106	CC	74323507	SANA MIGUEL	25-14	30	$1,500,535	$240,100	EPS008	30	$1,500,535	$60,100	CCF10	30	$2,446,183	$97,900	14-23	30	$1,500,535	$36,600	30	$0	$0
107	CC	74322535	SANCHEZ HECTOR	25-14	30	$1,250,165	$200,100	EPS017	30	$1,250,165	$50,100	CCF10	30	$2,040,862	$81,700	14-23	30	$1,250,165	$30,500	30	$0	$0
108	CC	74130153	SUAREZ JOSE	230301	30	$1,349,384	$216,000	EPS037	30	$1,349,384	$54,000	CCF10	30	$2,140,081	$85,700	14-23	30	$1,349,384	$7,100	30	$0	$0
109	CC	1053610862	TIBATA YOVANY	231001	30	$1,500,535	$240,100	EPS017	30	$1,500,535	$60,100	CCF10	30	$2,446,183	$97,900	14-23	30	$1,500,535	$36,600	30	$0	$0
110	CC	1053612595	TORRES RAGHUNATHA	230301	3	$255,091	$40,900	EPS017	3	$255,091	$10,300	CCF10	3	$255,090	$10,300	14-23	3	$255,091	$6,300	3	$0	$0
111	CC	1053613769	URIBE EDWIN	230301	20	$1,000,357	$160,100	EPS017	20	$1,000,357	$40,100	CCF10	20	$1,000,357	$0	14-23	20	$1,000,357	$0	20	$0	$0
112	CC	1053613769	URIBE EDWIN	230301	10	$500,179	$80,100	EPS017	10	$500,179	$20,100	CCF10	10	$3,486,013	$139,500	14-23	10	$500,179	$12,200	10	$0	$0
113	CC	74359861	VALDERRAMA CARLOS	230201	30	$1,600,571	$256,100	EPS005	30	$1,600,571	$64,100	CCF10	30	$2,546,219	$101,900	14-23	30	$1,600,571	$39,000	30	$0	$0
114	CC	7226057	VALDERRAMA JOSE	230201	30	$1,190,633	$190,600	EPS008	30	$1,190,633	$47,700	CCF10	30	$1,981,330	$79,300	14-23	30	$1,190,633	$6,300	30	$0	$0
115	CC	23856977	VALDERRAMA MARIA	230301	30	$2,714,717	$434,400	EPS017	30	$2,714,717	$108,600	CCF10	30	$4,072,076	$162,900	14-23	30	$2,714,717	$66,200	30	$0	$0
116	CC	74322488	VARGAS JOSE	25-14	30	$1,500,535	$240,100	EPS008	30	$1,500,535	$60,100	CCF10	30	$2,446,183	$97,900	14-23	30	$1,500,535	$36,600	30	$0	$0
117	CC	1053614462	VARGAS MAICOL	230201	2	$79,376	$12,800	EPS037	2	$79,376	$3,200	CCF10	2	$79,376	$0	14-23	2	$79,376	$0	2	$0	$0
118	CC	1053614462	VARGAS MAICOL	230201	28	$1,270,008	$203,300	EPS037	28	$1,270,008	$50,900	CCF10	28	$2,055,146	$82,300	14-23	28	$1,270,008	$6,700	28	$0	$0
119	CC	74359989	VASQUEZ ANGEL	230301	30	$1,500,535	$240,100	EPS005	30	$1,500,535	$60,100	CCF10	30	$2,446,183	$97,900	14-23	30	$1,500,535	$36,600	30	$0	$0
Total	**Afiliados(100)**					**$158,912,319**	**$25,587,100**			**$160,072,319**	**$6,855,600**			**$271,106,065**	**$10,595,500**			**$160,072,319**	**$3,094,800**		**$19,868,126**	**$993,700**

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900259348	5	RED VITAL PAIPA SA E.S.P	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PAIPA COMFABOY	CRA 17A 23A 05	PAIPA-BOYACA	7853051	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	43595383	9453507434	E	2023/07/13	2023/07/13	BANCOLOMBIA	0	$47,126,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				99	$25,587,100	$0	$0	$25,587,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	11	$2,331,400	$0	$0	$2,331,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	30	$8,670,300	$0	$0	$8,670,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	29	$6,698,400	$0	$0	$6,698,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	29	$7,887,000	$0	$0	$7,887,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				100	$3,094,800	$0	$0	$3,094,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	100	$3,094,800	$0	$0	$3,094,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				99	$10,595,500	$0	$0	$10,595,500
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	99	$10,595,500	$0	$0	$10,595,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				100	$6,855,600	$0	$0	$6,855,600
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$4,800	$0	$0	$4,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$312,900	$0	$0	$312,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$50,900	$0	$0	$50,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	53	$3,702,700	$0	$0	$3,702,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	18	$1,036,900	$0	$0	$1,036,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	$429,800	$0	$0	$429,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$10,300	$0	$0	$10,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	17	$1,307,300	$0	$0	$1,307,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$596,200	$0	$0	$596,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$596,200	$0	$0	$596,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$397,500	$0	$0	$397,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$397,500	$0	$0	$397,500
TOTAL				100	$47,126,700	$0	$0	$47,126,700

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1052396359
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			WILSON ARIEL BECERRA VALDERRAMA
CIUDAD/MUNICIPIO:	PAIPA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CR 10A 9A 73	TELÉFONO:	3143137
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas para la construc
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4505923247	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/07/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9995183150

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 185,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185,600	$ 0	$ 185,600
SUBTOTALES:										**$ 185,600**	**$ 0**	**$ 185,600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145,000	$ 0	$ 0	$ 145,000
SUBTOTALES:													**$ 145,000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 145,000**

Planilla Pagada
acn SOI
Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD						ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																												
1	CC 1052396359	BECERRA VALDERRAMA WILSON ARIEL	INDEPEND		$ 1,160,000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1,160,000	$ 185,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185,600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,160,000	$ 145,000	$ 0	$ 145,000			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 330.600
