INFORME DE INTERVENTORIA PARA EL PAGO PARCIAL No. 2

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.MP-0713-2023

"REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL EN LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS CON OCASIÓN DE LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA POR EL MUNICIPIO DE PALMIRA – VALLE DEL CAUCA, A TRAVES DEL DECRETO No. 011 DEL 16 DE ENERO DE 2023."



CONTRATISTA DE INTERVENTORIA**: EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ.**

SANTIADO DE CALI, JULIO DE 2023

Calle 18N No. 3N-70. Oficina 401 Edificio Noyra. Teléfono Fijo 668 55 24 Cel. 301-2759200; 316-4918891;
Email: cardenascivil99@gmail.com
Cali, Colombia.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 3

1.1 Localización 3

1.2 Información general de los contratos de obra e interventoría 3

ASPECTO LEGAL 4

ASPECTO FINANCIERO 4

ASPECTO TÉCNICO 5

1.1. Avance financiero 5

1.2. Prorrogas y suspensiones 6

1.3. Personal aprobado al Contratista de Interventoría 8

1.4. Descripción de las actividades desarrolladas en el Contrato de Interventoría 8

1.4.1. Administrativas 8

1.4.2. Financieras 8

1.4.3. Técnicas 9

2. ASPECTO ADMINISTRATIVOS 9

5.1 Elaboración de Informes 9

CONCLUSIONES GENERALES 10

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO 10

INTRODUCCION

El presente informe describe las actividades Técnicas, Ambientales, Sociales, Administrativas, Financieras del contrato de Interventoría No. MP-0713-2023, cuyo objeto es: "REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL EN LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS CON OCASIÓN DE LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA POR EL MUNICIPIO DE PALMIRA – VALLE DEL CAUCA, A TRAVES DEL DECRETO No. 011 DEL 16 DE ENERO DE 2023" efectuadas en el periodo comprendido desde el 11 de mayo de 2023 al 20 de julio de 2023.

1. DESCRIPCION DEL CONTRATO

La información del presente documento contiene el seguimiento que la Interventoría viene realizando sobre la ejecución de los contratos de obra No. **MP-0712-2023** del contratista **CARLOS ARMANDO PEDROZA ROJAS** cuyo objeto es: "DESCOLMATACIÓN DE LOS RÍOS AMAIME, BOLO Y NIMA-SECTOR TIENDA NUEVA E IRACALES DEL MUNICIPIO DE PALMIRA– VALLE DEL CAUCA Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS DE ACCESO COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO CON OCASIÓN DE LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA POR EL MUNICIPIO DE PALMIRA – VALLE DEL CAUCA, A TRAVÉS DEL DECRETO NO. 011 DEL 16 DE ENERO DE 2023", el contrato **MP-0711-2023** del contratista **DISEÑOS LICITACIONES E INGENIERÍA SAS** cuyo objeto es: "ELABORAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE 20 METROS LINEALES DE MURO EN CONCRETO Y UN BOX CULVERT COMO ACCIONES CORRECTIVAS A LOS EFECTOS ADVERSOS GENERADOS POR LA QUEBRADA LOS NARANJOS EN EL SECTOR DE IRACALES CON OCASIÓN DE LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA POR EL MUNICIPIO DE PALMIRA – VALLE DEL CAUCA A TRAVÉS DEL DECRETO 011 DEL 16 DE ENERO DE 2023." y el contrato **MP-0889-2023** del contratista **DISEÑOS Y OBRAS DE INGENIERIA R+N S.A.S** cuyo objeto es: "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 55 METROS LINEALES DE MURO EN CONCRETO COMO ACCIÓN CORRECTIVA A LOS EFECTOS GENERADOS SOBRE LA VÍA POR LA QUEBRADA LOS VAQUEROS SOBRE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DE PALMIRA CON LA ZAPATA " a fin de verificar las obligaciones contractuales pertinentes.

1.1. Localización

La ejecución del contrato de obra MP-0712-2023 se realiza en el rio Amaime a la altura del sector barrio Azul y el barrio el Triunfo, ambos pertenecientes al corregimiento de Amaime, zona rural del municipio de Palmira, Valle del Cauca.

La ejecución del contrato de obra MP-0711-2023 se encuentra localizada en la Comuna 14 del Municipio de Palmira, corregimiento de Ayacucho en el sector Iracales.

La ejecución del contrato de obra MP-0889-2023 se encuentra localizada en la comuna 14 del municipio de Palmira, corregimiento La Zapata.

1.2. Información general de los contratos de obra e interventoría

Durante este periodo informado la interventoría llevó a cabo las acciones pertinentes a sus responsabilidades en el ámbito del contrato de interventoría que le compete; se realizó seguimiento técnico, jurídico, administrativo y financiero a los proyectos relacionados en el punto 1. DESCRIPCION DEL CONTRATO.

A continuación, se plasma la información más relevante del contrato de interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA	
CONTRATO No.:	MP-0713-2023
OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL EN LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS CON OCASIÓN DE LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA POR EL MUNICIPIO DE PALMIRA – VALLE DEL CAUCA, A TRAVES DEL DECRETO No. 011 DEL 16 DE ENERO DE 2023"
CONTRATISTA:	EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ NIT.16.254.057-8
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	17 DE ENERO DE 2023
VALOR INICIAL:	$ 190.335.300

Tabla 1. Información general de los contratos de obra e interventoría

2. ASPECTO LEGAL

El Contrato de Interventoría se encuentra amparado por las siguientes pólizas, las cuales fueron presentadas por las partes respectivas y se encuentran aprobadas por la DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, como se observa a continuación:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				
AMPARO	ASEGURADORA	VIGENCIA (Fechas)		VALOR
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO (No. 45-44-101145760)	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	20/02/2023	23/01/2024	$ 38.067.060,00
SALARIOS Y PRESTACIONES (No. 45-44- 101145760))		20/02/2023	23/09/2026	$ 19.033.530,00
CALIDAD DEL SERVICIO (No. 45-44- 101145760)		20/02/2023	23/03/2024	$ 19.033.530,00

Tabla 2. Información general de las garantías expedidas para el Contrato de Interventoría

3. ASPECTO FINANCIERO

El Municipio de Palmira – Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres pagará al Contratista **CARLOS ARMANDO PEDROZA ROJAS** el valor del contrato de la siguiente manera:

….El valor del contrato será cancelado por la Alcaldía de Palmira al Contratista, mediante el reconocimiento de actas parciales de obra, previa presentación del informe del contratista y certificación del pago de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, aprobación del informe de avance del trabajo por parte del interventor designado para el efecto, que incluya (registro fotográfico de avance de las obras y resumen de las actividades desarrolladas y presentación de la factura el acta de recibo definitivo de las obras objeto del contrato, debidamente suscrita por las partes…..

El Municipio de Palmira – Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres pagará al Contratista **DISEÑOS LICITACIONES E INGENIERÍA SAS** el valor del contrato de la siguiente manera:

….El valor del contrato será cancelado por la Alcaldía de Palmira al Contratista, mediante el reconocimiento de actas parciales de obra, previa presentación del informe del contratista y certificación del pago de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, aprobación del informe de avance del trabajo por parte del interventor designado para el efecto, que incluya (registro fotográfico de avance de las obras y resumen de las actividades desarrolladas y presentación de la factura el acta de recibo definitivo de las obras objeto del contrato, debidamente suscrita por las partes…..

El Municipio de Palmira – Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres pagará al Contratista **DISEÑOS Y OBRAS DE INGENIERIA R+N S.A.S** el valor del contrato de la siguiente manera:

….El valor del contrato será cancelado por la Alcaldía de Palmira al Contratista, mediante el reconocimiento de actas parciales de obra, previa presentación del informe del contratista y certificación del pago de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, aprobación del informe de avance del trabajo por parte del interventor designado para el efecto, que incluya (registro fotográfico de avance de las obras y resumen de las actividades desarrolladas y presentación de la factura el acta de recibo definitivo de las obras objeto del contrato, debidamente suscrita por las partes…..

El Contrato Interventoría No. MP-0713-2023 tiene un valor de **$ 190.335.300,00**, el Contrato de Obra No. MP-0712-2023 tiene un valor de $ 494.480.095,00, el contrato de Obra No. MP-0711-2023 tiene un valor de $ 607.753.003,00 y el contrato de Obra No. MP-0889-2023 tiene un valor de $ 745.000.000,00 los cuales se encuentran suscritos y aprobados por la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres

A continuación, se puede verificar el estado financiero actual de la ejecución de cada uno de los contratos mencionados:

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA MP-0712-2023				
OBJETO: "DESCOLMATACIÓN DE LOS RÍOS AMAIME, BOLO Y NIMA-SECTOR TIENDA NUEVA E IRACALES DEL MUNICIPIO DE PALMIRA– VALLE DEL CAUCA Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS DE ACCESO COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO CON OCASIÓN DE LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA POR EL MUNICIPIO DE PALMIRA – VALLE DEL CAUCA, A TRAVÉS DEL DECRETO NO. 011 DEL 16 DE ENERO DE 2023"				
ACTA DE OBRA No.	**PERÍODO**	**VALOR DEL ACTA**	**VALOR ACUMULADO**	
1	19/01/2023 al 28/02/2023	$ 197.761.615.00	$ 197.761.615	39.99 %
2 FINAL	29/02/2023 al 17/03/2023	$ 276.011.139.00	$ 473.772.754	95.81 %
ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA MP-0711-2023				
OBJETO: "ELABORAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE 20 METROS LINEALES DE MURO EN CONCRETO Y UN BOX CULVERT COMO ACCIONES CORRECTIVAS A LOS EFECTOS ADVERSOS GENERADOS POR LA QUEBRADA LOS NARANJOS EN EL SECTOR DE IRACALES CON OCASIÓN DE LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA POR EL MUNICIPIO DE PALMIRA – VALLE DEL CAUCA A TRAVÉS DEL DECRETO 011 DEL 16 DE ENERO DE 2023."				
1	19/01/2023 al 28/02/2023	$ 176.759.911.37	$ 176.759.911.37	29.08 %
2	18/02/2023 al 22/03/2023	$ 125.892.570,44	$ 302.652.481.81	49.80 %
3	23/03/2023 al 30/05/2023	$ 146.381.668,69	$ 449.034.150,50	73.88 %
4	31/05/2023 al 30/06/2023	$ 99.701.118,51	$ 548.735.268,73	90.29 %
ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA MP-0889-2023				
OBJETO: "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 55 METROS LINEALES DE MURO EN CONCRETO COMO ACCIÓN CORRECTIVA A LOS EFECTOS GENERADOS SOBRE LA VÍA POR LA QUEBRADA LOS VAQUEROS SOBRE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DE PALMIRA CON LA ZAPATA "				
1	31/01/2023 al 20/04/2023	$ 72.888.296,92	$ 72.888.296,92	9.78 %
2	21/04/2023 al 12/05/2023	$ 173.108.388,08	$ 245.996.684,00	33.02 %
3	13/05/2023 al 21/06/2023	$ 81.030.504,41	$ 327.027.189,41	43.90 %

Tabla 3. Estado financiero de los contratos de obra

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA				
OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL EN LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS CON OCASIÓN DE LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA POR EL MUNICIPIO DE PALMIRA – VALLE DEL CAUCA, A TRAVES DEL DECRETO No. 011 DEL 16 DE ENERO DE 2023"				
ACTA PARCIAL No.	**PERÍODO**	**VALOR DELACTA**	**VALOR ACUMULADO**	
1	17/01/2023 al 10/05/2023	$ 100.877.709,00	$ 100.877.709,00	53.00 %
2	11/05/2023 al 20/07/2023	$ 51.390.531,00		80.00 %

Tabla 4. Estado financiero del contrato de interventoría

4. ASPECTO TÉCNICO


4.1 Avance financiero

Al 20 de julio 2023 se tuvo un avance financiero acumulado del 80.00 %, haciendo énfasis en que este porcentaje corresponde al valor acumulado de las Actas parciales de los contratos de obra No. MP-0712-2023, MP-0711-2023 y MP-0889-2023.

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO		
LABOR CONTRATADA	$	190.335.300
ANTICIPO ENTREGADO	$	-
AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES	$	-
VALOR PRESENTE ACTA	$	51.390.531
TOTAL, EJECUTADO A LA FECHA	$	152.268.240
AMORTIZACION ANTICIPO PRESENTE ACTA	$	-
AMORTIZACION ANTICIPO ACUMULADA	$	-
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	$	38.067.060
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	$	51.390.531

Tabla 5. Estado financiero del contrato de interventoría

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	SUELDO MENSUAL	TIEMPO (MESES)	DEDICAC.	FM	VALOR PARCIAL
1	**COSTO DIRECTO PERSONAL**						
	PERSONAL PROFESIONAL						
1	Director de Interventoria	1	$ 5.100.000	7	25%	2,00	$ 17.850.000,00
2	Residente de Interventoria	1	$ 4.500.000	7	100%	2,00	$ 63.000.000,00
3	Profesional ambiental	1	$ 4.100.000	7	20%	2,00	$ 11.480.000,00
4	Profesional SST	1	$ 4.100.000	7	20%	2,00	$ 11.480.000,00
5	Inspector de obra	1	$ 2.800.000	7	100%	2,00	$ 39.200.000,00
	TOTAL COSTO DE PERSONAL						**$ 143.010.000,00**
2	**OTROS COSTOS DIRECTOS**						
2,1	VIATICOS						
1	Transporte (Vehiculo propio o alquilado)	1	$ 2.600.000	5	50%		$ 6.500.000,00
2,2	COSTO DE ALQUILER EQUIPOS DE OFCINA						
2.2.1	Comision Topografica equipos incluidos	1	$ 1.858.750	3	10%		$ 557.625,00
2.2.2	Ensayos de Laboratorio	1	$ 1.452.000	5	30%		$ 2.178.000,00
2.2.3	Comunicación (Equipos propios o alquilados)	1	$ 650.001	7	100%		$ 4.550.005,25
2,3	OTROS COSTOS DIRECTOS						
2.3.1	Elaboracion de informes	1	$ 450.000	7	100%		$ 3.150.000,00
	TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS						**$ 16.935.630,25**
	COSTO DIRECTO TOTAL						**$ 159.945.630,25**
	IVA (19%)				**19,00%**		**$ 30.389.669,75**
	COSTO TOTAL						**$ 190.335.300,00**

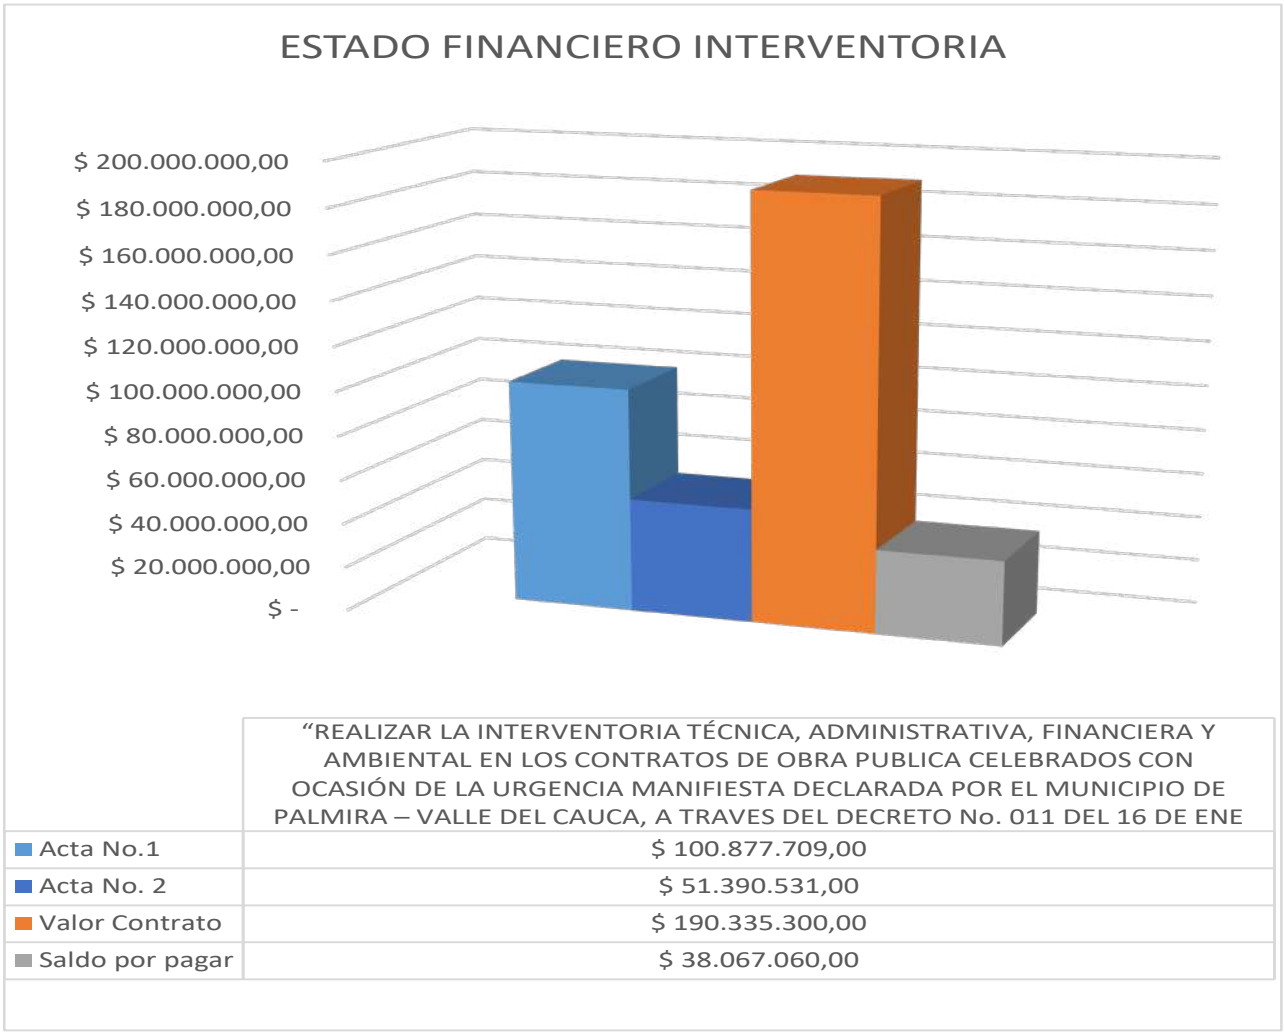

	"REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL EN LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS CON OCASIÓN DE LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA POR EL MUNICIPIO DE PALMIRA – VALLE DEL CAUCA, A TRAVES DEL DECRETO No. 011 DEL 16 DE ENE
Acta No.1	$ 100.877.709,00
Acta No. 2	$ 51.390.531,00
Valor Contrato	$ 190.335.300,00
Saldo por pagar	$ 38.067.060,00

4.2 Prorrogas y suspensiones

El contrato de interventoría, NO han tenido a la fecha del presente informe Prorrogas o Suspensiones.

Para el contrato de obra MP-0711-2023 el día 28 de junio de 2023 se legalizó la prórroga de tiempo de 154 días calendario.

Descripción de las actividades desarrolladas en el Contrato de Interventoría

4.2.1 Administrativas

Contrato de obra No. MP-0712-2023

- Revisión, control y seguimiento de las afiliaciones a seguridad y prestaciones sociales de los empleados del Contratista de obra y demás personas autorizadas para intervenir en el desarrollo de las actividades de ejecución delproyecto.
- Acompañamiento e inspección permanente de las actividades ejecutadas por el Contratista de Obra.

- Informar a la Dirección de Gestión del Riesgo del Municipio de Palmira sobre el estado actual de los trabajos ejecutados.
- Seguimiento de las actividades desarrolladas por al área Social, Ambiental y SST del Contratista.
- Seguimiento, revisión para la elaboración de los documentos para el trámite de pago del Acta No.1 Y Acta final No.2

Contrato de obra No. MP-0711-2023

- Revisión, control y seguimiento de las afiliaciones a seguridad y prestaciones sociales de los empleados del Contratista de obra y demás personas autorizadas para intervenir en el desarrollo de las actividades de ejecución delproyecto.
- Acompañamiento e inspección permanente de las actividades ejecutadas por el Contratista de Obra.
- Informar a la Dirección de Gestión del Riesgo del Municipio de Palmira sobre el estado actual de los trabajos ejecutados.
- Seguimiento de las actividades desarrolladas por al área Social, Ambiental y SST del Contratista.
- Seguimiento, revisión para la elaboración de los documentos para el trámite de pago de las Acta No.1, 2 ,3 y No.4

Contrato de obra No. MP-0889-2023

- Revisión, control y seguimiento de las afiliaciones a seguridad y prestaciones sociales de los empleados del Contratista de obra y demás personas autorizadas para intervenir en el desarrollo de las actividades de ejecución delproyecto.
- Acompañamiento e inspección permanente de las actividades ejecutadas por el Contratista de Obra.
- Informar a la Dirección de Gestión del Riesgo del Municipio de Palmira sobre el estado actual de los trabajos ejecutados.
- Seguimiento de las actividades desarrolladas por al área Social, Ambiental y SST del Contratista.
- Seguimiento, revisión para la elaboración de los documentos para el trámite de pago del Acta No.1, 2 y No. 3.

4.2.2 Financieras

Contrato de obra No. MP-0712-2023

- Al corte del presente informe la interventoría recibió dos Acta de pago; el Acta No. 1 por un valor de $ 197.761.615.00 y el Acta No. 2 final del contrato por un valor de $ 276.011.139.00 para un acumulado total ejecutado de $ 473.772.754 correspondiente al 95.81% del valor total contratado; a favor de la entidad contratante queda un saldo de $ 20.707.341.00.

Contrato de obra No. MP-0711-2023

- Al corte del presente informe la interventoría recibió cuatro Actas de pago; el Acta No. 1 por un valor de $ 176.759.911,37, el Acta No. 2 del contrato por un valor de $ 125.892.570,44, el Acta No. 3 del contrato por un valor de $ 146.381.668,69, y el Acta No. 4 del contrato por un valor de $ 99.701.118,51 para un acumulado a la fecha de $ 548.735.268,73 correspondiente al 90.29 % del valor total contratado.

Contrato de obra No. MP-0889-2023

- Al corte del presente informe la interventoría recibió un Acta de pago; el Acta No. 1 por un valor de $ 72.888.296,92, Acta de pago No. 2 por un valor de $ 173.108.388,08 y el Acta de pago No. 3 por un valor de $ 81.030.504,41 para un acumulado a la fecha de $ 327.027.189,41 correspondiente al 43.90 % del valor total contratado.

4.2.3 Técnicas

Contrato de obra No. MP-0712-2022.

- Se realizó seguimiento al levantamiento Topográfico de cada sector que se va a intervenir.
- Se realizó seguimiento a las actividades de descolmatación en los sitios correspondientes, dejando el cause del rio con caudal y flujo sin obstáculos.
- Se realizó seguimiento y control a las actividades de retiro de material sobrante en el sitio.
- Se verifican las profundidades antes y después de la descolmatación de cada uno de los sectores intervenidos.

Contrato de obra No. MP-0711-2022.

- Se realizó seguimiento al levantamiento Topográfico y estudios de suelos de cada sector que se va a intervenir.
- Se realizó seguimiento a las actividades de adecuación de vías de acceso.
- Se realizó seguimiento y control a las actividades de retiro de material sobrante en el sitio.
- Se reviso aplicación de nuevo plan de contingencia por avalancha del día 9 de marzo de 2023.
- Se realizo seguimiento a las actividades de relleno con material de sitio e importado (roca muerta).
- Se realizo acompañamiento en la ubicación técnica de gaviones para proteger vivienda y talud de la quebrada.

Contrato de obra No. MP-0889-2022.

- Se realizó seguimiento al levantamiento Topográfico y estudios de suelos de cada sector que se va a intervenir.
- Se realizó seguimiento a las actividades de adecuación de vías de acceso.
- Se realizó seguimiento y control a las actividades de retiro de material sobrante en el sitio.
- Se realizo seguimiento a las actividades de relleno con material de sitio e importado (roca muerta).

.

5. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

La interventoría realizó trabajo de seguimiento administrativo que consistió en las siguientes actividades:

- Revisión, control y seguimiento de las afiliaciones a seguridad y prestaciones sociales de los empleados de los contratistas de obra y demás personas autorizadas para intervenir en el desarrollo de las actividades de ejecución

de los proyectos.

- Acompañamiento e inspección permanente de las actividades ejecutadas por el Contratista Carlos Armando Pedroza Rojas, Diseños Licitaciones e Ingeniería s.a.s y Diseños y Obras de Ingeniería R+N s.a.s.
- Respuestas y/o conceptos referentes a solicitudes realizadas por parte del Contratista de Obra y la Dirección de Gestión del Riesgo del Municipio de Palmira.
- Informar a la Dirección de Gestión del Riesgo sobre el estado actual de cada uno de los frentes de obra intervenidos por los Contratistas.
- Elaboración de Informes y conceptos solicitados a la Interventoría por la Dirección de Gestión del Riesgo del Municipio de Palmira Elaboración de comunicados referentes con la ejecución del Contrato de Obra.
- Reuniones de socialización, aclaración de observaciones, dudas e inquietudes manifestadas por parte de las comunidades de los sectores ubicados dentro del área de intervención de los proyectos.
- Asistencia y planeación de Comités Técnicos.
- Seguimiento de las actividades desarrolladas por al área Social, Ambiental y SST de los Contratistas deObra
- Seguimiento y aprobación de tramites de prórroga contrato MP-0711-2023

5.1 Elaboración de Informes

En cumplimiento de las obligaciones contractuales, la interventoría de Eduardo Cárdenas Rodríguez remite a la Entidad los reportes de ejecución de las actividades de obra ejecutadas por los Contratistas de Obra y los informes solicitados por esta a la Interventoría.

6. CONCLUSIONES GENERALES

- Durante el período del desde el 11 de mayo de 2023 al 20 de julio de 2023, se realizó control, revisión y evaluación del avance de las actividades constructivas programadas
- Se realizaron todas las actividades de seguimiento y control a la ejecución de las obras.
- Los contratistas cumplieron a cabalidad con lo referente al SST.
- No se presentaron incidentes en ninguna de las obras en ejecución durante el presente periodo.
- Se dio solución a cada una de las dificultades técnicas de las obras durante el presente periodo
- Se realizaron todos los trámites necesarios, técnicos, administrativos, jurídicos y ambientales para que los contratistas de obra pudieran realizar cada una de las actividades sin dificultades.

EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR
16.254.057 Palmira (Valle del Cauca)

Dirección: Calle 18N # 3N – 70 oficina 401 Edificio Noyra
Teléfonos: 316 491 88 91 - Tel 6685524
e-mail: cardenascivil99@gmail.com
Ciudad: Santiago de Cali

El presente informe se suscribe el día 20 de julio de 2023

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO PERIDO 11/05/2023 AL 20/07/2023

- **Contrato de obra MP-0712-2023**

CONDICIONES INICIALES

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>








TRABAJOS EJECUTADOS.




























Calle 18N No. 3N-70. Oficina 401 Edificio Noyra. Teléfono Fijo 668 55 24 Cel. 301-2759200; 316-4918891;
Email: cardenascivil99@gmail.com
Cali, Colombia.










Calle 18N No. 3N-70. Oficina 401 Edificio Noyra. Teléfono Fijo 668 55 24 Cel. 301-2759200; 316-4918891;
Email: cardenascivil99@gmail.com
Cali, Colombia.

- **Actividades realizadas en el sector rio Amaime**



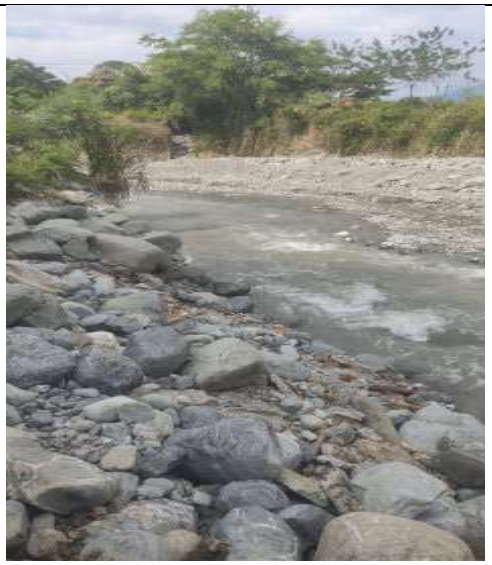

Calle 18N No. 3N-70. Oficina 401 Edificio Noyra. Teléfono Fijo 668 55 24 Cel. 301-2759200; 316-4918891;
Email: cardenascivil99@gmail.com
Cali, Colombia.


- **Contrato de obra MP-0711-2023**

1. PRELIMINARES

1.4. CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB





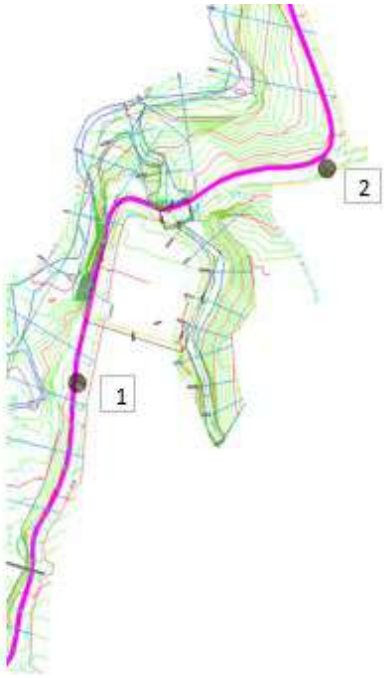

1.8. MOTOBOMBA DE 3"









2. EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.9 EXCAVACION CONGLOMER A MAQUINA (CARGUE)




2.10. EXCAVACION EN CONGLOMERADO (MANUAL)



2.11. VOLQUETA 5 M3



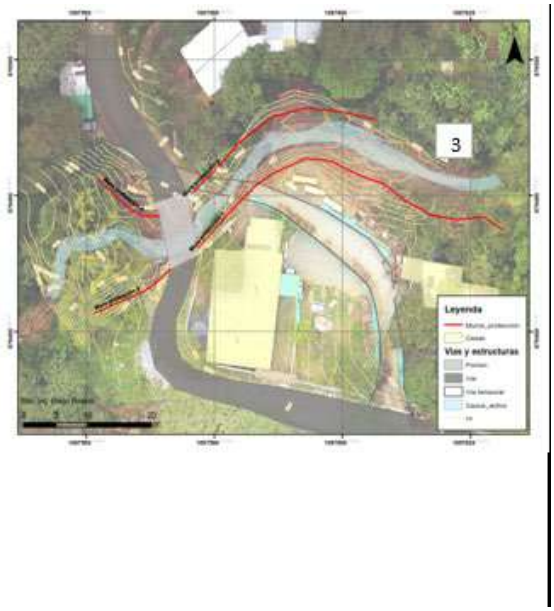


2.12. ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS.





2.13. ACARREO MATERIALES-ESCOMBROS 10 PERS.



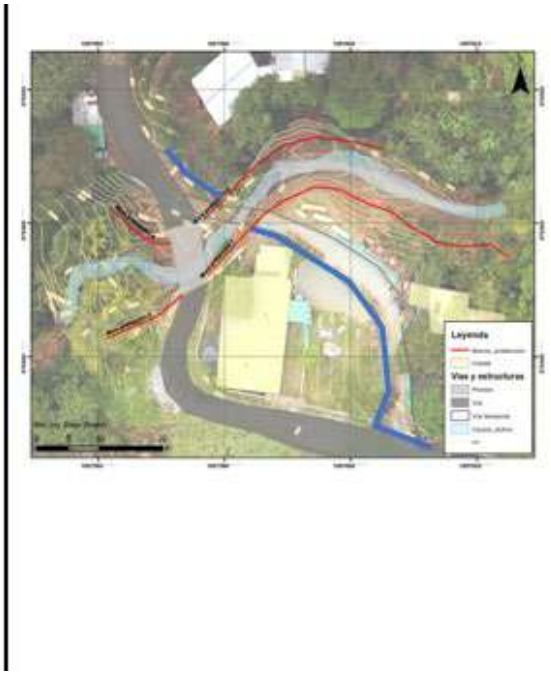

3.0 RELLENOS

3.17. RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-CILINDRO






3.18. SUB-BASE COMP.MAT.SELECC. TIPO INV SIN T





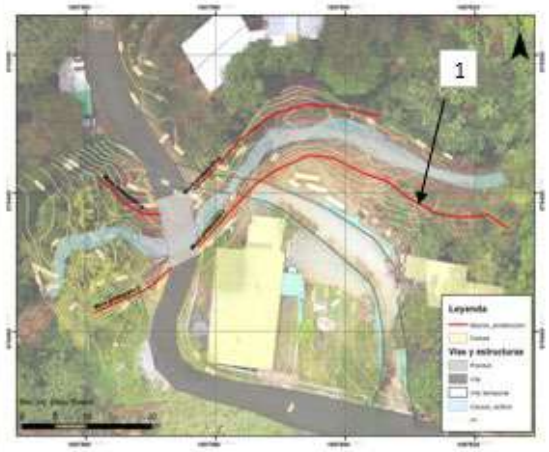

4.0 MURO EN CONCRETO Y BOX CULVERT

4.2. CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P












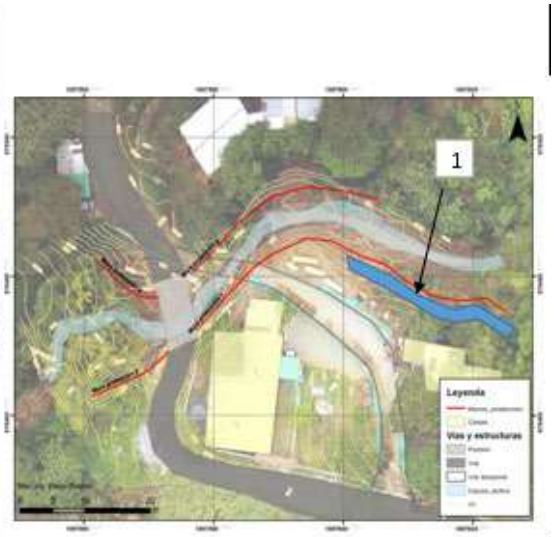

5.0 LIMPIEZA Y VARIOS

5.26. ACARREO MATERIALES CAMPERO-CAMIONETA






5.27. ATERIALES-ESCOMBROS 10 PERS







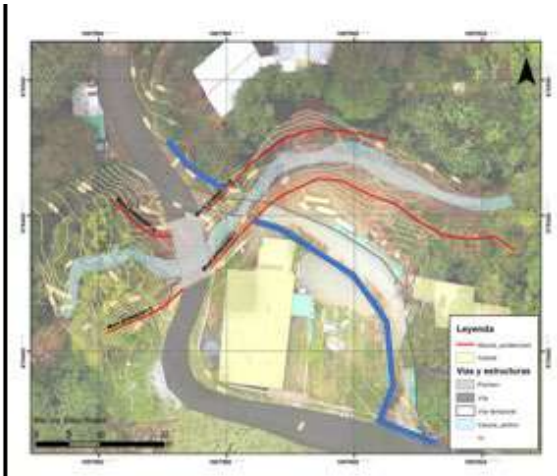

N.P ITEMS NO PREVISTOS

N.P 4 GAVIONES





N.P 5 GEOTEXTIL NT 1600





- **Contrato de obra MP-0889-2023**

1. PRELIMINARES

1.2. LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON:

.



1.4. SEÑAL TIPO SP-101 (VÍA EN CONSTRUCCIÓN):



1.5 SEÑALIZ VERTIC EN LAMINA REFLEC 60.



1.8 MOTOBOMBA 3”



2. EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA

2.1 EXCAVACION CONGLOMER A MAQUINA (CARGUE).



2.3. VOLQUETA 5M3:



2.4. ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS:



2.6. CONFIGURACIÓN NIVEL TERRENO:



4. MURO EN CONCRETO

4.5. ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420MPA:



6. ESTUDIOS Y DISEÑOS

6.1 TOPOGRAFÍA:





6.2. ESTUDIO DE SUELOS:







6.3. ESTUDIO LÍNEAS DE REFRACCIÓN:












6.4 DISEÑO HIDRAULICO OBRAS DE DRENAJE:

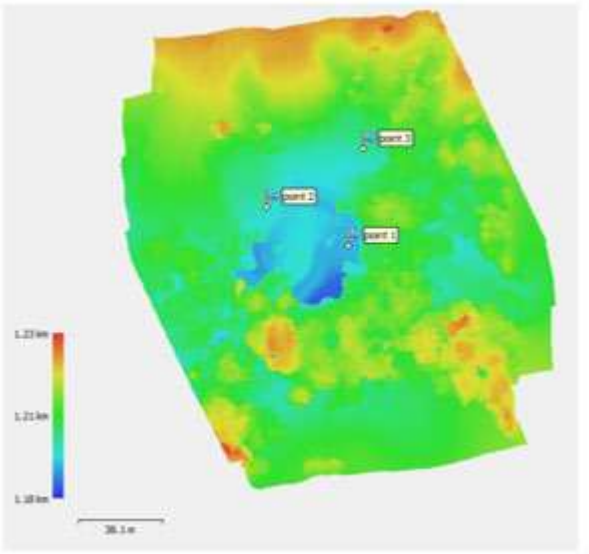

6.5. DISEÑO ESTRUCTURAL MURO:

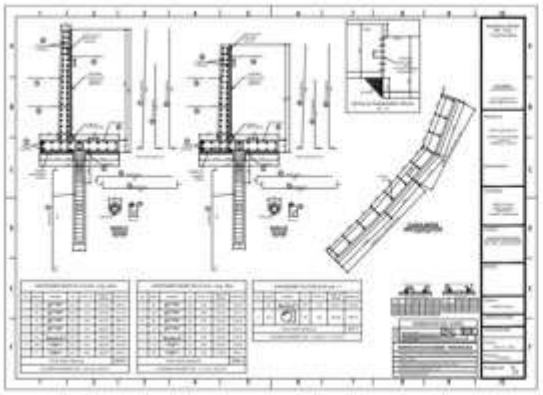


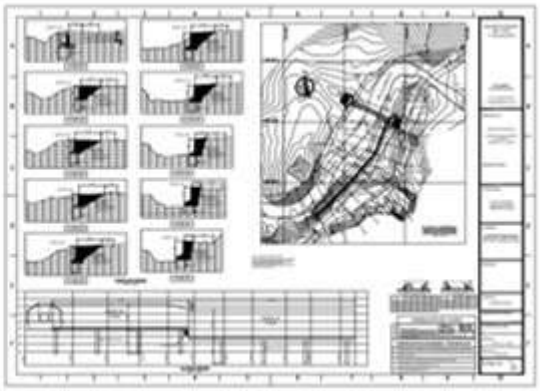


Calle 18N No. 3N-70. Oficina 401 Edificio Noyra. Teléfono Fijo 668 55 24 Cel. 301-2759200; 316-4918891;
Email: cardenascivil99@gmail.com
Cali, Colombia.

EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ

MATRICULA PROFESIONAL No. 76202-16441 VALLE

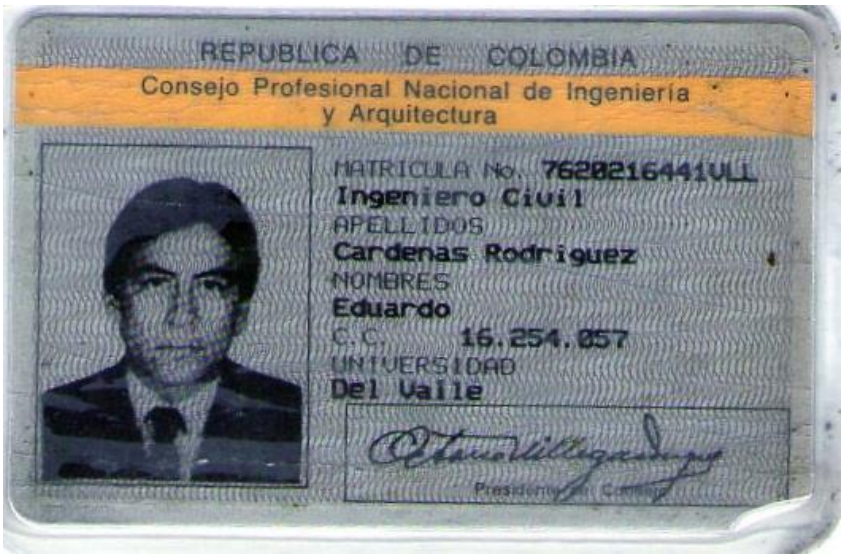

CEDULA EDUARDO CARDENAS

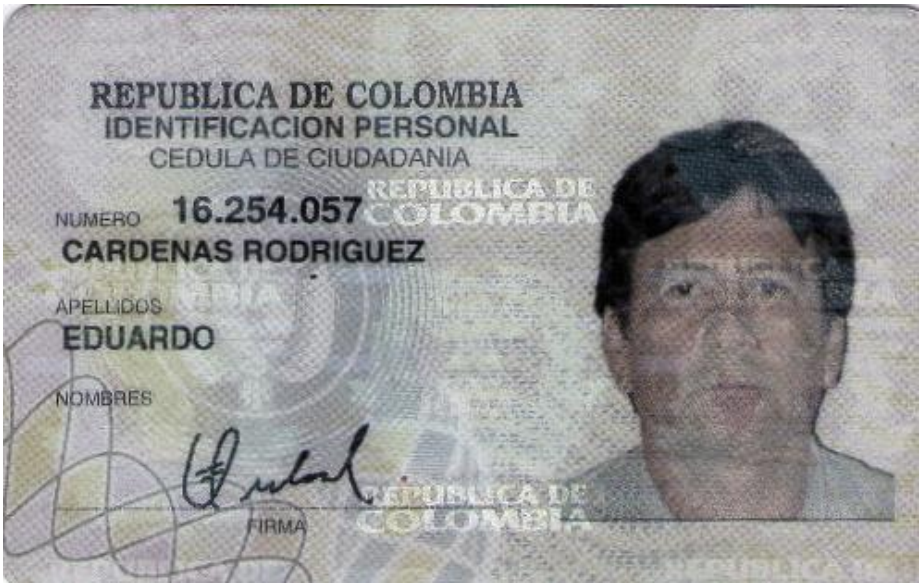



República de Colombia

Municipio de Palmira

NIT 8913800073

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 8949

Fecha 03/08/2023

Señor(es) EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ

C.C o Nit 16254057

Dirección CL 18 NORTE 3 70 AP 701 ED LOYRA

Teléfonos 6026685524

Girado a : EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ

Orden pago No. : 8797

Por concepto de : PAGO PARCIAL No.2 CONTRATO MP-713-2023

Observaciones :

Banco : 23 BANCO OCCIDENTE

Cuenta: 038-91820-7 MP FONDOS ICLD

Cheque No. : Fecha cheque 03/08/23

La suma de : 41.522.686,60

Son : Cuarenta Y Un Millones Quinientos Veintidos Mil Seiscientos Ochenta Y Seis Pesos Con Sesenta Centavos M/Cte.

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Base	%	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	43.185.320,00	1,00	431.853,00
RETEFUENTE	43.185.320,00	11,00	4.750.385,00
RETEIVA	8.205.211,00	15,00	1.230.782,00
ESTAMPILLA UNIVALLE	43.185.320,00	2,00	863.706,00
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	43.185.320,00	1,00	431.853,00
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	43.185.320,00	2,00	863.706,40
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	43.185.320,00	2,00	863.706,00
RETEN. FUENTE POR ICA	43.185.320,00	1,00	431.853,00
		Total	**9.867.844,40**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511173008	51.390.531,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 107715 CONTRATO DE INTE
240722005	0,00	431.853,00	Acta de recibo PARCIAL 107715 CONTRATO DE INTE
240722002	0,00	431.853,00	Acta de recibo PARCIAL 107715 CONTRATO DE INTE
243627010010	0,00	431.853,00	Acta de recibo PARCIAL 107715 CONTRATO DE INTE
240722006	0,00	863.706,00	Acta de recibo PARCIAL 107715 CONTRATO DE INTE
240722001	0,00	863.706,00	Acta de recibo PARCIAL 107715 CONTRATO DE INTE
240706004004	0,00	863.706,40	Acta de recibo PARCIAL 107715 CONTRATO DE INTE
243625005	0,00	1.230.782,00	Acta de recibo PARCIAL 107715 CONTRATO DE INTE
243603011	0,00	4.750.385,00	Acta de recibo PARCIAL 107715 CONTRATO DE INTE
249054001	0,00	41.522.686,60	Acta de recibo PARCIAL 107715 CONTRATO DE INTE
Sumas Iguales	**51.390.531,00**	**51.390.531,00**	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006023579	0,00	41.522.686,60	16254057-Cheque Nro. egreso Nro. 150247 PAGO PA
249054001	41.522.686,60	0,00	16254057-Cheque Nro. egreso Nro. 150247 PAGO PA

República de Colombia

Municipio de Palmira

NIT 8913800073

UNIDAD DE TESORERIA

Sumas Iguales	**41.522.686,60**	**41.522.686,60**

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN

Municipio de Palmira

NIT 8913800073

Estado Acta = VIGENTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 6916

SILVIO STIVENS VALENCIA TOVAR INTERVENTOR DE CONTRATO DE INTERVENTORIA Nro. 713

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ con identificaciòn 16254057 ha cumplido a satisfacción con los compromisos y obligaciones acordadas y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE INTERVENTORIA en referencia.

De acuerdo CONTRATO DE INTERVENTORIA se establece que:

Fecha de firma 20/02/2023

Fecha de iniciación

Duración HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Nro. Fra. Doc Eq. FEEC-100

Valor orden de gasto	190.335.300
Pagos efectuados	100.877.709
Valor acta	51.390.531,00
Saldo pendiente	38.067.060,00
Valor Anticipo	0
Valor Amortizaciones	0

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO PARCIAL No.2 CONTRATO MP-713-2023

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL EN LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS CON OCASIÓN DE LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA POR EL MUNICIPIO DE PALMIRA ¿ VALLE DEL CAUCA, A TRAVES DEL DECRETO No. 011 DEL 16 DE ENERO DE 2023.	43.185.320,00	8.205.211,00
Total:		**43.185.320,00**	**8.205.211,00**

Total recibido 51.390.531,00

- Amortización de anticipo

Valor Cincuenta Y Un Millones Trescientos Noventa Mil Quinientos Treinta Y Un Pesos M/Cte. **51.390.531,00**

Para constancia se firma en Palmira el: 27/07/2023

FIRMADO

SILVIO STEVENS VALENCIA TOVAR

02460154165906-2184350-001819660

FIRMADO

EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ

02460154165527-2184350-001819648

Municipio de Palmira

NIT 8913800073

Estado Acta = VIGENTE

Consecutivo 26049

Fecha del Documento : 27/07/2023

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A SUJETOS NO OBLIGADOS EXPEDIR FACTURA DE VENTA O DOCUMENTO EQUIVALENTE
(Resolución 0042 del 05 de mayo del 2020 expedida por la DIAN)

El MUNICIPIO DE PALMIRA, con número de identificación tributaria 891.380.007-3 debe a:

EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ

Identificacion : 16254057

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO PARCIAL No.2 CONTRATO MP-713-2023

Item	Descripción Detalle Contrato..	Valor	Iva
1	REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL EN LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS CON OCASIÓN DE LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA POR EL MUNICIPIO DE PALMIRA ¿ VALLE DEL CAUCA, A TRAVES DEL DECRETO No. 011 DEL 16 DE ENERO DE 2023.	43.185.320,00	8.205.211,00
Total:		**43.185.320,00**	**8.205.211,00**

Valor de la operación 51.390.531,00

Valor Cincuenta Y Un Millones Trescientos Noventa Mil Quinientos Treinta Y Un Pesos M/Cte. **51.390.531,00**

FIRMADO

EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ
02460154165527-2184350-001819648

EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ
Ingeniero CIVIL

EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ
NIT: 16254057-8
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
cl 18 Norte 3-70ofic 401ED LOYRA, Cali, Valle Del Cauca, Colombia
Tel. 6685524
Email. cardenascivil@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764047921180 válida desde 2023-04-23 hasta 2023-10-23 rango desde FEEC-87 hasta FEEC-500.

Cliente: MUNICIPIO DE PALMIRA
NIT : 891380007-3
Dirección: CL 38 CRA 29 ESQ ED CAMP P 6, Palmira, Valle Del Cauca, Colombia
Teléfono: 2709565
Email: contabilidad@palmira.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 25/08/2023
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FEEC - 100**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **10:10:20**
FECHA FIRMADO: **26/07/2023 10:10:22**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	07	2023	25	08	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	01	HONORARIOS ACTA 02 CONTRATO DE INTERVENTORIANo. MP-0713-2023 REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL EN LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS CON OCASIÓN DE LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA POR EL MUNICIPIO DE PALMIRA ? VALLE DEL CAUCA, A TRAVES DEL DECRETO No. 011 DEL 16 DE ENERO DE 2023	WSD	1,00	$43.185.320,00	19,00	0,00	$43.185.320,00

Notas:
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. MP-0713-2023

SON: (cincuenta y un millones trescientos noventa mil quinientos treinta y un pesos)
CUFE: 064c8a640a1ab0954720f4b5b23d7be67ea084b97d22260ab7350dd097d3ab02d5461e464badc7eca6d0fac07c3613f8

Subtotal:	$43.185.320,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$8.205.211,00
Total:	$51.390.531,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$43.185.320,17	19,00%	$8.205.211,00

Firma Digital: abuIG6Te5yqKAsPV4ln9piylbNQMXfm6Fdxm3ZXLRZC+5MYC8H6JYSJhElRoLsol 9Zy1shD1chv+wPwZa+Q0qFR5b+KF13SZvSRxTgDJ/gvN/7M0kl cL0woVaa6TFuN/ wDI1hWTOvlPHDQuT5oNFUlm5Kar8BoHNcQRej3Ct7d2prRLPYzZs0ev5ZA3m5VKL PN67IxxEl9D+1C9/d0tTMLF4kB7d9nd/u9K 49viWf9wNd4zs21qzDbDWbe7sq8rb 9v2KseqZaVi45u0H/kLjdXO+R1xkleQ15k5GfgpmoLEe9BDqH6e8/TJRKNxDhds vdS+42qzZpOYoHZCBuPt Yw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

SEÑORES
ALCALDIA MUNICIPAL DE PLAMIRA
DIRECTOR DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
Palmira – Valle del Cauca

Referencia: Contrato de Obra Pública No. MP-0711-2023 "ELABORAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE 20 METROS LINEALES DE MURO EN CONCRETO Y UN BOX CULVERT COMO ACCIONES CORRECTIVAS A LOS EFECTOS ADVERSOS GENERADOS POR LA QUEBRADA LOS NARANJOS EN EL SECTOR DE IRACALES CON OCASIÓN DE LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA POR EL MUNICIPIO DE PALMIRA – VALLE DEL CAUCA A TRAVÉS DEL DECRETO 011 DEL 16 DE ENERO DE 2023."

Asunto: CONCEPTO TÉCNICO AMBIENTAL

Cordial saludo,

De acuerdo con la revisión en campo de la obra hasta ahora ejecutada y en relación con los programas del "Plan de Adaptación a la Guía Ambiental - Construcción de MURO EN CONCRETO Y UN BOX CULVERT, en el corregimiento de Ayacucho, sector Iracales del Municipio de Palmira en el Departamento del Valle del Cauca" se presenta el concepto técnico ambiental de la interventoría.

En la siguiente tabla se expone las actividades y su cumplimiento en marco al tiempo en que se ha desarrollado la obra hasta la actualidad:

Actividades	**Cumple**		**Observaciones**
	Si	**No**	
Cumplir con lo dispuesto por Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca(CVC)	X		El proyecto tiene los permisos ambientales ante la autoridad ambiental CVC
Asumir el pago de los servicios públicos consumidos con ocasión de la ejecución de la obra, así como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtención de mismos cuando hubiere lugar a ello.	X		El proyecto no requiere el pago de servicios públicos

Manejo ambiental: Todas las labores de ejecución de obras de concreto estructural se realizarán teniendo en cuenta lo establecido en los estudios o evaluaciones ambientales del proyecto y las disposiciones vigentes sobre la conservación del medio ambiente y losrecursos naturales.	X		En lo observado en campo no se evidencia impacto significativo en la vegetación que comprometa especies importantes.
Materiales: Los materiales provenientes de las excavaciones varias que sean adecuados y necesarios para la ejecución de rellenos deberán ser almacenados por el Constructor para aprovecharlos en la construcción de aquellos, según lo determine el Interventor. Dichos materiales no se podrán desechar ni retirar de la zona de la obra para fines distintos a los definidos en los documentos del Contrato, sin la aprobación previa del Interventor. Los materiales de las excavaciones varias que no sean utilizables deberán ser dispuestosde acuerdo con lo que establezcan losdocumentos del proyecto y las instrucciones del Interventor, en zonas de disposición o desecho aprobadas ambientalmente.	X		En el desarrollo de la obra se observa buen manejo de los materiales de excavaciones siendo estos dispuestos apilados en lugares que afectan poco el paso de los transeúntes y vehículos considerando lo estrecho de algunos tramos.
Limpieza final: Al terminar los trabajos de excavación, el Constructor deberá limpiar y conformar las zonas laterales de la misma y las de disposición de sobrantes.	X		Las actividades se han desarrollado satisfactoriamente lo que ha permitido ejecutar con eficiencia el relleno de las excavaciones y la ejecución de los gaviones en los tiempos programados. El retiro de sobrantes se refiere específicamente al retiro de material orgánico o residuos inorgánicos que puedan afectar las tareas posteriores del relleno.

Manejo ambiental y otras consideraciones: Todas las labores de excavaciones varias se realizarán teniendo en cuenta lo establecido en los estudios o evaluaciones ambientales del proyecto y las disposiciones vigentes sobre la conservación del medio ambiente y de los recursos naturales. Los desvíos provisionales de los cursos de agua no podrán dar lugar a modificaciones permanentes en los lechos de quebradas y ríos. Así mismo, se deberá evitar el represamiento y el empozamiento de agua que puedan originar áreas insalubres causantes de la proliferación de mosquitos y otras plagas.	X		-Se ha dado manejo correcto al cause de la quebrada evitando daños al lecho y al curso normal de la misma; los factores climáticos no han afectado el desarrollo de las actividades

Se recomienda estar atentos a la señalización debido que esta es proclive a ser alterada en cualquier momento por factores climáticos o sociales y no desmejorar en la rigurosidad de la indumentaria del equipo de trabajo.

De acuerdo a lo anterior, se emite concepto ambiental favorable del contrato MP-0711-2023

Cordialmente,

Liesely Karina Romo Lopez

LIESELY ROMO LOPEZ
Ingeniera ambiental
EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ
Interventoría
Mat. Prof. No.76238-302253 VLL

Calle 18N No. 3N-70. Oficina 401 Edificio Noyra. Teléfono Fijo 668 55 24 Cel. 301-2759200; 316-4918891;
Email: cardenascivil99@gmail.com
Cali, Colombia.



INFORME No. 4

INTERVENTORA EN

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -SST

CONTRATO No. MP-711-2023

ELABORAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE 20 METROS LINEALES DE MURO EN CONCRETO Y UN BOX CULVERT COMO ACCIONES CORRECTIVAS A LOS EFECTOS ADVERSOS GENERADOS POR LA QUEBRADA LOS NARANJOS EN EL SECTOR DE IRACALES CON OCASIÓN DE LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA POR EL MUNICIPIO DE PALMIRA – VALLE DEL CAUCA A TRAVÉS DEL DECRETO 011 DEL 16 DE ENERO DE 2023.

PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
JESSICA BOLAÑOS RIVERA
LICENCIA 904 DEL 2 JUNIO 2016

CONTRATISTA DE OBRA

DISEÑOS LICITACIONES E INGENIERÍA SAS

PALMIRA - VALLE DEL CAUCA

31 MAYO A 30 JUNIO 2023

CONTENIDO

1. 3
2. 4
   2.1. 5
   2.2. 6
   2.3. 6
   2.4. 7
   2.5. 7
   2.6. 9
   2.7. 9
      2.7.1. 9
      2.7.2. 9
      2.7.3. 9
      2.7.4. 10
      2.7.5. 11
      2.7.6. 13
      2.7.7. 14
      2.7.8. 15
      2.7.9. 15
      2.7.10. 15
      2.7.11. 15
      2.7.12. 15
      2.7.13. 15
3. 16

TABLAS

Tabla 1. Cantidad de trabajadores para la ejecución del proyecto. 6

Tabla 2. Relación del personal afiliado al Sistema de Seguridad Social. 7

ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Cerramiento en obra 5

Ilustración 2. Campamento en obra. 6

Ilustración 3. Capacitaciones de SST. 10

Ilustración 5. Uso adecuado de los EPP. 12

Ilustración 6. Realización de pausas activas personal en obra 13

Ilustración 7. Realización de pausas activas personal administrativo. 14

Ilustración 8. Señalización en obra 14

1. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO

El objetivo del proyecto con asignación de contrato No. **MP-711-2023** es, elaborar estudios, diseños y construcción de 20 metros lineales de muro en concreto y un box culvert como acciones correctivas a los efectos adversos generados por la quebrada los Naranjos en el sector de Iracales con ocasión de la urgencia manifiesta declarada por el municipio de Palmira – Valle del Cauca a través del decreto 011 del 16 de enero de 2023.

Por las frecuentes lluvias presentadas en la zona el contratista se vio en la obligación de construir un puente provisional para facilitar el ingreso y egreso de las personas del sector, dicho puente, se construye con los siguientes materiales importantes: tablas, dos torres de hierro en ángulo. La medida total del puente construido es de 16 metros lineales

Para este proyecto se requiere que el contratista genere actividades relacionadas con Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin, de preservar la vida e integral de los trabajadores, evitando la ocurrencia de accidentes en el lugar de trabajo; y para ello, la interventoría a cargo ha definido de manera periódica realizar validaciones para garantizar que el contratista cumpla con dichas actividades y se encuentren coherentes con la normatividad vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo.

En el siguiente informe se revisa la ejecución de las actividades planteadas en el plan de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo.

2. ASPECTOS ESPECÍFICOS

Se realiza las siguientes validaciones al contratista DISEÑOS LICITACIONES E INGENIERÍA SAS, relacionado con la obra en el sector de Iracales:

2.1. Cerramiento en obra

Se evidencia que el contratista realiza cerramiento del área a trabajar en obra, tal como se muestra a continuación:

Ilustración 1. Cerramiento en obra



2.2. Campamento en obra

Se evidencia campamento para el personal y almacenamiento de equipo y herramientas de trabajo en obra.

Ilustración 2. Campamento en obra.



2.3. Trabajadores en obra.

El contratista cuenta en el mes de junio con 15 trabajadores, tal como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 1. Cantidad de trabajadores para la ejecución del proyecto.

Periodo	Personal	Cantidad de trabajadores		
31/05/2023 30/06/2023		Número de trabajadores	Ingreso	Egreso
	Administrativo	5	5	
	Operativo	10	10	

2.4. Examen médicos ocupacional

Se evidencia que el contratista realiza exámenes médicos ocupacionales al personal. En caso de requerirse concepto médico se debe solicitar al área de SST.

2.5. Certificación y/o planilla de seguridad social:

Se observa evidencia de afiliación y pago al Sistema de Seguridad Social (SSS) del personal asignado al proyecto tanto administrativo como operativo durante el periodo de junio de 2023, tal como se muestra en la siguiente tabla de afiliación al Sistema de Seguridad Social por trabajador:

Tabla 2. Relación del personal afiliado al Sistema de Seguridad Social.

Nombre del trabajador directo	**Pagos – Seguridad Social**			**Certificados al día**			**Periodo de cotización pagados**
	ARL	**EPS**	**AFP**	**SI**	**NO**	**Observaciones**	**Junio**
Hebert Danny Lopez Posada	Colmena	Coosalud	Protección	x			Ok
Erika Xiomara Olaya Sánchez	Colmena seguros	Emssanar	Porvenir	x		Planilla de seguridad social vigente hasta el 25/07/2023	Ok
Leidy Johana Segura Caicedo	ARL SURA	Nueva EPS	Porvenir	x		Planilla de seguridad social vigente hasta el 19/07/2023	Ok
Luisa Fernanda Castañeda C.	Colmena seguros	Emssanar	Porvenir	x			Ok
Paola Andrea Rodriguez	Colmena seguros	Coosalud	Porvenir	x			Ok
Juan Gavino Tamayo P.	Colmena seguros	Nueva EPS	Porvenir	x			Ok

Nombre del trabajador directo	Pagos – Seguridad Social			Certificados al día			Periodo de cotización pagados
	ARL	EPS	AFP	SI	NO	Observaciones	Junio
Humberto Banguera R.	Colmena seguros	SOS	Porvenir	x			Ok
Hernando Helcias Castro M.	Colmena seguros	Asmet salud	Colpensiones	x			Ok
Carlos Humberto Banguera R.	Colmena seguros	Nueva EPS	Protección	x			Ok
Jan Pol Gil Villada	Colmena seguros	Salud Total	Colpensiones	x			Ok
Janer Alonso loaiza Ocampo	Colmena seguros	Emssanar	Porvenir	x			Ok
Hermain Chagüendo Trujillo	Colmena seguros	Emssanar	Colpensiones	x			Ok
Rodrigo Otero Garcia	Colmena seguros	Emssanar	Colfondos	x			Ok
Amazonas Ermetilde Jaro Lara	Colmena seguros	Nueva EPS	Porvenir	x			Ok
Wilman Salguero Rincón	Colmena seguros	Asmet Salud	Porvenir	x			Ok

Nota. Hasta el día 30 de junio del 2023 prestaron su servicio los siguientes trabajadores: Humberto Banguera Ramos y Carlos Humberto Banguera Ramos (tio y sobrino).

Nombre del trabajador indirecto	Pagos – Seguridad Social			Certificados al día			Periodo de cotización pagados
	ARL	EPS	AFP	SI	NO	Observaciones	Junio
Ruben Dario Escobar Garcia	Sura	Emssanar	Colpensiones	x			Ok

2.6. Plan de trabajo de Seguridad y salud en el trabajo

El contratista cuenta con un plan de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo definido, que se ejecutará durante el transcurso del proyecto.

El contratista reporta una ejecución del 91% del 100% de las actividades planeadas en el plan de trabajo para este proyecto.

2.7. Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo ejecutadas

2.7.1. Asignación de personal SST en obra:

Se evidencia que el director de obra ha definido una persona de Seguridad y Salud en el Trabajo en la obra - operativo, se le pregunta a la persona asignada quien indica que su cargo es SISO en la obra de Iracales. Esta persona es diferente a la profesional de SST asignada por el contratista, esta última tiene a cargo el plan de trabajo y realiza los informes respectivamente.

2.7.2. Asignación del vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo en obra

Se evidencia que el director de obra ha definido como vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo, se le pregunta a la persona asignada quien indica que dentro de sus responsabilidades se encuentra la asignación como vigía de SST.

2.7.3. Mecanismos de comunicación al personal.

Se evidencia que el contratista cuenta como mecanismo de comunicación al personal ayudas didácticas como folletos, reuniones y capacitaciones presenciales.

2.7.4. Capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo - SST

Se evidencia que el contratista realiza capacitaciones sobre Seguridad y Salud en el Trabajo en temas relacionados con:

- Pausas activas.
- Prohibición de consumo de sustancia psicoactivas
- Higiene postural

Ilustración 3. Capacitaciones de SST.



2.7.5. Elementos de protección personal – EPP

Se observa evidencia fotográfica y registro de entrega de los siguientes elementos de protección al personal -EPP, también, aplica para el caso que se requiera reposición:

- Overol manga larga
- Casco amarillo
- Guantes para construcción
- Gafas de seguridad con filtro UV
- Botas punteras
- Mascarilla N95 para el polvo
- Protectores auditivos- tipo copa

El contratista cuenta con las fichas técnicas de los Elementos de Protección Personal – EPP.

Adicional, a la entrega de los EPP, se evidencia que los trabajadores utilizan adecuadamente los mismos de acuerdo con la labor a realizar, tal como se muestra en la siguiente ilustración:

Ilustración 5. Uso adecuado de los EPP.



También, se observa evidencia de acta de compromiso firmada por los trabajadores sobre el uso adecuado de los EPP.

2.7.6. Pausas activas

El contratista fomenta la realización de pausas activas en el lugar de trabajo, tal como se muestra a continuación:

Ilustración 6. Realización de pausas activas personal en obra



Ilustración 7. Realización de pausas activas personal administrativo.



2.7.7. Señalización en el lugar de trabajo

Se evidencia que el contratista ha instalado señalización, tal como, se muestra a continuación

Ilustración 8. Señalización en obra



2.7.8. Volquetas y maquinaria amarilla

Se evidencia que el contratista durante el mes de junio requiere el uso de maquinaria amarilla, el cual, presenta documentación.

2.7.9. Equipos y herramientas de trabajo

Se evidencia que el contratista utiliza herramientas manuales, las cuales se encuentran en buen estado y funcionamiento. Adicionalmente, se evidencia que el personal de SST en compañía del vigía de SST realiza inspección a los equipos y herramientas.

2.7.10. Inspecciones de Seguridad y salud en el trabajo en el lugar de trabajo

Se evidencia que el contratista realiza inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo en obra, con el fin, de identificar los peligros a los cuales se exponen los trabajadores.

2.7.11. Bitácora de Seguridad y Salud en el Trabajo

El contratista refiere diligenciamiento la bitácora registrando las actividades realizadas sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.

2.7.12. Investigación de accidentalidad

El contratista reporta dos accidentes de trabajo en el mes de mayo, genera el FURAT, y presenta copia del mismo al trabajador y a la IPS de atención.

Adicional, realiza investigación de los accidentes de trabajos, con ejecución de algunas medidas de intervención a los mismos.

2.7.13. Indicadores

Frecuencia de accidentalidad

En el mes de mayo se presentaron 2 accidentes de trabajo.

En el mes de junio se presentaron 0 accidentes de trabajo.

Severidad de accidentalidad

En el mes de mayo se perdieron 0 días por accidente de trabajo.

En el mes de junio se perdieron 0 días por accidentes de trabajo.

Ausentismo por causa médica

En el mes de mayo se perdieron 36% de días programados de trabajo por incapacidad médica.

En el mes de junio se perdieron 67% de días programados de trabajo por incapacidad médica.

3. CONCLUSIONES Y SOLICITUDES AL CONTRATISTA

El contratista atiende a las solicitudes encomendadas en los anteriores informes, las siguientes solicitudes quedan subsanadas:

- El radicado de afiliación a la EPS de Hernando Banguera (está pendiente de que la EPS lo emita).
- La carta o certificado de asignación de personal SST en obra.
- La carta o certificado de asignación vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo en obra.
- Los certificados y/o planilla de seguridad social del profesional en SST.
- El registro de asistencia de la inducción de SST
- Las fichas técnicas de los elementos de protección personal
- La instalación de las demás señalizaciones (Uso obligatorio EPP, peligro de excavación, prohibido el ingreso a personal no autorizado, etc.).
- Los certificados y/o planilla de seguridad social del director de obra.
- Los certificados y/o planilla de seguridad social del director de obra.
- Se evidencia investigación del accidente de trabajo presentado en el mes de mayo y junio (18 mayo,31 mayo).
- Documentación de la maquinaria amarilla el SOAT y la Técnico mecánica.

Se solicita al contratista atender los siguientes aspectos relacionados con Seguridad y Salud en el Trabajo:

- Curso virtual de capacitación de cincuenta (50) horas en SST para el personal de Seguridad.

- Continuar con la señalización relacionado con Seguridad y Salud en el Trabajo (señalización de los peligros a los que se exponen los trabajadores, prohibido el ingreso a personal no autorizado, etc).
- Pendiente plano sobre las coordenadas de rutas de evacuación y punto de encuentro.
- Pendiente evidencia del diligenciamiento de la bitácora.

Elaboró Jessica Bolaños Rivera Asesora externa Licencia # 904 /2016 Profesional en salud ocupacional	Revisó interventoría	Aprobó interventoría

SEÑORES
ALCALDIA MUNICIPAL DE PLAMIRA
DIRECTOR DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
Palmira – Valle del Cauca

Referencia: Contrato de Obra Pública No. MP-0889-2023 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 55 METROS LINEALES DE MURO EN CONCRETO COMO ACCIÓN CORRECTIVA A LOS EFECTOS GENERADOS SOBRE LA VÍA POR LA QUEBRADA LOS VAQUEROS SOBRE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DE PALMIRA CON LA ZAPATA.

Asunto: CONCEPTO TÉCNICO AMBIENTAL

Cordial saludo,

De acuerdo con la revisión en campo de la obra hasta ahora ejecutada y en relación con los programas del "Diseño y construcción de 55 metros lineales de muro en concreto como acción correctiva a los efectos generados sobre la vía por la quebrada Los Vaqueros sobre la vía que comunica el casco urbano de Palmira con La Zapata. se presenta el concepto técnico ambiental de la interventoría.

En la siguiente tabla se expone las actividades y su cumplimiento en marco al tiempo en que se ha desarrollado la obra hasta la actualidad:

Actividades	**Cumple**		**Observaciones**
	Si	**No**	
Cumplir con lo dispuesto por Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca(CVC)	X		El proyecto cuenta con los permisos ambientales ante la autoridad ambiental CVC
Asumir el pago de los servicios públicos consumidos con ocasión de la ejecución de la obra, así como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtención de mismos cuando hubiere lugar a ello.	X		El proyecto no requiere el pago de servicios públicos

Manejo ambiental: Todas las labores de ejecución de obras de concreto estructural se realizarán teniendo en cuenta lo establecido en los estudios o evaluaciones ambientales del proyecto y las disposiciones vigentes sobre la conservación del medio ambiente y losrecursos naturales.	X		En lo observado en campo no se evidencia impacto significativo en la vegetación que comprometa especies importantes. Se tiene permiso para la tala de cuatro árboles (1 Yarumo y 3 carboneros) por riesgo de volcamiento.
Materiales: Los materiales provenientes de las excavaciones varias que sean adecuados y necesarios para la ejecución de rellenos deberán ser almacenados por el Constructor para aprovecharlos en la construcción de aquellos, según lo determine el Interventor. Dichos materiales no se podrán desechar ni retirar de la zona de la obra para fines distintos a los definidos en los documentos del Contrato, sin la aprobación previa del Interventor. Los materiales de las excavaciones varias que no sean utilizables deberán ser dispuestosde acuerdo con lo que establezcan losdocumentos del proyecto y las instrucciones del Interventor, en zonas de disposición o desecho aprobadas ambientalmente.	X		En el desarrollo de la obra se observa buen manejo de los materiales de excavaciones siendo estos dispuestos apilados en lugares que no afectan el paso de los transeúntes y vehículos.
Limpieza final: Al terminar los trabajos de excavación, el Constructor deberá limpiar y conformar las zonas laterales de la misma y las de disposición de sobrantes.	X		Las actividades se han desarrollado satisfactoriamente lo que ha permitido ejecutar con eficiencia las actividades de relleno y las excavaciones en los tiempos programados. -Es importante precisar que para Las profundidades de excavación que se están manejando en la obra no hay necesidad de acodalamiento, ni tampoco el uso de taludes demasiado inclinados.

			-El retiro de sobrantes se refiere específicamente al retiro de material orgánico o residuos inorgánicos que puedan afectar las tareas posteriores del relleno.
Manejo ambiental y otras consideraciones: Todas las labores de excavaciones varias se realizarán teniendo en cuenta lo establecido en los estudios o evaluaciones ambientales del proyecto y las disposiciones vigentes sobre la conservación del medio ambiente y de los recursos naturales. Los desvíos provisionales de los cursos de agua no podrán dar lugar a modificaciones permanentes en los lechos de quebradas y ríos. Así mismo, se deberá evitar el represamiento y el empozamiento de agua que puedan originar áreas insalubres causantes de la proliferación de mosquitos y otras plagas.	X		No ser han presentado incidentes ambientales durante el periodo de este informe.

Se recomienda estar atentos a la señalización debido que esta es proclive a ser alterada en cualquier momento por factores climáticos o sociales y no desmejorar en la rigurosidad de la indumentaria del equipo de trabajo.

De acuerdo a lo anterior, se emite concepto ambiental favorable del contrato MP-0889-2023

Cordialmente,

Liesely Karina Romo Lopez

LIESELY ROMO LOPEZ
Ingeniera ambiental
EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ
Interventoría
Mat. Prof. No.76238-302253 VLL



INFORME No. 3

INTERVENTORA EN

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -SST

CONTRATO No. MP-0889-2023

DISEÑAR Y CONSTRUIR 55 METROS LINEALES DE MURO EN CONCRETO COMO ACCIONES CORRECTIVAS A LOS EFECTOS GENERADOS POR LA QUEBRADA LOS VAQUEROS SOBRE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DE PALMIRA CON LA ZAPATA.

PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
JESSICA BOLAÑOS RIVERA
LICENCIA 904 DEL 2 JUNIO 2016

CONTRATISTA DE OBRA

DISEÑOS Y OBRAS DE INGENIERÍA R+N SAS

PALMIRA - VALLE DEL CAUCA

12 MAYO A 21 JUNIO 2023

EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ
Ingeniero CIVIL

CONTENIDO

1. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO 4
2. ASPECTOS ESPECIFICOS 5
2.1. Campamento en obra 5
2.2. Cerramiento en obra. 6
2.3. Trabajadores en obra. 7
2.4. Certificación y/o planilla de seguridad social: 7
2.5. Plan de trabajo de Seguridad y salud en el trabajo 8
2.6. Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo ejecutadas 8
2.4.1. Asignación de personal SST en obra: 8
2.4.2. Asignación del vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo en obra 9
2.4.3. Examen médico ocupacional al personal: 9
2.4.4. Capacitaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo 10
2.4.5. Elementos de protección personal – EPP 11
2.4.6. Pausas activas 12
2.4.7. Señalización en el lugar de trabajo 13
2.4.8. Volquetas y maquinaria amarilla 13
2.4.9. Herramientas y equipos de trabajo 14
2.4.10. Matriz de identificación de peligro, evaluación y valoración del riesgo 14
2.4.11. Matriz de requisitos legales 14
2.4.12. Bitácora 14
2.4.13. Indicadores 14
3. CONCLUSIONES Y SOLICITUDES AL CONTRATISTA 15

TABLAS

Tabla 1. Cantidad de trabajadores para la ejecución del proyecto 7

Tabla 2. Relación del personal afiliado al Sistema de Seguridad Social 7

ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Campamento en obra. 5

Ilustración 2. Cerramiento en obra. 6

Ilustración 3. Capacitaciones SST 10

Ilustración 4. Uso adecuado de EPP. 11

Ilustración 5. Realización de pausas activas. 12

Ilustración 6. Señalización en obra. 13

1. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO

El objetivo del proyecto con asignación de contrato no. MP-0889-2023 diseñar y construir 55 metros lineales de muro en concreto como acciones correctivas a los efectos generados por la Quebrada los Vaqueros sobre la vía que comunica el casco urbano de Palmira con la Zapata.

Para este proyecto se requiere que el contratista genere actividades relacionadas con Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin, de preservar la vida e integral de los trabajadores, evitando la ocurrencia de accidentes en el lugar de trabajo; y para ello, la interventoría a cargo, ha definido de manera periódica realizar validaciones para garantizar que el contratista cumpla con dichas actividades y se encuentren coherentes con la normatividad vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo.

2. ASPECTOS ESPECÍFICOS

Se realiza las siguientes validaciones al contratista DISEÑOS Y OBRAS DE INGENIERÍA R+N SAS, relacionado con la obra en el sector de la Zapata:

2.1. Campamento en obra

El contratista garantiza la construcción del campamento en obra.

Ilustración 1. Campamento en obra.



2.2. Cerramiento en obra.

El contratista garantiza el cerramiento en obra.

Ilustración 2. Cerramiento en obra.



2.3. Trabajadores en obra.

El contratista cuenta en este periodo con 9 trabajadores, tal como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 1. Cantidad de trabajadores para la ejecución del proyecto

Periodo	Personal	Cantidad de trabajadores		
12/05/2023 21/06/2023		Número de trabajadores	Ingreso	Egreso
	Administrativo	3	3	
	Operativo	6	6	

2.4. Certificación y/o planilla de seguridad social:

Se observa evidencia de afiliación al Sistema de Seguridad Social (SSS) del personal asignado al proyecto durante este periodo de tiempo, tal como se muestra en la siguiente tabla de afiliación al Sistema de Seguridad Social por trabajador:

Tabla 2. Relación del personal afiliado al Sistema de Seguridad Social

Nombre del trabajador directo	Seguridad Social			Certificados al día			Periodo de cotización pagados	
	ARL	EPS	AFP	SI	NO	Observaciones	Abril	Mayo
Nilson Javier Barrios	ARL SURA	NUEVA EPS	Porvenir	x			Ok	Ok
David Felipe Valdes Rodriguez	ARL SURA	SOS	Colpensiones	x		Planilla pagada de SS presentada del mes de febrero, inició labores como inspector de obra en el mes de febrero	Ok	Ok
Ana Mileth Tobar Arrieta	ARL SURA	Emssanar	Colpensiones	x			Ok	Ok
Luis Alberto Murillo	ARL SURA	Nueva EPS	Colpensiones	x			Ok	Ok

Nombre del trabajador directo	Seguridad Social			Certificados al día			Periodo de cotización pagados	
	ARL	EPS	AFP	SI	NO	Observaciones	Abril	Mayo
Víctor Manuel Banguera Vivas	ARL SURA	Salud Total	Colpensiones	x			Ok	Ok
Jose Arley Cruz Villa	ARL SURA	Nueva EPS	Colpensiones	x			Ok	Ok
Miguel Antonio Santacruz	ARL SURA	SURA			x	Pendiente certificado AFP, afiliado a la ARL desde 21/06/2023		
Miguel Angel Franco	ARL SURA	SURA	Porvenir	x		Afiliado a la ARL desde 15/06/2023		
Jose Anibal Ramirez	ARL SURA	SURA	Colpensiones	x		Afiliado a la ARL desde 15/06/2023		

Nombre del trabajador indirecto	Pagos – Seguridad Social			Certificados al día			Periodo de cotización pagado	
	ARL	EPS	AFP	SI	NO	Observaciones	Abril	Mayo
Javier Jaramillo	Sura	Sura	Colpensiones			Maquinista	X	X

2.5. Plan de trabajo de Seguridad y salud en el trabajo

El contratista cuenta con un plan de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo definido, que se ejecutará durante el transcurso del proyecto.

2.6. Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo ejecutadas

2.4.1. Asignación de personal SST en obra:

Se evidencia que el director de obra ha definido una persona de Seguridad y Salud en el Trabajo en la obra - operativo, se le pregunta a la persona asignada quien

indica que su cargo es Profesional de SST en la obra de la Zapata. Esta persona tiene a cargo el plan de trabajo y realiza los informes respectivamente.

2.4.2. Asignación del vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo en obra

Se evidencia que el director de obra ha definido como vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo, se le pregunta a la persona asignada quien indica que dentro de sus responsabilidades se encuentra la asignación como vigía de SST. El contratista cuenta con la carta de asignación vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo en obra.

2.4.3. Examen médico ocupacional al personal:

Se evidencia que el contratista realiza exámenes médicos ocupacionales al personal, que, en caso de requerir los conceptos médicos, se deben solicitar al área de SST.

2.4.4. Capacitaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo

Se evidencia que el contratista realiza capacitaciones de Seguridad y Salud en el trabajo, incluyendo inducción al personal nuevo, uso de los elementos de protección personal, charlas de seguridad en orden y aseo, manejo manual de cargas, reporte de accidentes de trabajo, manejo adecuado de las herramientas y maquinas; tal como se muestra en la siguiente imagen:

Ilustración 3. Capacitaciones SST



2.4.5. Elementos de protección personal – EPP

Se observa evidencia fotográfica y registro de entrega de los siguientes elementos de protección al personal -EPP:

- Overol manga larga
- Casco de seguridad
- Protección auditiva (Tapaoidos)
- Tapabocas
- Gafas de seguridad con filtro UV
- Guantes para construcción
- Botas punteras

Adicional, a la entrega de los EPP, se evidencia que los trabajadores utilizan adecuadamente los mismos de acuerdo con la labor a realizar, tal como se muestra en la siguiente ilustración:

Ilustración 4. Uso adecuado de EPP.



El contratista cuenta con las fichas técnicas de los elementos de protección personal.

También, se evidencia que el contratista realiza inspección de los EPP, y reposición en caso de ser necesario.

2.4.6. Pausas activas

El contratista fomenta la realización de pausas activas en el lugar de trabajo, tal como se muestra a continuación:

Ilustración 5. Realización de pausas activas.





2.4.7. Señalización en el lugar de trabajo

Se evidencia que el contratista ha instalado señalización, tal como, se muestra a continuación:

Ilustración 6. Señalización en obra.



Nota.

Se indica al contratista continuar con la instalación de las demás señalizaciones (Uso obligatorio EPP, peligro de excavación, prohibido el ingreso a personal no autorizado, etc.).

2.4.8. Volquetas y maquinaria amarilla

El contratista utiliza volqueta y maquinaria amarilla, cuenta con la respectiva documentación, incluyendo seguridad social.

2.4.9. Herramientas y equipos de trabajo

El contratista utiliza herramientas manuales, que dentro de su plan de trabajo realizará inspección del estado de las mismas de manera bimensual.

2.4.10. Matriz de identificación de peligro, evaluación y valoración del riesgo

El contratista dentro de su plan de trabajo tiene contemplado la construcción de la matriz de identificación de peligro, evaluación y valoración del riesgo.

2.4.11. Matriz de requisitos legales

El contratista cuenta con la matriz de requisitos legales.

2.4.12. Bitácora

El contratista cuenta con una bitácora, donde se evidencia el registro de los realizados en obra, incluyendo herramientas y maquinaria utilizada, junto con el personal de obra.

2.4.13. Indicadores

Frecuencia de accidentalidad

En el mes de abril se presentaron 0 accidentes de trabajo.

En el mes de mayo se presentaron 0 accidentes de trabajo.

Severidad de accidentalidad

En el mes de abril se presentaron 0 accidentes de trabajo.

En el mes de mayo se presentaron 0 accidentes de trabajo.

Ausentismo por causa médica

En el mes de abril se perdió 0% de días programados de trabajo por incapacidad médica.

En el mes de abril se perdió 0% de días programados de trabajo por incapacidad médica.

3. CONCLUSIONES Y SOLICITUDES AL CONTRATISTA

Del informe anterior, se subsana:

- La carta o certificado de asignación de personal SST en obra.

Se solicita al contratista atender los siguientes aspectos relacionados con Seguridad y Salud en el Trabajo:

- La instalación de las demás señalizaciones (Uso obligatorio EPP, peligro de excavación, prohibido el ingreso a personal no autorizado, etc.).
- La asistencia del personal del proyecto a la obra debe ser con vestuario adecuado (camisa manga larga, pantalón sin rotos, casco, botas de seguridad, etc).
- Continuar con la verificación del personal de maquinaria, incluyendo, seguridad social vigente, mantenimiento de la maquinaria y demás.
- Pendiente certificado AFP de Miguel Antonio Santacruz

Elaboró	Revisó interventoría	Aprobó interventoría
Jessica Bolaños Rivera Asesora externa Licencia # 904 /2016. Profesional en salud ocupacional		

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR	
	2.1 No. Pago	2.2 Fecha del Pago		4.1 Nombre	4.2 Cargo
MP-713-2023	02	jueves, 27 de julio de 2023	SUPERVISIÓN	SILVIO STIVENS VALENCIA TOVAR	DIRECTOR GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ	16.254.057	23-feb-2023	20-sep-2023	7,0	5,1	73,68%

5.8 Objeto del Contrato

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL EN LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS CON OCASIÓN DE LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA POR EL MUNICIPIO DE PALMIRA – VALLE DEL CAUCA, A TRAVÉS DEL DECRETO No. 011 DEL 16 DE ENERO DE 2023

5.9 Forma de Pago	5.10 Descripción	5.11 Valores	5.12 Duración (Meses)	5.13 Ejecución (Meses)	5.14 Tiempo Ejecutado (%)
EL MUNICIPIO DE PALMIRA pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, mediante acta de avance, según corresponda al porcentaje de ejecución.	5.10.1 Contrato Inicial	$ 190.335.300	6,97	5,13	73,68%
	5.10.2 Adiciones al Contrato				
	5.10.3 Suspensiones al Contrato				
	5.10.4 Total Contrato + Adiciones	**$ 190.335.300**	**6,97**	**5,13**	**73,68%**
	5.10.5 Nueva Fecha Final				

7. DOCUMENTACIÓN ENTREGADA

7.1 No.	7.2 Documento	7.3 Documentos en la Carpeta Digital de la Dependencia	7.4 Entregados a la Dirección de Contratación	7.5 Entregados a la Secretaría de Hacienda
1	Radicado en la Secretaría de Hacienda			
2	Orden de Pago (SIIF)	X		
3	Acta de Recibo (SIIF) o Entrada Almacén			
4	Minuta del Contrato (SIIF)	X	No Aplica	
5	Acta de Inicio	X	No Aplica	
6	Informe de Actividades y soportes	X		No Aplica
7	Informe del Supervisor	X		No Aplica
8	Factura o Documento equivalente	X		
9	Pago Seguridad Social	X		
10	Certificación de Parafiscales	X		
11	Certificación Bancaria	X	No Aplica	

8. SEGUIMIENTO

8.1 Item	8.2 Actividades Generales	8.3 SI / NO	8.4 Observaciones
1	Conoce y entiende los términos y condiciones del contrato	SI	El Contratista ha leído y entiende los términos y condiciones del contrato, NO se han materializado riesgos previstos en la matriz de riesgos del contrato, el contrato ha presentado un desarrollo normal y cordial entre las partes, el contratista organiza y administra el recibo de bienes y servicios establecidos en el contrato, el contratista está dando cumplimiento a los bienes y/o servicios establecidos en el contrato, el contratista presenta soportes de la ejecución contractual, durante el período del informe se desarrollaron reuniones de seguimiento.
2	Se ha materializado algún riesgo planteado en la matriz de riesgos del Contrato	NO	
3	Se han presentado controversias entre las partes	NO	
4	Se organiza y administra el recibo de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato	SI	
5	Se ha presentado rechazo justificado de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato	NO	
6	Se ha presentado incumplimientos del proveedor o contratista al presentar los soportes correspondientes	NO	
7	Se ha solicitado informes y convocado a reuniones para el cumplimiento de la función de supervisor	SI	

8.5 Item	8.6 Seguimiento Administrativo	8.7 SI / NO	8.8 Observaciones
1	Se encuentra completo el expediente físico y electrónico con los informes previstos	SI	El expediente físico y electrónico del contrato se encuentra completo y al día, las garantías del contrato se encuentran al día, No se hicieron requerimientos por parte de los entes de control, se ha dado cumplimiento a la publicación de los documentos del contrato en el SIIF y en el SECOP, el contratista está cumpliendo con sus obligaciones en materia de seguridad social y salud en el trabajo, como también el cumplimiento de normas legales
2	Las pólizas y garantías del contrato se encuentran vigentes	SI	
3	Han solicitado los organismos de control informes y el contratista los ha presentado	No Aplica	
4	Se cargó en los tiempos, los documentos del Contrato en el SIIF y se garantizó el principio de publicidad	SI	
5	Se ha verificado el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de Seguridad Social, Seguridad y Salud en el Trabajo, Planes de Contingencia, Normas ambientales, Planes de Emergencia y cualquier otra norma aplicable al contrato	SI	

8.9 Item	8.10 Seguridad y Salud en el Trabajo (Personas Naturales y Jurídicas)	8.11 SI / NO	8.12 Observaciones
1	Aportó los elementos necesarios de protección personal para el desempeño de sus actividades	SI	el contratista está cumpliendo con la utilización de los elementos de protección personal necesarios, , , El contratista presentó novedades de accidente o incidentes de trabajo pero no aportó soportes
2	Aportó las certificaciones de competencias requeridas o necesarias para desarrollar las tareas de alto riesgo	No Aplica	
3	Aportó el permiso de trabajo para el desarrollo de las tareas de alto riesgo avaldo por SST	No Aplica	
4	Se recibieron reportes de accidentes e incidentes de trabajo	NO	

8.13 Item	8.14 Seguridad y Salud en el Trabajo (Solo Personas Jurídicas)	8.15 SI / NO	8.16 Observaciones
1	Aportó certificación de avance de la Resolución 1111 de 2017 (Plazos para implementar el SST), avalada por el SST	No Aplica	, ,
2	Aportó el Plan Anual de Trabajo	No Aplica	
3	Aportó el Plan Anual de Capacitaciones	No Aplica	

8.17 Item	8.18 Seguimiento Técnico	8.19 SI / NO	8.20 Observaciones
1	Se ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables	SI	El contratista ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables al contrato, El contratista está cumpliendo con las condiciones ofrecidas en el contrato, El Contratista no ha hecho solicitudes de ajustes o cambios en las condiciones del contrato, El Contratista, durante el período del informe no hizo solicitudes o requerimientos técnicos, El Contratista, durante el período del informe, no ha presentado incumplimientos en los que se necesite aplicar las garantías del contrato
2	Se ha revisado que el contratista o su equipo cumpla las condiciones ofrecidas de acuerdo a lo previsto en el contrato	SI	
3	Se han requerido cambios o ajustes en las condiciones el contrato	NO	
4	Se han recibido solicitudes o requerimientos técnicos por parte del contratista y se han dado las recomendaciones respectivas.	NO	
5	El contrato ha tenido la necesidad de hacer efectivas las garantías	NO	

9. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

9.1 No.	9.2 Obligación Contractual	9.3 Actividad Desarrollada	9.4 Anexos o Sorpotes de Evidencia	9.5 Cumple	9.6 Observaciones
1	Requerir a los contratistas de obra el cronograma y plan de trabajo detallado, en el que se especifiquen las fechas de entrega de las actividades requeridas y aprobar dichos documentos en aras de dar inicio a las respectivas actividades. Realizar de manera conjunta con el contratista, las modificaciones necesarias para la ejecución efectiva de los contratos.	Actividad desarrollada una se firmo acta de inicio	Acta numero 1, del Interventor con el contratista y supervision para dar inicio a la ejecucion de cada una de las obras. 2. Actas de comites de obra. 3. Actas de ejecución, o modificación.	SI	
2	Solicitar y recibir de Dirección de Gestión del Riesgo y el Desastre la información necesaria tanto para los contratos de obra como el de Interventoría como para el desarrollo de los contratos.				El contratista tiene acceso a toda la información ya que esta se encuentra cargada en el SECOPII, y la que no repose en esta plataforma debera ser solicitada por escrito ante la supervision.
3	Revisar y estudiar los documentos e información en general suministrados por el Jefe de la Sección, con el propósito de establecer criterios claros y precisos sobre el proyecto, de modo tal que pueda realizar de manera efectiva las labores encomendadas.	1. Solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución del contrato objeto de la interventoría. 2. Mantener informado a la supervisión y/o al Ordenador del Gasto de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando tal incumplimiento se presente. 3. Solicitar el trámite respectivo para los eventos de adición, prórroga, cesión o cualquier modificación del contrato.	INFORME DE INTERVENTORIA PARA EL PAGO PARCIAL No. 2 y anexos	SI	

4	Efectuar una visita al sitio donde se ejecutará el proyecto con los Contratistas con el fin de verificar sus condiciones y confirmar el inicio de las obras derivadas de la urgencia manifiesta.	Se evidencia en cada uno de los informes presentados para soportar cada acta tramitada para pago.	Informes de interventoria y revisar bitacora de trabajo en la cual se lleva registro (firmas) del personal que vista cada obra.	SI	
5	Verificar las cantidades de obra establecidas en el contrato a partir de la información suministrada, y presentar un informe sobre aspectos que repercutan en el normal desarrollo del contrato.7. Conocer los procedimientos internos de orden técnico, administrativo, legal, financiero y ambiental establecidos en la entidad para los contratos de Interventoría y de obra con el fin de realizar los trámites correspondientes eficaz y oportunamente.	Se evidencia en cada uno de los informes presentados para soportar cada acta tramitada para pago de los contratos objeto de interventoria	VINFORME DE INTERVENTORIA PARA EL PAGO PARCIAL No. 2 y anexos - Ver informes de interventoria y actas de modificacion de cantidades de obra	SI	
6	Garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas consignadas en la invitación, los estudios y diseños y demás normas y leyes vigentes según el caso. La calidad y ejecución de las obras deberán cumplir con lo ofertado en la propuesta entregada y seleccionada por la Entidad, conforme al cronograma pactado y aceptado por las partes.	Se evidencia en cada uno de los informes presentados para soportar cada acta tramitada para pago de los contratos objeto de interventoria	INFORME DE INTERVENTORIA PARA EL PAGO PARCIAL No. 2 y anexos		
7	Revisar con el Contratista antes y durante la ejecución del contrato, las referencias topográficas (puntos topográficos, coordenadas y cotas), de tal forma que le permitan al constructor localizar adecuadamente el proyecto sobre el terreno. Exigirle al Contratista la permanencia de las referencias topográficas establecidas, su protección, traslado o reposición cuando sea necesario	Informes de topografia los cuales son parte integral de los informes de avance cuando hay lugar para ello, por ejemplo. Localizacion y replanteo, movimiento de tierras entre otras actividades como son el desarrollo de los diseños arquitectonicos y estructurales de cada una de las obras planteadas.	informes de topografia los cuales hacen parte integral de los informes de avance de obra.	SI	
8	Verificar que se cumpla con la calidad de las obras ejecutadas.	El contratista realiza informes de seguimiento	Registro fotografico aportado en los informes y en los estudios y diseños aportados.	SI	
9	Efectuar ensayos de laboratorio, control de calidad de los materiales a partir de lo establecido en las especificaciones técnicas, control de la ejecución del proyecto, control de los métodos constructivos, controles topográficos de las secciones, localización y nivelación de los elementos estructurales (si para el caso aplica)	El contratista realizó el control de calidad de materiales y equipos	INFORME DE INTERVENTORIA PARA EL PAGO PARCIAL No. 2 y anexos	SI	
10	En caso de incumplimiento se abstendrá de recibir la obra e informará por escrito a la Dirección en aras de que se inicien los respectivos trámites contractuales de incumplimiento, garantías, clausula penal etc.	N/A			La situación no se ha presentado hasta el momento
11	Informar oportunamente sobre eventualidades que puedan surgir y que impliquen retraso en el desarrollo del contrato.	El contratista a presentado en los informes de interventoria las eventualidades presentadas en ejecucion del contrato	INFORME DE INTERVENTORIA PARA EL PAGO PARCIAL No. 2 y anexos	SI	
12	14. Presentar conjuntamente con el contratista de obra, las respectivas actas de avance de obra, Acta final de obra y el Acta de liquidación final con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	El contratista presenta los informes realizados en ejecucion de la auditoria a los contratos Mp-711-2023 y MP-0889-2023	Informes anexos de interventoria en cada acta parcial de obra.	SI	
13	Cumplir con las obligaciones referidas al pago de aportes de seguridad social integral y aportes parafiscales, de acuerdo con lo establecido en la Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes o complementarias, en materia de aportes a seguridad social y pago de parafiscales, vigentes a la fecha de presentación de la propuesta y durante la vigencia del contrato	El contratista aporta planillas pagadas de seguridad social de 5 personas de los meses de mayo a junio de 2023	INFORME DE INTERVENTORIA PARA EL PAGO PARCIAL No. 2	SI	

10. SEGUIMIENTO FINANCIERO, CONTABLE, FISCAL Y JURÍDICO

10.1 Item	10.2 Seguimiento Financiero y Contable	10.3 SI / NO	10.4 Observaciones
1	Se hace seguimiento a la gestión financiera del contrato (Registro Presupuestal, Planeación de los pagos previstos y disponibilidad de caja)	SI	La revisión del avance financiero, se hizo al momento de la presentación de los documentos para el respectivo pago, La revisión de los documentos necesarios para el pago, se hizo al momento de la presentación de los respectivos documentos (ver soportes del pago), , El Contrato no presenta situaciones que afectan el valor total del contrato
2	Se hace revisión de los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del contrato	SI	
3	Se ha hecho entrega de anticipos y se han amortizado en los terminos de la Ley y del contrato	No Aplica	
4	Se ha presentado modificaciones en la actividades que afecten el valor inicial del contrato	NO	

10.5 Estado fiscal del contrato

10.5.1 No.	10.5.2 Concepto	10.5.3 Ingresos	10.5.4 Egresos	10.5.5 Valor Total de Contrato + Adiciones	
1	10.5.2.1 Valor del contrato	$ 190.335.300			
2	10.5.2.2 Valor de las adiciones al contrato	$ -		$ 190.335.300	
3	10.5.2.3 Valores cancelados al contratista		$ 100.877.709	10.5.6 Total Pagos al Contrato	La ejecución fiscal del Contrato va en un 80%, estando pendiente por pagar al Contratista la suma de: $ 38067060
4	10.5.2.4 Valor a pagar en la presente acta		$ 51.390.531		
5	10.5.2.5 Saldo por pagar al contratista		$ 38.067.060	$ 152.268.240	
6	10.5.2.6 Saldo a favor del municipio			10.5.7 % Avance	
	10.5.2.7 Sumas Iguales	**$ 190.335.300**	**$ 190.335.300**	**80,00%**	

10.5.8 Item	10.5.9 Seguimiento Jurídico	10.5.10 Cumple	10.5.11 Observaciones
1	El Seguimiento jurídico del contrato verifica que las actividades subcontratadas hayan sido autorizadas previamente por la Entidad. (En todo caso, de ser el ejecutor, no podrá Subcontratar el 100% de las Actividades)		

11. OBSERVACIONES

Considerando que a la fecha del presente Informe se encuentran parcialmente cumplidas y recibidas.

Teniendo en cuenta el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato dejo constancia que no existe controversia alguna.

Para constancia de lo anterior se firma en Palmira a los **27** dias del mes de **Julio** del año **2023**

SILVIO STIVENS VALENCIA TOVAR
SUPERVISOR

DECLARACION JURAMENTADA
DE PAGO DE APORTES ALSISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

(ARTÍCULO 50, LEY 789 DE 2002)

(PERSONA JURIDICA)

Yo **EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ** identificado (a) con C.C. **16.254.057** de Cali, actuando en mi propio nombre y representación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, QUE HE EFECTUADO CORRECTA Y ADECUADAMENTE, EL PAGO DE MIS APORTES Y EL DE MIS EMPLEADOS, AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL (Salud, Pensiones y ARL) y DE APORTES PARAFISCALES (Cajas de Compensación Familiar), según me corresponde, durante los últimos seis (06) meses calendario.

Se firma en Santiago de Cali, 20 días del mes de JULIO de 2023

Cordialmente:

Ing. EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ
C.C. No. 16.254.057 de Palmira - Valle
Representante Legal
Interventor

SANDRA PATRICIA PEÑA BURBANO
C.C. 38.460.488 de Cali
Contador Público- TP 161319-T

Copia: Archivo

Calle 18N No. 3N-70. Oficina 401 Edificio Noyra. Teléfono Fijo 668 55 24 Cel. 301-2759200; 316-4918891;
Email: cardenascivil99@gmail.com
Cali, Colombia.

"República de Colombia"
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

161319-T



SANDRA PATRICIA
PEÑA BURGOS
C.C. 38160468
RESOLUCION INSCRIPCION 272 FECHA 01/09/2011
UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON 71267

FIRMA DEL TITULAR 87687

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA


NÚMERO **38.460.488**
PEÑA BURBANO

APELLIDOS
SANDRA PATRICIA

NOMBRES

Sandra Patricia Peña B.

FIRMA

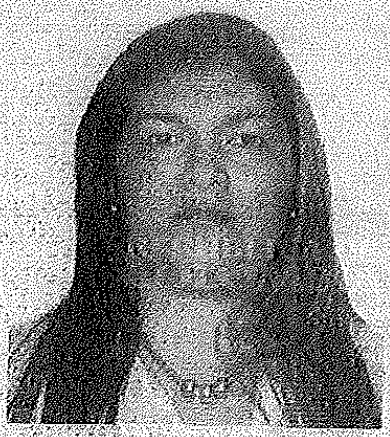



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-DIC-1980**
ALMAGUER
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.53 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

27-AGO-1999 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

A-3100150-00880800-F-0038460488-20170202 0053435741G 1 9998663531

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

POSITIVA
Compañía de Seguros S.A.
N.I.T 860.011.153-6

CERTIFICA

Verificada la base de datos, el empleador: EDUARDO CARDENAS identificado con Nit - 16254057 se encuentra afiliado en POSITIVA Compañía de Seguros S.A. en riesgos laborales, su estado es ACTIVO desde el 08/02/2007 y su actividad económica principal es 5411101 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCION DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METALICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACION DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES con clase de riesgo 5.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web: www.positivaenlinea.gov.co y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202201022229915.

Dada en Bogotá, a los 13 días del mes de diciembre de 2022

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordialmente

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

Impreso por Internet el 13/12/2022 04:56:43 p. m.
ISCDC: 13/12/2022 04:56:43 p. m.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

D A D 8 C A 0 0 A B A 8 F E 1 3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SANDRA PATRICIA PEÑA BURBANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 38460488 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 161319-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-04-05, 03:50:26 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1053282648

Periodo Cotización: abril de 2023 **Periodo Servicio:** abril de 2023

PAGADO 05/04/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EDUARDO CARDENAS		
Documento	CC16254057	**Dirección**	CLL 12N 4N 17 OF 610
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5560163
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 16254057	EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ	57	02																	0	0	30	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.500.000	$ 187.500	6,960	$ 1.500.000	$ 104.400	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 291.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 0	$ 0	$ 187.500	$ 104.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 291.900	$ 0	$ 291.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-05-08, 08:39:44 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1053895960

Periodo Cotización: mayo de 2023 **Periodo Servicio:** mayo de 2023

PAGADO 08/05/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EDUARDO CARDENAS		
Documento	CC16254057	**Dirección**	CLL 12N 4N 17 OF 610
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5560163
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 16254057	EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ	57	02																	0	0	30	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.500.000	$ 187.500	6,960	$ 1.500.000	$ 104.400	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 291.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 0	$ 0	$ 187.500	$ 104.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 291.900	$ 0	$ 291.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-06-07, 09:44:11 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1055301296

Periodo Cotización: junio de 2023 **Periodo Servicio:** junio de 2023

PAGADO 07/06/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EDUARDO CARDENAS		
Documento	CC16254057	**Dirección**	CLL 12N 4N 17 OF 610
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5560163
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 16254057	EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ	57	02																	0	0	30	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.500.000	$ 187.500	6,960	$ 1.500.000	$ 104.400	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 291.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 0	$ 0	$ 187.500	$ 104.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 291.900	$ 0	$ 291.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	16700426	JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ	kl. 6 Via la buitrera callejon los pinos	6685524	tuarek0564@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		VALLE DEL CAUCA	CALI		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-04	2023-04	I	24/04/2023	67038363	$381.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	50.500				50.500	0	0	50.500			505	50.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.000	145.000
Pensión	1	185.600	185.600
Riesgos Laborales	1	50.500	50.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	381.100	381.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	16700426	JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ	kl. 6 Via la buitrera callejon los pinos	6685524	tuarek0564@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		VALLE DEL CAUCA	CALI		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-04	2023-04	I	24/04/2023	67038363	$381.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	16700426	NARANJO RAMIREZ JUAN CARLOS	57	0			N																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS010	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	4	50.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	16700426	JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ	kl. 6 Via la buitrera callejon los pinos	6685524	tuarek0564@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		VALLE DEL CAUCA	CALI		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-05	I	02/06/2023	67819913	$381.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	50.500				50.500	0	0	50.500			505	50.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.000	145.000
Pensión	1	185.600	185.600
Riesgos Laborales	1	50.500	50.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	381.100	381.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	16700426	JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ	kl. 6 Via la buitrera callejon los pinos	6685524	tuarek0564@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		VALLE DEL CAUCA	CALI		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-05	I	02/06/2023	67819913	$381.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	16700426	NARANJO RAMIREZ JUAN CARLOS	57	0			N																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS010	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	4	50.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	16700426	JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ	kl. 6 Via la buitrera callejon los pinos	6685524	tuarek0564@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		VALLE DEL CAUCA	CALI		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-06	2023-06	I	05/07/2023	68579825	$381.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	50.500				50.500	0	0	50.500			505	50.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.000	145.000
Pensión	1	185.600	185.600
Riesgos Laborales	1	50.500	50.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	381.100	381.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	16700426	JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ	kl. 6 Via la buitrera callejon los pinos	6685524	tuarek0564@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		VALLE DEL CAUCA	CALI		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-06	2023-06	I	05/07/2023	68579825	$381.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	16700426	NARANJO RAMIREZ JUAN CARLOS	57	0			N																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS010	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	4	50.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-05-25, 03:51:48 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 62836248

Periodo Cotización 202304 **Periodo Servicio** 202304

Cliente:

PAGADA 2023-05-25

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JESSICA BOLAÑOS RIVERA				
Documento	CC 1112468699	**Dirección**	CL 10C SUR #4 S - 15		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3153602		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	JAMUNDI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1112468699		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	57	00					BOLAÑOS RIVERA JESSICA	76364000 - 76		VALLE DEL CAUCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				**Código AFP**	**Código Tras. AFP**	**Tarifa AFP**	**IBC**	**Total Aporte AFP**	**Total Aporte FSP**	**Total Aporte FSPS**	**Código EPS**	**Código Tras. EPS**	**Tarifa EPS**	**IBC EPS**	**Aporte Salud**	**Aporte UPC**	**Código ARL**	**Clase Riesgo**	**Tarifa ARL**	**IBC ARL**	**Aporte Riesgos**	**Código CCF**	**Tarifa CCF**	**IBC CCF**	**Aporte Caja**	**Tarifa SENA**	**Aporte SENA**	**Tarifa ICBF**	**Aporte ICBF**
															0	30	30	30	30			$ 1.350.000	230301		16 %	$ 1.350.000	$ 216.000	$ 0	$ 0	EPS010		12,5 %	$ 1.350.000	$ 168.800	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 1.350.000	$ 94.000	CCF57	0,6 %	$ 1.350.000	$ 8.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	COMFANDI	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 216.000	$ 0	$ 0	$ 168.800	$ 94.000	$ 8.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 486.900

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-06-19, 08:07:08 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 63540041

Periodo Cotización: mayo de 2023 **Periodo Servicio:** mayo de 2023

PAGADO 19/06/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JESSICA BOLAÑOS RIVERA		
Documento	CC1112468699	**Dirección**	CL 10C SUR #4 S - 15
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3153602
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	JAMUNDI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1112468699	JESSICA BOLAÑOS RIVERA	57	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.350.000	$ 216.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.350.000	$ 168.800	6,960	$ 1.350.000	$ 94.000	(CCF57) COMFANDI	$ 1.350.000	$ 8.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 486.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.350.000	$ 1.350.000	$ 1.350.000	$ 1.350.000	$ 216.000	$ 168.800	$ 94.000	$ 8.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 486.900	$ 0	$ 486.900

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-07-19, 10:07:23 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 64050880

Periodo Cotización: junio de 2023 **Periodo Servicio:** junio de 2023

PAGADO 19/07/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JESSICA BOLAÑOS RIVERA		
Documento	CC1112468699	**Dirección**	CL 10C SUR #4 S - 15
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3153602
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	JAMUNDI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1112468699	JESSICA BOLAÑOS RIVERA	57	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.350.000	$ 216.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.350.000	$ 168.800	6,960	$ 1.350.000	$ 94.000	(CCF57) COMFANDI	$ 1.350.000	$ 8.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 486.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.350.000	$ 1.350.000	$ 1.350.000	$ 1.350.000	$ 216.000	$ 168.800	$ 94.000	$ 8.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 486.900	$ 0	$ 486.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16652780		TORRES GARCIA HECTOR FABIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera25 # 47-60 apto 401	CALI-VALLE	2698176	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2076033492	9450369582	I	2023/05/18	2023/05/11	BANCO DAVIVIENDA	0	$225,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$80,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$80,800		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$80,800		$0	$0
1	CC	16652780	TORRES HECTOR		0	$0	$0	EPS018	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	$80,800	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$80,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16652780		TORRES GARCIA HECTOR FABIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera25 # 47-60 apto 401	CALI-VALLE	2698176	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2076033492	9450369582	I	2023/05/18	2023/05/11	BANCO DAVIVIENDA	0	$225,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$80,800	$0	$0	$80,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$80,800	$0	$0	$80,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				**1**	**$225,800**	**$0**	**$0**	**$225,800**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16652780		TORRES GARCIA HECTOR FABIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera25 # 47-60 apto 401	CALI-VALLE	2698176	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-05	2125117400	9451870094	I	2023/06/21	2023/06/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$225,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$80,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$80,800		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$80,800		$0	$0
1	CC	16652780	TORRES HECTOR		0	$0	$0	EPS018	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	$80,800	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$80,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16652780		TORRES GARCIA HECTOR FABIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera25 # 47-60 apto 401	CALI-VALLE	2698176	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-05	2125117400	9451870094	I	2023/06/21	2023/06/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$225,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$80,800	$0	$0	$80,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$80,800	$0	$0	$80,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				**1**	**$225,800**	**$0**	**$0**	**$225,800**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16652780		TORRES GARCIA HECTOR FABIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera25 # 47-60 apto 401	CALI-VALLE	2698176	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	53723429	9453066747	I	2023/07/21	2023/07/18	BANCO DAVIVIENDA	0	$225,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$80,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$80,800		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$80,800		$0	$0
1	CC	16652780	TORRES HECTOR		0	$0	$0	EPS018	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	$80,800	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$80,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16652780		TORRES GARCIA HECTOR FABIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera25 # 47-60 apto 401	CALI-VALLE	2698176	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	53723429	9453066747	I	2023/07/21	2023/07/18	BANCO DAVIVIENDA	0	$225,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$80,800	$0	$0	$80,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$80,800	$0	$0	$80,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				**1**	**$225,800**	**$0**	**$0**	**$225,800**

NIT 8913800073

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No. 8797** **De 27/07/2023** **Por 51.390.531,00**

PAGO PARCIAL No.2 CONTRATO MP-713-2023

ACTA No.: 6916 **de 27/07/2023** **ESTADO=VIGENTE**

DEPENDENCIA : DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

PROYECTO : IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA

A FAVOR DE: EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ **C.C o Nit** 16254057

TERCERO ENDOSO:

VALOR ENDOSO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 713 de 20/02/2023 Por 190.335.300,00

REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL EN LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS CON OCASIÓN DE LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA POR EL MUNICIPIO DE PALMIRA ¿ VALLE DEL CAUCA, A TRAVES DEL DECRETO No. 011 DEL 16 DE ENERO DE 2023.

VALOR A PAGAR Cincuenta Y Un Millones Trescientos Noventa Mil Quinientos Treinta Y Un Pesos M/Cte. **51.390.531,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PROCULTURA		43.185.320,00	1,00	431.853,00	**9.867.844,40**
RETEFUENTE	2	43.185.320,00	11,00	4.750.385,00	
RETEIVA	2	8.205.211,00	15,00	1.230.782,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	059	43.185.320,00	1,00	431.853,00	
ESTAMPILLA UNIVALLE		43.185.320,00	2,00	863.706,00	
ESTAMPILLA PROHOSPITALES		43.185.320,00	1,00	431.853,00	
TASA PRODEPORTE Y RECREACION		43.185.320,00	2,00	863.706,40	
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR		43.185.320,00	2,00	863.706,00	

NETO A GIRAR **41.522.686,60**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 1018 **Fecha.** 23/02/2023

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1162	2300001	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	919 R/B Ingresos Corrientes de Libre Destinación	51.390.531,00

Total obligación **51.390.531,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
511173008	Interventorias (tercero)	51.390.531,	0,	Acta de recibo PARCIAL 107715 CONTRATO DE INTER\
240722005	Recuados estampilla procultura	0,	431.853,	Acta de recibo PARCIAL 107715 CONTRATO DE INTER\
243627010010	Tarifa diez por mil (10)	0,	431.853,	Acta de recibo PARCIAL 107715 CONTRATO DE INTER\
240722002	Estampilla prohospitales	0,	431.853,	Acta de recibo PARCIAL 107715 CONTRATO DE INTER\
240722001	Estampilla prouniversidad del valle	0,	863.706,	Acta de recibo PARCIAL 107715 CONTRATO DE INTER\
240722006	Estampilla Proadulto Mayor	0,	863.706,	Acta de recibo PARCIAL 107715 CONTRATO DE INTER\
240706004004	Tasa prodeporte y recreacion munici	0,	863.706,	Acta de recibo PARCIAL 107715 CONTRATO DE INTER\
243625005	Impuesto a las ventas retenido	0,	1.230.782,	Acta de recibo PARCIAL 107715 CONTRATO DE INTER\
243603011	Honorarios, Comisiones 11% p.juridi	0,	4.750.385,	Acta de recibo PARCIAL 107715 CONTRATO DE INTER\
249054001	Honorarios	0,	41.522.687,	Acta de recibo PARCIAL 107715 CONTRATO DE INTER\
Sumas Iguales		**51.390.531**	**51.390.531**	

NIT 8913800073

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 8797 De 27/07/2023 Por 51.390.531,00

PAGO PARCIAL No.2 CONTRATO MP-713-2023

ACTA No.: 6916 de 27/07/2023 **ESTADO=VIGENTE**

FIRMADO

SILVIO STEVENS VALENCIA TOVAR

02460153152720-2183063-001816688

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

BOGOTA, D.C., **10/03/2023**
BOGOTA, D.C.,
COLOMBIA,

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ** con **Cédula de Ciudadanía** número **16254057**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO

Número	**0570017370218483**
Fecha de apertura	**30/10/2017**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fecha Actual: 2023/08/11 | Hora Ingreso: 16:06 IP: 190.144.251.100

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

maria alejandra orejuela rivera

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/11 15:32

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ
No. Identificación	16254057
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	038918207
Fecha Pago/Débito	2023/08/03
Fecha Transacción	2023/08/03
Valor Transacción	$41,522,687.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	-
No. Control	OTB004PD4O
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	0570017370218483
Entidad Financiera	DAVIVIENDA
No. Comprobante	8797
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	038A3212321500SF
Información Adicional	TO MP-713-2023
Fecha Cobro	2023/08/03
No. Factura	PAGO PARCIAL No.2 CONTRA
Oficina Pago	-
Usuario Creador	angie lorena hernandez balcazar

DEPENDENCIA QUE EJECUTA EL CONTRATO	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
CONTRATO No.	MP-0713-2023
FECHA DEL CONTRATO	20/02/2023
CONTRATISTA	EDUARDO CÁRDENAS RODRÍGUEZ, identificado con Cedula de Ciudadania Nº 16.254.057 de Palmira.
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL EN LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS CON OCASIÓN DE LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA POR EL MUNICIPIO DE PALMIRA – VALLE DEL CAUCA, A TRAVÉS DEL DECRETO No. 011 DEL 16 DE ENERO DE 2023
SUPERVISOR	SILVIO STIVENS VALENCIA TOVAR - Director Gestion del Riesgo de Desastres
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE. ($190.335.300)incluidos todos los tributos, costos directos e indirectos a que haya lugar con ocasión de su celebración y ejecución.
FORMA DE PAGO	EL MUNICIPIO DE PALMIRA pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, mediante acta de avance, según corresponda al porcentaje de ejecución. El Contratista deberá presentar cuenta de cobro y/o factura como condición ineludible para que se produzca el pago y acta de recibo a satisfacción de parte del Supervisor. Del mismo modo presentará pago de aportes a seguridad social integral y parafiscal según el caso. Dicho pago será causado de acuerdo a la disponibilidad que presente el PAC.
PLAZO DE EJECUCIÓN	20 de septiembre de 2023
FECHA INICIO	23/02/2023
NUMERO DE CP	1018
FECHA DE CP	23/02/2023
No. DE GARANTÍAS	Compañía: Seguros del Estado S.A Póliza No.45-44-101145760
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS	22/02/2023

En el Municipio de Palmira, a los 23 dias del mes de febrero de 2023, se reunieron SILVIO STIVENS VALENCIA TOVAR - Director de Gestión del Riesgo de Desastres, en calidad de Supervisor del

contrato, y EDUARDO CÁRDENAS RODRÍGUEZ, en su calidad de interventor, con el fin de dar inicio al contrato en referencia.

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que en ella intervinieron.

SILVIO STIVENS VALENCIA TOVAR
Supervisor
Director Gestión del Riesgo de Desastres
C.C. No. 1.114.814.146

EDUARDO CÁRDENAS RODRÍGUEZ
C.C. No. 16.254.057 de Palmira
Contratista de Interventoría

Alcaldía Municipal de Palmira
Nit: 891.380.007-3

ACTA PAGO PARCIAL No. 2 INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. MP-0713-2023

CONTRATO No.	MP-0713-2023						**FECHA DE ELABORACION:**
CONTRATISTA:	EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ						21/07/2023
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	NIT	16.254.057-8		CC		NUMERO	
OBJETO : "REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL EN LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS CON OCASIÓN DE LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA POR EL MUNICIPIO DE PALMIRA – VALLE DEL CAUCA, A TRAVES DEL DECRETO No. 011 DEL 16 DE ENERO DE 2023"							FECHA INICIO: 17/01/2023
							FECHA DE FINALIZACION: 20/09/2023
PERIODO PRESENTE ACTA	**DESDE EL**			11/05/2023	**HASTA EL**	20/07/2023	
SUPERVISOR:	SILVIO STIVENS VALENCIA TOVAR						

CONDICIONES CONTRACTUALES								OBRA EJECUTADA					
								ACTAS ANTERIORES (Acta No. 1)		PRESENTE ACTA FINAL		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANT.**	**SUELDO MENSUAL**	**TIEMPO (MESES)**	**DEDICAC.**	**FM**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**
1	**COSTO DIRECTO PERSONAL**												
	PERSONAL PROFESIONAL												
1	Director de Interventoria	1	$ 5.100.000	7	25%	2,00	$ 17.850.000,00	0,53	$ 9.460.500,00	0,27	$ 4.819.500,00	0,80	$ 14.280.000,00
2	Residente de Interventoria	1	$ 4.500.000	7	100%	2,00	$ 63.000.000,00	0,53	$ 33.390.000,00	0,27	$ 17.010.000,00	0,80	$ 50.400.000,00
3	Profesional ambiental	1	$ 4.100.000	7	20%	2,00	$ 11.480.000,00	0,53	$ 6.084.400,00	0,27	$ 3.099.600,00	0,80	$ 9.184.000,00
4	Especialista en Geotecnia	1	$ 4.100.000	7	20%	2,00	$ 11.480.000,00	0,53	$ 6.084.400,00	0,27	$ 3.099.600,00	0,80	$ 9.184.000,00
5	Inspector de obra-SST	1	$ 2.800.000	7	100%	2,00	$ 39.200.000,00	0,53	$ 20.776.000,00	0,27	$ 10.584.000,00	0,80	$ 31.360.000,00
	TOTAL COSTO DE PERSONAL						**$ 143.010.000,00**		**$ 75.795.300,00**		**$ 38.612.700,00**		**$ 114.408.000,00**
2	**OTROS COSTOS DIRECTOS**												
2,1	VIATICOS												
1	Transporte (Vehiculo propio o alquilado)	1	$ 2.600.000	5	50%		$ 6.500.000,00	0,53	$ 3.445.000,00	0,27	$ 1.755.000,00	0,80	$ 5.200.000,00
2,2	COSTO DE ALQUILER EQUIPOS DE OFCINA												
2.2.1	Comision Topografica equipos incluidos	1	$ 1.858.750	3	10%		$ 557.625,00	0,53	$ 295.541,25	0,27	$ 150.558,75	0,80	$ 446.100,00
2.2.2	Ensayos de Laboratorio	1	$ 1.452.000	5	30%		$ 2.178.000,00	0,53	$ 1.154.340,00	0,27	$ 588.060,00	0,80	$ 1.742.400,00
2.2.3	Comunicación (Equipos propios o alquilados)	1	$ 650.001	7	100%		$ 4.550.005,25	0,53	$ 2.411.502,78	0,27	$ 1.228.501,42	0,80	$ 3.640.004,20
2,3	OTROS COSTOS DIRECTOS												
2.3.1	Elaboracion de informes	1	$ 450.000	7	100%		$ 3.150.000,00	0,53	$ 1.669.500,00	0,27	$ 850.500,00	0,80	$ 2.520.000,00
	TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS						**$ 16.935.630,25**		**$ 8.975.884,03**		**$ 4.572.620,17**		**$ 13.548.504,20**
	COSTO DIRECTO TOTAL						**$ 159.945.630**		**$ 84.771.184**		**$ 43.185.320**		**$ 127.956.504,20**
	IVA (19%)				**19,00%**		**$ 30.389.670**		**$ 16.106.525**		**$ 8.205.211**		**$ 24.311.736**
	COSTO TOTAL						**$ 190.335.300**		**$ 100.877.709**		**$ 51.390.531**		**$ 152.268.240**
	VALOR NETO A PAGAR										**$ 51.390.531**		

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO		
VALOR CONTRATO INTERVENTORIA	$	190.335.300
ANTICIPO ENTREGADO	$	-
AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES	$	-
ACTA No 1.	$	100.877.709
ACTA No 2.	$	51.390.531
ACTA FINAL.		
VALOR PRESENTE ACTA	$	51.390.531
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	$	100.877.709
% PRESENTE ACTA		27,00%
% PENDIENTE POR COBRAR		20,00%
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	$	51.390.531

ESTADO DEL CONTRATO	
CONTRATO ADICIONAL	
TOTAL CONTRATADO	$ 190.335.300
EJECUTADO A LA FECHA	$ 152.268.240
RETENCION GARANTIA (10%) (SI APLICA)	
VALOR PAGADO	$ 100.877.709
SALDO DEL CONTRATO	$ 38.067.060
VALOR NETO A PAGAR PRESENTA ACTA	$ 51.390.531

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (VALOR EN LETRAS)	**CINCUENTA Y UN MILLONES TRECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE**

Nota: LAS CANTIDADES DE CADA ITEM Y LA LIQUIDACION DE LA INTERVENTORIA, SON RESPONSABILIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATISTA INTERVENTOR Y EL SUPERVISOR, PARA LO CUAL SE ADJUNTA INFORME PAGO PARCIAL No.1 .

EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

SILVIO STIVENS VALENCIA TOVAR
SUPERVISOR
Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres

Municipio de Palmira

NIT 8913800073

DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

Nro. Int. 68

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 713

Fecha Imp: Mar. 8, 2023

A FAVOR DE	**EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ**	**C.C o Nit**	**16254057**
CL 18 NORTE 3 70 AP 701 ED LOYRA Cali		**Teléfonos**	6026685524
Regimen Común,		**Fecha Firma:**	20/02/23
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL EN LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS CON OCASIÓN DE LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA POR EL MUNICIPIO DE PALMIRA ¿ VALLE DEL CAUCA, A TRAVES DEL DECRETO No. 011 DEL 16 DE ENERO DE 2023.		
VALOR	Ciento Noventa Millones Trescientos Treinta Y Cinco Mil Trescientos Pesos M/Cte.		**190.335.300,00**
FORMA PAGO	ACTAS PARCIALES		
INTERVENTOR	- SILVIO STIVENS VALENCIA TOVAR		
PLAZO	HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023		

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

C.Costo	Proyecto	Fondo	Rubro	Nombre
1162	2300001	919 R/B Ingresos Corrientes de Libre Destinación	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

SIRVASE SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS O EJECUTAR EL TRABAJO SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE

Descripción	Cantidad Und.	Valor Unitario	Valor Total
REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL EN LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS CON OCASIÓN DE LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA POR EL MUNICIPIO DE PALMIRA ¿ VALLE DEL CAUCA, A TRAVES DEL DECRETO No. 011 DEL 16 DE ENE	0	0,00	159.945.630,00

SubTotal	**159.945.630,00**
Iva	**30.389.670,00**
Total	**190.335.300,00**

Autorizacion Ingreso a SIIF:
