GOBERNACION DE CALDAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO PRESTACION SERVICIOS	CD-SI-142-2023 CO1.PCCNTR.4527045	RADICADO NRO.	03022023-0192	

Prestación de Servicios profesionales como ingeniero civil especialista en vías para desarrollar las actividades asociadas a la elaboración de los documentos relacionados con los Estudios y Diseños necesarios para la Secretaría de Infraestructura en cumplimiento de las metas planteadas en el Plan de Desarrollo Departamental

NOMBRE DEL CONTRATISTA	NICOLAS LINARES SERNA			
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JAVIER MAURICIO VANEGAS VANEGAS			
PLAZO DEL CONTRATO	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y POR 5.5 MESES, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LO			
FECHA DE INICIACION DEL CONTRAT	03/02/2023	FECHA DE TERMINACION		17/07/2023
VALOR DEL CONTRATO	$ 29,423,394.00			
VALOR DE LA ADICIÓN	$ 0.00			

PRESTACION DE SERVICIOS CONTRATADOS						DIF	EJECUTADO	
DESCRIPCION	UND	CANT.	PER.	V/UNIT	V/TOTAL	%		
Prestación de Servicios profesionales como ingeniero civil especialista en vías para desarrollar las actividades asociadas a la elaboración de los documentos relacionados con los Estudios y Diseños necesarios para la Secretaría de Infraestructura en cumplimiento de las metas planteadas en el Plan de Desarrollo Departamental	GL	1.00	5.50	5,349,708	########	45%	3.00	16,049,124

% CONTRA.	100.00%	% EJECUT.	54.55%

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	
CONTRATISTA	NICOLAS LINARES SERNA
VALOR TOTAL	$ 29,423,394
VALOR ADICION	$ 0
PLAZO	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y POR 5.5 MESES, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION
FECHA INICIO	03/02/2023
FECHA TERMINACION	17/07/2023
PRORROGA	N/A
NUEVA FECHA TERMINACION	N/A
FECHA DEL ACTA	14/04/2023

INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION
LA SUPERVISION ES REALIZADA POR EL INGENIERO JAVIER MAURICIO VANEGAS VANEGAS, PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTIVIDADES REALIZADAS
Revisar informe adjunto

JAVIER MAURICIO VANEGAS VANEGAS
SUPERVISOR

NICOLÁS LINARES SERNA
INGENIERO CIVIL

GOBERNACIÓN DE CALDAS
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO


INFORME DE ACTIVIDADES - CONTRATO No. 03022023-0192

SUPERVISOR:	Javier Mauricio Vanegas Vanegas
OBJETO:	Prestación de Servicios profesionales como ingeniero civil especialista en vías para desarrollar las actividades asociadas a la elaboración de los documentos relacionados con los Estudios y Diseños necesarios para la Secretaría de Infraestructura en cumplimiento de las metas planteadas en el Plan de Desarrollo Departamental.
PLAZO	Desde la suscripción del acta de inicio (03/02/2023) y por 5.5 meses, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución (17/07/2023).
PERÍODO INFORME	Abril de 2023.


En el desarrollo del contrato de prestación de servicios **03022023-0192** suscrito con la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO, para el período del presente informe, llevé a cabo las siguientes actividades según las obligaciones pactadas en el contrato:

- Asistencia a las reuniones virtuales y presenciales en la Gobernación de Caldas programadas por el coordinador Luis Daniel Taba Becerra para definir el cronograma de las fechas de entrega de los volúmenes de estudios y diseños de los proyectos asignados.


- Realización del informe y planos del plan de manejo de tránsito (PMT) específico desde las abscisas de referencia K0+000 al K2+500, en el corredor vial Tres Puertas – Santagueda, sectorizando las obras hidráulicas y las obras de contención con la finalidad de establecer la cantidad de cierres viales durante la ejecución del proyecto.

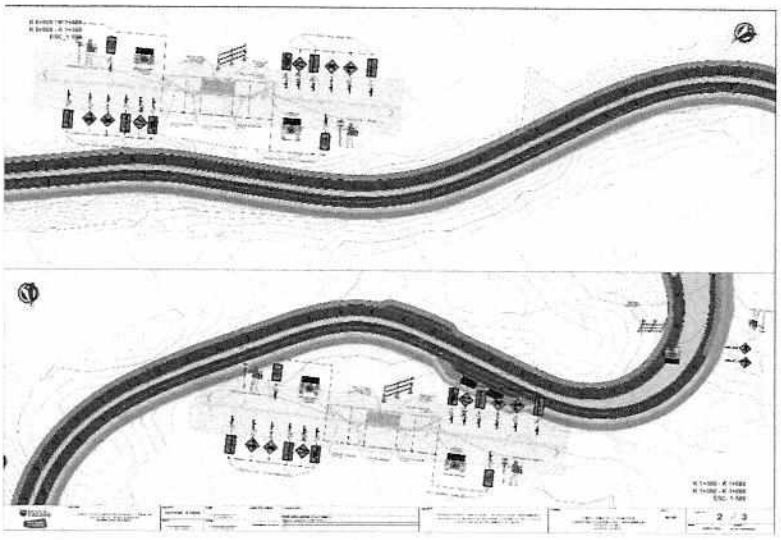

- Realización del informe y planos del plan de manejo de tránsito (PMT) específico desde las abscisas de referencia K25+800 al K29+000, en el corredor vial Arma – La Pintada, sectorizando las obras hidráulicas y las obras de contención con la finalidad de establecer la cantidad de cierres viales durante la ejecución del proyecto.

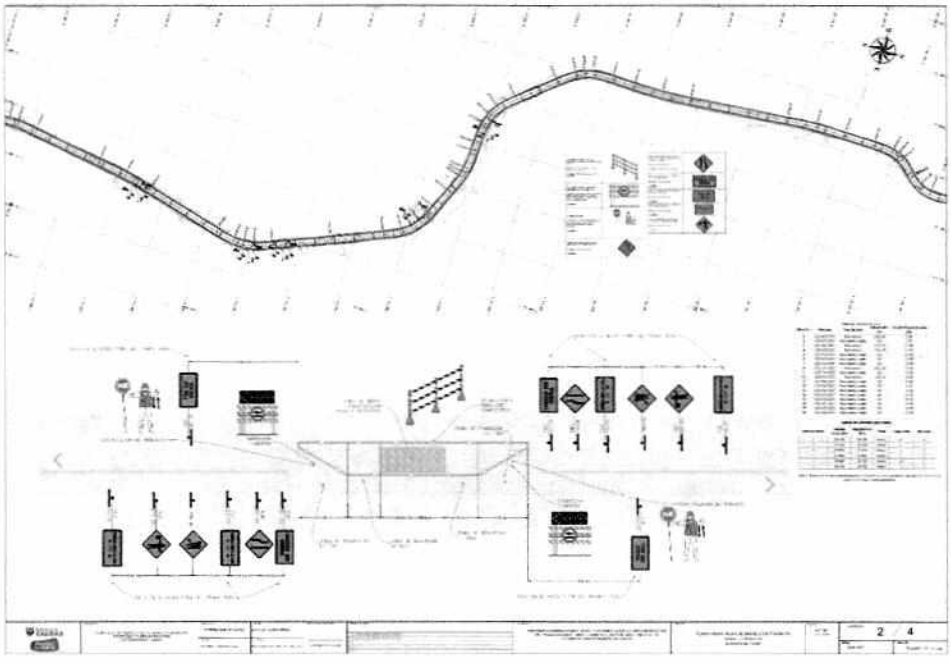

- Entrega definitiva del diseño de pavimentos para el proyecto de renovación del Parque de San Félix (Salamina, Caldas) con el plano de modulación de losas para el perímetro urbano.

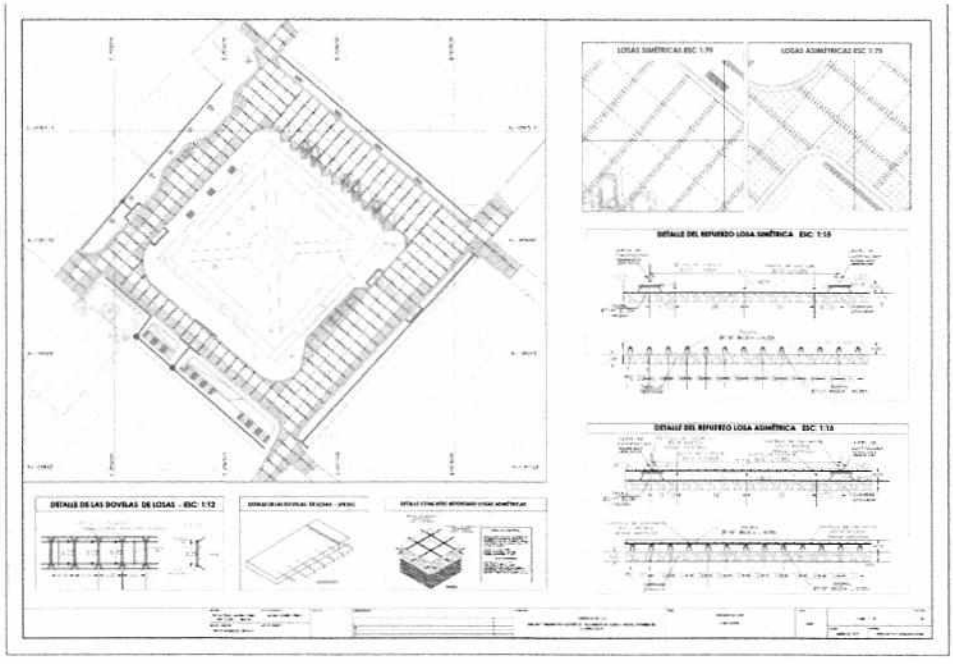

- Realización del presupuesto de la vía puente La Libertad – Termales – El Arbolito en el sector Ternium desde la zona del hotel Ares y a partir de allí en una longitud aproximada de 500 metros de la estructura de pavimentos rígida propuesta.

- Revisión del estado de los proyectos priorizados desde la secretaría de infraestructura y la secretaría de planeación, según la lista que se presenta a continuación

PRIORIZACION DE PROYECTOS EQUIPO ESTRUCTURADOR CALDAS FUTURO	
PRIORIDAD	**INFRAESTRUCTURA**
0	LA MANUELA AEROCAFE
1	TRES PUERTAS SANTAGUEDA
2	SALAMINA PACORA
3	ARMA LA PINTADA
4	9 SITIOS CRITICOS
5	PLACA HUELLA
6	LAVADEROS
7	ARMA LA MARIA
8	TERMINAR VIAS PERMITRALES SAN FELIX
9	TERMINAR PUNTOS CRITICOS SAN LORENZO
10	VARIANTE EL BRILLANTE
11	TERMALES EL ARBOLITO
PRIORIDAD	**SATELITES**
1	ADECUACIONES COLISEO CUBIERTO LA MERCED
2	ALBERGUE PACORA
3	CANCHA SAN FELIX
4	CDI SAN JOSE
5	ALBERGUE SALAMINA
6	CANCHA DE TEJO DE MARULANDA
7	RECINTO DE PENSAMIENTO EMBERA
PRIORIDAD	**PBA'S**
1	PLANTA DE BEFICIO AGUADAS
2	PLANTA DE BEFICIO LA MERCED

- Atención y ajuste de las observaciones de los componentes de tránsito, pavimentos y PMT de los proyectos que se presentan a viabilización.

Atentamente,

Nicolás Linares Serna

NICOLÁS LINARES SERNA
Especialista en vías y transporte
Estudios y diseños
Secretaria de Infraestructura del Departamento
