Folio No. _____

Kr 97B Cl41Sur -Cl 42Sur.
Pk-ID 29906 suroriente
Pk-ID 29907 noroccidente
Tiempo: Seco
P-26 Móvil 14 minicargador Bobcat horas 9305
Móvil 39 compactador Ingersoll Rand. No se pudo instalar el horómetro. Queda pendiente. Carlos Benavides Residente MEV. Interv.
Ambiental -SST: Se observa Personal adecuando sumideros en la intersección P27 y P26, Compactación de fresado en vía, Personal hace uso de sus EPPs, punto ecológico, Señalización SST Instalada,
Nury Alexandra Daza
Residente SST Interventoría
El día Sabado Jul. 01/23, realizo visita de movistar S.A. para consertar la construcción de la camara de operador movistar. Adjunto Copia del acta firmada.
Actividad: Instalación de lavaderos en sumideros, en ambos costados.
Observaciones: Se solicita al contratista. informe de la respuesta dada por el delegado de ETB para la inspección y posible nivelación de la caja ubicada en la esquina con Cl 42.
Observaciones PHT: Se solicita al contratista corregir 2. Señales de desvio, que se encuentren mal referenciado la dirección de desvio.
Lucero Restrepo Lopez
Residente Interventoría
ROSA LIDA MONSALVA
Resid. Técnico
Miercoles 4 Julio 2023
P-26 CV 8008988
Kr 97B Cl41Sur - Cl42Sur

Folio No. _____

PK-1D 29906 surloriente
PK-1D 29907 norloccidente
Tiempo: Seco
Actividad: Instalación de fresado Estabilizado con cemento
Soil-soil al 4%. K0,10 al Kot0,35 25x4x0,15 = 15m³
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico!
Luis Restrepo
Interventoría

Jueves 06 Julio 2023
P-26 CIV 8000988
KR 97B CL41SUR - CL42SUR
PK-1D 29906 surloriente
PK-1D 29907 norloccidente
Tiempo: Seco.
No hay actividad en esta prioridad.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico
Luis Restrepo
Interventoría

Viernes 07 Julio 2023
P-26 CIV 8000988
KR 97B CL41SUR- CL42SUR
PK-1D 29906 Surloriente
PK-1D 29907 norloceidente
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.
Luis Restrepo
Interventoría

Sabado 08 Julio 2023
P-26 CIV 8000988
KR 97B CL41 SUR - CL42SUR
PK-1D 29906 SUR/Oriente

Folio No. _____

PK-ID 29907 norlocaidente

Tiempo: Seco.

No hay actividad en esta prioridad

ROSA LOA MORGUA

Resid. Técnico.

Lucas Restrepo Lyo
Interventoría.

Lunes 10 Julio 2023

P-26 CW 8000988

KR 97B CL 42SUR - CL 42SUR.

PK-ID 29906 sur/oriente

PK-ID 29907 norlocaidente

Tiempo: Seco.

Actividad: Excavación parcial manual de pozo a sumidero para instalación tubería

personal: 2 auxiliares.

J. ALFONSO DIAZ M.
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Lucas Restrepo Lyo
Interventoría

Martes 11 Julio 2023

P-26 CW 8000988

KR 97B CL 41SUR - CL 42SUR.

PK-ID 29906 sur/oriente

PK-ID 29907 norlocaidente

Tiempo: Seco

Ambiental-SST: Excavación manual de pozo a sumideros para instalar tubería, se evidencias Kit de emergencias (botiquín, camilla, extintor), punto ecologico, punto de hidratación, personal haciendo uso de sus EPP's, señalización SST instalada.

Nelly Albeiro Daza.

Residente SST Interventoría.

Res. Amb. Urbano.

Actividad: Excavación manual parcial de sumidero a pozo.

Folio No. _____

Personal: 1 ayudante.

Observaciones PHT: Se encuentra mal redireccionado 2 señales de desvio, se recomienda al contratista realizar la respectiva corrección.

J. Alfonso Díaz M.
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Interventoría

Miercoles 12 Julio 2023

P-26 CIV 8000988

KR 97B CL41SUR – CL42SUR

PK-1D 29906 sur/oriente

PK-1D 29907 nor/occidente

Tiempo: Seco

Actividad: Excavación occidente manual 4.90 x 0,6 x 0,65 = 1.91m³, costado occidente instalación tubería 12" 5.65ML, instalación acom. tubería manual. 3.84 x 0,65 x 0.55 = 1,37m³, excavación manual oriente 2.72 x 0,70 x 0,55 = 1.05m3, instalación tubería 12" 3.56ML.

personal: 1 oficial, 1 ayudantes

J. Alfonso Díaz M.
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Interventoría

Jueves 13 Julio 2023

P-26 CIV 8000988

KR 97B CL41SUR - CL42SUR

PK-1D 29906 sur/oriente

PK-1D 29907 nor/occidente

Tiempo: Seco

Actividad: Nivelación fresado para instalación de geoceldas.

personal: 2 ayudantes, 1 oficial.

Lisa Lida Monroy

Resid. Técnico

Interventoría.

FORMATO ACTA DE REUNION							
CÓDIGO	**PROCESO**				**VERSIÓN**		
FECHA	30-063-2023	**HORA INICIO**	8:00:00 a. m.	**DURACIÓN (HORAS)**		**ACTA No.**	
ASUNTO	INTERVENCION SOBRE CAMARA DE OPERADOR MOVISTAR						
CONTRATO /PROYECTO	Contrato de obra No COP-621-2022. Objeto: Inv-014 Contratar las Obras de Construcción Por El Sistema De Precios Unitarios A Monto Agotable De La Malla Vial Local y Su Espacio Público Asociado De La Localidad De Kennedy. Grupo 1						

ASISTENTES

Nombre	Área / Entidad	Cargo/Tipo de vinculación	Firma
Jhon Fredy Cubillos Camacho	COBRA	SUPERVISOR DE OBRA CIVIL	
Jaime Alfonso Diaz Moreno	XIE S.A.	RESIDENTE TECNICO DE OBRA	

TEMAS

INTERVENCION SOBRE CAMARA DE MOVISTAR


DESARROLLO

En el proceso de excavacion del CIV No. 8000988 ubicado en la Carrera 97B entre calles 41 y 42 Sur, se encontro una camara del operador del operador Movistar, la altura no corresponde a la rasante definitiva de la via, razon por la cual se debe elevar para que ella quede a nivel de pavimento.

Se transmite novedad mediante correo electronico para coordinar visita y tomar las medidas pertinetes para solucionar el tema, hoy viernes 30 de junio de 2023 se presenta el señor Cubillos funcionario de Cobra, contratista de Movistar, se visita el sitio de ubicación de la camara, se le comenta la novedad, como solucion que plantea es la elevacion de la tapa de camara, creando un cuello que finalmernte quedara con una altura de .60 m de altura, con lo cual se nivelara a la rasante definitiva.

Ellos como contratista se comprometen a sumistrar el dia de hoy el aro y tapa correspondiente para la elevacion.



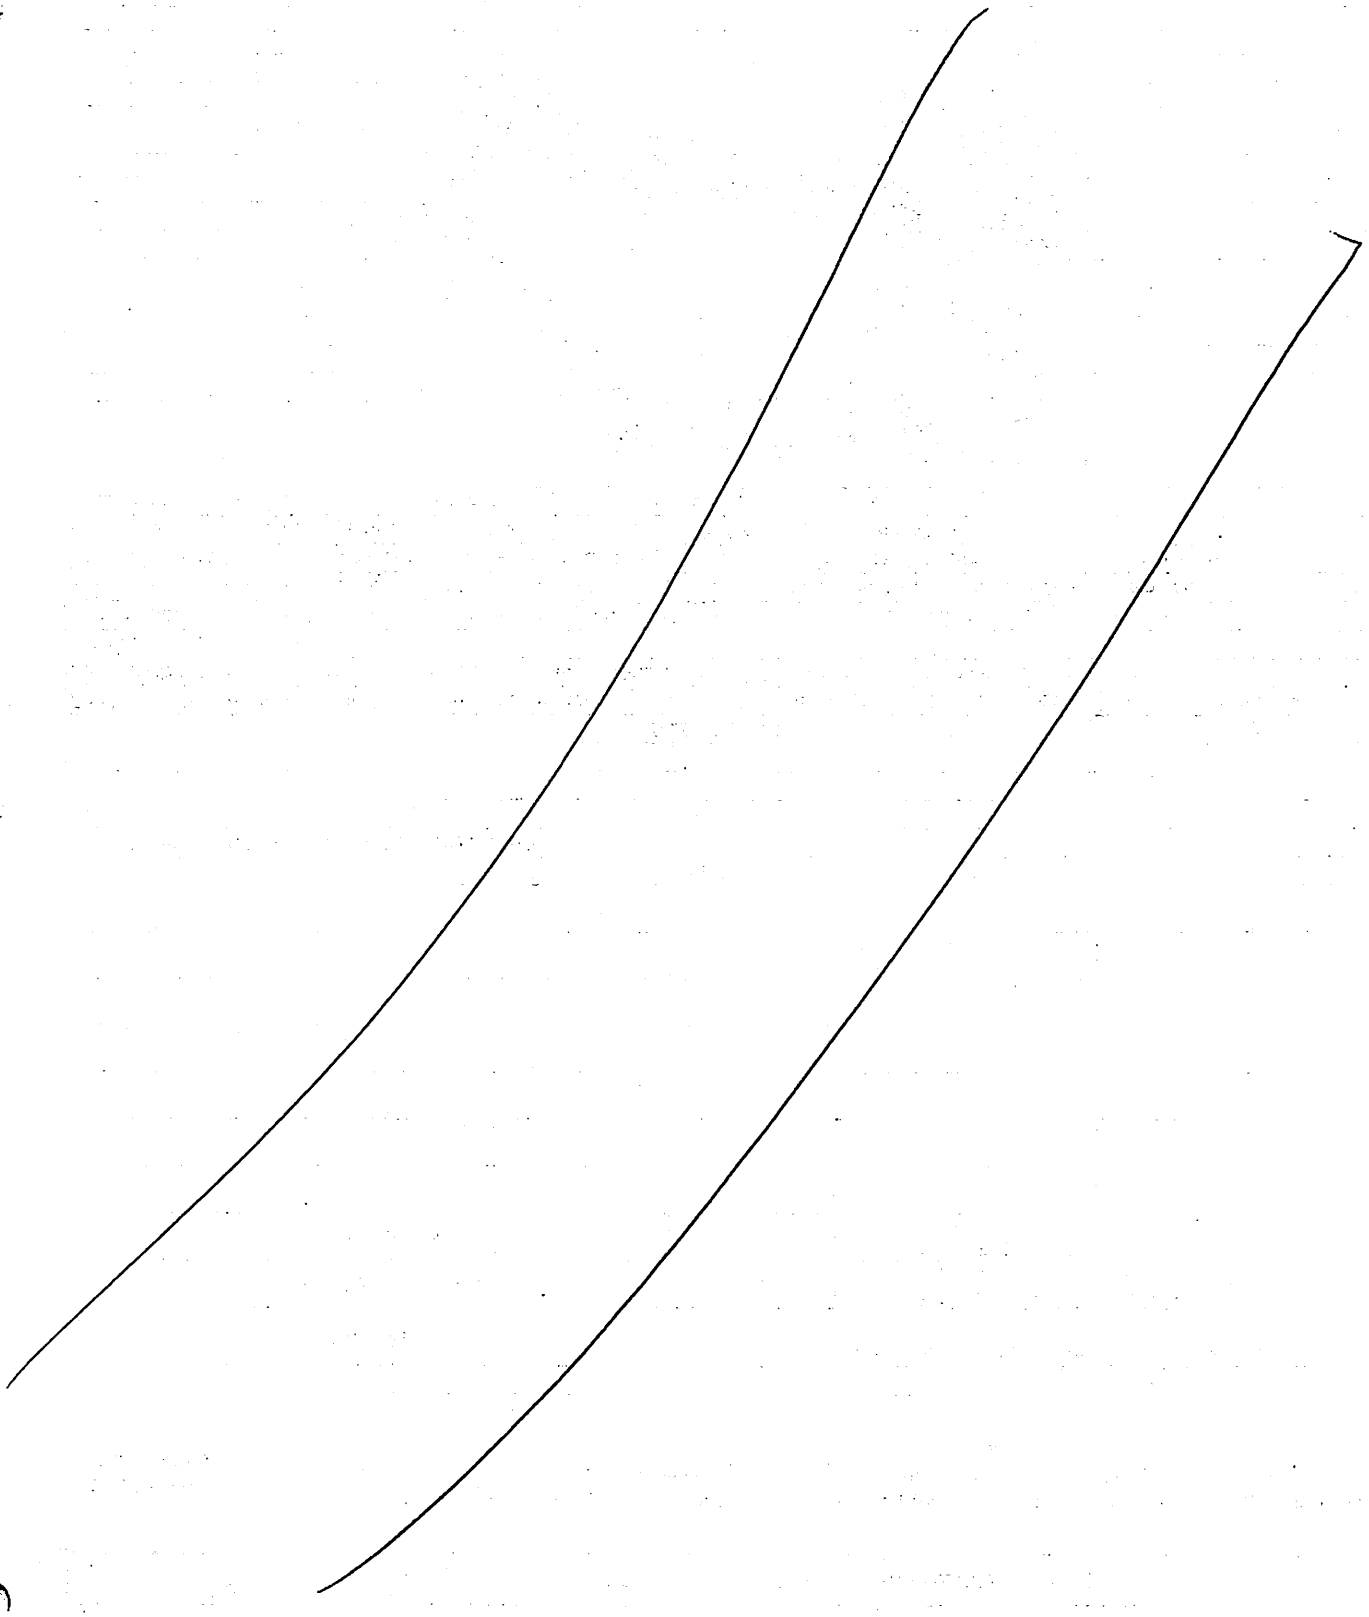

Folio No. _____

Viernes 14 Julio 2023
P-26 CW -8000988
KR97B CL 41SUR- CL42SUR
PK-1D 29906 sur/oriente
PK-1D 29907 nor/occidente
Tiempo: Seco
Actividad: Instalación geotextil en calzada intersección 15,62m², instalación geoceldas = 15,62m². instalación fresado = 2.81m³
personal: 1 oficial, 3 ayudantes
ROSA LIDA MONSALVE
Resid. Técnico.
Interventoría

Sabado 15 Julio 2023
P-26 CW 8000988
KR97B CL41SUR - CL42SUR
PK-1D 29906 sur/oriente
PK-1D 29907 nor/occidente
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONSALVE
Resid. Técnico
Interventoría

Lunes ~~14~~ Julio 2023
P-26 CW 8000988
KR97B CL41SUR- CL42SUR
PK-1D 29906 sur/oriente
PK-1D 29907 nor/occidente
Tiempo: Seco.
Actividad: Demolición de anden costado oriente predio 97A-17 5,80 x 1 -1 caja = 5,16m³, predio 41-14SUR 6.08 x0,92 - 1 caja - 2 cajillos = 4,60m², predio 41-20SUR 6x1.10 -1 caja

Folio No. _____

- 1 cajilla = 5,78m², predio 41-26 SUR 6.02 x 1.05 - 1 caja - 2 cajillas = 5.88m². Total demolición = 21,42m².

excavación en canden costado oriente predio 97A-17 5.80 x 1,85 x 0,45 → 1 caja = 4,54m³; predio 41-14 SUR 6,08 x 1.35 x 0,45 - 1 caja - 2 cajillas = 4,62m3, predio. 41-20 SUR 6.08 x 1.25 x 0,45 - 1 caja - 1 cajilla. = 4.69m³, predio 41-26 SUR 6,02 x 1.85 x 0,45 - 1 caja - 2 cajilla = 4.57m³. Total excavaciones 18,42m³

Instalación fresado estabilizada. 10 x 4 x 0,20 = 8m³ - 0,44m³ - 2(1.20 x 0,90 x 0,20) = 0,43m³ = 7,13m3 del Kotooo al Kotoio.

personal: 1 oficial, 3 ayudantes, 2 aux trafico, 1 operador.

J. ALFONSO DIAZ M.
C.C. 79 158 171
INGENIERO RESIDENTE

J. Luis Restrepo
Interventor

Martes 18 Julio 2023

P-26 CIV 8000 988

KR 97B CL 41 SUR - CL 42 SUR

PK-10 29906 sur/oriente

PK-10 29907 nor/occidente

Tiempo: Seco.

Observación PMT: Se observa cargue de volquetas fuera del cerramiento, el PMT aprobado no cuenta con autorización para realizar esta actividad 17 / Julio / 23

Ambiental - SST: Se observan actividades de espacio publico, el contratista cuenta con kit de emergencias (Botiquin, camilla extintor), punto ecologico, punto de hidratación, el personal hace uso de sus EPP's, tambien se observa arreglo de Cajas de inspección.

Nayl Alberto Diaz
Residente SST Interventoria

Resid Ambi Interv

Folio No. _____

Actividad: Demolición anden. costado occidente.
predio 978-05 5,75 x 0,95 - 1 caja - 1 cajilla = 4,64m2,
predio 41-138SUR 6,02 x 0,93 - 1 caja - 1 cajilla = 4,43m2,
predio 41-198SUR 5.96 x 0,96 - 1 caja - 1 cajilla = 4,90m2.
Predio 41-258SUR. 5.95 x 1.10 - 1 caja - 1 cajilla = 5,73m2.
occidente
Demolición Total= 19,7m2
costado oriente 41-328SUR 5.94 x 1.10 - 1 caja - 1 cajilla = 5,71
predio 41-388SUR 5.99 x 0,88 - 1 caja - 1 cajilla = 4.28m2,
predio 41-448SUR 6 x 1 - 1 caja - 1 cajilla = 5,98m2.
Demolición oriente total = 15,17m2
excavación costado occidente. 23,86 x 1.80 x 0,45 = 19,33 m3
4 (0,8x0,8 x 0,45) = 18,18m3. costado oriente
17,93 x 1.90 x0,45 = 15,83 - 3 (0,8 x0,80 x 0,45 = 14,17m3
personal: 3 oficiales, 4 ayudantes, 2aux trafico, 1 operador.
equipo = 1 Minicargador

ROSALBA MONCUA
Resid. Tecnico.

Lucas Mosquera
Interventoria.

Miercoles 19 Julio 2023
P-26 CN 8000988.
KR 97B CL 41SUR - CL 42SUR
PK-ID 29906 sur/oriente.
PK-ID 29907 nor/occidente
Tiempo: Seco
Actividad: Demolición manual. concreto. costado oriente.
41-50SUR. 6.13 x 0,95 - 1 caja - 1 cajilla = 5m2., predio
41-568SUR. 6.04 x 0,70 - 1 caja - 1 cajilla. = 3,44 m2, predio
41-628SUR. (6.06 +1 x 0,8) = 1 caja = 4,83m2, Total = 13,24m2
excavación manual 19,23 x 1,90 x 0,45 = 16,44 m3 -
3(0,80 x 0,80 x0,45) = 15,58m3.

Folio No. _____

construcción en cajas de inspección costado oriente.
predio 97A-17, 41-14SUR, 41-20SUR, 41-26SUR,
41-32SUR Total Sunidades
personal: 30 oficiales, 5 ayudantes, 1boal, 2auxtrafico.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Tecnico.
Interventoría

Viernes 21 Julio 2023
P-26 CIV 8000988
KR 97B CL41SUR — CL42SUR
PK-10 29906 sur/oriente
PK-10 29907 nor/occidente
Tiempo: Seco.
Actividad: Demolición andenes costado occidente.
predio 41-31SUR 6.04 x 0,95 - 1caja - 1cajilla = 4,92m2
predio 41-37SUR 5.48 x 0,87 - 1caja - 1cajilla = 4,38m2
predio 41-43SUR 6.06 x 1 - 1caja - 1cajilla = 5.24m2
predio 41-49SUR 5.97 x 0,85 - 1caja - 1cajilla = 4.25 m2
Total demolición = 18,79m2
Excavación manual costado occidente 24.05 x 1.85 x 0,45 = 20,02 m3 - 1caja = 19,73m3, demolición de cajas de inspección. costado oriente. predios 41-38SUR, 41-44SUR, 41-50SUR 0,27 x 3 = 0,81 m3 y construcción de las mismas 3unidades.
personal: 1Oficiales, 5ayudantes
Observación: Se evidencia procedimientos inadecuados en la construcción en las cajas de inopección, no estan demoliendo por completo las cajas, Se realiza nuevamente la observación y recomendación al contratista., por motivo que no se aceptaran estas cajas de inspección, si no realizan la demolición completa.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Tecnico.
Interventoría.

Folio No. _____

Sabado 22 Julio 2023
P-26 CIV 8000988
KR97B CL41SUR - CL42SUR
PK-ID 29906 sur/oriente
PK-ID 29907 nor/occidente
Tiempo: Seco
Actividad: Demolicion de cajas de inspeccion costado oriente. 41-56 SUR, 41-62SUR. 0,27 x2 = 0,54m3
costado occidente. predio 41-61SUR ., 41-55SUR.
41-49SUR, 41-43SUR, 41-37SUR, 41-31SUR, 41-25SUR., 41-19SUR.
41-13SUR 0,27 x 8 = 2.16.m3 y contruccion de
las mismas 10 unidades.
personal: 5 oficiales, 5 ayudantes, 3aux trafico, 1local
ROSA CIDA MONQUA
Resid. Tecnico
Lucas Restrepo
Inspector

Lunes 24 Julio 2023
P-26 CIV 8000988
KR97B CL41SUR - CL42SUR
PK-ID 29906 Sur/oriente
PK-ID 29907 nor/occidente
Tiempo: Seco.
Actividad: Nivelacion y compactacion subrasante costado occidente
23.80 x 1.90 - 4 cajas = 42.68 m2 predios 97B-05, 41-13SUR, 41-19SUR, 41-25SUR,
costado oriente. 23.75 x 1.90 - 4cajas = 42.57 m2 predios
97A-17, 41-14SUR, 41-20SUR, 41-26SUR, instalacion geo-textil
costado occidente 97B-05, 41-13SUR, 41-19SUR, 41-25SUR
23.80 x2 - 2.56 = 45,04m2, costado oriente predios
97A-17, 41-14SUR, 41-20SUR, 41-26SUR 23.75 x2 -2.56 = 44,94m2,
instalacion fresado anden costado occidente predios

Folio No. _____

97B-05, 41-13SUR, 41-19SUR, 41-25SUR. 23.80 x 1.90 x 0,20 - 4 cajas = 8,51m3, costado oriente predios 97A-17, 41-14SUR, 41-20SUR, 49-26SUR. 23.75 x 1.90 x 0,20 - 4 caja = 8,53 m3.

personal: 3 oficiales, 4 ayudantes.

ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.

Lucas Restrepo
Interventoría

Martes 25 Julio 2023

P-26 CIV 8000988

KR 97B CL41SUR - CL42SUR

PK-ID 29906 suroriente

PK-ID 29907 noroccidente.

Tiempo: Seco

Ambiental-SST: Se observan actividades de espacio Publico, adecuación de andenes, Kit de emergencias (Botiquín, Camilla, extintor), Punto ecologico, Punto de hidratación, personal hace uso de sus EPPS

Nelly Alvarez OSTA
Residente SST Interventoría

Actividad: Instalación bordillo A-80 costado occidente del KO+054 al KO+063 9ML. costado oriente. 9ML, instalación geotextil costado occidente. predios 41-61SUR, 41-55SUR, 41-49SUR, 41-43SUR, 41-37SUR, 41-37SUR. 41-31SUR.. 37.19 x 2 = 74,38m2 - 6 cajas = 70,54m2.

Instalación fresado: 1ra capa. 37.19. x 1.90 x 0.20 = 14,13m3 - 6 cajas = 13,36m3.

personal: 3 oficiales, 2 ayudantes, 1 local

ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.

Lucas Restrepo
Interventoría

Observación: Se realiza una corrección día 22 Julio 2023 el predio 41-25SUR es reconstrucción de caja de inspección.

Folio No. _____

Miercoles 26 Julio 2023
P-26 CIV 8000988
KR 97B CL41SUR - CL42SUR.
PK - 1D 29906 sur/oriente.
PK - 1D 29907 nor/occidente
Tiempo: Seco Lluvia leve.
Actividad: Instalación geotextil costado oriente.
predios 41-62SUR, 41-56SUR, 41-50SUR, 41-44SUR,
41-38SUR, 41-32SUR. 36,16 x 2 = 74.32 m² - 6 cajas = 70,48m².
instalación fresado en los mismos predios.
37.16 x 1.90 x 0,20 - 6 cajas = 3.35m³.
personal: 2oficiales, 3ayudantes
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico
Lucas Restrepo
Interventoría

Jueves 27 Julio 2023
P-26 CIV 8000988
KR97B CL41 SUR - CL42SUR.
PK - 1D 29906 sur/oriente
PK - 1D 29907 nor/occidente.
Tiempo: Seco
Actividad: Instalación bordillo para instalación de concreto parcial. ,nivelación fresado
personal: 3oficiales, 4 ayudantes, 1boal
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.
Lucas Restrepo
Interventoría.

Viernes 28 Julio 2023
P-26 CIV 8000988
KR97B CL41SUR - CL42SUR
PK - 1D 29906 sur/oriente
PK - 1D 29907 nor/occidente

Folio No. _____

Tiempo: Seco

Actividad: Nivelación compactación subrasante costado oriente. 61.06 x 1.90 = 116 m2 - 10 caja = 109,60 m2

costado occidente. 60.87 x 1.85 - 10 cajas = 106,21 m2.

instalación concreto 3000PSI asentamiento 4 3/4 pulgadas.

costado oriente predios.

41-20SUR. 3.01 x 2.14 - 1 caja - 1 cajilla = 6.04 m2

41-14SUR. 3.32 x 1,16 - 1 cajilla = 6.97 m2

→ Total concreto instalado oriente = 13,01 m2.

costado occidente predios

97B-05 3.44 x 2.05 = 7.05 m2

41 - 13SUR. 3 x 2.05 - 3 cajillas = 5.85 m2.

97A - 17 5.96 x 2.03 - 1 caja = 11,61 m2

→ total concreto instalado occidente = 24,51 m2

personal: 1 oficial, 2 boal, 3 aux trafico, 2 ayudantes.

ROSA LIDA MONSUA
Resid. Técnico

Inspectora

Sabado. 29 Julio 2023

P-26 CIV 8000988

KR97B CL41SUR - CL42SUR.

PK-ID 29906 sur/oriente

PK-ID 29907 nor/occidente

Tiempo: Seco.

Actividad: Nivelación fresado para fundida de concreto en rampas.

ROSA LIDA MONSUA
Resid. Técnico.

Inspectora

Luner 31 Julio 2023

P-26 CIV 8000988

Folio No. _____

KR97B CL41SUR - CL42SUR
PK - ID 29906 sur/oriente
PK - ID 29907 nor/occidente
Tiempo: Seco.
Actividad: Instalación de concreto MR41 con un asentamiento 5½ pulgadas, costado oriente.
predio 41-14SUR 2.67 x2.13 - 1caja = 4.88m2.
predio 41-20SUR. 3,06 x 2.17 = 6.64m2.
predio 41-26SUR 2.90 x 2.22. - 1caja = 5.94m2.
Total instalado. oriente = 17.46m2
predio. 41-13SUR 3.06 x 2.11 - 1caja = 5.97m2.
predio. 41-19SUR 3.10 x 2.11 = 6,54 m2
predio. 41-25SUR 3.01 x 2.16 = 6,57 m2
Total instalado costado occidente = 19,08m2
personal: 1oficiales, 3ayudantes, 2bcal, 2aux trafico.
ROSA LIDA MONCADA
Resid. Técnico.
Lilian Restrepo
Interventoría
Martes 01 Agosto 2023
P-26 CIV 8000988
KR97B CL41SUR - CL42SUR
PK - ID 29906 sur/oriente
PK - ID 29907 nor/occidente
Tiempo: Seco
Ambiental - SST: Se observan actividades de espacio publico, Kit de emergencia (Botiquín, camilla, extintor), Punto ecologico, punto de hidratación, Personal hace uso de sus EPPS.
Nayer Albarracín Daza
Residente Ambiental y SST.
Actividad: Instalación bordillo A-80 provisional como

Folio No. _____

Formaleta.
personal: 2 oficiales, 3 ayudantes
ROSA LIDA MONCUA
Resid. Técnico.

Miercoles 02 Agosto 2023
P-26 CV 8000988
KR97B CL41SUR - CL42SUR.
PK-ID 29906 sur/oriente
PK-ID 29907 nor/occidente
Tiempo: Seco
Actividad: Nivelación de fresado costado oriental y occidental segunda capa costado occidente
predios 41-43SUR, 41-37SUR, 41-31SUR, 41-25SUR, 41-19SUR, 41-13SUR, KR97B 41.76 x 1.90 x 0.15 - 7 cajas.
Total fresado occidente = 11,23 m3.
costado oriental. predios 41-44SUR, 41-38SUR, 41-32SUR, 41-26SUR, 41-20SUR, 41-14SUR, KR97, 41,83 x 1.90 x 0,15 -7 cajas = 11,25m3.
personal: 4 oficiales, 3 ayudantes
ROSA LIDA MONCUA
Resid. Técnico.

Jueves 03 Agosto 2023
P-26 CV 8000988
Kr97B CL41sur - CL42sur
PK-ID 29906 Sur/oriente
PK-ID 29907 nor/Occidente
Tiempo: Seco
Actividades: Se realizo Nivelación de fresado para andenes e instalación parcial de cajillas
Personal: 2 oficiales, 3 ayudante

J. Alfonso Diaz M
INGENIERO RESIDENTE
