BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo De Desarrollo Local de Kennedy

FECHA: 23 / marzo / 23 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** ____

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comite de seguimiento # 25 - FDLK. 61

HORA DE INICIO: 2:00 pm **HORA DE FINALIZACIÓN:** ____

ASISTENTES:

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Nury Albarracín Daza			X						X	Interventoria Consorcio SCLV	sst1kennedy@outlook.com	3123230618	
Andrés Mauricio Rojas Ll.			X						X	FDLK - Infraestructura	andresm.llanos@gobiernobogota.gov.co	3057039773	
Danilo Meneses Toro			X						X	FDLK - Infraestructura	Danilomeneses@gobiernobogota.gov.co	3118988039	
Oswaldo Ladino Chavez			X						X	INTERVENTORIA - CONSORCIO SCLV	dir-vial@silcarsa.com.co	3103178077	
EIKIN ESTEBAN MORENO			X						X	XIE	xie.espetprog@gmail.com	3205768756	
Manuel Alejandro Magabel. G.			X						X	XIE SA.		3212147452	
Oscar Vargas		X							X	Xie SA	oscardavid.vargas@xie.com.co	3502279588	
Maria Camila Pera Roa			X						X	Xie S.A	xie.ambiental@gmail.com	3102457234	
Leonardo Pinto			X						X	Xie SA	xie.sst621@gmail.com	3108537058	
Ana Leonor Parras Rodriguez			✓							Interventoria	alexaparras@gmail.com	3212071449	
Sonia E Lerzundy G V			X						X	Interventoria	Social grupo1.fdlk@gmail.com	3103626480	

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo De Desarrollo Local de Kennedy

FECHA: 23/ marzo /23 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** 61

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de seguimiento #25 - FDLK.

HORA DE INICIO: 2:00 pm. **HORA DE FINALIZACIÓN:** ____

ASISTENTES:

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
ROSA LIDA MONGUA			X						X	XIE S.A.	Xiekennedy621.residente2@gmail.com	3223141853	
Lucas Restrepo Largo.			X					X		Interventoria	U233SCLVkennedy@outlook.com.	3002133006	
Alba Yolanda Morales			X					X		Interventoría	ayma1380@gmail.com	3114440424	
Carlos Benavides M.			X						X	Interventoría	Carlos Benavides M	3132105586	
Anyeli Curiel Acosta			X							Interventoría	U233SCLVkennedy@outlook.com	3227401898	
Juan Manuel Alba Rojas			X						X	Interventoría	juan.alba@elavialidad.co	3107671842	
Karen Juleth Peñates Ramírez.			X							Interventoría	U233SCLVkennedy@outlook.com	314 6253729	

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se da inicio a el comité de seguimiento No. 25 con la participación del FDLK, Interventoría y contratista de obra grupo 1, comité realizado en las Instalaciones de la interventoría el 23 de marzo de 2023 a las 8 am.

La Interventoría hace la presentación de las fotografías tomadas en el recorrido realizado el día de hoy con el FDLK. Se evidencia que el contratista de obra está cumpliendo con los 5 frentes de obra establecidos contractualmente. Hay varios aspectos que corregir en cuanto a seguridad de los trabajadores y los habitantes que viven aledañamente. Es importante dar cumplimiento al PMT de acuerdo con lo establecido por SDM.

Planos en Obra
Se evidencio que el contratista de obra cuenta con los planos en obra.

Por otra parte, el contratista menciona que tendrá en cuenta las observaciones que la interventoría tienen de lo evidenciado en el recorrido realizado el día de hoy en cuanto al pozo y el sumidero que presentan problemas.

El contratista además indica que la interferencia de redes son unas de las situaciones que a pesar de que se tengan identificado donde inicia y donde finalizan, las acometidas de gas y conexiones domiciliarias son situaciones que han generado en medio de la ejecución problemas. El contratista manifiesta que hará revisión de todos los temas de esta índole para solucionar y atender de manera rápida.

NPS
La interventoría indica que en cuanto a los NPS, se evidencia que el NP 8 correspondiente a subterranización deberá ser anulado puesto que este ya se presentó en la propuesta. El contratista manifiesta que en una mesa de trabajo en la cual se propuso un precio en virtud al precio que está en el contrato, respecto al remplazo de medidores, el FDLK y la Interventoría indican al contratista que no hay medidores en este ítem, puesto que contempla registro mas no medidor.

El contratista indica que el residente técnico reviso el NP con el fin de que económicamente fuera factible y el proceso de ejecución fuera más rápido, el FDLK indica que no puede ser implementado ese NP puesto que no incluye la cajilla y luego este será cobrado de manera independiente y el precio aumenta.

En cuanto al NP 15 en cuanto a la mezcla asfáltica, se evidencia que el ítem seleccionado por el contratista es instalación a manual, esta debería ser instalación mecánica. El contratista indica que hay sectores donde no puede hacerlo de manera mecánica porque no hay acceso para poder extender la mezcla.

Cargue al aplicativo de SDA
El contratista menciona que se realizó el cargue de mes de diciembre y enero, se está a la espera de la certificación de los 2000 M3 para poder subir el siguiente cargue. Se realizó un acta con interventoría respecto al cargue, se enviará copia al correo del FDLK y al del PIGA.

Fecha de Superación del atraso
No se cuenta con la fecha de superación del atraso de acuerdo al plan de contingencia. El FDLK solicita en cuanto se ajuste y se revise la programación remitir las fechas de este.

Componentes

Técnico
-Informe semanal: El contratista ajusto los informes semanales 18,19,20 y 21 de acuerdo al plan de contingencia. El informe 22 esta revisión por parte de la interventoría y los informes de la semana 23 y 24 no han sido radicados.
-Informe Mensual 5: En revisión de interventoría.
-Calificación: 84%

SST
-Informe semanal: Aprobado
-Informe Mensual 5: Observado (pendientes planillas de seguridad social del mes de enero)
-calificación: 98.35%

Ambiental
-Informe semanal: Aprobado
-Informe Mensual 5: Aprobado
-Calificación: 98.35%

** La calificación fue afectada por orden y aseo, por falta cerramiento en el CIV 25. El contratista menciona que se ha remplazado varias veces este cerramiento sin embargo el fin de semana se volvió a adecuar y el martes se encontraron que nuevamente se fue robado el cerramiento, el plan de acción fue reponer las paletas y dejar constante un boal para cuidar dichas señales.*

Gestión Social
-Informe semanal: Aprobado
-Informe Mensual 5: Aprobado
-Calificación: 96%

**La interventoría menciona que se remitió una comunicación al contratista con varias observaciones de acuerdo a la presentación que se realizó a la comunidad. Una de las mayores causas fue convocar a la comunidad en un salón comunal sin capacidad.*

El componente social de interventoría indica que la semana pasada con la reunión de inicio no fue la más óptima. Y esta semana se repitieron los errores, se evaluó como había sido la reunión de inicio y se solicitó que la parte técnica realizara el ejercicio de mostrar los avances y presentar lo adecuado ajustado con avances y demás. Pero se evidencio que no se llegó a un acuerdo. Esto causo que en la presentación no se evidenciara un apoyo técnico, varias inquietudes. Se evidencio que no presentaron las secciones transversales, y se presentó a la comunidad varios aspectos muy técnicos que para la comunidad son muy difícil de entender.

La interventoría indica e invita a el contratista a tomar acción y realizar los simulacros para que las presentaciones y reuniones con la comunidad se presenten de manera acorde a los lineamentos, para que la comunidad esté enterada de cómo va el contrato.

Se tiene programado el cuarto comité con la comunidad con el primer ciclo se realizará en abril y se debe explicar cómo va el proyecto, y como es la estructura y procedimiento del proyecto. Se solicita ir montando el simulacro de la reunión.

Se solicita al contratista dar respuesta a la comunicación U233-G1-357-23 respecto a cómo el contratista va a dar solución a los temas técnicos, logísticos y demás en los comités de participación ciudadana.

Obra

Se evidencia que el contratista de obra está ejecutando actividades en los 11 CIV (Avance por CIV se adjunta la agenda presentada en el comité). En los avances presentados se evidencian atrasos, esto evidencia que el contratista no está ejecutando actividades de manera continua en cada uno de los CIV, la interventoría solicita que las actividades en cada CIV sean simultaneas hasta finalizar actividades.

Se hace la presentación del plan de contingencia, se evidencia que diariamente hay atrasos en los CIV de acuerdo a las cantidades conciliadas. La desviación presentada en la curva está aumentando de manera progresiva, lo que se está ejecutando no es suficiente, porque no hay continuidad.

La interventoría explica que hay cantidades que no se están reportando y por ello se ven las diferencias y la desviación. El contratista menciona que hay varias cantidades de especio público puesto que no se tienen los NPS aprobados.

Se programa mesa de trabajo de espacio público para el día 24 de marzo de 2023 a las 10 am.

La interventoría indica que el seguimiento del plan de contingencia se está realizando diariamente con los inspectores y residentes de obra, en donde se concilian cantidades. Al ver que las cantidades no se están conciliando, se solicita que el día viernes 24 de marzo 2023 se realice una mesa de trabajo en campo de cómo se reportan las cantidades tanto de interventoría como contratista. Con el fin de que estas queden conciliadas semanalmente.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Mesa de trabajo espacio público	SCLV-XIE S.A	24/MAR/23
2	Oficio con fecha de superación del atraso	SCLV-XIE S.A	25/MAR/23
2	Radicación de informes semanales 23 y 24 ajustados	XIE S.A	24/MAR/23
3	Plan de contingencia ajustado	SCLV – XIE S.A	28/MAR/23
4	Rectificaciones de cantidades de obra	SCLV – XIE S.A	24/MAR/23

Elaborada por: Interventoría – Juan Manuel Alba Rojas

Fecha de la próxima reunión: 30-marzo-23 Lugar de la próxima reunión:

AGENDA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO

Contratista de Obra XIE S.A – COP -621-22 Grupo 1

COMITÉ DE SEGUIMIENTO No.25

Fecha: 23 de marzo de 2023

ORDEN DEL DIA

1.Compromisos Pendientes	
No	**Asunto**
1	Planos impresos en obra
2	Realizar el cargue en el aplicativo de la SDA
3	Comunicación de fecha de superación del atrasó
2. Componentes	
A. Técnico	
- **Informe semanal:** El contratista ajusto los informes semanales 18,19,20 y 21 de acuerdo al plan de contingencia. El informe 22 esta revisión por parte de la interventoría y los informes de la semana 23 y 24 no han sido radicados.	
- **Informe Mensual 5:** En revisión de interventoría.	
- **Calificación:** 84%	
B. SST	
- **Informe semanal :** Aprobado	
- **Informe Mensual 5:** Observado	
- **Calificación:** 98.35%	
C. Ambiental	
- **Informe semanal :** Aprobado	
- **Informe Mensual 5:** Aprobado	
- **Calificación:** 98.35%	
D. Gestión Social	
- **Informe semanal :** Aprobado	
- **Informe Mensual 5:** Aprobado	
- **Calificación:** 96%	
Obra	

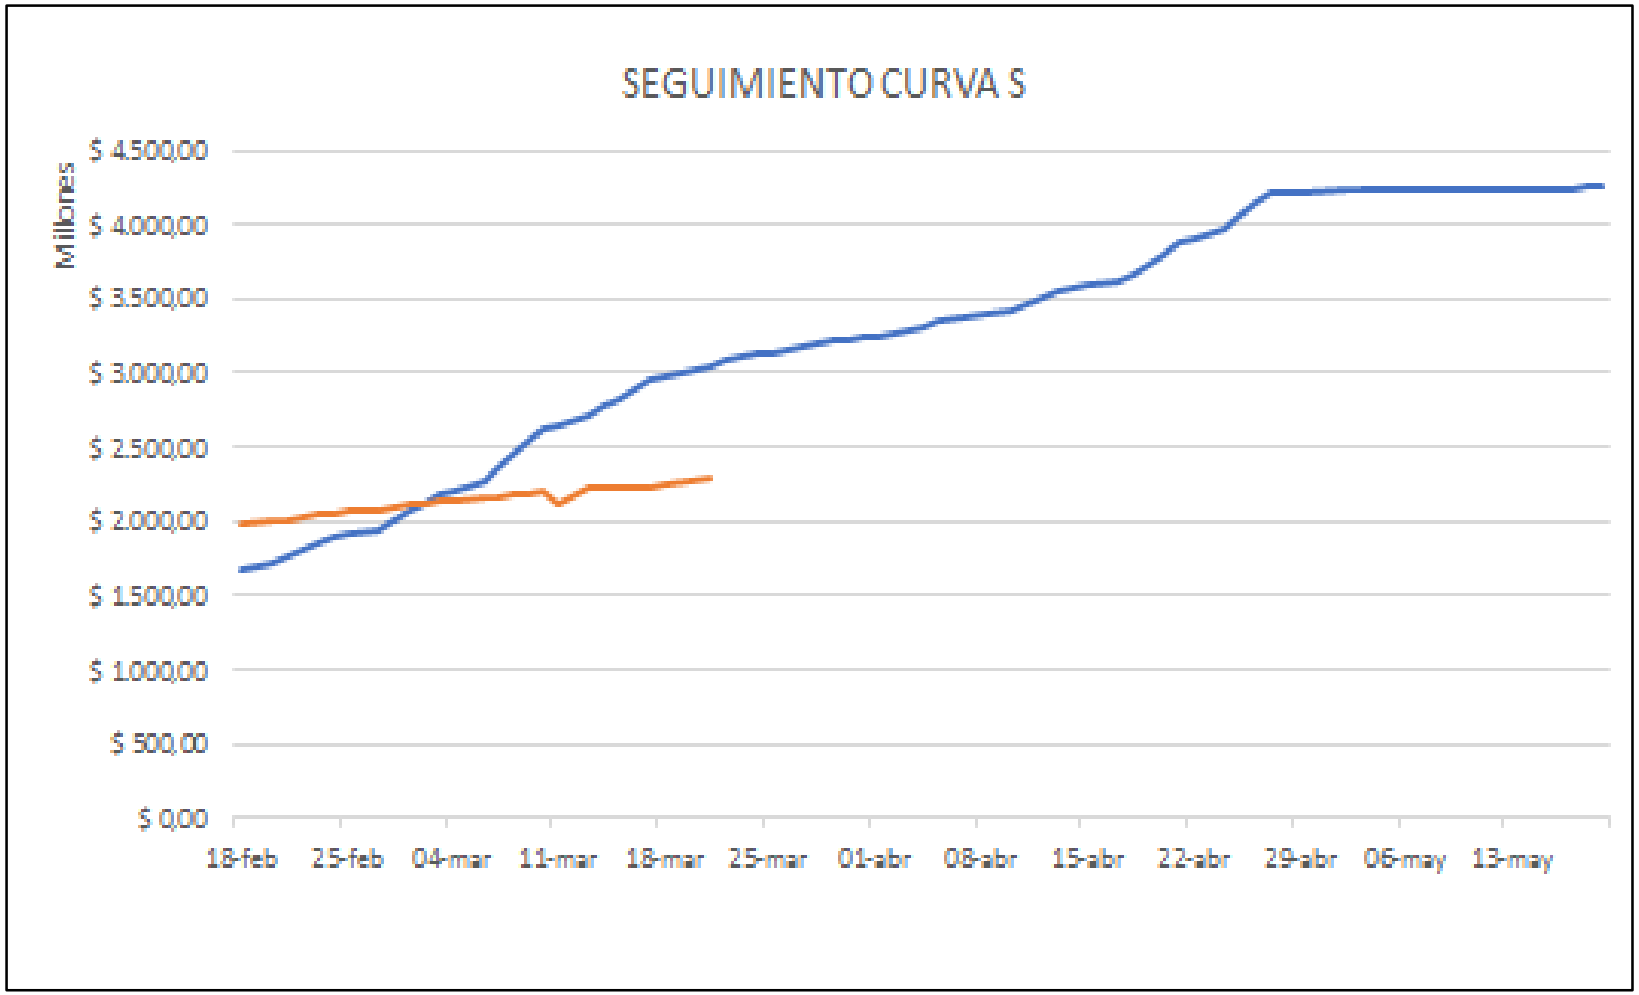
Alcaldía Local de Kennedy

SEGUIMIENTO PLAN DE CONTINGENCIA GRUPO 1 DEL 21-MARZO-2023

PRIORIDAD	CIV	PROGRAMADO ACUMULADO	% PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO
28	8000929	$293 624 300	6.67%	$134 622 295	3.06%
29	8000996	$239 417 606	5.44%	$110 132 099	2.50%
24	8000871	$265 953 771	6.04%	$122 338 735	2.78%
25	8000923	$328 817 744	7.47%	$266 342 373	6.05%
13	8000772	$95 143 023	2.16%	$80 871 570	1.84%
14	8000814	$186 611 501	4.24%	$162 352 006	3.69%
17	8000794	$312 179 984	7.09%	$249 743 987	5.67%
18	8000839	$357 242 710	8.11%	$289 366 595	6.57%
21	8000821	$337 571 461	7.66%	$327 444 317	7.43%
22	8000864	$343 218 002	7.79%	$312 328 382	7.09%
3	8000957	$277 975 607	6.31%	$239 059 022	5.43%
TOTAL		**$3 037 755 709**	**68.97%**	**$2 294 601 380**	**52.09%**

SEGUIMIENTO DIARIO EN MILLONES DE PESOS

DIA	14-mar	15-mar	16-mar	17-mar	18-mar	21-mar
$ PROG ACUM	$2 771	$2 832	$2 888	$2 951	$2 973	$3 038
% PROG ACUM	62.90%	64.29%	65.56%	66.99%	67.50%	68.97%
$ EJEC ACUM	$2 224	$ 2 225	$2 226	$2 237	$2 244	$2 295
% EJEC ACUM	50.49%	50.52%	50.54%	50.79%	50.95%	52.09%
$DESVIACIÓN	**$(546)**	**$(607)**	**$ (662)**	**$ (714)**	**$(729)**	**$ (743)**
% DESVIACIÓN	**-12.41%**	**-13.77%**	**-15.02%**	**-16.20%**	**-16.55%**	**-16.87%**


SEGUIMIENTO CURVA S
Millones
$ 4.500,00
$ 4.000,00
$ 3.500,00
$ 3.000,00
$ 2.500,00
$ 2.000,00
$ 1.500,00
$ 1.000,00
$ 500,00
$ 0,00
18-feb
25-feb
04-mar
11-mar
18-mar
25-mar
01-abr
08-abr
15-abr
22-abr
29-abr
06-may
13-may

Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la semana
28	8000929	**Calzada:** a nivel de segunda capa de RCD. Sin actividades en la semana
29	8000996	**Calzada:** a nivel de segunda capa de RCD. **Anden oriental:** demolición completa de pisos en concreto y avanza excavación del K0+000 al K0+020 en un espesor prom de 45 cm. **Anden occidental:** sin actividades
24	8000871	**Calzada:** a nivel de segunda capa de RCD. **Anden oriental:** demolición completa de pisos en concreto, excavación en un espesor prom de 45 cm y avanza el lleno con RAP del K0+000 al K0+040 en un espesor prom de 20 cm. Excavación para monoblock del K0+000 al K0+025. **Anden occidental:** demolición de pisos en concreto del K0+000 al K0+025.
25	8000923	**Calzada:** a nivel de segunda capa de RCD. **Anden oriental:** demolición completa de pisos en concreto, excavación en un espesor prom de 45 cm y avanza el lleno con RAP del K0+000 al K0+064 en un espesor prom de 35 cm. Excavación para monoblock del K0+000 al K0+059. **Anden occidental:** demolición completa de pisos en concreto, excavación en un espesor prom de 45 cm y avanza la excavación para monoblock del K0+000 al K0+050.
13	8000772	**Calzada:** a nivel de segunda capa de RCD. En la semana se completó el RCD estabilizado en segunda capa del K0+010 al K0+045.
14	8000814	**Calzada:** a nivel de segunda capa de RCD. **Anden oriental:** demolición completa de pisos en concreto, excavación en un espesor prom de 45 cm y avanza el lleno con RAP del K0+000 al K0+040 en un espesor prom de 35 cm. **Anden occidental:** sin actividades
17	8000794	**Calzada:** a nivel de segunda capa de RCD. En la semana se completó el RCD estabilizado en segunda capa del K0+013 al K0+035.

Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la semana
18	8000839	**Calzada:** a nivel de segunda capa de RCD. Sin actividades en la semana
21	8000821	**Calzada:** a nivel de segunda capa de RCD. Sin actividades en la semana
22	8000864	**Calzada:** a nivel de segunda capa de RCD. **Anden oriental**: demolición completa de pisos en concreto, excavación en un espesor prom de 45 cm y avanza el lleno con RAP del K0+000 al K0+056 en un espesor prom de 20 cm. **Anden occidental:** demolición completa de pisos en concreto, avanza la excavación en un espesor prom de 45 cm del K0+000 al K0+035.
3	8000957	**Calzada:** a nivel de segunda capa de RCD. **Anden oriental:** Avanza la demolición de pisos en concreto del K0+000 al K0+030. **Anden occidental:** sin actividades
Total Frentes abiertos		**6 Frentes de obra**
