BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo De Desarrollo Local de Kennedy

FECHA: 20 de abril de 2023 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** 01

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité Integral No. 7 de seguimiento No. 28

HORA DE INICIO: ____ **HORA DE FINALIZACIÓN:** 4:40 pm

ASISTENTES:

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Andrés Mauricio Rojas Ll.			X						X	FDLK-Infraestructura	andresm.llanos@gobiernobogota.gov.co	3057039773	
Danilo Meneses Toro			X						X	FDLK-Infraestructura	Danilo.Meneses@gobiernobogota.gov.co	3118988054	
Oswaldo Ladino Chavel			X						X	SCLV-Interventoría	dir-viales@silcarta.com.co	3103178077	
Juan H. Alba R.			X						X	SCLV-Interventoría	garantia@lavialidad.co	3107177892	
Oscar Vargas -		X							X	Xie. SA	Oscar.vargas@xie.com.co	3102279581	
Manuel Alejandro Miguel Garcia			X						X	XIE SA.	Xdirectorproyecto21@gmail.com	3219141481	
ROSA LIDA MONQUA			X						X	XIE S.A	xie.kennedyresidente2@gmail.com	3223141853	
Maria Camila Pera Roa			X						X	XIE. S.A.	xie.ambiental@gmail.com	3102457234	
Sandra Pinto Cardenas			X						X	xie.sst1621@gmail.com	xie.sst1621@gmail.com	3208921058	
Yolén Agamez C.			X						X	XIE S.A	milen.agamez@outlook.com	318396 0998	
Ana Leonor Porras R			✓						✓	Interventoria	alcoporras@gmail	3212014149	

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo De Desarrollo Local de Kennedy

FECHA: 20 de abril de 2023 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** GL

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité Integral 7 de seguimiento No. 28

HORA DE INICIO: ____ **HORA DE FINALIZACIÓN:** ____

ASISTENTES:

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Sonia E Berzunda Gómez			Y						Y	Interventoria Consorcio SCLV	Socialgrupo7.fdlk@gmail.com	3103626480	
José de Calasanz Mosquera			X							Interventoria	interventoria@gmail.com	3044	
Alba Yolanda Morales Arios			X							Interventoria. SCLV	aymat380@gmail.com	3114490424	
Nury Mireya Albarracin Vega			X							Interventoria SCLV	SSTdkennedy@outlook.com	3123230618	
Kuren Judith Penates Ramirez			X							Interventoria SCLV	U233SCLVkennedy@outlook.com	3143253729	
LIMAR MONTALVO H.			K							KIA	MONTALVOBETHEL@HOTMAIL.COM	3008742898	
Anyeli Cunel Acosta			X							Interventoria SCLV	U233SCLVkennedy@outlook.com	3227401898	
Jorge E. Tamayo Mejía			X							Interventoría Cons. SCLV	kennedy.financiero@gmail.com	317.4410997	
Jesus Restrepo Lago			X							Interventoría sclv	U233SCLVkennedy@outlook.com	3002133006	
ARTURO RAMIREZ M.			X							INTERV. SCLV	arturoramirezm@yahoo.com	71523683	
Pablo Augusto Castillo G			X							Interv. SCLV	pablo.castillo@laviatidad.com	3117556026	

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se da inicio al comité de seguimiento No. 28 integral No. 7 en las instalaciones de la interventoría las 2:30 pm, con la presencia del apoyo a la supervisión FDLK, contratista de obra Grupo 1 XIE S.A e Interventoría Consorcio SCLV.

Orden del Día

1. Compromisos Pendientes

A la fecha la Interventoría manifiesta que no se dio cumplimiento a los siguientes compromisos:

- Comunicación al FDLK informando sobre el plan de contingencia y su cumplimiento – Estado de multas
- AIU: Ajuste de impuestos descontando componentes
- Reporte de área aferente para cuantificación de espacio público
- Radicación de NPs espacio público– Balance - Informe de justificación al FDLK

Por otra parte, la Interventoría indica que a la fecha están en revisión los siguientes documentos:

- Cuentas diciembre 2022 y enero de 2023 ajustadas
- NPs de espacio público – Balance - Informe de justificación

Componentes

Componente SOCIAL

- Informe semanal 28: Aprobado
- Informe Mensual 6: En atención de observaciones del contratista
- Calificación: 100%

-Calificación del mes de marzo cerro en 93%, la calificación mensual fue afectada por la ausencia del auxiliar de gestión social del contratista y por la repetición de la reunión.

La Interventoría manifiesta que el día 18 de abril de 2023 se realizó el comité FDLK No.4, con una participación de un 24 %, además se desarrolló un taller de cultura ciudadana.

Par el 25 de abril de 2023 se realizará la repetición de reunión de inicio a las 9 am, con la comunidad del ciclo 2, es decir los nuevos frentes de obra que abrirán. La Interventoría solicita al contratista que la comunicación con la comunidad sea más acertada. Puesto que el lenguaje al exponer en las mismas es muy técnico y este no es muy claro para los mismos.

Por otra parte, la Interventoría indica que a la fecha no se cuenta con una fecha real de finalización y entrega del as prioridades 28 y 29. Se solicita al contratista realizar una tabla con fechas de terminación de CIV de acuerdo al plan de contingencia.

Componente SST
- Informe semanal 28: Aprobado
- Informe Mensual 6: Observado, por documentos de ingreso, retiros de personal y esto afecta 3 anexos del informe.
- Calificación: 100%
-Calificación del mes de marzo cerro en 99.58%, afectada por ítems ambientales afectados debido a que los cerramientos no están cumpliendo con lo exigido contractualmente.

Componente Ambiental
- Informe semanal 28: Aprobado
- Informe Mensual 6: Sin radicar, pendiente por revisar cantidades en referencia al componente técnico.
- Calificación: 100%
-Calificación del mes de marzo cerro en 99.58%, afectada por ítems ambientales afectados debido a que los cerramientos no están cumpliendo con lo exigido contractualmente.

Por otra parte, el contratista manifiesta que hay la nueva resolución 1257 del 2021, no incluye GCR en aprovechamiento del 25%, y se solicitó a SDA para que realice una capacitación para dar aclaraciones en el momento del cargue, puesto que posiblemente los formatos presentaran modificaciones. Contratista e Interventoría deben ponerse de acuerdo para estudiar la resolución.

Por otra la Interventoría indica que al corte de la semana pasada se realizó el cargue en el aplicativo del mes de febrero, se envió el reporte al FDLK, está pendiente el certificado del IDU.

Forestal
La Interventoría y el contratista manifiestan que siguen a la espera de una respuesta de la SDA, respeto a la solicitud de tala de un árbol de especie urapán. ubicado en el CIV 8000655 prioridad 5. Se han realizado varios acercamientos y no se ha recibido respuesta.

El FDLK solicita sea remitido el radicado con el cual se realizó la solicitud a la SDA, con el fin de adelantar la gestión con el PIGA.

Maquinaria y equipo
La Interventoría manifiesta que a la fecha el contratista esta al día con todos los formatos y documentos de maquinaria y equipo.

Técnico
-Frentes de obra activos: 8
-Informe semanal 28: Sin radicar
-Informe mensual 6: Sin radicar
-Calificación: 86% (La calificación ha sido afectada por llamados de atención reiterativos al PMT).

Frente a las prioridades que no presentaron actividades en la semana, el contratista manifiesta que es por falta de monoblock, puesto que este es el insumo fundamental para el avance de obra, además del personal puesto que no cuentan con el recurso. El Grupo 2 cuenta con este insumo.

El FDLK manifiesta que puede hacerse un acercamiento con el contratista de obra grupo 2 y realizar un trueque de monoblock para avanzar, puesto que es importante entregar las prioridades que están abiertas desde el mes de diciembre además de incluir más personal, de no ser así seguirán presentando problemas sociales y demás.

Por otra parte, la Interventoría manifiesta que una de las observaciones de la semana al contratista, es que el RCD debe ir en dos capas y los ensayos de densidades se deben realizar a la capa completa (35 cm). Otra de las observaciones es respecto al concreto de 3000 psi, ya que en el espacio público al estampar la plantilla táctil quedan los taches, pero al secar esta pierde altura, el contratista debe consultar este problema con el proveedor de concreto.

**Se adjunta agenda que contiene plano de prioridades y cuadro de actividades por prioridades*

Especialidades

Tránsito y transporte

La Interventoría manifiesta que para la semana del 13 al 19 de abril de abril de 2023 SDM dio la aprobación del PMT de la prioridad 12, 15, 16, 26 y 27.

La Interventoría solicita realizar una mesa de trabajo con el especialista del contratista para la revisión de los diseños de señalización, puesto que hay diseños de varias prioridades que están próximos a vencer.

Espacio Público y Urbanismo

El contratista manifiesta que hay predios que cuentan con un acceso con altura de 50 a 40 cm por encima del nivel del anden, el contratista propone unificar los accesos, pero la interventoría indica que en los diseños los accesos son individuales no continuos con escalón. El contratista manifiesta que presentara una solución desde el punto de vista arquitectónico junto con el plano ajustado. Se espera que esta solución no afecte el presupuesto.

La Interventoría manifiesta que otro de los problemas es que de uno de los predios es que cuenta con dos cajas de inspección y estas deben ser conservadas y que en los predios bajos el monoblock va contra el paramento, el monoblock es de 25 cm de ancho de acuerdo al diseño, el especialista del contratista manifiesta que normalmente para espacio público se utilizan solos, que son sistemas urbanos de drenaje, la norma no permite tener un espacio deprimido sin poder evacuar el agua. Es necesario el monoblock, ya que, si se implementan los solos, las rejillas prefabricadas pueden afectar el espacio público. En este caso se instalaría el más pequeño, y es con el que no cuenta el contratista.

Por otra parte, el FDLK solicita al contratista realizar el reporte de área aferente para cuantificación de espacio público.

OTROS

-Programación: Adjunto a esta acta se evidencian los avances de la semana No. 28.

-Cuentas: La Interventoría manifiesta que se realizó una reunión interna, con el fin de determinar los factores que estaban afectado que los documentos contractuales y de cuentas estaban siendo observados más de 3 veces. La Interventoría manifiesta que, con respecto a las cuentas, se definió que en el informe de actividades y soportes cada uno de los componentes debe realizar la revisión de las obligaciones y soportes que le competan. Se le recomienda al contratista que haga esta actividad junto con su par de interventoría, para que no se presenten errores, observaciones o devoluciones.

De haber errores en las siguientes cuentas, se procederá a una solicitud de multa para el contratista puesto que se ha socializado sobre el tema en varias ocasiones. *La Interventoría se compromete a realizar la entrega de la cuenta No.3 de diciembre el lunes 24 de abril de 2023, de contar con todos lo exigido.

El FDLK solicita al contratista agregar al cuadro de control financiero la comunicación y fecha de radicación de la misma a la Interventoría.

Además, el FDLK solicita al contratista e Interventoría ponerse al día con informes y cuentas, puesto que no se está dando cumplimiento al PAC.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Comunicación al FDLK informando sobre el plan de contingencia y su cumplimiento – Estado de multas	SCLV	26-abr-23
2	Reporte de área aferente para cuantificación de espacio público	XIE S.A	26-abr-23
3	NPs de espacio público – Balance - Informe de justificación	XIE S.A	26-abr-23
4	*Cuentas de diciembre 2023 radicada al FDLK	SCLV	24-abr-23
5	Tabla con fechas de terminación de CIV de acuerdo al plan de contingencia	XIE S.A	26-abr-23
6	Remitir al FDLK los radicados de permiso de manejo silvicultural de árboles aislados.	XIE S.A	21-abr-23
7	Propuesta de acceso a predios contiguos espacio publico	XIE S.A	26-abr-23

Elaborada por: Interventoría – Juan Manuel Alba Rojas
Fecha de la próxima reunión: 27 de abril de 2023 Lugar de la próxima reunión: NA

AGENDA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO

Contratista de Obra XIE S.A – COP -621-22 Grupo 1

COMITÉ INTEGRAL No.7 DE SEGUIMIENTO No.28

Fecha: 20 de abril de 2023

ORDEN DEL DIA

1.Compromisos	
No	**Asunto**
1	NPS – Balance – Acta de fijación
2	Plan de contingencia – Programación PDT – Flujo de caja
3	Informes semanales actualizados y cargados a la nube
4	Comunicación al FDLK informando sobre el plan de contingencia y su cumplimiento – Estado de multas
5	AIU: Ajuste de impuestos descontando componentes
6	Reporte de área aferente para cuantificación de espacio público
7	Fecha de retiro de fresado en la UMV
8	NPs de espacio público – Balance - Informe de justificación
9	Radicación de NPs espacio público– Balance - Informe de justificación al FDLK
10	Informe mensual Diciembre 2022 y enero de 2023 ajustados
11	Cuentas Diciembre 2022 y enero de 2023 ajustadas

Convenciones

Radicado	
En elaboración	
En revisión	
Pendiente	

2. Componentes
A. Técnico
- **Informe semanal 28:** Sin Radicar
- **Informe Mensual 6:** Sin Radicar
- **Calificación:** 86%

Obra
B. SST
- **Informe semanal 28:** Aprobado
- **Informe Mensual 6:** Observado
- **Calificación:** 99.58%
C. Ambiental
- **Informe semanal 28 :**Aprobado
- **Informe Mensual 6:** Aprobado
- **Calificación:** 99.58%
D. Gestión Social
- **Informe semanal 28:** Aprobado
- **Informe Mensual 6:** El contratista se encuentra atendiendo observaciones de mesa de trabajo.
- **Calificación:** 100%
Especialidades
Varios

Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la Semana
32	8000979	**Calzada:** instalación segunda capa de estabilizado de la K0+ 010 al k0+030 12 m3.
33	8001041	**Calzada:** Estabilizado primera capa del K0+004 al K0+017 1.8 m3, estabilizado segunda capa K0+007 al K0+023 9.6m3
4	8001069	**Calzada**: Instalación segunda capa de estabilizado con soil- soil del K0+000 al K0+022 13.2 m3
28	8000929	**Calzada:** a nivel de segunda capa de RCD.
		Anden oriental: demolición manual y mecánica de anden desde la K0+K000 al K0+K045 45m2, excavación manual de anden de K0+K000 al K0+K045 16.68m3, construcción de caja de inspección.
		Anden occidental: Sin actividades.
29	8000996	**Calzada:** a nivel de segunda capa de RCD.
		Anden oriental: Corte para instalación de monoblock del K0+004 K0+K056,70 52,70ML, excavación para instalación de monoblock 3.95m3
		Anden occidental: Corte para instalación de monoblock del K0+004 K0+K055 51ML, excavación para instalación de monoblock 3.82m3, compactación de fresado anden del K0+060 al K0+040 40 m2.
3	8000957	**Calzada:** instalación de sumidero.
		Anden oriental: construcción de cajas de inspección parciales del K0+000 al K0+060, instalación de geotextil y fresado del K0+001 al K0+050
		Anden occidental: instalación de monoblock del K0+059 al K0+032, instalación de geotextil y fresado del K0+001 al K0+050
24	8000871	**Calzada:** a nivel de segunda capa de RCD.

Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la Semana
		Anden oriental: Instalación de bordillo A80 3ML del K0+006 al K0+009, instalación de monoblock del K0+000 al K0+018 4.4 ML
		Anden occidental: Nivelación y compactación de fresado segunda capa e instalación de 2 cajillas de agua potable del K0+030 al K0+032, instalación de concreto 3000psi para ande parcial K0+000 al K0+060, instalación de monoblock del K0+000 al K0+018 4.4 ML.
25	8000923	**Calzada:** a nivel de segunda capa de RCD.
		Anden oriental: Instalación de concreto parcial 3000psi del K0+000 al K0+060, instalación parcial de concreto 4000 psi MR- 41 para rampas.
		Anden occidental: Instalación de concreto parcial 3000psi del K0+000 al K0+060, instalación parcial de concreto 4000 psi MR- 41 para rampas.
21	8000821	**Calzada:** a nivel de segunda capa de RCD.
		Anden oriental: demolición y construcción de cajas de inspección parcial del K0+000 al K0+060.
		Anden occidental: demolición y construcción de cajas de inspección parcial del K0+000 al K0+060.
22	8000864	**Calzada:** a nivel de segunda capa de RCD.
		Anden oriental: instalación parcial de bordillo A80 9.50ML del K0+000 al K0+060, Instalación de concreto parcial 3000psi del K0+000 al K0+060, instalación parcial de concreto 4000 psi.
		Anden occidental: instalación parcial de bordillo A80 9.50ML del K0+000 al K0+060, Instalación de concreto parcial 3000psi del K0+000 al K0+060, instalación parcial de concreto 4000 psi.
17	8000794	**Calzada:** Sin actividades en la semana
18	8000839	**Calzada:** a nivel de segunda capa de RCD.
		Anden oriental: Construcción 1 caja de inspección entre el K0+000+K060.
		Anden occidental: Excavación manual parcial desde K0+000+K060 16.38m3, demolición anden 19.8 m2, construcción de 2 cajas de inspección entre el K0+000+K060.
13	8000772	**Calzada:** a nivel de segunda capa de RCD.
		Anden occidental: demolición de anden occidental parcial 26.48 m2, excavación de anden occidental, 3.47m3, instalación de tubería 3.3ML, nivelación y compactación, instalación de geotextil y fresado de 7.2m3
		Anden oriental: excavación para sumidero, instalación de tubería 12 pulgadas 4.30 ML.
14	8000814	**Calzada:** a nivel de segunda capa de RCD.
		Anden oriental: Corte estabilizado monoblock del K0+020 al K0+050.

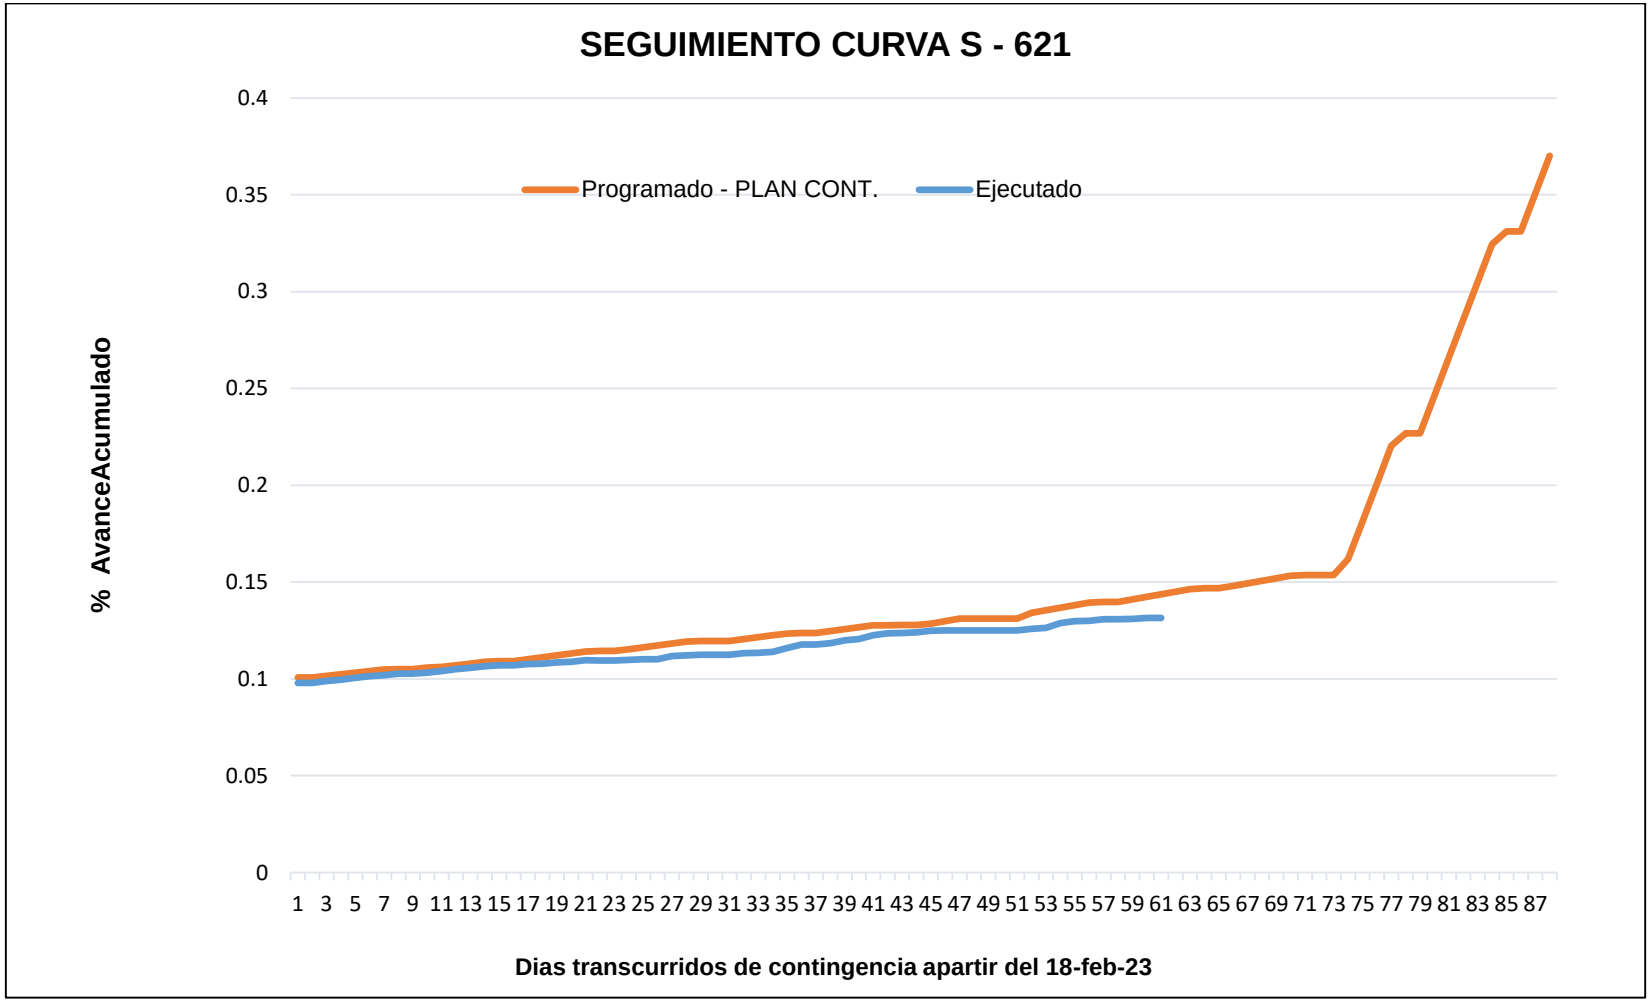
Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la Semana
		Anden occidental: Corte estabilizado monoblock del K0+001 al K0+050, excavación para tubería de sumidero a poso 1,68m3.
30	8001125	**Calzada:** nivelación y compactación de la subrasante del K0+000 al K0+062.75, excavación de la K0+000 al K0+062.75 209 m3, instalación de geotextil K0+000 al K0+062.75 71m2, instalación geo celda K0+025 al K0+062.75, instalación de fresado K0+000 al K0+062.75 18.75m3
		Anden oriental: cerramiento peatonal poli sombra 63ML
		Anden occidental: cerramiento peatonal poli sombra 63ML
31	8001058	**Calzada:** excavación mecánica del K0+050 al K0+065.18 56.97m3
		Anden oriental: cerramiento peatonal poli sombra 30ML
		Anden occidental: cerramiento peatonal poli sombra 30ML

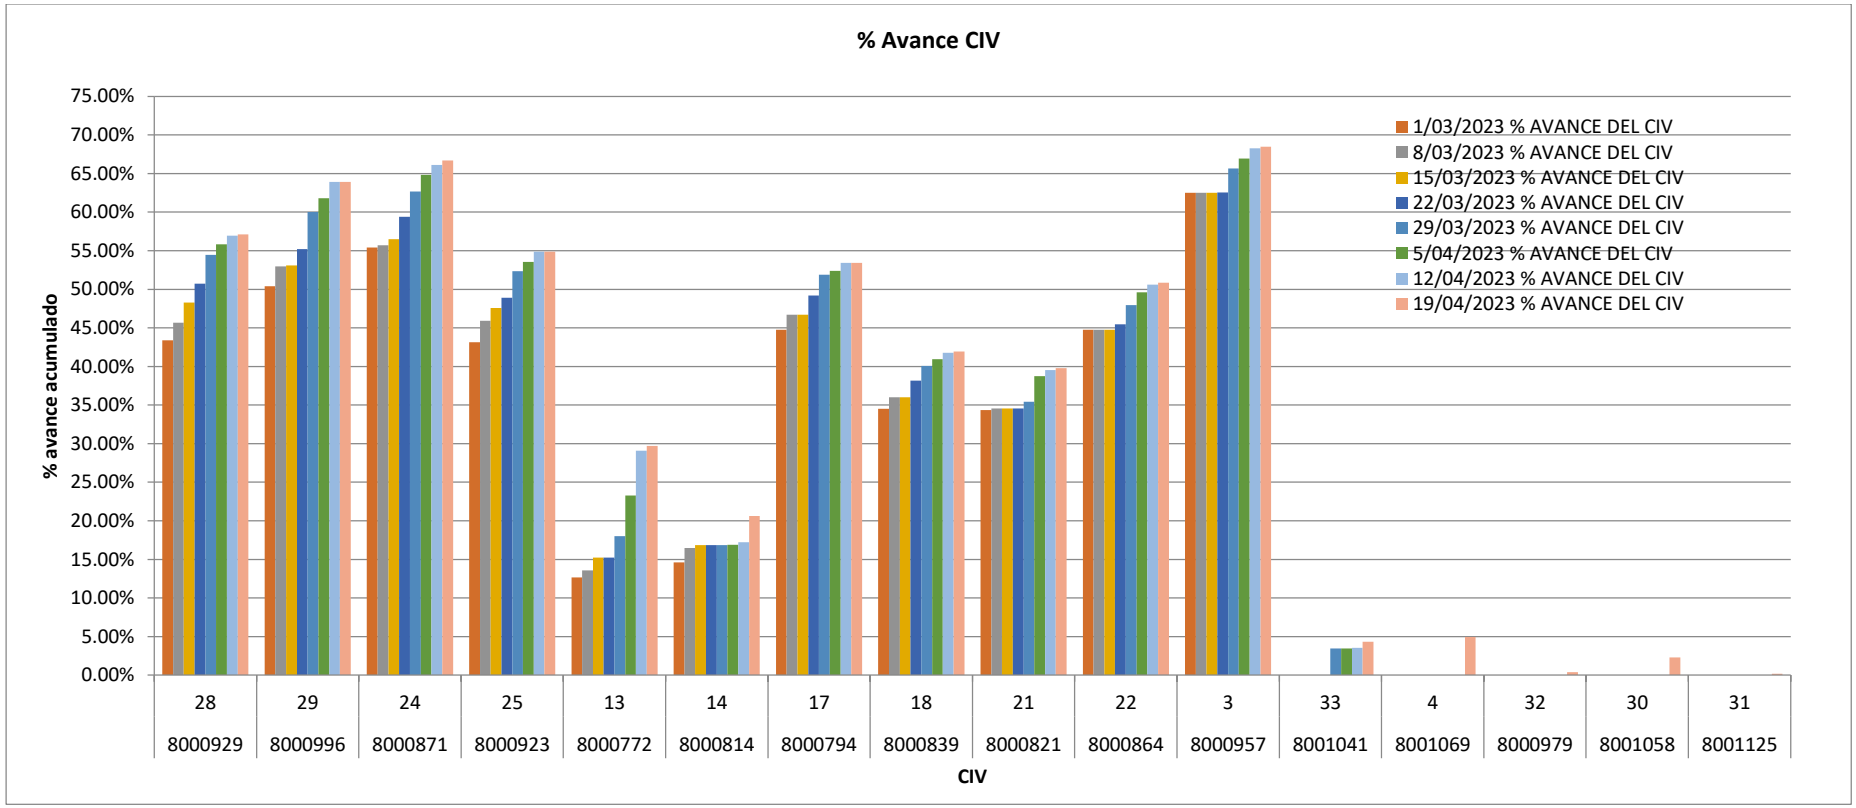
SEGUIMIENTO GRUPO 1 AL 19-ABRIL-2023

PRIORIDAD	CIV	PROGRAMADO ACUMULADO	% PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO
28	8000929	$ 172 024 381	1.03%	$ 221 084 679	1.32%
29	8000996	$ 160 997 335	0.96%	$ 214 487 548	1.28%
24	8000871	$ 181 694 894	1.08%	$ 228 020 481	1.36%
25	8000923	$ 226 694 758	1.35%	$ 234 275 660	1.40%
13	8000772	$ 135 895 900	0.81%	$ 99 613 832	0.59%
14	8000814	$ 211 210 097	1.26%	$ 97 032 278	0.58%
17	8000794	$ 148 727 501	0.89%	$ 216 960 757	1.29%
18	8000839	$ 217 155 215	1.29%	$ 194 041 870	1.16%
21	8000821	$ 207 267 732	1.24%	$ 170 922 538	1.02%
22	8000864	$ 264 274 924	1.57%	$ 243 939 469	1.45%
3	8000957	$ 188 919 828	1.13%	$ 260 868 319	1.55%
33	8001041	$ 50 483 350	0.30%	$ 7 629 824	0.05%
4	8001069	$ 39 071 379	0.23%	$ 8 629 824	0.05%
16	8000907	$ 27 197 399	0.16%	$ -	0.00%
15	8000856	$ 31 136 942	0.19%	$ -	0.00%
26	8000988	$ 31 987 205	0.19%	$ -	0.00%
27	8001052	$ 30 927 729	0.18%	$ -	0.00%
32	8000979	$ 26 331 420	0.16%	$ 724 080	0.00%
30	8001058	$ 28 816 750	0.17%	$ 8 223 973	0.05%
20	8000938	$ 30 592 197	0.18%	$ -	0.00%
31	8001125	$ -	0.00%	$ 634 639	0.00%
TOTAL		**$ 2 411 406 938**	**14.37%**	**$ 2 207 089 771**	**13.15%**

SEGUIMIENTO DIARIO EN MILLONES DE PESOS							
FECHA	**13-abr**	**14-abr**	**15-abr**	**16-abr**	**17-abr**	**18-abr**	**19-abr**
PROG ACUM	$ 2 317	$ 2 339	$ 2 346	$ 2 346	$ 2 368	$ 2 390	$ 2 411
% PROG ACUM	13.81%	13.94%	13.98%	13.98%	14.11%	14.24%	14.37%
EJEC ACUMULADO	$ 2 178	$ 2 181	$ 2 196	$ 2 196	$ 2 197	$ 2 207	$ 2 207
% EJEC ACUMULADO	12.98%	13.00%	13.08%	13.08%	13.09%	13.15%	13.15%
DESVIACIÓN	$ 139	$ 158	$ 150	$ 150	$ 171	$ 183	$ 204
% DESVIACIÓN	**-0.83%**	**-0.94%**	**-0.90%**	**-0.90%**	**-1.02%**	**-1.09%**	**-1.22%**

G1	**19-abr-23**		
	GENERAL	**OBRA**	**FINANCIERO**
% PROGRAMADO	15.73%	14.37%	15.73%
% EJECUTADO	13.85%	13.15%	10.73%
% DESVIACIÓN	**-1.88%**	**-1.22%**	**-5.00%**


SEGUIMIENTO CURVA S - 621
Programado - PLAN CONT.
Ejecutado
% AvanceAcumulado
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87
Dias transcurridos de contingencia apartir del 18-feb-23


% Avance CIV
% avance acumulado
75.00%
70.00%
65.00%
60.00%
55.00%
50.00%
45.00%
40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
1/03/2023 % AVANCE DEL CIV
8/03/2023 % AVANCE DEL CIV
15/03/2023 % AVANCE DEL CIV
22/03/2023 % AVANCE DEL CIV
29/03/2023 % AVANCE DEL CIV
5/04/2023 % AVANCE DEL CIV
12/04/2023 % AVANCE DEL CIV
19/04/2023 % AVANCE DEL CIV
28 8000929
29 8000996
24 8000871
25 8000923
13 8000772
14 8000814
17 8000794
18 8000839
21 8000821
22 8000864
3 8000957
33 8001041
4 8001069
32 8000979
30 8001058
31 8001125
CIV

CIV	FECHA EVALUACIÓN		1/03/2023	8/03/2023	15/03/2023	22/03/2023	29/03/2023	5/04/2023	12/04/2023	19/04/2023
	PRIORIDAD	VALOR TOTAL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV
8000929	28	$ 387 193 662.00	43.39%	45.65%	48.30%	50.71%	54.47%	55.82%	56.93%	57.10%
8000996	29	$335 480 235.00	50.41%	52.98%	53.07%	55.20%	60.00%	61.79%	63.93%	63.93%
8000871	24	$341 880 653.00	55.40%	55.68%	56.50%	59.39%	62.65%	64.84%	66.13%	66.70%
8000923	25	$426 826 969.00	43.15%	45.93%	47.58%	48.91%	52.34%	53.55%	54.89%	54.89%
8000772	13	$335 386 402.00	12.67%	13.55%	15.25%	15.25%	17.99%	23.27%	29.09%	29.70%
8000814	14	$470 646 759.00	14.60%	16.46%	16.83%	16.84%	16.86%	16.88%	17.21%	20.62%
8000794	17	$406 072 929.00	44.74%	46.69%	46.71%	49.18%	51.89%	52.38%	53.43%	53.43%
8000839	18	$462 540 379.00	34.50%	36.01%	36.01%	38.18%	40.08%	40.95%	41.77%	41.95%
8000821	21	$429 876 324.00	34.33%	34.56%	34.56%	34.58%	35.44%	38.75%	39.53%	39.76%
8000864	22	$479 608 776.00	44.77%	44.77%	44.77%	45.44%	47.94%	49.62%	50.62%	50.86%
8000957	3	$381 069 937.00	62.51%	62.51%	62.51%	62.54%	65.66%	66.95%	68.29%	68.46%
8001041	33	$176 572 662.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.47%	3.47%	3.54%	4.32%
8001069	4	$174 443 193.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.95%
8000979	32	$185 023 843.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.39%
8001058	30	$ 358 273 590.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.30%
8001125	31	$353 584 859.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.18%

Alcaldía Local de Kennedy

LA VIALIDAD

Silva Carreño & Asociados S.A.S.
