BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo De Desarrollo Local de Kennedy

FECHA: 27 de abril 23 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** GRUPO1.

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comite de seguimiento # 29.

HORA DE INICIO: ____ **HORA DE FINALIZACIÓN:** ____

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Juan Manuel Alba Rojas			X							Consorcio SCLV	juan.alba@ingenieria.com	310767 1942.	
Danilo Meneses Toro			X						X	FDLK Infraestructura	Danilo.Meneses@gobiernobogota.gov.co	3118988034	
ROSA LIDA MONGUA			X						X	XIE S.A.	xiekennedy.residente@gmail.com	3223141853	
Oscar Vargas		X							X	XIE, SA	Oscar.Vargas@gmail.com	310 8239581	
Lucas Restrepo Largo			X							Consorcio SCLV	U233SCLV.kennedy@outlook.com	3002133006	
Andrés Mauricio Rojas Ll.			X						X	FDLK-Infraestructura	andresm.llanos@gobiernobogota.gov.co	3057039778	
ARTURO ZARATE M.			X							CONSORCIO SCLV	arturozaratem01@yahoo.com	3152368037	
Karen Juliethi Perales Ramirez			X							Consorcio SCLV	U233SCLV.kennedy@outlook.com	3143253729	
Manuel Miguel Guerra			X							XIE SA	[illegible]	3212143916	

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	**EVIDENCIA DE REUNIÓN**

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se da inicio al comité de seguimiento no. 29 en las instalaciones del FDLK a las 2:19 pm, con la presencia del contratista de obra grupo 1 XIE S.A, apoyo a la supervisión del FDLK e Interventoría Consorcio SCLV.

1.Programación

La Interventoría inicia informando al contratista de obra grupo 1 y FDLK que al revisar la programación del plan de continúen vicia este no concuerda con los avances evidenciados en obra, lo ejecutado acumulado sobre lo programado debería ser el 100% y lo presentado lo supera.

Con lo presentado se evidencia que el contratista está atrasado, no hay una lógica contra el plan de contingencia presentado. (Se adjunta programación presentada).

El contratista manifiesta que, si bien no ha realizado la entrega de al menos un CIV terminado, esto se debe a que no cuenta con el presupuesto y capital para finalizar algunas de las prioridades.

2***.Facturación***

El contratista de obra manifiesta que, al indagar respecto al proceso de montaje de cuentas, se evidencio que el componente técnico es el cuello de botella, puesto que no se están conciliando, revisando y verificando las cantidades ejecutadas en obra.

De acuerdo a la revisión exhaustiva del contratista de manera interna lograron realizar los siguientes avances para sacar las cuentas adelante:

•Se radico corregido el informe técnico No. 4 del mes de enero
•Está pendiente la aprobación de informe técnico No. 4 de enero por parte de la Interventoría.
•El contratista manifiesta que se radico el informe mensual No. 6 del mes de marzo y las cantidades.
•La cuenta de febrero ya estaba revisada en cuanto cantidades por parte de la interventoría, es decir que el informe fue radicado el día 26 de abril en atención a todas las observaciones y una vez se tenga la aprobación de enero se radicara la cuenta.

El contratista manifiesta que de acuerdo a compromisos pasados se había comprometido a radicar la cuenta de abril el 25 de abril de 2023, el estado es:

•El día 26 de abril de 2023 se radicaron todos los informes semanales
•Los informes semanales corregidos hasta el mes de marzo se radicaron a la interventoría.
•El día 27 de abril de 2023 se radicarán los informes semanales técnicos corregidos del mes de abril
•En cuanto a los componentes se radicaron todos los informes mensuales marzo del componente de gestión social, Ambiental, forestal se radicará hoy, SST está pendiente porque no tienen al día los pagos de la seguridad social.
•La cuenta de febrero se radicará en cuanto se tenga.
El FDLK indica que para cumplir con el PAC se habían destinado 4 mil millones para el cobro.

Enero

1.El martes 2 de mayo de 2023 se realizará revisión del informe técnico No. 4 de enero
2.El martes 2 de mayo de 2023 se radicará la aprobación general del informe mensual No. 4 de enero al FDLK
3.El miércoles 3 de mayo de 2023 se realizará la revisión y radicación de la cuenta al FDLK, de no contar con observaciones.

Febrero

1.El 28 de abril de 2023 se realizará la radicación del informe técnico de No. 5 a la interventoría.
2.El 5 de mayo de 2023 se debe dar concepto de aprobación por parte de la interventoría.
3.El 5 de mayo radicación de la cuenta a la interventoría
4.El 9 de mayo de 2023 se radica la cuenta del contratista del mes febrero al FDLK

Marzo

1.El día 26 de abril de 2023 se radico a la interventoría la pre-acta sin cantidades conciliadas.
2.El 5 de mayo de 2023 se realizará la conciliación de cantidades y la pre-acta con la interventoría.
Se deja en acta que las fechas aquí pactas son solo para dar un panorama de los pendientes y que se debe ir evacuando.

El FDLK solicita que las actas de cobro estén todas radicadas antes del 12 de mayo de 2023, es decir deben estar revisadas y aprobadas.

El contratista manifiesta que se debe llevar muy acorde las cantidades ejecutadas en obra, puesto que esta suma, y lo que se hace cada día se debe reflejar en los avances.

El contratista solicita al FDLK y a la Interventoría que los comités sean orientados en la facturación para que la facturación sea eficaz.

La Interventoría indica que la obra está cumpliendo a cabalidad con lo estipulado contractualmente, se evidencia que la obra en más de un 80% pero lo mostrado en los avances indica que no se lleva ejecución de más de un 60%, hay unos pequeños remates los que hay pendientes y pues el contratista se debe concentrar también en la instalación del monoblock. El contratista de obra indica que si se ha visto atrasado es porque el monoblock tiene un costo muy elevado.

Se evidencia que hay errores en cuanto a cantidades o el valor que se estipulo para el CIV en la programación no es el acorde a lo que en realidad cuesta ejecutarlo. La medición puede estar por encima, se está realizando una evaluación solo financieramente.

La interventoría indica que se el contratista debe realizar una evaluación y un ajuste a la programación sin modificar fechas de acuerdo a la realidad de la ejecución.

La Interventoría además indica que remitió una comunicación donde se anexa una fotografía de o que se pactó dejar en la programación, se solicita al contratista que lo aplique.

El FDLK también solicita que se revise y de ajuste, puesto que ya se evidencio un avance negativo y producto de una solicitud de proceso de multa por incumplimiento a la programación.

El FDLK solicita que se adjunte la curva S puesto que no se está haciendo la presentación en la agenda del día. (Se adjunta la agenda del día agregando la curva S de la semana).

Por otra parte, la Interventoría indica que a la fecha el contratista de obra cuenta con 7 frentes de obra activos.

Tránsito

El especialista de tránsito y transporte de la interventoría indica que se reunió en mesa de trabajo con el contratista el día 24 de marzo de 2023 y se evidencio que los planos de cada uno de los CIV entregados por el FDLK están acordes. Pero hay un tema que es de supremo cuidado puesto que se evidencia que la consultoría había tramitado los diseños de señalización de cada uno de los CIV y estaban vigentes a dos años, pero hay varios que están próximos a vencer, los más próximos a vencer son los que vencen en junio 2022.

La Interventoría manifiesta que se tenga en cuenta este tema puesto que estos permisos llevan mucho tiempo. El FDLK indica que hará la solicitud de reunión con la subdirección de señalización y plantear la situación para que se tengan que presentar nuevamente la señalización.

La Interventoría realizara la evolución y cruce de los CIV próximos a vencer para solicitarla reunión.

Por otra parte, la Interventoría indica que se espera que para la próxima semana llegue la aprobación de los 5 PMT que se radicaron la semana pasada (Prioridad 12,15,16,26 y 27), para el cambio de fase.

Para finalizar el FDLK solicita al contratista indicar las fechas de cuando se hace la entrega de los primeros CIV terminados, la interventoría responde que estos debieron ser entregados el 23 de abril y 26 de abril de 2023, es por eso que el contratista debe hacer una evaluación de esa programación.

La Interventoría solicita al contratista tener en cuenta los detalles en obra como lo son el monoblock de inspección, los sumideros. Es importante que el contratista se contacte con el proveedor TITAN, el contratista indica que solicito la reunión, la interventoría solicita además que se hable con el ingeniero delegado de EAB Patiño de acuerdo a las recomendaciones.

El contratista indica que de acuerdo a lo indicado por el proveedor TITAN, al realizar una modificación de la pieza se debe hacer sujeto a la orden de compra de las 100 piezas. La Interventoría solicita al contratista de obra solicitar una reunión de TITAN. El contratista de obra solicita se dé un espacio, puesto que se realizó la visita a el proveedor CONCRETARTE, puesto que este ofrece crédito.

La Interventoría indica que ya se debe empezar a subsanar el tema, puesto que esto ha afectado la calidad de la obra en cuanto a la geocelda y subrasante.

El contratista indica además que el prefabricado como tal es el mismo en TITAN y Concretarte, la diferencia radica en que concretarte facilita la venta de una pieza del prefabricado para poder realizar la prueba del mismo y así demostrar que la opción con mampostería es acorde y cuenta con un riesgo mínimo para su implantación puesto que los con los cálculos estructurales se diseñó para peso mayor de la estructura, antes de comprar todas las piezas que se requieren en cada uno de los CIVs.

La Interventoría solicita al contratista dar respuesta a la comunicación U233-G1-410-23 antes del 3 de mayo de 2023, de acuerdo a los sumideros en los cuales va a implementar la rejilla soportada en vigas, por afectación a ala geocelda y la subrasante y se debe dar una solución lo antes posible.

El FDLK solicita y reitera que se radiquen lo antes posible las cuentas.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Radicación de Informes y cuentas de acuerdo a lo pactado	SCLV-XIE S.A	Ver anexo 1
2	Mesa de trabajo con SDM diseños de señalización	SCLV – XIE S.A-FDLK	Por pactar
3	Revisión y ajuste de programación del plan de contingencia	XIE S.A	2-may-23
4	Respuesta a oficio U233-G1-410-23 de sumideros en los cuales va a implementar la rejilla soportada en vigas	XIE S.A	3-may-23

Elaborada por: Interventoría – Juan Manuel Alba Rojas
Fecha de la próxima reunión: 4 de mayo de 2023 Lugar de la próxima reunión: NA

AGENDA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO

Contratista de Obra XIE S.A – COP -621-22 Grupo 1

COMITÉ DE SEGUIMIENTO No.29

Fecha: 27 de abril de 2023

ORDEN DEL DIA

1.Compromisos	
No	**Asunto**
1	Comunicación al FDLK informando sobre el plan de contingencia y su cumplimiento – Estado de multas
2	Reporte de área aferente para cuantificación de espacio público
3	NPs de espacio público – Balance - Informe de justificación
4	Cuentas enero de 2023 ajustadas
5	Tabla con fechas de terminación de CIV de acuerdo al plan de contingencia
6	Remitir al FDLK los radicados de permiso de manejo silvicultural de árboles aislados.
7	Propuesta de acceso a predios contiguos espacio publico

Convenciones

Radicado	
En elaboración	
En revisión	
Pendiente	

2. Componentes
A. Técnico
- **Informe semanal 29:** Sin Radicar
- **Informe Mensual 6:** Sin Radicar
- **Calificación:** 86%
Obra
B. SST
- **Informe semanal 29:** Aprobado
- **Informe Mensual 6:** Observado

- **Calificación:** 95%
C. Ambiental
- **Informe semanal 29 :**Aprobado
- **Informe Mensual 7:** En revisión mesa de trabajo.
- **Calificación:** 95%
D. Gestión Social
- **Informe semanal 29:** Aprobado
- **Informe Mensual 6:** Aprobado
- **Calificación:** 100%
Obra

Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la semana
4	8001069	**Calzada**: a nivel de segunda capa de RCD del K0+000 al K0+022 13.2 m3. **Andén oriental:** Sin actividades. **Andén occidental:** Sin actividades.
32	8000979	**Calzada:** a nivel de segunda capa de RCD del K0 + 010 al k0+030 12 m3. **Andén oriental:** Sin actividades. **Andén occidental:** Sin actividades.
28	8000929	**Calzada:** a nivel de segunda capa de RCD. **Andén oriental:** demolición manual y mecánica de andén desde la K0+K045 al K0+K060 15m2, excavación manual de andén de K0+K045 al K0+K060 12m3, demolición de cajas de inspección 2 unidades 0.54 m3 **Andén occidental:** Sin actividades.
29	8000996	**Calzada:** a nivel de segunda capa de RCD. **Andén oriental:** Corte perfilado para instalación de monoblock del K0+K004 al K0+058 54 ML, excavación para instalación de monoblock K0+K004 al K0+058 K0+K055 4.7m3, compactación de fresado en andén del K0+004 al K0+058. **Andén occidental:** Corte para instalación de monoblock del K0+004 K0+K055 51ML, excavación para instalación de monoblock del K0+004 K0+K055 4.5m3, compactación de fresado en andén del K0+060 al K0+004.
24	8000871	**Calzada:** a nivel de segunda capa de RCD. **Andén oriental:** instalación de concreto 3000psi para andenes parcial K0+000 al K0+060 e instalación de 6 cajillas de agua potable del K0+006 al K0+060,

Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la semana
		nivelación y compactación de fresado segunda capa parcial del K0+K006 al K0+K060 **Andén occidental:** Instalación de bordillo A80 del K0+050 al K0+053.20 3.20ML, nivelación y compactación de fresado segunda capa parcial del K0+K006 al K0+K060 e instalación de 3 cajillas de agua potable del K0+006 al K0+060, instalación de concreto 3000psi para andenes parcial K0+000 al K0+060, instalación de monoblock del K0+18 al K0+030 12 ML.
25	8000923	**Calzada:** a nivel de segunda capa de RCD. **Andén oriental:** Nivelación y acabados en cajas de inspección parciales 4 unidades del K0+K 000 al K0+K 060, instalación de concreto para andén de 3000psi de un predio K0+K 000 al K0+K 060. **Andén occidental:** Nivelación y acabados en cajas de inspección parciales 2 unidades del K0+K 000 al K0+K 060
21	8000821	**Calzada:** a nivel de segunda capa de RCD. **Andén oriental:** Instalación de monoblock del K0+K 015 al K0+K 040 25ML. **Andén occidental**: Demolición y construcción de cajas de inspección 2 unidades del K0+K 000 al K0+K 060, corte y estabilizado para instalación de monoblock del K0+K 015 al K0+K 035, demolición y estabilizado para instalación de monoblock del K0+K 015 al K0+K 0354 1.75m3, nivelación y acabados para cajas de inspección parcial 2 unidades del K0+K 000 al K0+K 060
22	8000864	**Calzada:** a nivel de segunda capa de RCD. **Andén oriental**: Instalación de concreto 3000psi 7m3 para andén, nivelación y compactación en rampas (volumen ya se había reportado anteriormente) **Andén occidental:** Instalación de concreto 3000psi 7m3 para andén, corte estabilizado del K0+015 al K0+K035, demolición de estabilizado del K0+015 al K0+K035 1.75m3, demolición de cajas de inspección 0.54 m3 instalación de bordillo A-80 intersección CL 40A 7,34 ML.
3	8000957	**Calzada:** instalación de sumidero. **Andén oriental:** Instalación de geotextil del K0+001 al K0+050 98 m2. instalación de fresado del K0+001 al K0+050 19.6m3, demolición de anden del K0+050+ al K0+K060 5.19m2, excavación de andén 3.36m3

Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la semana
Alcaldía Local de Kennedy		**Andén occidental:** instalación de monoblock del K0+059 al K0+032, instalación de geotextil y fresado del K0+001 al K0+050, demolición de anden del K0+050+ al K0+K060 5.19m2, nivelación y compactación de andén.
13	8000772	**Calzada:** a nivel de segunda capa de RCD. **Andén occidental:** Sin actividad. **Andén oriental:** excavación manual anden 50m3m desde K0+000 al K0+060, demolición de 1 caja de inspección 0.27m3 y construcción de 1 caja de inspección 0,36m2 parcial del K0+000 al K0+060.
14	8000814	**Calzada:** Instalación de tubería alcantarillado a sumidero 5.70 ML, instalación de arena base para tubería 3.17m3, excavación mecánica en intersección prioridad 14 y 13 5.76m3. **Andén oriental:** instalación de monoblock del K0+057 al K0+034 27ML. **Andén occidental:** Sin actividad.
17	8000794	**Calzada:** Se realiza construcción de un filtro de 10 pulgadas, para evacuar gran cantidad de agua en el predio K0+050 y realizar drenaje en el pozo de aguas lluvias, excavación mecánica en la interacción de las prioridades 17 y 18 7.15m3, excavación parcial de alcantarilla a sumidero del K0+000 al K0+005.
18	8000839	**Calzada:** a nivel de segunda capa de RCD. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Construcción de 4 cajas de inspección parcial del K0+004 al K0+060, demolición de anden 10.84m2 y excavación manual de andén 13.18m3 parcial del K0+004 al K0+06, instalación de geotextil 51.04 m2 nivelación y compactación de fresada subrasante 9.66m3.
33	8001041	**Calzada:** Estabilizado primera capa del K0+004 al K0+017 1.8 m3, estabilizado segunda capa K0+007 al K0+023 9.6m3. **Andén oriental:** Sin actividades. **Andén occidental:** Sin actividades.
31	8001058	**Calzada:** excavación mecánica del K0+050 al K0+000 165m3, nivelación y compactación en vía K0+050 al K0+020 61m2, instalación de geotextil 121m2 y geotextil 121m2 del K0+000 al K0+060, instalación de fresado primera capa 7.52m3 del K0+000 al K0+060, **Andén oriental:** Sin actividad.


Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la semana
		Andén occidental: Sin actividad.
30	8001125	**Calzada:** Instalación de geotextil K0+005 al K0+025 82m2, instalación geo celda K0+005 al K0+025 82m2, instalación de fresado K0+005 al K0+025 82m2 15m3, compactación de material K0+005 al K0+025 82m2, nivelación de fresado K0+050 al K0+060. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.

SEGUIMIENTO GRUPO 1 AL 26-ABRIL-2023

PRIORIDAD	CIV	PROGRAMADO ACUMULADO	% PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO
28	8000929	$ 172 823 429	1.03%	$ 221 502 422	1.32%
29	8000996	$ 161 955 881	0.97%	$ 215 577 349	1.28%
24	8000871	$ 182 273 004	1.09%	$ 236 993 457	1.41%
25	8000923	$ 227 416 084	1.36%	$ 235 133 452	1.40%
13	8000772	$ 137 228 493	0.82%	$ 101 123 155	0.60%
14	8000814	$ 212 807 004	1.27%	$ 109 532 678	0.65%
17	8000794	$ 149 807 780	0.89%	$ 216 992 669	1.29%
18	8000839	$ 218 436 157	1.30%	$ 194 367 569	1.16%
21	8000821	$ 207 667 732	1.24%	$ 182 984 178	1.09%
22	8000864	$ 265 174 200	1.58%	$ 252 023 551	1.50%
3	8000957	$ 190 183 834	1.13%	$ 261 490 931	1.56%
33	8001041	$ 22 606 269	0.13%	$ 15 663 615	0.09%
4	8001069	$ 21 105 300	0.13%	$ 10 954 506	0.07%
16	8000907	$ 54 616 668	0.33%	$ -	0.00%
15	8000856	$ 47 186 432	0.28%	$ -	0.00%
26	8000988	$ 57 157 299	0.34%	$ -	0.00%
6	8000977	$ 57 157 299	0.34%	$ -	0.00%
32	8000979	$ 26 993 713	0.16%	$ 2 790 399	0.02%
30	8001058	$ 28 816 750	0.17%	$ 13 203 151	0.08%
20	8000938	$ 59 601 229	0.36%	$ -	0.00%
31	8001125	$ 11 193 712	0.07%	$ 19 375 071	0.12%
TOTAL		**$ 2 512 208 271**	**14.97%**	**$ 2 289 708 153**	**13.64%**


SEGUIMIENTO DIARIO EN MILLONES DE PESOS					
FECHA	**20-abr**	**21-abr**	**22-abr**	**23-abr**	**24-abr**
PROG ACUM	$ 2 434	$ 2 456	$ 2 463	$ 2 463	$ 2 485
% PROG ACUM	14.50%	14.63%	14.68%	14.68%	14.81%
EJEC ACUMULADO	$ 2 271	$ 2 281	$ 2 249	$ 2 249	$ 2 289
% EJEC ACUMULADO	13.53%	13.59%	13.40%	13.40%	13.64%
DESVIACIÓN	$ 163	$ 175	$ 214	$ 214	$ 196
% DESVIACIÓN	**-0.97%**	**-1.04%**	**-1.28%**	**-1.28%**	**-1.17%**

G1	**24-ABR-23**		
	GENERAL	**OBRA**	**FINANCIERO**
% PROGRAMADO	15.09%	14.81%	15.09%
% EJECUTADO	14.14%	13.64%	10.73%
% DESVIACIÓN	-0.95%	-1.17%	-4.36%

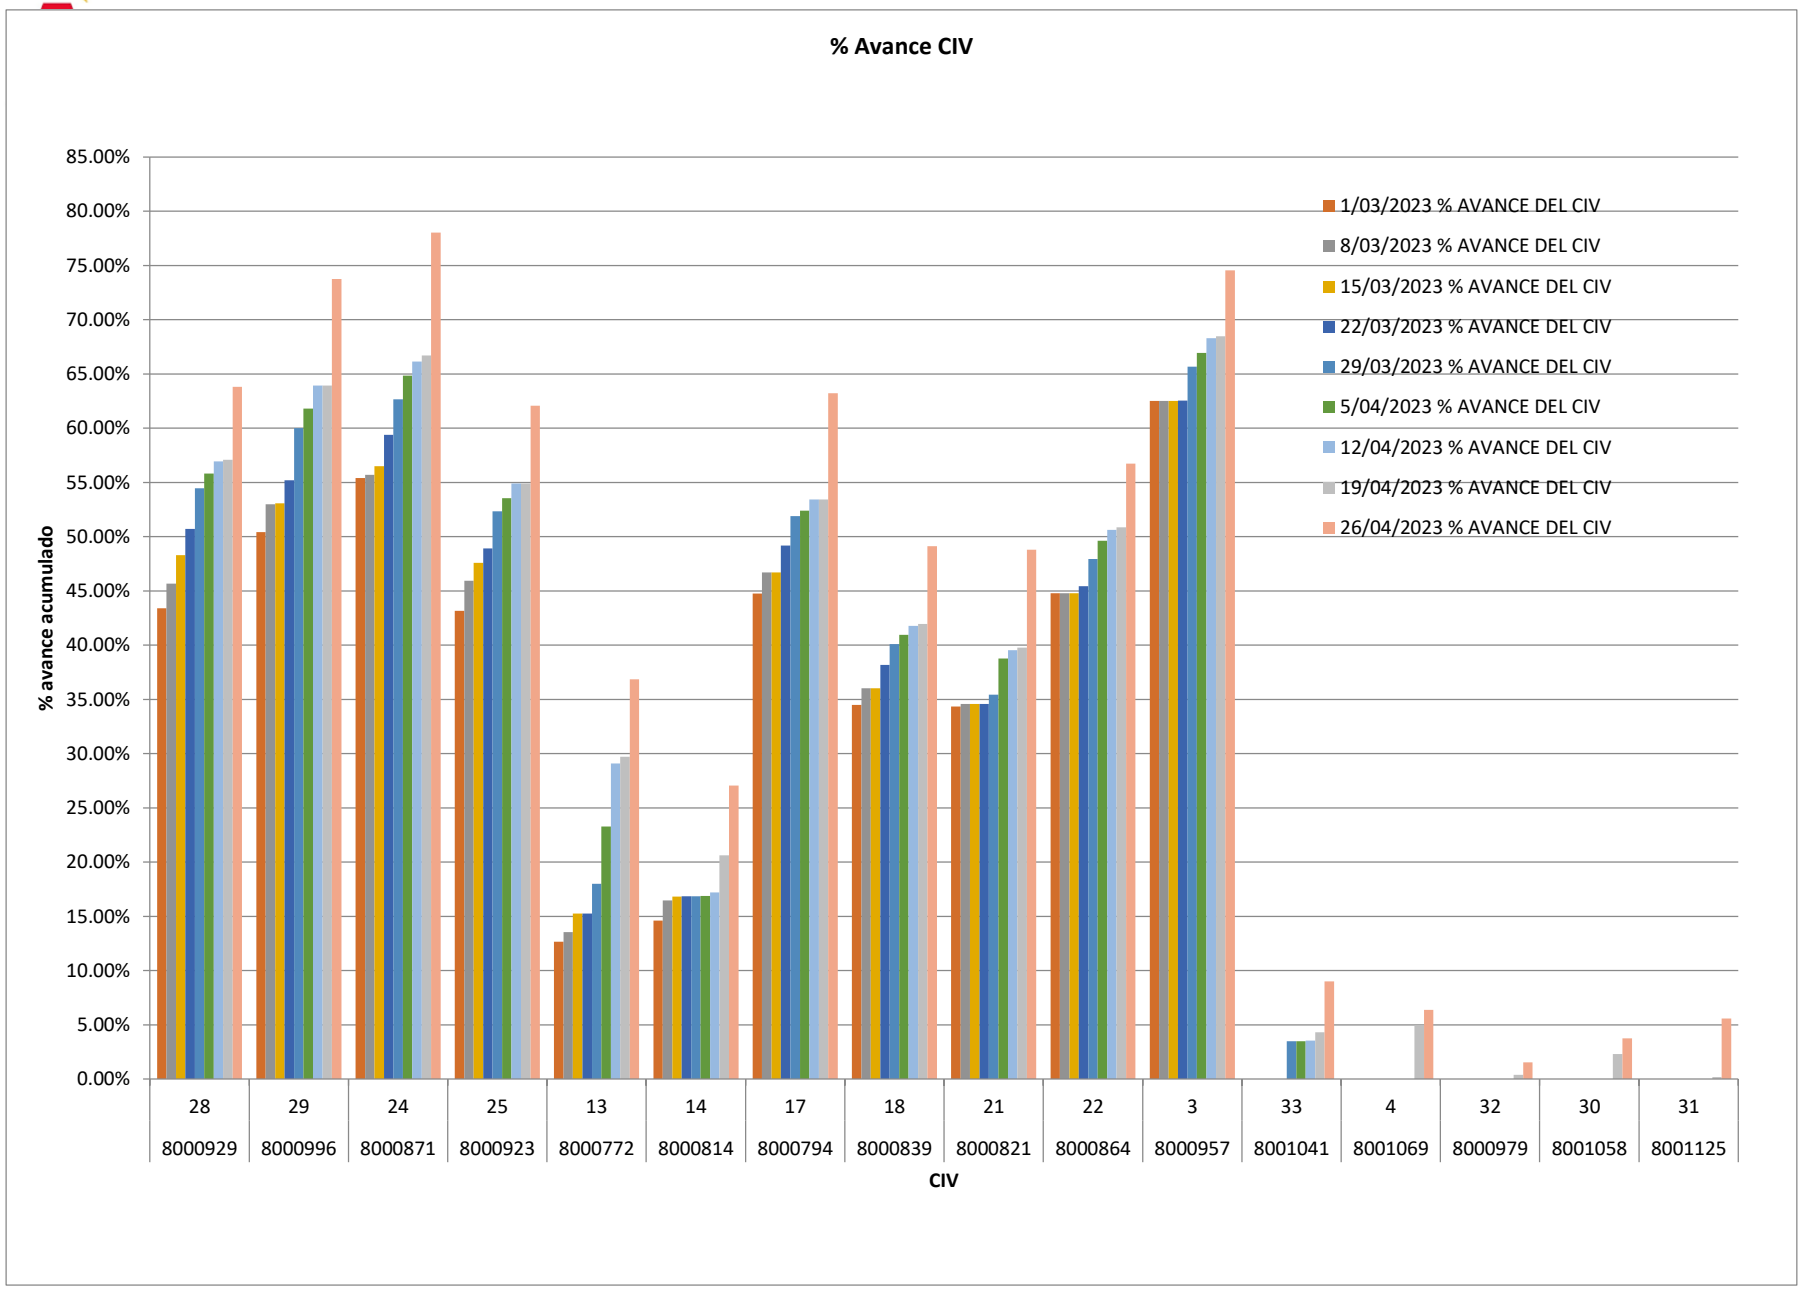
% Avance CIV
% avance acumulado
85.00%
80.00%
75.00%
70.00%
65.00%
60.00%
55.00%
50.00%
45.00%
40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
1/03/2023 % AVANCE DEL CIV
8/03/2023 % AVANCE DEL CIV
15/03/2023 % AVANCE DEL CIV
22/03/2023 % AVANCE DEL CIV
29/03/2023 % AVANCE DEL CIV
5/04/2023 % AVANCE DEL CIV
12/04/2023 % AVANCE DEL CIV
19/04/2023 % AVANCE DEL CIV
26/04/2023 % AVANCE DEL CIV
28 8000929
29 8000996
24 8000871
25 8000923
13 8000772
14 8000814
17 8000794
18 8000839
21 8000821
22 8000864
3 8000957
33 8001041
4 8001069
32 8000979
30 8001058
31 8001125
CIV

FECHA EVALUACIÓN		1/03/2023	8/03/2023	15/03/2023	22/03/2023	29/03/2023	5/04/2023	12/04/2023	19/04/2023	26/04/2023
PRIORIDAD	VALOR TOTAL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV
28	$387 193 662.00	43.39%	45.65%	48.30%	50.71%	54.47%	55.82%	56.93%	57.10%	63.80%
29	$335 480 235.00	50.41%	52.98%	53.07%	55.20%	60.00%	61.79%	63.93%	63.93%	73.76%
24	$341 880 653.00	55.40%	55.68%	56.50%	59.39%	62.65%	64.84%	66.13%	66.70%	78.03%
25	$426 826 969.00	43.15%	45.93%	47.58%	48.91%	52.34%	53.55%	54.89%	54.89%	62.06%
13	$335 386 402.00	12.67%	13.55%	15.25%	15.25%	17.99%	23.27%	29.09%	29.70%	36.86%
14	$470 646 759.00	14.60%	16.46%	16.83%	16.84%	16.86%	16.88%	17.21%	20.62%	27.07%
17	$406 072 929.00	44.74%	46.69%	46.71%	49.18%	51.89%	52.38%	53.43%	53.43%	63.22%
18	$462 540 379.00	34.50%	36.01%	36.01%	38.18%	40.08%	40.95%	41.77%	41.95%	49.13%
21	$429 876 324.00	34.33%	34.56%	34.56%	34.58%	35.44%	38.75%	39.53%	39.76%	48.81%
22	$ 479 608 776.00	44.77%	44.77%	44.77%	45.44%	47.94%	49.62%	50.62%	50.86%	56.73%
3	$ 381 069 937.00	62.51%	62.51%	62.51%	62.54%	65.66%	66.95%	68.29%	68.46%	74.54%
33	$ 176 572 662.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.47%	3.47%	3.54%	4.32%	9.01%
4	$ 174 443 193.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.95%	6.36%
32	$185 023 843.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.39%	1.54%
30	$358 273 590.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.30%	3.75%
31	$353 584 859.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.18%	5.59%

CONSORCIO SCLV
NIT 900.547.145-2
EVALUACIÓN PLAN DE CONTINGENCIA - GRUPO 1 COP-621-22

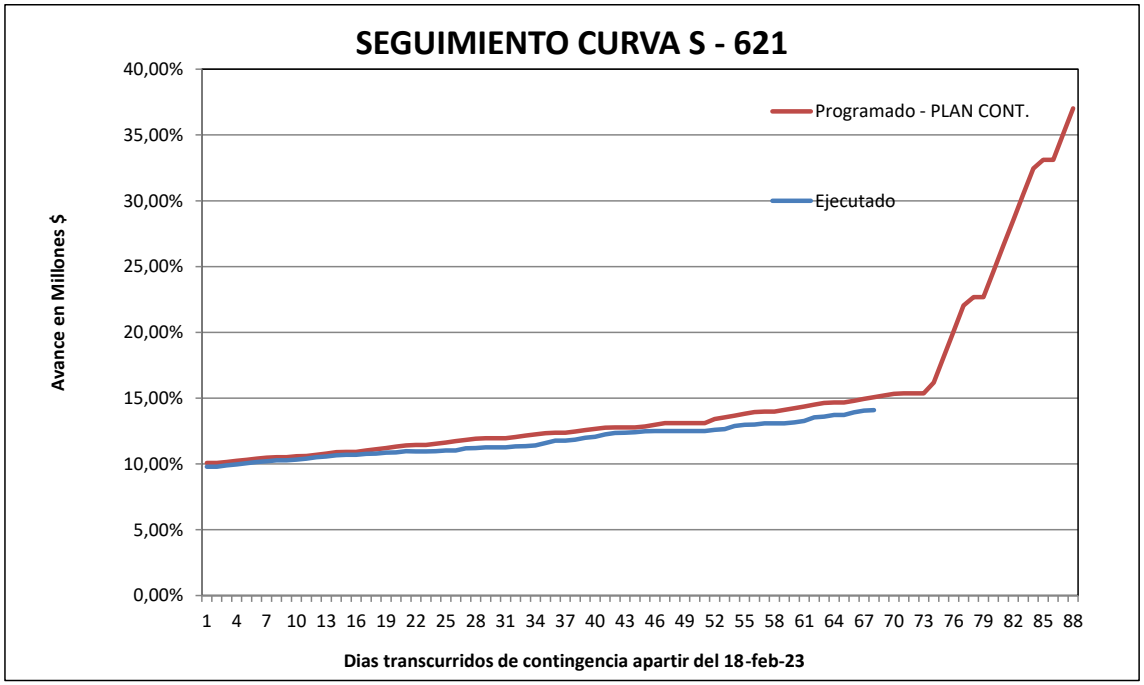

ANEXO 1

FECHAS DE RADICACIÓN INFORMES Y CUENTAS

Responsable	Obligación	Fecha	Cumplio	
			SI	NO
G2	Radicación del INF-MEN-04 Enero a la Interventoría	26-abr-23	x	
G2	Radicación cuenta 04 Enero a la Interventoría	27-abr-23	x	
G1	Radicación del INF-MEN-04 Enero a la Interventoría	28-abr-23		x
INT	Revisión del INF-MEN-04 Enero G1	28-abr-23		
G1	Radicación cuenta 04 Enero a la Interventoría	28-abr-23		x
G2	Radicación cuenta 05 Febrero a la Interventoría	28-abr-23		x
INT	Radicación del INF-MEN-04 Enero al FDLK	2-may-23	x	
INT	Revisión del INF-MEN-04 Enero G2	2-may-23	x	
INT	Aprobación del INF-MEN-04 Enero G1	2-may-23	x	
INT	Aprobación del INF-MEN-04 Enero G2	2-may-23	x	
G2	Radicación del INF-MEN-06 Marzo a la Interventoría	2-may-23		x
INT	Revisión cuenta 04 Enero G1	3-may-23		
INT	Revisión cuenta 04 Enero G2	3-may-23		
INT	Radicación cuenta 04 Enero G1 - FDLK	4-may-23		
INT	Radicación cuenta 04 Enero G2 -FDLK	4-may-23		
G2	Radicación cuenta 06 Marzo a la Interventoría	4-may-23		
G1	Radicación del INF-MEN-05 Febrero a la Interventoría	5-may-23		
G2	Radicación del INF-MEN-05 Febrero a la Interventoría	5-may-23		
INT	Radicación del INF-MEN-05 Febrero al FDLK	5-may-23		
INT	Revisión del INF-MEN-05 Febrero G1	5-may-23		
INT	Revisión del INF-MEN-05 Febrero G2	5-may-23		
INT	Aprobación del INF-MEN-05 Febrero G1	5-may-23		
G1	Radicación cuenta 05 Febrero a la Interventoría	5-may-23		
INT	Revisión del INF-MEN-06 Marzo G2	5-may-23		
INT	Aprobación del INF-MEN-06 Marzo G1	5-may-23		
INT	Aprobación del INF-MEN-05 Febrero G2	8-may-23		
INT	Radicación cuenta 05 Febrero al FDLK	8-may-23		
INT	Revisión cuenta 05 Febrero G2	8-may-23		
INT	Revisión cuenta 06 Marzo G2	8-may-23		
INT	Revisión cuenta 05 Febrero G1	9-may-23		
INT	Radicación cuenta 05 Febrero G2 -FDLK	9-may-23		
INT	Radicación cuenta 06 Marzo G2 -FDLK	9-may-23		
INT	Radicación cuenta 05 Febrero G1 - FDLK	10-may-23		
FDLK	Revisión del INF-MEN-04 Enero			
FDLK	Aprobación del INF-MEN-04 Enero			
INT	Radicación cuenta 04 Enero al FDLK			
FDLK	Revisión cuenta 04 Enero			
FDLK	Aprobación cuenta 04 Enero			
FDLK	Revisión del INF-MEN-05 Febrero			
FDLK	Aprobación del INF-MEN-05 Febrero			
FDLK	Revisión cuenta 05 Febrero			
FDLK	Aprobación cuenta 05 Febrero			
G1	Radicación del INF-MEN-06 Marzo a la Interventoría			
INT	Radicación del INF-MEN-06 Marzo al FDLK			
INT	Revisión del INF-MEN-06 Marzo G1			
FDLK	Revisión del INF-MEN-06 Marzo			
INT	Aprobación del INF-MEN-06 Marzo G2			
FDLK	Aprobación del INF-MEN-06 Marzo			
G1	Radicación cuenta 06 Marzo a la Interventoría			
INT	Radicación cuenta 06 Marzo al FDLK			

INT	Revisión cuenta 06 Marzo G1			
FDLK	Revisión cuenta 06 Marzo			
INT	Radicación cuenta 06 Marzo G1 - FDLK			
FDLK	Aprobación cuenta 06 Marzo			
G1	Radicación del INF-MEN-07 Abril a la Interventoría			
G2	Radicación del INF-MEN-07 Abril a la Interventoría			
INT	Radicación del INF-MEN-07 Abril al FDLK			
INT	Revisión del INF-MEN-07 Abril G1			
INT	Revisión del INF-MEN-07 Abril G2			
FDLK	Revisión del INF-MEN-07 Abril			
INT	Aprobación del INF-MEN-07 Abril G1			
INT	Aprobación del INF-MEN-07 Abril G2			
FDLK	Aprobación del INF-MEN-07 Abril			
G1	Radicación cuenta 07 Abril a la Interventoría			
G2	Radicación cuenta 07 Abril a la Interventoría			
INT	Radicación cuenta 07 Abril al FDLK			
INT	Revisión cuenta 07 Abril G1			
INT	Revisión cuenta 07 Abril G2			
FDLK	Revisión cuenta 07 Abril			
INT	Radicación cuenta 07 Abril G1 - FDLK			
INT	Radicación cuenta 07 Abril G2 -FDLK			
FDLK	Aprobación cuenta 07 Abril			
