BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo De Desarrollo Local de Kennedy

FECHA: 4 de mayo 2023 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** G1

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comite de seguimiento # 30.

HORA DE INICIO: 2:30 pm **HORA DE FINALIZACIÓN:** ____

ASISTENTES:

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Nury Alberacin Daza.			X							Interventoria.	sst1Kennedy@outlook.com.	3123230618	
Maria Camila Pera Rea			X							XIE S.A	xie.umbrita1@gmail.com	3102457234	
Sandra Pino			X							Xie. S.A	xie621.sst@gmail.com	3208736078	
D. Milena Medina			X							XIE S.A	xie621@outlook.com	3102504480	
ROSA LIDA MONCUA			X							XIE SA.	XIEKennedyresidente2@gmail.com.	3223141853	
Sonia Berzandy Gomez			X							Consorcio SCLV	sociolgrupo1.fdlk@gmail.com	3103626480	
EIKIN ESTEBAN MORENO			X						X	XIE SA	XIE ESPPPtproy@gmail.com	3203768856	
Oscar Vargas			X						X	Xie SA	Oscar.vargas@xie.com.co	3102239587	
Manuel Alejandro Mezquita			X						X	XIE SA	xie.directorproyecto.621@gmail.com	3212149477	
Lucas Restrepo Lenis			X							Interventoria	U233Sclv kennedy@outlook.com.	3002133006	
Juan Manuel Ibarra R			X							Interventoria	gerencial@atrabilidad.com	3107671842	

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo De Desarrollo Local de Kennedy

FECHA: 4 de mayo 2023 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** 61

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de seguimiento #30

HORA DE INICIO: 2:30 p.m. **HORA DE FINALIZACIÓN:** ____

ASISTENTES:

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Arturo Zárate M.			X							SCLV	arturozaratem91@yahoo.com	3152268031	
Danilo Meneses Toro			X						X	FDLK - Infraestructura	DaniloMeneses@gobierno bogota.gov.co	3118988034	
Andrés Mauricio Rojas U.			X						X	FDLK - Infraestructura	andres.m.llanos@gobierno bogota.gov.co	3057039773	
Karen Juliette Portales Ramírez.			X							Consorcio SCLV	U233SCLVKennedy@outlook.com	3143853729	
Alba Yolanda Morales			X							Consorcio SCLV	aymo1380@gmail.com	3114410429	
Anyeli Curiel Acosta			X							Consorcio SCLV	U233SCLVKennedy@outlook.com	3227401898	
Ana Leonor Porras R			V							Consorcio SCLV	aleoporras@gmail.com	3212071449	

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se da inicio al comité de seguimiento No. 30 en las instalaciones de la interventoría las 2:30 pm, con la presencia del apoyo a la supervisión FDLK, contratista de obra Grupo 1 XIE S.A e Interventoría Consorcio SCLV.

Orden del Día

1. Compromisos Pendientes

A la fecha la Interventoría manifiesta que no se dio cumplimiento a los siguientes compromisos:

- Ajuste a la programación del plan de contingencia
- Radicación de informes y cuentas – Facturación
- Respuesta a oficio U233-G1-410-23 de sumideros en los cuales va a implementar la rejilla soportada en vigas

2. Componentes

Componente SST

- Informe semanal 30: Aprobado
- Informe Mensual 6: Observado
-Informe Mensual 7: Mesa de trabajo 5 de mayo 2023, primera revisión.
-Calificación: 100%

-Obra: El contratista de obra se acogió a las observaciones presentadas en el recorrido realizado, y las atendió de manera inmediata.

-Personal: Durante la semana hubo un solo ingreso, un maestro de obra, al corte del día miércoles.

- Retirados en el mes de abril: 17 trabajadores que corresponden al 13%
- Retirados en enero, febrero y marzo 2023: 4 trabajadores que ingresaron y en el mismo mes se retiraron.

Componente Ambiental

- Informe semanal 30: Aprobado
- Informe Mensual 6: Aprobado.
-Informe Mensual 7: Mesa de trabajo 5 de mayo 2023, para aprobación.
- Calificación: 100%

Componente Social

- Informe semanal 30: Aprobado
- Informe Mensual 7: Observado, el contratista se encuentra atendiendo observaciones.
- Calificación: 100%

Se informa que se realizara el comité No. 5 FDLK, el día 26 de mayo de 2023 (Ciclo 1,2 y 3)

El contratista, menciona que, se programó simulacro para el comité No. 5 FDLK, para el 19 de mayo de 2023, virtual.

Se tiene programado el taller de seguridad vial con un jardín de la zona, 16 de mayo de 2023 (P14).
Por otra parte, la Interventoría informa que, respecto a los volantes de inicio de espacio público para las prioridades 30,31,33 y 4, no se cuenta con el COI aprobado.

El contratista informa que se va a socializar y está en proceso de solicitud de actualización del COI, y solicito permisos para dar inicio al espacio público ya que se cuenta con el concreto disponible. Se dejó soporte para cambio de fase el registro fotográfico. La Interventoría indica que, si el contratista solicitado de manera formal al correo de la interventoría, la solicitud y actualización del COI se dará aval para que el contratista proceda.

Por otra parte, la interventoría solicita al contratista atender las observaciones de los informes, y ser más prevenido al momento de presentarlos, puesto que las observaciones son reiterativas.

Técnico
-Frentes de obra activos: 8 -16 CIV
-Frentes intermitentes: 2 prioridades
-Informes semanales del mes de mayo: Sin radicar.
-Informe mensual 7 y 8: Sin radicar
-Calificación: 95% (La calificación ha sido afectada por llamados de atención reiterativos al PMT).

La interventoría, informa que, se cuenta con la aprobación del informe No. 4 (enero) y la cuenta, se radicaran el día de hoy al FDLK.

La Interventoría se encuentra en la revisión del informe mensual Técnico No.5 (febrero), y el acta parcial esta conciliada con cantidades, está pendiente el informe de la cuenta.

La Interventoría, indica que, la cuenta del mes de marzo está pendiente por conciliación de concreto de espacio público. Los NPS de espacio público no están aprobados, se está realizado la revisión de los mismo para emitir concepto. El FDLK, solicita que el documento este radicado a la alcaldía con balance y justificación el 5 de mayo antes del mediodía.

La Interventoría solicita a los residentes técnico, presentar un cuadro semáforo, donde se logre evidenciar en qué estado constructivo se encuentra cada una de las prioridades

**Se adjunta agenda que contiene plano y cuadro de actividades por prioridades*

Tránsito y transporte
La Interventoría informa que, en cuestiones de diseños y señalización, el contratista de obra tiene próximo a vencer los diseños de las prioridades 6,20 y 23 (30-jun-23). Se debe revisar cuál de las prioridades está abierto para gestionar una reunión con la SDM.

Se radicaron 13 PMT a la SDM para segunda etapa.
A la fecha se cuenta con 22 PMT aprobados.

Programación: A la fecha el contratista de obra continua con los atrasos en obra, como se evidencia en los avances para la semana No. 30 (27 de abril al 3 de mayo de 2023), presentados a continuación:

G1	3-may-23		
	GENERAL	OBRA	FINANCIERO
% PROGRAMADO	17.27%	16.74%	17.27%
% EJECUTADO	15.27%	14.57%	10.73%
% DESVIACIÓN	-2.00%	-2.17%	-6.54%

La Interventoría indica que a la fecha el contratista no ha realizado el ajuste a la programación.
Se evidencia que, aun el contratista no ha presentado el remplazo de A80 por monoblock.

El contratista manifiesta que, no se ve un avance físico, es porque no se está relacionando el monoblock, hasta que no se supere la cantidad que ya se había aprobado. La Interventoría indica que, la programación se está realizando por costo y no por la metafísica y esta no se está reflejando el avance.

La Interventoría les recuerda a todos, que los contratistas de obra manifestaron en un comité que no se les descontara el monoblock, hasta nueva orden y así quedo acordado por las partes. Es decir que no hay razón por la cual el contratista a la fecha lo descontó sin previo aviso.

La Interventoría solicita al contratista que se realice una validación y ajuste a la programación, programación real por actividad. El lunes 8 de mayo de 2023 se realizará una mesa trabajo entre Interventoría y contratista para la revisión.

La Interventoría indica que, se está realizando otra actividad con los residentes técnicos e inspectores, revisando las cantidades en campo, con el fin de evidenciar que cantidades no se conciliaron. Se solicita al contratista presentar un listado de las longitudes por CIV en las cuales se remplazara A80 por monoblock.

El FDLK indica que reportara el avance entregado por la Interventoría, pero necesita que se ajuste lo antes posible la programación, puesto que se debe presentar un avance real de la obra a la alcaldesa. Indica procederá con las solicitudes de incumplimiento que radique la Interventoría, puesto que se está viendo afectado el contrato física y económicamente. Y se evidencia en obra que el contratista está ejecutando las actividades significativamente, pero lo reportado equivale a lo ejecutado.

Por otra parte, el FDLK solicita a la Interventoría que, en los informes no se duplique la información, puesto que se están revisando anexos repetidos en cada tomo de los informes técnico, gestión social y ambiental (SST se mantiene igual). La Interventoría revisara y ajustara, para no presentar

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	**EVIDENCIA DE REUNIÓN**

No	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	NPs espacio público -Balance de mayores y menores	XIE S.A	5-may-23
2	Atención de observaciones al ajuste a la programación del plan de contingencia	XIE S.A	8-may-23
3	Radicación de informes y cuentas – Facturación	XIE S.A	5-may-23
4	Respuesta a oficio U233-G1-410-23 de sumideros en los cuales va a implementar la rejilla soportada en vigas	XIE S.A	8-may-23
5	Listado de cantidades de monoblock a remplazar por A80	XIE S.A	5-may-23

Elaborada por: Interventoría – Juan Manuel Alba Rojas
Fecha de la próxima reunión: 11 de mayo de 2023 Lugar de la próxima reunión: NA

AGENDA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO

Contratista de Obra XIE S.A – COP -621-22 Grupo 1

COMITÉ DE SEGUIMIENTO No.30

Fecha: 4 de mayo 2023

ORDEN DEL DIA

1.Compromisos	
No	**Asunto**
1	NPs de espacio público – Balance - Informe de justificación
2	Ajuste a la programación del plan de contingencia
3	Radicación de informes y cuentas – Facturación
4	Respuesta a oficio U233-G1-410-23 de sumideros en los cuales va a implementar la rejilla soportada en vigas

Convenciones

Radicado	
En elaboración	
En revisión	
Pendiente	

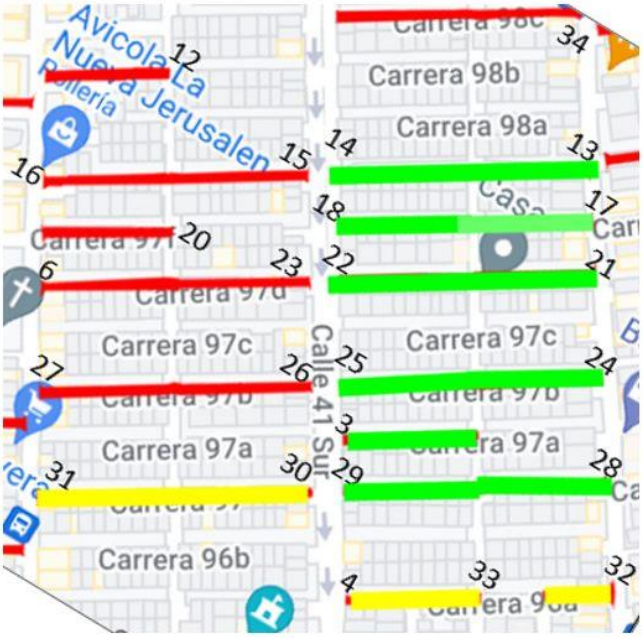
2. Componentes
A. Técnico
- **Informe semanal 30:** Sin Radicar
- **Informe Mensual 6 y 7:** Sin Radicar
- **Calificación:** 86%
Obra
B. SST
- **Informe semanal 30:** Aprobado
- **Informe Mensual 6 y 7:** Sin radicar
- **Calificación:** 100%
C. Ambiental
- **Informe semanal 30 :**Aprobado
- **Informe Mensual 7:** En revisión mesa de trabajo.

- **Calificación:** 100%
D. Gestión Social
- **Informe semanal 30:** Aprobado
- **Informe Mensual 7:** Observado
- **Calificación:** 100%
Obra

Frentes de obra en la semana del 26-abr-23 al 2-may-2

Frentes de obra: 8

CIV: 16



Nomenclatura
Frente de obra Activo
Frente de obra Intermitente
Frente de obra Inactivo
Frente de obra sin inicio

Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la Semana
4	8001069	**Calzada**: a nivel de segunda capa de RCD del K0+000 al K0+022 13.2 m3.
		Andén oriental: Sin actividades.
		Andén occidental: Sin actividades.
32	8000979	**Calzada:** a nivel de segunda capa de RCD del K0 + 010 al k0+030 12 m3.
		Andén oriental: Sin actividades.

Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la Semana
		Andén occidental: Sin actividades.
28	8000929	**Calzada:** Excavación ,nivelación y compactación para instalación de sumideros, del K0 + 000 al K0+010.
		Andén oriental: Instalación de geotextil del K0+ 000 al K0+061 103 m2, instalación de fresado del K0+ 000 al K0+061 41m2 , nivelacion y compactacion de fresado, construcción de cajas de inspección 3 und del K0+ 000 al K0+040.
		Andén occidental: Sin actividades.
29	8000996	**Calzada:** a nivel de segunda capa de RCD.
		Andén oriental: Instalación de bordillo A-80 provisional como formaleta del K0+025 al K0+040 15 ML, nivelacion y compactacion de fresado del K0+005 al K0+050, instalación de concreto de 3000psi 34.3m3.
		Andén occidental: nivelación y compactación de fresado del K0+005 al K0+056, instalación parcial de cajillas 4 und del K0 + 000 al K0+060.
24	8000871	**Calzada:** Instalación de bordillo A-80 en la intersección de la prioridad 24 y 25 8.30ML.
		Andén oriental: instalación de concreto MR41 4000 psi para rampas parcial del K0+000 al K0+030 1.3m3, instalación de marcos y acabados en cajas de inspección del K0+000 al K0+060,
		Andén occidental: instalación de concreto MR41 4000 psi para rampas parcial del K0+000 al K0+036 2.4m3, instalación de marcos y acabados en cajas de inspección del K0+000 al K0+060.
25	8000923	**Calzada:** Instalación de bordillo A-80 en la intersección de la prioridad 25 y 24 6.40ML, nivelación para instalación de sumideros.
		Andén oriental: Instalación de concreto parcial MR41 4000psi del K0+045 al K0+060 0.43m3, nivelacion y compactacion en anden del K0+050 al K0+ 056, acabados y limpieza para cajas de inspección del K0+000 al K0 + 060.
		Andén occidental:acabados y limpieza para cajas de inspección del K0+000 al K0 + 060.
21	8000821	**Calzada:** Instalación, nivelación y compactación de fresado del K0+002 al K0+013 5.13, instalación de geotextil del K0+003 al K0+014 28m2.

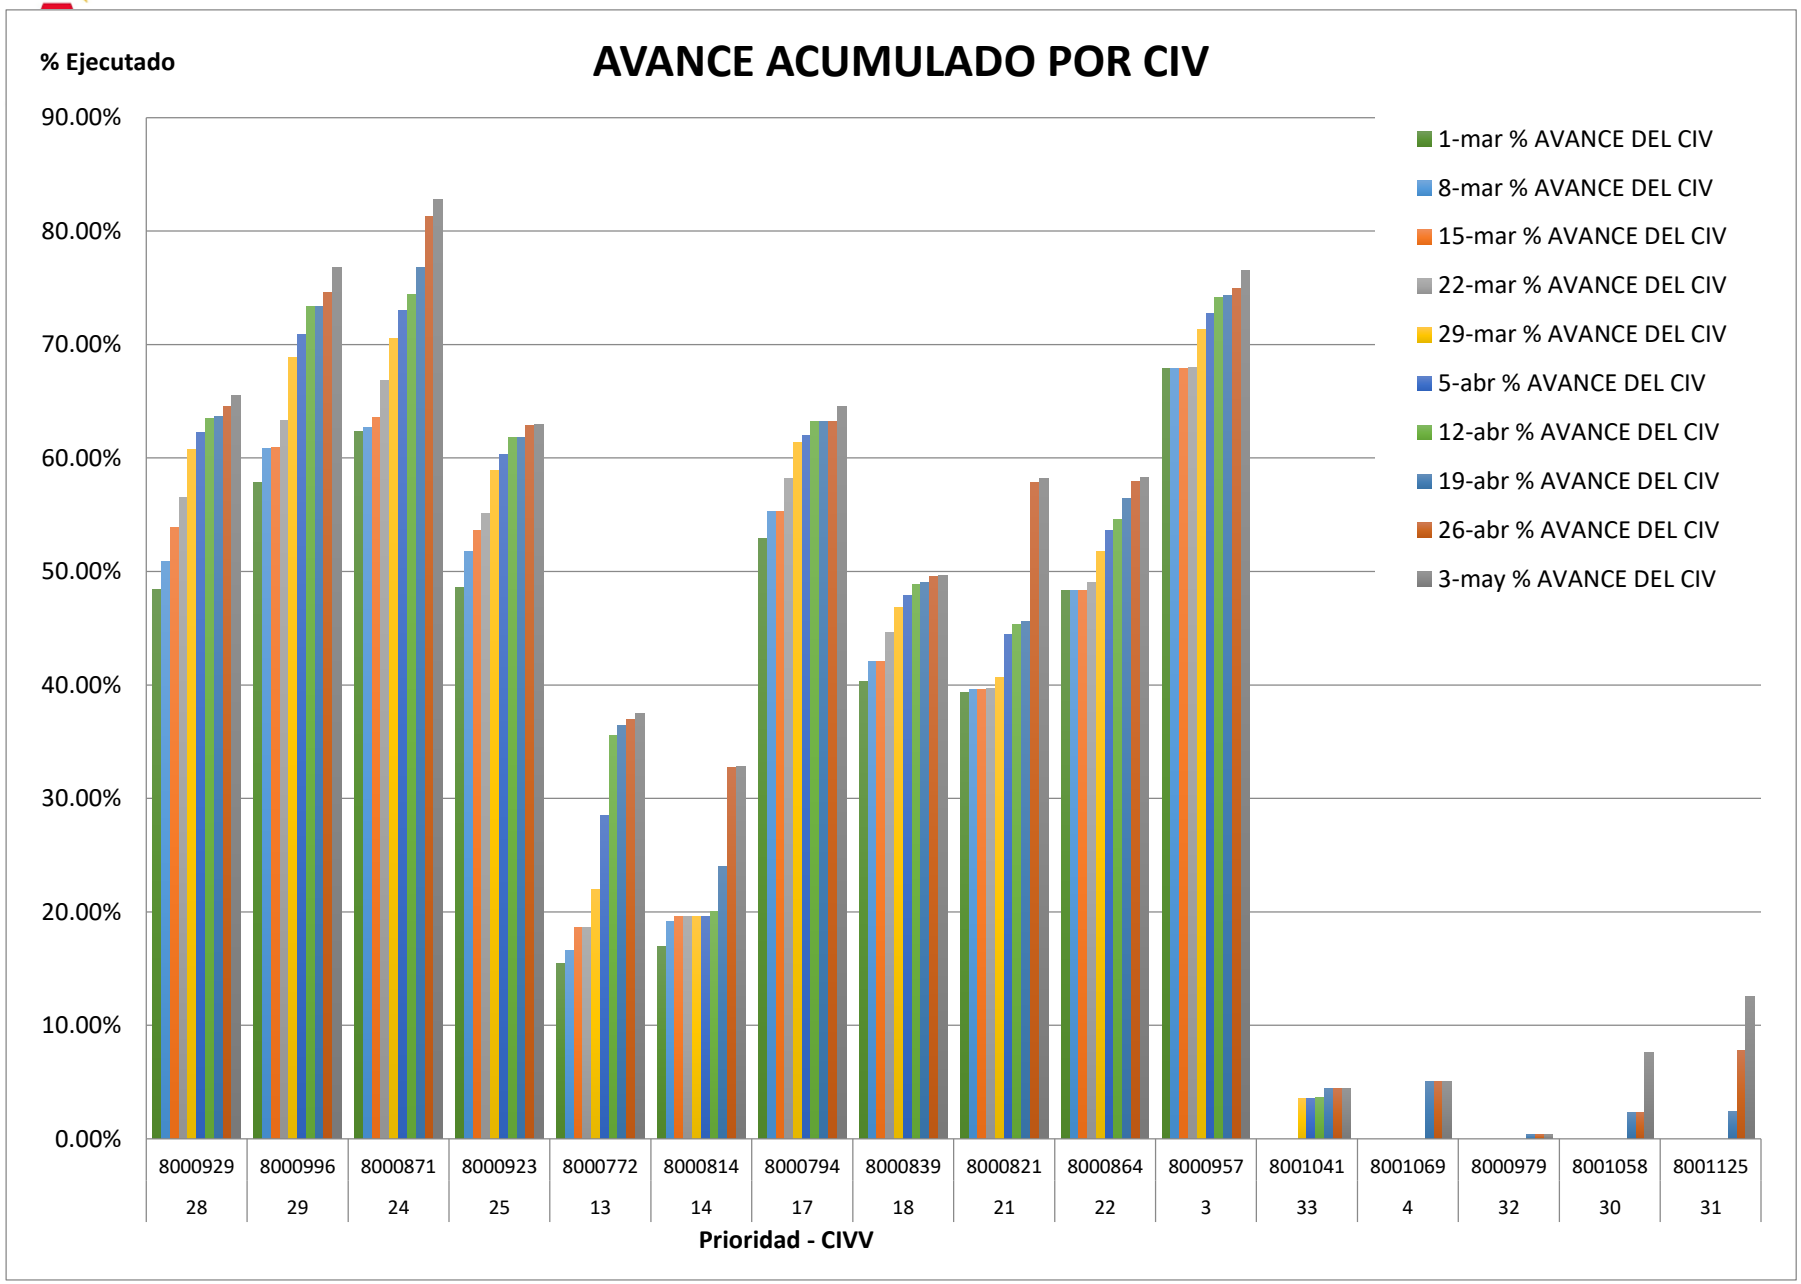
Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la Semana
		Andén oriental: Instalación, nivelación y compactación de fresado del K0+002 al K0+013 9.17m3, instalación de monoblock del K0+040 al K0+047 7ML, instalación parcial de bordillo A-80 del K0+003 al K0+060 13ML,instalación parcial de concreto MR41 4000psi del K0+003 al K0+060 1.15m3,excavación manual parcial del K0+003 al K0+060 1.29m3.
		Andén occidental: Instalación, nivelación y compactación de fresado del K0+002 al K0+013 4.64m3, instalación de monoblock del K0+003 al K0+014 11ML,instalación parcial de bordillo A-80 del K0+003 al K0+060 12ML,excavación manual parcial del K0+003 al K0+060 1.29m3.
22	8000864	**Calzada:** Instalación de bordillo A-80 en la intersección de la prioridad 22 y 21 4.8ML.
		Andén oriental: Instalación de concreto MR41 4000 psi para rampas 1.44m3,acabados en fachadas parte inferior del K0+003 al K0+060,
		Andén occidental: acabados en fachadas parte inferior del K0+003 al K0+060,
3	8000957	**Calzada:** a nivel de segunda capa de RCD.
		Andén oriental: Instalación de concreto MR41 4000 psi 14m3 parcial del K0+000 al K0+060,instalación de cajilla 1 und parcial del K0+000 al K0+060,nivelacion y compactacion el K0+048 al K0+060
		Andén occidental: : Instalación de concreto MR41 4000 psi 1.7m3 parcial del K0+000 al K0+060, instalación de concreto 3000 psi 17.89m3 parcial del K0+000 al K0+060 , instalación de cajillas 2 und parcial del K0+000 al K0+060, instalación de bordillo parcial del K0+000 al K0+060 6.8ML.
13	8000772	**Calzada:** a nivel de segunda capa de RCD.
		Andén occidental: Perfilación de andén parcial del K0+000 al K0+060
		Andén oriental: Demolición de placa anden 14m2, excavación manual y perfilación de andén parcial del K0+000 al K0+060 5.3m3, demolición de cajas de inspección parcial del K0+000 al K0+060 2 undy construcción de las mismas, instalación de fresado primera capa parcial del K0+000 al K0+060 2.35m3,retiro y limpieza de material de excavación.
14	8000814	**Calzada:**a nivel de segunda capa de RCD.
		Andén oriental: Sin actividad.

Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la Semana
		Andén occidental: Instalación de bordillo A-80 19.1ML,instalación,nivelación y compactación parcial de fresado segunda capa del K0+001 al K0+036,adecuación de tubería potable y sanitaria.
17	8000794	**Calzada:**Excavación para instalación de sumidero 2und instalación de concreto para base del sumidero 0.091m3, retiro y limpieza de material de excavación, instalación de polisombra para cerramiento K0+000 al K0+010 10ML, instalación geotextil del K0+040 al K0+050 40m2,instalación geocelda K0+040 al K0+050 40m2,instalación fresado K0+040 al K0+050 7.2m3.
		Andén oriental: Sin actividad.
		Andén occidental: Sin actividad.
18	8000839	**Calzada:** Excavación manual de sumidero a alcantarillado 5.7m3.
		Andén oriental: Demolición de cajas de inspección 3 und 0.81m3
		y construcción de las mismas 3 und , demolición parcial de anden del K0+000 al K0+060 5.30m2,excavación de andén 5.8m3.
		Andén occidental: excavación de andén 1.2m3, excavación de calzada para instalación de monoblock 3.33m3
33	8001041	**Calzada:** Se inicia excavación manual para instalación de tubería de aguas negras.
		Andén oriental: Sin actividades.
		Andén occidental: Sin actividades.
31	8001058	**Calzada:** Instalación de fresado para base estabilizada K0+005 al K0+050 36.7m3.
		Andén oriental: Sin actividad.
		Andén occidental: Sin actividad.
30	8001125	**Calzada:**Instalación de fresado para base estabilizada K0+010 al K0+062.75 43 m3.
		Andén oriental: Sin actividad.
		Andén occidental: Sin actividad.

SEGUIMIENTO GRUPO 1 AL 3-MAYO-2023										
P	INI	FIN	CIV	VALOR CIV	PROG-ACUM	% PROG-ACUM	EJEC-ACUM	% EJEC-ACUM	% PESO EJEC	% ATRASO
28	5-dic	30-jun	8000929	$ 347 200 311	$ 176 348 576	1.05%	$ 227 521 593	1.36%	65.53%	0.30%
29	5-dic	31-may	8000996	$ 292 279 155	$ 166 329 948	0.99%	$ 224 519 143	1.34%	76.82%	0.35%
24	5-dic	31-may	8000871	$ 303 712 088	$ 186 181 059	1.11%	$ 251 400 884	1.50%	82.78%	0.39%
25	5-dic	31-may	8000923	$ 378 908 264	$ 232 291 999	1.38%	$ 238 630 315	1.42%	62.98%	0.04%
13	5-dic	31-may	8000772	$ 274 339 089	$ 141 989 472	0.85%	$ 102 794 256	0.61%	37.47%	-0.23%
14	5-dic	31-may	8000814	$ 404 676 565	$ 219 238 278	1.31%	$ 132 866 161	0.79%	32.83%	-0.51%
17	5-dic	30-jun	8000794	$ 343 212 808	$ 154 086 754	0.92%	$ 221 418 647	1.32%	64.51%	0.40%
18	5-dic	31-may	8000839	$ 395 629 378	$ 224 311 508	1.34%	$ 196 620 697	1.17%	49.70%	-0.17%
21	5-dic	31-may	8000821	$ 374 906 711	$ 208 462 394	1.24%	$ 218 370 681	1.30%	58.25%	0.06%
22	5-dic	31-may	8000864	$ 444 284 148	$ 270 977 679	1.61%	$ 259 151 328	1.54%	58.33%	-0.07%
3	5-dic	31-may	8000957	$ 350 804 854	$ 195 600 746	1.17%	$ 268 373 657	1.60%	76.50%	0.43%
33	5-dic	30-jun	8001041	$ 173 766 372	$ 27 281 521	0.16%	$ 7 629 824	0.05%	4.39%	-0.12%
4	5-dic	1-jul	8001069	$ 172 153 562	$ 21 554 474	0.13%	$ 8 629 824	0.05%	5.01%	-0.08%
16	3-abr	31-ago	8000907	$ 356 743 482	$ 64 407 570	0.38%	$ 0	0.00%	0.00%	-0.38%
15	3-abr	31-ago	8000856	$ 308 449 741	$ 74 549 536	0.44%	$ 0	0.00%	0.00%	-0.44%
26	3-abr	31-ago	8000988	$ 303 045 416	$ 64 107 479	0.38%	$ 0	0.00%	0.00%	-0.38%
6	5-dic	31-may	8000977	$ 440 627 039	$ 78 017 393	0.46%	$ 0	0.00%	0.00%	-0.46%
32	5-dic	30-jun	8000979	$ 181 397 134	$ 31 163 165	0.19%	$ 724 080	0.00%	0.40%	-0.18%
30	2-may	29-sep	8001058	$ 352 063 180	$ 28 816 750	0.17%	$ 26 742 067	0.16%	7.60%	-0.01%
20	3-abr	31-ago	8000938	$ 389 376 441	$ 81 353 256	0.48%	$ 0	0.00%	0.00%	-0.48%
31	2-may	29-sep	8001125	$ 346 894 732	$ 7 607 639	0.05%	$ 43 555 844	0.26%	12.56%	0.21%
8	2-may	29-sep	8002417	$ 520 851 148	$ 11 206 497	0.07%	$ 16 429 006	0.10%	3.15%	0.03%
9	2-may	29-sep	8002500	$ 347 361 803	$ 7 473 746	0.04%	$ 0	0.00%	0.00%	-0.04%
27	2-may	29-sep	8001052	$ 446 170 102	$ 9 599 679	0.06%	$ 0	0.00%	0.00%	-0.06%
12	2-may	29-sep	8000849	$ 350 989 548	$ 7 551 799	0.05%	$ 0	0.00%	0.00%	-0.05%
23	3-abr	31-ago	8000916	$ 367 411 857	$ 75 790 818	0.45%	$ 0	0.00%	0.00%	-0.45%
5	2-may	29-sep	8000655	$ 470 405 871	$ 10 121 130	0.06%	$ 0	0.00%	0.00%	-0.06%
1	2-may	29-sep	8000687	$ 457 563 625	$ 9 844 819	0.06%	$ 0	0.00%	0.00%	-0.06%
7	2-may	29-sep	8000736	$ 484 559 005	$ 10 425 645	0.06%	$ 0	0.00%	0.00%	-0.06%

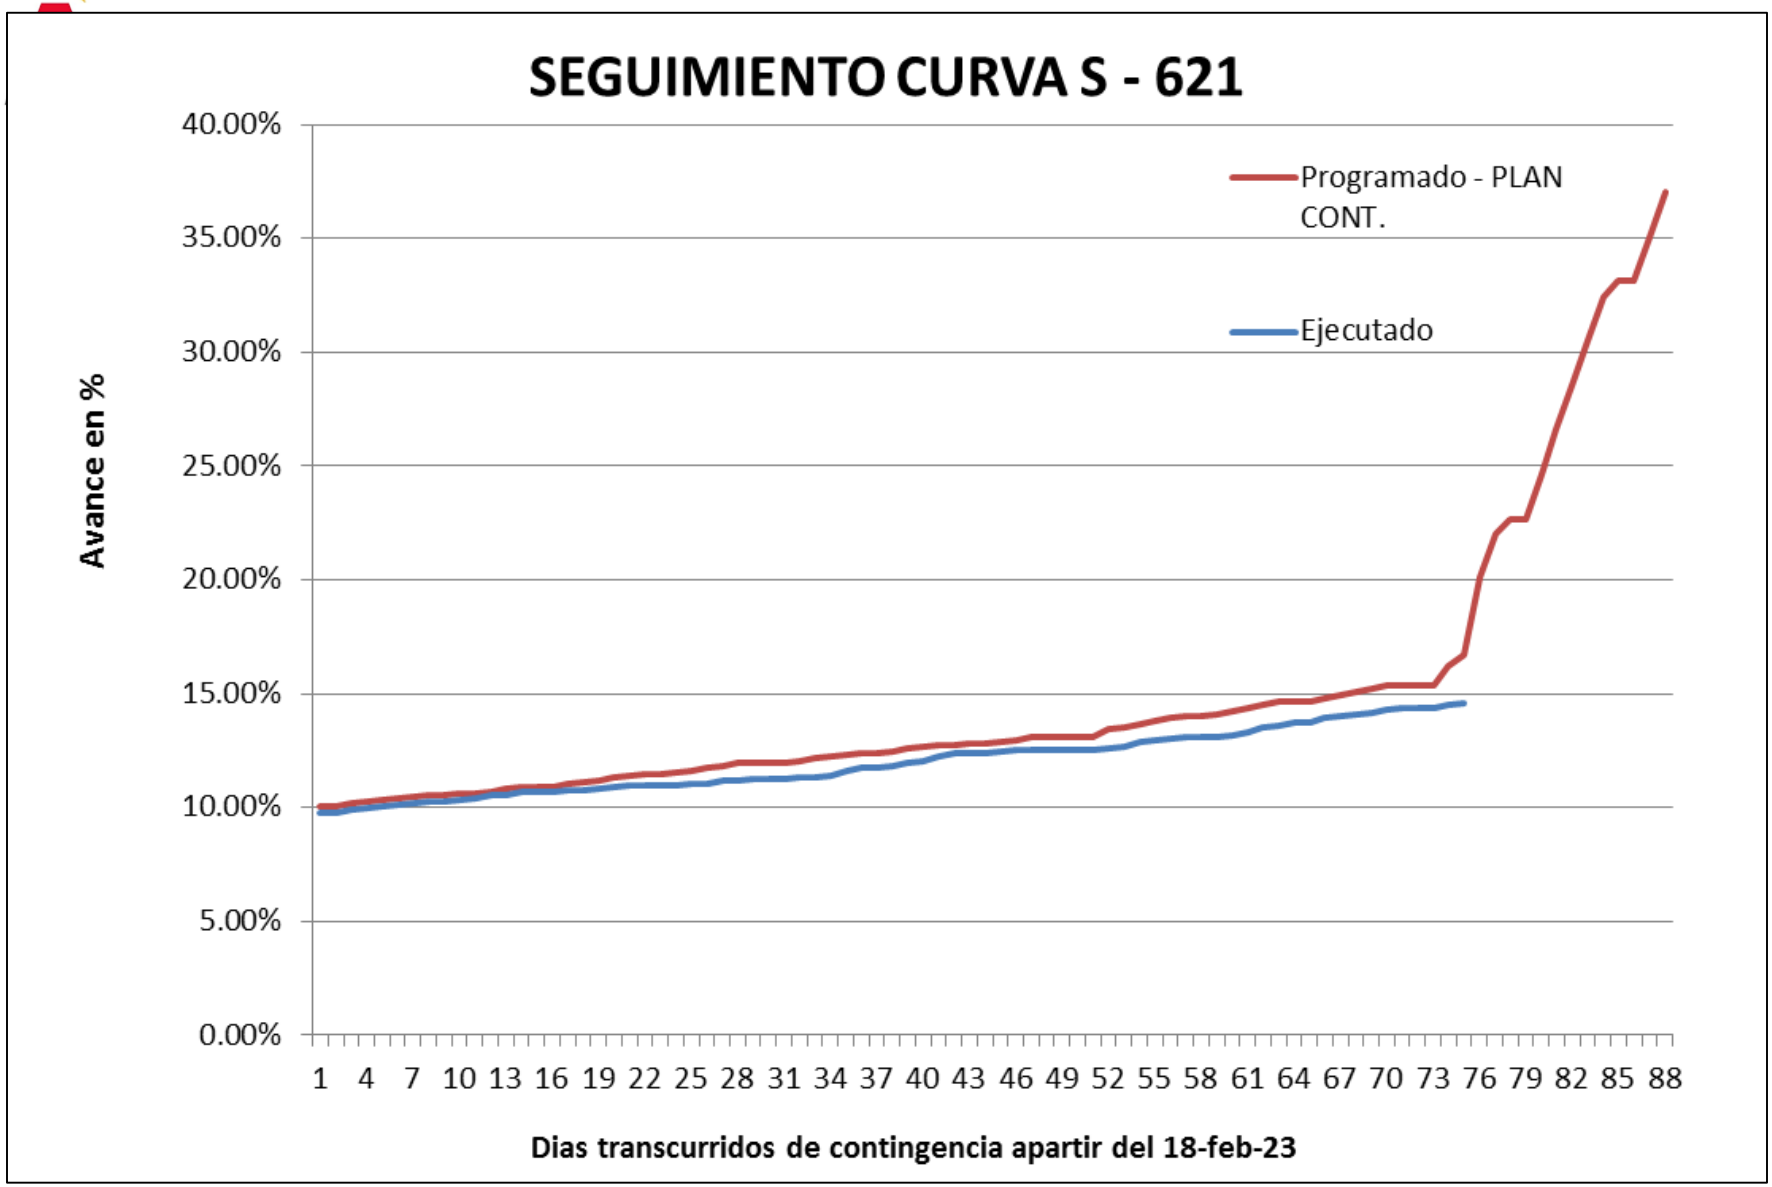
40	2-may	5-oct	8011953	$ 708 106 011	$ 6 562 059	0.04%	$ 0	0.00%	0.00%	-0.04%
2	2-may	5-oct	8001195	$ 360 865 577	$ 3 344 162	0.02%	$ 0	0.00%	0.00%	-0.02%
39	2-may	5-oct	8000584	$ 454 498 306	$ 2 451 072	0.01%	$ 0	0.00%	0.00%	-0.01%
Totales					**$ 2 809 048 622**	**16.74%**	**$ 2 445 378 007**	**14.57%**		-2.17%
					$ 16 781 065 424					

AVANCE ACUMULADO SEMANAL							
FECHA EVALUACIÓN			5-abr	12-abr	19-abr	26-abr	3-may
P	CIV	VALOR TOTAL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV
28	8000929	$ 347 200 311.00	62.24%	63.49%	63.68%	64.58%	65.53%
29	8000996	$ 292 279 155.00	70.93%	73.38%	73.38%	74.56%	76.82%
24	8000871	$ 303 712 088.00	72.98%	74.44%	76.76%	81.24%	82.78%
25	8000923	$ 378 908 264.00	60.32%	61.83%	61.83%	62.86%	62.98%
13	8000772	$ 274 339 089.00	28.45%	35.56%	36.46%	37.01%	37.47%
14	8000814	$ 404 676 565.00	19.63%	20.02%	23.98%	32.70%	32.83%
17	8000794	$ 343 212 808.00	61.98%	63.21%	63.21%	63.25%	64.51%
18	8000839	$ 395 629 378.00	47.87%	48.83%	49.05%	49.57%	49.70%
21	8000821	$ 374 906 711.00	44.43%	45.32%	45.59%	57.80%	58.25%
22	8000864	$ 444 284 148.00	53.57%	54.64%	56.44%	57.97%	58.33%
3	8000957	$ 350 804 854.00	72.73%	74.18%	74.38%	74.94%	76.50%
33	8001041	$ 173 766 372.00	3.53%	3.60%	4.39%	4.39%	4.39%
4	8001069	$ 172 153 562.00	0.00%	0.00%	5.01%	5.01%	5.01%
32	8000979	$ 181 397 134.00	0.00%	0.00%	0.40%	0.40%	0.40%
30	8001058	$ 352 063 180.00	0.00%	0.00%	2.34%	2.34%	7.60%
31	8001125	$ 346 894 732.00	0.00%	0.00%	2.42%	7.82%	12.56%


AVANCE ACUMULADO POR CIV
% Ejecutado
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
1-mar % AVANCE DEL CIV
8-mar % AVANCE DEL CIV
15-mar % AVANCE DEL CIV
22-mar % AVANCE DEL CIV
29-mar % AVANCE DEL CIV
5-abr % AVANCE DEL CIV
12-abr % AVANCE DEL CIV
19-abr % AVANCE DEL CIV
26-abr % AVANCE DEL CIV
3-may % AVANCE DEL CIV
8000929 28
8000996 29
8000871 24
8000923 25
8000772 13
8000814 14
8000794 17
8000839 18
8000821 21
8000864 22
8000957 3
8001041 33
8001069 4
8000979 32
8001058 30
8001125 31
Prioridad - CIVV

FECHA EVALUACIÓN			3-may
P	CIV	VALOR TOTAL CIV	% AVANCE SEMANAL
28	8000929	$ 347 200 311.00	0.95%
29	8000996	$ 292 279 155.00	2.25%
24	8000871	$ 303 712 088.00	1.54%
25	8000923	$ 378 908 264.00	0.12%
13	8000772	$ 274 339 089.00	0.46%
14	8000814	$ 404 676 565.00	0.13%
17	8000794	$ 343 212 808.00	1.26%
18	8000839	$ 395 629 378.00	0.13%
21	8000821	$ 374 906 711.00	0.44%
22	8000864	$ 444 284 148.00	0.36%
3	8000957	$ 350 804 854.00	1.56%
33	8001041	$ 173 766 372.00	0.00%
4	8001069	$ 172 153 562.00	0.00%
32	8000979	$ 181 397 134.00	0.00%
30	8001058	$ 352 063 180.00	5.26%
31	8001125	$ 346 894 732.00	4.74%

G1	3-may-23		
	GENERAL	OBRA	FINANCIERO
% PROGRAMADO	17.27%	16.74%	17.27%
% EJECUTADO	15.27%	14.57%	10.73%
% DESVIACIÓN	-2.00%	-2.17%	-6.54%


SEGUIMIENTO CURVA S - 621
40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
Avance en %
Programado - PLAN CONT.
Ejecutado
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88
Dias transcurridos de contingencia apartir del 18-feb-23
