BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo De Desarrollo Local de Kennedy

FECHA: 11 de mayo de 2023 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** (61)

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comite de Seguimento #31 - FDLK.

HORA DE INICIO: 2:30 pm. **HORA DE FINALIZACIÓN:** ____

ASISTENTES:

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Sonia C Fernandez Gomez			X						X	Consorcio SCLV	Scalqrpol.fdlk@gmail.com	3103626480	
Sandra Pinto			X						X	XIE.SA	[illegible]@gmail.com	3203393095	
Maria Camila Pira Pen			X						X	XIE.S.A	XIE.ambiental@gmail.com	3124547134	
Lucas Restrepo Lago			X						X	Interventoria	U233SCIVkennedy@outlook.com	3002133006	
Andrés Mauricio Rojas U.			X						X	FDLK-Infraestructura	andres.m.llanos@gobiernobogota.gov.co	3057039773	
Danilo Meneses Tolo			X						X	FDLK-Infraestructura	Danilo.Meneses@gobiernobogota.gov.co	3118788004	
Juan M. Alba R			X						X	Interventoria	gerencia@heridad.com	3024[illegible]	
Manuel Mezabal G.			X						X	XIE SA	[illegible]	3197149476	
Oscar Vanegas			X						X	XIE SA	Oscar Vanegas	3102239582	
Nuy Alvarado Daza			X							Interventoria	sst1Kennedy@outlook.com	3123230618	
Alba Yolanda Morales Arias			X							Interventoria	aymra1380@gmail.com	3114440424	

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Powered by CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo De Desarrollo Local de Kennedy

FECHA: 11 de mayo de 2023 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** ____ (61)

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de Seguimiento #31 - FDLK.

HORA DE INICIO: 2:30 pm **HORA DE FINALIZACIÓN:** ____

ASISTENTES:

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Ana Leonor Porras P.									✓	Interventoria	aleporras@gmail.com	3212071449	
A. MILENA MEDINA G			X						✓	CONTRATISTA.	XIESOCIAL@OUTLOOK.COM	3102504470	
ROSA LIDA MONGUA			X						✓	CONTRATISTA	XIE.Kennedyresidente2@gmail.com	3123141853	
ARTURO BARATE			X							SCLV	arturo2barate@yahoo.com	3152368031	
Karen Juleth Perales Ramirez.			X							Interventoria - SCLV	u233sclvkennedy@outlook.com	3143253729	
Angeli Curiel Acosta			X							Interventoria- SCLV	0233SCLVkennedy@outlook.com	3227401898	

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se da inicio al comité de seguimiento No. 31 en las instalaciones de la interventoría las 2:30 pm, con la presencia del apoyo a la supervisión FDLK, contratista de obra Grupo 1 XIE S.A e Interventoría Consorcio SCLV.

Orden del Día

1. Compromisos Pendientes

A la fecha la Interventoría manifiesta que no se dio cumplimiento a los siguientes compromisos:

- Balance Mayores y menores – NPS Esp. Público
- Atención de observaciones al ajuste a la programación del plan de contingencia
- Radicación de informes y cuentas – Facturación
- Respuesta a oficio U233-G1-410-23 de sumideros en los cuales va a implementar la rejilla soportada en vigas
- Listado de cantidades de monoblock a remplazar por A80

2. Componentes

Componente SST

- Informe semanal 31: Aprobado
- Informe Mensual 6: Aprobado
- Informe Mensual 7: Observado por los anexos 2, 3 y 4
-Calificación: 100%

-Obra: El contratista de obra se acogió a las observaciones presentadas en el recorrido realizado, y las atendió de manera inmediata.

-Personal: Durante la semana hubo ingresos de ayudantes de mano de obra no calificada
En términos generales se evidencia ausentismo en obra del personal, los trabajadores manifiestan que no se le ha pagado.

La interventoría indica que se realizó la revisión de la cuenta del mes de febrero componente SST, la cual no presento observaciones.

Durante la semana se presentó un altercado con un trabajador con una de las personas de la comunidad, fue golpeado, por la parte SST del contratista se realizó el reporte a la interventoría como accidente de trabajo. al trabajador le dieron 12 días de incapacidad, y la Interventoría está realizando el seguimiento a la respectiva documentación de la investigación.

Componente Ambiental

- Informe semanal 31: Aprobado

-Informe Mensual 7: En atención de las observaciones realizadas por la interventoría en la mesa de trabajo 5 de mayo 2023.
- Calificación: 100%

La Interventoría solicita al contratista atender las observaciones en el menor tiempo posible, puesto que de estos depende la presentación de las cuentas, además de tomar el último tomo del informe aprobado, puesto que son reiterativas las observaciones de forma

Componente Social
- Informe semanal 31: Aprobado
- Informe Mensual 7: Aprobado
- Calificación: 100%

La Interventoría informa que se han venido realizando actividades preliminares para la apertura de nuevos frentes de obra, pero se tiene como consecuencia que entregan volantes de inicio de obra y apertura de frentes a la comunidad con fechas erróneas. Un caso es que, el 8 de mayo se daba inicio las prioridades 30 y 31 y no se cumplió.

Se informa que se realizara el comité No. 5 FDLK, el día 26 de mayo de 2023 (Ciclo 1,2 y 3). Para el nuevo ciclo en el último comité, un grupo de la comunidad solicito toda la documentación contractual para revisión. Se programó simulacro para el comité No. 5 FDLK, para el 19 de mayo de 2023, virtual, al cual se solicita acompañamiento técnico.

El componente de gestión social de Interventoría indica que, si no se aclara el panorama físico y económico del contrato es mejor cancelar la reunión.

El FDLK indica que en el recorrido realizo el día de hoy, la comunidad solicitó que unos predios se dejaran más alto el espacio público para que no queden enterrados, se está revisando si hay vialidad, pero debe quedar en actas de compromiso con la comunidad que deben responsabilizarse de arreglar su casa al interior. La Interventoría solicita que en comité con la comunidad se informe como son los diseños de cada una de las prioridades y puedan tener as conocimiento de los procesos constructivos.

La Interventoría indica que se presenta mucha inseguridad en la zona, la comunidad no respeta la señalización, hurto de señales y atracos al personal. El contratista debe llevar un registro fotográfico de los casos, para no confrontar a los habitantes de la zona.

Técnico
-Frentes de obra activos: 8 -16 CIV
-Frentes intermitentes: prioridades 30 y31
-Informe semanal 31: Sin radicar
-Informe mensual 6 y 7: Sin radicar
-Calificación: 98% (La calificación ha sido afectada por llamados de atención reiterativos al PMT en senderos peatonales).

**Se adjunta agenda que contiene plano y cuadro de actividades por prioridades*

Tránsito y transporte

La Interventoría informa que, la importancia del PMT es que en primer lugar informa a todos los usuarios de la vida por donde circular ya sea en la vía o en el espacio público, y en segundo lugar tener claridad y los permisos vigentes en caso de presentarse alguna eventualidad, y tener soportes de que se informó a la comunidad.
Es decir que para as ocasiones en la cuales se roben la señales, la Interventoría solicita al contratista realizar la denuncia, un informe con registro fotográfico donde se evidencie reposición de la señal hurtada. Este informe debe quedar consignado en el informe semanal y mensual, para llevar consignada la trazabilidad.

La Interventoría manifiesta que de los PMT observados por la SDM, fue radicado, radicado sin firma y no se copió y se generaron nuevamente observaciones. El día 10 de mayo se remitió al contratista COI firmado, pero se dejará la anotación en los informes semanales y mensuales.

Programación

A la fecha el contratista de obra continua con los atrasos en obra, como se evidencia en los avances para la semana No. 31 (4 al 10 de mayo de 2023), presentados a continuación:

G1	9-may-23		
	GENERAL	OBRA	FINANCIERO
% PROGRAMADO	26.09%	27.03%	26.09%
% EJECUTADO	15.65%	14.95%	10.73%
% DESVIACIÓN	-10.44% -	-12.08%	-15.36%

La Interventoría indica que a la fecha se ha trabajado en conjunto con el contratista de obra, en la recolección y validación de cantidades, pero se presentan aun diferencias, es decir las cantidades no han sido conciliadas ni aterrizadas de acuerdo a lo realmente ejecutado. La diferencia radica en cantidades de demoliciones y excavaciones.

El contratista manifiesta que, los inspectores en campo midieron predio a predio el concreto MR41, el concreto de 3000, descontaron sus respectivas cajillas, cajas, el estampado, se tiene la información predio a predio. No se ha conciliado la recolección de esta información con la Interventoría. La interventoría indica que las cantidades reportadas predio a predio no corresponden.

El contratista, manifiesta que se debe realizar un cuadro global entre los residentes técnicos de interventoría y contratista. La Interventoría manifiesta que se realizará el día 12 de mayo de 2023, la verificación de estas cantidades junto con el contratista.

La Interventoría manifiesta que no puede continuar con los atrasos que presenta el contratista, y dará respuesta al oficio del FDLK el 12 de mayo de 2023, solicitando la multa al contratista por el incumplimiento al plan de contingencia, pese a que se le ha insistido al contratista realizar un ajuste a la programación.

Cuentas

La Interventoría indica que a la fecha el contratista de obra no radico la cuenta del mes de febrero en la fecha pactada.

El contratista manifiesta que, tuvo problemas para realizar la radicación, puesto que los datos consignados en los informes semanales no correspondían con la fecha del 18 de febrero de 2023. Estos se ajustaron y se radicaron a la interventoría, para revisión.

El FDLK informa que ya se cuenta con los informes de febrero, y está a la espera de la radicación de la cuenta por parte de la Interventoría. La Interventoría manifiesta que, la cuenta del contratista no tiene observaciones, está pendiente la revisión del componente técnico y de no presentar observaciones, se radicara al FDLK el 12 de mayo de 2023.

En cuanto a la cuenta de marzo, se cuenta con la aprobación de los informes de gestión ambiental, gestión social, tránsito, SST y forestal, pendiente el componente técnico.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	NPs espacio público -Balance de mayores y menores	XIE S.A	12-may-23
2	Atención de observaciones al ajuste a la programación del plan de contingencia	XIE S.A	15-may-23
3	Radicación de informes y cuentas – Facturación	XIE S.A	12-may-23
4	Respuesta a oficio U233-G1-410-23 de sumideros en los cuales va a implementar la rejilla soportada en vigas	XIE S.A	12-may-23
5	Listado de cantidades de monoblock a remplazar por A80	XIE S.A	12-may-23
6	Balance del monoblock instalado e inventario de monoblock por instalar.	XIE S.A	15-may-23

Elaborada por: Interventoría – Juan Manuel Alba Rojas

Fecha de la próxima reunión: 18 de mayo de 2023 Lugar de la próxima reunión: NA

AGENDA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO

Contratista de Obra XIE S.A – COP -621-22 Grupo 1

COMITÉ DE SEGUIMIENTO No.31

Fecha: 11 de mayo 2023

ORDEN DEL DIA

1.Compromisos	
No	**Asunto**
1	Balance Mayores y menores – NPS Esp. Público
2	Atención de observaciones al ajuste a la programación del plan de contingencia
3	Radicación de informes y cuentas – Facturación
4	Respuesta a oficio U233-G1-410-23 de sumideros en los cuales va a implementar la rejilla soportada en vigas
5	Listado de cantidades de monoblock a remplazar por A80
2. Componentes	
A. Técnico	
- **Informe semanal 31:** Sin Radicar	
- **Informe Mensual 6 y 7:** Sin Radicar	
- **Calificación:** 98%	
Obra	
B. SST	
- **Informe semanal 31:** Aprobado	
- **Informe Mensual 7:** Observado en mesa de trabajo anexo 2,3 y 4	
- **Calificación:** 100%	
C. Ambiental	
- **Informe semanal 31 :**Aprobado	
- **Informe Mensual 7:** En revisión de interventoría la atención de observaciones.	
- **Calificación:** 100%	
D. Gestión Social	
- **Informe semanal 31:** Aprobado	
- **Informe Mensual 7:** Aprobado	

- **Calificación:** 100%

Obra

Frentes de obra en la semana del 3 al 9-may-23

Frentes de obra: 8

CIV: 16



Nomenclatura
Frente de obra Activo
Frente de obra Intermitente
Frente de obra Inactivo
Frente de obra sin inicio

Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la Semana
4	8001069	**Calzada**: a nivel de segunda capa de RCD del K0+000 al K0+022 13.2 m3. **Andén oriental:** Demolición manual de andén del K0+005 al K0+030 38,3 m2, nivelación de excavación del K0+000 al K0+060, excavación manual de andén 12,86m3 del K0+005 al K0+03. **Andén occidental:** Demolición manual de andén del K0+005 al K0+030 36,74m2, excavación manual de andén 14,3 del K0+005 al K0+030,

Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la Semana
		nivelación de excavación del K0+000 al K0+060.
32	8000979	**Calzada:** Se construye sumidero modelo para la verificación de diseño y su posible aprobación por interventoría, se inicia excavación de tubería para sumidero. **Andén oriental:** Sin actividades. **Andén occidental:** Sin actividades.
28	8000929	**Calzada:** Construcción de cárcamo para tubería de 12 pulgadas 3,95ML, construcción de placa de concreto para cárcamo 3,62m2. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Excavación manual de andén 11,95m3 del K0+000 al K0+033, demolición parcial de andén 15,17 m2 del K0+000 al K0+060, demolición de andén 15,7m2.
29	8000996	**Calzada:** a nivel de segunda capa de RCD. **Andén oriental:** Nivelación de andén del K0+010 al K0+040, instalación de concreto parcial 4000 psi 17,32m2 del K0+010 al K0+060. **Andén occidental:** Nivelación de andén del K0+010 al K0+040,instalación de concreto parcial 4000 psi 21,89m2 del K0+010 al K0+060.
24	8000871	**Calzada:** a nivel de segunda capa de RCD. **Andén oriental:** Se realizan acabados en las fachas de los predios en la parte inferior entre el andén nuevo y el existente 34ML del K0+000 al K0+060. **Andén occidental:** Se realizan acabados en las fachas de los predios en la parte inferior entre el andén nuevo y el existente 30ML del K0+000 al K0+060..
25	8000923	**Calzada:** a nivel de segunda capa de RCD. **Andén oriental:** Se realizan acabados en las fachas de los predios en la parte inferior entre el andén nuevo y el existente 27ML del K0+000 al K0+060. **Andén occidental:** Se realizan acabados en las fachas de los predios en la parte inferior entre el andén nuevo y el existente 42ML del K0+000 al K0+060.
21	8000821	**Calzada:** Instalación de base estabilizado primera capa 2,25 m3del del K0+001 al K0+011. **Andén oriental:** instalación parcial de bordillo A-80 del K0+003 al K0+060 2,80ML, instalación parcial de concreto MR41 4000psi del K0+003 al K0+060 3,69m3, instalación parcial de concreto 3000psi del K0+003 al K0+060 0,84m3. **Andén occidental:** instalación parcial de bordillo A-80 del K0+003 al K0+060 4,22 ML, instalación parcial de concreto MR41 4000psi del K0+003 al K0+060 11,4m3, instalación parcial de concreto 3000psi del K0+003 al K0+060 2,93m3.
22	8000864	**Calzada:** a nivel de segunda capa de RCD.

Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la Semana
		Andén oriental: Instalación de concreto 3000 psi para anden 0,75m3 K0+003 al K0+060, **Andén occidental:** Sin actividad.
3	8000957	**Calzada:** a nivel de segunda capa de RCD. **Andén oriental:** instalación de concreto 3000 psi 3,7m3 parcial del K0+000 al K0+060. **Andén occidental:** instalación de concreto 3000 psi 5,1m3 parcial del K0+000 al K0+060.
13	8000772	**Calzada:** a nivel de segunda capa de RCD. **Andén occidental:** Sin actividad. **Andén oriental:** instalación de fresado 1,98m3, instalación de geotextil parcial 12m2 del K0+000 al K0+060.
14	8000814	**Calzada:** a nivel de segunda capa de RCD. **Andén oriental:** Nivelación y compactación en andenes parcial del K0+000 al K0+060, instalación de bordillo parcial 0,80ML del K0+000 al K0+060. **Andén occidental:** Nivelación y compactación en andenes parcial del K0+000 al K0+060, instalación de bordillo parcial 0,80ML del K0+000 al K0+060.
17	8000794	**Calzada:** Instalación de primera capa de fresado del K0+040 al K0+050 6m3, excavación mecánica de sumidero a pozo 4,73m3, instalación de tubería de 12 pulgadas para sumidero 5,1ML, instalación de tubería para recubrimiento de tubería 2,16m3, instalación de geotextil y geo celda 28m2 del K0+000 al K0+007. **Andén oriental:** demolición manual de concreto 12,84 **Andén occidental:** excavación manual de anden 19,64m3, demolición manual de concreto 26,14 m2.
18	8000839	**Calzada:** Instalación de tubería de 12 pulgadas de sumidero a pozo 14,55ML, instalación de arena para recubrimiento de tubería 4,78m3 **Andén oriental:** **Andén occidental:** Perfilación de corte de estabilizado para monoblock del K0+000 al K0+060.
33	8001041	**Calzada:** Se inicia excavación manual para instalación de tubería de aguas negras. **Andén oriental:** Demolición de anden 41,60m2, excavación de anden 14,56m3 **Andén occidental:** Demolición de anden 36,92m2, demolición parcial , demolición de 4 unidades de cajas de inspección 0,57 m3, del K0+000 al K0+050.
31	8001058	**Calzada:** Instalación de fresado para base estabilizada K0+050 al K0+058 6,53m3. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.
30	8001125	**Calzada:** Excavación manual para sumideros 1,73m3.

Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la Semana
		Andén oriental: Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.


SEGUIMIENTO GRUPO 1 AL 9-MAYO-2023										
P	**INI**	**FIN**	**CIV**	**VALOR CIV**	**PROG-ACUM**	**% PROG-ACUM**	**EJEC-ACUM**	**% EJEC-ACUM**	**% PESO EJEC**	**% ATRASO**
28	5-dic	30-jun	8000929	$ 347 200 311	$ 203 408 957	1.21%	$ 229 460 531	1.37%	66.09%	0.16%
29	5-dic	31-may	8000996	$ 292 279 155	$ 200 059 433	1.19%	$ 242 087 741	1.44%	82.83%	0.25%
24	5-dic	31-may	8000871	$ 303 712 088	$ 217 607 311	1.30%	$ 251 695 425	1.50%	82.87%	0.20%
25	5-dic	31-may	8000923	$ 378 908 264	$ 271 501 537	1.62%	$ 239 224 856	1.43%	63.14%	-0.19%
13	5-dic	31-may	8000772	$ 274 339 089	$ 177 361 244	1.06%	$ 104 088 797	0.62%	37.94%	-0.44%
14	5-dic	31-may	8000814	$ 404 676 565	$ 267 961 795	1.60%	$ 135 160 702	0.81%	33.40%	-0.79%
17	5-dic	30-jun	8000794	$ 343 212 808	$ 186 422 026	1.11%	$ 233 525 367	1.39%	68.04%	0.28%
18	5-dic	31-may	8000839	$ 395 629 378	$ 269 648 527	1.61%	$ 196 620 697	1.17%	49.70%	-0.44%
21	5-dic	31-may	8000821	$ 374 906 711	$ 252 917 801	1.51%	$ 225 632 496	1.34%	60.18%	-0.16%
22	5-dic	31-may	8000864	$ 444 284 148	$ 317 456 978	1.89%	$ 261 337 671	1.56%	58.82%	-0.33%
3	5-dic	31-may	8000957	$ 350 804 854	$ 237 015 224	1.41%	$ 276 306 334	1.65%	78.76%	0.23%
33	5-dic	30-jun	8001041	$ 173 766 372	$ 64 168 028	0.38%	$ 7 948 551	0.05%	4.57%	-0.34%
4	5-dic	1-jul	8001069	$ 172 153 562	$ 49 270 989	0.29%	$ 8 924 365	0.05%	5.18%	-0.24%
16	3-abr	31-ago	8000907	$ 356 743 482	$ 142 409 923	0.85%	$ 0	0.00%	0.00%	-0.85%
15	3-abr	31-ago	8000856	$ 308 449 741	$ 123 036 006	0.73%	$ 0	0.00%	0.00%	-0.73%
26	3-abr	31-ago	8000988	$ 303 045 416	$ 122 462 751	0.73%	$ 0	0.00%	0.00%	-0.73%
6	5-dic	31-may	8000977	$ 440 627 039	$ 149 034 476	0.89%	$ 0	0.00%	0.00%	-0.89%
32	5-dic	30-jun	8000979	$ 181 397 134	$ 70 535 055	0.42%	$ 2 910 423	0.02%	1.60%	-0.40%
30	2-may	29-sep	8001058	$ 352 063 180	$ 74 982 881	0.45%	$ 28 990 486	0.17%	8.23%	-0.27%
20	3-abr	31-ago	8000938	$ 389 376 441	$ 155 406 889	0.93%	$ 0	0.00%	0.00%	-0.93%
31	2-may	29-sep	8001125	$ 346 894 732	$ 74 001 587	0.44%	$ 45 742 187	0.27%	13.19%	-0.17%
8	2-may	29-sep	8002417	$ 520 851 148	$ 109 008 640	0.65%	$ 18 615 349	0.11%	3.57%	-0.54%
9	2-may	29-sep	8002500	$ 347 361 803	$ 72 699 162	0.43%	$ 0	0.00%	0.00%	-0.43%
27	2-may	29-sep	8001052	$ 446 170 102	$ 93 378 703	0.56%	$ 0	0.00%	0.00%	-0.56%
12	2-may	29-sep	8000849	$ 350 989 548	$ 73 458 412	0.44%	$ 0	0.00%	0.00%	-0.44%
23	3-abr	31-ago	8000916	$ 367 411 857	$ 144 781 107	0.86%	$ 0	0.00%	0.00%	-0.86%
5	2-may	29-sep	8000655	$ 470 405 871	$ 98 450 985	0.59%	$ 0	0.00%	0.00%	-0.59%
1	2-may	29-sep	8000687	$ 457 563 625	$ 95 763 241	0.57%	$ 0	0.00%	0.00%	-0.57%
7	2-may	29-sep	8000736	$ 484 559 005	$ 101 413 100	0.60%	$ 0	0.00%	0.00%	-0.60%
40	2-may	5-oct	8011953	$ 708 106 011	$ 63 830 938	0.38%	$ 0	0.00%	0.00%	-0.38%
2	2-may	5-oct	8001195	$ 360 865 577	$ 32 529 577	0.19%	$ 0	0.00%	0.00%	-0.19%
39	2-may	5-oct	8000584	$ 454 498 306	$ 24 551 072	0.15%	$ 0	0.00%	0.00%	-0.15%
Totales					**$ 4 536 534 355**	**27.03%**	**$ 2 508 271 978**	**14.95%**		-12.09%


SEGUIMIENTO GRUPO 1 AL 9-MAYO-2023										
P	INI	FIN	CIV	VALOR CIV	PROG-ACUM	% PROG-ACUM	EJEC-ACUM	% EJEC-ACUM	% PESO EJEC	% ATRASO
					$ 16 781 065 424					

FECHA EVALUACIÓN			26-abr	3-may	9-may
P	CIV	VALOR TOTAL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV
28	8000929	$ 347 200 311.00	64.58%	65.53%	66.09%
29	8000996	$ 292 279 155.00	74.56%	76.82%	82.83%
24	8000871	$ 303 712 088.00	81.24%	82.78%	82.87%
25	8000923	$ 378 908 264.00	62.86%	62.98%	63.14%
13	8000772	$ 274 339 089.00	37.01%	37.47%	37.94%
14	8000814	$ 404 676 565.00	32.70%	32.83%	33.40%
17	8000794	$ 343 212 808.00	63.25%	64.51%	68.04%
18	8000839	$ 395 629 378.00	49.57%	49.70%	49.70%
21	8000821	$ 374 906 711.00	57.80%	58.25%	60.18%
22	8000864	$ 444 284 148.00	57.97%	58.33%	58.82%
3	8000957	$ 350 804 854.00	74.94%	76.50%	78.76%
33	8001041	$ 173 766 372.00	4.39%	4.39%	4.57%
4	8001069	$ 172 153 562.00	5.01%	5.01%	5.18%
32	8000979	$ 181 397 134.00	0.40%	0.40%	1.60%
30	8001058	$ 352 063 180.00	2.34%	7.60%	8.23%
31	8001125	$ 346 894 732.00	7.82%	12.56%	13.19%

FECHA EVALUACIÓN			9-may
P	CIV	VALOR TOTAL CIV	% AVANCE SEMANAL
28	8000929	$ 347 200 311.00	0.56%
29	8000996	$ 292 279 155.00	6.01%
24	8000871	$ 303 712 088.00	0.10%
25	8000923	$ 378 908 264.00	0.16%
13	8000772	$ 274 339 089.00	0.47%
14	8000814	$ 404 676 565.00	0.57%
17	8000794	$ 343 212 808.00	3.53%
18	8000839	$ 395 629 378.00	0.00%
21	8000821	$ 374 906 711.00	1.94%
22	8000864	$ 444 284 148.00	0.49%
3	8000957	$ 350 804 854.00	2.26%

FECHA EVALUACIÓN			9-may
P	CIV	VALOR TOTAL CIV	% AVANCE SEMANAL
33	8001041	$ 173 766 372.00	0.18%
4	8001069	$ 172 153 562.00	0.17%
32	8000979	$ 181 397 134.00	1.21%
30	8001058	$ 352 063 180.00	0.64%
31	8001125	$ 346 894 732.00	0.63%

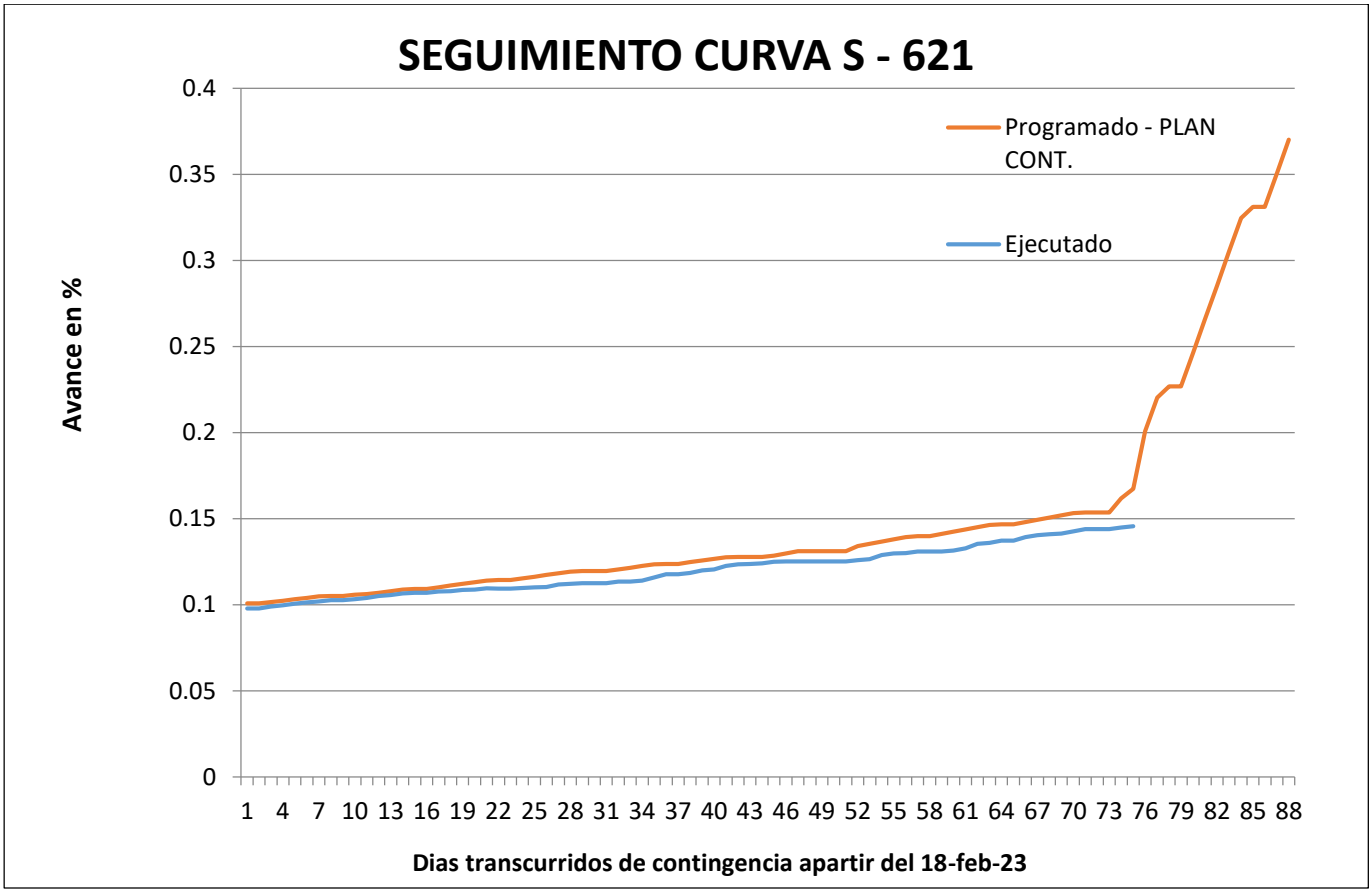

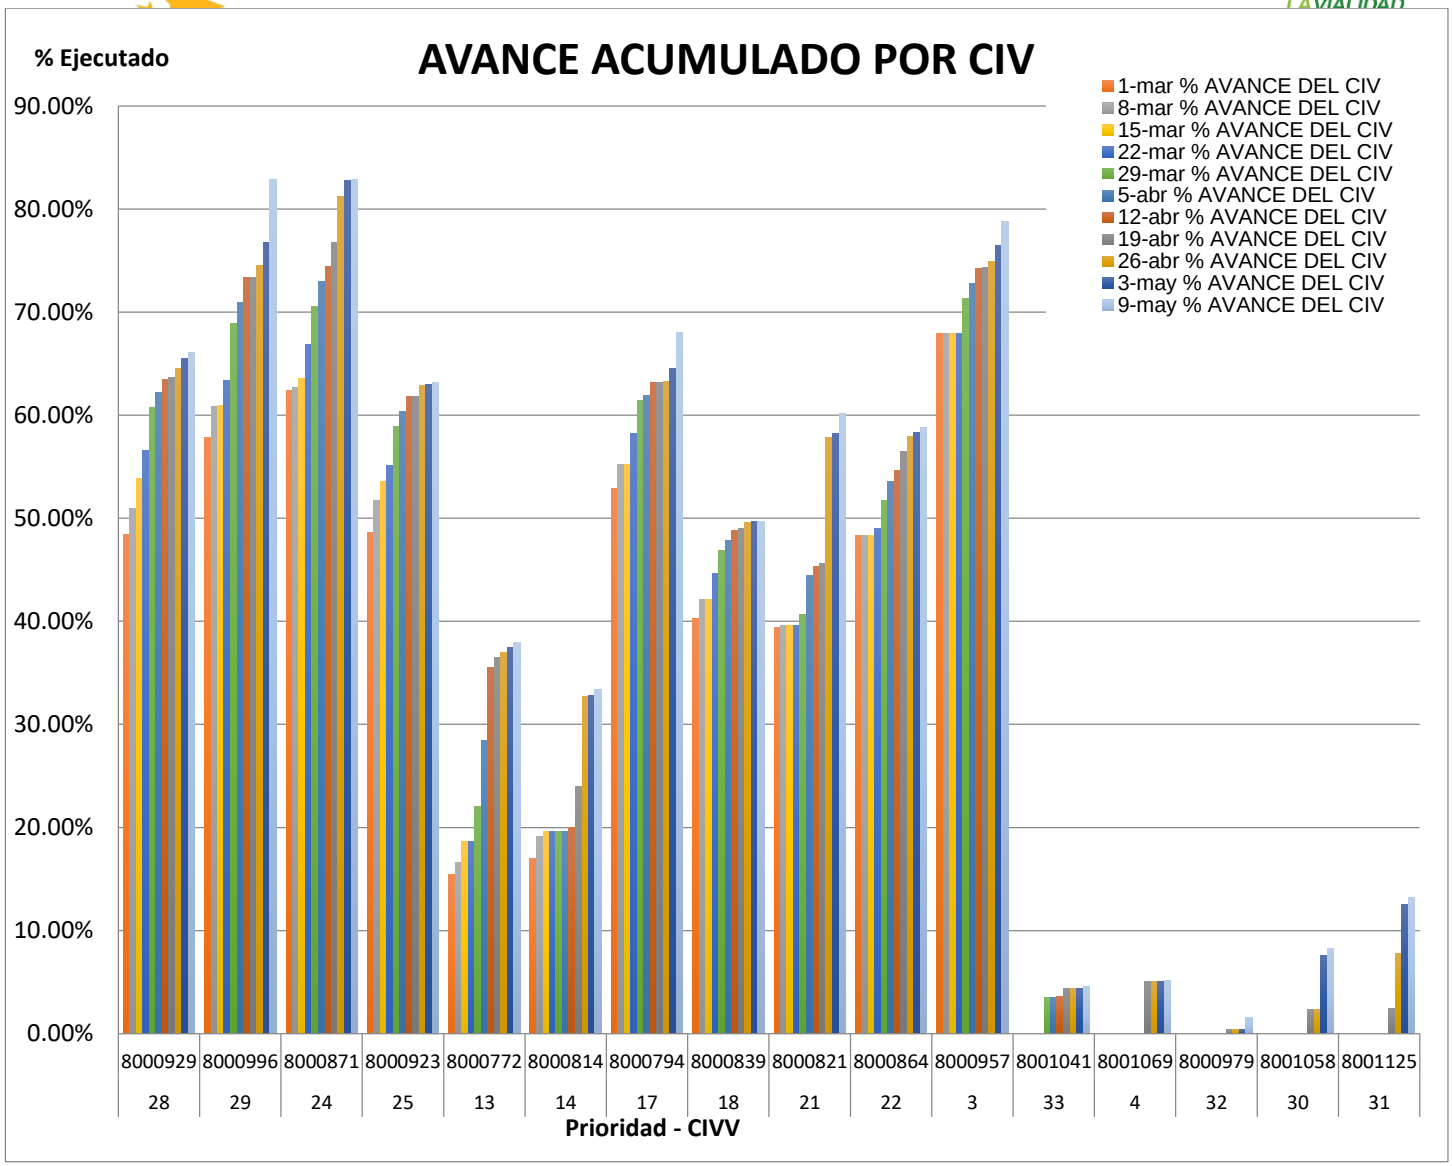

G1	CORTE AL 9 DE MAYO DE 2023		
	GENERAL	OBRA	FINANCIERO
% PROGRAMADO	26.09%	27.03%	26.09%
% EJECUTADO	15.65%	14.95%	10.73%
% DESVIACIÓN	-10.44%	-12.08%	-15.36%

	PK_ID ANDEN	PK_ID ANDEN	3			4			13			14			17			18			21			22			24			25			28			29			30			31			32			33		
VIA	ORIENTAL	OCCIDENTAL	VIA (156201)	ORI (29896)	OCC (29897)	VIA (156189)	ORI (29872)	OCC (29873)	VIA (156220)	ORI (29934)	OCC (29935)	VIA (156221)	ORI (29936)	OCC (29937)	VIA (156216)	ORI (29926)	OCC (29927)	VIA (156217)	ORI (29928)	OCC (29929)	VIA (156212)	ORI (29918)	OCC (29919)	VIA(156213)	ORI(29920)	OCC(29921)	VIA(156204)	ORI(29902)	OCC(29903)	VIA(156205)	ORI(29904)	OCC(29905)	VIA(156196)	ORI(29886)	OCC(29887)	VIA(156197)	ORI(29888)	OCC(29889)	VIA(156198)	ORI(29890)	OCC(29891)	VIA(156199)	ORI(29892)	OCC(29893)	VIA(156186)	ORI(29866)	OCC(29867)	VIA(156188)	ORI(29870)	OCC(29871)
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO Y CAJAS DE INSPECCION.	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO Y CAJAS DE INSPECCION.																																													
NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.																																												
REDES HIDRAULICAS	GEOTEXTIL	GEOTEXTIL																																												
GEOTEXTIL, GEOCELDA HDPE PERFORADA, RELLENO CON FRESADO SOBRE GEOCELDA	PRIMERA CAPA DE FRESADO	PRIMERA CAPA DE FRESADO																																												
PRIMERA CAPA FRESADO (RAP) ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 3% Y ADITIVO POTENCIALIZADOR (1.3 KG/M3 - SOLID SOIL).	SEGUNDA CAPA DE FRESADO	SEGUNDA CAPA DE FRESADO																																												
CANAL DE DRENAJE PREFABRICADO EN POLYCONCRETO MONOBLOCK.	CONSTRUCCION CAJAS DE INSPECCION, CAJILLAS DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION CAJAS DE INSPECCION, CAJILLAS DE AGUA POTABLE																																												
SEGUNDA CAPA FRESADO (RAP) ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 3% Y ADITIVO POTENCIALIZADOR (1.3 KG/M3 - SOLID SOIL).	BORDILLO PREFABRICADO A80	BORDILLO PREFABRICADO A80																																												
MEZCLA ASFALTICA	CONCRETO DE 3000PSI Y MR41	CONCRETO DE 3000 PSI Y MR41																																												

TERMINADO	
EJECUCION	
INTERMITENTE	
SIN INICIAR	
NO APLICA	
