BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo De Desarrollo Local de Kennedy

FECHA: 25 de mayo de 2023 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** 61

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité Integral No. 8 de Seguimiento No. 33

HORA DE INICIO: 8:30 am **HORA DE FINALIZACIÓN:** ____

ASISTENTES:

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Andrés Mauricio Rojas LL.			X						X	FDLK - Infraestructura	andres.m.llanos@gobiernobogota.gov.co	3057039773	
Danilo Meneses Toro			X						X	FDLK-Infraestructura	Danilo.Meneses@gobiernobogota.gov.co	3118788084	
Manuel Alejandro Mazabel Garcia			X						X	FDLK - XIE SA	director.proyecto.0621@gmail.com	3212149472	
Juan Pedro Largo			X						X	Interventoría	u233sclvkennedy@outlook.com	3002133006	
ROSA LIDA MONGUA			X						X	XIE S.A.	xiekennedyresidente2@gmail.com	3223141853	
ANGIE MILENA MEDINA GUZMAN			X						X	XIE. S.A	xiesocial@outlook.com	3102504425	A. MILENA MEDINA
Sandra Pinto			X						X	Xie-Sa	xie.sst6212gmail.com	3089320058	
Maria Camila Perez Rey			X						X	XIE. S.A	xie.ambiental@gmail.com	3102457234	
Oscar Vargas		A							X	X.i.e S.A	oscar.vargas@xie.com.co	3102239581	
Pablo Castillo			X							Interventoría	pablo.castillo@lavialidad.com	3117556026	Pablo A
ARTURO ZÁRATE M.			X							SCLV INTERV,	arturo.zarate1963@yahoo.com	3152768021	

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo De Desarrollo Local de Kennedy

FECHA: 25 de mayo de 2023 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** ____

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité Integral No. 8 de seguimiento No. 33.

HORA DE INICIO: 8:30 am. **HORA DE FINALIZACIÓN:** ____

ASISTENTES:

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Yolen Agamez C.			X						X	XIE, S.A.S	milen.agamez@outlook.com.	318 396 0948	
Ana Leonor Porras R			✓						·	Interventoria Social	aleoporras@gmail.com	3212071449	
Sonia E Hernandez Gomez			X						X	Interventoria Consorcio SCLV	socialgrupo1.kennedy@gmail.com	3103626480	
Jose de Calasanz Marquez			X							Interventoria	supervisortoyeguer.3204993418		
Mario Javier Delgado Camargo			X						X	Interventoria Cons. SCLV	maja.99@gmail.com	3132124564	
Nury Albarracin Daza			X						X	Interventoria	sst1kennedy@outlook.es	3123230618	
Carlos Benavides M.			X							Interventoría	maquinariasclv@outlook	3131211526	
Alba Yolanda Morales Arias			X							InterventoriaCons SCLV	aymat38@gmail.com	3114440424	
Juan Manuel Olaya R			X							Interventoria	juanmanuelolaya@hotmail.com	3107411542	
Anyeli Cunel Acosta			X							Interventoria	u233sclvkennedy@outlook.com	3227401898	
Karen Juleth Perales Ramirez			X							Interventoria	u233sclvkennedy@outlook.com	3143253724	

CONSENTIMIENTO: El abajo firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se da inicio al comité de seguimiento No. 33 integral No. 8 en las instalaciones de la interventoría las 8:30 am, con la presencia del apoyo a la supervisión FDLK, contratista de obra Grupo 1 XIE S.A e Interventoría Consorcio SCLV.

Orden del Día

1. Compromisos Pendientes

A la fecha la Interventoría manifiesta que no se dio cumplimiento a los siguientes compromisos:

- Radicación de NPs espacio público– Balance - Informe de justificación al FDLK
- Radicación de la cuenta del mes de abril.

Por otra parte, la Interventoría indica que, de acuerdo a la reunión realizada con el FDLK y la alcaldesa, se pactaron los siguientes compromisos:

- El contratista debe ponerse al día con el PDT, con el fin de contar con una programación y cronograma real de actividades de obra a ejecutar, antes del 15 de junio de 2023.
- El contratista de obra debe terminar las actividades de obra de los primeros 27 CIV restantes, a finales del mes de julio e inicios del mes de agosto.
- El contratista de obra deberá realizar la entrega de un registro fotográfico de cada una de las prioridades (antes y después), para el 15 de junio de 2023.

Componentes

Componente SST

- Informe semanal 33: Aprobado
- Informe Mensual 7: Observado (Planillas de seguridad social)
- Calificación: 94.76%

-Obra: El contratista de obra se acogió a las observaciones presentadas en el recorrido realizado, y las atendió de manera inmediata.

-Personal: Durante la semana hubo ingreso de 8 trabajadores de mano de obra, de los cuales son 6 ayudantes y 2 oficiales.

- Retirados en el mes de abril: 17 trabajadores que corresponden al 13%
- Retirados en enero, febrero y marzo 2023: 4 trabajadores que ingresaron y en el mismo mes se retiraron.

La Interventoría manifiesta que remitió un apremio al contratista por presentar planillas alteradas en diversos apartados de los subcontratistas. El contratista informa que no se volverá presentar este percance, y manifiesta

que, para dar solución a este problema, realizará el pago de las mismas y se descontará ese pago a los subcontratistas.

Componente Ambiental
- Informe semanal 33: Observado
- Informe Mensual 8: En revisión en mesa de trabajo.
- Calificación: 94.76%

La Interventoría informa que, de acuerdo con la reunión realizada con la SDA, con respecto a la normatividad de aprovechamiento de RCD, no se realizara con el total de volumen generado de material sino con el total del RCD, por lo tanto, el indicador es cero. Por tanto, no se está utilizando como meta de aprovechamiento. El día 23 de mayo de 2023 se elevó esta interpretación al PIGA del FDLK.

Forestal
El contratista manifiesta que siguen a la espera de una respuesta de la SDA, respeto a la solicitud de tala de un árbol de especie urapán. ubicado en el CIV 8000655 prioridad 5. Se han realizado varios acercamientos y no se ha recibido respuesta. Se remitió el radicado a el FDLK, con el cual se realizó la solicitud a la SDA, con el fin de adelantar la gestión con el PIGA, pero mencionan que aún no les han dado respuesta.

Sin embargo, el contratista indico que reitero la radicación a SDA, y está a la espera de una pronta respuesta. El FDLK hará un acercamiento con la SDA para darle celeridad a la gestión.

Maquinaria y equipo
-La Interventoría manifiesta que a la fecha el contratista no ha ingresado nueva maquinaria ni equipo.
-Los formatos del informe mensual No. 7 (abril) se encuentran aprobados.

Gestión Social
- Informe semanal 33: Aprobado
- Informe Mensual 8: En revisión en mesa de trabajo.
- Calificación: 100%

Técnico
-Frentes de obra activos: 8 – 16 CIV
-Informe semanal 30 al 33: Sin radicar
-Informe mensual 6: En ajustes por parte del contratista
-Informe mensual 7: Sin radicar
-Calificación: 98% (La calificación ha sido afectada por llamados de atención reiterativos al PMT).

**Se adjunta agenda que contiene plano de prioridades y cuadro de actividades por prioridades*

Especialidades

Espacio público y urbanismo

-La Interventoría informa que a la fecha está pendiente de radicación por parte del contratista de obra el listado de las cantidades que se van a remplazar de monoblock a bordillos A80.
-El componente de gestión social informa que varias personas de la comunidad donde se están realizando las actividades de obra, están afectado y dañando el espacio público cuando se funde. La Interventoría y FDLK solicita al contratista realizar actas de compromisos en las cuales ellos se responsabilicen de los daños que puedan causar por las alteraciones al espacio público y su registro fotográfico con la evidencia.
- Se solicita al contratista darle celeridad a la radicación de NPs y Balance de espacio público.

Redes Húmedas

-La Interventoría manifiesta que a la fecha el contratista de obra no ha realizado la radicación del cronograma de inspecciones CCTVs.

Tránsito y transporte

-La Interventoría manifiesta que de los 43 CIV que el contratista tiene, solo ha realizado el trámite de PMT a 23, 7 para vías y 16 para espacio público.
- Se cuenta con la observación de 8 PMT de las prioridades 1, 5, 7, 19, 34, 35, 36 y 39, y no han sido atendidas por el contratista. El contratista manifiesta que realizara la radicación de la atención a observaciones en el transcurso de la próxima semana.
-En cuanto a los diseños de señalización, la Interventoría informa que el 12 de junio vencen 3 CIVS.
- La Interventoría menciona que en los informes mensuales no se están incluyendo las inconformidades de la comunidad en cuanto a la implementación del PMT, estas inconformidades pueden ser de la comunidad (propietarios aledaños) o terceros (JAC, SDM, entre otras entidades). Es obligatorio adjuntar estos documentos en el informe.
- La Interventoría agrega que es indispensable en obra contra con el COI y plano actualizado, puesto que se evidencio en obra que no se contaba con el COI actualizado.

Programación

A la fecha el contratista de obra continua con los atrasos en obra, como se evidencia en los avances para la semana No. 33 (18 al 24 de mayo de 2023), presentados a continuación:

G1	CORTE AL 23 DE MAYO DE 2023		
	GENERAL	OBRA	FINANCIERO
% PROGRAMADO	41.55%	58.67%	41.55%
% EJECUTADO	18.95%	25.20%	10.73%
% DESVIACIÓN	-22.60%	-33.47%	-30.82%

La Interventoría manifiesta que, pese a varios intentos y solicitudes de ajuste a la programación, el contratista no ha realizado los respectivos ajustes y el plan de contingencia termino, es decir que esta evaluación se realizó con la programación inicialmente aprobada por la interventoría. Es evidente que el contratista presenta atrasos muy elevados física y financieramente, pero frente a lo evidenciado en obra en los recorridos, este no concuerda, puesto que la obra presente un buen avance.

Cuentas

La Interventoría manifiesta que aun las cuentas cuentan con errores, para que no se presenten más problemas y errores, debemos revisar muy bien las cuentas y como las diligenciamos, puesto que si se radican correctamente y asertivamente no serán devueltas y el FDLK realizara los pagos.

El FDK informa que en su mayoría se revisa el acta parcial de obra, para verificación de cantidades y los soportes. Se solicita al contratista ponerse al día el mes de abril para nivelarse y tener presupuesto para los insumos.

Se espera que el contratista también radique el cronograma de las prioridades de las cuales va a entregar

El FDLK le recuerda a la Interventoría y contratista que quedan tan solo 4 meses de obra y queda más del 60% de obra por ejecutar, puesto que el proceso sancionatorio está en proceso y del contratista depende si este se queda o no.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	NPs de espacio público – Balance - Informe de justificación	XIE S.A	29-may-23
2	Atención observaciones PMT SDM	XIE S.A	31-may-23
3	Plan detallado de trabajo ajustado	XIE S.A	26-may-23
4	Cronograma de inspecciones CCTV	XIE S.A	25-may-23

Elaborada por: Interventoría – Juan Manuel Alba Rojas
Fecha de la próxima reunión: 1 de junio de 2023 Lugar de la próxima reunión: NA

AGENDA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO

Contratista de Obra XIE S.A – COP -621-22 Grupo 1

COMITÉ DE SEGUIMIENTO No.33 INTEGRAL No.8

Fecha: 25 de mayo 2023


ORDEN DEL DIA

1.Compromisos	
No	**Asunto**
1	Balance Mayores y menores – NPS Esp. Público
2	Radicación de cuenta de abril
2. Componentes	
A. Técnico	
- **Informe semanal 30 al 33:** Sin radicar	
- **Informe Mensual 6:** En ajustes por parte del contratista - **Informe Mensual 7:** Sin radicar	
- **Calificación:** 98%	
B. SST	
- **Informe semanal 33:** Aprobado	
- **Informe Mensual 7:** Observado en mesa de trabajo anexo 2,3 y 4	
- **Calificación:** 94.76%	
C. Ambiental	
- **Informe semanal 33 :**Observado	
- **Informe Mensual 8:** Revisión en mesa de trabajo	
- **Calificación:** 94.76%	
D. Gestión Social	
- **Informe semanal 33:** Aprobado	
- **Informe Mensual 8:**Revisión en mesa de trabajo	
- **Calificación:** 100%	
Especialidades	
Obra	

Frentes de obra en la semana del 17 al 23 de mayo de 2023

Frentes de obra: 8

CIV: 16

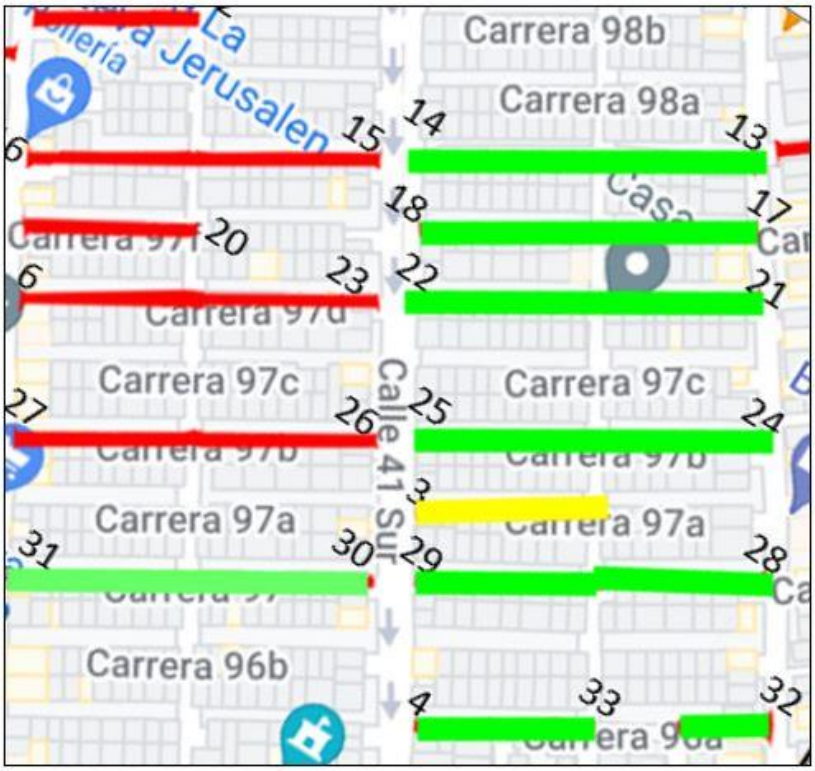

Nomenclatura
Frente de obra Activo
Frente de obra Intermitente
Frente de obra Inactivo
Frente de obra sin inicio

Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la Semana
4	8001069	**Calzada** a nivel de segunda capa de RCD. **Andén oriental:** demolición parcial de cajas de inspección 0,27m3 y construcción parcial de cajas de inspección 1 unidad del K0+000 al K0+060. **Andén occidental:** instalación parcial de geotextil 45m2 del K0+000 al K0+060, instalación parcial de fresado 9m3 del K0+000 al K0+060.
32	8000979	**Calzada**: a nivel de segunda capa de RCD. **Andén oriental:** demolición manual parcial de piso de concreto 29m2 del K0+000 al K0+060, excavación manual parcial 18.61m3 del K0+000 al K0+060

Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la Semana
		Andén occidental: demolición manual parcial de piso de concreto 22.3m2 del K0+000 al K0+060, excavación manual parcial 18.4m3 del K0+000 al K0+060, demolición parcial de cajas de inspección 0,54m3 y construcción parcial de cajas de inspección 2 unidades del K0+000 al K0+060.
28	8000929	**Calzada:** a nivel de segunda capa de RCD. **Andén oriental:** corte de estabilizado para instalación de monoblock del K0+020 al K0+030 10ML. **Andén occidental:** instalación parcial de geotextil 67.8 m2 del K0+000 al K0+060, instalación parcial de fresado 14.91 m3 del K0+000 al K0+060.
29	8000996	**Calzada:** a nivel de segunda capa de RCD. **Andén oriental:** instalación de concreto parcial para anden de 3000 psi 20.32m2 del K0+000 al K0+060, instalación parcial de cajillas 2 unidades del K0+000 al K0+060. **Andén occidental:** instalación de concreto parcial para anden de 3000 psi 22.88m2 del K0+000 al K0+060, instalación parcial de cajillas 4 unidades del K0+000 al K0+060.
24	8000871	**Calzada**: renivelación de pozo de aguas negras sobre la CL 40 Sur 3 hiladas. **Andén oriental:** excavación manual parcial 31.12m3, instalación parcial de bordillo A-80 15.26ml del K0+000 al K0+060. **Andén occidental:** instalación parcial de bordillo A-80 7.66ml del K0+000 al K0+060.
25	8000923	**Calzada:** acabados en instalación de bordillos sobre la Cl 40ª. **Andén oriental**: instalación de concreto parcial para anden de 3000 psi 4.76m2 del K0+000 al K0+060. **Andén occidental:** instalación de concreto parcial para anden de 3000 psi 4.23m2 del K0+000 al K0+060.
21	8000821	**Calzada:** a nivel base estabilizada primera capa. **Andén oriental:** instalación de concreto parcial para anden de 3000 psi 17.6m2 del K0+000 al K0+060. **Andén occidental:** excavación manual de anden 5.12m3, instalación parcial de bordillo A-80 del K0+000 al K0+060 17.83ml, instalación parcial de fresado del K0+000 al K0+060 5.14m3, instalación de concreto parcial para anden de 3000 psi 28m2 del K0+000 al K0+060.
22	8000864	**Calzada:** a nivel de base estabilizada primera capa. **Andén oriental**: remates de fachadas parte inferior 78.4ml del K0+000 al K0+060. **Andén occidental:** remates de fachadas parte inferior del 46.83ml K0+000 al K0+060.
3	8000957	**Calzada:** a nivel de segunda capa de RCD. **Andén oriental;** instalación de concreto parcial para anden de

Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la Semana
		3000 psi 40.02m2 del K0+000 al K0+060, instalación parcial de cajillas 4 unidades del K0+000 al K0+060. **Andén occidental:** instalación de concreto parcial para anden de 3000 psi 5.05m2 del K0+000 al K0+060, instalación parcial de cajillas 1 unidad del K0+000 al K0+060, instalación parcial de bordillo A-80 del K0+000 al K0+060 3.35 ml.
13	8000772	**Calzada:** Corte de base estabilizada para instalación de monoblock del K0+020 al K0+030. **Andén occidental:** Sin actividad. **Andén oriental:** Sin actividad.
14	8000814	**Calzada:** instalación parcial de bordillo A-80 en la intersección 40-45sur y 40ª-03sur 7.60ml. **Andén oriental:** instalación de concreto parcial para anden de 3000 psi 13.7m2 del K0+000 al K0+060 **Andén occidental:** instalación de concreto parcial para anden de 3000 psi 43.24m2 del K0+000 al K0+060, instalación parcial de fresado 2.78m3 del K0+000 al K0+060.
17	8000794	**Calzada:** Instalación de primera capa de fresado del K0+040 al K0+050. **Andén oriental:** instalación de fresado parcial 1ra capa 2.16m3 del K0+000 al K0+060, demolición manual de concreto 7.35m2, demolición parcial de cajas de inspección 1.08m3 y construcción parcial de cajas de inspección 4 unidades del K0+000 al K0+060. **Andén occidental:** instalación de fresado parcial 1ra capa 12.01m3 del K0+000 al K0+060, demolición parcial de cajas de inspección 0.54m3 y construcción parcial de cajas de inspección 2 unidades del K0+000 al K0+060.
18	8000839	**Calzada:** instalación de geo celda corte y arreglo de empalme del K0+050 al K0+064.02 56.08m2m, instalación de geotextil del K0+050 al K0+064.02 56.08m2, instalación de fresado del K0+050 al K0+064.02 10.09m3. **Andén oriental:** instalación de fresado parcial 2da capa 5.09m3 del K0+000 al K0+060. **Andén occidental:** instalación de fresado parcial 2da capa 11.33m3 del K0+000 al K0+060.
33	8001041	**Calzada:** Sin actividad **Andén oriental:** instalación parcial de geotextil 40m2 del K0+000 al K0+060, instalación parcial de fresado 8m3 del K0+000 al K0+060. **Andén occidental:** instalación parcial de geotextil 45.44 m2 del K0+000 al K0+060, instalación parcial de fresado 9.08m3 del K0+000 al K0+060, demolición parcial de cajas de inspección 0.27m3 y construcción parcial de cajas de inspección 1 unidad del K0+000 al K0+060.
31	8001058	**Calzada:** Sin actividad

Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la Semana
		Andén oriental: demolición parcial de concreto manual 39m2 del K0+000 al K0+060, excavación manual en anden 32.76m3 del K0+000 al K0+060, demolición parcial de cajas de inspección 0.81m3 y construcción parcial de cajas de inspección 3 unidades del K0+000 al K0+060 **Andén occidental:** demolición parcial de concreto manual 17.76m2 del K0+000 al K0+060, excavación manual en anden 13.86m3 del K0+000 al K0+060.
30	8001125	**Calzada:** Sin actividad **Andén oriental:** demolición parcial de concreto manual 17.76m2 del K0+000 al K0+060, excavación manual en anden 13.86m3 del K0+000 al K0+060. **Andén occidental:** demolición parcial de concreto manual 44.41m2 del K0+000 al K0+060, excavación manual en anden 31.71m3 del K0+000 al K0+060.




EVALUACIÓN CON PROGRAMACIÓN INICIAL
GRUPO 1 COP-621-22

SEGUIMIENTO GRUPO 1 AL 23-MAYO-2023


P	CIV	VALOR CIV	PROG-ACUM	% PROG-ACUM	EJEC-ACUM	% EJEC-ACUM	% PESO EJEC	% ATRASO
28	8000929	$ 286 285 298	$ 286 285 298	2.36%	$ 179 730 011	1.48%	62.78%	-0.88%
29	8000996	$ 242 229 957	$ 242 229 957	2.00%	$ 248 437 282	2.05%	102.56%	0.05%
24	8000871	$ 269 517 473	$ 269 517 473	2.22%	$ 269 014 793	2.22%	99.81%	0.00%
25	8000923	$ 345 626 780	$ 345 626 780	2.85%	$ 341 937 802	2.82%	98.93%	-0.03%
13	8000772	$ 289 860 253	$ 289 860 253	2.39%	$ 115 222 417	0.95%	39.75%	-1.44%
14	8000814	$ 414 590 746	$ 414 590 746	3.42%	$ 291 909 180	2.41%	70.41%	-1.01%
17	8000794	$ 305 729 990	$ 305 729 990	2.52%	$ 139 467 959	1.15%	45.62%	-1.37%
18	8000839	$ 414 390 409	$ 414 390 409	3.42%	$ 204 872 009	1.69%	49.44%	-1.73%
21	8000821	$ 379 185 734	$ 379 185 734	3.13%	$ 277 890 269	2.29%	73.29%	-0.84%
22	8000864	$ 407 701 220	$ 407 701 220	3.36%	$ 402 437 306	3.32%	98.71%	-0.04%
3	8000957	$ 324 515 768	$ 246 830 979	2.04%	$ 315 724 369	2.60%	97.29%	0.57%
33	8001041	$ 148 920 207	$ 148 920 207	1.23%	$ 44 378 989	0.37%	29.80%	-0.86%
4	8001069	$ 154 073 695	$ 154 073 695	1.27%	$ 43 468 463	0.36%	28.21%	-0.91%
16	8000907	$ 361 864 229	$ 361 864 229	2.98%	$ 0	0.00%	0.00%	-2.98%
15	8000856	$ 314 966 118	$ 311 099 346	2.57%	$ 0	0.00%	0.00%	-2.57%
26	8000988	$ 248 815 938	$ 236 199 092	1.95%	$ 0	0.00%	0.00%	-1.95%
6	8000977	$ 313 656 772	$ 313 656 772	2.59%	$ 0	0.00%	0.00%	-2.59%
32	8000979	$ 151 794 191	$ 109 779 728	0.91%	$ 41 027 915	0.34%	27.03%	-0.57%
30	8001058	$ 307 025 458	$ 178 975 177	1.48%	$ 70 412 636	0.58%	22.93%	-0.90%
20	8000938	$ 379 247 233	$ 379 247 233	3.13%	$ 0	0.00%	0.00%	-3.13%
31	8001125	$ 295 012 955	$ 200 339 326	1.65%	$ 70 370 092	0.58%	23.85%	-1.07%
8	8002417	$ 433 765 202	$ 114 517 753	0.94%	$ 0	0.00%	0.00%	-0.94%
9	8002500	$ 331 158 979	$ 63 242 166	0.52%	$ 0	0.00%	0.00%	-0.52%
27	8001052	$ 384 495 381	$ 328 725 414	2.71%	$ 0	0.00%	0.00%	-2.71%
12	8000849	$ 417 435 435	$ 143 714 530	1.18%	$ 0	0.00%	0.00%	-1.18%
23	8000916	$ 341 149 570	$ 341 149 570	2.81%	$ 0	0.00%	0.00%	-2.81%
5	8000655	$ 454 907 485	$ 36 070 090	0.30%	$ 0	0.00%	0.00%	-0.30%
40	8000687	$ 616 993 900	$ 60 773 899	0.50%	$ 0	0.00%	0.00%	-0.50%
10	8000736	$ 668 954 068	$ 30 117 106	0.25%	$ 0	0.00%	0.00%	-0.25%
1	8011953	$ 442 058 340	$ 1 748 649	0.01%	$ 0	0.00%	0.00%	-0.01%
	Totales		**$ 7 116 162 821**	**58.67%**	**$ 3 056 301 492**	**25.20%**		-33.47%
			$ 12 128 504 795					

SEGUIMIENTO CURVA S - 621

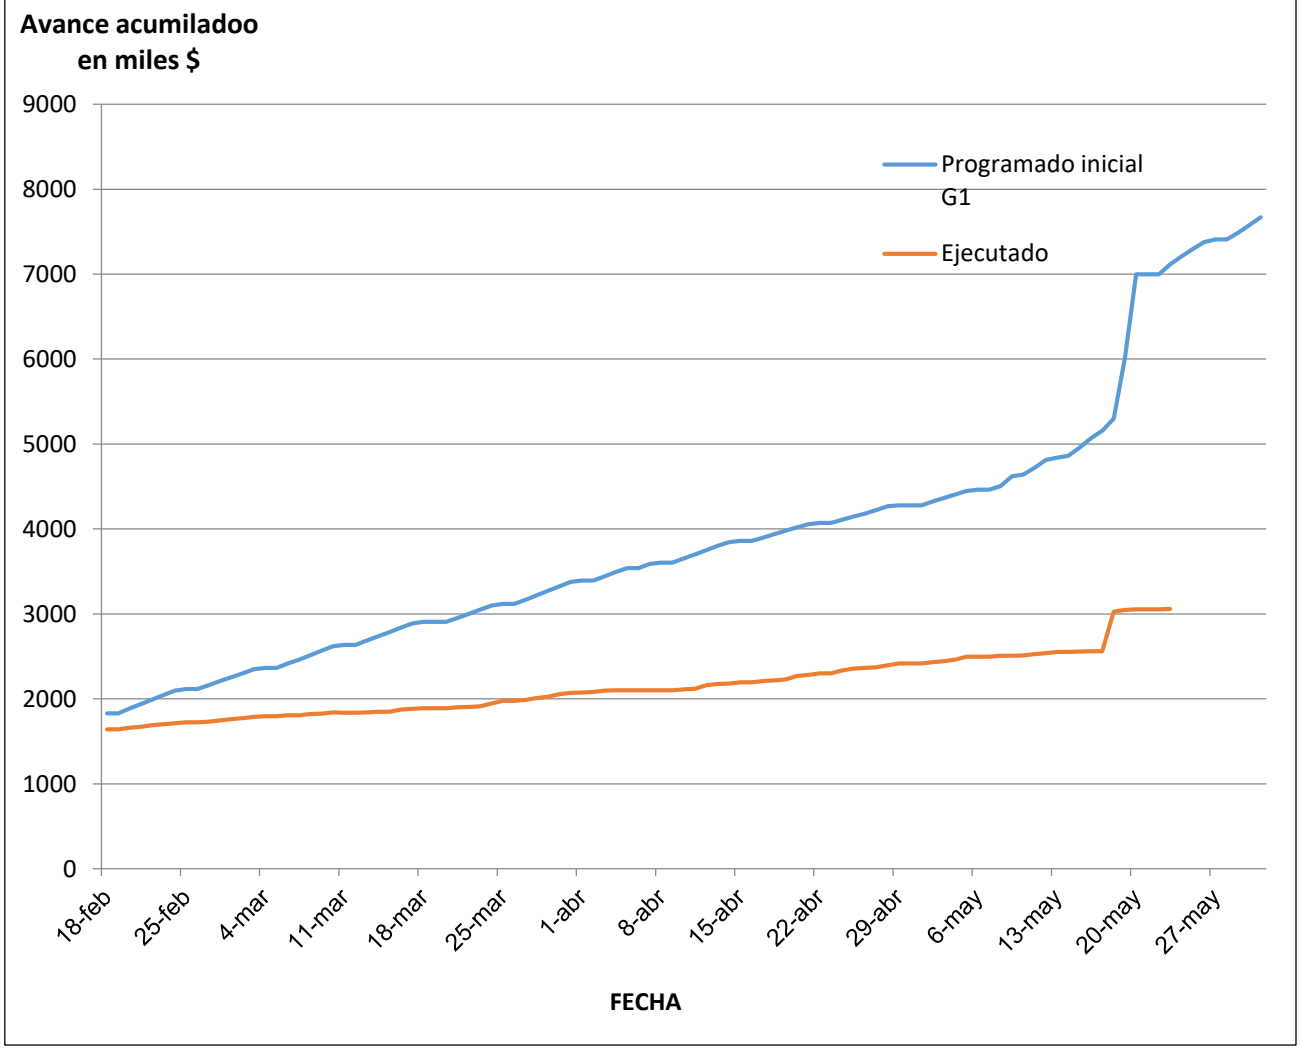

G1	CORTE AL 23 DE MAYO DE 2023		
	GENERAL	OBRA	FINANCIERO
% PROGRAMADO	41.55%	58.67%	41.55%
% EJECUTADO	18.95%	25.20%	10.73%
% DESVIACIÓN	-22.60%	-33.47%	-30.82%

FECHA EVALUACIÓN			18-may	23-mar
P	CIV	VALOR TOTAL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV
28	8000929	$ 347 200 311.00	50.00%	62.78%
29	8000996	$ 292 279 155.00	85.00%	102.56%
24	8000871	$ 303 712 088.00	88.00%	99.81%
25	8000923	$ 378 908 264.00	90.00%	98.93%
13	8000772	$ 274 339 089.00	42.00%	39.75%
14	8000814	$ 404 676 565.00	72.00%	70.41%
17	8000794	$ 343 212 808.00	40.00%	45.62%
18	8000839	$ 395 629 378.00	50.00%	49.44%
21	8000821	$ 374 906 711.00	73.00%	73.29%
22	8000864	$ 444 284 148.00	90.00%	98.71%
3	8000957	$ 350 804 854.00	90.00%	97.29%
33	8001041	$ 173 766 372.00	25.00%	29.80%
4	8001069	$ 172 153 562.00	25.00%	28.21%
32	8000979	$ 181 397 134.00	22.00%	27.03%
30	8001058	$ 352 063 180.00	20.00%	22.93%
31	8001125	$ 346 894 732.00	20.00%	23.85%

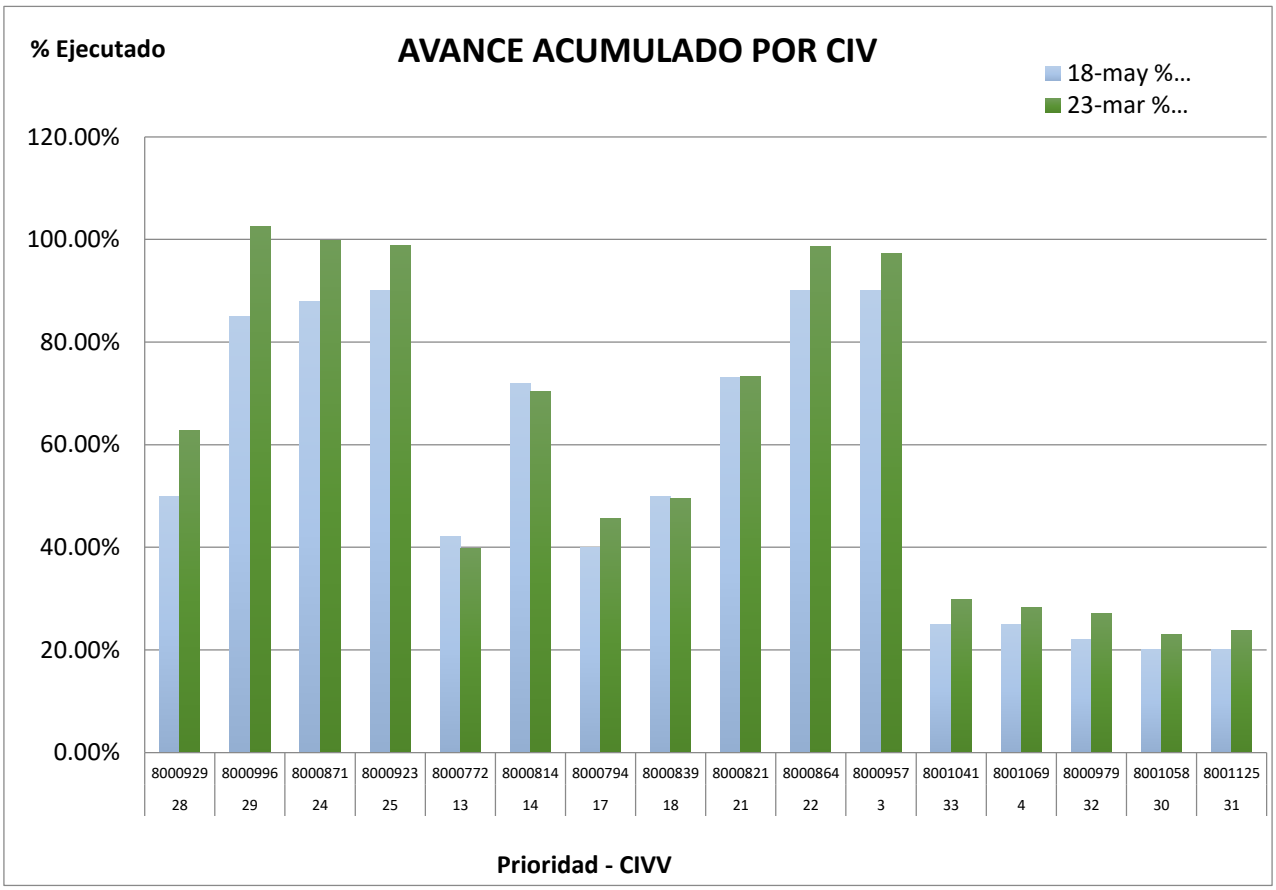

ESTADO SEMANAL DE PROCESO CONSTRUCTIVO

CONTRATISTA DE OBRA GRUPO 1-XIE S.A COP 620-22

	PK_ID ANDEN	PK_ID ANDEN	3			4		13			14			17			18			21			22			24			25			28			29			30			31			32			33		
VIA	ORIENTAL	OCCIDENTAL	VIA (156201)	ORI (29896)	OCC (29897)	VIA (156189)	ORI (29872)	OCC (29873)	VIA (156220)	ORI (29934)	OCC (29935)	VIA (156221)	ORI (29936)	OCC (29937)	VIA (156216)	ORI (29926)	OCC (29927)	VIA (156217)	ORI (29928)	OCC (29929)	VIA (156212)	ORI (29918)	OCC (29919)	VIA(156213)	ORI(29920)	OCC(29921)	VIA(156204)	ORI(29902)	OCC(29903)	VIA(156205)	ORI(29904)	OCC(29905)	VIA(156196)	ORI(29886)	OCC(29887)	VIA(156197)	ORI(29888)	OCC(29889)	VIA(156198)	ORI(29890)	OCC(29891)	VIA(156199)	ORI(29892)	OCC(29893)	VIA(156186)	ORI(29866)	OCC(29867)	VIA(156188)	ORI(29870)	OCC(29871)
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO Y CAJAS DE INSPECCION.	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO Y CAJAS DE INSPECCION.																																													
NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.																																													
REDES HIDRAULICAS	GEOTEXTIL	GEOTEXTIL																																													
GEOTEXTIL, GEOCELDA HDPE PERFORADA, RELLENO CON FRESADO SOBRE GEOCELDA	PRIMERA CAPA DE FRESADO	PRIMERA CAPA DE FRESADO																																													
PRIMERA CAPA FRESADO (RAP) ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 3% Y ADITIVO POTENCIALIZADOR (1.3 KG/M3 - SOLID SOIL).	SEGUNDA CAPA DE FRESADO	SEGUNDA CAPA DE FRESADO																																													
CANAL DE DRENAJE PREFABRICADO EN POLYCONCRETO MONOBLOCK.	CONSTRUCCION CAJAS DE INSPECCION, CAJILLAS DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION CAJAS DE INSPECCION, CAJILLAS DE AGUA POTABLE																																													
SEGUNDA CAPA FRESADO (RAP) ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 3% Y ADITIVO POTENCIALIZADOR (1.3 KG/M3 - SOLID SOIL).	BORDILLO PREFABRICADO A80	BORDILLO PREFABRICADO A80																																													
MEZCLA ASFALTICA	CONCRETO DE 3000PSI Y MR41	CONCRETO DE 3000 PSI Y MR41																																													

TERMINADO	
EJECUCION	
INTERMITENTE	
SIN INICIAR	
NO APLICA	
