BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo De Desarrollo Local de Kennedy

FECHA: 1 de junio de 2023 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** ____ (01)

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de seguimiento No. 34 CIN-717-2022 / COP-621-2022.

HORA DE INICIO: 2:40 pm **HORA DE FINALIZACIÓN:** ____

ASISTENTES:

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Nuy Albarracín Dazo			X							Interventoría	sst1kennedy@outlook.com	3123230615	
Sandra Fernanda Gómez			X							Consorcio SCHV-Interventoría	sandrafgpol.ydlk@gmail.com	3103626480	
D. Milena Medina Guzmán			X						X	XIE SA - Contratista.	xiesocial@gmail.com	3102504420	
Sandra Pinto			X						X	xie.sst6212@gmail.com	XIE. SA	3208932068	
María Camila Pérez Rojas			X						X	xie.ambiental@gmail.com	XIE S.A	3102457234	
Rosalba Xiomara			X						X	Xie.kennedy621@gmail.com	XIE. S.A	3223141853	
Jesús Restrepo			X						X	Jefe Interventoría	02335clv kennedy@outlook.com	3002133006	
Oswaldo Mantilla Chavez			X						X	Interventoría	dir-viales@silcaria.com.co	3103178077	
ARTURO ZARATE M.			X						X	INTERVENTORIA	arturozaratem01@yahoo.com	3152368031	
Danilo Meneses Toro			X						X	FDLK - Infraestructura	Danilo.meneses@gobiernobogota.gov.co	3118988034	
Andrés Mauricio Rojas Ll			X						X	FDLK - Infraestructura	andres.m.llanos@gobiernobogota.gov.co	3057034773	

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política del Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo De Desarrollo Local de Kennedy

FECHA: 1 de junio de 2023 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** ____ (61)

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de seguimiento #34 CM 717-2022 / COP-627-22.

HORA DE INICIO: 2:40 pm **HORA DE FINALIZACIÓN:** ____

ASISTENTES:

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Manuel Alejandro Mazuel Gomez			X						X	XIE S.A.	xie.directorproyecto.621@gmail.com	3212144433	
Alba Yolanda Morales Arias			X							Interventoría - Consorcio	aayma1380@gmail.com	3144404274	
Karen Tyliell Perales Ramirez.			X							Interventoría - Cons SCW	0233scwkennedy@outlook.com	3143253729	
Anyeli Curiel Acosta			X							Interventoría	0233scwkennedy@outlook.com	3227401588	

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	**EVIDENCIA DE REUNIÓN**

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se da inicio al comité de seguimiento No. 34 en las instalaciones de la interventoría las 2:30 pm, con la presencia del apoyo a la supervisión FDLK, contratista de obra Grupo 1 XIE S.A e Interventoría Consorcio SCLV.

Orden del Día

1. Compromisos Pendientes

A la fecha la Interventoría manifiesta que no se dio cumplimiento a los siguientes compromisos:

- **NPs espacio público -Balance de mayores y menores**: el contratista de obra manifiesta que hará la estrega de este el 1-jun-23.
- **Atención observaciones PMT-SDM:** el contratista de obra manifiesta que realizara la atención de observaciones del PMT de las prioridades 1,7,19,34,36 y 39 en el trascurso de la semana.
- **Plan detallado de trabajo ajustado:** el contratista de obra manifiesta que ya tienen lista una programación que remitió de manera informal a la interventoría, pero solicita una mesa de trabajo del mismo para el 5 de junio de 2023. Pendiente confirmar hora.
- **Cronograma de Inspecciones CCTV:** el contratista manifiesta que realizara la radicación del cronograma de inspecciones CCTV el 2 de junio de 2023.

2. Visita a obra

El FDLK e interventoría manifiestan que, en la visita a obra, se logró evidenciar que hay varios frentes de obra que están a muy poco de terminar, pero sin embargo hay prioridades que necesitan la instalación del monoblock, puesto que este es la ruta crítica del avance en el proyecto.

El FDLK además manifiesta que es necesario presentar las prioridades que se entregaran en el mes de junio a la alcaldesa.
El contratista manifiesta que dentro de su programación se realizara la entrega de unas prioridades de la siguiente manera:

- Semana del 13 al 16 de junio de 2023, el contratista entregara las prioridades 24,25,21,22 y 3.
- Semana del 26 al 30 de junio de 2023, el contratista entregara las prioridades 13,14,17,18,28 y 29.

El contratista manifiesta que estas prioridades quedarían pendientes de señalización y demarcación.

Por otra parte, el contratista manifiesta que presentara la propuesta urbanística y presupuestal del cambio de bolardos M60 a M62 el 6 de junio de 2023. Puesto que el bolardo M60 es susceptible a vandalismo.

Componentes

Componente SST
- Informe semanal 34: Aprobado
- Informe Mensual 7: Aprobado
- Calificación: 100%

-Personal:
- Rotación de personal de obra (maestros, oficiales y ayudantes): 62 trabajadores.
- Retirados en el mes de mayo: 11 trabajadores que corresponden al 18%
- Ausentismo de la semana 25 al 31 de mayo 2023 del 5.56%

-Calificación promedio del mes de mayo 98.95%

Componente Ambiental
- Informe semanal 34: Fue radicado por el contratista el 1 de junio.
- Informe Mensual 7: Se realizará mesa de trabajo el 5 de junio de 2023, para revisión de atención de observaciones.
- Calificación: 100%
-Calificación promedio del mes de mayo 98.95%

El contratista manifiesta que, el 31 de mayo de 2023 se realizó a los trabajadores de obra simulacro de evacuación de sismos.

Fresado
De acuerdo con, lo indicado por el contratista de obra grupo 2, el FDLK solicita que, el contratista de obra grupo 1 lleve un seguimiento del desperdicio y los sobre tamaños del material de fresado, puesto que, cuando se instala el monoblock hay que atracar el material de fresado, pero cuando se excava el andén, ese material se retira. Es decir que, al momento de reportar la cantidad de fresado en los informes mensuales, este no va cerrar de acuerdo el material suministrado.

Desde la Interventoría se solicita al Contratista dar un soporte técnico de los desperdicios de material de fresado, para justificar la cantidad a cierre de cada mes. La Interventoría además propone, llevar un registro fotográfico para evidenciar donde se presentan los puntuales. Se deben revisar las cantidades de los meses de enero, febrero, marzo y abril para reportar en el mes de mayo.

El FDLK recomienda tener un soporte y control del material de fresado, realizando el cálculo exacto del desperdicio y reportarlo en el informe mensual, para dejar la trazabilidad mes a mes y justificar las razones por las cuales se genera el desperdicio.

Componente SOCIAL
- Informe semanal 34: Aprobado
- Informe Mensual 8: Observado
- Calificación: 100%

-Calificación promedio del mes de mayo 100%

La Interventoría manifiesta que realizo comité FDLK con la comunidad el 26 de mayo de 2023, tuvo la participación de 18 personas.

Al mes de mayo se contaba con 15 PQRS, 14 cerradas y 1 abierta.

El contratista manifiesta que, se realizó taller a la comunidad con Ciudad Limpia en las prioridades 17 y 18, puesto que la comunidad no está cumpliendo con los horarios de recolección de basuras.

El contratista de obra manifiesta que el día 31 de mayo se realizó taller de conocimiento de pirámide de movilidad en el colegio Cafam Bella Vista.

Tránsito y transporte

La Interventoría indica que a la fecha el contratista cuenta con 8 PMT observados, de los cuales no se han atendido las observaciones.

El contratista de obra indica que hoy 1 de junio de 2023, se remitieron la atención a las observaciones. La interventoría manifiesta al contratista de obra que hoy era fecha de radicación a la SDM, como no es cambio de fase no posee ajustes en los planos y demás, es decir que procederá a la firma del COI de estos PMT, con la salvedad de que no se puede volver a presentar esta situación, los documentos remitidos por el contratista deben ser radicados a la interventoría dentro de las fechas, para así mismo proceder con la revisión completa por parte de la Interventoría.

La interventoría informa al contratista que el 30 de junio de 2023 se vencen los diseños de señalización de las prioridades 6,20 y 23.

El contratista por su parte remitirá el 7 de junio de 2023 a la Interventoría y FDLK una solicitud de reunión con la SDM para la revisión de los diseños de señalización y demarcación próximos a vencer.

Por otra parte, la interventoría informa que a la fecha el contratista no ha realizado la radicación del informe mensual No. 8 correspondiente al periodo del 1 al 31 de mayo de 2023. El contratista manifiesta que radicara el informe el 2 de junio de 2023.

Técnico

-Frentes de obra activos: 6
-Frente de obra inactivos: 3, prioridades 13,21 y 22.
-Informes semanales del mes de mayo: Sin radicar.
-Informe mensual 7 y 8: Sin radicar
-Calificación: 96% (La calificación ha sido afectada por llamados de atención reiterativos al PMT).

En cuanto a los informes semanales y mensuales, el contratista manifiesta que realizara la radicación de estos el 6 de junio de 2023.

La Interventoría indica que, a la fecha el contratista de obra no radicado el Acta No.9 de recibo parcial No.7 correspondiente al mes de abril. El contratista manifiesta que, esta será radicada el 1 de junio de 2023.

**Se adjunta agenda que contiene plano y cuadro de actividades por prioridades*

Programación: A la fecha el contratista de obra continua con los atrasos en obra, como se evidencia en los avances para la semana No. 34 (25 al 31 de mayo de 2023), presentados a continuación:

G1	CORTE AL 31 DE MAYO DE 2023		
	GENERAL	OBRA	FINANCIERO
% PROGRAMADO	44.08%	62.48%	44.08%
% EJECUTADO	25.39%	25.36%	10.73%
% DESVIACIÓN	-18.69%	-37.12%	-33.35%

El contratista manifiesta que los atrasos en obra se siguen presentando, porque la Interventoría está midiendo los avances frente a la programación inicial, y a la fecha el contrato a presentado varios ajustes. Sin embargo, remitió a la dirección de interventoría de manera informal una programación para revisión en mesa de trabajo el 5 de junio de 2023.

La Interventoría indica que no se puede medir al contratista más con la programación presentada con el plan de contingencia, puesto que ya termino, y se ha solicitado en varias ocasiones al contratista realizar un ajuste a las actividades de la programación sin modificar las fechas. La Interventoría queda a la espera de la programación formal de la mesa de trabajo.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	NPs espacio público -Balance de mayores y menores	XIE S.A	1-jun-23
2	Atención observaciones PMT-SDM:	XIE S.A	6-jun-23
3	Programación de mesa de trabajo Plan detallado de trabajo ajustado	XIE S.A	5-jun-23
4	Cronograma de Inspecciones CCTV	XIE S.A	2-jun-23
5	Propuesta urbanística y presupuestal del cambio de bolardos M60 a M62	XIE S.A	6-jun-23
6	Solicitud de reunión con la SDM para la revisión de los diseños de señalización y demarcación próximos a vencer	XIE S.A	6-jun-23
7	Informe mensual No. 8 (mayo) Componente Tránsito y transporte	XIE S.A	2-jun-23
8	Informes semanales y mensuales (abril y mayo) Componente Técnico	XIE S.A	6-jun-23
9	Acta No.9 de recibo parcial No.7 (abril)	XIE S.A	1-jun-23

Elaborada por: Interventoría – Juan Manuel Alba Rojas
Fecha de la próxima reunión: 8 de junio de 2023 Lugar de la próxima reunión: NA

NOTA: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

AGENDA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO

Contratista de Obra XIE S.A – COP -621-22 Grupo 1

COMITÉ DE SEGUIMIENTO No.34

Fecha: 1 de junio 2023

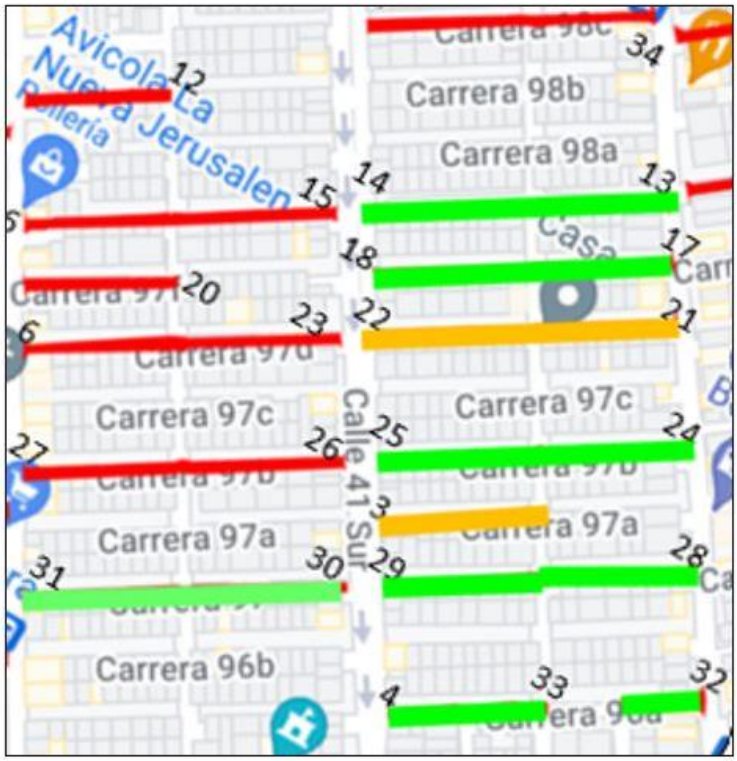
ORDEN DEL DIA

1.Compromisos	
No	**Asunto**
1	Balance Mayores y menores – NPS Esp. Público
2	Atención observaciones PMT SDM
3	Plan detallado de trabajo ajustado
4	Cronograma de inspecciones CCTV
2. Componentes	
A. Técnico	
- **Informe semanal 30al 34:** Sin radicar	
- **Informe Mensual 7:** Sin radicar - **Informe Mensual 8:** Sin radicar	
- **Calificación:** 96%	
B. SST	
- **Informe semanal 34:** Aprobado	
- **Informe Mensual 7:** Aprobado - **Informe Mensual 8:** Sin radicar	
- **Calificación:** 100%	
C. Ambiental	
- **Informe semanal 34 :**Revisión	
- **Informe Mensual 8:** Observado	
- **Calificación:** 100%	
D. Gestión Social	
- **Informe semanal 34:** Aprobado	
- **Informe Mensual 8:**Revisión en mesa de trabajo	
- **Calificación:** 100%	
Varios	
Obra	

Frentes de obra en la semana del 24 al 30 de mayo de 2023

Frentes de obra: 6, disminuyó 2 frentes

CIV: 16



Nomenclatura
Frente de obra Activo
Frente de obra Intermitente
Frente de obra Inactivo
Frente de obra sin inicio

Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la Semana
4	8001069	**Calzada** a nivel de segunda capa de RCD. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** instalación parcial de fresado 2.81m3 del K0+000 al K0+060.
32	8000979	**Calzada**: a nivel de segunda capa de RCD. **Andén oriental:** instalación parcial de fresado 5.75 m3 del K0+000 al K0+060, labores de limpieza. **Andén occidental:** demolición parcial de cajas de inspección 0,51m3 y construcción parcial de cajas de inspección 2 unidades del K0+000 al K0+060, instalación parcial de geotextil 98.56m2 del K0+000 al K0+060, instalación parcial de fresado 15.09 m3 del K0+000 al K0+060, labores de limpieza.

Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la Semana
28	8000929	**Calzada:** corte de estabilizado para instalación de monoblock del K0+030 al K0+052 22M3. **Andén oriental:** Se realiza nivelación y compactación parcial de fresado del K0+000 al K0+060, nivelación parcial de cajillas de medidor del K0+000 al K0+060, instalación de concreto parcial 41MR 35.75m2 del K0+000 al K0+060, instalación de concreto parcial 3000psi 32.14m2 del K0+000 al K0+060. **Andén occidental:** instalación parcial de fresado 3.38 m3 del K0+000 al K0+060.
29	8000996	**Calzada:** a nivel de segunda capa de RCD. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** instalación de concreto parcial 41MR 2.86m2 del K0+000 al K0+060.
24	8000871	**Calzada**: Sin actividad **Andén oriental:** Se realiza instalación parcial de geotextil 8.52 m2 del K0+000 al K0+060, instalación parcial de fresado 2.98 m3 del K0+000 al K0+060, instalación de concreto parcial 3000psi 8.6m2 del K0+000 al K0+060. **Andén occidental:** Se realiza instalación parcial de geotextil 8.22 m2 del K0+000 al K0+060, instalación parcial de fresado 2.88 m3 del K0+000 al K0+060, instalación de concreto parcial 3000psi 8.3m2 del K0+000 al K0+060.
25	8000923	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental**: Sin actividad. **Andén occidental:** Se realiza instalación de concreto parcial 3000psi 8.3m2 del K0+000 al K0+060.
21	8000821	**Calzada:** a nivel base estabilizada primera capa. **Andén oriental:** Se realiza remate de fachadas en la parte inferior del K0+000 al K0+060. **Andén occidental:** Se realiza remate de fachadas en la parte inferior del K0+000 al K0+060.
22	8000864	**Calzada:** a nivel de base estabilizada primera capa. **Andén oriental**: Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.
3	8000957	**Calzada:** a nivel de segunda capa de RCD. **Andén oriental:** Se realiza acabados en cajas de inspección nivelación y marcos. **Andén occidental:** Se realiza acabados en cajas de inspección nivelación y marcos.
13	8000772	**Calzada:** corte de estabilizado para instalación de monoblock 2.6m3 del K0+010 al K0+040. **Andén occidental:** Se realiza instalación parcial de fresado 5.03m3 del K0+000 al K0+060, instalación de bordillo parcial A-80 del K0+000 al K0+060.

Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la Semana
		Andén oriental: Se realiza nivelación y compactación parcial de fresado del K0+000 al K0+060, instalación parcial de fresado 4.07m3 del K0+000 al K0+060.
14	8000814	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** instalación de concreto parcial para rampas de acceso 41MR 4000 psi 22.57 m2 del K0+000 al K0+060, remates parciales en fachadas en parte inferior del K0+000 al K0+060. **Andén occidental:** Se realiza remates parciales en fachadas en parte inferior del K0+000 al K0+060.
17	8000794	**Calzada:** **Andén oriental:** Nivelación y compactación parcial sub-rasante 70.82m2 del K0+000 al K0+060, instalación parcial de fresado 12.44m3 del K0+000 al K0+060, instalación parcial de geotextil 33.51 m2 del K0+000 al K0+060, demolición parcial de concreto manual 4m2 del K0+000 al K0+060, excavación manual en anden 3.51m3 del K0+000 al K0+060. **Andén occidental:** Se realiza demolición parcial de concreto manual 8.26m2 del K0+000 al K0+060, excavación manual en anden 6.55m3 del K0+000 al K0+060.
18	8000839	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Se realiza nivelación y compactación parcial de fresado del K0+000 al K0+060 **Andén occidental:** Se realiza excavación manual en anden 5.81m3 del K0+000 al K0+060.
33	8001041	**Calzada:** corte de estabilizado para instalación de monoblock del K0+007 al K0+021 1.23m3. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Instalación parcial de fresado segunda capa sin terminar del K0+000 al K0+060.
31	8001058	**Calzada:** Sin actividad **Andén oriental:** demolición parcial de cajas de inspección 1.08m3 y construcción parcial de cajas de inspección 4unidades del K0+000 al K0+060, instalación parcial de fresado 17.70m3 del K0+000 al K0+060, instalación parcial de geotextil 90.88 m2 del K0+000 al K0+060. **Andén occidental:** demolición parcial de concreto manual 41.81m2 del K0+000 al K0+060, excavación manual en anden 27.18m3 del K0+000 al K0+060, demolición parcial de cajas de inspección 1.62m3 y construcción parcial de cajas de inspección 6 unidades del K0+000 al K0+060, instalación parcial de fresado 2.94m3 del K0+000 al K0+060, instalación parcial de geotextil 22.72 m2 del K0+000 al K0+060, demolición parcial de cajas de inspección 1.35m3 y construcción parcial de cajas de inspección 2 unidades del K0+000 al K0+060
30	8001125	**Calzada:** Sin actividad

Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la Semana
		Andén oriental: demolición parcial de concreto manual 28.96m2 del K0+000 al K0+060, excavación manual en anden 24.01m3 del K0+000 al K0+060, instalación parcial de geotextil 45.44 m2 del K0+000 al K0+060 **Andén occidental:** demolición parcial de concreto manual 5.26m2 del K0+000 al K0+060, excavación manual en anden 4.83m3 del K0+000 al K0+060, instalación parcial de fresado8.74m3 del K0+000 al K0+060, instalación parcial de geotextil 46.08 m2 del K0+000 al K0+060, demolición parcial de cajas de inspección 0.81m3 y construcción parcial de cajas de inspección 3 unidades del K0+000 al K0+060

SEGUIMIENTO GRUPO 1 AL 30-MAYO-2023

P	INI	FIN	CIV	VALOR CIV	PROG-ACUM	% PROG-ACUM	EJEC-ACUM	% EJEC-ACUM	% PESO EJEC	% ATRASO
28	5-dic	8-feb	8000929	$ 286 285 298	$ 286 285 298	2.36%	$ 183 900 994	1.52%	64.24%	-0.84%
29	12-dic	14-feb	8000996	$ 242 229 957	$ 242 229 957	2.00%	$ 248 889 674	2.05%	102.75%	0.05%
24	4-ene	9-mar	8000871	$ 269 517 473	$ 269 517 473	2.22%	$ 269 540 338	2.22%	100.01%	0.00%
25	10-ene	15-mar	8000923	$ 345 626 780	$ 345 626 780	2.85%	$ 341 937 802	2.82%	98.93%	-0.03%
13	16-ene	21-mar	8000772	$ 289 860 253	$ 289 860 253	2.39%	$ 115 772 718	0.95%	39.94%	-1.44%
14	20-ene	3-abr	8000814	$ 414 590 746	$ 414 590 746	3.42%	$ 291 909 180	2.41%	70.41%	-1.01%
17	26-ene	31-mar	8000794	$ 305 729 990	$ 305 729 990	2.52%	$ 140 649 982	1.16%	46.00%	-1.36%
18	2-feb	15-abr	8000839	$ 414 390 409	$ 414 390 409	3.42%	$ 205 080 483	1.69%	49.49%	-1.73%
21	8-feb	14-abr	8000821	$ 379 185 734	$ 379 185 734	3.13%	$ 277 890 269	2.29%	73.29%	-0.84%
22	14-feb	21-abr	8000864	$ 407 701 220	$ 407 701 220	3.36%	$ 402 437 306	3.32%	98.71%	-0.04%
3	28-mar	7-jun	8000957	$ 324 515 768	$ 283 568 613	2.34%	$ 315 724 369	2.60%	97.29%	0.27%
33	20-feb	8-abr	8001041	$ 148 920 207	$ 148 920 207	1.23%	$ 45 462 511	0.37%	30.53%	-0.85%
4	24-feb	14-abr	8001069	$ 154 073 695	$ 154 073 695	1.27%	$ 43 468 463	0.36%	28.21%	-0.91%
16	2-mar	4-may	8000907	$ 361 864 229	$ 361 864 229	2.98%	$ 0	0.00%	0.00%	-2.98%
15	9-mar	24-may	8000856	$ 314 966 118	$ 314 966 118	2.60%	$ 0	0.00%	0.00%	-2.60%
26	15-mar	26-may	8000988	$ 248 815 938	$ 248 815 938	2.05%	$ 0	0.00%	0.00%	-2.05%
6	6-dic	20-feb	8000977	$ 313 656 772	$ 313 656 772	2.59%	$ 0	0.00%	0.00%	-2.59%
32	15-abr	3-jun	8000979	$ 151 794 191	$ 135 801 589	1.12%	$ 41 886 785	0.35%	27.59%	-0.77%
30	10-abr	17-jun	8001058	$ 307 025 458	$ 214 401 191	1.77%	$ 74 386 934	0.61%	24.23%	-1.15%
20	19-dic	24-feb	8000938	$ 379 247 233	$ 379 247 233	3.13%	$ 0	0.00%	0.00%	-3.13%
31	3-abr	12-jun	8001125	$ 295 012 955	$ 234 379 283	1.93%	$ 76 420 369	0.63%	25.90%	-1.30%
8	27-abr	13-jul	8002417	$ 433 765 202	$ 159 390 015	1.31%	$ 0	0.00%	0.00%	-1.31%
9	4-may	14-jul	8002500	$ 331 158 979	$ 100 037 608	0.82%	$ 0	0.00%	0.00%	-0.82%
27	22-mar	1-jun	8001052	$ 384 495 381	$ 372 253 193	3.07%	$ 0	0.00%	0.00%	-3.07%
12	21-abr	10-jul	8000849	$ 417 435 435	$ 186 165 591	1.53%	$ 0	0.00%	0.00%	-1.53%
23	12-dic	27-feb	8000916	$ 341 149 570	$ 341 149 570	2.81%	$ 0	0.00%	0.00%	-2.81%
5	10-may	8-ago	8000655	$ 454 907 485	$ 76 808 074	0.63%	$ 0	0.00%	0.00%	-0.63%
40	2-may	5-oct	8000687	$ 616 993 900	$ 90 389 606	0.75%	$ 0	0.00%	0.00%	-0.75%

SEGUIMIENTO GRUPO 1 AL 30-MAYO-2023

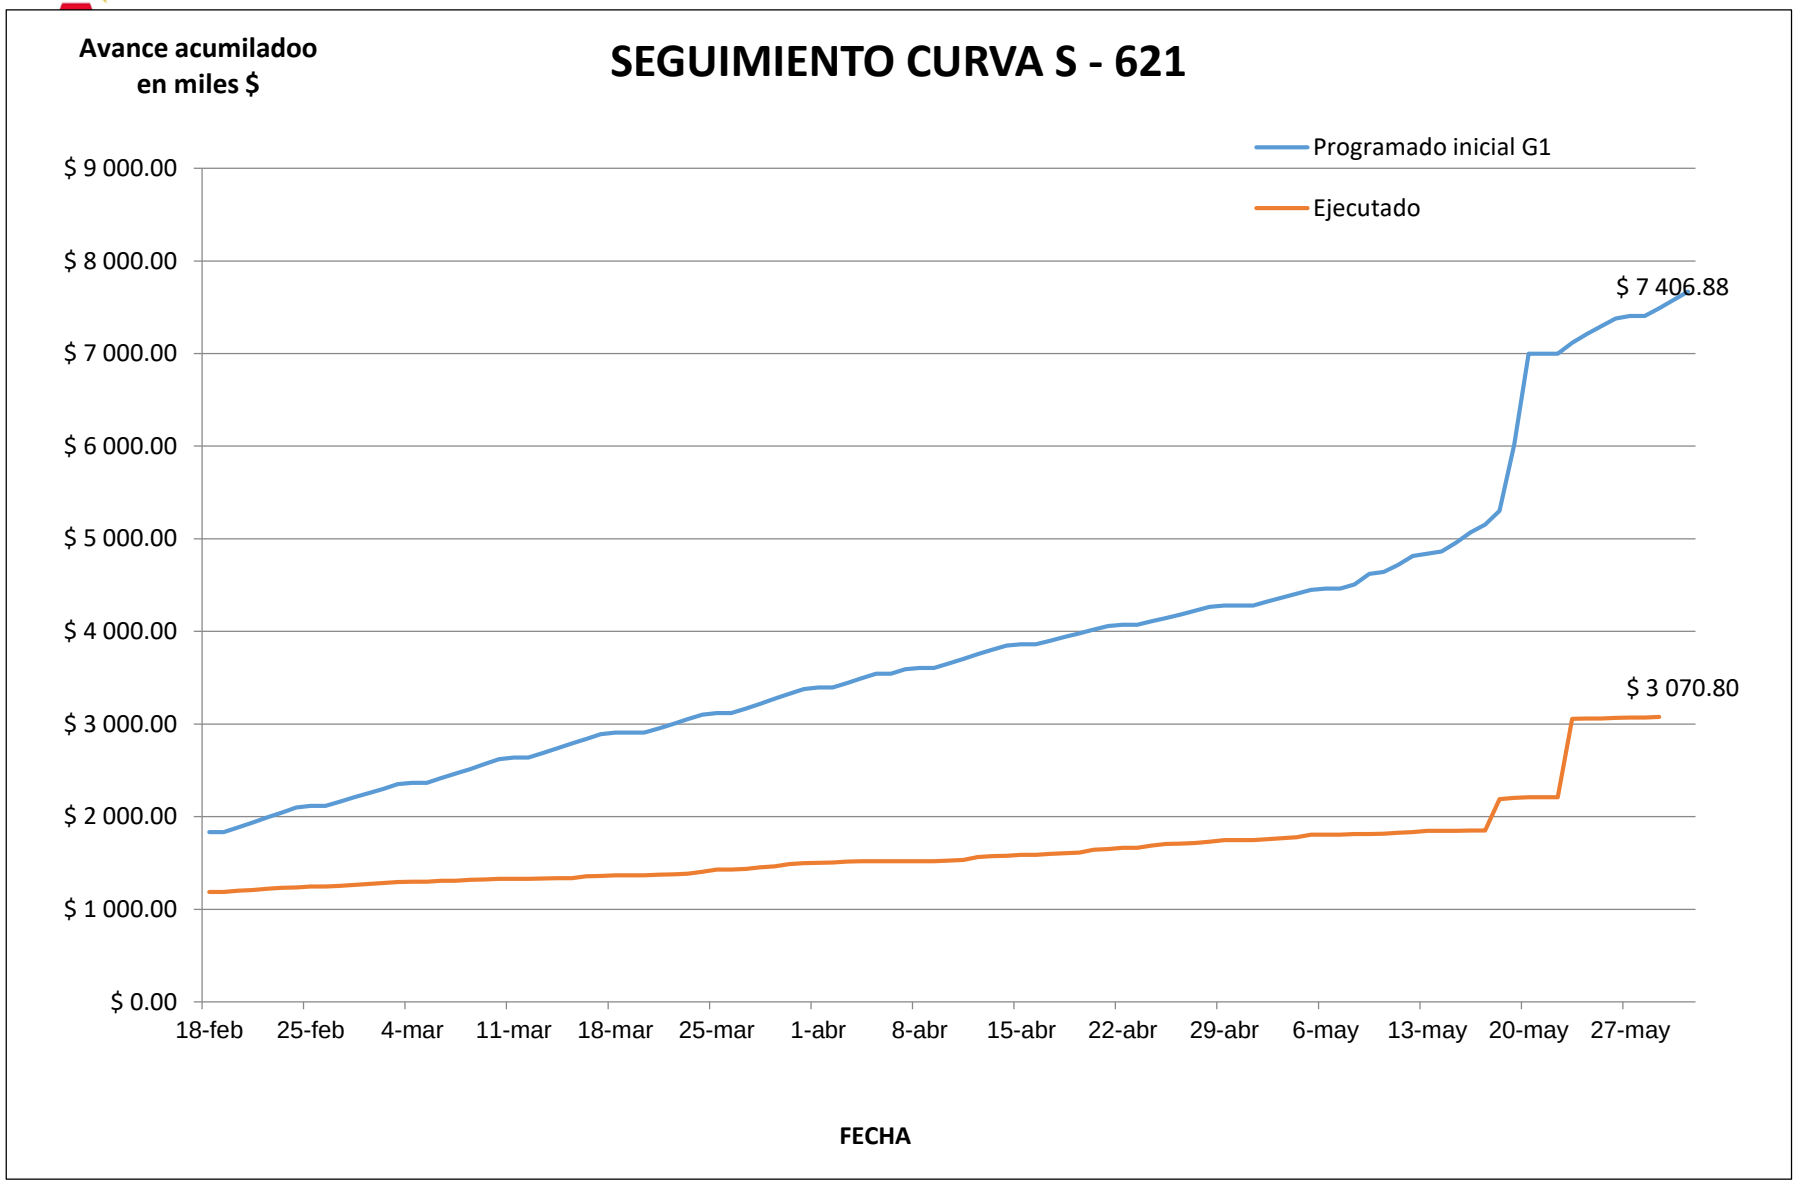
P	INI	FIN	CIV	VALOR CIV	PROG-ACUM	% PROG-ACUM	EJEC-ACUM	% EJEC-ACUM	% PESO EJEC	% ATRASO
10	10-may	5-oct	8000736	$ 668 954 068	$ 64 131 719	0.53%	$ 0	0.00%	0.00%	-0.53%
1	16-may	28-ago	8011953	$ 442 058 340	$ 35 322 700	0.29%	$ 0	0.00%	0.00%	-0.29%
7	23-may	30-ago	8000736	$ 455 102 661	$ 7 859 503	0.06%	$ 0	0.00%	0.00%	-0.06%
TOTALES					$ 7 578 320 308	62.48%	$ 3 075 358177	25.36%		-37.13%
					$ 12 128 504 795					

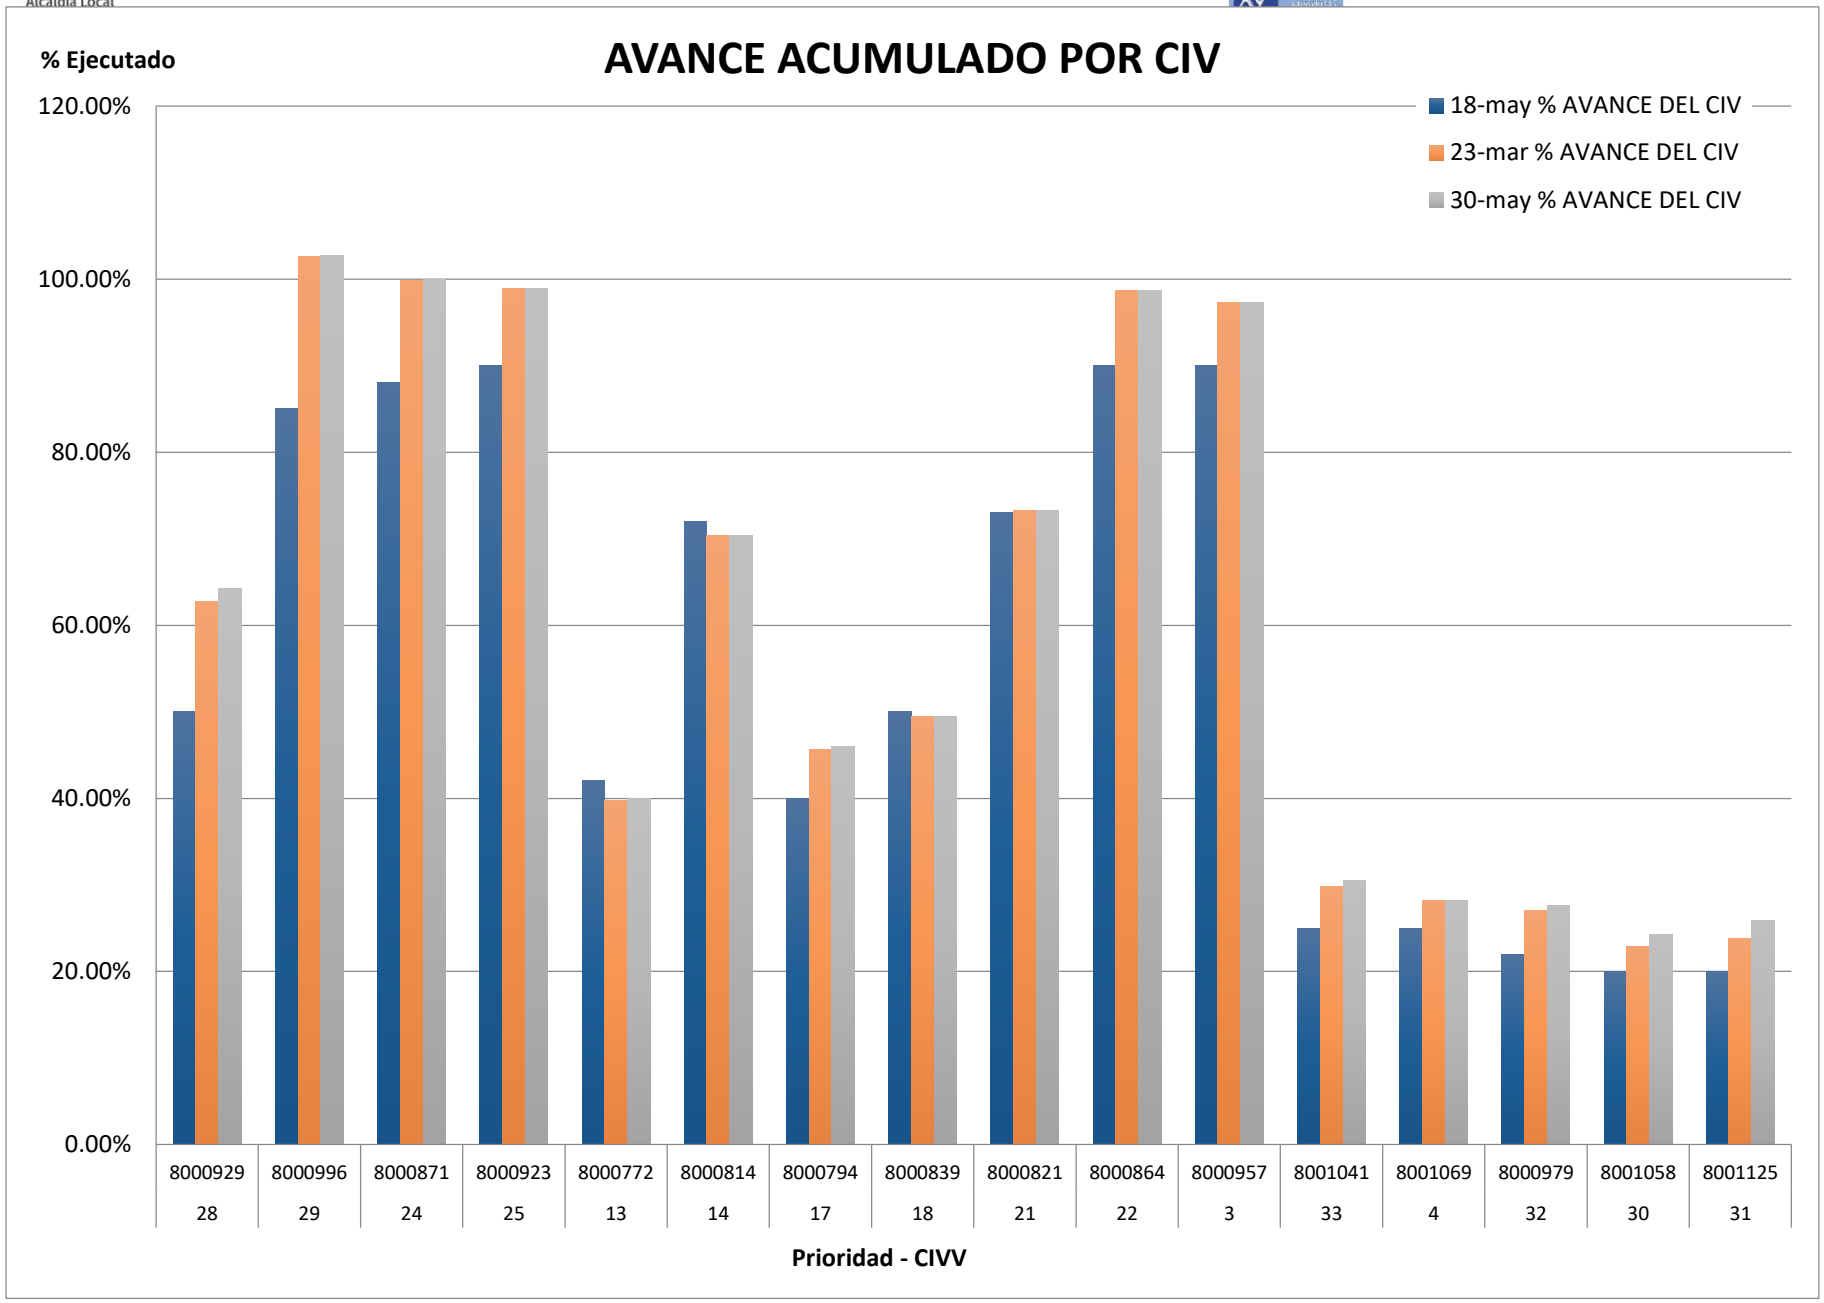
FECHA EVALUACIÓN			18-may	23-mar	30-may
P	CIV	VALOR TOTAL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV
28	8000929	$ 347 200 311.00	50.00%	62.78%	64.24%
29	8000996	$ 292 279 155.00	85.00%	102.56%	102.75%
24	8000871	$ 303 712 088.00	88.00%	99.81%	100.01%
25	8000923	$ 378 908 264.00	90.00%	98.93%	98.93%
13	8000772	$ 274 339 089.00	42.00%	39.75%	39.94%
14	8000814	$ 404 676 565.00	72.00%	70.41%	70.41%
17	8000794	$ 343 212 808.00	40.00%	45.62%	46.00%
18	8000839	$ 395 629 378.00	50.00%	49.44%	49.49%
21	8000821	$ 374 906 711.00	73.00%	73.29%	73.29%
22	8000864	$ 444 284 148.00	90.00%	98.71%	98.71%
3	8000957	$ 350 804 854.00	90.00%	97.29%	97.29%
33	8001041	$ 173 766 372.00	25.00%	29.80%	30.53%
4	8001069	$ 172 153 562.00	25.00%	28.21%	28.21%
32	8000979	$ 181 397 134.00	22.00%	27.03%	27.59%
30	8001058	$ 352 063 180.00	20.00%	22.93%	24.23%
31	8001125	$ 346 894 732.00	20.00%	23.85%	25.90%

FECHA EVALUACIÓN			30-may
P	CIV	VALOR TOTAL CIV	% AVANCE DEL CIV
28	8000929	$ 347 200 311.00	1.46%
29	8000996	$ 292 279 155.00	0.19%
24	8000871	$ 303 712 088.00	0.19%
25	8000923	$ 378 908 264.00	0.00%
13	8000772	$ 274 339 089.00	0.19%

FECHA EVALUACIÓN			30-may
P	CIV	VALOR TOTAL CIV	% AVANCE DEL CIV
14	8000814	$ 404 676 565.00	0.00%
17	8000794	$ 343 212 808.00	0.39%
18	8000839	$ 395 629 378.00	0.05%
21	8000821	$ 374 906 711.00	0.00%
22	8000864	$ 444 284 148.00	0.00%
3	8000957	$ 350 804 854.00	0.00%
33	8001041	$ 173 766 372.00	0.73%
4	8001069	$ 172 153 562.00	0.00%
32	8000979	$ 181 397 134.00	0.57%
30	8001058	$ 352 063 180.00	1.29%
31	8001125	$ 346 894 732.00	2.05%

G1	CORTE AL 30 DE MAYO DE 2023		
	GENERAL	OBRA	FINANCIERO
% PROGRAMADO	44.08%	62.48%	44.08%
% EJECUTADO	25.39%	25.36%	10.73%
% DESVIACIÓN	-18.69%	-37.12%	-33.35%


SEGUIMIENTO CURVA S - 621
Avance acumiladoo en miles $
Programado inicial G1
Ejecutado
$ 9 000.00
$ 8 000.00
$ 7 000.00
$ 6 000.00
$ 5 000.00
$ 4 000.00
$ 3 000.00
$ 2 000.00
$ 1 000.00
$ 0.00
$ 7 406.88
$ 3 070.80
18-feb
25-feb
4-mar
11-mar
18-mar
25-mar
1-abr
8-abr
15-abr
22-abr
29-abr
6-may
13-may
20-may
27-may
FECHA


AVANCE ACUMULADO POR CIV
% Ejecutado
120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
18-may % AVANCE DEL CIV
23-mar % AVANCE DEL CIV
30-may % AVANCE DEL CIV
8000929 28
8000996 29
8000871 24
8000923 25
8000772 13
8000814 14
8000794 17
8000839 18
8000821 21
8000864 22
8000957 3
8001041 33
8001069 4
8000979 32
8001058 30
8001125 31
Prioridad - CIVV

ESTADO SEMANAL DE PROCESO CONSTRUCTIVO

SEMANA 34 (25 AL 31 DE MAYO DE 2023)

CONTRATISTA DE OBRA GRUPO 1-XIE S.A COP 620-22

	PK_ID ANDEN	PK_ID ANDEN	3			4			13			14			17			18			21			22			24			25			28			29			30			31			32			33		
VIA	ORIENTAL	OCCIDENTAL	VIA (156201)	ORI (29896)	OCC (29897)	VIA (156189)	ORI (29872)	OCC (29873)	VIA (156220)	ORI (29934)	OCC (29935)	VIA (156221)	ORI (29936)	OCC (29937)	VIA (156216)	ORI (29926)	OCC (29927)	VIA (156217)	ORI (29928)	OCC (29929)	VIA (156212)	ORI (29918)	OCC (29919)	VIA(156213)	ORI(29920)	OCC(29921)	VIA(156204)	ORI(29902)	OCC(29903)	VIA(156205)	ORI(29904)	OCC(29905)	VIA(156196)	ORI(29886)	OCC(29887)	VIA(156197)	ORI(29888)	OCC(29889)	VIA(156198)	ORI(29890)	OCC(29891)	VIA(156199)	ORI(29892)	OCC(29893)	VIA(156186)	ORI(29866)	OCC(29867)	VIA(156188)	ORI(29870)	OCC(29871)
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO Y CAJAS DE INSPECCION.	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO Y CAJAS DE INSPECCION.																																														
NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.																																													
REDES HIDRAULICAS	GEOTEXTIL	GEOTEXTIL																																														
GEOTEXTIL, GEOCELDA HDPE PERFORADA, RELLENO CON FRESADO SOBRE GEOCELDA	PRIMERA CAPA DE FRESADO	PRIMERA CAPA DE FRESADO																																													
PRIMERA CAPA FRESADO (RAP) ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 3% Y ADITIVO POTENCIALIZADOR (1.3 KG/M3 - SOLID SOIL).	SEGUNDA CAPA DE FRESADO	SEGUNDA CAPA DE FRESADO																																													
CANAL DE DRENAJE PREFABRICADO EN POLYCONCRETO MONOBLOCK.	CONSTRUCCION CAJAS DE INSPECCION, CAJILLAS DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION CAJAS DE INSPECCION, CAJILLAS DE AGUA POTABLE																																													
SEGUNDA CAPA FRESADO (RAP) ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 3% Y ADITIVO POTENCIALIZADOR (1.3 KG/M3 - SOLID SOIL).	BORDILLO PREFABRICADO A80	BORDILLO PREFABRICADO A80																																													
MEZCLA ASFALTICA	CONCRETO DE 3000PSI Y MR41	CONCRETO DE 3000 PSI Y MR41																																													

TERMINADO	
EJECUCION	
INTERMITENTE	
SIN INICIAR	
NO APLICA	
