BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo De Desarrollo Local de Kennedy

FECHA: 8/Junio/2023 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** (01)

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de seguimiento No. 35 CIN-717-2022 | COP-621-2022

HORA DE INICIO: ____ **HORA DE FINALIZACIÓN:** ____

ASISTENTES:

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Andrés Mauricio Rojas Llanos			X						X	FDLK-Infraestructura	andresm.llanos@gobiernobogota.gov.co	3057089723	
Danilo Meneses Toro			X						X	FDLK-Infraestructura	Danilo.Meneses@gobierno bogota.gov.co	3118988034	
Oscar David Vargas.		X							X	XIE.	oscardavid57@hotmail.com	3102220581	
Manuel A. Mora.			X						X	XIE.	Xiedirector621@gmail.com	3212149076	
Lucas Restrepo Largo			X						X	Interventoria	uz335c1vkennedy@outlook.com	3002133006	
Maria Camila Portilla			X						X	XIE. S.A	xie.ambiental@gmail.com	3102457234	
Sandra Pinto Cardenas			X						X	XIE.SA	xie.sst621@gmail.com	3208931058	
Sonia E Lerzundy Gomez			X						X	Interventoria Consorcio SCLV	socialgrupot.fdlk@gmail.com	3103626480	
Angie Milena Medina Guzmán			X						X	contratista XIE	xiesocial@outlook.com	3028044W	
ROSALIDA MONSUA			X						X	XIE SA	xiekennedy621.residente2@gmail.com	3223141553	
Nuy Albarracin Daza			X						X	Interventoria	sst1kennedy@outlook.com	3123230618	

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo De Desarrollo Local de Kennedy

FECHA: 01 Junio /2023 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** (01).

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de seguimiento No. 35 CIN-717-2022 / COP-621-2022.

HORA DE INICIO: _____ **HORA DE FINALIZACIÓN:** _____

ASISTENTES:

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Anyeli M. Ariel Acosta			X							Interventoría	U233scivkennedy@outlook.com	3227401898	
Karen Julieth Penates Ramirez.			X							Interventoría	U233scivkennedy@outlook.com.	314.3253729	
Juan Manuel Alba Rojas			X							Interventoría	U233scivkennedy@outlook.com	3107671842	
ARTURO ZARATE			X							INTERV.	arturozarate1401@yahoo.com	3152366031	
Alba Yolanda Morales A.			X							Interventoría	ayma1380@gmail.com	3114440424	

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se da inicio al comité de seguimiento No. 35 en las instalaciones de la interventoría las 2:30 pm, con la presencia del apoyo a la supervisión FDLK, contratista de obra Grupo 1 XIE S.A e Interventoría Consorcio SCLV.

Orden del Día

1. Compromisos Pendientes

A la fecha la Interventoría manifiesta que no se dio cumplimiento a los siguientes compromisos:

- ***Atención observaciones PMT-SDM:*** La Interventoría manifiesta que a la fecha el contratista de obra no atendido las observaciones de la SDM al PMT de las prioridades 1, 7, 5, 19, 34, 35, 36 y 39. El contratista manifiesta que se realizara la atención de esas observaciones y las radicara a la SDM el 9 de junio de 2023.

- ***Programación de mesa de trabajo Plan detallado de trabajo ajustado:*** A la fecha el contratista no ha presentado el ajuste a la programación de acuerdo a los compromisos pactados. El contratista manifiesta que esta ya había sido radicada y se solicitó mesa de trabajo con la Interventoría.
  La Interventoría indica al contratista que, no se procedió a la realización de la mesa de trabajo de la misma, puesto que el contratista sigue presentando una programación con avance financiero y no físico, y para poder reportar los avances reales de obra se debe presentar esta programación con el avance físico. Se solicita nuevamente al contratista presentar la programación de solo los CIV abiertos para que radiquen de manera inmediata, puesto que su ruta crítica a la fecha es el asfalto y el monoblock. Se solicita incluir el listado por CIV que contenga el monoblock y A80, en cuanto tiempo los van a ejecutar y cuantas cuadrillas van a requerir e informar en que prioridades se va a instalar monoblock. El contratista se compromete a radicar la programación ajustada con lo solicitado el 14 de junio de 2023.
  Recibida esta programación la interventoría informa que se realizará una mesa de trabajo para conciliar las cantidades.

- ***Cronograma de Inspecciones CCTV:*** La Interventoría manifiesta que l contratista no ha realizado la radicación del cronograma de las CCTV, y reitera la solicitud al contratista, puesto que es un documento muy simple pero necesario. El contratista manifiesta que realizara la radicación del cronograma el 14 de junio de 2023.

- ***Propuesta urbanística y presupuestal del cambio de bolardos M63 a M62:*** La Interventoría manifiesta que después de que el contratista propuso realizar el cambio de bolardos M63 a M62, no ha recibido la justificación técnica y presupuestal. La interventoría le propone al contratista que puede realizar el cambio incluso por bolardos M60 (BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI, PREMEZCLADO), para que estos no sean susceptibles a hurtos en la zona. El contratista se compromete a realizar la radicación de la propuesta el 14 de junio de 2023.

****Nota: se realiza la corrección del compromiso, puesto que el contratista manifestó cambio de bolardo M60 a M62 y lo estipulado en la propuesta es***

4083	4012			BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI PREMEZCLADO)	UN	2.715,00	$ 182.912,00	$ 496.606.080,00

- ***Solicitud de reunión con la SDM para la revisión de los diseños de señalización y demarcación próximos a vencer:*** El contratista manifiesta que realizo la solicitud e reunión con la SDM y está a la espera de una respuesta positiva por parte de la entidad. La Interventoría y FDLK solicita se copien estas solicitudes para saber en qué estado se encuentran.

- ***Informe mensual No. 8 (mayo) Componente Tránsito y transporte:*** La Interventoría manifiesta que, el contratista no ha realizado la radicación del informe mensual No.8 de tránsito y transporte correspondiente al mes de mayo y este debió ser radicado los 5 primero días del mes de acuerdo a los compromisos pactados. Como consecuencia la interventoría manifiesta que se puede ver afectada la calificación. El contratista de obra se compromete a realizar la radicación del informe el 9 de junio de 2023.

- ***Informes semanales y mensuales (abril y mayo) Componente Técnico:*** La Interventoría manifiesta que los informes semanales de abril están observados y los del mes de mayo están sin radicar. En cuanto a informes mensuales el contratista no ha realizado la radicación del informe 7 (abril) y 8 (mayo). El contratista manifiesta que se dará cumplimiento al compromiso el 9 de junio de 2023.

Componentes

Componente SST
- Informe semanal 35: Aprobado
- Informe Mensual 8: En revisión de Interventoría
- Calificación: 100%

-Personal:
En términos generales se evidencia que el personal de obra ha tenido muy poca actividad. Además, se solicita que, el día que se programen actividades de asfalto remitir los documentos del personal un día antes con planillas y documentación al día.

Componente Ambiental
- Informe semanal 35: Observado
- Informe Mensual 8: Observado
- Calificación: 100%

Componente SOCIAL
- Informe semanal 35: Aprobado
- Informe Mensual 8: Observado
- Calificación: 100%

-Calificación promedio del mes de mayo 100%

Tránsito y transporte
La Interventoría indica que:

-A la fecha se cuenta con 23 CIV con permiso vigente, 5 de estos CIV son para etapa 3.

-La Interventoría informa al contratista que es importante que tenga en cuenta que el PMT que se califica es vigente, si no se realiza el cambio, afectara la calificación. Esto para evitar inconvenientes con la SDM.

- Dentro de 15 días se vence el PMT de 6 CIVs y el 29 de junio de 2023 vencen 2 CIVs.

-El contratista no ha remitido los documentos del PMT que se radico a la SDM el 1 de junio de 2023, solo remitió el radicado.

-La Interventoría además indica que en los planos que se radican se debe tener en cuenta que para la etapa tres no se puede instalar rollizos, es decir que el contratista debe realizar el cierre con colombinas y cinta, entre otras soluciones, pero plasmarlas en el plano.

Técnico
-Frentes de obra activos: 5-10 CIV
-Frente de obra inactivos: 6
-Calificación: 96% (La calificación ha sido afectada por llamados de atención reiterativos al PMT).

**Se adjunta agenda que contiene plano y cuadro de actividades por prioridades*

Cuentas:
La Interventoría y el FDLK solicita al contratista radicar la cuenta del mes de abril (el paquete completo). El contratista indica que radicara la cuenta completa el día 13 de junio de 2023 y la interventoría radicara al FDLK el 15 de junio de 2023.

Programación: A la fecha el contratista de obra continua con los atrasos en obra, como se evidencia en los avances para la semana No. 35 (1 al 7 de junio de 2023), presentados a continuación:

G1	CORTE AL 6 DE JUNIO DE 2023		
	GENERAL	OBRA	FINANCIERO
% PROGRAMADO	46.47%	66.05%	46.47%
% EJECUTADO	25.73%	25.72%	10.73%
% DESVIACIÓN	-20.74%	-40.33%	-35.74%

Varios
-El FDLK y la interventoría recuerdan al contratista de obra que se citó a audiencia virtual con la alcaldesa el 9 de junio de 2023 a las 8 am. El contratista manifiesta que solicito por medio de un oficio aplazar dicha audiencia puesto que debe prepararse jurídicamente. La Interventoría manifiesta al contratista que este documento no fue copiado al correo oficial. Se solicita se copie para estar enterados.

-La Interventoría informa a todos los presentes que se realizara el comité integral No. 9 de seguimiento No. 36 el 15 de junio de 2023, en el cual deben acudir de manera presencial los residentes y especialistas, sin excepciones.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Atención observaciones PMT-SDM:	XIE S.A	9-jun-23
2	Plan detallado de trabajo ajustado de las prioridades abiertas a la fecha (Se solicita incluir el listado por CIV que contenga el monoblock y A80, en cuanto tiempo los van a ejecutar, cuantas cuadrillas van a requerir e informar en que prioridades se va a instalar monoblock)	XIE S.A	14-jun-23
3	Cronograma de Inspecciones CCTV	XIE S.A	14-jun-23
4	Propuesta urbanística y presupuestal del cambio de bolardos M60 a M62	XIE S.A	14-jun-23
5	Solicitud de Reunión con la SDM – Vigencia de señalización	XIE S.A	Pendiente de confirmación
6	Informe mensual No. 8 (mayo) Componente Tránsito y transporte	XIE S.A	9-jun-23
7	Informes semanales y mensuales (abril y mayo) Componente Técnico	XIE S.A	9-jun-23
8	Radicación de cuenta del mes de abril	XIE S.A	13-jun-23
9	Radicación de cuenta del mes de abril G1al FDLK	SCLV	15-jun-23

Elaborada por: Interventoría – Juan Manuel Alba Rojas
Fecha de la próxima reunión: 15 de junio de 2023 Lugar de la próxima reunión: NA

AGENDA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO

Contratista de Obra XIE S.A – COP -621-22 Grupo 1

COMITÉ DE SEGUIMIENTO No.35

Fecha: 8 de junio 2023


ORDEN DEL DIA

1.Compromisos				
No	**Asunto**	**Responsable**	**Fecha de compromiso**	**Cumplió SI/NO**
1	NPs espacio público -Balance de mayores y menores	Contratista	1-jun-23	SI
2	Atención observaciones PMT-SDM:	Contratista	6-jun-23	NO
3	Programación de mesa de trabajo Plan detallado de trabajo ajustado	Contratista	5-jun-23	NO
4	Cronograma de Inspecciones CCTV	Contratista	2-jun-23	NO
5	Propuesta urbanística y presupuestal del cambio de bolardos M60 a M62	Contratista	6-jun-23	NO
6	Solicitud de Reunión con la SDM – Vigencia de señalización	Contratista	6-jun-23	NO
7	Informe mensual No. 8 (mayo) Componente Tránsito y transporte	Contratista	2-jun-23	NO
8	Informes semanales y mensuales (abril y mayo) Componente Técnico	Contratista	6-jun-23	NO
9	Acta No.9 de recibo parcial No.7 (abril)	Contratista	1-jun-23	SI
2. Componentes				
A. Técnico				
- **Informes semanales abril:** Observados - **Informes semanales mayo:** Sin radicar				
- **Informe Mensual 7:** Sin radicar - **Informe Mensual 8:** Sin radicar				

- **Calificación:** 96%
B. SST
- **Informe semanal 35:** Aprobado
- **Informe Mensual 8:** En revisión
- **Calificación:** 100%
C. Ambiental
- **Informe semanal 35 :**Observado
- **Informe Mensual 8:** Observado
- **Calificación:** 100%
D. Gestión Social
- **Informe semanal 35:** Aprobado
- **Informe Mensual 8:**Observado
- **Calificación:** 100%
Varios
Obra

Frentes de obra en la semana del 31 de mayo al 6 de junio de 2023:

Frentes de obra: 5, disminuyó 1 frente.

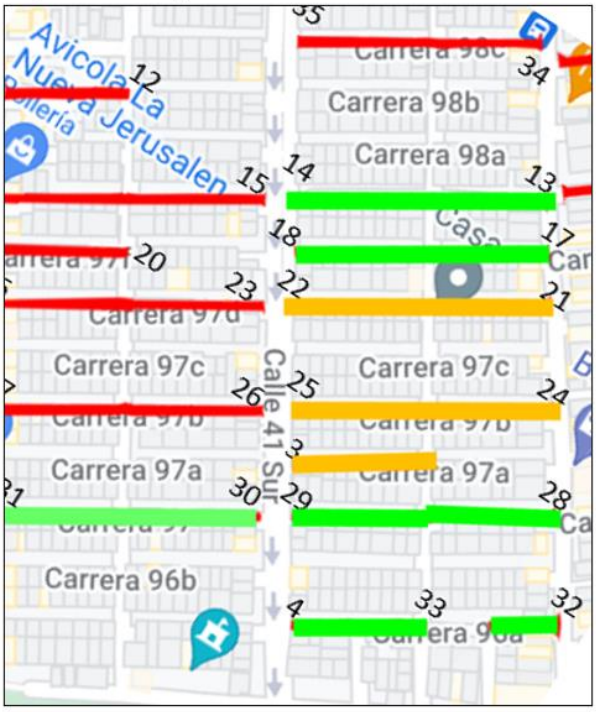

Nomenclatura	
	Frente de obra Activo
	Frente de obra Intermitente
	Frente de obra Inactivo
	Frente de obra sin inicio

ESTADO SEMANAL DE PROCESO CONSTRUCTIVO

CONTRATISTA DE OBRA GRUPO 1 - XIE S.A COP 621-22

	PK_ID ANDEN	PK_ID ANDEN	3			4		13			14			17			18			21			22			24			25			28			29			30			31			32			33		
VIA	**ORIENTAL**	**OCCIDENTAL**	VIA (156201)	ORI (29896)	OCC (29897)	VIA (156189)	ORI (29872)	OCC (29873)	VIA (156220)	ORI (29934)	OCC (29935)	VIA (156221)	ORI (29936)	OCC (29937)	VIA (156216)	ORI (29926)	OCC (29927)	VIA (156217)	ORI (29928)	OCC (29929)	VIA (156212)	ORI (29918)	OCC (29919)	VIA(156213)	ORI(29920)	OCC(29921)	VIA(156204)	ORI(29902)	OCC(29903)	VIA(156205)	ORI(29904)	OCC(29905)	VIA(156196)	ORI(29886)	OCC(29887)	VIA(156197)	ORI(29888)	OCC(29889)	VIA(156198)	ORI(29890)	OCC(29891)	VIA(156199)	ORI(29892)	OCC(29893)	VIA(156186)	ORI(29866)	OCC(29867)	VIA(156188)	ORI(29870)	OCC(29871)
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO Y CAJAS DE INSPECCION.	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO Y CAJAS DE INSPECCION.																																													
NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.																																													
REDES HIDRAULICAS	GEOTEXTIL	GEOTEXTIL																																													
GEOTEXTIL, GEOCELDA HDPE PERFORADA, RELLENO CON FRESADO SOBRE GEOCELDA	PRIMERA CAPA DE FRESADO	PRIMERA CAPA DE FRESADO																																													
PRIMERA CAPA FRESADO (RAP) ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 3% Y ADITIVO POTENCIALIZADOR (1.3 KG/M3 - SOLID SOIL).	SEGUNDA CAPA DE FRESADO	SEGUNDA CAPA DE FRESADO																																													
CANAL DE DRENAJE PREFABRICADO EN POLYCONCRETO MONOBLOCK.	CONSTRUCCION CAJAS DE INSPECCION, CAJILLAS DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION CAJAS DE INSPECCION, CAJILLAS DE AGUA POTABLE																																													
SEGUNDA CAPA FRESADO (RAP) ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 3% Y ADITIVO POTENCIALIZADOR (1.3 KG/M3 - SOLID SOIL).	BORDILLO PREFABRICADO A80	BORDILLO PREFABRICADO A80																																													
MEZCLA ASFALTICA	CONCRETO DE 3000PSI Y MR41	CONCRETO DE 3000 PSI Y MR41																																													

TERMINADO	
EJECUCION	
INTERMITENTE	
SIN INICIAR	
NO APLICA	

Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la Semana
4	8001069	**Calzada** a nivel de segunda capa de RCD. **Andén oriental:** Se realiza instalación parcial de fresado 3.44m3 del K0+000 al K0+060, instalación de bordillo parcial A-80 8.20ml del K0+000 al K0+060, instalación de concreto parcial 3000psi asentamiento 5in, 11.08 m2 del K0+000 al K0+060. **Andén occidental:** Se realiza instalación de concreto parcial 3000psi 14.6m2 del K0+000 al K0+060, instalación parcial de fresado 1.46m3 del K0+000 al K0+060, labores de limpieza.
32	8000979	**Calzada**: Demolición parcial de estabilizado para instalación de monoblock 12ml del K0+000 al K0+060, instalación de geotextil 21.2m2 del K0+000 al K0+005.30, instalación parcial de fresado estabilizado 6.14 del K0+000 al K0+060. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.
28	8000929	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Se realiza instalación parcial de cajillas de medidor del 5und del K0+000 al K0+060, instalación parcial de concreto 3000psi para acceso peatonal asentamiento 4in, 22.3m2 del K0+000 al K0+060, instalación parcial de concreto 4000psi para acceso vehicular asentamiento 4in, 35.42m2 del K0+000 al K0+060. **Andén occidental:** instalación parcial de fresado 6.6m3 del K0+000 al K0+060, instalación parcial de concreto 3000psi asentamiento 4in, 22.7m2 del K0+000 al K0+060.
29	8000996	**Calzada:** Se realiza excavación manual para instalación de bordillo A-80 en la intersección costado occidente 1m3 y costado oriente 0.83m3 **Andén oriental:** instalación parcial de concreto 3000psi asentamiento 4in, 5.07m2 del K0+000 al K0+060. **Andén occidental:** instalación parcial de concreto 4000psi para acceso vehicular, 0.35m2 del K0+000 al K0+060.
24	8000871	**Calzada**: Sin actividad. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** instalación parcial de concreto 3000psi asentamiento 4in, 10.13m2 del K0+000 al K0+060.
25	8000923	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental**: Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.
21	8000821	**Calzada:** Sin actividad.

Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la Semana
		Andén oriental: Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.
22	8000864	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental**: Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.
3	8000957	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Instalación parcial de concreto de 4000psi 0.46m3 del K0+000 al K0+060.
13	8000772	**Calzada:** Instalación de geotextil en la intersección predio 40-45 sur y 40ª-03sur, 40ª-04sur - 40ª-46sur, 44.14m2 **Andén occidental:** instalación parcial de fresado segunda capa 4.11m3 del K0+000 al K0+060, instalación parcial de concreto 3000psi asentamiento 4in, 53.18m2 del K0+000 al K0+060. **Andén oriental:** instalación parcial de concreto 4000psi para acceso vehicular, 12.2m2 del K0+000 al K0+060, instalación de bordillo A-80 3.25ml del K0+000 al K0+060.
14	8000814	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.
17	8000794	**Calzada:** Se realiza instalación de fresado estabilizado 5.67m3 del K0+000 al K0+010. **Andén oriental:** instalación parcial de fresado segunda capa 15.34m3 del K0+000 al K0+060. **Andén occidental:** instalación parcial de fresado segunda capa 14.45m3 del K0+000 al K0+060.
18	8000839	**Calzada:** **Andén oriental:** instalación parcial de concreto 4000psi para acceso vehicular, asentamiento 4.5in, 5.73m2 del K0+000 al K0+060, nivelación parcial de anden 10.46m2 del K0+000 al K0+060, instalación parcial de fresado 3.66m3 del K0+000 al K0+060 **Andén occidental:** instalación parcial de concreto 4000psi para acceso vehicular, asentamiento 4.5in, 19.8m2 del K0+000 al K0+060, instalación parcial de concreto 3000psi asentamiento 5in, 36.1m2 del K0+000 al K0+060, nivelación parcial de anden 10.28m2 del K0+000 al K0+060, instalación parcial de fresado 3.60m3 del K0+000 al K0+060
33	8001041	**Calzada:** Sin actividad

Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la Semana
		Andén oriental: Se realiza instalación de bordillo A-80 9.67ml del K0+000 al K0+060, instalación parcial de fresado segunda capa 6.67m3 del K0+000 al K0+060. **Andén occidental:** Se realiza instalación de bordillo A-80 9.67ml del K0+000 al K0+060.
30	8001125	**Calzada:** instalación de concreto solado como base en sumideros 0.17m3. **Andén oriental:** demolición parcial de concreto en ande 5.46m2, excavación manual en anden 9.5m3, nivelación de piso 11.36m2, instalación de fresado 15.97m3 del K0+000 al K0+060, demolición corte de fresado para instalación de bordillo A-80 del 1.55m3 K0+045 al K0+062.75 **Andén occidental:** demolición parcial de concreto en ande 15.9m2, instalación de fresado 28.5m3 del K0+000 al K0+060, nivelación de piso 10.06m2, demolición corte de fresado para instalación de bordillo A-80 del 1.55m3 K0+045 al K0+062.75
31	8001058	**Calzada:** Se realiza excavación manual para instalación de sumideros costado oriental 1.82m3 – costado occidente 1.64m3, instalación de concreto solado como base en sumideros 0.18m3. **Andén oriental:** demolición parcial de concreto en ande 5.93m2, excavación manual en anden 5.49m3, nivelación y compactación 13m2, instalación parcial de fresado 16.05m3 del K0+000 al K0+060 **Andén occidental:** Se realiza demolición parcial de concreto en ande 5.51m2, excavación manual en anden 4.64m3.

SEGUIMIENTO GRUPO 1 AL 6-JUNIO-2023

P	CIV	VALOR CIV	PROG-ACUM	% PROG-ACUM	EJEC-ACUM	% EJEC-ACUM	% PESO EJEC	% ATRASO
28	8000929	$ 286 285 298	$ 286 285 312	2.36%	$ 191 779 300	1.58%	66.99%	-0.78%
29	8000996	$ 242 229 957	$ 242 229 965	2.00%	$ 249 692 560	2.06%	103.08%	0.06%
24	8000871	$ 269 517 473	$ 269 517 476	2.22%	$ 270 990 387	2.23%	100.55%	0.01%
25	8000923	$ 345 626 780	$ 345 626 788	2.85%	$ 341 937 802	2.82%	98.93%	-0.03%
13	8000772	$ 289 860 253	$ 289 860 280	2.39%	$ 128 320 590	1.06%	44.27%	-1.33%
14	8000814	$ 414 590 746	$ 414 590 812	3.42%	$ 291 909 180	2.41%	70.41%	-1.01%
17	8000794	$ 305 729 990	$ 305 730 007	2.52%	$ 145 024 609	1.20%	47.44%	-1.33%
18	8000839	$ 414 390 409	$ 414 390 477	3.42%	$ 209 882 001	1.73%	50.65%	-1.69%
21	8000821	$ 379 185 734	$ 379 185 766	3.13%	$ 277 890 269	2.29%	73.29%	-0.84%
22	8000864	$ 407 701 220	$ 407 701 176	3.36%	$ 402 437 306	3.32%	98.71%	-0.04%

SEGUIMIENTO GRUPO 1 AL 6-JUNIO-2023

P	CIV	VALOR CIV	PROG-ACUM	% PROG-ACUM	EJEC-ACUM	% EJEC-ACUM	% PESO EJEC	% ATRASO
3	8000957	$ 324 515 768	$ 314 948 686	2.60%	$ 315 724 369	2.60%	97.29%	0.01%
33	8001041	$ 148 920 207	$ 148 920 197	1.23%	$ 45 462 511	0.37%	30.53%	-0.85%
4	8001069	$ 154 073 695	$ 154 073 672	1.27%	$ 49 872 025	0.41%	32.37%	-0.86%
16	8000907	$ 361 864 229	$ 361 864 274	2.98%	$ 0	0.00%	0.00%	-2.98%
15	8000856	$ 314 966 118	$ 314 966 118	2.60%	$ 0	0.00%	0.00%	-2.60%
26	8000988	$ 248 815 938	$ 248 815 964	2.05%	$ 0	0.00%	0.00%	-2.05%
6	8000977	$ 313 656 772	$ 313 656 791	2.59%	$ 0	0.00%	0.00%	-2.59%
32	8000979	$ 151 794 191	$ 151 794 156	1.25%	$ 45 180 468	0.37%	29.76%	-0.88%
30	8001058	$ 307 025 458	$ 244 660 905	2.02%	$ 75 821 749	0.63%	24.70%	-1.39%
20	8000938	$ 379 247 233	$ 379 247 247	3.13%	$ 0	0.00%	0.00%	-3.13%
31	8001125	$ 295 012 955	$ 263 455 089	2.17%	$ 77 593 404	0.64%	26.30%	-1.53%
8	8002417	$ 433 765 202	$ 197 718 410	1.63%	$ 0	0.00%	0.00%	-1.63%
9	8002500	$ 331 158 979	$ 131 467 073	1.08%	$ 0	0.00%	0.00%	-1.08%
27	8001052	$ 384 495 381	$ 390 495 370	3.22%	$ 0	0.00%	0.00%	-3.22%
12	8000849	$ 417 435 435	$ 231 425 899	1.91%	$ 0	0.00%	0.00%	-1.91%
23	8000916	$ 341 149 570	$ 340 149 553	2.80%	$ 0	0.00%	0.00%	-2.80%
5	8000655	$ 454 907 485	$ 119 605 073	0.99%	$ 0	0.00%	0.00%	-0.99%
40	8000687	$ 616 993 900	$ 122 686 392	1.01%	$ 0	0.00%	0.00%	-1.01%
10	8000736	$ 668 954 068	$ 93 185 843	0.77%	$ 0	0.00%	0.00%	-0.77%
1	8011953	$ 442 058 340	$ 74 000 523	0.61%	$ 0	0.00%	0.00%	-0.61%
7	8000736	$ 455 102 661	$ 58 548 975	0.48%	$ 0	0.00%	0.00%	-0.48%
Total			**$ 8 010 804 271**	**66.05%**	**$ 3 119 518 530**	**25.72%**		-40.33%
Total obra			**$ 12 128 504 795**					


FECHA EVALUACIÓN			18-may	23-mar	30-may	6-jun
P	CIV	VALOR TOTAL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV
28	8000929	$ 347 200 311.00	50.00%	62.78%	64.24%	65.55%
29	8000996	$ 292 279 155.00	85.00%	102.56%	102.75%	102.78%
24	8000871	$ 303 712 088.00	88.00%	99.81%	100.01%	100.01%
25	8000923	$ 378 908 264.00	90.00%	98.93%	98.93%	98.93%
13	8000772	$ 274 339 089.00	42.00%	39.75%	39.94%	45.30%
14	8000814	$ 404 676 565.00	72.00%	70.41%	70.41%	72.41%
17	8000794	$ 343 212 808.00	40.00%	45.62%	46.00%	48.09%
18	8000839	$ 395 629 378.00	50.00%	49.44%	49.49%	50.75%
21	8000821	$ 374 906 711.00	73.00%	73.29%	73.29%	73.29%
22	8000864	$ 444 284 148.00	90.00%	98.71%	98.71%	98.71%
3	8000957	$ 350 804 854.00	90.00%	97.29%	97.29%	97.29%
33	8001041	$ 173 766 372.00	25.00%	29.80%	30.53%	30.53%
4	8001069	$ 172 153 562.00	25.00%	28.21%	28.21%	30.81%
32	8000979	$ 181 397 134.00	22.00%	27.03%	27.59%	29.76%


FECHA EVALUACIÓN			18-may	23-mar	30-may	6-jun
P	CIV	VALOR TOTAL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV
30	8001058	$ 352 063 180.00	20.00%	22.93%	24.23%	24.70%
31	8001125	$ 346 894 732.00	20.00%	23.85%	25.90%	26.30%

FECHA EVALUACIÓN			30-may
P	CIV	VALOR TOTAL CIV	% AVANCE DEL CIV
28	8000929	$ 347 200 311.00	1.46%
29	8000996	$ 292 279 155.00	0.19%
24	8000871	$ 303 712 088.00	0.19%
25	8000923	$ 378 908 264.00	0.00%
13	8000772	$ 274 339 089.00	0.19%
14	8000814	$ 404 676 565.00	0.00%
17	8000794	$ 343 212 808.00	0.39%
18	8000839	$ 395 629 378.00	0.05%
21	8000821	$ 374 906 711.00	0.00%
22	8000864	$ 444 284 148.00	0.00%
3	8000957	$ 350 804 854.00	0.00%
33	8001041	$ 173 766 372.00	0.73%
4	8001069	$ 172 153 562.00	0.00%
32	8000979	$ 181 397 134.00	0.57%
30	8001058	$ 352 063 180.00	1.29%
31	8001125	$ 346 894 732.00	2.05%

G1	CORTE AL 6 DE JUNIO DE 2023		
	GENERAL	OBRA	FINANCIERO
% PROGRAMADO	46.47%	66.05%	46.47%
% EJECUTADO	25.73%	25.72%	10.73%
% DESVIACIÓN	-20.74%	-40.33%	-35.74%

SEGUIMIENTO CURVA S - 621

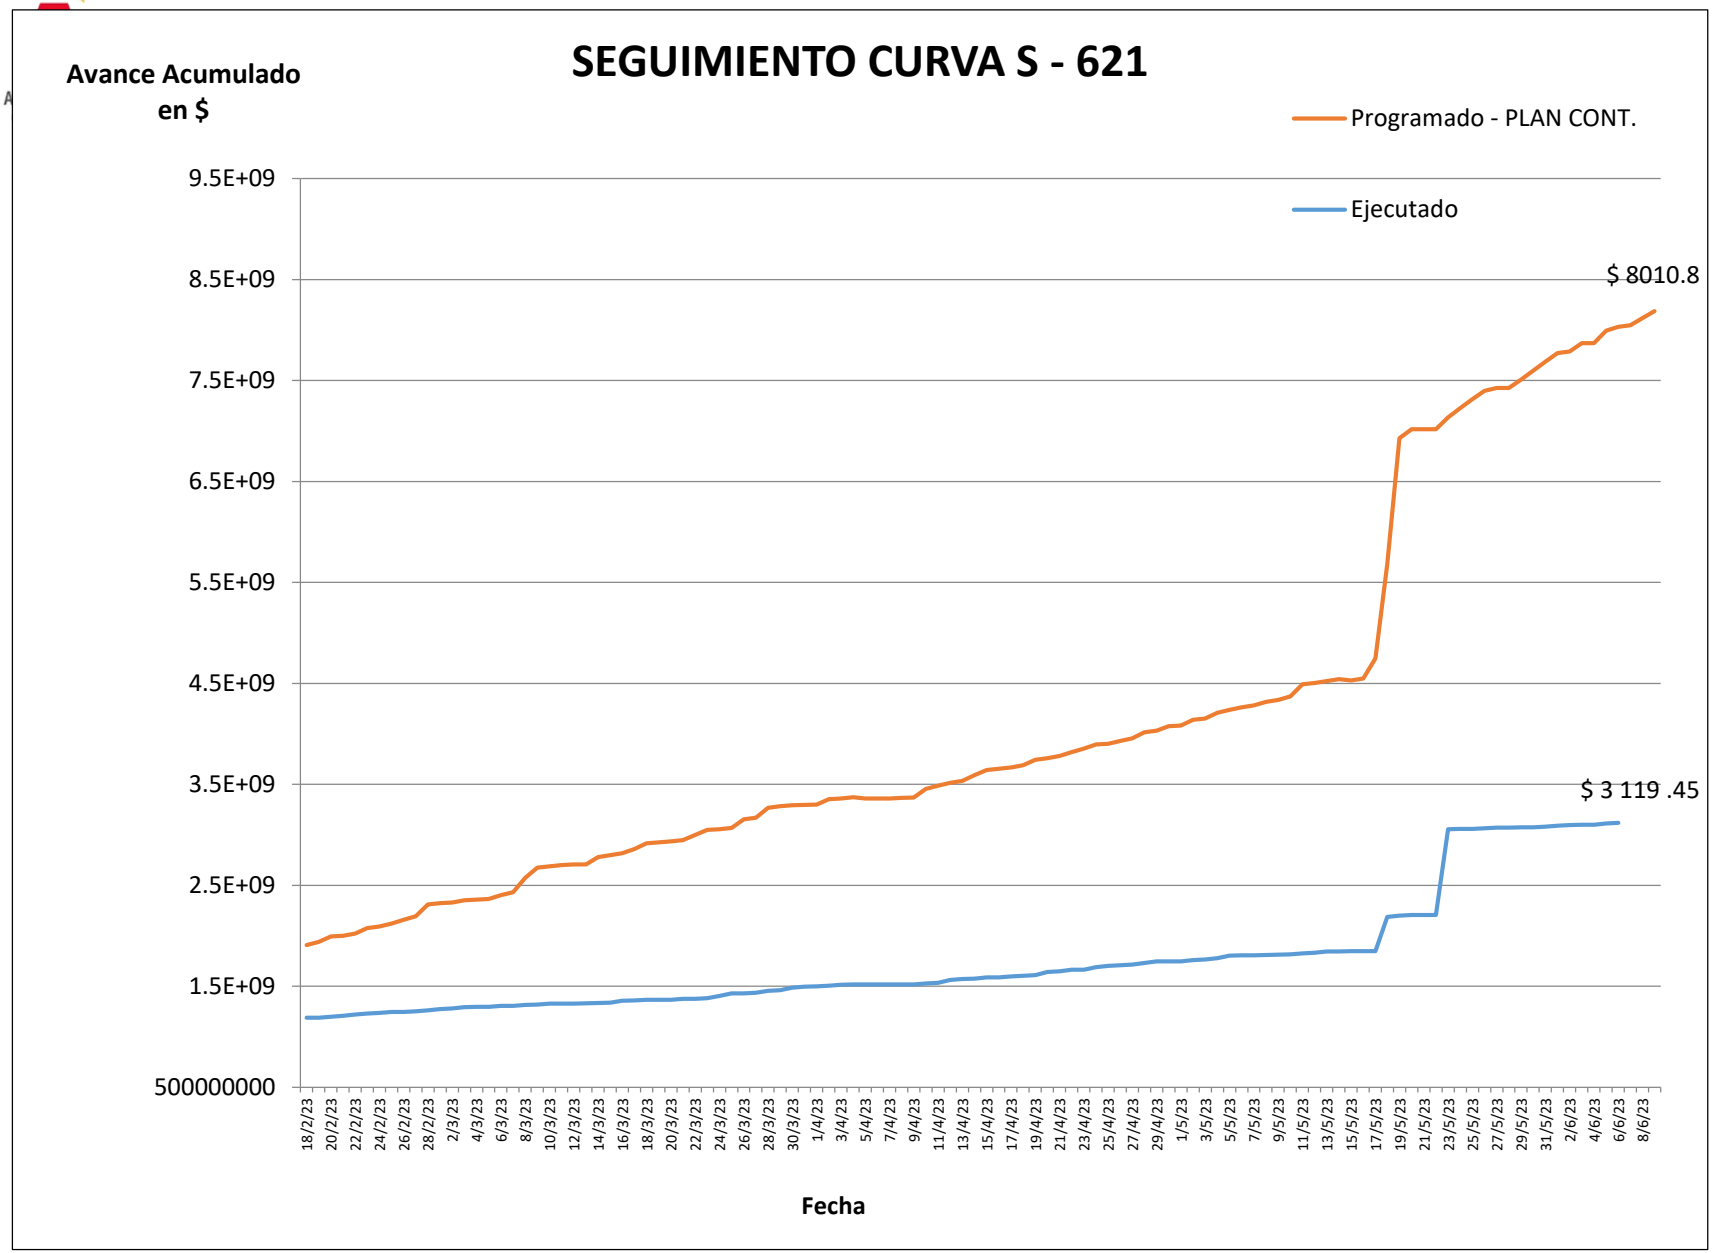

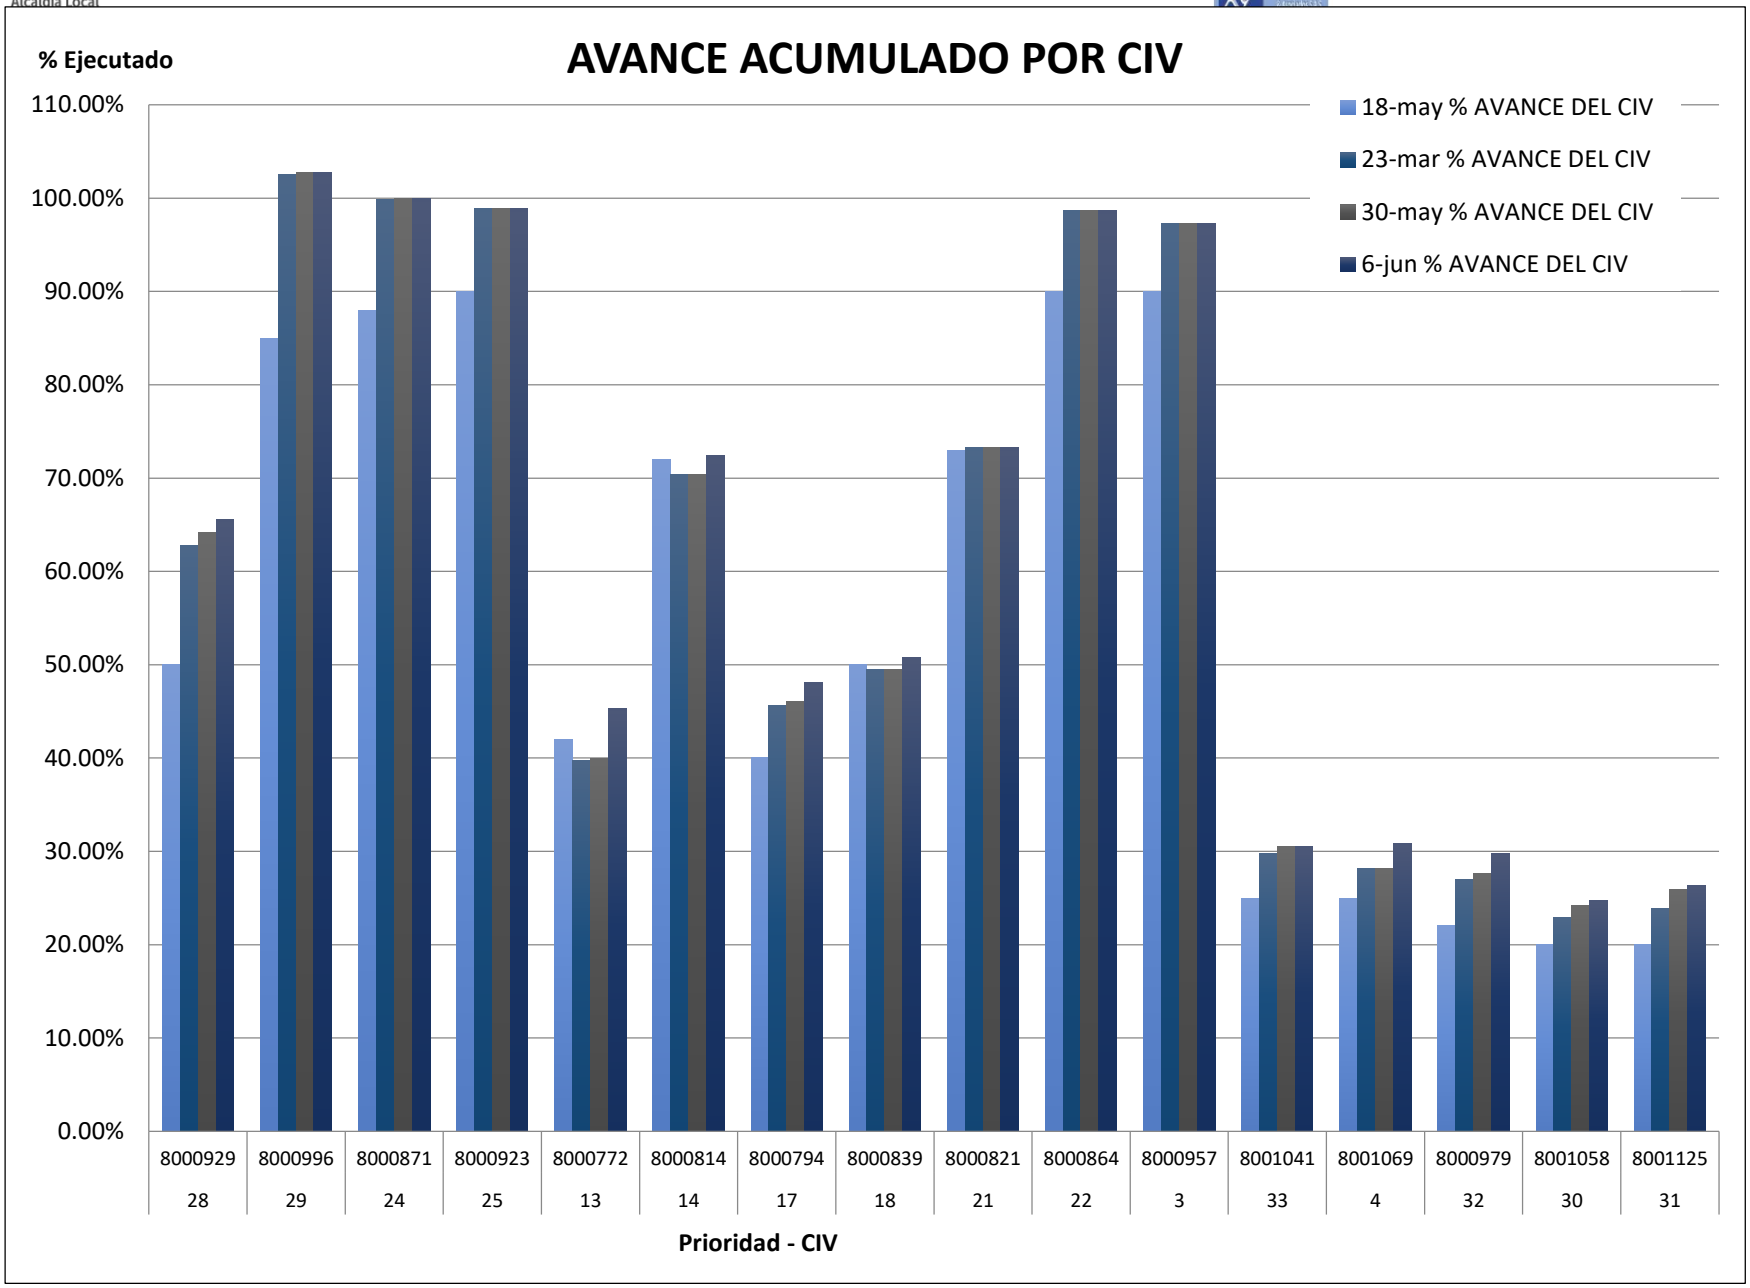
AVANCE ACUMULADO POR CIV
% Ejecutado
110.00%
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
18-may % AVANCE DEL CIV
23-mar % AVANCE DEL CIV
30-may % AVANCE DEL CIV
6-jun % AVANCE DEL CIV
8000929 28
8000996 29
8000871 24
8000923 25
8000772 13
8000814 14
8000794 17
8000839 18
8000821 21
8000864 22
8000957 3
8001041 33
8001069 4
8000979 32
8001058 30
8001125 31
Prioridad - CIV
