BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

**DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:** Fondo De Desarrollo Local de Kennedy

**FECHA:** 15 / Junio / 23 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** 01

**OBJETO DE LA REUNIÓN:** Comité Integral No. 9 de Seguimiento No. 36

**HORA DE INICIO:** 2:51 pm **HORA DE FINALIZACIÓN:** ____

**ASISTENTES:**

| NOMBRE | CARGO | | | | | TIPO DE VINCULACIÓN | | | | ENTIDAD o DEPENDENCIA | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ASESOR | DIRECTIVO | PROFESIONAL | TÉCNICO/ TECNÓLOGO | AUXILIAR | CARRERA | PROVISIONAL | LIBRE NOMB. | CONTRATISTA | | | | |
| Andrés Mauricio Rojas Llanos | | | X | | | | | | X | FDLK - Infraestructura | andres.m.llanos@gobiernobogota.gov.co | 3057039773 | |
| Danilo Meneses Toro | | | X | | | | | | X | FDLK - Infraestructura | Danilo.meneses@gobiernobogota.gov.co | 3118980354 | |
| Juan Manuel Alba R | | | X | | | | | | X | Interventoría | gerencia@lavidal.co | 3013178 | |
| Oswaldo Ladino Chavel | | | X | | | | | | X | Interventoría | dir-viales@silcarsa.com.co | 3103178077 | |
| Daniel Alberto Alcántara Rodríguez | | | X | | | | | | X | Xie. | daar1986@gmail.com | 3105678644 | |
| Carlos Benavides M. | | | X | | | | | | | Interventoría SCLV | maquinariasclv@outlook.com | 3132110586 | |
| Alexander García Bautista | | | X | | | | | | | XIE S.A. | gabalex@gmail.com | 3212414884 | |
| Daniel J. Mejía M. | | | X | | | | | | X | XIE. SA. | ing.djmm@gmail.com | 3204961207 | |
| Sebastian Salazar Sánchez | | | X | | | | | | | XIE. SA. | ingeniera3@ojrestructurals.com | 3217510735 | |
| Manuel Mejía García | | | X | | | | | | | XIE SA | xie.director.proyecto.621@gmail.com | 3212144452 | |
| Oscar Vargas | | X | | | | | | | | XIE SA | oscardavid53@hotmail.com | 3102239581 | |

**NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.**

**CONSENTIMIENTO:** El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

**DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:** Fondo De Desarrollo Local de Kennedy

**FECHA:** 15 Junio 123 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** 01

**OBJETO DE LA REUNIÓN:** Comité Integral No. 9 de seguimiento No. 36

**HORA DE INICIO:** ____ **HORA DE FINALIZACIÓN:** ____

**ASISTENTES:**

| NOMBRE | CARGO | | | | | TIPO DE VINCULACIÓN | | | | ENTIDAD o DEPENDENCIA | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ASESOR | DIRECTIVO | PROFESIONAL | TÉCNICO/ TECNÓLOGO | AUXILIAR | CARRERA | PROVISIONAL | LIBRE NOMB. | CONTRATISTA | | | | |
| Teresa Restrepo Lago | | | X | | | | | | | Interventoría | U233SCLV[illegible]@outlook.com | 3002133006 | |
| Milen Agamez C | | | X | | | | | | X | XIE. S.A.S. | milen.agamez@outlook.com | 3183960948 | |
| Maria Cumi. Perez Peer | | | X | | | | | | X | XIE. S.A.S. | xie.ambiental@gmail.com | 3102457734 | |
| José de calasanz Hoyos | | | X | | | | | | | Interventoria | [illegible] | 3204993917 | |
| Sonia Lerzundy bómer | | | X | | | | | | | Consorcio SCLV | socialgrupo1.fdlk@gmail.com | 3103624180 | |
| Ana Leonor Torres T. | | | ✓ | | | | | | | Interventoria Social | socialgrupo1.fdlk@gmail | 3212071469 | |
| D. MILENA MEDINA GUZMAN | | | - | | | | | | ✓ | CONTRATISTA – XIE SA | XIESOCIAL@OUTLOOK.COM | 3102504420 | |
| ROSA LIDA MONGUA | | | X | | | | | | ✓ | CONTRATISTA XIE SA. | xie.kennedy621residente2@gmail.com | 3223141883 | |
| ARTURO ZARATE M. | | | X | | | | | | X | INTERVENTORIA | arturozarate[illegible]@yahoo.com | 3152368[illegible] | |
| Alba Yolanda Morales Arias | | | X | | | | | | | Interventoría - Cons SCLV | oyma1380@gmail.com | 3114440429 | |
| Nury Albarracin Daza | | | X | | | | | | | Interventoria-Cons SCLV | sstkennedy@outlook.com | 3123230648 | |

**NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.**

**CONSENTIMIENTO:** El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

**DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:**

Se da inicio al comité de seguimiento No. 36 integral No.9 en las instalaciones de la interventoría las 4:30 pm, con la presencia del apoyo a la supervisión FDLK, contratista de obra Grupo 1 XIE S.A e Interventoría Consorcio SCLV.

***Orden del Día***

***1. Compromisos Pendientes***

A la fecha la Interventoría manifiesta que no se dio cumplimiento a los siguientes compromisos:

- Plan detallado de trabajo ajustado de las prioridades intervenidas a la fecha (Se solicita incluir el listado por CIV que contenga el monoblock y A80, en cuanto tiempo los van a ejecutar, cuantas cuadrillas van a requerir e informar en que prioridades se va a instalar monoblock)
- Cronograma de Inspecciones CCTV
- Propuesta urbanística y presupuestal del cambio de bolardos M60 a M62. El contratista hace la corrección y manifiesta que la propuesta de cambio de bolardo es de M63 por M61.
- Informe mensual No. 8 (mayo) Componente Tránsito y transporte
- Radicación de la cuenta de abril

***2. Componentes y especialidades:***

***Componente Forestal***

El contratista manifiesta que ha oficiado en dos ocasiones se ha realizado la solicitud de visita para la revisión de la tala del árbol de especie urapán. ubicado en el CIV 8000655 prioridad 5.
SDM manifiesta al contratista que el proceso y solicitud continua y no se ha recibido respuesta por el volumen de trabajo que presentan.

El FDLK indica que, enviara a la trazabilidad que se tienen de los requerimientos directamente a un profesional de la SDM para adelantar la gestión. Además, indica que, el día viernes 16 de junio de 2023 se tiene programada una reunión con Secretaria Distrital de Gobierno en donde se tocara este tema, para darle celeridad a la gestión. El contratista manifiesta que remitirá los 54 oficios y los soportes a la supervisión del FDLK.

***Componente maquinaria y equipo***

La Interventoría manifiesta que han sido observados los pre operaciones de maquinaria y equipo del mes de mayo de 2023, el contratista manifiesta que ha ido atendiendo las observaciones.

***Redes secas***

La Interventoría manifiesta que el contratista debe realizar un inventario de las redes secas existentes en el contrato, este debe realizarse antes de ejecutar los civ y sobre los planos que fueron estregados por la ESP de redes secas.

La Interventoría manifiesta que se programara recorrido en obra para el día martes 20 de junio 2023 con los especialistas de redes secas a las 9:30 am, el especialista de interventoría presentara al contratista un formato guía para el contratista. El contratista deberá llevar los planos de las redes eléctricas.

***Redes Húmedas***

El contratista de obra manifiesta que el especialista de redes húmedas no pudo presentarse, el contratista manifiesta que hará el cambio de este especialista puesto que no ha realizado acompañamiento de acuerdo a su dedicación.

La Interventoría informa que, el contratista remitió un oficio con la justificación con la cual se establece la decisión de no aplicar el cambio de colector existente de 28" CONCRETO por colector proyectado de 30" PVC en la prioridad 12, justificación la cual no tienen ninguna objeción por parte de la Interventoría.
En cuanto al sumidero tampoco se tienen objeciones, pero el especialista de interventoría manifiesta que de acuerdo a la reunión realizada el 9 de junio de 2023 con el delegado de la EAAB se tienen dos precisiones para tener e en cuenta:

- Al monoblock PD100V (pequeño) implementar la conexión de al sumidero a través de un sistema de bajantes de 4" y para el monoblock PD200V de 6".
- Como el sumidero prefabricado tiene una ventana, esa ventana debe sellarse.

La Interventoría manifiesta que a la fecha el contratista no ha remitido los costos de este ajuste, el contratista manifiesta que con el oficio OFICIO_KNXIE22-621-733 radicado el 14 de junio de 2023, remitió el análisis de costos.

La Interventoría indica que a la fecha el contratista no cumplió con el compromiso de radicación de cronograma de inspecciones CCTV, el contratista manifiesta que este compromiso no se cumplió, pero que el día 15 de junio de 2023 mediante el oficio OFICIO_KNXIE22-621-735, en el cual remitió tres documentos:

- Un Excel con las cantidades CIV por CIV
- Recuento por capítulo de actividades con inicio y fin.
- Presupuesto CIV por CIV.

***Diseño Geométrico***

La Interventoría que el contratista realizo la radicación de las cantidades y actualizaciones de acuerdo a los diseños de pavimentos y espacio público de solo 19 CIV. El contratista manifiesta que realizara la actualización con la documentación completa para el radicar el 20 de junio de 2023 el paquete completo.
La interventoría indica que solo se recibirá si la información llega completa de los 43 CIV, de lo contrario se devolverá.

***Estructural***

El contratista hace la presentación del especialista de estructuras, el cual presento el diseño de vigas para los sumideros, se realizó la prueba de carga y arrojo resultados exitosos, pero no fue acogido puesto que presentaba problemas para realizar los mantenimientos con el vactor.

***Componente Ambiental***
***- Informe semanal 36:*** Aprobado
***- Informe Mensual 8 (mayo):*** Aprobado
***- Calificación:*** 98%
** La calificación fue afectada por errores de digitación de cantidades.*

El contratista solicita a la Interventoría que se haga el corte del informe sea el 30 o 31 de cada mes, puesto que quedan varias actividades por fuera y afecta la calidad y afectaría contractualmente al contratista. La Interventoría indica que no se puede realizar un cambio, puesto que en comités pasados se pactó que se remitiera el informe los 25 de cada mes sin oficio para revisión en mesa de trabajo y se proyectaras las actividades de los 5 o 6 días faltantes.

El FDLK solicita al contratista radicar sin oficio los 25 de cada mes el informe para que no se generen nuevas versiones y en mesa de trabajo se subsanen las observaciones y se radique el 30 de cada mes.
Por otra parte, la Interventoría manifiesta no se recibida respuesta por parte del FDLK-PIGA con respecto a la resolución 1257 de 2021. El FDLK solicita a la Interventoría remitir un oficio al FDLK con la trazabilidad de dicha solicitud, la interventoría radicara el oficio el 16 de junio de 2023. El FDLK indica que con el número de radicado ejercerá presión al PIGA para que emita respuesta.

***Componente SST***
***- Informe semanal 36:*** Aprobado
***- Informe Mensual 8(mayo):*** Esta observado por tres anexos que corresponden a soportes de pago, soportes de retiro de personal del mes. El contratista manifiesta que está realizado la gestión de las liquidaciones y soportes para atender las observaciones.
***- Calificación:*** 98%

***Personal***
***Ingreso :***5 personal que corresponde a 2 ayudantes, 1 boal y 2 auxiliares de tráfico.
***Retiros:*** 2 (correspondiente al 4% de mano de maestros, ayudantes y oficiales)
***Ausentismo:*** 7.08% (correspondientes a permisos y permisos no remunerados)

En cuanto a obra la Interventoría manifiesta que se les han emitido recomendaciones al contratista en cuanto a la señalización de los plafones y cajas de inspección, puesto que en las visitas se evidencia que esta esta corrida. Además, la interventoría manifiesta que el contratista debe realizar la revisión diaria de los senderos peatonales en las nuevas prioridades abiertas, puesto que se evidencian elementos que puede ser una condición insegura para el personal. El contratista ya atendió las observaciones.

No se presentaron accidentes durante la semana.

El contratista manifiesta que el proveedor ya realizo la entrega de 100 tapas y han sido hurtadas. Las que quedan se han entregado a los propietarios y por eso se deja el plafón a la vista.

La Interventoría indica que lo mismo puede suceder con las tapas de los canales de inspección de los monoblocks, el contratista manifiesta que a la fecha no se cuenta con un aval de las tapas. El proveedor ACO remitió tapas metálicas y no prefabricadas como se había solicitado. La Interventoría solicita al contratista realizar un oficio donde informe la publicidad engañosa de ACO a la Interventoría y al FDLK. La Interventoría precisa que con ese antecedente solicitara vetar al proveedor por incumplir.

***Componente Tránsito y transporte***
El contratista manifiesta que a la fecha cuenta con:

- ***Ciclo 1:*** 11 PMT Aprobados, 6 en etapa 2 y 5 en etapa 3.
- ***Ciclo 2:*** 12 PMT Aprobados, 8 en etapa 1 y 4 en etapa 2
- ***Ciclo 3:*** 20 PMT aprobados, 7 proyectados para etapa 1 y los restantes están terminando los diseños para radicar.
- ***Total:*** 30 CIV

El contratista manifiesta que se programó mesa de trabajo para la próxima semana con la SDM, para revisión de los estados de los diseños de señalización y revisión de los próximos a vencer. Pendiente por confirmar fecha de reunión por parte de SDM.

La Interventoría manifiesta que, respecto a lo informado por el especialista del contratista, se cuenta con unas diferencias al corte de la semana 35:

- Se cuenta con un total de 31 CIV con el PMT aprobado vigente.
- 15 CIV en etapa 1
- 11 CIV en etapa 2.
- 5 CIV en etapa 3

El contratista no cuenta con permisos y solicitud de PMT pendientes, y tiene 12 CIV pendientes por tramite de PMT. De los 12 CIV, 3 CIV tienen diseños de señalización por vencer al 30 de junio de 2023.

La Interventoría además indica que, las prioridades 13,14,17,18 28 y 29, vencen el 23 de junio, es decir que se pueden quedar con una semana sin PMT. El contratista manifiesta que son estas prioridades las que pasaran a fase 3, la Interventoría manifiesta que el día de hoy ya no se puede radicar, la interventoría manifiesta que ha tratado de colaborar al contratista y hace dos semanas solicito remitieran los soportes del PMT de las prioridades 3,21,22, 24 y 25, y no fueron remitidos. El contratista manifiesta que solo remitió el radicado, es decir que no podrá ayudarlos por incumplir.

La Interventoría por otra parte manifiesta que, el contratista de obra no ha realizado la radicación del informe mensual No.8 correspondiente al periodo del 1 al 31 de mayo de 2023, puesto que ya es 15 de junio de 2023 y

no ha radicado, es decir que se afectara la calificación por la no entrega. El contratista manifestó que realizaría la radicación el viernes 9 de junio de 2023, es decir que la calificación con estos ítems afectados no alcanzará a la calificación del 80%, es decir que puede ser causal de multa.

El contratista manifiesta que realizo la radicación de este informe con la comunicación OFICIO_KNXIE22-621-704 el día miércoles 14 de junio de 2023. La interventoría manifiesta que en los términos del apéndice F el contratista debe presentar en los primeros 10 días del mes el informe, y este fue radicado el 15 de junio de 2023 al correo oficial de la Interventoría. El FDLK solicita que el contratista sea un poco más responsable con los compromisos adquiridos puesto que puede verse afectada la calificación.

La Interventoría manifiesta que los favores y colaboraciones al contratista de mesas de trabajo, radiaciones en tiempos más cortos o radicaciones y revisiones en el mismo día, se terminaron, puesto que en varios componentes el contratista ha abusado de la confianza y no cumple con lo solicitado por parte de la Interventoría.

El contratista manifiesta que hubo un retraso en la presentación de los documentos por parte de la dirección, puesto que el especialista presento la documentación a tiempo, pero se realizó una revisión exhaustiva para no presentar observaciones, y esta llevo dos semanas.

La Interventoría manifiesta que, en los recorridos realizados por el componente de gestión social, la señalización en los senderos peatonales estaba mal implementada. Además, agrega que la etapa 3 inicia cuando el contratista inicia con la instalar asfalto, hay 5 CIV que están con la aprobación de etapa 3 por SDM. Puede que el PMT para estos CIV en etapa tres esté aprobado, pero no está implementado correctamente, se deben revisar los planos del diseño de señalización. Se programará visita a campo por parte del especialista de tránsito y transporte de Interventoría el día martes 20 de junio de 2023.

***Componente Gestión social***
***- Informe semanal 36:*** Aprobado
***- Informe Mensual 8(mayo):*** Observado. Se realizó la revisión y el día de hoy sale la aprobación.
***- Calificación:*** 96%.

La calificación fue afectada por desinformación a la comunidad, puesto que los volantes de los puntos satélites de información informaban que el espacio público iba a durar tres meses y esa etapa culmino el 7 de junio de 2023 y en otros el 14 de junio de 2023, y no se dio la terminación. El componente de gestión social del contratista solicita claridad sobre cómo va a regir en cuanto a las fechas de entregas a la comunidad, puesto que esto afectado la calificación.

La Interventoría informa al contratista que las fecha que se pactan van respecto a la fecha estipuladas por el componente técnico de acuerdo a la programación de la entrega de cada uno de los CIV, la responsabilidad del componente de gestión social es hasta cuando solicita la fecha. De no cumplir con las fechas en cronograma de inicio y fin de cada CIV, se desinformará a la comunidad por no cumplir con las fechas contractuales, el PMT solo da valides de apertura y vigencia de cierres de la vías y espacio público.

La Interventoría manifiesta que no se están cumpliendo las contractuales se han emitido varias fechas a la comunidad en los volantes y esto hace que se presenten problemas con la comunidad. Se deberá calificar con cero (0) el ítem de desinformación a la comunidad en los volantes.

El contratista por otra parte, manifiesta que tiene programado el comité FDLK No.6 para el 23 de junio a las 9 am en el salón comunal los almendros.
El día 9 de junio se realizó el taller de prevención de riesgo en las prioridades 8 y 9 con respecto a los senderos peatonales, señalización, puntos satélites de información con asistencia de 34 personas.

El contratista informa que, con respecto a los medidores previo a la intervención, dentro del proceso constructivo de especio público lo que se realiza es demoler el andén, retirando medidor y el polo a tierra de la vivienda que queda expuesto y se le entrega al propietario de cada vivienda. Se tienen soporte de cada una de estas entregas por parte del componente social, pero hay casos puntuales donde los propietarios no abren y el componente técnico y de gestión social debe encargarse del medidor y guardarlo e instalarlo cuando se termine el procedimiento constructivo y se abrió una PQRSD No.17 abierta porque el medidor esta sin una parte, se informó a el área técnica y se concertó que se va a pagar la parte faltante.

El contratista informa que todos los medidores no tienen el mismo tipo de estado en terreno, unos presentan muchos deterioros puesto que llevan más de 10 años instalado, además de que se pegan por todas partes con cemento para que no se los roben, al quitarlos pues puede que se fracturen partes. La Interventoría indica que debe haber un protocolo con las ESP, pero el contratista indica que las ESP indica que son los responsables, sin embargo, se realizara la revisión de los parámetros de reposición de estos medidores.

La Interventoría solicita que no se responsabilice de este tema al componente de gestión social, el contratista debe responsabilizarse de estos temas técnicamente para no generar conflictos con la comunidad.

Por otra parte, el contratista manifiesta que, con respecto a las bajantes el componente social todos los días se realiza recorrido para la verificación entregando volantes por cada predio y se realizaron actas de compromiso, pero en la prioridad 25 no se ha podido llegar a un acuerdo puesto que no quieren firmar ninguna acta de compromiso. El FDLK solicita se remitan todas las evidencias para hacer un traslado policivo, en caso de que se agoten todas las instancias para poder llegar a un acuerdo con los propietarios.

La Interventoría le recuerda al contratista que se deben hacer actas de compromiso con los propietarios por el daño en el espacio público (informar de este tema en el comité FDLK) y también para cuando se entreguen las tapas de las cajas, puesto que, si son entregadas a los propietarios y son hurtadas, ellos serán los responsables.

***Componente Técnico***

-***Frentes de obra activos***: 7
***-Frente de obra inactivos:*** 5 (Prioridades 21,22,24,25,3)
***-Calificación:*** 98% (La calificación ha sido afectada por llamados de atención reiterativos al PMT).
***-Informe semanales mayo y junio***: pendientes por radicar por el contratista.

***-Informe mensual No.7:*** El contratista se encuentra atendiendo observaciones, se realizará mesa de trabajo hoy mismo con el contratista para subsanar esas observaciones.

El contratista manifiesta que realizara la instalación de mezcla asfáltica y monoblock para la próxima semana en las prioridades 24, 25, 21, 22 (pendientes 30 metros de monoblock, se espera al martes 20 de junio de 2023contar con este material) y 3. El contratista manifiesta que pacto una fecha con el proveedor de asfalto y este indico que en cuanto tenga disposición de grano caucho confirma, el contratista manifiesta que espera iniciar la instalación de la mezcla asfáltica entre el 22 y 23 de junio de 2023.

El FDLK indica que la abogada manifestó hacer unas inclusiones al documento en Word y ese pasa a presupuesto para el aval de la cesión de derechos, se espera tener una razón el 16 de junio de 2023. El FDLK espera que la próxima semana se cuente con el despacho de monoblock y la mezcla asfáltica, puesto que esto facilita la entrega ya de varias prioridades.

**Se adjunta agenda que contiene plano y cuadro de actividades por prioridades*

El FDLK que en la prioridad 30, un propietario solicito una rampa de acceso vehicular, pero el contratista manifestó que no se realizar porque el acceso tiene una altura de 60 cm y 1.10 cm incluyendo la franja peatonal, es claro que no se puede hacer, pero el FDLK solicita al contratista presentar una solución a este predio, puesto que antes contaba con esta rampa, siempre y cuando respete la franja peatonal de acuerdo a el diseño arquitectónico. El martes 20 de junio de 2023 se realizará recorrido en obra con los especialistas de espacio público de interventoría y contratista, para plantear una solución.

***Presupuesto y programación***

La Interventoría manifiesta que se realizó el análisis y evaluación de cantidades de la semana y se evidencia que a la fecha el contratista sigue con atrasos en obra, como se evidencia a continuación:

| G1 | CORTE AL 13 DE JUNIO DE 2023 | | |
|---|---|---|---|
| | GENERAL | OBRA | FINANCIERO |
| % PROGRAMADO | 48,50% | 69,05% | 48,50% |
| % EJECUTADO | 26,15% | 26,12% | 14,51% |
| % DESVIACIÓN | -22,35% | -42,93% | -33,99% |

**Se adjunta agenda con toda la programación semanal*

Si bien es cierto que el contratista debía realizar la radicación actualizada de la programación actualizada, esta no fue entregada para realizar la revisión. El contratista manifiesta que se realizó este ajuste, pero solo hasta el día de hoy realizo la radicación. Esta programación cuenta con las actividades de todos los CIV, programación de la instalación del monoblock y las actividades de los componentes. La Interventoría manifiesta que realizará la revisión de esta programación y queda pendiente por radicar el balance de los CIV que si se van a intervenir.

El contratista solicita que se haga la excepción de tramitar la cuenta del mes de abril el día martes 20 de junio de 2023, pero el FDLK indica que si esta no fue entregada el día de hoy es imposible que se efectué el pago, sin embargo, se solicita que se radique lo antes posible su debido tramite.

El contratista manifiesta que en cuanto a todo el tema de gestión documental y de cuentas se está haciendo una evaluación cada miércoles, con el fin de verificar cada uno de los componentes, pero se ha evidenciado que el componente técnico es el componente que está generando los atrasos. El contratista solicita que las cantidades sean conciliadas semanalmente Interventoría – contratista, para que al final de mes se verifiquen las cantidades acumuladas. La Interventoría manifiesta que así debe ser y se está realizando de esa manera, pero la interventoría mide cotas no volúmenes.

El contratista indica que si de ser así solicita a la Interventoría que si se realiza la revisión semanal de estas cantidades y la consolidación se puede salir del "cuello de botella" en cuanto a la facturación.

## COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

| No | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|---|---|
| 1 | Plan detallado de trabajo ajustado de las prioridades intervenidas a la fecha (Se solicita incluir el listado por CIV que contenga el monoblock y A80, en cuanto tiempo los van a ejecutar, cuantas cuadrillas van a requerir e informar en que prioridades se va a instalar monoblock) | XIE S.A | 15-jun-23 |
| 2 | Cronograma de Inspecciones CCTV | XIE S.A | 15-jun-23 |
| 3 | Propuesta urbanística y presupuestal del cambio de bolardos M63 a M62 | XIE S.A | 21-jun-23 |
| 4 | Solicitud de Reunión con la SDM – Vigencia de señalización | XIE S.A | 21-jun-23 |
| 5 | Informe mensual No. 8 (mayo) Componente Tránsito y transporte | XIE S.A | 15-jun-23 |
| 6 | Radicación de la cuenta de abril | XIE S.A | 16-jun-23 |
| 7 | Radicación de cuenta del mes de abril G1 al FDLK | SCLV | 21-jun-23 |
| 8 | Oficio al FDLK con trazabilidad de las solicitudes al PIGA de la resolución 1257 de 2021. | XIE S.A | 22-jun-23 |
| 9 | Relación de viviendas que no acceden a la adecuación de bajantes para gestionar visita con la Policía. | SCLV | 21-jun-23 |
| 10 | Solución del acceso a vivienda de la Prioridad 30 | XIE S.A | 21-jun-23 |
| 11 | Cantidades de diseño geométrico de los 43 CIV actualizadas. | XIE S.A | 20-jun-23 |
| 12 | Inventario redes secas | XIE S.A | 21-jun-23 |
| 13 | Recorrido especialistas de tránsito. | XIE S.A - SCLV | 20-jun-23 |
| 14 | Recorrido especialistas espacio público y urbanismo | XIE S.A - SCLV | 20-jun-23 |
| 15 | Recorrido especialistas redes secas. | XIE S.A - SCLV | 20-jun-23 |

Elaborada por: Interventoría – Juan Manuel Alba Rojas
Fecha de la próxima reunión: 22 de junio de 2023 Lugar de la próxima reunión: NA

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

## AGENDA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO

### Contratista de Obra XIE S.A – COP -621-22 Grupo 1

### COMITÉ DE SEGUIMIENTO No.36 INTEGRAL 9

**Fecha: 15 de junio 2023**

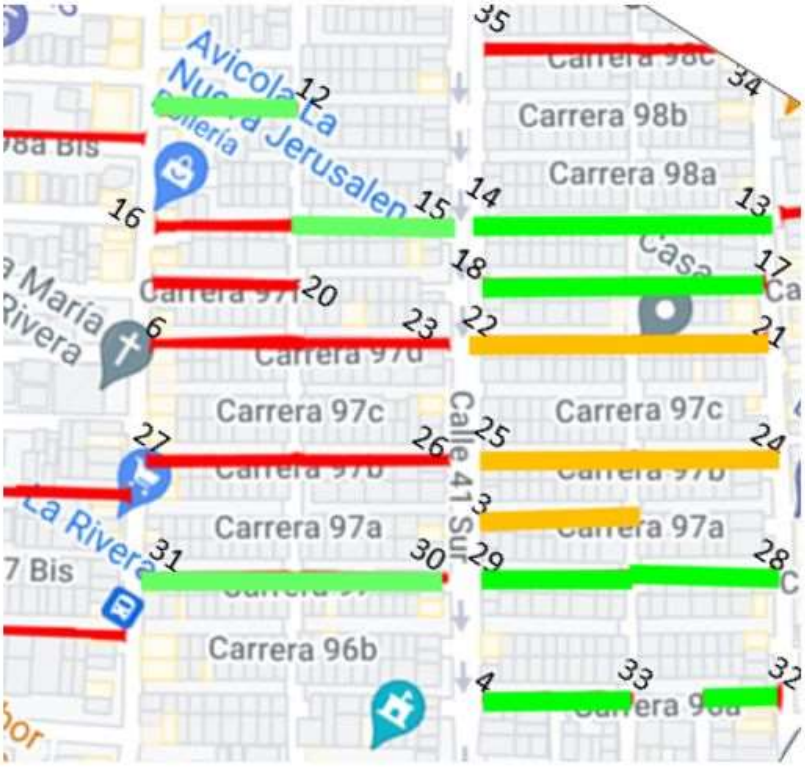
**ORDEN DEL DIA**

| **1.Compromisos** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No** | **Asunto** | **Responsable** | **Fecha de compromiso** | **Cumplió SI/NO** |
| **1** | Plan detallado de trabajo ajustado de las prioridades intervenidas a la fecha (Se solicita incluir el listado por CIV que contenga el monoblock y A80, en cuanto tiempo los van a ejecutar, cuantas cuadrillas van a requerir e informar en que prioridades se va a instalar monoblock) | Contratista | 14-jun-23 | NO |
| **2** | Cronograma de Inspecciones CCTV | Contratista | 14-jun-23 | NO |
| **3** | Propuesta urbanística y presupuestal del cambio de bolardos M60 a M62 | Contratista | 14-jun-23 | NO |
| **4** | Solicitud de Reunión con la SDM – Vigencia de señalización | Contratista | Pendiente de confirmación | |
| **5** | Informe mensual No. 8 (mayo) Componente Tránsito y transporte | Contratista | 9-jun-23 | NO |
| **6** | Radicación de la cuenta de abril | Contratista | 13-jun-23 | NO |
| **7** | Radicación de cuenta del mes de abril G1 al FDLK | Interventoría | 15-jun-23 | |
| **2. Componentes** | | | | |
| **A. Técnico** | | | | |
| - **Informes semanales mayo:** Sin radicar | | | | |
| - **Informe Mensual 7 y 8:** Sin radicar | | | | |
| - **Calificación:** 98% | | | | |
| **B. SST** | | | | |
| - **Informe semanal 36:** Aprobado | | | | |
| - **Informe Mensual 8:** En revisión mesa de trabajo | | | | |
| - **Calificación:** 98% | | | | |
| **C. Ambiental** | | | | |
| - **Informe semanal 36:** Aprobado | | | | |
| - **Informe Mensual 8:** Aprobado | | | | |
| - **Calificación:** 98% | | | | |
| **D. Gestión Social** | | | | |
| - **Informe semanal 36:** Aprobado | | | | |
| - **Informe Mensual 8:** Observado | | | | |
| - **Calificación:** 96%<br>**Se afectó la calificación por desinformación a la comunidad y calidad de documentos* | | | | |
| **Especialistas** | | | | |
| **Obra** | | | | |

Frentes de obra en la semana del 7 al 13 de junio de 2023:

Frentes de obra: 7, aumentó 2 frentes.

CIV: 18




| Nomenclatura | |
|---|---|
| | Frente de obra Activo |
| | Frente de obra Intermitente |
| | Frente de obra Inactivo |
| | Frente de obra sin inicio |

# ESTADO SEMANAL DE PROCESO CONSTRUCTIVO

**CONTRATISTA DE OBRA GRUPO 1 - COP 621-22**

| | PK_ID ANDEN | PK_ID ANDEN | 3 | | | 4 | | | 13 | | | 14 | | | 17 | | | 18 | | | 21 | | | 22 | | | 24 | | | 25 | | | 28 | | | 29 | | | 30 | | | 31 | | | 32 | | | 33 | | | 12 | | 15 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIA | ORIENTAL | OCCIDENTAL | VIA (156201) | ORI (29896) | OCC (29897) | VIA (156189) | ORI (29872) | OCC (29873) | VIA (156220) | ORI (29934) | OCC (29935) | VIA (156221) | ORI (29936) | OCC (29937) | VIA (156216) | ORI (29926) | OCC (29927) | VIA (156217) | ORI (29928) | OCC (29929) | VIA (156212) | ORI (29918) | OCC (29919) | VIA(156213) | ORI(29920) | OCC(29921) | VIA(156204) | ORI(29902) | OCC(29903) | VIA(156205) | ORI(29904) | OCC(29905) | VIA(156196) | ORI(29886) | OCC(29887) | VIA(156197) | ORI(29888) | OCC(29889) | VIA(156198) | ORI(29890) | OCC(29891) | VIA(156199) | ORI(29892) | OCC(29893) | VIA(156186) | ORI(29866) | OCC(29867) | VIA(156188) | ORI(29870) | OCC(29871) | VIA(156231) | ORI(29956) | OCC(29957) | VIA(156222) | ORI(29938) | OCC(29939) |
| EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE) | DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO Y CAJAS DE INSPECCION. | DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO Y CAJAS DE INSPECCION. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE. | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REDES HIDRAULICAS | GEOTEXTIL | GEOTEXTIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GEOTEXTIL, GEOCELDA HDPE PERFORADA, RELLENO CON FRESADO SOBRE GEOCELDA | PRIMERA CAPA DE FRESADO | PRIMERA CAPA DE FRESADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRIMERA CAPA FRESADO (RAP) ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 3% Y ADITIVO POTENCIALIZADOR (1.3 KG/M3 - SOLID SOIL). | SEGUNDA CAPA DE FRESADO | SEGUNDA CAPA DE FRESADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CANAL DE DRENAJE PREFABRICADO EN POLYCONCRETO MONOBLOCK. | CONSTRUCCION CAJAS DE INSPECCION, CAJILLAS DE AGUA POTABLE | CONSTRUCCION CAJAS DE INSPECCION, CAJILLAS DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEGUNDA CAPA FRESADO (RAP) ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 3% Y ADITIVO POTENCIALIZADOR (1.3 KG/M3 - SOLID SOIL). | BORDILLO PREFABRICADO A80 | BORDILLO PREFABRICADO A80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEZCLA ASFALTICA | CONCRETO DE 3000PSI Y MR41 | CONCRETO DE 3000 PSI Y MR41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| TERMINADO | |
| EJECUCION | |
| INTERMITENTE | |
| SIN INICIAR | |
| NO APLICA | |

| Prioridad | CIV | Actividades desarrolladas en la Semana |
|---|---|---|
| 4 | 8001069 | **Calzada:** Excavación manual para instalación de sumideros 2,87m3, instalación de solado0,16m3, instalación de 2 unidades de sumideros.<br>**Andén oriental:** Se realiza instalación de concreto parcial para rampa de 4000 psi 11,83m2 del K0+010 al K0+060.<br>**Andén occidental:** Se realiza instalación de concreto parcial para rampa de 4000 psi 15,74m2 del K0+010 al K0+060, instalación de concreto parcial para anden 3000 psi 10,36m2 del K0+000 al K0+060. |
| 32 | 8000979 | **Calzada**: Sin actividades.<br>**Andén oriental:** Sin actividades.<br>**Andén occidental:** Sin actividades. |
| 28 | 8000929 | **Calzada:** Sin actividad.<br>**Andén oriental:** Se realiza nivelación y compactación parcial de fresado en anden para instalación de concreto del K0+000 al K0+060.<br>**Andén occidental:** Se realiza nivelación y compactación parcial de fresado en anden para instalación de concreto del K0+000 al K0+060, instalación parcial de concreto 3000psi del K0+000 al K0+060 43.22m2. |
| 29 | 8000996 | **Calzada:** Se realiza instalación de sumideros 2 unidades.<br>**Andén oriental:** Se realiza nivelación y compactación parcial de fresado en anden para instalación de concreto del K0+000 al K0+060.<br>**Andén occidental:** Se realiza nivelación y compactación parcial de fresado en anden para instalación de concreto del K0+000 al K0+060, instalación parcial de bordillo A-80 5.25 ML del K0+003 al K0+060 |
| 24 | 8000871 | **Calzada:** Sin actividad.<br>**Andén oriental:** Sin actividad.<br>**Andén occidental:** Se realiza instalación parcial de bordillo A-80 10.75 ML del K0+003 al K0+060, instalación parcial de concreto 3000psi del K0+000 al K0+060 8,69m2. |
| 25 | 8000923 | **Calzada:** Sin actividad.<br>**Andén oriental:** Sin actividad.<br>**Andén occidental:** Sin actividad. |
| 21 | 8000821 | **Calzada:** Sin actividad.<br>**Andén oriental:** Sin actividad.<br>**Andén occidental:** Sin actividad. |
| 22 | 8000864 | **Calzada:** Sin actividad.<br>**Andén oriental**: Sin actividad.<br>**Andén occidental:** Sin actividad. |
| 3 | 8000957 | **Calzada:** Sin actividad.<br>**Andén oriental:** Sin actividad.<br>**Andén occidental:** Sin actividad. |
| 13 | 8000772 | **Calzada:** Sin actividad.<br>**Andén occidental:** Se realiza instalación parcial de concreto para rampa MR41 4000psi 17.39m2 del K0+000 al K0+060<br>**Andén oriental:** Se realiza instalación parcial de concreto para rampa MR41 4000psi 11.61m2 del K0+000 al K0+060 |
| 14 | 8000814 | **Calzada:** Se realiza instalación de base estabilizada en intersección de la prioridad 14 y 13 5.66m3 del K0+054 al K0+063.90.<br>**Andén oriental:** Se realiza instalación parcial de concreto para rampa MR41 4000psi 6.33m2 del K0+000 al K0+060<br>**Andén occidental:** Sin actividad. |
| 17 | 8000794 | **Calzada:** Sin actividad.<br>**Andén oriental:** Se realiza nivelación y compactación parcial de fresado en anden para instalación de concreto del K0+000 al K0+060. |

| Prioridad | CIV | Actividades desarrolladas en la Semana |
|---|---|---|
| | | **Andén occidental:** instalación de concreto 3000 psi para anden 23.01m2 K0+000 al K0+060, nivelación y compactación parcial de fresado en anden para instalación de concreto del K0+000 al K0+060. |
| 18 | 8000839 | **Calzada:** Se realiza instalación de base estabilizada 8.08m3 del K0+050 al K0+064.02.<br>**Andén oriental:** Se realiza instalación parcial de concreto para rampa MR41 4000psi 6.4m2 del K0+000 al K0+060, nivelación y compactación parcial de fresado en anden para instalación de concreto del K0+000 al K0+060.<br>**Andén occidental:** Se realiza instalación parcial de concreto para rampa MR41 4000psi 16.09m2 del K0+000 al K0+060, nivelación y compactación parcial de fresado en anden para instalación de concreto del K0+000 al K0+060. |
| 33 | 8001041 | **Calzada:** Se realiza excavación manual para instalación de sumideros 2,46m3, instalación de solado 0,15m3.<br>**Andén oriental:** Se realiza instalación de concreto 3000 psi para anden 19,31m2 K0+000 al K0+060.<br>**Andén occidental:** Se realiza instalación parcial de concreto para rampa MR41 4000psi 5.4m2 del K0+000 al K0+060, instalación parcial de bordillo A-80 del K0+003 al K0+060 7.62 ML, instalación de concreto 3000 psi para anden 28,69m2 del K0+000 al K0+060 |
| 31 | 8001058 | **Calzada:** Se realiza instalación de bordillo A-80 18ML del K0+011 al K0+029.<br>**Andén oriental:** Sin actividad.<br>**Andén occidental:** Se realiza demolición parcial de cajas de inspección 0.81m3 y construcción de cajas de inspección 3 unidades del K0+000 al K0+060, instalación parcial de fresado en anden 4.48m3 del K0+000 al K0+060. |
| 30 | 8001125 | **Calzada:** Se realiza instalación de bordillo A-80 34.4 ML del K0+044.5 al K0+062 en ambos costados de la calzada.<br>**Andén oriental:** Se realiza instalación de concreto 3000 psi para anden 22.55m2 del K0+000 al K0+060.<br>**Andén occidental:** Se realiza instalación de concreto 3000 psi para anden 32.38m2 del K0+000 al K0+060. |
| 12 | 8000849 | **Calzada:** Se realiza apertura de la prioridad se utiliza 132ML de poli sombra para cerramiento, se inicia excavación mecánica del K0+000 al K0+060 138.24 m3, subterranización de agua potable 8 unidades y 1 de gas del K0+000 al K0+053, nivelación y compactación de subrasante 220m2 del K0+000 al K0+055, instalación de geotextil 212m2 del K0+000 al K0+053, instalación de geo-celda 212m2 del K0+000 al K0+053, instalación de fresado 38.36m3 del K0+000 al K0+053.<br>**Andén oriental:** Sin actividad.<br>**Andén occidental:** Sin actividad. |
| 15 | 8000856 | **Calzada:** Se realiza apertura de la prioridad se utiliza 136ML de poli sombra para cerramiento, se inicia excavación mecánica del K0+015 al K0+063.10 115.4 m3, subterranización de agua potable 9 unidades del K0+015 al K0+063.10.<br>**Andén oriental:** Sin actividad.<br>**Andén occidental:** Sin actividad. |

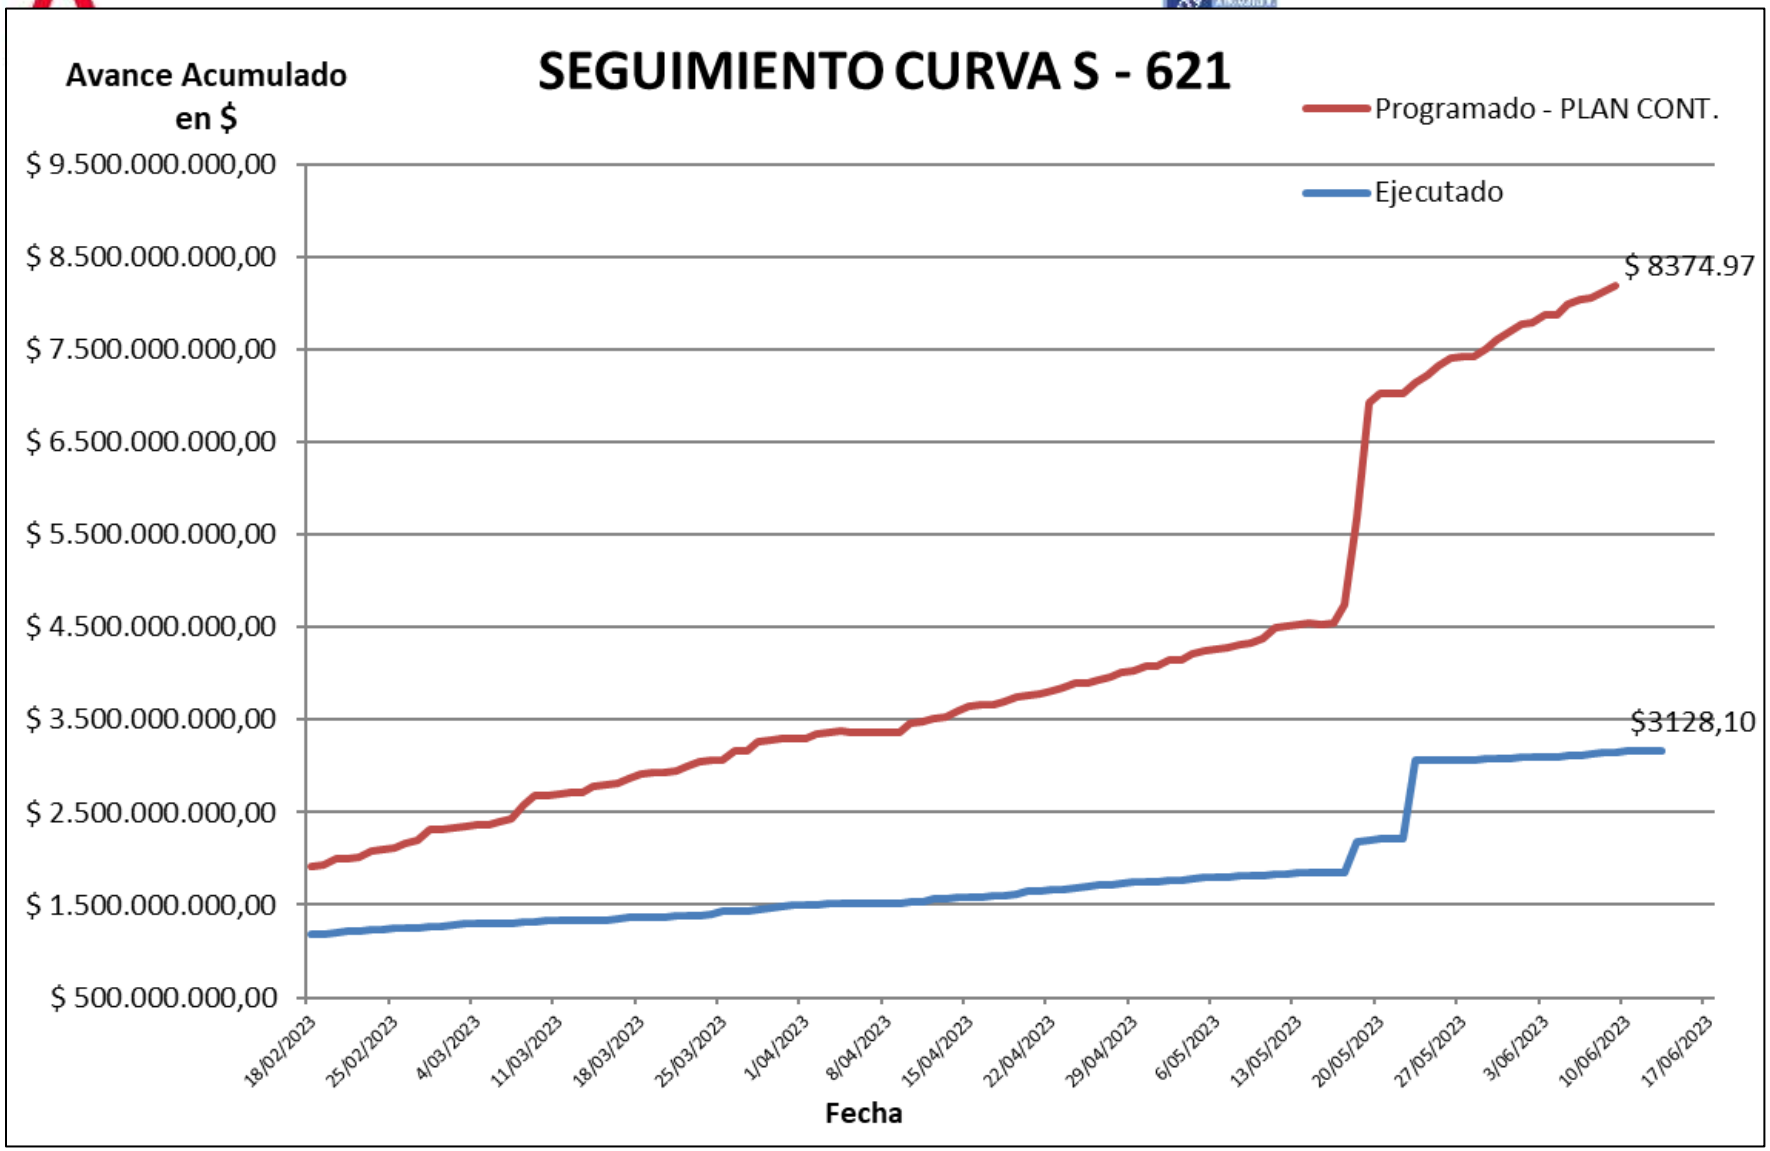
**SEGUIMIENTO GRUPO 1 AL 13-JUNIO-2023**

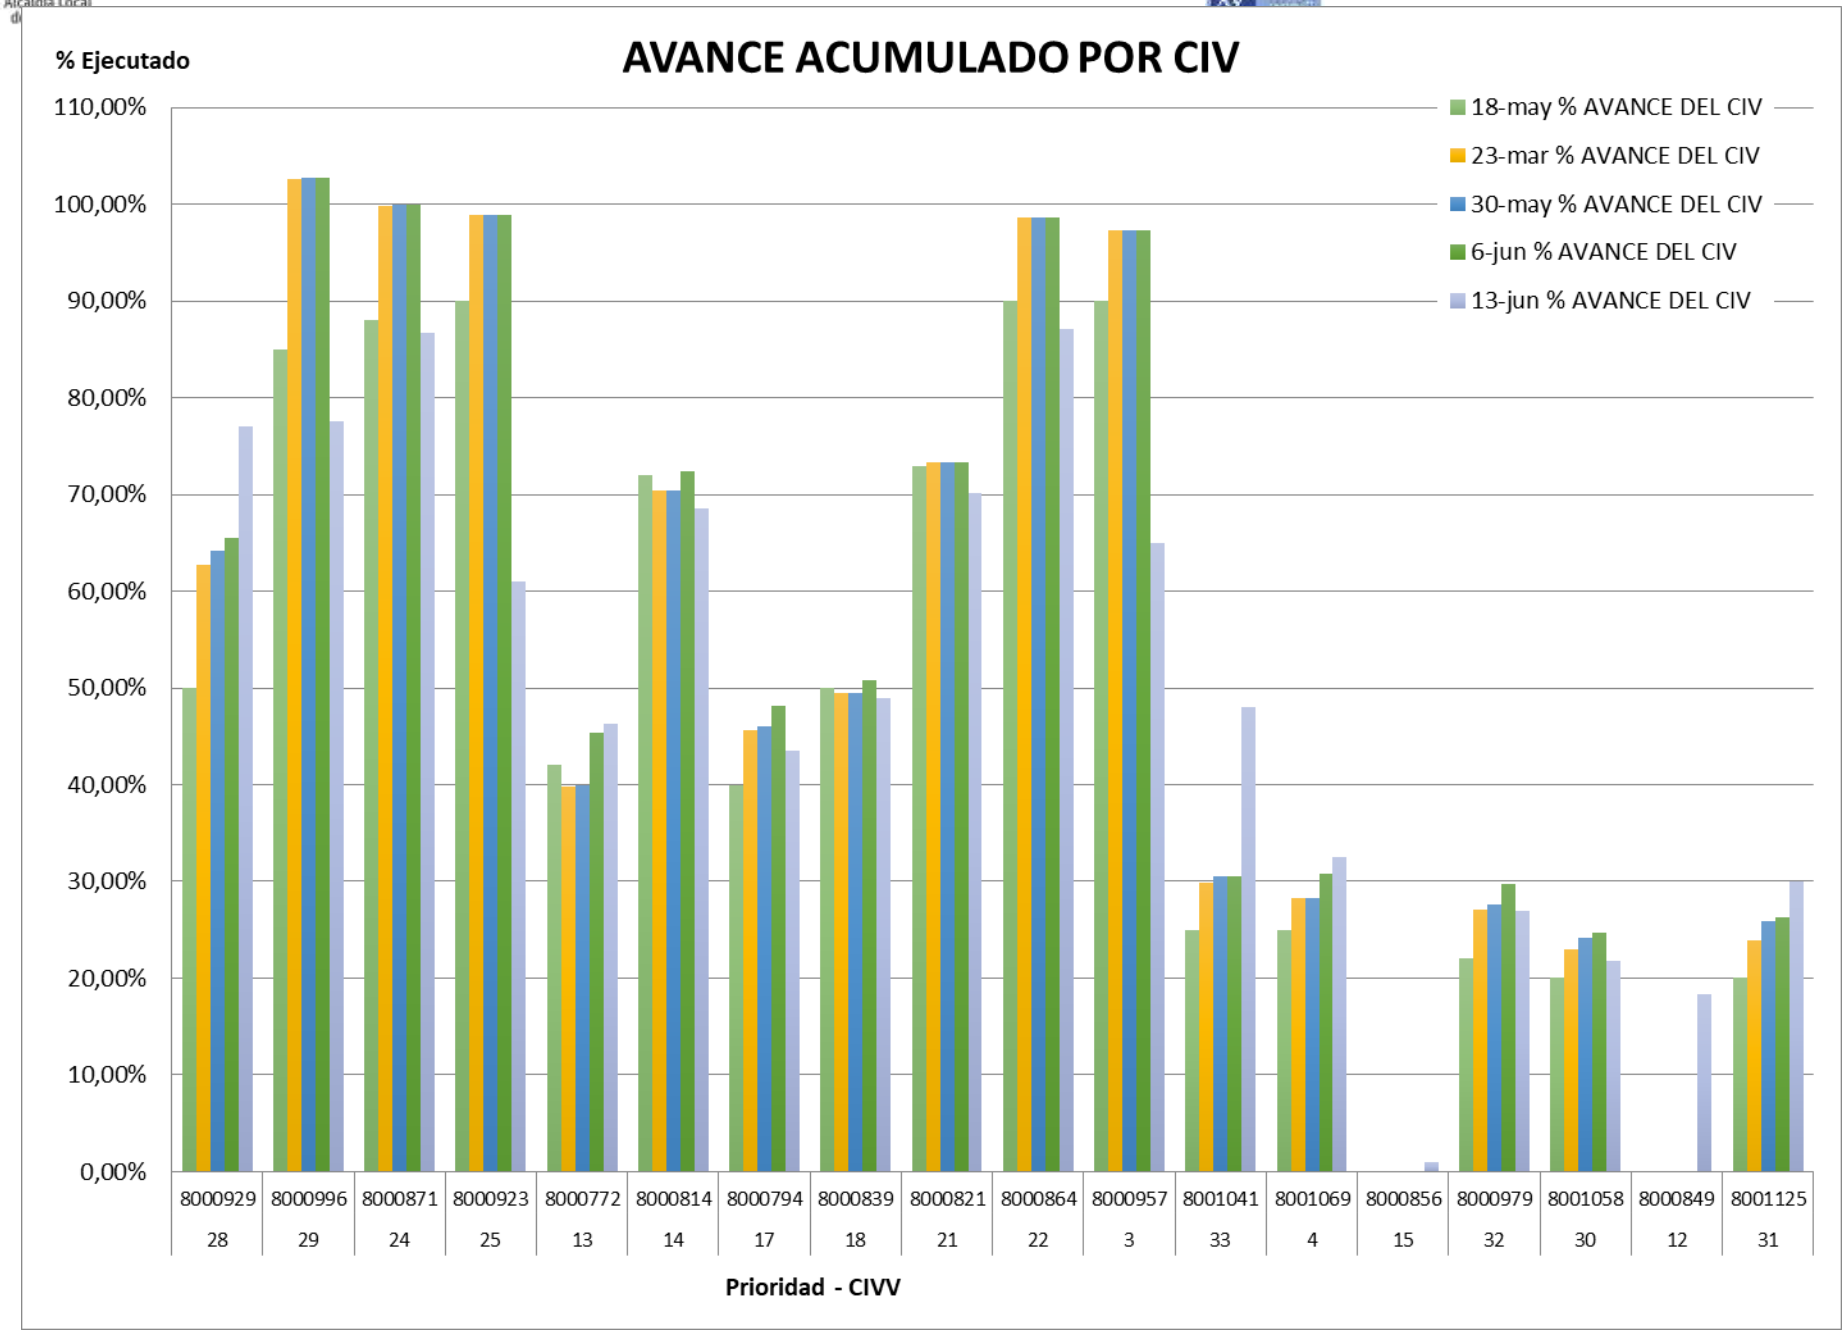
| P | CIV | VALOR CIV | PROG-ACUM | % PROG-ACUM | EJEC-ACUM | %EJEC-ACUM | %PESO EJEC PROG | %ATRASO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 8000929 | $ 350.196.158 | $ 286.285.312 | 2,36% | $ 269.647.119 | 1,61% | 77,00% | -0,75% |
| 29 | 8000996 | $ 277.835.940 | $ 242.229.965 | 2,00% | $ 215.376.955 | 2,06% | 77,52% | 0,07% |
| 24 | 8000871 | $ 282.948.453 | $ 269.517.473 | 2,22% | $ 245.506.185 | 2,24% | 86,77% | 0,02% |
| 25 | 8000923 | $ 399.102.738 | $ 345.626.780 | 2,85% | $ 243.452.670 | 2,82% | 61,00% | -0,03% |
| 13 | 8000772 | $ 299.171.212 | $ 289.860.253 | 2,39% | $ 138.682.630 | 1,06% | 46,36% | -1,33% |
| 14 | 8000814 | $ 429.546.537 | $ 414.590.745 | 3,42% | $ 294.441.537 | 2,43% | 68,55% | -0,99% |
| 17 | 8000794 | $ 366.022.606 | $ 305.729.991 | 2,52% | $ 159.098.664 | 1,23% | 43,47% | -1,29% |
| 18 | 8000839 | $ 445.759.062 | $ 414.390.409 | 3,42% | $ 218.460.195 | 1,80% | 49,01% | -1,62% |
| 21 | 8000821 | $ 396.404.118 | $ 379.185.734 | 3,13% | $ 277.890.269 | 2,29% | 70,10% | -0,84% |
| 22 | 8000864 | $ 475.419.809 | $ 407.701.220 | 3,36% | $ 413.939.504 | 3,41% | 87,07% | 0,05% |
| 3 | 8000957 | $ 347.400.619 | $ 324.515.768 | 2,68% | $ 225.724.369 | 2,60% | 64,98% | -0,07% |
| 33 | 8001041 | $ 165.001.611 | $ 148.920.207 | 1,23% | $ 79.300.677 | 0,44% | 48,06% | -0,79% |
| 4 | 8001069 | $ 184.315.968 | $ 154.073.696 | 1,27% | $ 59.890.353 | 0,46% | 32,49% | -0,81% |
| 16 | 8000907 | $ 378.941.081 | $ 361.864.229 | 2,98% | $ 0 | 0,00% | 0,00% | -2,98% |
| 15 | 8000856 | $ 319.238.431 | $ 314.966.118 | 2,60% | $ 3.009.631 | 0,00% | 0,94% | -2,59% |
| 26 | 8000988 | $ 312.565.276 | $ 248.815.938 | 2,05% | $ 0 | 0,00% | 0,00% | -2,05% |
| 6 | 8000977 | $ 385.158.931 | $ 313.656.772 | 2,59% | $ 0 | 0,00% | 0,00% | -2,59% |
| 32 | 8000979 | $ 168.065.421 | $ 151.794.191 | 1,25% | $ 45.180.468 | 0,37% | 26,88% | -0,88% |
| 30 | 8001058 | $ 348.299.954 | $ 285.253.220 | 2,35% | $ 75.821.749 | 0,63% | 21,77% | -1,73% |
| 20 | 8000938 | $ 394.914.092 | $ 379.247.247 | 3,13% | $ 0 | 0,00% | 0,00% | -3,13% |
| 31 | 8001125 | $ 353.899.334 | $ 295.012.954 | 2,43% | $ 106.169.800 | 0,66% | 30,00% | -1,78% |
| 8 | 8002417 | $ 436.309.464 | $ 249.134.539 | 2,05% | $ 0 | 0,00% | 0,00% | -2,05% |
| 9 | 8002500 | $ 341.127.565 | $ 173.628.493 | 1,43% | $ 0 | 0,00% | 0,00% | -1,43% |
| 27 | 8001052 | $ 455.638.594 | $ 384.495.381 | 3,17% | $ 0 | 0,00% | 0,00% | -3,17% |
| 12 | 8000849 | $ 308.572.488 | $ 271.067.713 | 2,23% | $ 56.517.618 | 0,00% | 18,32% | -2,23% |
| 23 | 8000916 | $ 389.375.082 | $ 341.149.570 | 2,81% | $ 0 | 0,00% | 0,00% | -2,81% |
| 5 | 8000655 | $ 464.716.467 | $ 158.284.042 | 1,31% | $ 0 | 0,00% | 0,00% | -1,31% |
| 40 | 8000687 | $ 462.079.926 | $ 149.621.021 | 1,23% | $ 0 | 0,00% | 0,00% | -1,23% |
| 10 | 8000736 | $ 492.144.459 | $ 132.160.947 | 1,09% | $ 0 | 0,00% | 0,00% | -1,09% |
| 1 | 8011953 | $ 769.586.187 | $ 102.470.802 | 0,84% | $ 0 | 0,00% | 0,00% | -0,84% |
| 7 | 8000736 | $ 492.144.459 | $ 79.717.818 | 0,66% | $ 0 | 0,00% | 0,00% | -0,66% |
| Totales | | | **$ 8.374.968.548** | **69,05%** | **$ 3.128.110.393** | **26,12%** | | -42,93% |
| Total de obra | | | **$ 12.128.504.795** | | | | | |

| G1 | CORTE AL 13 DE JUNIO DE 2023 | | |
|---|---|---|---|
| | GENERAL | OBRA | FINANCIERO |
| % PROGRAMADO | 48,50% | 69,05% | 48,50% |
| % EJECUTADO | 26,15% | 26,12% | 14,51% |
| % DESVIACIÓN | -22,35% | -42,93% | -33,99% |

| FECHA EVALUACIÓN | | | 18-may | 23-mar | 30-may | 6-jun | 13-jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | CIV | VALOR TOTAL CIV | % AVANCE DEL CIV | % AVANCE DEL CIV | % AVANCE DEL CIV | % AVANCE DEL CIV | % AVANCE DEL CIV |
| 28 | 8000929 | $ 347.200.311,00 | 50,00% | 62,78% | 64,24% | 65,55% | 77,00% |
| 29 | 8000996 | $ 292.279.155,00 | 85,00% | 102,56% | 102,75% | 102,78% | 77,52% |
| 24 | 8000871 | $ 303.712.088,00 | 88,00% | 99,81% | 100,01% | 100,01% | 86,77% |
| 25 | 8000923 | $ 378.908.264,00 | 90,00% | 98,93% | 98,93% | 98,93% | 61,00% |
| 13 | 8000772 | $ 274.339.089,00 | 42,00% | 39,75% | 39,94% | 45,30% | 46,36% |
| 14 | 8000814 | $ 404.676.565,00 | 72,00% | 70,41% | 70,41% | 72,41% | 68,55% |
| 17 | 8000794 | $ 343.212.808,00 | 40,00% | 45,62% | 46,00% | 48,09% | 43,47% |
| 18 | 8000839 | $ 395.629.378,00 | 50,00% | 49,44% | 49,49% | 50,75% | 49,01% |
| 21 | 8000821 | $ 374.906.711,00 | 73,00% | 73,29% | 73,29% | 73,29% | 70,10% |
| 22 | 8000864 | $ 444.284.148,00 | 90,00% | 98,71% | 98,71% | 98,71% | 87,07% |
| 3 | 8000957 | $ 350.804.854,00 | 90,00% | 97,29% | 97,29% | 97,29% | 64,98% |
| 33 | 8001041 | $ 173.766.372,00 | 25,00% | 29,80% | 30,53% | 30,53% | 48,06% |
| 4 | 8001069 | $ 172.153.562,00 | 25,00% | 28,21% | 28,21% | 30,81% | 32,49% |
| 15 | 8000856 | $ 308.449.741,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,94% |
| 32 | 8000979 | $ 181.397.134,00 | 22,00% | 27,03% | 27,59% | 29,76% | 26,88% |
| 30 | 8001058 | $ 352.063.180,00 | 20,00% | 22,93% | 24,23% | 24,70% | 21,77% |
| 12 | 8000849 | $ 417.435.434,91 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 18,32% |
| 31 | 8001125 | $ 346.894.732,00 | 20,00% | 23,85% | 25,90% | 26,30% | 30,00% |

| FECHA EVALUACIÓN | | | 13-jun |
|---|---|---|---|
| P | CIV | VALOR TOTAL CIV | % AVANCE DEL CIV |
| 28 | 8000929 | $ 347.200.311,00 | 11,45% |
| 29 | 8000996 | $ 292.279.155,00 | -25,26% |
| 24 | 8000871 | $ 303.712.088,00 | -13,24% |
| 25 | 8000923 | $ 378.908.264,00 | -37,93% |
| 13 | 8000772 | $ 274.339.089,00 | 1,05% |
| 14 | 8000814 | $ 404.676.565,00 | -3,86% |
| 17 | 8000794 | $ 343.212.808,00 | -4,62% |
| 18 | 8000839 | $ 395.629.378,00 | -1,74% |
| 21 | 8000821 | $ 374.906.711,00 | -3,18% |
| 22 | 8000864 | $ 444.284.148,00 | -11,64% |
| 3 | 8000957 | $ 350.804.854,00 | -32,32% |
| 33 | 8001041 | $ 173.766.372,00 | 17,53% |
| 4 | 8001069 | $ 172.153.562,00 | 1,68% |
| 16 | 8000907 | $ 356.743.482,00 | 0,00% |
| 15 | 8000856 | $ 308.449.741,00 | 0,94% |
| 26 | 8000988 | $ 303.045.416,00 | 0,00% |
| 27 | 8001052 | $ 440.627.039,00 | 0,00% |
| 32 | 8000979 | $ 181.397.134,00 | -2,88% |
| 30 | 8001058 | $ 352.063.180,00 | -2,93% |
| 12 | 8000849 | $ 417.435.434,91 | 18,32% |
| 31 | 8001125 | $ 346.894.732,00 | 3,70% |


SEGUIMIENTO CURVA S - 621
Avance Acumulado en $
Programado - PLAN CONT.
Ejecutado
$ 8374.97
$3128,10
$ 9.500.000.000,00
$ 8.500.000.000,00
$ 7.500.000.000,00
$ 6.500.000.000,00
$ 5.500.000.000,00
$ 4.500.000.000,00
$ 3.500.000.000,00
$ 2.500.000.000,00
$ 1.500.000.000,00
$ 500.000.000,00
18/02/2023
25/02/2023
4/03/2023
11/03/2023
18/03/2023
25/03/2023
1/04/2023
8/04/2023
15/04/2023
22/04/2023
29/04/2023
6/05/2023
13/05/2023
20/05/2023
27/05/2023
3/06/2023
10/06/2023
17/06/2023
Fecha


AVANCE ACUMULADO POR CIV
% Ejecutado
110,00%
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
18-may % AVANCE DEL CIV
23-mar % AVANCE DEL CIV
30-may % AVANCE DEL CIV
6-jun % AVANCE DEL CIV
13-jun % AVANCE DEL CIV
8000929 28
8000996 29
8000871 24
8000923 25
8000772 13
8000814 14
8000794 17
8000839 18
8000821 21
8000864 22
8000957 3
8001041 33
8001069 4
8000856 15
8000979 32
8001058 30
8000849 12
8001125 31
Prioridad - CIVV
