BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

**DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:** Fondo De Desarrollo Local de Kennedy

**FECHA:** 22 / Junio / 23 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** 01

**OBJETO DE LA REUNIÓN:** Comité de seguimiento No. 37 CIN-717-2022 / COP-621-2022

**HORA DE INICIO:** ____ **HORA DE FINALIZACIÓN:** ____

**ASISTENTES:**

| NOMBRE | CARGO | | | | | TIPO DE VINCULACIÓN | | | | ENTIDAD o DEPENDENCIA | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ASESOR | DIRECTIVO | PROFESIONAL | TÉCNICO/ TECNÓLOGO | AUXILIAR | CARRERA | PROVISIONAL | LIBRE NOMB. | CONTRATISTA | | | | |
| ARTURO ZARATE M. | | | X | | | | | | X | INTERVENTORIA | arturozarate1971@yahoo.com | 3152268031 | |
| A. Milena Medina G. | | | X | | | | | | X | Contratista | xiesocial@outlook | 3102504420 | |
| María Camila Perez Roa | | | X | | | | | | X | xie. S.A | xie.ambiental@gmail.com | 3102457234 | |
| Sandra Pinto. | | | X | | | | | | X | xie. S.A | xie.55t621@gmail.com | 3208931056 | |
| ROSALIDA MONQUA | | | X | | | | | | X | XIE S.A. | xie.Kennedy621@gmail.com | 3223141858 | |
| Manuel A. Magdal Garcia | | | X | | | | | | X | XIE S.A | xie.director.proyecto621@gmail.com | 3212194426 | |
| Lucas Restrepo Lizo | | | X | | | | | | X | Interventoría | U233 SCLV@Outlook.com | 3002133006 | |
| Osvaldo Ladino Chaves | | | X | | | | | | X | SCLV - Interventoría | dir.vialeo@silcoasa.com.co | 3103178077 | |
| Danilo Meneses Toro | | | X | | | | | | X | FDLK. Infraestructura | Danilo.Meneses@gobiernobogota.gov.co | 3118988031 | |
| Andrés Mauricio Rojas U. | | | X | | | | | | X | FDLK - Infraestructura | andres.m.llanos@gobiernobogota.gov.co | 3057039773 | |
| Juan Manuel Alba Rojas | X | | | | | | | | | Interventoría | juan.aba@hotmail.com | 3107671842 | |

**NOTA:** En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

**CONSENTIMIENTO:** El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demas normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

NOTA: Asistir a aquellas las fotos que sean necesarias para soporte y no solo para dar cumplimiento de la reunión.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

**DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:** Fondo De Desarrollo Local de Kennedy

**FECHA:** 22/Junio/23 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** 01

**OBJETO DE LA REUNIÓN:** Comité de Seguimiento No. 37 CIN-717-2022 / COP-621-2022.

**HORA DE INICIO:** ____ **HORA DE FINALIZACIÓN:** ____

**ASISTENTES:**

| NOMBRE | CARGO | | | | | TIPO DE VINCULACIÓN | | | | ENTIDAD o DEPENDENCIA | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ASESOR | DIRECTIVO | PROFESIONAL | TÉCNICO/ TECNÓLOGO | AUXILIAR | CARRERA | PROVISIONAL | LIBRE NOMB. | CONTRATISTA | | | | |
| Nury Albarracin Daza | | | X | | | | | | | Interventoria | sst1kennedy@outlook | 3123230618 | |
| Karen Julieth Perdomo Ramirez | | | X | | | | | | | Interventoría | u2333sstvkennedy@outlook.com | 3143253729 | |
| Anyeli Curiel Acosta | | | X | | | | | | | Interventoria | u2338sstvkennedy@outlook.com | 3227401898 | |
| Oscar Vargas. | | X | | | | | | | | Contratista. | oscarvargasexe. | 3102273581 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

**NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.**

**CONSENTIMIENTO:** El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

| | |
|---|---|
| BOGOTÁ \| SECRETARÍA DE GOBIERNO | **EVIDENCIA DE REUNIÓN** |

**DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:**

Se da inicio al comité de seguimiento No. 37 en las instalaciones de la interventoría las 4:30 pm, con la presencia del apoyo a la supervisión FDLK, contratista de obra Grupo 1 XIE S.A e Interventoría Consorcio SCLV.

***Orden del Día***

***1. Compromisos Pendientes***

La Interventoría indica que a la fecha el contratista no ha cumplido los siguientes compromisos:

- ***Programación ajustada de acuerdo a observaciones de la interventoría***: La interventoría indica que esta observada la programación, dado a que no se evidencio que se quemara la línea base. El contratista manifiesta que realiza la revisión ya atención de las observaciones.
- ***Propuesta urbanística y presupuestal del cambio de bolardos M63 a M62***: El contratista manifiesta que el cambio se realizará de M63 a M61, deberá remitir la propuesta con la justificación técnica y económica.
- ***Relación de viviendas que no acceden a la adecuación de bajantes para gestionar visita con la Policía:*** se acatara este compromiso cuando se requiera, a la fecha este no ha sido requerido puesto que el contratista no cuenta con ningún problema de bajantes.
- ***Solución del acceso a vivienda de la Prioridad 30:*** El contratista manifiesta que se realizó un compromiso social con el propietario, indicándole que no se le realizara la construcción de la rampa y de acuerdo a la visita en campo de los especialistas de espacio público y urbanismos se presentara una solución.
- ***Inventario redes secas:*** El contratista atenderá este requerimiento de acuerdo a lo requerido por el especialista de redes secas en el recorrido que se reprogramo para el 23 de junio de 2023.

***2. Componentes***

***Componente Técnico***

***- Informes semanales mayo y junio:*** La Interventoría indica que el contratista radico los informes semanales del mes de mayo, pero están pendientes los del mes de julio.
***- Informe Mensual 8:*** Sin radicar
***- Pre-Acta No.10 de recibo parcial No.8 (mayo):*** Sin radicar. El contratista manifiesta que realizo la radicación el día de hoy.
***- Cuenta No. 8 (mayo):*** Sin radicar.
***- Calificación:*** 98%

La Interventoría indica que durante la semana el contratista conto con 8 frentes de obra.

**Se adjunta agenda que contiene plano y cuadro de actividades por prioridades*

La Interventoría solicita que se realice una simulación de acta parcial final de obra de las cantidades de mayo y junio, para tener un estimado de facturación a la fecha.

***Tránsito y transporte***

La Interventoría manifiesta que el día de hoy se realizó mesa de trabajo con el contratista y SDM de acuerdo a la prórroga de diseños de señalización, el contratista ya remitió el oficio a la Interventoría y será radicada la solicitud a la SDM.
A la fecha se cuenta con 31 CIVs con permisos, de estos 31 se tienen el siguiente balance:

-5 CIVs en etapa 3, es decir que están listos para la instalación de mezcla asfáltica.
-11 CIVs en etapa 2
-15 CIVs en etapa 1

Durante la semana el contratista solicito permisos del PMT para 6 CIVs adicionales para etapa 3 y 8 CIVs para etapa 2. La próxima semana saldría la aprobación de los 12 CIVs restantes, lo cual indica que es bueno porque puede haber un avance en la ejecución de las actividades, pero complicaciones porque se deben controlar ahora los 43 CIVs y ninguno sin terminar.

La Interventoría por otra parte solicita al contratista dar respuesta inmediata a los oficios de incumplimiento de la SDM, es muy importante cumplir con la implementación del PMT.

***Componente SST***

***-Informe semanal 37:*** Aprobado
***-Informe Mensual 8:*** Observado, anexo 4.1 y FOAC, el contratista manifiesta que realizara la subsanación de estas observaciones para la próxima semana
***-Ingresos en la semana:*** 12
***-Retiros en la semana:*** 3
***-Total Personal Obra:*** 50 de mano de abra.
***-Calificación:*** 100%

El contratista manifiesta que el sábado 17 de junio se presentó un accidente con oficial de trafico quien estaba trasladando las barricadas para guardar en el acopio y esta se deslizo y causo grave cortada. A el oficial de trafico le dieron los primeros auxilios correspondientes en obra y se emitió a la clínica occidente donde le dieron 5 días de incapacidad.

***Componente Ambiental***

***-Informe semanal 37:*** Aprobado
***-Informe Mensual 8:*** Aprobado
***-Calificación: 100%***

La Interventoría manifiesta que se radicara el día de hoy al FDLK

***Componente Gestión Social***

***-Informe semanal 37:*** Aprobado
***-Informe Mensual 8:*** Aprobado
***-Calificación:*** 97%

*Se afectó un ítem del componente humano debido a que no cuentan con personal contratado para el levantamiento de actas de vecindad

El contratista manifiesta que el día 23 de junio de 2023 se realizará el comité FDLK No.6.

Indica que de las 17 PQRSD, solo se cuenta con 1 abierta, está abierta porque a una propietaria le fue hurtado el medidor. El día 20 de junio el contratista se comunicó con ella e indico que la EAAB indico que en 48 horas realizaría la instalación. A la fecha el contratista cuenta con el medido instalado, se le solicito no esperar dos meses mientras es remitida la factura, sino que el acueducto remita desde ya la factura para realizar el pago y no tener que esperar tanto tiempo, la propietaria llamo a EAAB e indicaron que toca esperar 8 días para gestionar y remitir la factura y realizar el pago.

***Componente de programación y presupuestos***

La Interventoría informa que en la semana 37 correspondiente al periodo del 15 al 21 de junio de 2023, el contratista continuo con los atrasos como se indica a continuación:

| G1 | CORTE AL 20 DE JUNIO DE 2023 | | |
|---|---|---|---|
| | GENERAL | OBRA | FINANCIERO |
| % PROGRAMADO | 50,53% | 71,69% | 48,50% |
| % EJECUTADO | 26,57% | 26,57% | 14,51% |
| % DESVIACIÓN | -23,96% | -45,11% | -33,99% |

**Se adjunta agenda con los avances físicos y financieros durante la semana.*

***Varios***
El contratista manifiesta que a la fecha cuenta con:

- Las prioridades 22, 24, 25, 21 y 3, para realizar actividades de instalación de mezcla asfáltica, de los cuales 24,25 y 3 están pendientes de cargues.

- Las prioridades 4, 13, 17, 18, 28, 29, 31, 32 y 33, que están pendientes de instalación de canal de monoblock, los cuales equivalen a 798 m.

La Interventoría estima que con la instalación de la mezcla asfáltica y monoblock el contratista podría facturar un promedio de 950 millones de pesos, pero es importante que el contratista indique en qué fecha va realizar estas actividades. La Interventoría manifiesta que el contratista puede salir cuello de botella facturando 2000 millones al mes.

El contratista manifiesta que, si bien es cierta la estimación de la Interventoría, es la falta de flujo de caja lo que los detiene para ejecutar. El FDLK indica que las cuentas de marzo y abril no han podido pagarse puesto que estas tardaron en llegar y el contratista debe ser consiente que administrativamente también se deben cumplir con los tiempos para poder facturar.

El FDLK de igual forma manifiesta al contratista su preocupación puesto que ya se está a casi tres meses de que el contrato culmine, y a la fecha no se ha entregado ninguna de las 43 prioridades terminadas. El proceso de incumplimiento está en trámite, el objetivo del contrato nunca es perjudicar al contratista, pero es claro que se deben regir bajo las obligaciones estipuladas contractualmente puesto que a la fecha se lleva un atraso de por lo menos el 60 %. El FDLK también recomienda al contratista que busque un apoyo económico, puesto que no puede siempre estar sujeto a lo que se facture, y además las cuentas no cubren todo el monoblock que se requiere.

El contratista indica que hay un apalancamiento financiero y ha causado los retrasos, se ha buscado apoyo financiero, y pendiente de la cesión de derechos económicos para poder dar una marcha positiva al contrato.

El contratista manifiesta que está próximo a abrir nuevos frentes de trabajo para darle más celeridad a las actividades iniciales. El FDLK le recuerda que el comité de seguimiento No.34 del 1 de junio de 2023, se comprometió a realizar la entrega de:

-Las prioridades 3,21, 22, 24 y 25 terminada en la semana del 13 al 16 de junio de 2023 y
- las prioridades 13, 14,17,18,28 y 29 en la semana del 26 al 30 de junio de 2023

El contratista manifiesta que a la fecha sigue a la espera de unos papeles de la maquinaria de instalación de asfalto y espera empezar a instalar en la semana del 22 al 28 de junio de 2023 y la semana del 29 de junio al 5 de julio de 2023 los otros 6 CIVs.

La Interventoría solicita al contratista que se comprometa y cumpla con la entrega de estas prioridades, y es cierto que es favorable que abran más frentes de trabajo, pero es más necesario que se vayan terminando y entregando las prioridades que ya se terminaron.

## COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

| BOGOTÁ \| SECRETARÍA DE GOBIERNO | **EVIDENCIA DE REUNIÓN** |
|---|---|

| No | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|---|---|
| 1 | Plan detallado ajustado de acuerdo a las observaciones de la comunicación U233-G1-515-23 del 22 jun 23 | XIE S.A | 23-jun-23 |
| 2 | Propuesta urbanística y presupuestal del cambio de bolardos M63 a M61 | XIE S.A | 23-jun-23 |
| 3 | Solicitud de Reunión con la SDM – Vigencia de señalización | XIE S.A | 22-jun-23 |
| 4 | Solución del acceso a vivienda de la Prioridad 30 | XIE S.A | 23-jun-23 |
| 5 | Inventario redes secas | XIE S.A | 23-jun-23 |
| 6 | Recorrido especialistas redes secas. | XIE S.A - SCLV | 23-jun-23 |
| 7 | Simulación de acta parcial final con cantidades a la fecha | XIE S.A - SCLV | 28-jun-23 |

Elaborada por: Interventoría – Juan Manuel Alba Rojas
Fecha de la próxima reunión: 29 de junio de 2023 Lugar de la próxima reunión: NA

**AGENDA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO**

**Contratista de Obra XIE S.A – COP -621-22 Grupo 1**

**COMITÉ DE SEGUIMIENTO No.37**

**Fecha: 22 de junio 2023**

**ORDEN DEL DIA**

| **1.Compromisos** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No** | **Asunto** | **Responsable** | **Fecha de compromiso** | **Cumplió SI/NO** |
| **1** | Plan detallado de trabajo ajustado de las prioridades intervenidas a la fecha (Se solicita incluir el listado por CIV que contenga el monoblock y A80, en cuanto tiempo los van a ejecutar, cuantas cuadrillas van a requerir e informar en que prioridades se va a instalar monoblock) | Contratista | 15-jun-23 | SI |
| **2** | Cronograma de Inspecciones CCTV | Contratista | 15-jun-23 | SI |
| **3** | Propuesta urbanística y presupuestal del cambio de bolardos M63 a M62 | Contratista | 21-jun-23 | NO |
| **4** | Solicitud de Reunión con la SDM – Vigencia de señalización | Contratista | 21-jun-23 | |
| **5** | Informe mensual No. 8 (mayo) Componente Tránsito y transporte | Contratista | 15-jun-23 | SI |
| **6** | Radicación de la cuenta de abril | Contratista | 16-jun-23 | SI |
| **7** | Radicación de cuenta del mes de abril G1 al FDLK | Interventoría | 21-jun-23 | SI |
| **8** | Oficio al FDLK con trazabilidad de las solicitudes al PIGA de la resolución 1257 de 2021. | Interventoría | 22-jun-23 | SI |
| **9** | Relación de viviendas que no acceden a la adecuación de bajantes para gestionar visita con la Policía. | Contratista | 21-jun-23 | NO |
| **10** | Solución del acceso a vivienda de la Prioridad 30 | Contratista | 21-jun-23 | NO |
| **11** | Cantidades de diseño geométrico de los 43 CIV actualizadas. | Contratista | 20-jun-23 | SI |
| **12** | Inventario redes secas | Contratista | 21-jun-23 | NO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **13** | Recorrido especialistas de transito. | Contratista e Interventoría | 20-jun-23 | |
| **14** | Recorrido especialistas espacio público y urbanismo | Contratista e Interventoría | 20-jun-23 Reprogramación 21-jun-23 | SI |
| **15** | Recorrido especialistas redes secas. | Contratista e Interventoría | 20-jun-23 Reprogramación 23-jun-23 | |

**2. Componentes**

**A. Técnico**

- **Informes semanales mayo y junio:** Sin radicar
- **Informe Mensual 8:** Sin radicar
- **Acta No.10 de recibo parcial No.8 (mayo):** Sin radicar
- **Cuenta No. 8 (mayo):** Sin radicar
- **Calificación:** 93%

**B. SST**

- **Informe semanal 37:** Aprobado
- **Informe Mensual 8:** Observado
- **Ingresos en la semana:** 12
- **Retiros en la semana:** 3
- **Total Personal Obra:** 50
- **Calificación:** 100%

**C. Ambiental**

- **Informe semanal 37:** Aprobado
- **Informe Mensual 8:** Aprobado
- **Calificación:** 100%

**D. Gestión Social**

- **Informe semanal 37:** Aprobado
- **Informe Mensual 8:** Aprobado
- **Calificación:** 97%

**Se afectó un ítem del componente humano debido a que no cuentan con personal contratado para el levantamiento de actas de vecindad*

**Varios**

**Obra**

| Prioridad | CIV | Actividades desarrolladas en la Semana |
|---|---|---|
| 4 | 8001069 | **Calzada:** Sin actividades.<br>**Andén oriental:** Sin actividades.<br>**Andén occidental:** Sin actividades. |
| 32 | 8000979 | **Calzada**: Se realiza instalación parcial de bordillo A-80 costado oriental 11.50ML del K0+016.5 al K0+028.<br>**Andén oriental:** Se realiza instalación parcial de concreto 3000psi 33.2m2 del K0+000 al K0+060.<br>**Andén occidental:** Se realiza instalación parcial de concreto 3000psi 9.76m2 del K0+000 al K0+060. |

| Prioridad | CIV | Actividades desarrolladas en la Semana |
|---|---|---|
| 28 | 8000929 | **Calzada:** Se realiza excavación parcial en intersección de la prioridad 28 y 29 3.92m3.<br>**Andén oriental:** Se realiza instalación parcial de bordillo A-80 4.55ML del K0+000 al K0+060, instalación parcial de concreto 3000psi 10.69m2 del K0+000 al K0+060.<br>**Andén occidental:** Se realiza instalación parcial de bordillo A-80 2.04 ML del K0+000 al K0+060, instalación parcial de concreto 3000psi 5.25m2 del K0+000 al K0+060. |
| 29 | 8000996 | **Calzada:** Sin actividades.<br>**Andén oriental:** Sin actividades.<br>**Andén occidental:** Sin actividades. |
| 24 | 8000871 | **Calzada:** Sin actividad.<br>**Andén oriental:** Sin actividad.<br>**Andén occidental** Sin actividades. |
| 25 | 8000923 | **Calzada:** Sin actividad.<br>**Andén oriental:** Sin actividad.<br>**Andén occidental:** Sin actividad. |
| 21 | 8000821 | **Calzada:** Sin actividad.<br>**Andén oriental:** Sin actividad.<br>**Andén occidental:** Sin actividad. |
| 22 | 8000864 | **Calzada:** Sin actividad.<br>**Andén oriental**: Sin actividad.<br>**Andén occidental:** Sin actividad. |
| 3 | 8000957 | **Calzada:** Sin actividad.<br>**Andén oriental:** Sin actividad.<br>**Andén occidental:** Sin actividad. |
| 13 | 8000772 | **Calzada:** Sin actividad.<br>**Andén occidental:** Se realiza instalación de concreto 3000 psi para anden 18m2 del K0+000 al K0+060, instalación parcial de bordillo A-80 2.81ML del K0+000 al K0+060.<br>**Andén oriental:** Se realiza instalación de concreto 3000 psi para anden 17m2 del K0+000 al K0+060, instalación parcial de bordillo A-80 4.72ML del K0+000 al K0+060. |
| 14 | 8000814 | **Calzada:** Sin actividad.<br>**Andén oriental:** Sin actividad.<br>**Andén occidental:** Se realiza instalación parcial de bordillo A-80 4.97ML del K0+000 al K0+060. |
| 17 | 8000794 | **Calzada:** Se realiza instalación de bordillo A-80 10.68ML del K0+011 al K0+029.<br>**Andén oriental:** Se realiza instalación parcial de bordillo A-80 3.18ML del K0+000 al K0+060. |

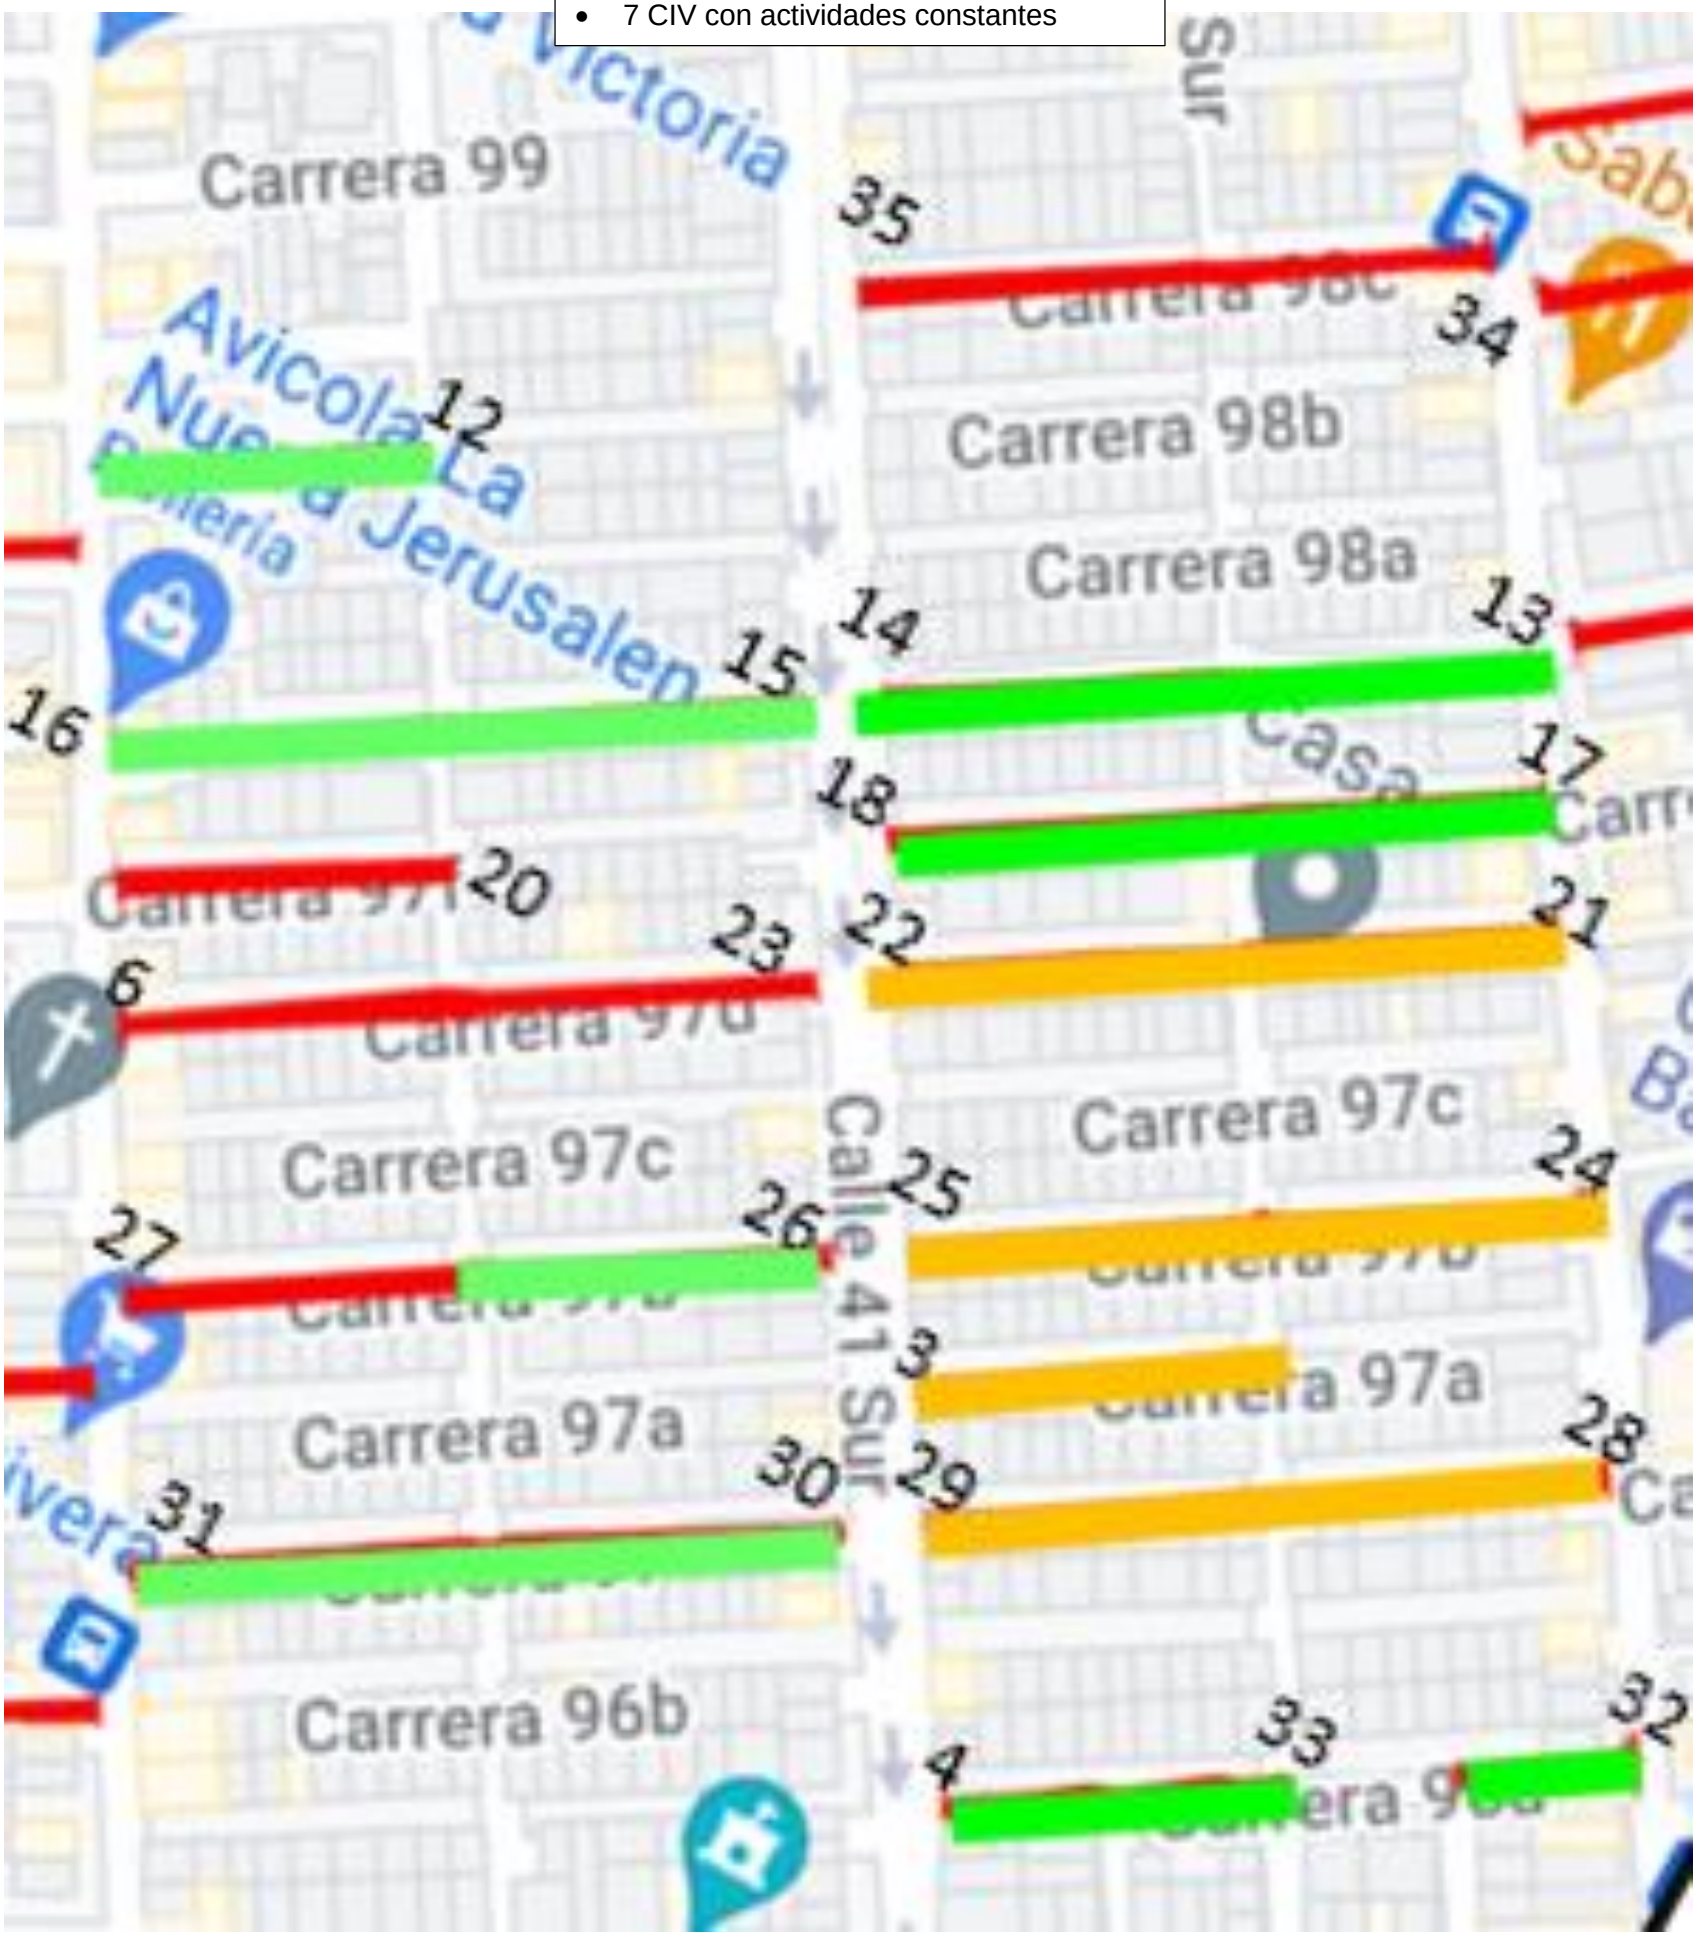
| Prioridad | CIV | Actividades desarrolladas en la Semana |
|---|---|---|
| | | **Andén occidental:** Se realiza instalación parcial de concreto para rampa MR41 4000psi 16.95m2 del K0+000 al K0+060, instalación de concreto 3000 psi para anden 10.04m2 del K0+000 al K0+060 |
| 18 | 8000839 | **Calzada:** Se realiza instalación de base estabilizada 10.68m3 del K0+039.38 al K0+050.<br>**Andén oriental:** Se realiza instalación parcial de concreto para rampa MR41 4000psi 11,69m2 del K0+000 al K0+060, instalación de concreto 3000 psi para anden 22.07m2 del K0+000 al K0+060.<br>**Andén occidental:** Se realiza instalación parcial de concreto para rampa MR41 4000psi 17.53m2 del K0+000 al K0+060, instalación de concreto 3000 psi para anden 15.67m2 del K0+000 al K0+060 |
| 33 | 8001041 | **Calzada:** Se realiza instalación de sumideros en calzada 2und, excavación manual de sumidero a pozo 2.46m3.<br>**Andén oriental:** Sin actividad.<br>**Andén occidental:** Sin actividad. |
| 31 | 8001058 | **Calzada:** Sin actividad.<br>**Andén oriental:** Se realiza nivelación y compactación de fresado en anden del K0+000 al K0+060, instalación parcial de bordillo A-80 10.6ML del K0+000 al K0+060.<br>**Andén occidental:** Se realiza nivelación y compactación de fresado en anden del K0+000 al K0+060. |
| 30 | 8001125 | **Calzada:**<br>**Andén oriental:** Se realiza instalación parcial de concreto para rampa MR41 4000psi 18.64m2 del K0+000 al K0+060, instalación de concreto 3000 psi para anden 34m2 del K0+000 al K0+060, instalación parcial de bordillo A-80 costado oriental 12.90ML del K0+000 al K0+060.<br>**Andén occidental:** Se realiza instalación parcial de concreto para rampa MR41 4000psi 17.58m2 del K0+000 al K0+060, instalación de concreto 3000psi para anden 16m2 del K0+000 al K0+060. |
| 12 | 8000849 | **Calzada:** Se realiza instalación de primera base estabilizada 30.4m3 del K0+053 al K0+015.<br>**Andén oriental:** Se realiza demolición parcial de concreto en anden 48,77m2 del K0+000 al K0+060, excavación parcial en anden 28.40m3 del K0+000 al K0+060<br>**Andén occidental:** Sin actividad. |
| 15 | 8000856 | **Calzada:** Se realiza instalación de geotextil 252m2 del K0+000 al K0+063.10, Se realiza instalación de geo- |

| Prioridad | CIV | Actividades desarrolladas en la Semana |
|---|---|---|
| | | celda 252m2 del K0+000 al K0+063.10, instalación de fresado 45m3 del K0+000 al K0+063.1, nivelación y compactación de sub-rasante 252.4m2 del K0+000 al K0+063.10, excavación mecánica 36m3 del K0+030 al K0+063.10, se realiza retiro de material 75m3, retiro de material 30m3.<br>**Andén oriental:** Sin actividad.<br>**Andén occidental:** Sin actividad. |
| 16 | 8000907 | **Calzada:** Se realiza apertura de la prioridad se utiliza para cerramiento 130ML, se inicia excavación mecánica 145m3 del K0+000 al K0+060.46, nivelación y compactación de sub-rasante 241.84m2 del K0+000 al K0+060.46, instalación de geotextil 220m2 del K0+000 al K0+055<br>instalación de geo-celda 220m2 del K0+000 al K0+030, instalación de fresado 40m3 del K0+000 al K0+030, se realiza retiro de material de excavación 45m3.<br>**Andén oriental:** Sin actividad.<br>**Andén occidental:** Sin actividad. |
| 26 | 8000988 | **Calzada:** Se realiza apertura de la prioridad se utiliza para cerramiento 131ML, se inicia excavación mecánica 79m3 del K0+030al K0+062.8, se realiza retiro de material de excavación 165m3.<br>**Andén oriental:** Sin actividad.<br>**Andén occidental:** Sin actividad. |

| G1 | CORTE AL 20 DE JUNIO DE 2023 | | |
|---|---|---|---|
| | GENERAL | OBRA | FINANCIERO |
| % PROGRAMADO | 50,53% | 71,69% | 48,50% |
| % EJECUTADO | 26,57% | 26,57% | 14,51% |
| % DESVIACIÓN | -23,96% | -45,11% | -33,99% |

**Semana 37 (15 al 21 de junio 23)**

- 7 Frentes de obra – 20 CIV abiertos
- 7 CIV con actividades constantes




| Nomenclatura | |
|---|---|
| | Frente de obra Activo |
| | Frente de obra Intermitente |
| | Frente de obra Inactivo |
| | Frente de obra sin inicio |

# ESTADO SEMANAL DE PROCESO CONSTRUCTIVO

**SEMANA No. 37 (15 al 21 de junio de 2023)**

**CONTRATISTA DE OBRA GRUPO 1 -CVK22 COP 621-22**

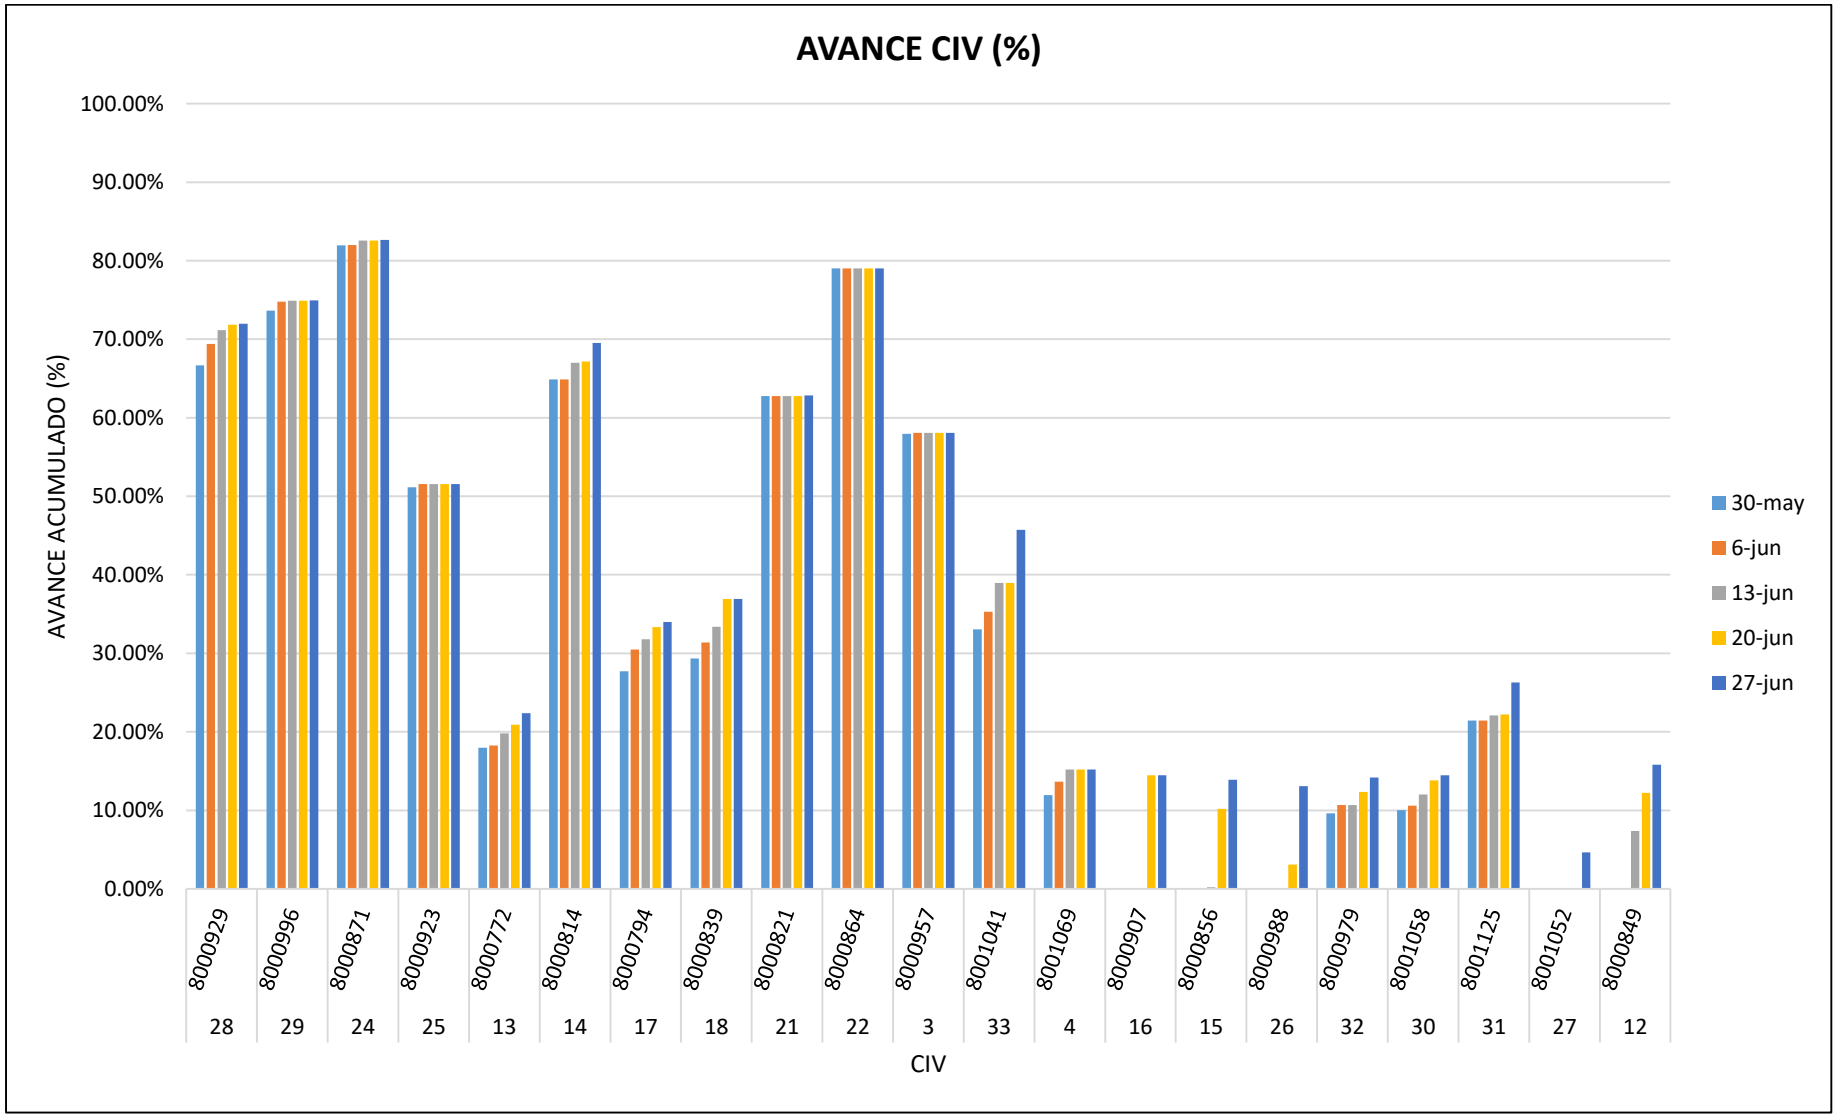
| | PK_ID ANDEN | PK_ID ANDEN | 3 | | | 4 | | | 13 | | | 14 | | | 17 | | | 18 | | | 21 | | | 22 | | | 24 | | | 25 | | | 28 | | | 29 | | | 30 | | | 31 | | | 32 | | | 33 | | | 12 | | | 15 | | | 16 | | | 26 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIA | ORIENTAL | OCCIDENTAL | VIA (156201) | ORI (29896) | OCC (29897) | VIA (156189) | ORI (29872) | OCC (29873) | VIA (156220) | ORI (29934) | OCC (29935) | VIA (156221) | ORI (29936) | OCC (29937) | VIA (156216) | ORI (29926) | OCC (29927) | VIA (156217) | ORI (29928) | OCC (29929) | VIA (156212) | ORI (29918) | OCC (29919) | VIA(156213) | ORI (29920) | OCC(29921) | VIA(156204) | ORI(29902) | OCC(29903) | VIA(156205) | ORI (29904) | OCC(29905) | VIA(156196) | ORI(29886) | OCC(29887) | VIA(156197) | ORI (29888) | OCC(29889) | VIA(156198) | ORI (29890) | OCC(29891) | VIA(156199) | ORI(29892) | OCC(29893) | VIA(156186) | ORI (29866) | OCC(29867) | VIA(156188) | ORI (29870) | OCC(29871) | VIA(156231) | ORI (29956) | OCC(29957) | VIA(156222) | ORI(29938) | OCC(29939) | VIA(156223) | ORI (29940) | OCC(29941) | VIA(156206) | ORI (29940) | OCC(29941) |
| EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE) | DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO Y CAJAS DE INSPECCION. | DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO Y CAJAS DE INSPECCION. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE. | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REDES HIDRAULICAS | GEOTEXTIL | GEOTEXTIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GEOTEXTIL, GEOCELDA HDPE PERFORADA, RELLENO CON FRESADO SOBRE GEOCELDA | PRIMERA CAPA DE FRESADO | PRIMERA CAPA DE FRESADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRIMERA CAPA FRESADO (RAP) ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 3% Y ADITIVO POTENCIALIZADOR (1.3 KG/M3 - SOLID SOIL). | SEGUNDA CAPA DE FRESADO | SEGUNDA CAPA DE FRESADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CANAL DE DRENAJE PREFABRICADO EN POLYCONCRETO MONOBLOCK. | CONSTRUCCION CAJAS DE INSPECCION, CAJILLAS DE AGUA POTABLE | CONSTRUCCION CAJAS DE INSPECCION, CAJILLAS DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEGUNDA CAPA FRESADO (RAP) ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 3% Y ADITIVO POTENCIALIZADOR (1.3 KG/M3 - SOLID SOIL). | BORDILLO PREFABRICADO A80 | BORDILLO PREFABRICADO A80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEZCLA ASFALTICA | CONCRETO DE 3000PSI Y MR41 | CONCRETO DE 3000 PSI Y MR41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| TERMINADO | |
| EJECUCION | |
| INTERMITENTE | |
| SIN INICIAR | |
| NO APLICA | |

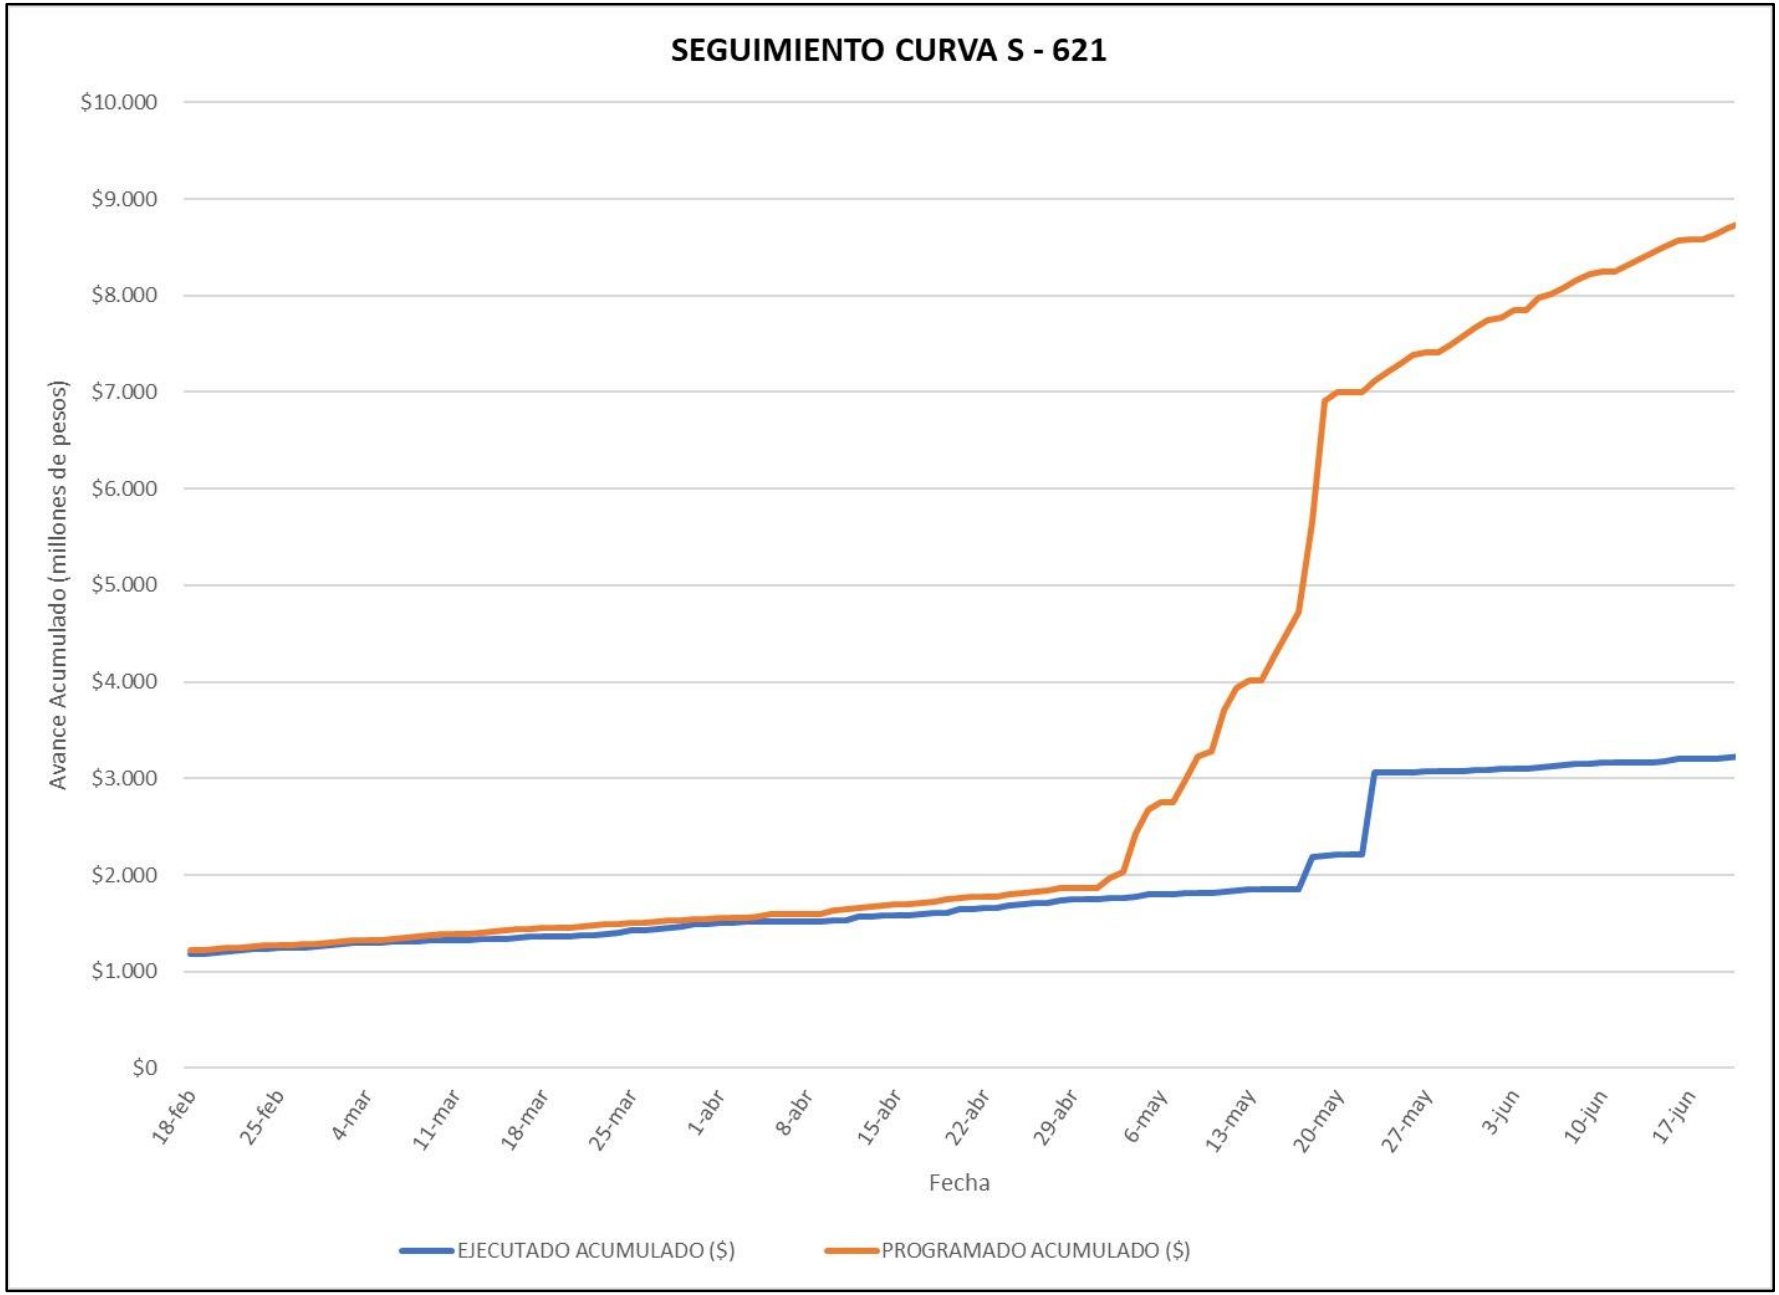
**CONSORCIO SCLV**
**NIT 900.547.145-2**

**EVALUACIÓN**
**GRUPO 1 COP-621-22**

| FECHA EVALUACIÓN | | | 23-may | 30-may | 6-jun | 13-jun | 20-jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | CIV | VALOR TOTAL CIV | % AVANCE DEL CIV | % AVANCE DEL CIV | % AVANCE DEL CIV | % AVANCE DEL CIV | % AVANCE DEL CIV |
| 28 | 8000929 | $ 286 285 298.00 | 62.78% | 64.24% | 65.55% | 68.11% | 68.96% |
| 29 | 8000996 | $ 242 229 956.95 | 102.56% | 102.75% | 102.75% | 103.34% | 103.34% |
| 24 | 8000871 | $ 269 517 473.15 | 99.81% | 100.01% | 100.01% | 101.01% | 101.01% |
| 25 | 8000923 | $ 345 626 779.89 | 98.93% | 98.93% | 98.93% | 98.93% | 98.93% |
| 13 | 8000772 | $ 289 860 253.15 | 39.75% | 39.94% | 39.94% | 44.39% | 46.26% |
| 14 | 8000814 | $ 414 590 745.60 | 70.41% | 70.41% | 70.41% | 71.02% | 71.08% |
| 17 | 8000794 | $ 305 729 990.38 | 45.62% | 46.00% | 46.00% | 48.77% | 50.34% |
| 18 | 8000839 | $ 414 390 409.14 | 49.44% | 49.49% | 49.49% | 52.72% | 55.39% |
| 21 | 8000821 | $ 379 185 734.00 | 73.29% | 73.29% | 73.29% | 73.29% | 73.29% |
| 22 | 8000864 | $ 407 701 220.24 | 98.71% | 98.71% | 98.71% | 101.53% | 101.53% |
| 3 | 8000957 | $ 324 515 767.59 | 97.29% | 97.29% | 97.29% | 97.29% | 97.29% |
| 33 | 8001041 | $ 148 920 206.67 | 29.80% | 30.53% | 30.53% | 35.65% | 35.65% |
| 4 | 8001069 | $ 154 073 695.45 | 28.21% | 28.21% | 30.81% | 36.28% | 36.28% |
| 16 | 8000907 | $ 361 864 228.92 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 15 | 8000856 | $ 314 966 117.90 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.10% |
| 26 | 8000988 | $ 248 815 938.04 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 6 | 8000977 | $ 313 656 771.99 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 32 | 8000979 | $ 151 794 191.30 | 27.03% | 27.59% | 29.76% | 29.76% | 34.66% |
| 30 | 8001058 | $ 307 025 458.10 | 22.93% | 24.23% | 24.70% | 24.70% | 29.21% |
| 20 | 8000938 | $ 379 247 233.34 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 31 | 8001125 | $ 295 012 954.84 | 23.85% | 25.90% | 26.30% | 26.99% | 27.17% |
| 8 | 8002417 | $ 433 765 201.90 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 9 | 8002500 | $ 331 158 979.28 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 27 | 8001052 | $ 384 495 380.79 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 12 | 8000849 | $ 417 435 434.91 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.18% |
| 23 | 8000916 | $ 341 149 570.13 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 5 | 8000655 | $ 454 907 485.31 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 40 | 8011953 | $ 616 993 900.08 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 8011960 | $ 668 954 068.44 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 1 | 8000687 | $ 442 058 339.95 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 7 | 8000736 | $ 455 102 661.47 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |


AVANCE CIV (%)
AVANCE ACUMULADO (%)
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
30-may
6-jun
13-jun
20-jun
27-jun
8000929
8000996
8000871
8000923
8000772
8000814
8000794
8000839
8000821
8000864
8000957
8001041
8001069
8000907
8000856
8000988
8000979
8001058
8001125
8001052
8000849
28
29
24
25
13
14
17
18
21
22
3
33
4
16
15
26
32
30
31
27
12
CIV

| FECHA EVALUACIÓN | | | 20-jun |
|---|---|---|---|
| P | CV | VALOR TOTAL CIV | %AVANCE DEL CIV |
| 28 | 8000929 | $ 286 285 298.00 | 0.85% |
| 29 | 8000996 | $ 242 229 956.95 | 0.00% |
| 24 | 8000871 | $ 269 517 473.15 | 0.00% |
| 25 | 8000923 | $ 345 626 779.89 | 0.00% |
| 13 | 8000772 | $ 289 860 253.15 | 1.86% |
| 14 | 8000814 | $ 414 590 745.60 | 0.06% |
| 17 | 8000794 | $ 305 729 990.38 | 1.57% |
| 18 | 8000839 | $ 414 390 409.14 | 2.67% |
| 21 | 8000821 | $ 379 185 734.00 | 0.00% |
| 22 | 8000864 | $ 407 701 220.24 | 0.00% |
| 3 | 8000957 | $ 324 515 767.59 | 0.00% |
| 33 | 8001041 | $ 148 920 206.67 | 0.00% |
| 4 | 8001069 | $ 154 073 695.45 | 0.00% |
| 16 | 8000907 | $ 361 864 228.92 | 0.00% |
| 15 | 8000856 | $ 314 966 117.90 | 0.00% |
| 26 | 8000988 | $ 248 815 938.04 | 0.00% |
| 6 | 8000977 | $ 313 656 771.99 | 0.00% |
| 32 | 8000979 | $ 151 794 191.30 | 4.90% |
| 30 | 8001058 | $ 307 025 458.10 | 4.52% |
| 20 | 8000938 | $ 379 247 233.34 | 0.00% |
| 31 | 8001125 | $ 295 012 954.84 | 0.18% |
| 8 | 8002417 | $ 433 765 201.90 | 0.00% |
| 9 | 8002500 | $ 331 158 979.28 | 0.00% |
| 27 | 8001052 | $ 384 495 380.79 | 0.00% |
| 12 | 8000849 | $ 417 435 434.91 | 0.05% |
| 23 | 8000916 | $ 341 149 570.13 | 0.00% |
| 5 | 8000655 | $ 454 907 485.31 | 0.00% |
| 40 | 8011953 | $ 616 993 900.08 | 0.00% |
| 10 | 8011960 | $ 668 954 068.44 | 0.00% |
| 1 | 8000687 | $ 442 058 339.95 | 0.00% |
| 7 | 8000736 | $ 455 102 661.47 | 0.00% |


SEGUIMIENTO CURVA S - 621
$10.000
$9.000
$8.000
$7.000
$6.000
$5.000
$4.000
$3.000
$2.000
$1.000
$0
Avance Acumulado (millones de pesos)
18-feb
25-feb
4-mar
11-mar
18-mar
25-mar
1-abr
8-abr
15-abr
22-abr
29-abr
6-may
13-may
20-may
27-may
3-jun
10-jun
17-jun
Fecha
EJECUTADO ACUMULADO ($)
PROGRAMADO ACUMULADO ($)

**CONSORCIO SCLV**
**NIT 900.547.145-2**

**EVALUACIÓN - GRUPO 1 COP-621-22**

| | | | SEGUIMIENTO GRUPO 1 AL 20-JUNIO-2023 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P** | **CIV** | **VALOR CIV** | **PROG-ACUM ($)** | **PROG-ACUM (%)** | **EJEC-ACUM ($)** | **EJEC-ACUM (%)** | **PESO EJEC PROG (%)** | **ATRASO (%)** |
| 28 | 8000929 | $ 286 285 298.00 | $ 286 285 298.00 | 2.36% | $ 197 415 255.34 | 1.63% | 68.96% | -0.73% |
| 29 | 8000996 | $ 242 229 956.95 | $ 242 229 956.95 | 2.00% | $ 250 319 524.75 | 2.06% | 103.34% | 0.07% |
| 24 | 8000871 | $ 269 517 473.15 | $ 269 517 473.15 | 2.22% | $ 272 234 308.44 | 2.24% | 101.01% | 0.02% |
| 25 | 8000923 | $ 345 626 779.89 | $ 345 626 779.89 | 2.85% | $ 341 937 801.60 | 2.82% | 98.93% | -0.03% |
| 13 | 8000772 | $ 289 860 253.15 | $ 289 860 253.15 | 2.39% | $ 134 080 707.69 | 1.11% | 46.26% | -1.28% |
| 14 | 8000814 | $ 414 590 745.60 | $ 414 590 745.60 | 3.42% | $ 294 686 314.09 | 2.43% | 71.08% | -0.99% |
| 17 | 8000794 | $ 305 729 990.38 | $ 305 729 990.38 | 2.52% | $ 153 899 515.20 | 1.27% | 50.34% | -1.25% |
| 18 | 8000839 | $ 414 390 409.14 | $ 414 390 409.14 | 3.42% | $ 229 526 696.58 | 1.89% | 55.39% | -1.52% |
| 21 | 8000821 | $ 379 185 734.00 | $ 379 185 734.00 | 3.13% | $ 277 890 269.03 | 2.29% | 73.29% | -0.84% |
| 22 | 8000864 | $ 407 701 220.24 | $ 407 701 220.24 | 3.36% | $ 413 939 504.20 | 3.41% | 101.53% | 0.05% |
| 3 | 8000957 | $ 324 515 767.59 | $ 324 515 767.59 | 2.68% | $ 315 724 368.60 | 2.60% | 97.29% | -0.07% |
| 33 | 8001041 | $ 148 920 206.67 | $ 148 920 206.67 | 1.23% | $ 53 094 167.00 | 0.44% | 35.65% | -0.79% |
| 4 | 8001069 | $ 154 073 695.45 | $ 154 073 695.45 | 1.27% | $ 55 890 352.50 | 0.46% | 36.28% | -0.81% |
| 16 | 8000907 | $ 361 864 228.92 | $ 361 864 228.92 | 2.98% | $ 0.00 | 0.00% | 0.00% | -2.98% |
| 15 | 8000856 | $ 314 966 117.90 | $ 314 966 117.90 | 2.60% | $ 309 631.00 | 0.00% | 0.10% | -2.59% |
| 26 | 8000988 | $ 248 815 938.04 | $ 248 815 938.04 | 2.05% | $ 0.00 | 0.00% | 0.00% | -2.05% |
| 6 | 8000977 | $ 313 656 771.99 | $ 313 656 771.99 | 2.59% | $ 0.00 | 0.00% | 0.00% | -2.59% |
| 32 | 8000979 | $ 151 794 191.30 | $ 151 794 191.30 | 1.25% | $ 52 612 041.41 | 0.43% | 34.66% | -0.82% |
| 30 | 8001058 | $ 307 025 458.10 | $ 307 025 458.10 | 2.53% | $ 89 684 158.82 | 0.74% | 29.21% | -1.79% |
| 20 | 8000938 | $ 379 247 233.34 | $ 379 247 233.34 | 3.13% | $ 0.00 | 0.00% | 0.00% | -3.13% |
| 31 | 8001125 | $ 295 012 954.84 | $ 295 012 954.84 | 2.43% | $ 80 143 907.00 | 0.66% | 27.17% | -1.77% |
| 8 | 8002417 | $ 433 765 201.90 | $ 294 006 801.72 | 2.42% | $ 0.00 | 0.00% | 0.00% | -2.42% |
| 9 | 8002500 | $ 331 158 979.28 | $ 210 423 934.75 | 1.73% | $ 0.00 | 0.00% | 0.00% | -1.73% |
| 27 | 8001052 | $ 384 495 380.79 | $ 384 495 380.79 | 3.17% | $ 0.00 | 0.00% | 0.00% | -3.17% |
| 12 | 8000849 | $ 417 435 434.91 | $ 313 518 774.74 | 2.58% | $ 571 420.00 | 0.00% | 0.18% | -2.58% |
| 23 | 8000916 | $ 341 149 570.13 | $ 341 149 570.13 | 2.81% | $ 0.00 | 0.00% | 0.00% | -2.81% |
| 5 | 8000655 | $ 454 907 485.31 | $ 199 022 024.82 | 1.64% | $ 0.00 | 0.00% | 0.00% | -1.64% |
| 40 | 8011953 | $ 616 993 900.08 | $ 179 236 727.97 | 1.48% | $ 0.00 | 0.00% | 0.00% | -1.48% |
| 10 | 8011960 | $ 668 954 068.44 | $ 166 175 560.43 | 1.37% | $ 0.00 | 0.00% | 0.00% | -1.37% |
| 1 | 8000687 | $ 442 058 339.95 | $ 136 044 853.04 | 1.12% | $ 0.00 | 0.00% | 0.00% | -1.12% |
| 7 | 8000736 | $ 455 102 661.47 | $ 115 646 975.65 | 0.95% | $ 0.00 | 0.00% | 0.00% | -0.95% |
| **TOTALES** | | | **$ 8 694 731 028.68** | **71.69%** | **$ 3 213 959 943.25** | **26.50%** | | **-45.19%** |
| **TOTAL DE OBRA** | | | **$ 12 128 504 795.00** | | | | | |
