BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo De Desarrollo Local de Kennedy

FECHA: 29- Jun - 23 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** FDLK - 61.

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de seguimiento No. 38.

HORA DE INICIO: 2:30 pm **HORA DE FINALIZACIÓN:** ____

ASISTENTES:

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Lucas Restrepo Largo			X						X	Interventoría	u233sclvkennedy@outlook.com	3002133006	
ROSALIDA MONGUA			X						X	CONTRATISTA XIE S.A.	xie.kennedy621 residente@gmail.com	3223141853	
Manuel Alejandro Miguel Garcia			X						X	XIE SA. Director de Proyectos	xie.director.proyectos621@gmail.com	3242149472.	
Oscar Vargas			X										
ARTURO ZARATE			X						X	INTERVENTORÍA	arturozaratem91@yahoo.com	3152368031	
Danilo Meneses Toro			x						x	FDLK-INFRAESTRUCTURA	Danilo.Meneses@gobiernobogota.gov.co	3118988039	
Juan Manuel Alba Rojo			X						X	Interventoria	gerencia@movilidad.co	3107671843	
Laura Daniela Díaz			x							Interventoria	dlaura0898@gmail.com	3168270441	

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno a Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	**EVIDENCIA DE REUNIÓN**

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se da inicio al comité de seguimiento No. 38 en las instalaciones del FDLK a las 2: 30 pm, con la presencia del contratista de obra grupo 1 XIE S.A, Interventoría Consorcio SCLV y supervisores del FDLK

Orden del día

1. Compromisos pendientes

- ***Plan detallado ajustado de acuerdo a las observaciones de la comunicación U233-G1-515-23 del 22 jun 23:*** La interventoría manifiesta que la programación radica por el contratista de obra nuevamente está basada en el avance financiero y no físico como se ha venido solicitando en varios comités. Es decir que los avances presentados por el contratista no demuestran el avance ejecutado físicamente por el contratista.

  El contratista con esta programación y cantidades no alcanza a realizar ni el 0.5% de avance semanal de inversión. El contratista manifiesta que con la programación presentada tiene los siguientes pasos para la ejecución de cada uno de los CIV:

  1. Estabilización de la vía
  2. Demolición de espacio publico
  3. Instalación de monoblock
  4. Excavación
  5. Fundida

  El contratista manifiesta que ha presentado unos atrasos puesto que, ya que no se cuenta con el monoblock por falta de presupuesto, se instala un bordillo para poder fundir el espacio público y luego se retira. El contratista indica que tiene muy claro que las dos actividades que son prioridad son instalar monoblock e instalar la mezcla asfáltica.

  La Interventoría indica que el contratista indica que no ha dado ninguna alternativa para poder avanzar, el contratista manifiesta que no ha tiene flujo de caja para poder realizar la ejecución oportuna.

  La Interventoría manifiesta que la programación esta errónea, puesto que esta se modificó con las actividades y cantidades ya ejecutas desde los inicios, y esta debió ajustarse después de culminado el plan de contingencia. El contratista indica que se está viendo muy afectado por la calificación.

  Se hacen dos presiones por parte de la Interventoría al contratista:

  - La función de la Interventoría es calificar el avance del contratista de acuerdo al apéndice F (calificación del PMT) establecido contractualmente. Si en algún momento la interventoría falla en esa calificación, se traerá a comité para resolver la controversia.

  La Interventoría le indica al contratista que no puede presentar un avance que no cuente con los avales y las mediciones revisadas en campo.

El contratista menciona que la obra inicio el 4 de octubre realizando las verificaciones iniciales, no inicio la obra en los tiempos por ajustes. Con la realización de estos ajustes fue posible avanzar en las actividades de obra, un ejercicio técnico e ingenieril que termino beneficiando a la comunidad en el alcance del logro de los CIV. Uno de los factores que también influyo en estos ajustes fue la determinación de nuevos precios los cuales se pactaron mucho después.

El contratista manifiesta que para realizar estos avances debió realizar actividades de octubre a diciembre., porque para los meses de enero a marzo no se contó con un presupuesto y aun así sigue ejecutando. No se cuenta con presupuesto. La Interventoría manifiesta que los pagos realizados para el mes de diciembre eran pagos de monoblock y el contratista de obra no realizo la compra de competa de este material.

El contratista tiene un acta firma el monoblock se respaldaba con una orden de compra.

El FDLK indica que es evidente que uno de los problemas del contratista para ejecutar es el flujo de caja, y hasta que no se facturo lo que se tiene a la fecha no podrán salir de los atrasos que tienen en obra, pero que también es cierto que el contratista de obra no ha podido encontrar un apoyo financiero para ir avanzando. Estas cuentas que están por pagar marzo y abril, mayo no ha sido pasada a la Interventoría

El FDLK solicita al contratista de obra pasar una propuesta o un plan de acción donde informen que se realizara con el recurso para salir de los atrasos. No es una programación, lo que se debe presentar.

- ***Propuesta urbanística y presupuestal del cambio de bolardos M63 a M61:*** La Interventoría informa que el compromiso se cumplió tardíamente. El contratista instalara al bolardo de concreto al mismo precio de la propuesta económica, está pendiente por aprobación de la Interventoría.

- ***Solicitud de Reunión con la SDM – Vigencia de señalización:*** la interventoría remitió la solicitud de prórroga de los diseños de señalización del contratista a la SDM, por 4 meses.

- ***Solución del acceso a vivienda de la prioridad 30:*** El contratista a la fecha no ha remitido la solución económica y técnica a la Interventoría. El contratista manifiesta que se realizó por la parte del componente social el acta de cierre.

- ***Inventario redes secas:*** El contratista manifiesta que se realizó recorrido con los especialistas de redes secas, se entregaron planos de gas natural. La interventoría informa al contratista que mientras no se radique de manera oficial el inventario de redes secas, este seguirá presentándose como incumplido.

- ***Simulación de acta parcial final con cantidades a la fecha:*** El contratista manifiesta que no pudo realizar la entrega, puesto que se estaba poniendo al día con los informes semanales. El contratista manifiesta que realizara la entrega con las cantidades a la fecha.

2. Componentes

Componente Técnico
-Informes semanales mayo y junio: Se encuentran en revisión de la Interventoría

-Informe Mensual 8 (mayo): Sin radicar. El contratista manifiesta que solo le falta ajustar las cantidades y posteriormente se radicara el informe. El contratista estima que realizara la radicación el martes 3 de julio de 2023.

-Pre-Acta No.10 de recibo parcial No.8 (mayo): En revisión de interventoría. La Interventoría manifiesta que hará la revisión minuciosa con el fin de realizar la entrega de observaciones, de presentarse, el sábado 1 de julio de 2023.

El contratista manifiesta que la revisión de las cuentas y cantidades se han atendido y resolver por parte de la Interventoría y contratista de manera rápida y eso ha permitido que se avance de manera ágil la radicación de las cuentas.

La Interventoría por su parte manifiesta que darles celeridad a las cuentas en los tiempos no contractuales, ha causado un desgaste significativo, puesto que se evidencia que hay varias observaciones que son repetitivas. Es por ello que la Interventoría no está de acuerdo con las mesas de trabajo, puesto que se está viendo descuidada la visita en obra.

-Cuenta No. 8 (mayo): Sin radicar

-Calificación: 90%

-Obra: El contratista conto con 7 frentes de obra, se cuenta con 11 CIVs abiertos con trabajos permanentes y 10 CIVs sin actividades.

**Se adjunta agenda que contiene plano y cuadro de actividades por prioridades*

Componente SST
-Informe semanal 38: Aprobado
-Informe Mensual 8: Observado
-Ingresos en la semana: 1
-Retiros en la semana: 3
-Calificación: 95.76%

**Calificación afectada por el ítem 24 del componente de maquinaria y equipo*

Componente Ambiental
-Informe semanal 38: Aprobado

-Informe Mensual 8: Aprobado
-Calificación: 95.76%

**Calificación afectada por el ítem 24 del componente de maquinaria y equipo*

Componente de Gestión Social
-Informe semanal 38: Aprobado
-Informe Mensual 8: Aprobado
-Calificación: 97%

**Se afectó un ítem del componente humano debido a que no cuentan con personal contratado para el levantamiento de actas de vecindad*

Componente de Programación y presupuestos
De acuerdo con la programación inicial aprobada, el contratista de obra grupo 1, sigue presentando atrasos. Se evidencia que el avance semanal es del 0.45 % el cual ha ocasionado un atraso en 4 meses. A la fecha el contratista de obra ha realizado una ejecución total del 27.28%, es decir que le falta un 72.72% para terminar actividades de obra a tres meses de terminar el contrato.

G1	27-jun-23		
	GENERAL	OBRA	FINANCIERO
% PROGRAMADO	50,50%	74,15%	50,50%
% EJECUTADO	30,28%	27,28%	14,51%
% DESVIACIÓN	-20,22%	-46,86%	-35,99%

**Se adjunta agenda con los avances físicos y financieros durante la semana.*

3. Varios

La Interventoría informa que se ha revisado el tema de los sumideros, pero se solicita al contratista una trazabilidad, el contratista tenía un sumidero contractualmente, el contratista manifiesta que no se tenía el diseño de los sumideros se tuvo que realizar un detalle, la interventoría manifiesta que el contratista llevo a campo un sumidero prefabricado, pero tenía problemas con el tanque.

Esa propuesta de sumidero se presentó a la EAAB para hacer una validación del diseño, el contratista manifiesta que en primer lugar se realizó una validación hidráulica en la cual el volumen equiparable al bosquejo que fue entregado por la consultoría cumpliera. La Interventoría manifiesta al contratista que este análisis nunca fue entregado de manera oficial a la interventoría.

La Interventoría manifiesta que el contratista instalo los sumideros prefabricados, el FDLK había indicado al contratista que hasta que no se contara con el aval del delegado de la zona de la EAAB el Ingeniero Javier Patiño, este no podría instalarse.

El contratista fue con una propuesta a la EAAB en donde el delegado le indico al contratista que cambiara el tanque y solicito que se construyera en ladrillo. El contratista entrego tres propuestas, las cuales ninguna fue aprobado por la EAAB. Dio una nueva propuesta la cual fue aprobada por la interventoría para el mes de marzo, en esta propuesta se indicaba que solo se aceptaban 4 vigas e incluir la propuesta de que la pieza para la conexión la iba a fabricar el proveedor TITAN. El contratista indica que comprometieron a consultar con TITAN a ver si podían realizar la pieza con ellos, pero el proveedor indico que se necesitaban al menos 100 piezas para poder fabricarles.

En base a la propuesta presentada y a probada por la EAAB, el contratista debía hacer la presentación de NPs a la interventoría para el mes de marzo. A la fecha el contratista presenta un análisis de precios unitarios con otra propuesta. El contratista hace la precisión de que se realizó la construcción de un solo sumidero con mampostería doble como los solicito la EAAB, el cual funcionaba, se realizó la modificación de la pieza superior – cabezal como se indicaba (modificación que fue realizada por el proveedor concretarte), el delgado del EAAB estuvo presente en esta instalación en campo, pero objeto la propuesta, no fue aprobada. La Interventoría manifiesta que eso no quedo en acta.

El delegado de EAAB le indico al contratista que debía implementar un pendiente del 2% utilizando un prefabricado en la parte superior, escribiendo eso en acta y presentar la propuesta a la Interventoría. La Interventoría indica que la nueva propuesta está en revisión, pero genera controversia que se salte de una propuesta a otra, porque no hay justificación escrita, técnica y económica para realizar el cambio. El contratista debe realizar un alcance explicando el cambio y el respectivo análisis de precios unitarios.

El contratista remitirá un oficio solicitando a la EAAB con una visita a campo de la inspección de la instalación de sumideros para realizar acta.

Por otra parte, la Interventoría informa al contratista que la calificación seguirá viendo se afecta en el componente técnico por no contar con lo estipulado en el Anexo f – PMT. Si bien es cierto que la zona sufre mucho por el vandalismo, se deben implementar medidas y acciones que aseguren y no afecten la obra.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Solución técnica y económica del acceso a vivienda de la Prioridad 30	XIE S.A	6-jul-23
2	Inventario redes secas	XIE S.A	6-jul-23
3	Simulación de acta parcial final con cantidades a la fecha	XIE S.A - SCLV	6-jul-23

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	**EVIDENCIA DE REUNIÓN**

4	Solicitud de recorrido delegado EAAB – Sumideros	XIE S.A	6-jul-23

Elaborada por: Interventoría – Juan Manuel Alba Rojas
Fecha de la próxima reunión: 6 de julio de 2023 Lugar de la próxima reunión: NA

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

AGENDA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO

Contratista de Obra XIE S.A – COP -621-22 Grupo 1

COMITÉ DE SEGUIMIENTO No.38

Fecha: 29 de junio 2023

ORDEN DEL DIA

1.Compromisos				
No	**Asunto**	**Responsable**	**Fecha de compromiso**	**Cumplió SI/NO**
1	Plan detallado ajustado de acuerdo a las observaciones de la comunicación U233-G1-515-23 del 22 jun 23	Contratista	23-jun-23	NO
	Propuesta urbanística y presupuestal del cambio de bolardos M63 a M61	Contratista	23-jun-23	SI
2	Solicitud de Reunión con la SDM – Vigencia de señalización	Contratista	22-jun-23	SI
	Solución del acceso a vivienda de la Prioridad 30	Contratista	23-jun-23	NO
5	Inventario redes secas	Contratista	23-jun-23	NO
6	Recorrido especialistas redes secas.	Contratista e Interventoría	23-jun-23	Solo asisto la interventoría
7	Simulación de acta parcial final con cantidades a la fecha	Contratista e interventoría	28-jun-23	NO

2. Componentes A.
Técnico
- **Informes semanales mayo y junio:** Aprobados parcialmente
- **Informe Mensual 8:** Sin radicar
- **Pre-Acta No.10 de recibo parcial No.8 (mayo):** En revisión de interventoría.
- **Cuenta No. 8 (mayo):** Sin radicar
- **Calificación: 90**%
B. SST
- **Informe semanal 38:** Aprobado
- **Informe Mensual 8:** Observado
- **Ingresos en la semana:** 1
- **Retiros en la semana:** 3
- **Calificación:** 95.76%% **Calificación afectada por el ítem 24 del componente de maquinaria y equipo*
C. Ambiental
- **Informe semanal 38:** Aprobado
- **Informe Mensual 8:** Aprobado
- **Calificación:** 95.76% ***Calificación afectada por el ítem 24 del componente de maquinaria y equipo**

D. Gestión Social
- **Informe semanal 38:** Aprobado
- **Informe Mensual 8:** Aprobado
- **Calificación:** 97% **Se afectó un ítem del componente humano debido a que no cuentan con personal contratado para el levantamiento de actas de vecindad*
Varios
Obra

Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la Semana
4	8001069	**Calzada:** Excavación parcial de pozo a sumidero. **Andén oriental:** Sin actividades. **Andén occidental:** Sin actividades.
32	8000979	**Calzada**: Sin actividad. **Andén oriental:** Se realiza instalación parcial de concreto para rampa MR41 4000psi 12.13m2 del K0+000 al K0+060. **Andén occidental:** Se realiza instalación parcial de concreto para rampa MR41 4000psi 29.07m2 del K0+000 al K0+060, instalación parcial de concreto 3000psi 5,65m2 del K0+000 al K0+060.
28	8000929	**Calzada:** Se realiza excavación parcial manual en intersección de la prioridad 29 y 28. **Andén oriental**: Se realiza instalación parcial de marcos en cajas de inspección del K0+000 al K0+060. **Andén occidental:** Se realiza instalación parcial de marcos en cajas de inspección del K0+000 al K0+060.
29	8000996	**Calzada:** Se realiza instalación parcial de bordillo A-80 3.89ML en intersección de la prioridad 28 y 29. **Andén oriental:** Sin actividades. **Andén occidental:** Sin actividades.
24	8000871	**Calzada:** Se realiza instalación parcial de bordillo A-80 5.28ML en intersección de la prioridad 25 y 24, excavación manual en intersección de la prioridad 25 y 24 0.16m3. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental** Sin actividades.
25	8000923	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.
21	8000821	**Calzada:** Se realiza instalación parcial de bordillo A-80 5.71ML, excavación manual en intersección de la prioridad 25 y 24 0.17m3. **Andén oriental:** Sin actividad.

Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la Semana
		Andén occidental: Sin actividad.
22	8000864	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental**: Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.
3	8000957	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.
13	8000772	**Calzada:** Sin actividad. **Andén occidental:** Se realiza instalación de concreto 3000 psi para anden 21.29m2 del K0+000 al K0+060 **Andén oriental:** Se realiza instalación parcial de bordillo A-80 12.21ML del K0+000 al K0+060, instalación de concreto 3000 psi para anden 6.74m2 del K0+000 al K0+060, instalación parcial de concreto para rampa MR41 4000psi 13.93m2 del K0+000 al K0+060, demolición de concreto parcial en anden 5.56m2 del K0+000 al K0+060.
14	8000814	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Se realiza instalación de concreto 3000 psi para anden 6.58m2 del K0+000 al K0+060, **Andén occidental:** Se realiza instalación parcial de bordillo A-80 3.97ML del K0+000 al K0+060, instalación de concreto 3000 psi para anden 4.59m2 del K0+000 al K0+060, instalación parcial de concreto para rampa MR41 4000psi 12.12m2 del K0+000 al K0+060
17	8000794	**Calzada:** Se realiza instalación de bordillo A-80 costado oriente 5.75ML del K0+050 al K0+056, costado occidente 5.75ML del K0+050 al K0+056. **Andén oriental:** Se realiza instalación parcial de bordillo A-80 13.14ML del K0+000 al K0+060. **Andén occidental:** Se realiza instalación parcial de bordillo A-80 6.07ML del K0+000 al K0+060.
18	8000839	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.
33	8001041	**Calzada:** Se realiza instalación de tubería corrugada de 12 pulgadas de pozo a sumidero costado oriente 8.61ML, costado occidente 8.50ML, instalación de arena de peña para recubrimiento de tubería 5.18m3. **Andén oriental:** Se realiza excavación mecánica parcial en anden 16,82m3 del K0+000 al K0+060, instalación parcial de geotextil 33,63m2 del K0+000 al K0+060, instalación parcial de fresado 11.78m3 del K0+000 al

Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la Semana
		K0+060, instalación parcial de bordillo A-80 22.24ML del K0+000 al K0+060, instalación parcial de concreto para rampa MR41 4000psi 27.2m2 del K0+000 al K0+060, instalación de concreto 3000 psi para anden 21.01m2 del K0+000 al K0+060 **Andén occidental:** Se realiza instalación parcial de concreto para rampa MR41 4000psi 12.79m2 del K0+000 al K0+060.
31	8001058	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Se realiza instalación parcial de concreto para rampa MR41 4000psi 38.46m2 del K0+000 al K0+060, instalación parcial de bordillo A-80 6.72ML del K0+000 al K0+060, instalación de concreto 3000 psi para anden 43.25m2 del K0+000 al K0+060 **Andén occidental:** Se realiza instalación de bordillo A-80 24ML del K0+005 al K0+029.
30	8001125	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Se realiza instalación parcial de concreto para rampa MR41 4000psi 6.09m2 del K0+000 al K0+060, instalación parcial de bordillo A-80 14.58ML del K0+000 al K0+060. **Andén occidental:** Se realiza instalación parcial de bordillo A-80 12.04ML del K0+000 al K0+060, instalación parcial de concreto para rampa MR41 4000psi 17.23m2 del K0+000 al K0+060
12	8000849	**Calzada:** Se realiza instalación de base estabilizada 12m3 del K0+000 al K0+015. **Andén oriental:** Se realiza demolición parcial de concreto en anden 46.22m2 del K0+000 al K0+060, excavación parcial en anden 4.58m3 del K0+000 al K0+060, demolición parcial de cajas de inspección 2.43m3 del K0+000 al K0+060, construcción parcial de cajas de inspección 9 unidades del K0+000 al K0+060. **Andén occidental:** Se realiza demolición parcial de concreto en anden 31.5m2 del K0+000 al K0+060, excavación parcial en anden 12.89m3 del K0+000 al K0+060.
15	8000856	**Calzada:** Se realiza céreo de fresado y nivelación para recubrimiento de geo-celda del K0+000 al K0+060, instalación de base estabilizada 26.48m3 del K0+030 al K0+063.10. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.

Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la Semana
16	8000907	**Calzada:** Se realiza céreo de fresado y nivelación para recubrimiento de geo-celda del K0+000 al K0+060. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.
26	8000988	**Calzada:** Se realiza excavación mecánica 24m3 del K0+040al K0+050 y 48m3 del K0+000al K0+020, nivelación y compactación de sub-rasante 251.2m2 del K0+000al K0+062.8, instalación parcial de geotextil 52m2 del K0+000al K0+062.8, instalación parcial de geo-celda 52m2 del K0+000al K0+062.8, instalación parcial de fresado 9.36m3 del K0+000al K0+062.8, se realiza retiro de material de excavación 105m3 **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.
27	8001052	**Calzada:** Se realiza excavación mecánica 124.76m3 del K0+000 al K0+063.63, instalación de geotextil 40m2 del K0+000al K0+010, instalación parcial de geo-celda 40m2 del K0+000al K0+010, instalación parcial de fresado 7.20m3 del K0+000al K0+010 se realiza retiro de material de excavación 270m3. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.

SEGUIMIENTO DIARIO EN MILLONES DE PESOS						
FECHA	22-jun	23-jun	24-jun	25-jun	26-jun	27-jun
PROGRAMADO ACUMULADO ($)	$8.806	$8.862	$8.881	$8.881	$8.937	$8.993
PROGRAMADO ACUMULADO (%)	72,61%	73,07%	73,22%	73,22%	73,68%	74,15%
EJECUTADO ACUMULADO ($)	$3.235	$3.254	$3.270	$3.270	$3.283	$3.309
EJECUTADO ACUMULADO (%)	26,68%	26,83%	26,96%	26,96%	27,07%	27,28%
DESVIACIÓN ($)	$ 5.571	$ 5.609	$ 5.611	$ 5.611	$ 5.654	$ 5.684
DESVIACIÓN (%)	-45,93%	-46,24%	-46,26%	-46,26%	-46,62%	-46,86%

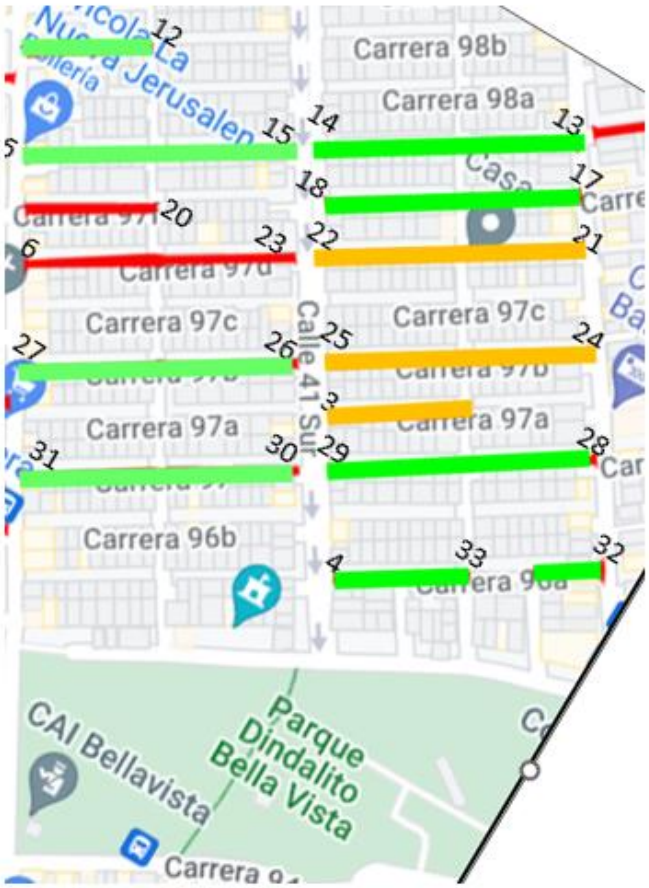
G1	27-jun-23		
	GENERAL	OBRA	FINANCIERO
% PROGRAMADO	50,50%	74,15%	50,50%
% EJECUTADO	30,28%	27,28%	14,51%
% DESVIACIÓN	-20,22%	-46,86%	-35,99%

Al c

Frentes de obra en la semana del 21 al 27 de junio de 2023:

Frentes de obra: 7

CIV abiertos: 21



Nomenclatura	
	Frente de obra Activo
	Frente de obra Intermitente
	Frente de obra Inactivo
	Frente de obra sin inicio

ESTADO SEMANAL DE PROCESO CONSTRUCTIVO

CONTRATISTA DE OBRA GRUPO 1 -CVK22 COP 621-22

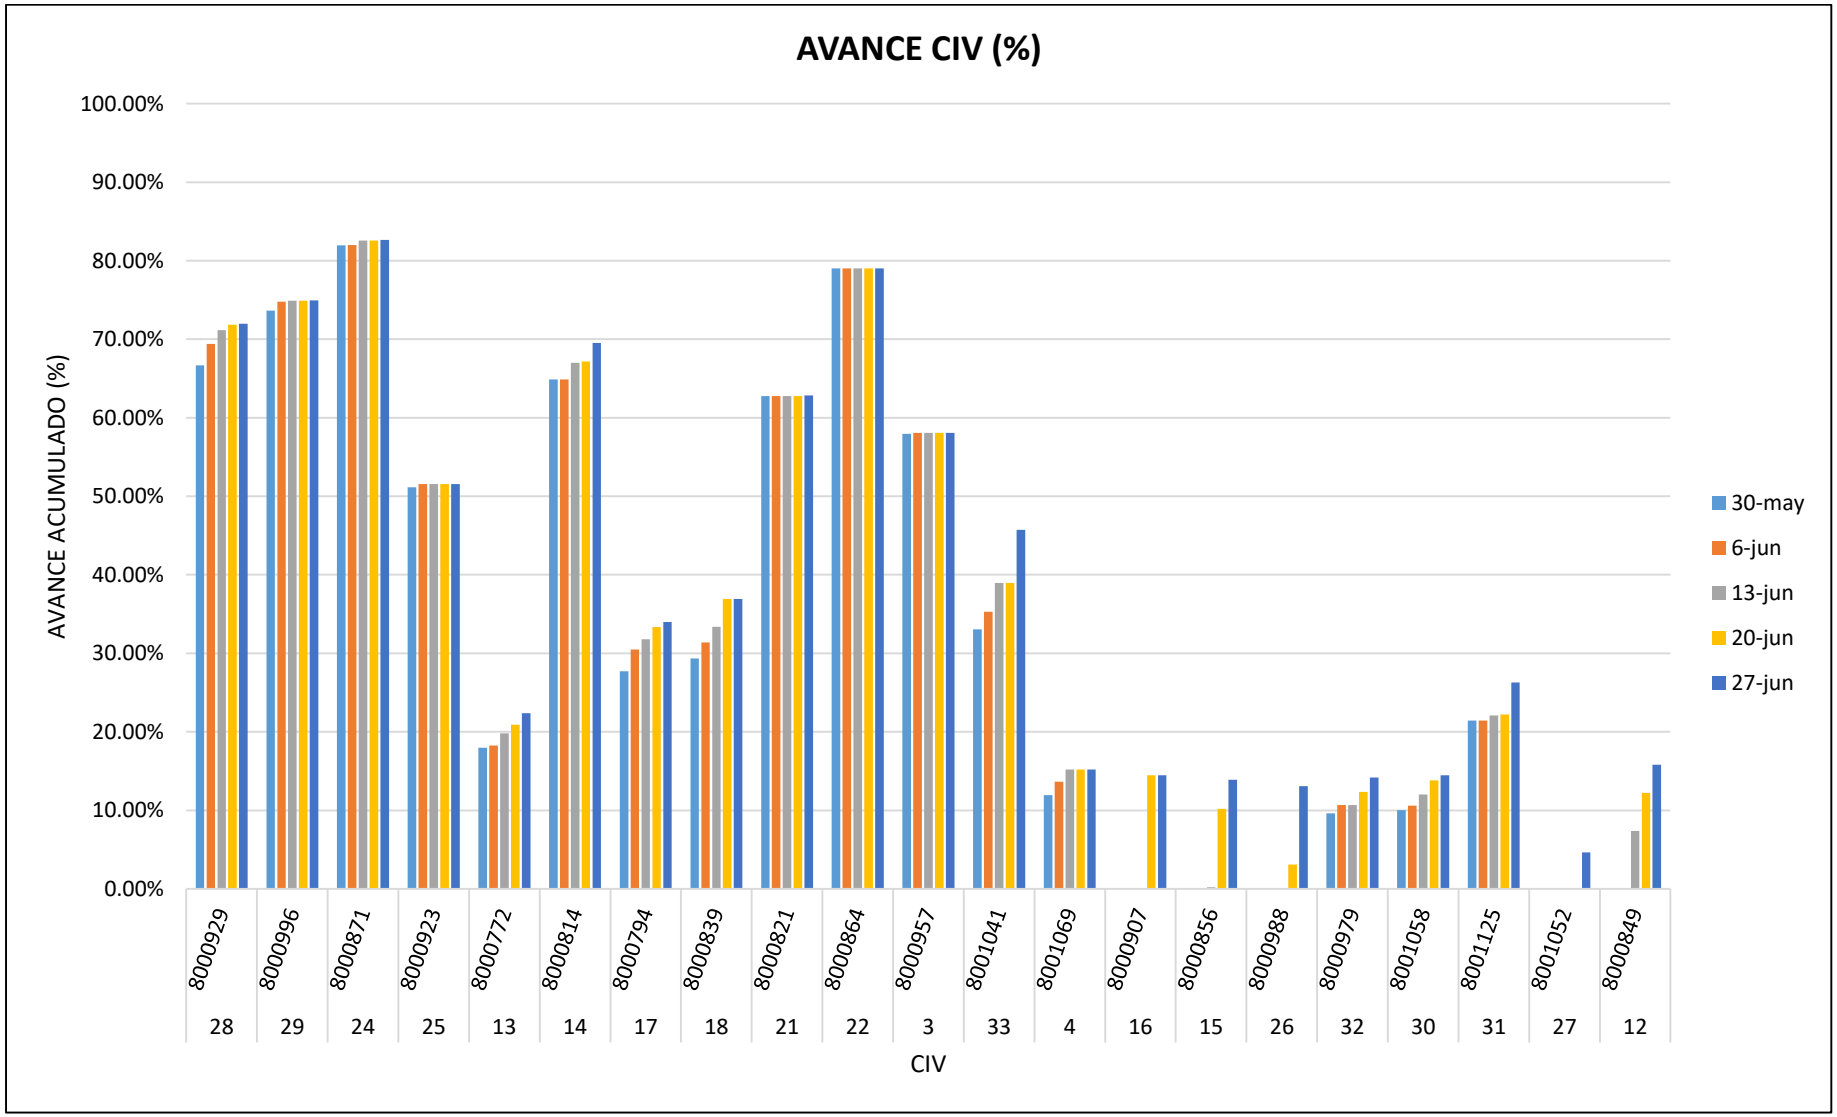
	PK_ID ANDEN	PK_ID ANDEN	3			4			13			14			17			18			21			22			24			25			28			29			30			31			32			33			12			15			16			26			27		
VIA	ORIENTAL	OCCIDENTAL	VIA (156201)	ORI (29886)	OCC (29897)	VIA (156189)	ORI (29872)	OCC (29873)	VIA (156220)	ORI (29934)	OCC (29935)	VIA (156221)	ORI (29936)	OCC (29937)	VIA (156216)	ORI (29926)	OCC (29927)	VIA (156217)	ORI (29928)	OCC (29929)	VIA (156212)	ORI (29918)	OCC (29919)	VIA(156213)	ORI (29920)	OCC(29921)	VIA(156204)	ORI(29902)	OCC(29903)	VIA(156205)	ORI (29904)	OCC(29905)	VIA(156196)	ORI(29886)	OCC(29887)	VIA(156197)	ORI(29888)	OCC(29889)	VIA(156198)	ORI(29890)	OCC(29891)	VIA(156199)	ORI(29892)	OCC(29893)	VIA(156186)	ORI(29866)	OCC(29867)	VIA(156188)	ORI(29870)	OCC(29871)	VIA(156231)	ORI(29956)	OCC(29957)	VIA(156222)	ORI(29938)	OCC(29939)	VIA(156223)	ORI(29940)	OCC(29941)	VIA(156206)	ORI(29940)	OCC(29941)	VIA(156207)	ORI(29908)	OCC(29909)
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO Y CAJAS DE INSPECCION.	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO Y CAJAS DE INSPECCION.																																																													
NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.																																																													
REDES HIDRAULICAS	GEOTEXTIL	GEOTEXTIL																																																													
GEOTEXTIL, GEOCELDA HDPE PERFORADA, RELLENO CON FRESADO SOBRE GEOCELDA	PRIMERA CAPA DE FRESADO	PRIMERA CAPA DE FRESADO																																																											
PRIMERA CAPA FRESADO (RAP) ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 3% Y ADITIVO POTENCIALIZADOR (1.3 KG/M3 - SOLID SOIL).	SEGUNDA CAPA DE FRESADO	SEGUNDA CAPA DE FRESADO																																																												
CANAL DE DRENAJE PREFABRICADO EN POLYCONCRETO MONOBLOCK.	CONSTRUCCION CAJAS DE INSPECCION, CAJILLAS DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION CAJAS DE INSPECCION, CAJILLAS DE AGUA POTABLE																																																												
SEGUNDA CAPA FRESADO (RAP) ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 3% Y ADITIVO POTENCIALIZADOR (1.3 KG/M3 - SOLID SOIL).	BORDILLO PREFABRICADO A80	BORDILLO PREFABRICADO A80																																																											
MEZCLA ASFALTICA	CONCRETO DE 3000PSI Y MR41	CONCRETO DE 3000 PSI Y MR41																																																											

TERMINADO	
EJECUCION	
INTERMITENTE	
SIN INICIAR	
NO APLICA	

CONSORCIO SCLV
NIT 900.547.145-2

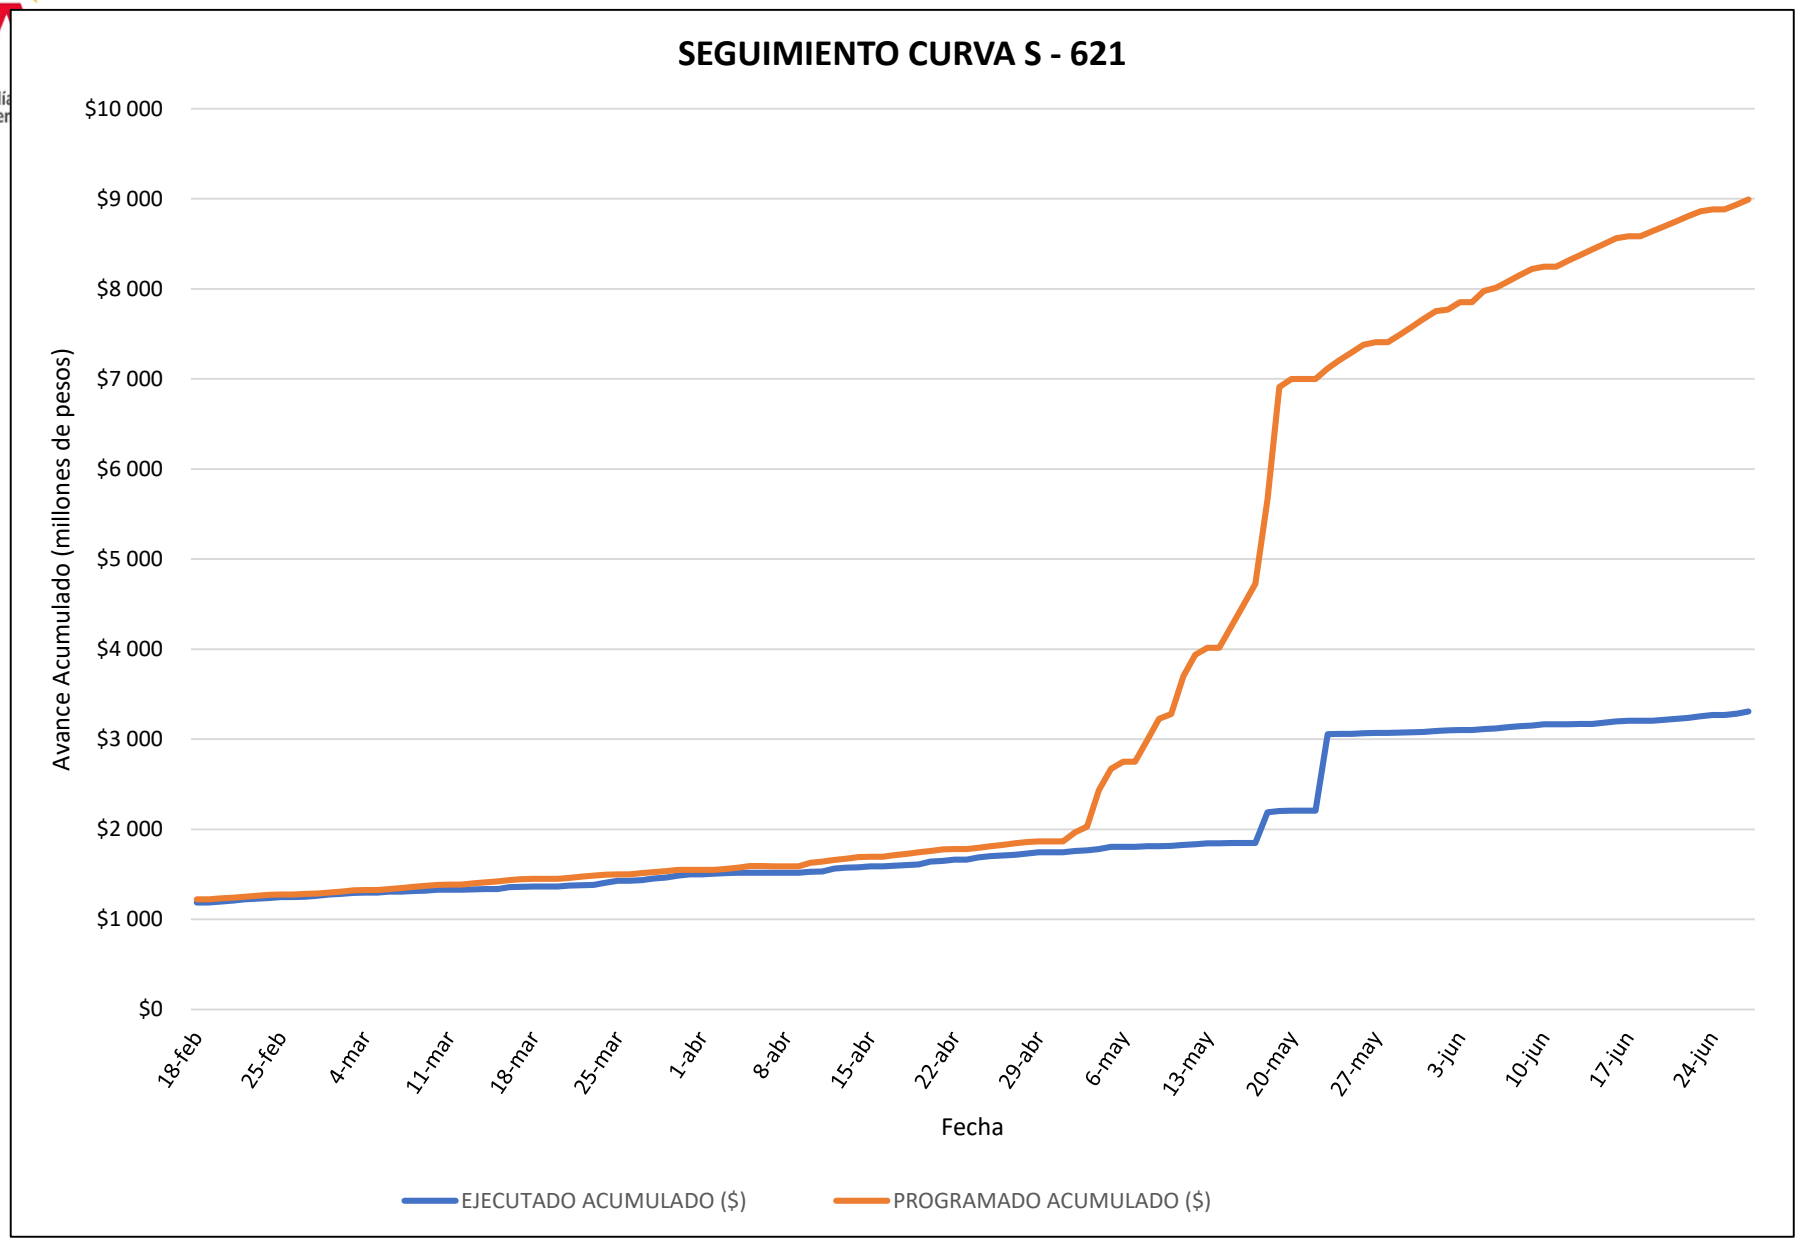
EVALUACIÓN PLAN DE CONTINGENCIA - GRUPO 1 COP-621-22

			SEGUIMIENTO GRUPO 1 AL 27-JUNIO-2023				
P	**CIV**	**VALOR CIV**	**PROG-ACUM (%)**	**EJEC-ACUM ($)**	**EJEC-ACUM (%)**	**PESO EJEC PROG (%)**	**ATRASO (%)**
28	8000929	$ 286 285 298.00	2.36%	$ 197 740 312.03	1.63%	69.07%	-0.73%
29	8000996	$ 242 229 956.95	2.00%	$ 250 511 111.12	2.07%	103.42%	0.07%
24	8000871	$ 269 517 473.15	2.22%	$ 272 500 094.84	2.25%	101.11%	0.02%
25	8000923	$ 345 626 779.89	2.85%	$ 341 937 801.60	2.82%	98.93%	-0.03%
13	8000772	$ 289 860 253.15	2.39%	$ 140 942 207.49	1.16%	48.62%	-1.23%
14	8000814	$ 414 590 745.60	3.42%	$ 298 612 224.65	2.46%	72.03%	-0.96%
17	8000794	$ 305 729 990.38	2.52%	$ 155 900 978.82	1.29%	50.99%	-1.24%
18	8000839	$ 414 390 409.14	3.42%	$ 229 526 696.58	1.89%	55.39%	-1.52%
21	8000821	$ 379 185 734.00	3.13%	$ 278 177 591.99	2.29%	73.36%	-0.83%
22	8000864	$ 407 701 220.24	3.36%	$ 413 939 504.20	3.41%	101.53%	0.05%
3	8000957	$ 324 515 767.59	2.68%	$ 315 724 368.60	2.60%	97.29%	-0.07%
33	8001041	$ 148 920 206.67	1.23%	$ 67 943 556.00	0.56%	45.62%	-0.67%
4	8001069	$ 154 073 695.45	1.27%	$ 55 890 352.50	0.46%	36.28%	-0.81%
16	8000907	$ 361 864 228.92	2.98%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-2.98%
15	8000856	$ 314 966 117.90	2.60%	$ 12 158 186.47	0.10%	3.86%	-2.50%
26	8000988	$ 248 815 938.04	2.05%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-2.05%
6	8000977	$ 313 656 771.99	2.59%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-2.59%
32	8000979	$ 151 794 191.30	1.25%	$ 60 746 378.63	0.50%	40.02%	-0.75%
30	8001058	$ 307 025 458.10	2.53%	$ 94 683 861.54	0.78%	30.84%	-1.75%
20	8000938	$ 379 247 233.34	3.13%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-3.13%
31	8001125	$ 295 012 954.84	2.43%	$ 93 931 286.16	0.77%	31.84%	-1.66%
8	8002417	$ 433 765 201.90	2.79%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-2.79%
9	8002500	$ 331 158 979.28	2.04%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-2.04%
27	8001052	$ 384 495 380.79	3.17%	$ 19 956 881.71	0.16%	5.19%	-3.01%
12	8000849	$ 417 435 434.91	2.93%	$ 8 247 178.42	0.07%	2.32%	-2.87%
23	8000916	$ 341 149 570.13	2.81%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-2.81%
5	8000655	$ 454 907 485.31	1.98%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-1.98%
40	8011953	$ 616 993 900.08	1.72%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-1.72%
10	8011960	$ 668 954 068.44	1.65%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-1.65%
1	8000687	$ 442 058 339.95	1.40%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-1.40%
7	8000736	$ 455 102 661.47	1.25%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-1.25%
TOTALES			**74.15%**	**$ 3 309 070 573.35**	**27.28%**		**-46.86%**
TOTAL DE OBRA							


AVANCE CIV (%)
AVANCE ACUMULADO (%)
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
30-may
6-jun
13-jun
20-jun
27-jun
8000929
8000996
8000871
8000923
8000772
8000814
8000794
8000839
8000821
8000864
8000957
8001041
8001069
8000907
8000856
8000988
8000979
8001058
8001125
8001052
8000849
28
29
24
25
13
14
17
18
21
22
3
33
4
16
15
26
32
30
31
27
12
CIV

CONSORCIO SCLV
GRUPO 1 - XIE S.A

FECHA EVALUACIÓN			23-may	30-may	6-jun	13-jun	20-jun	27-jun
P	CIV	VALOR TOTAL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV
28	8000929	$ 286 285 298.00	62.78%	64.24%	65.55%	68.11%	68.96%	69.07%
29	8000996	$ 242 229 956.95	102.56%	102.75%	102.75%	103.34%	103.34%	103.42%
24	8000871	$ 269 517 473.15	99.81%	100.01%	100.01%	101.01%	101.01%	101.11%
25	8000923	$ 345 626 779.89	98.93%	98.93%	98.93%	98.93%	98.93%	98.93%
13	8000772	$ 289 860 253.15	39.75%	39.94%	39.94%	44.39%	46.26%	48.62%
14	8000814	$ 414 590 745.60	70.41%	70.41%	70.41%	71.02%	71.08%	72.03%
17	8000794	$ 305 729 990.38	45.62%	46.00%	46.00%	48.77%	50.34%	50.99%
18	8000839	$ 414 390 409.14	49.44%	49.49%	49.49%	52.72%	55.39%	55.39%
21	8000821	$ 379 185 734.00	73.29%	73.29%	73.29%	73.29%	73.29%	73.36%
22	8000864	$ 407 701 220.24	98.71%	98.71%	98.71%	101.53%	101.53%	101.53%
3	8000957	$ 324 515 767.59	97.29%	97.29%	97.29%	97.29%	97.29%	97.29%
33	8001041	$ 148 920 206.67	29.80%	30.53%	30.53%	35.65%	35.65%	45.62%
4	8001069	$ 154 073 695.45	28.21%	28.21%	30.81%	36.28%	36.28%	36.28%
16	8000907	$ 361 864 228.92	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
15	8000856	$ 314 966 117.90	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	0.10%	3.86%
26	8000988	$ 248 815 938.04	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
6	8000977	$ 313 656 771.99	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
32	8000979	$ 151 794 191.30	27.03%	27.59%	29.76%	29.76%	34.66%	40.02%
30	8001058	$ 307 025 458.10	22.93%	24.23%	24.70%	24.70%	29.21%	30.84%
20	8000938	$ 379 247 233.34	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
31	8001125	$ 295 012 954.84	23.85%	25.90%	26.30%	26.99%	27.17%	31.84%
8	8002417	$ 433 765 201.90	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
9	8002500	$ 331 158 979.28	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
27	8001052	$ 384 495 380.79	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.19%
12	8000849	$ 417 435 434.91	0.00%	0.00%	0.00%	0.14%	0.18%	2.32%
23	8000916	$ 341 149 570.13	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
5	8000655	$ 454 907 485.31	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
40	8011953	$ 616 993 900.08	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
10	8011960	$ 668 954 068.44	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
1	8000687	$ 442 058 339.95	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
7	8000736	$ 455 102 661.47	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%


SEGUIMIENTO CURVA S - 621
$10 000
$9 000
$8 000
$7 000
$6 000
$5 000
$4 000
$3 000
$2 000
$1 000
$0
Avance Acumulado (millones de pesos)
18-feb
25-feb
4-mar
11-mar
18-mar
25-mar
1-abr
8-abr
15-abr
22-abr
29-abr
6-may
13-may
20-may
27-may
3-jun
10-jun
17-jun
24-jun
Fecha
EJECUTADO ACUMULADO ($)
PROGRAMADO ACUMULADO ($)
