BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo De Desarrollo Local de Kennedy

FECHA: 13 | Julio | 23 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** CBI

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de Seguimiento No. 40 CIN-717-2022 / COP-621-2022

HORA DE INICIO: _____ **HORA DE FINALIZACIÓN:** _____

ASISTENTES:

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Danilo Meneses Toro			X						X	FDLK-Infraestructura	Danilo.Meneses@gobiernobogota.gov.co	3118988634	
Andres M. Rojas Llanos			X						X	FDLK-Infraestructura	andresm.llanos@gobiernobogota.gov.co	3057037773	
Laura Daniela Diaz			X							Interventoria - SCLV	dlaura0818@gmail.com	3168270441	
Karen Juleth Penagos Ramirez.			X							Interventoria- SCLV	u233kennedyscv@outlook.com	3143253758	
Jorge E. Tamayo Mejía			X						X	Interventoria SCLV	Kennedy.financiero@gmail.com	317.4410997	
Nury Albarracin Daza			X						X	Interventoria SCLV	sst1kennedy@outlook.es	3123230618	
Maria Camila Pera Roa			X						X	XIE. S.A	sse.ambiental@gmail.com	3102457234	
Sandra Pinto			X						X	XIE S.A	xiesst621@gmail.com	3208931058	
Ana Leonor Porras			✓							Interventoria Salud	alexporras@gmail.com	3212074429	
Angie Milena Medina G			✓						X	Contratista XIE SA	XIESOCIAL@outlook.es	3102504180	
Rosa Lida Manguar.			✓						✓	Contratista XIE. SA.	xie.kennedy621.residente@gmail.com	3123141853	
Jaime Vargas G.			X							Enlace Cto.	Jaime.vargas@xie.com.co	3102239569	

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo De Desarrollo Local de Kennedy

FECHA: 13/Julio/23 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** (61)

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de seguimiento No. 40 CIN-717-2022 / COP-621-2022.

HORA DE INICIO: ____ **HORA DE FINALIZACIÓN:** ____

ASISTENTES:

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Lucas Restrepo Lozano			X						X	Interventoría	0233scl kennedy@outlook.com	300233066	
Juan Manuel Alba Rojas		X								Interventoría - SCLV	0233sclvkennedy@outlook.com	3107671842.	
ARTURO ZAMATE			X						X	INTERV. SCLV	arturozamate@yahoo.com	3152268031	
Manuel Alejandro Mogollón Ruiz			X						X	XIESA	xie.interventoria.62@gmail.com	3212144402	
Angeli Anel Acosta			X							Interventoría	0233sclvkennedy@outlook.com	3227401848	

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Comité de seguimiento No.40

Se da inicio al comité de seguimiento No. 40 en las instalaciones de la interventoría con la presencia del contratista de obra grupo 1 – XIE S.A y la supervisión del FDLK.

Orden del día

Componentes

a. Componente Técnico

La Interventoría indica que al corte de la semana No.40 el contratista de obra conto con 9 frentes de obra de los cuales 5 fueron intermitentes.
Se desarrollaron actividades en:

- ***Prioridad 32-33:*** Nivelación de posos de inspección e instalación de bordillos
- ***Prioridad 12:*** Adecuación del espacio público, construcción de cajas de inspección e instalación de fresado.
- ***Prioridad 26-27:*** espacio público
- ***Prioridad 30-31***: adecuación de sumidero e instalación de tubería de 12 pulgadas.

Se evidencia que en las actividades realizadas en la semana no se fundió concreto, se realizaron actividades de céreo de la base estabilizada y actividades de bordillo de confinamiento, actividades que no genera facturación.

El porcentaje de avance ejecutado de la semana fue de 0.07%, el más bajo en lo que lleva el contrato en ejecución. El FDLK manifiesta que el contratista indico que para la semana del presente comité el contratista ya habría instalado el monoblock, pero no se evidencia actividad alguna.

El contratista manifiesta que para ña próxima semana también se desarrollaran las actividades de instalación de monoblock.

El FDLK indica que no confía y mucho menos cree en los compromisos del contratista en la instalación de monoblock y actividades de asfalto, puesto que en varios comités el contratista

manifiesta que realizara las actividades, pero esto solo se ha quedado en palabras, y lo evidenciado en obra ratifica la situación.

El FDLK solicita al contratista reactivar las actividades en obra, puesto que se evidencia que el contratista cuenta con las capacidades, maquinaria equipo para realizar las actividades de manera efectiva y en el menor tiempo posible. Se debe fortalecer el tema desde la gerencia, para que no falten los materiales e insumos requeridos para la ejecución de la obra.

**Se adjunta agenda con las actividades realizadas en la semana.*

Calificación de la semana: 92%. Se afectó porque se trabajó espacio público en PMT en fase 2, y se tenía aprobada era la fase 3.

La Interventoría solicita se agregue un plano de colores, donde se evidencie el estado de ejecución de cada uno de los CIV.

Se evidencia además que se cuenta con 21 CIV a la fecha, con solo 4 frentes activos de los 5 exigidos contractualmente.

El FDLK indica que la contratita en el comité pasado, se comprometió a realizar la entrega de 5 CIV asfaltados para el 14 de julio de 2023, a lo que el contratista responde que este compromiso no podrá ser cumplido ya que no se cuenta aún con el suministro de grano caucho, se espera realizar las actividades de pavimentación la próxima semana.

La Interventoría manifiesta que se remitió al contratista una comunicación en la cual se solicita al contratista un cronograma de instalación de asfalto, con el fin de poder estar al tanto de que días se realizara la actividad y realizar el acompañamiento. El FDLK manifiesta que en el comité de la semana pasada se había solicitado al contratista remitir ese cronograma de pavimentación y que a la fecha debía estar radicado, el contratista manifiesta que ya está hecho, pero no se ha socializado con la interventoría y el día de hoy será radicado.

De ser entregado el día de hoy el cronograma de pavimentación por parte del contratista, la interventoría remitirá al FDLK el concepto dentro de los 3 días hábiles correspondientes.

La Interventoría manifiesta que en cuanto a documentación el contratista:

- ***Informes semanales mayo***: El contratista subsano las observaciones y fueron aprobados por la Interventoría.
- ***Informes semanales junio:*** El contratista se encuentra en atención de observaciones, por temas de programación.
- ***Pre-Acta No.10 de recibo parcial No.8 (mayo):*** En revisión de interventoría V2. La Interventoría indica que se tendrá concepto el 20 de julio de 2023, pero contractualmente se cuenta con 5 días para 1 versiones, para segundas revisiones se cuenta 3 días hábiles. El residente técnico de la interventoría que revisara internamente cuando puede gestionar la revisión.

El FDLK solicita que se revisen los tiempos de revisión, puesto que es el contratista y la Interventoría quienes necesitan facturar, el FDLK solicita que esta semana se tenga concepto por parte de la Interventoría de la pre-acta. La Interventoría manifiesta que tal vez los tiempos están así porque hay tres días a la semana en los cuales se hacen visitas a campo todo el día, visitas que son netamente de campo y no administrativas. El FDLK difiere, he indica que es importante que cuando los residentes técnicos vayan a campo cuentan con un espacio para realizar estas revisiones y se deben cumplan con los tiempos de revisión de los productos remitidos por el contratista.

El FDLK manifiesta que hay atrasos en la radicación de mayo y junio, es necesario nivelarse para facturar en los cortes y fechas correspondientes, puesto que si se radican las cuentas el 20 de julio de 2023 es mucho tiempo y el FDLK no podrá realizar los pagos. A la fecha las cuentas ya deberían estar radicadas. Se recomienda al contratista e interventoría dar celeridad al tema.

- ***Pre-Acta No.10 de recibo parcial No.9 (junio):*** El contratista se encuentra en atención de observaciones. Puesto que los documentos no contaban con las cantidades de diseño geométrico, documentos sin firmas.
- ***Informe mensual No. 8 (mayo):*** Sin radicar

b. Componente Ambiental

-Informe semanal 40: Observado

-Informe Mensual 9 (junio): El contratista manifiesta que la Interventoría remitió las observaciones el 11 de julio de 2023 y se remitió la atención de estas observaciones el 12 de julio de 2023, se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.

-Calificación semanal: **100%**
El contratista solicita al FDLK respuesta del PIGA, el FDLK indica que se pondrá en contacto con el área encargada para revisar en que va el radicado.

c. Componente de Gestión social

-***Informe semanal 39:*** Aprobado

-Informe Mensual 9 (junio): El contratista manifiesta que fue enviado a interventoría el 30 de junio de 2023 y la interventoría emitió observaciones el 12 de julio de 2023 y se emitió la respuesta a la Interventoría.

-Calificación semanal: 98%, el contratista manifiesta que la calificación fue afectada por la desinformación en los volantes de terminación de las prioridades 24,25, 17,18,13,14, 21, 22 y 3. Se realizó mesa de trabajo con el área técnica para realizar los ajustes en los volantes de acuerdo al PMT y se corrigieron los volantes.

El contratista manifiesta que a la fecha se cuenta con 4 PQRSD abiertas, el día 12 de julio de 2023 se realizó el cierre de una de ellas. Las PQRSD que están abiertas por:

1. Medidor: Se abrió la PQRSD y no se puede cerrar hasta el mes de agosto.
2. Caja de Inspección
3. Rampa vehicular
4. Punta entre rampa y escalón, que se solucionar con el área técnica

Por otra parte, el contratista manifiesta que cuenta con problema ya que dos predios de la zona de intervención no quisieron realizar la adecuación de las bajantes de ninguna manera. El contratista manifiesta que se realizara la notificación a los predios que no quisieron acceder a esta adecuación a la Interventoría y FDLK.

El contratista manifiesta que se realizaran las siguientes actividades:

- El día 26 de julio de 2023 en el salón comunal los Almendros se realizará un taller sobre las funciones del FDLK a la comunidad, taller que se realizará con la administración local

y el comité veedor y los presidentes de las JAC, el cual busca enseñarle a la comunidad sobre todas las políticas públicas, funciones y demás del FDLK.

- El día 14 de julio de 2023 se realizará la capacitación a los trabajadores de obra de comunicación asertiva, pendiente de confirmar la hora.

El componente de gestión social de la Interventoría por su parte manifiesta que, es necesario que la parte técnica del contrato informe y remita el cronograma de asfaltos, para realizar el acompañamiento y realizar la verificación de volantes y programar las capacitaciones frente a ese cronograma.

Recordar que el día 25 de julio de 2023 se realizará el comité FDLK No.7 a las 8 am.

El FDLK por otra parte indica que llego un derecho de petición de un ex trabajador llamado Diego López, profesional de presupuestos, en el cual manifestó su inconformidad. El contratista manifiesta que este trabajador no se presentaron documentos de ingreso. Se realizará la revisión.

d. Componente SST

-Informe semanal 40: Aprobado

-Informe Mensual 8 (mayo): El contratista manifiesta que se encuentra observado por planillas de seguridad social, ya que se presentó un inconveniente con un subcontratista, el cual no ha remitido las planillas de seguridad social para realizar el pago, esto ha sido un inconveniente para poder dar cierre al informe.

La Interventoría manifiesta que estas planillas son de mes vencido de la seguridad social de abril de 2023, el contratista tiene pendiente el pago de esta planilla, si bien el contratista realizara el pago, cual es la solución que propone el contratista.

Se realizará la aprobación del Informe mensual No.8 condicionado, con el compromiso de que el contratista en 15 días hará la entrega de las planillas de seguridad social del subcontratista. La Interventoría que este compromiso es particular y no general, es decir que este compromiso solo se realizara con este subcontratista. El contratista manifiesta que el día 17 de julio esos soportes serán remitidos a la Interventoría. Si para el mes de junio el contratista no radica el informe con los soportes completos, este no se recibirá.

-Ingresos en la semana: 2, 1 oficial y 1 ayudante.

-Retiros en la semana: 7, 3 oficiales 4 ayudantes.

-Calificación semanal: **100%**

En cuanto a obra el contratista manifiesta que las observaciones realizadas en los recorridos de obra, se acatan y se corrigen de manera inmediata.

e. Tránsito y transporte

Al corte del 7 de julio de 2023 se tienen los siguientes CIV en

1. Etapa: 24 CIV
2. Etapa: 8 CIV
3. Etapa:11 CIV

Para un total de 43 CIV, es decir que todos cuentan con algún permiso de PMT ante la SDM.

De los 43 CIV se tiene que las prioridades 3, 21, 22, 26 y 27 se vencen el 27 de julio de 2023. El PMT de las prioridades 26 y 27 el día 15 de julio de 2023 debe salir la extensión para la segunda etapa.

En cuanto a la señalización, la interventoría manifiesta que de los 11 CIV en tercera etapa todos son de la señalización que finalizo el 30 de junio de 2023 y los 8 que están en la segunda etapa también son del 30 de junio de 2023. Es decir que de esos 19 CIV para implementar o instalar la señalización es necesaria la aprobación de la SDM de la prórroga de los diseños. Solicitud que se realizó a la SDM hace dos semanas.

f. Presupuestos y programación

La Interventoría manifiesta que el avance de la semana del contratista de obra fue de 0.07%. Y los avances generales son:

G1	11-jul-23		
	GENERAL	OBRA	FINANCIERO
% Programado	75.12%	78.18%	75.12%
% Ejecutado	31.22%	28.22%	17.52%
% Desviación	-43.90%	-49.96%	-57.60%

El porcentaje de avance de obra está contra el ultimo cronograma radicado por el contratista y aprobado por la Interventoría.

La Interventoría agrega que el cronograma está más acorde, puesto que se revisó y las cantidades están más acordes a lo que se ejecutado a la fecha.

La Interventoría manifiesta al contratista de obra que se remitió una carta al contratista con las observaciones de cantidades de diseño geométrico, pero no se cuenta con la respuesta. El contratista manifiesta que el especialista se encuentra realizando la atención a las observaciones, y aun tarda en el proceso porque son más de 130 planos. La Interventoría manifiesta al contratista de obra que lo solicitado por parte de la especialidad de diseño geométrico, se ha solicitado desde el mes de febrero de 2023, y es la fecha en la cual no ha sido remitida ni radicada la información completa.

La Interventoría le calara al contratista que estas cantidades no son las definitivas, pero si las de referencia para poder hacer un presupuesto en donde se evidencian los volúmenes de excavación en calzada y andenes. Son áreas de referencia para poder realizar los cobros.

El contratista propone que se realice el cobro de espacio público con el total de área intervenida dividida por predio. La Interventoría manifiesta que el volumen excavación de la calzada se paga mecánicamente y el volumen de excavación del espacio público manual, si se realiza como manifiesta el contratista se realizará el pago de un solo volumen de excavación mecánica. El contratista manifiesta que las cantidades de diseño geométrico estarán radicadas a más tardar el lunes 17 de julio de 2023 en la interventoría.

Por otra parte, la Interventoría manifiesta que así la interventoría hubiese sido afable con el contratista sabiendo que este ha cambiado los sistemas constructivos, no quiere decir que estén aprobados por la Interventoría.

El sistema constructivo es propio del contratista y si este se cambia el riesgo será única y exclusivamente del contratista. Se evidencia que hay unos costos en los NPs, los cuales quieren que se paguen, y fue muy claro cuando la Interventoría explico que no se iba a realizar el pago del transporte del sitio del patio IDU a la obra, puesto que no hay una justificación de la interventoría, es el contratista quien debe soportar y justificar ese NP, y se evidencia que no está incluida. Ese precio surgió de la negativa que tuvo el IDU del fresado, para que no fuera de obra a obra, sino de patio de IDU a obra y viceversa., este si quedo establecido.

Además, se evidencia que el contratista dentro de los nuevos NPs presentados presentan nuevos precios de asfalto, cuando ya se había realizado el cambio. La Interventoría indica que no se pueden aprobar 2 NPs de asfalto.

Estas y varias observaciones se tienen de los NPs y se solicita al contratista realizar una revisión minuciosa de lo presentado y remitir todas las justificaciones técnicas y económicas que se requieran.

La Interventoría indica que las observaciones de los nuevos NPs presentados por el contratista se remitieron el día de hoy.

El FDLK solicita al contratista se atiendan las observaciones de esos NPS de manera inmediata, el contratista manifiesta que realizara la revisión del oficio y con seguridad radicara el día 15 de julio de 2023.

Por otra parte, el FDLK indica que hay un compromiso pendiente por parte de contratista el cual es dar Respuesta a la comunicación U233-G1-515-23 *Observaciones a Plan Detallado de Trabajo – PDT,* el contratista manifiesta que no se realizara respuesta a la comunicación y tampoco la radicación de un nuevo cronograma de obra, puesto que legalmente está abierto un proceso de multa por incumplimiento al mismo.
* Se eliminan de la agenda los compromisos 1 (ya se cumplio) y 5 (por que no se solicito)

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Inventario redes secas	XIE S.A	19-jul-23
2	Simulación de acta parcial final con cantidades a la fecha	XIE S.A - SCLV	19-jul-23

3	Alcance al NP-31 sumidero justificación técnica y económica	XIE S.A	19-jul-23
4	Respuesta a la comunicación U233-G1-515-23 Observaciones a Plan Detallado de Trabajo – PDT	XIE S.A	13-jul-23
5	Cantidades de diseño geométrico ajustadas de los 43 CIVs.	XIE S.A	18-jul-23
6	Respuesta a la comunicación U233-G1-555-23 Observaciones a NPs 31 al 44	XIE S.A	17-jul-23

Elaborada por: Interventoría – Juan Manuel Alba Rojas
Fecha de la próxima reunión: 19 de julio de 2023 Lugar de la próxima reunión: NA

AGENDA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO

Contratista de Obra XIE S.A – COP -621-22 Grupo 1

COMITÉ DE SEGUIMIENTO No.40

Fecha: 13 de julio de 2023

ORDEN DEL DIA

1.Compromisos				
No	**Asunto**	**Responsable**	**Fecha de compromiso**	**Cumplió SI/NO**
1	Solución del acceso a vivienda de la Prioridad 30	Contratista	12-jul-23	NO
2	Inventario redes secas	Contratista	12-jul-23	NO
3	Simulación de acta parcial final con cantidades a la fecha	Contratista e interventoría	12-jul-23	NO
4	Alcance al NP-31 sumidero justificación técnica y económica	Contratista	6-jul-23	NO
5	Solicitud de recorrido delegado EAAB – Sumideros	Contratista	12-jul-23	NO
6	Respuesta a la comunicación U233-G1-515-23 *Observaciones a Plan Detallado de Trabajo – PDT*	Contratista	12-jul-23	NO
7	Cantidades de diseño geométrico ajustadas de los 43 CIVs.	Contratista	12-jul-23	NO
8	Revisión de NPS 31 al 37	Interventoría	11-jul-23	NO
2. Componentes				
A. Técnico				
- **Informes semanales mayo:** Aprobados - **Informes semanales junio:** En atención de observaciones.				
- **Informe Mensual 8 (mayo):** Sin radicar				
- **Pre-Acta No.10 de recibo parcial No.8 (mayo):** En revisión de interventoría V2				
- **Cuenta No. 8 (mayo):** Sin radicar				
- **Calificación semanal:** 92%				
B. SST				
- **Informe semanal 40:** Aprobado				
- **Informe Mensual 8 (mayo):** Observado				
- **Ingresos en la semana:** 2				
- **Retiros en la semana:** 7				
- **Calificación semanal:** 100%%				
C. Ambiental				
- **Informe semanal 40:** Observado				
- **Informe Mensual 9 (junio):** Observado				

- **Calificación semanal:** 100%
D. Gestión Social
- **Informe semanal 39:** Aprobado
- **Informe Mensual 9 (junio):** En revisión de la interventoría la atención a observaciones.
- **Calificación semanal:**98% - ***Calificación afecta por la desinformación en los volantes.**
Varios
Obra

Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la Semana
4	8001069	**Calzada:** Se realiza instalación de fresado estabilizado 4.12m3 del K0+022 al K0+030, instalación de bordillo A-80 en costado oriente esquina 3,58ML, nivelación de pozos de aguas negras. **Andén oriental:** Sin actividades. **Andén occidental:** Sin actividades.
32	8000979	**Calzada**: Sin actividad. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.
28	8000929	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental**: Se realiza instalación parcial de geotextil 8,06m2 del K0+000 al K0+060, instalación parcial de fresado primera capa 1.61m3 del K0+000 al K0+060, nivelación e instalación de marcos en cajas de inspección del K0+000 al K0+060. **Andén occidental:** Se realiza instalación parcial de geotextil 8,6m2 del K0+000 al K0+060 instalación parcial de fresado primera capa 1.72m3 del K0+000 al K0+060, nivelación e instalación de marcos en cajas de inspección del K0+000 al K0+060.
29	8000996	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Se realiza nivelación e instalación de marcos en cajas de inspección del K0+000 al K0+060. **Andén occidental:** Se realiza nivelación e instalación de marcos en cajas de inspección del K0+000 al K0+060.
24	8000871	**Calzada:** Se realiza re nivelación parcial a la rasante de la base estabilizada del K0+000 al K0+060. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental** Sin actividades.
25	8000923	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Se realiza remates y acabados en cajas de inspección del K0+000 al K0+060. **Andén occidental:** Se realiza remates y acabados en cajas de inspección del K0+000 al K0+060.
21	8000821	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.


Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la Semana
22	8000864	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental**: Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.
3	8000957	**Calzada:** Se realiza instalación de fresado estabilizado 5.25m3 del K0+000 al K0+015, instalación del bordillo A-80 5ML del K0+000. **Andén oriental:** Se realiza remates y acabados en cajas de inspección del K0+000 al K0+060. **Andén occidental:** Se realiza remates y acabados en cajas de inspección del K0+000 al K0+060.
13	8000772	**Calzada:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad. **Andén oriental:** Sin actividad.
14	8000814	**Calzada:** Se realiza excavación manual parcial para instalación de sumideros 3.97m3 del K00+055 al K00+060, instalación de solado pobre 0.15m3 como base para instalación de sumideros, se realiza instalación de sumideros 2 unidades. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.
17	8000794	**Calzada:** Se realiza re nivelación a pozo de aguas negras en el K00+000. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.
18	8000839	**Calzada:** Se realiza excavación manual para instalación de sumideros 4.06m3, instalación de solado pobre 0.15m3 como base para instalación de sumideros. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.
33	8001041	**Calzada: Calzada:** Se realiza nivelación de pozo 1,1 ML en el K0+000 al K0+005. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.
31	8001058	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Se realiza conformación de espacio público, remates en cajas de inspección el K0+000 al K0+060, instalación parcial de bordillo A-80 1.67ML K0+000 al K0+060. **Andén occidental:** Se realiza conformación de espacio público, remates en cajas de inspección el K0+000 al K0+060.
30	8001125	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Se realiza remates de fachada en parte inferior del K0+000 al K0+060.

Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la Semana
		Andén occidental: Se realiza remates de fachada en parte inferior del K0+000 al K0+060.
12	8000849	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Acabados y remates en cajas de inspección, instalación de accesorios PVC, se realiza conformación de fresado en espacio público. **Andén occidental:** Se realiza instalación parcial de geotextil 51,7m2 del K0+000 al K0+060,instalación parcial de fresado 15.31m3 del K0+000 al K0+060.
15	8000856	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Se realiza demolición parcial de concreto 75.84m2 K0+000 al K0+060, se realiza excavación manual parcial 53.66m3 del K0+000 al K0+060, demolición parcial de cajas de inspección 2.16m2 del K0+000 al K0+060, construcción parcial de cajas de inspección 8 unidades. **Andén occidental:** Sin actividad.
16	8000907	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.
26	8000988	**Calzada:** Se realiza instalación de fresado estabilizado 15m3 K0+010 al K0+035, excavación manual parcial para instalación de tubería de 12 pulgadas que va de pozo a sumidero. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.
27	8001052	**Calzada:** Se realiza instalación de fresado estabilizado 24m3 K0+010 al K0+050, excavación manual parcial para instalación de tubería de 12 pulgadas que va de pozo a sumidero. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.

Frentes de obra en la semana del 5 al 11 de julio de 2023:

Frentes de obra: 9

CIV abiertos: 21

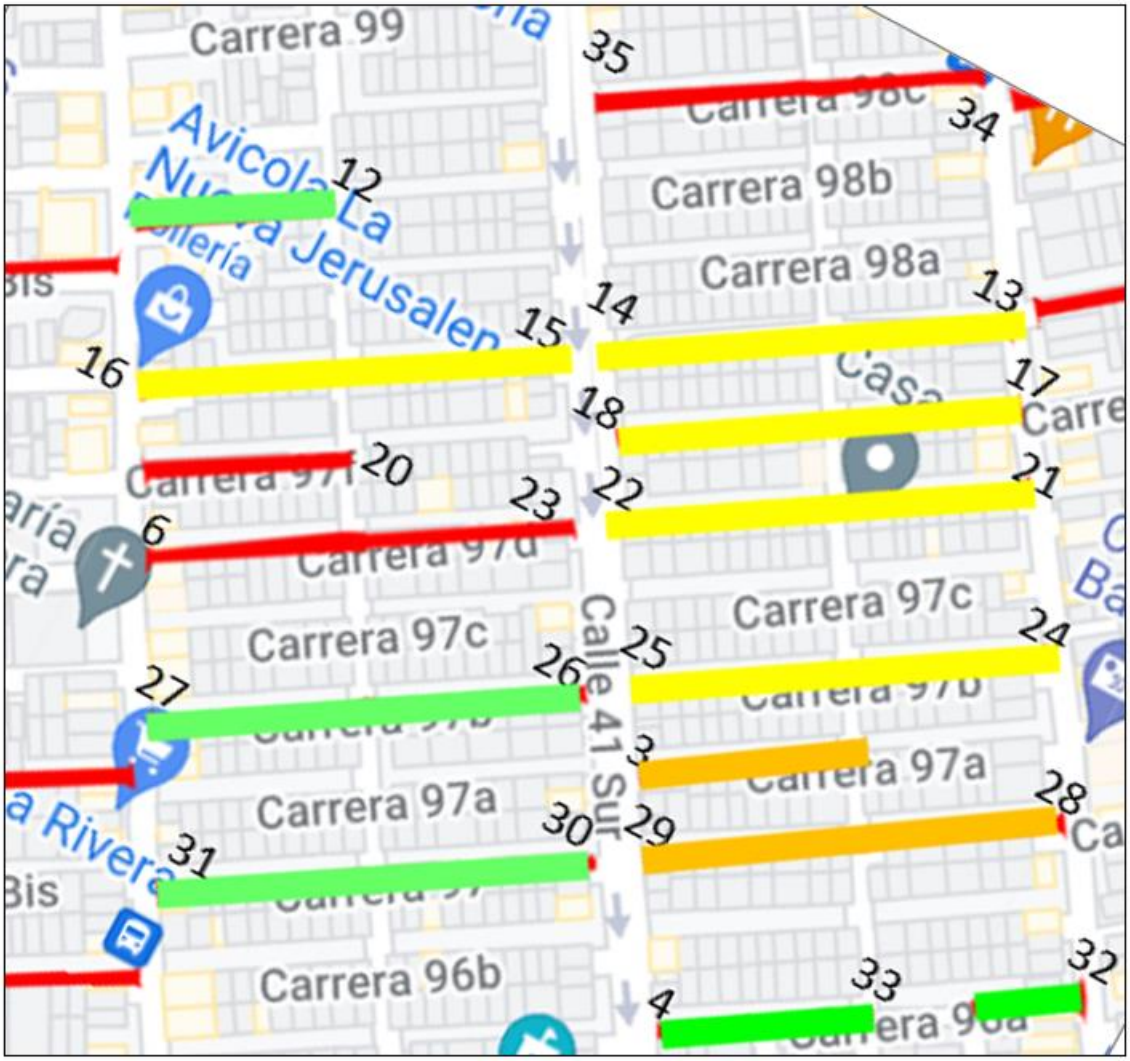


Nomenclatura	
	Frente de obra Activo
	Frente de obra Intermitente
	Frente de obra Inactivo
	Frente de obra sin inicio

Frentes de obra en la semana del 5 al 11 de julio de 2023:

Frentes de obra: 9

CIV abiertos: 21

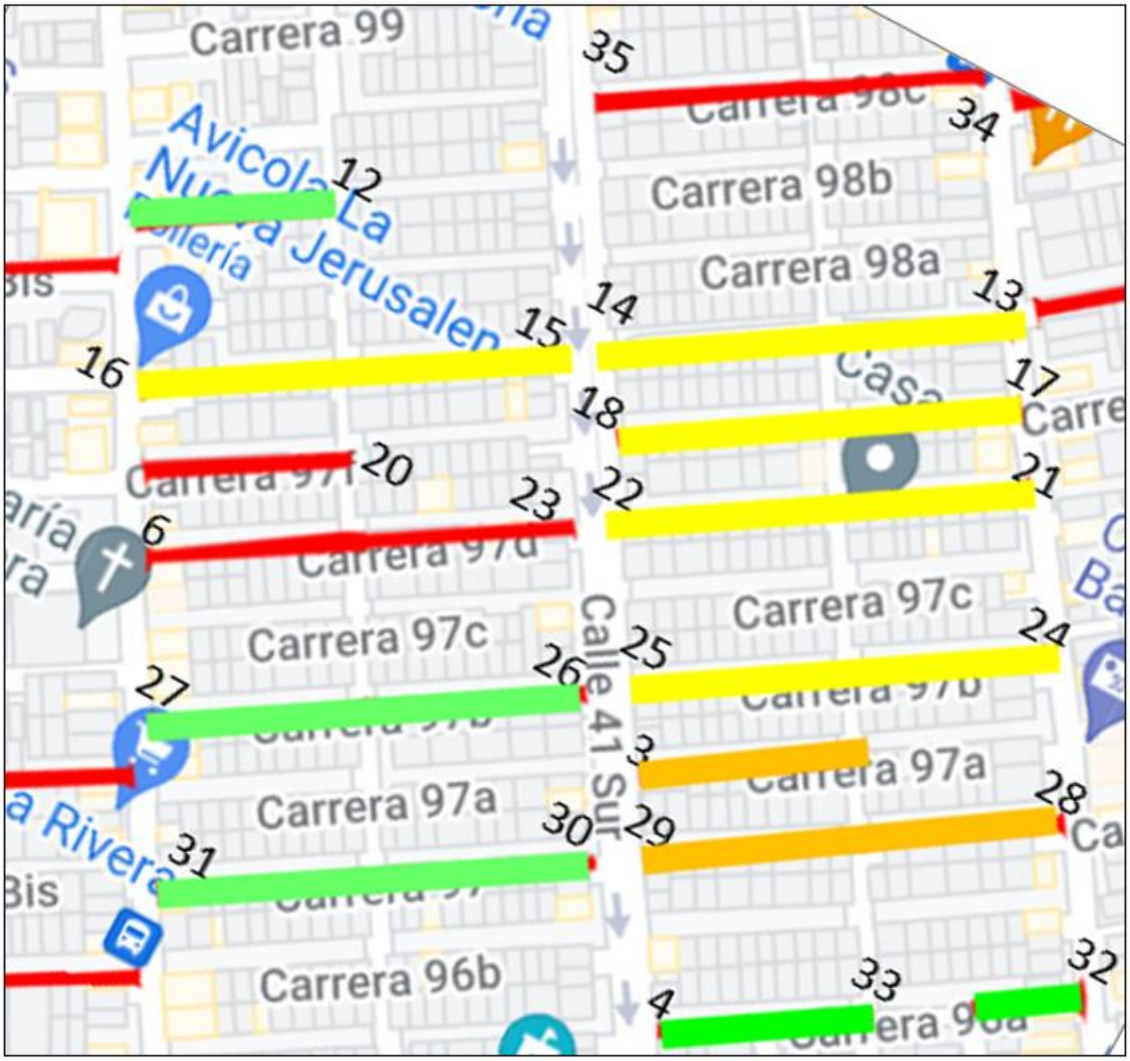


Nomenclatura	
	Frente de obra Activo
	Frente de obra Intermitente
	Frente de obra Inactivo
	Frente de obra sin inicio

ESTADO SEMANAL DE PROCESO CONSTRUCTIVO


CONTRATISTA DE OBRA GRUPO 1 -CVK22 COP 621-22

	PK_ID ANDEN	PK_ID ANDEN	3			4			13			14			17			18			21			22			24			25			28			29			30			31			32			33			12			15			16			26			27		
VIA	**ORIENTAL**	**OCCIDENTAL**	VIA (156201)	ORI (29896)	OCC (29897)	VIA (156189)	ORI (29872)	OCC (29873)	VIA (156220)	ORI (29934)	OCC (29935)	VIA (156221)	ORI (29936)	OCC (29937)	VIA (156216)	ORI (29926)	OCC (29927)	VIA (156217)	ORI (29928)	OCC (29929)	VIA (156212)	ORI (29918)	OCC (29919)	VIA(156213)	ORI(29920)	OCC(29921)	VIA(156204)	ORI(29902)	OCC(29903)	VIA(156205)	ORI(29904)	OCC(29905)	VIA(156196)	ORI(29886)	OCC(29887)	VIA(156197)	ORI(29888)	OCC(29889)	VIA(156198)	ORI(29890)	OCC(29891)	VIA(156199)	ORI(29892)	OCC(29893)	VIA(156186)	ORI(29866)	OCC(29867)	VIA(156188)	ORI(29870)	OCC(29871)	VIA(156231)	ORI(29956)	OCC(29957)	VIA(156222)	ORI(29938)	OCC(29939)	VIA(156223)	ORI(29940)	OCC(29941)	VIA(156206)	ORI(29940)	OCC(29941)	VIA(156207)	ORI(29908)	OCC(29909)
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO Y CAJAS DE INSPECCION.	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO Y CAJAS DE INSPECCION.		

AVANCE GRUPO 1-11 DE JULIO DE 2023

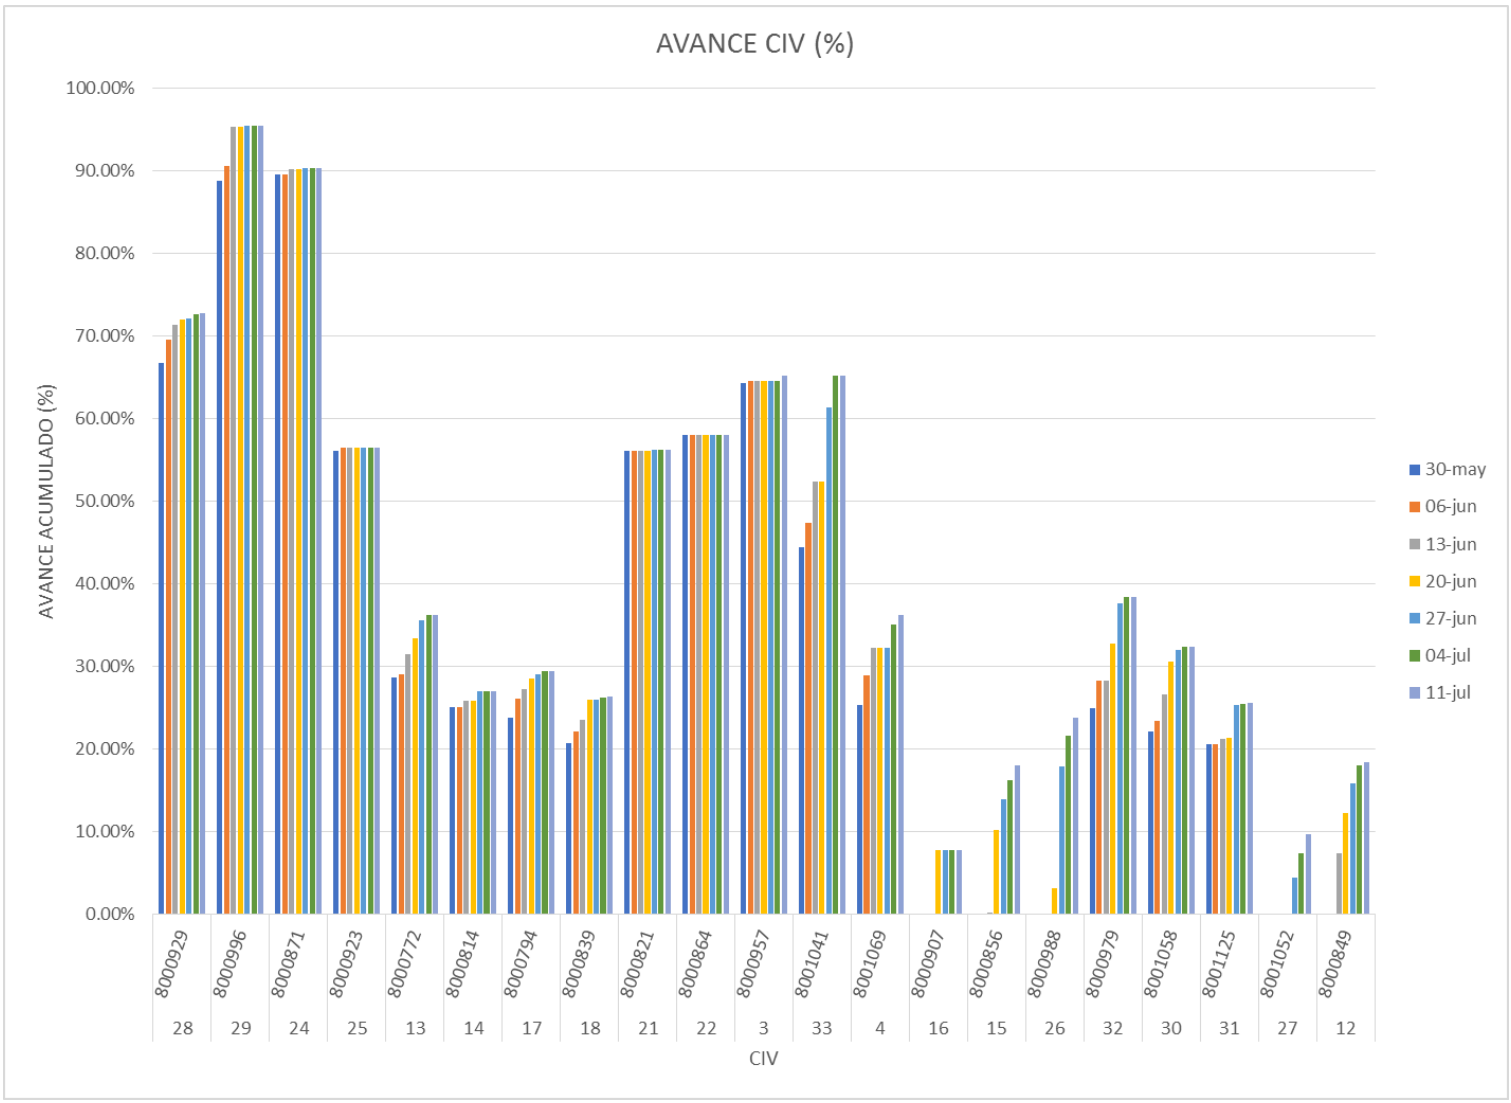

SEGUIMIENTO DIARIO EN MILLONES DE PESOS						
FECHA	**06-jul**	**07-jul**	**08-jul**	**09-jul**	**10-jul**	**11-jul**
PROGRAMADO ACUMULADO ($)	$9 303	$9 359	$9 415	$9 415	$9 432	$9 482
PROGRAMADO ACUMULADO (%)	76.70%	77.17%	77.63%	77.63%	77.77%	78.18%
EJECUTADO ACUMULADO ($)	$3 414	$3 416	$3 417	$3 417	$3 418	$3 422
EJECUTADO ACUMULADO (%)	28.15%	28.17%	28.18%	28.18%	28.18%	28.21%
DESVIACIÓN ($)	$ 5 890	$ 5 943	$ 5 998	$ 5 998	$ 6 014	$ 6 060
DESVIACIÓN (%)	**-48.56%**	**-49.00%**	**-49.45%**	**-49.45%**	**-49.59%**	**-49.97%**

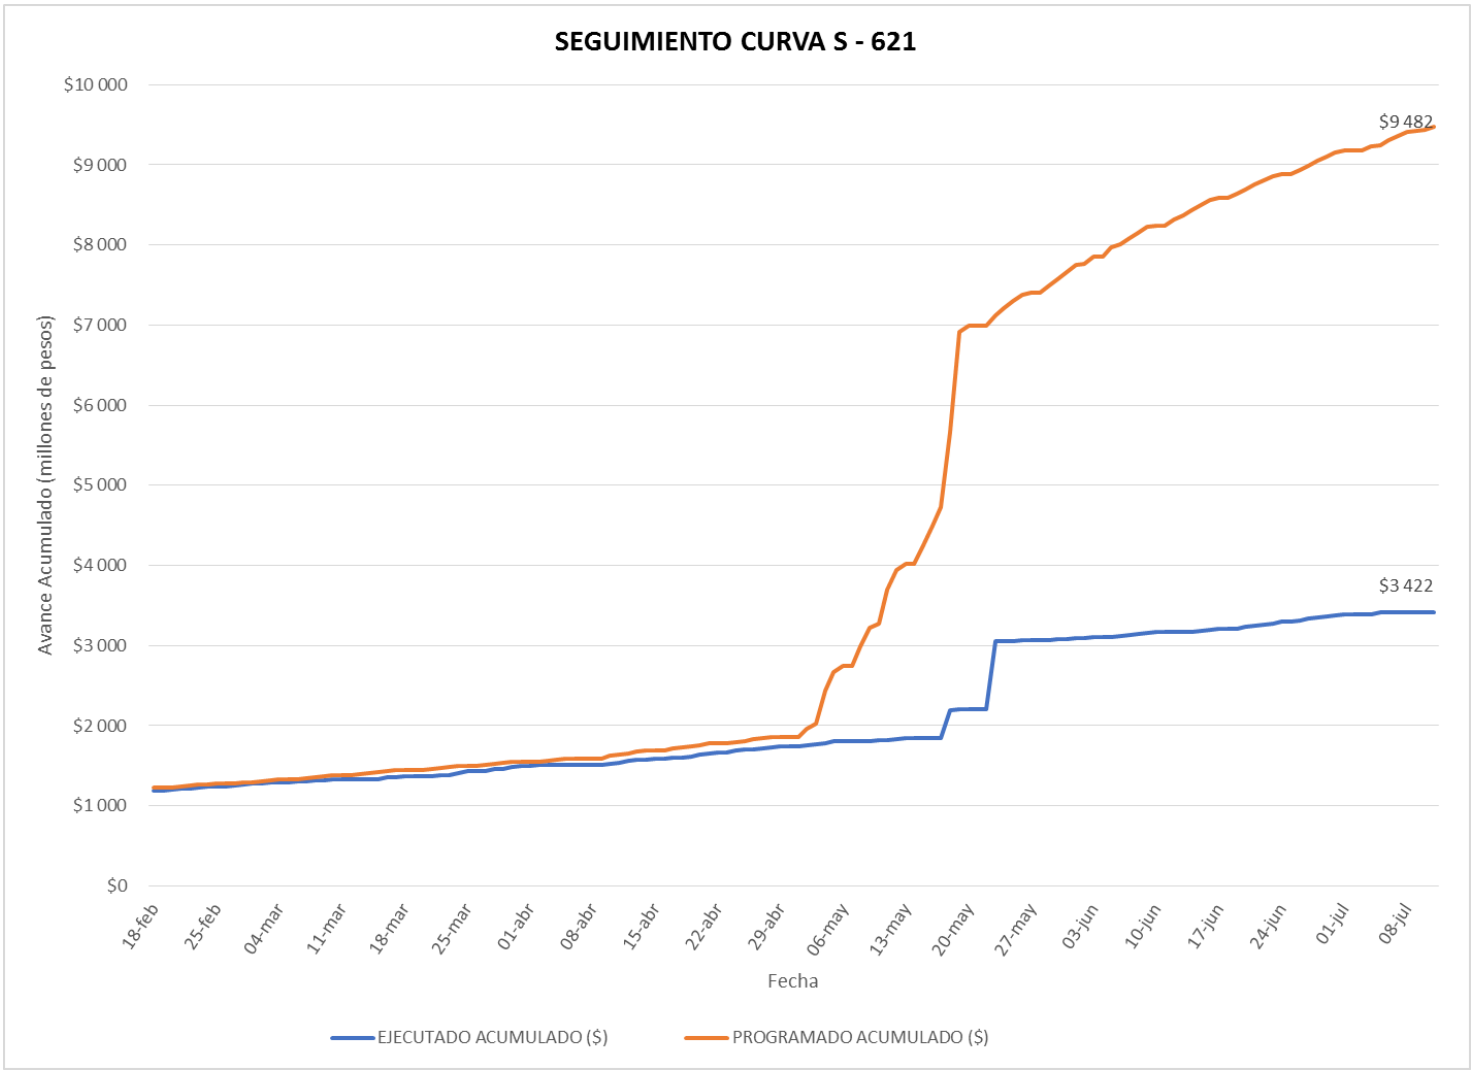

11-jul-23		
GENERAL	OBRA	FINANCIERO
54.50%	78.18%	54.50%
31.21%	28.21%	17.52%
-23.29%	-49.97%	-36.98%



CONSORCIO SCLV

NIT 900.547.145-2



GRUPO 1 COP-621-22

SEGUIMIENTO GRUPO 1 AL 11-JULIO-2023								
P	**CIV**	**VALOR CIV**	**PROG-ACUM ($)**	**PROG-ACUM (%)**	**EJEC-ACUM ($)**	**EJEC-ACUM (%)**	**PESO EJEC PROG (%)**	**ATRASO (%)**
28	8000929	$ 349 737 154.00	$ 286 285 298.00	2.36%	$ 200 027 363.45	1.65%	57.19%	-0.71%
29	8000996	$ 276 918 878.00	$ 242 229 956.95	2.00%	$ 250 511 111.12	2.07%	90.46%	0.07%
24	8000871	$ 282 489 045.00	$ 269 517 473.15	2.22%	$ 272 500 094.84	2.25%	96.46%	0.02%
25	8000923	$ 398 643 978.00	$ 345 626 779.89	2.85%	$ 341 937 801.60	2.82%	85.78%	-0.03%
13	8000772	$ 298 711 275.00	$ 289 860 253.15	2.39%	$ 142 594 926.99	1.18%	47.74%	-1.21%
14	8000814	$ 428 629 368.00	$ 414 590 745.60	3.42%	$ 298 888 719.85	2.46%	69.73%	-0.95%
17	8000794	$ 365 563 428.00	$ 305 729 990.38	2.52%	$ 157 120 925.19	1.30%	42.98%	-1.23%
18	8000839	$ 444 842 291.00	$ 414 390 409.14	3.42%	$ 230 914 666.54	1.90%	51.91%	-1.51%
21	8000821	$ 395 944 862.00	$ 379 185 734.00	3.13%	$ 278 177 591.99	2.29%	70.26%	-0.83%
22	8000864	$ 474 960 513.00	$ 407 701 220.24	3.36%	$ 413 939 504.20	3.41%	87.15%	0.05%
3	8000957	$ 346 941 971.00	$ 324 515 767.59	2.68%	$ 318 252 906.84	2.62%	91.73%	-0.05%
33	8001041	$ 164 541 658.00	$ 148 920 206.67	1.23%	$ 74 166 612.92	0.61%	45.07%	-0.62%
4	8001069	$ 183 856 740.00	$ 154 073 695.45	1.27%	$ 61 766 939.83	0.51%	33.60%	-0.76%
16	8000907	$ 378 482 383.00	$ 361 864 228.92	2.98%	$ 10 818 120.32	0.09%	2.86%	-2.89%
15	8000856	$ 318 778 666.00	$ 314 966 117.90	2.60%	$ 25 226 559.54	0.21%	7.91%	-2.39%
26	8000988	$ 312 106 601.00	$ 248 815 938.04	2.05%	$ 25 482 702.88	0.21%	8.16%	-1.84%
6	8000977	$ 384 241 540.00	$ 313 656 771.99	2.59%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-2.59%
32	8000979	$ 167 606 525.00	$ 151 794 191.30	1.25%	$ 62 184 752.39	0.51%	37.10%	-0.74%
30	8001058	$ 347 840 618.00	$ 307 025 458.10	2.53%	$ 96 052 542.64	0.79%	27.61%	-1.74%
20	8000938	$ 394 454 974.00	$ 379 247 233.34	3.13%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-3.13%
31	8001125	$ 353 440 216.00	$ 295 012 954.84	2.43%	$ 94 732 573.26	0.78%	26.80%	-1.65%
8	8002417	$ 436 309 464.00	$ 413 666 167.76	3.41%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-3.41%
9	8002500	$ 341 127 565.00	$ 308 545 113.80	2.54%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-2.54%
27	8001052	$ 455 180 038.00	$ 384 495 380.79	3.17%	$ 43 850 622.86	0.36%	9.63%	-2.81%
12	8000849	$ 307 654 668.00	$ 417 435 434.91	3.44%	$ 22 354 124.21	0.18%	7.27%	-3.26%
23	8000916	$ 389 375 082.00	$ 341 149 570.13	2.81%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-2.81%
5	8000655	$ 464 716 467.00	$ 307 656 648.18	2.54%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-2.54%
40	8011953	$ 462 079 926.00	$ 258 211 947.18	2.13%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-2.13%
10	8011960	$ 492 144 459.00	$ 256 881 196.83	2.12%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-2.12%
1	8000687	$ 769 586 187.00	$ 225 575 656.07	1.86%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-1.86%
7	8000736	$ 492 144 459.00	$ 211 458 062.28	1.74%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-1.74%
2	8001595	$ 338 872 088.69	$ 1 575 414.42	0.01%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-0.01%
TOTALES			**$ 9 481 661 016.99**	**78.18%**	**$ 3 421 501 163.47**	**28.21%**		**-49.97%**
TOTAL DE OBRA			**$ 12 128 504 795.27**					



CONSORCIO SCLV
NIT 900.547.145-2



GRUPO 1 COP-621-22

FECHA EVALUACIÓN			06-jun	13-jun	20-jun	27-jun	04-jul	11-jul
P	CIV	VALOR TOTAL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV
28	8000929	$ 349 737 154.00	65.55%	68.11%	56.45%	56.54%	57.09%	57.19%
29	8000996	$ 276 918 878.00	102.75%	103.34%	90.39%	90.46%	90.46%	90.46%
24	8000871	$ 282 489 045.00	100.01%	101.01%	96.37%	96.46%	96.46%	96.46%
25	8000923	$ 398 643 978.00	98.93%	98.93%	85.78%	85.78%	85.78%	85.78%
13	8000772	$ 298 711 275.00	39.94%	44.39%	44.89%	47.18%	47.74%	47.74%
14	8000814	$ 428 629 368.00	70.41%	71.02%	68.75%	69.67%	69.67%	69.73%
17	8000794	$ 365 563 428.00	46.00%	48.77%	42.10%	42.65%	42.98%	42.98%
18	8000839	$ 444 842 291.00	49.49%	52.72%	51.60%	51.60%	51.89%	51.91%
21	8000821	$ 395 944 862.00	73.29%	73.29%	70.18%	70.26%	70.26%	70.26%
22	8000864	$ 474 960 513.00	98.71%	101.53%	87.15%	87.15%	87.15%	87.15%
3	8000957	$ 346 941 971.00	97.29%	97.29%	91.00%	91.00%	91.00%	91.73%
33	8001041	$ 164 541 658.00	30.53%	35.65%	32.27%	41.29%	45.07%	45.07%
4	8001069	$ 183 856 740.00	30.81%	36.28%	30.40%	30.40%	32.50%	33.60%
16	8000907	$ 378 482 383.00	0.00%	0.00%	2.86%	2.86%	2.86%	2.86%
15	8000856	$ 318 778 666.00	0.00%	0.10%	0.10%	3.81%	6.06%	7.91%
26	8000988	$ 312 106 601.00	0.00%	0.00%	2.21%	2.21%	6.01%	8.16%
6	8000977	$ 384 241 540.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
32	8000979	$ 167 606 525.00	29.76%	29.76%	31.39%	36.24%	37.10%	37.10%
30	8001058	$ 347 840 618.00	24.70%	24.70%	25.78%	27.22%	27.61%	27.61%
20	8000938	$ 394 454 974.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
31	8001125	$ 353 440 216.00	26.30%	26.99%	22.68%	26.58%	26.74%	26.80%
8	8002417	$ 436 309 464.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
9	8002500	$ 341 127 565.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
27	8001052	$ 455 180 038.00	0.00%	0.00%	0.00%	4.38%	7.27%	9.63%
12	8000849	$ 307 654 668.00	0.00%	0.14%	2.28%	4.77%	6.89%	7.27%
23	8000916	$ 389 375 082.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
5	8000655	$ 464 716 467.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
40	8011953	$ 462 079 926.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
10	8011960	$ 492 144 459.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
1	8000687	$ 769 586 187.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
7	8000736	$ 492 144 459.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

FECHA EVALUACIÓN			11-jul
P	CV	VALOR TOTAL CIV	%AVANCE DEL CIV
28	8000929	$ 349 737 154.00	0.11%
29	8000996	$ 276 918 878.00	0.00%
24	8000871	$ 282 489 045.00	0.00%
25	8000923	$ 398 643 978.00	0.00%
13	8000772	$ 298 711 275.00	0.00%
14	8000814	$ 428 629 368.00	0.06%
17	8000794	$ 365 563 428.00	0.00%
18	8000839	$ 444 842 291.00	0.02%
21	8000821	$ 395 944 862.00	0.00%
22	8000864	$ 474 960 513.00	0.00%
3	8000957	$ 346 941 971.00	0.73%
33	8001041	$ 164 541 658.00	0.00%
4	8001069	$ 183 856 740.00	1.10%
16	8000907	$ 378 482 383.00	0.00%
15	8000856	$ 318 778 666.00	1.85%
26	8000988	$ 312 106 601.00	2.15%
6	8000977	$ 384 241 540.00	0.00%
32	8000979	$ 167 606 525.00	0.00%
30	8001058	$ 347 840 618.00	0.00%
20	8000938	$ 394 454 974.00	0.00%
31	8001125	$ 353 440 216.00	0.06%
8	8002417	$ 436 309 464.00	0.00%
9	8002500	$ 341 127 565.00	0.00%
27	8001052	$ 455 180 038.00	2.36%
12	8000849	$ 307 654 668.00	0.37%
23	8000916	$ 389 375 082.00	0.00%
5	8000655	$ 464 716 467.00	0.00%
40	8011953	$ 462 079 926.00	0.00%
10	8011960	$ 492 144 459.00	0.00%
1	8000687	$ 769 586 187.00	0.00%
7	8000736	$ 492 144 459.00	0.00%
