BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo De Desarrollo Local de Kennedy

FECHA: 19/Julio/2023 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** 61

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de seguimiento No. 41 CIN-717-2022 1 COP-621-2022

HORA DE INICIO: _____ **HORA DE FINALIZACIÓN:** _____

ASISTENTES:

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Nury Albarracin Daza			X							Interventoria Consorcio SCCV	sst1kennedy@outlook.es	3123230618	
Lucas Restrepo Rengo			X						X	Interventoria	U233SCIVkennedy@outlook.com	3002133006	
Sandra Lorena Gonzalez Torres			X						X	Consorcio SCCV Interventoria	segvialgrupo1.fdlk@gmail.com	3103626480	
Ana Leonor Porras R			/							Interventoria Social	aleoporras@gmail.com	3212071449	
ROSALIDAMONQUA R.			X						X	XIE S.A.	xie.kennedy621 residente 2@gmail.com	3223418158	
♥ A MILENA MEDINA GOZMAN			X						X	CONTRATISTA / XIE SA	XIESOCIAL@OUTLOOK.	3102504120	
Maria Camila Perez Pen			X						X	XIE. S A	Xie.ambiental@gmail.co	3702457231	
ELKIN ESTEBAN MORENO			X						X	XIE SA	xie.esppptprog@gmail.	3203768256	
Oscar Vasquez			X						X	XIE SA	oscar.vasquez@xie.	3012239588	
Manuel Alfonso Miguel Garz			X						X	XIE SA	xie.interventoria.grupo1@gmail.com	3212144962	
ANTORO ZARATE M.			X						X	SCLV INTERV.	ZARATEM01@Yahoo.com	3152368028	
Juan Manuel Alba R			X						X	Interventoria	[illegible]	3107[illegible]	

CONSENTIMIENTO: El(la) arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo De Desarrollo Local de Kennedy

FECHA: 19 | Julio | 2023 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** 61

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de seguimiento No. 41 CIN-717-2022 / COP-621-2022

HORA DE INICIO: 2:50 pm **HORA DE FINALIZACIÓN:** ____

ASISTENTES:

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Danilo Meneses Toro			X						X	FDLK-Infraestructura	Danilo.meneses@gobiernobogota.gov.co	3118988034	
Andrés Mauricio Rojas L.			X						X	FDLK-Infraestructura	andresm.llanos@gobiernobogota.gov.co	3057039773	
Laura Daniela Díaz			X							Consorcio SCLV - Interventoría	dlaura0898@gmail.com	3168270411	
Karen Julieth Pantes Ramirez			X							Consorcio SCLV - Interventoría	u233sclv.kennedy@outlook.com	3143253729	
Angeli Curiel Acosta			X							Consorcio SCLV - Interventoría	u233sclv.kennedy@outlook.com	3227401898	

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	**EVIDENCIA DE REUNIÓN**

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Comité de seguimiento No.41

Se da inicio a comité No.41 en las instalaciones de la Interventoría con la presencia del contratista de obra grupo 1 XIE S.A y la supervisión del FDLK.

Orden del día

La Interventoría informa que se realizaron observaciones a los precios no previstos NP 31 al 37. La Interventoría indica que el contratista ya emitió la atención a las observaciones, pero se evidencia que hay unos NPs que pueden aprobarse, pero los procedimientos no se han surtido. La Interventoría propone una reunión el próximo 24de julio de 2023 a las 8 am con el contratista para realizar la revisión de estos NPs. Con el fin de darle celeridad al tema y no frenar la facturación.

Recorrido de obra

La Interventoría indica que se realizó recorrido junto con la supervisión del FDLK y se evidencia que el contratista de obra ha avanzado, pese a que no cuenta con el monoblock y asfalto. Se espera que se avance de manera significativa con la llegada de los insumos.

El contratista manifiesta que, de acuerdo con la necesidad de insumos, se aclara que el día viernes 14 de julio de 2023 se realizó un acuerdo con ACO para que suministrara el material con el fin de que el monoblock llegara el día 21 de julio de 2023. El contratista indica que se realizó una negociación por mil unidades, entre estas vienen las 50 requeridas de 23 cm. El contratista manifiesta que antes de poner en la mesa el compromiso tiene que cerciorarse de que el compromiso de entrega de ACO sea cierto para empezar con la instalación.

El contratista indica que se recibirán 300 unidades incluidas las rejillas de canal de inspección, y 50 monoblocs inspeccionarles. Los monoblocks restantes se estima que estén llegando en 10 días hábiles.

El contratista de obra espera que con los monoblocks que lleguen y el asfalto la próxima semana se instale en:

- Las prioridades 4, 13, 14 y 17. Finalizando esta actividad se pavimentan.
- Se pavimentarán las prioridades 3, 22, 24 y 25.

El contratista indica que listos para instalar monoblock más adelante están programadas

- Las prioridades 30, 32, 33 y 28,29.
- Se informa que no se alcanzó a fundir espacio público para prioridad 12, puesto que indico el proveedor que llegaba a la 1 y este alcanzo a llegar.

En cuanto al asfalto el contratista menciona que el proveedor se comprometió a prender planta a primera hora. El contratista manifiesta que el material tiene que trasegarlo, puesto que es muy costoso e implica más tiempo. Se tiene programado el equipo, el trasporte, el personal de extensión y compactación y toda la documentación.

Componentes

a. Componente Técnico

El contratista indica que a la fecha se cuenta 6 frentes de obra, de los cuales hay 1 intermitente, porque se está acondicionando para instalación de asfalto.

Se está trabajando en las prioridades 12,15,16,17,26,27,30,31, 32 y 4.

Como se indicó anteriormente se programó para instalación de asfalto el 21 de julio de 2023 en las prioridades 3 y 24 las dos capas, y en las prioridades 25 y 22 el 22 de julio de 2023 las otras dos capas.

De llegar monoblock el 21 de julio de 2023, se realizará la instalación en las prioridades 14, 13, 17 y 18. La prioridad 21 pendiente por 30 monoblock.

En cuanto a las actividades semanales se informa que:

- ***Prioridad 12:*** Instalación de concretos
- ***Prioridades 15 y 16:*** excavación, rellenos y constricción de cajas
- ***Prioridades 25 y 26:*** En actividades de excavación

La ***Calificación de la semana*** fue del 92%, calificación que es objetada por el contratista de obra, porque en comité se indicó que se podía intervenir espacio público con el PMT vigente, pero es lo que la Interventoría ha calificado de manera negativa, puesto que se realizaron actividades en espacio público e intervención de la calzada.

La Interventoría aclara que al contratista se le informo que tenía aprobado el PMT y COI para la intervención de espacio público, pero cuando necesitan realizara adecuaciones a la calzada como lo son sumideros, empalmes de base estabilizada como es el caso de las prioridades 12 y 14, no hay continuidad en las actividades.

El contratista indica que no se da la respectiva continuidad por falta de insumos, materiales o el clima, pero sin embargo se trata de avanzar, como es el caso de la prioridad 30 que se estaban realizando actividades de excavación de una tubería y se evidencio que esta está colmatada por la EAAB y no se ha logrado avanzar.

La interventoría indica que se ha afectado también la calificación por un día que no contaban con los senderos peatonales adecuados correctamente. La metodología que impone la Interventoría es que se realiza recorrido el día miércoles, se indica que se hagan correcciones al PMT, al pasar los días el sábado se realiza la calificación, si se sigue cometiendo con esa falta se va afectada la calificación.

El contratista desde la parte del componente ambiental indica que en el recorrido realizado el 8 de julio de 2023, se evidencio que el sendero peatonal de la prioridad 26, se evidencio junto con la interventoría que se corrió el cerramiento, porque estaba el mini cargador sacando material de espacio público y se volvió adecuar.

La Interventoría indica que es clara la justificación que se da, pero para la interventoría no es coherente que la comodidad del operador y la maquina se imponga sobre la comunidad del peatón. El bobcat es una máquina para operar y trabajar sobre su mismo eje, no es coherente que necesite de los 4 metros de calzada y la señora que tiene condiciones especiales si tienen que hacer maniobras al transitar por el sendero.

El contratista manifiesta que se instaló toda la señalización para realizar la actividad y ella simplemente rompió todas las cintas, levanto la polisombra y paso. En este caso de la persona a la que hace referencia la Interventoría tampoco respeta la señalización y su actitud es muy irrespetuosa.

La Interventoría indica que, si es cierto que el contratista atiende las observaciones en algunos casos de manera inmediata, no se tienen que esperar al llamado de atención para enmendar la falta en el PMT, el contratista debe ser más proactivo.

**Se hace la presentación del plano del estado de las obras por CIV, adjunto a la agenda.*

El componente de tránsito y transporte indica que de acuerdo a lo presentado la prioridad 3,21 y 22 vence el PMT el 27 de julio de 2023.

El contratista manifiesta que la cuenta de junio está proyectada en aproximadamente $591 millones, pero es necesario revisar la metodología en la cual se van a presentar los soportes, puesto que la interventoría manifiesta que se va a cambiar.

La interventoría indica que los soportes para el cobro de las cantidades no se van aceptar más por informe diario de inspector, sino por secciones transversales y volúmenes de excavación, y el espacio público relacionado con memorarías de cálculo independiente por predio.

b. Presupuestos y programación

La interventoría manifiesta que el avance de la semana No.41 fue del 0.59%, que en comparación con la semana No.40 es un valor significativo.

Lo preocupante para la Interventoría es que el contratista de obra se encuentra en un proceso de multa, si no se evidencia un avance en la obra se puede aplicar la multa, el contratista debe aumentar los rendimientos el contratista debe planear una estrategia para avanzar. Hay temor puesto que los avances lo reflejan:

G1	18-jul-23		
	GENERAL	OBRA	FINANCIERO
% PROGRAMADO	77.04%	80.28%	77.04%
% EJECUTADO	32.10%	29.10%	17.52%
% DESVIACIÓN	-44.94%	-51.18%	-59.52%

El contratista de acuerdo a los compromisos del comité No.40 se comprometió a realizar la entrega del cronograma de actividades de asfalto, pero esta no fue remitida. El contratista manifiesta que dado a las reuniones que se realizaron con los proveedores, no fue posible radicar el cronograma, hasta tanto no se cuente con las fechas correctas y reales.

Es importante que el contratista remita el cronograma, puesto que es importante revisar y estar al tanto de las actividades que realizara el contratista (Se aclara que este cronograma no es contractual). El contratista manifiesta que 24 de julio de 2023 lo radicara a la Interventoría.

El FDLK indica que bajo la premisa de que el contratista va a seguir pavimentando e instalando monoblock y demás, el contrato se está quedando corto con la apertura de nuevos frentes de trabajo, y pues se tiene PMT aprobado de lo que resta del contrato. Se espera que el contratista se plantee la apertura de nuevos frentes de obra, la cual va asociada al cierre de los ya indicados.

El contratista manifiesta que, en cuanto a los avances presentados por la Interventoría, el avance programado de obra el cual es de 80.28%, está en base a los $12 mil millones de pesos. La Interventoría indica que a $ 12 millones de pesos con respecto a una repartición uniforme de $ 5 mil, es decir que están repartidos los $ 17 mil millones. El contratista indica que este solo se ve reflejado en el general, en el de obra no se debe reflejar. La Interventoría responde al contratista que, si está reflejado, pero el contratista hizo una distribución en los CIV y así se está midiendo.

La Interventoría indica que en los avances programados y ejecutados no puede haber un desfase de más del 3%

**Se presentan los avances, los cuales están adjuntos al acta.*

c. Componente Ambiental

-Informe semanal 41: Aprobado
-Informe Mensual 9 (junio): Aprobado
-***Calificación semanal:*** 100%

El contratista manifiesta que el día de hoy realizo la entrega de la legalización del fresado a la Interventoría de la UMV, hay un viaje que no se debe legalizar, porque es el prestamos que se realizó al FDLK, el FDLK indica que si se debe adjuntar cuando se reintegre el material al proyecto, se dejara el recibo con comentario de que el material quedo en el acopio. El FDLK informa que ya cuentan con la resolución de fresado para la próxima semana devolver el material que se prestó y no tener ningún inconveniente.

En cuanto a la respuesta del PIGA el FDLK indica al contratista que se están desarrollando reuniones con respecto a los pines ambientales y se expuso la solicitud, pero no se comprometieron, el FDLK escalara el tema con la Alcaldesa.

Por otra parte, el FDLK indica que, en cuanto a la solicitud realizada a la SDA del componente Forestal, se informó que ya se están contactando con el contratista para gestionar la visita en campo. El contratista afirma que ya hubo un acercamiento de la SDA.

d. Componente de gestión social

-***Informe semanal 41:*** Aprobado
-Informe Mensual 9 (junio): La interventoría emitirá concepto de aprobación hoy.
-Calificación semanal:100%

El contratista manifiesta que a la fecha se cuenta con 22 PQRSD, de las cuales se tienen 17 cerradas, 5 abiertas. Esta semana se abrió una PQRSD, por una tapa de una caja de inspección, puesto que se evidencio que la tapa estaba rota. Se informó acerca de este hecho al área técnica e informa que se cuenta con unos tiempos de ejecución en los CIV y el CIV donde se presentó este problema no ha sido entregado.

El contratista desde el área técnica manifiesta que en comités anteriores informo que estas tapas no habían cumplido con el tiempo de fraguado en sitio y se fracturaban porque se fundían en sitio, así que el contratista decidió dejar que se fragüen en planta. El contratista manifiesta que las tapas que están fracturadas en campo se demolerán y se remplazarán.

El componente SST de interventoría indica que a esta tapa se le puso plafón y se señalizo para que no se presentara ningún accidente mientras es demolida.

En cuanto a temas de reuniones del componente de gestión social, el contratista informa que el comité FDLK No. 7 que se tenía programado para el 25 de julio de 2023 se reprogramo para el 28 de julio de 2023 a las 8 am.

El contratista infirma que la semana pasada se realizó también la capacitación a los empleados de obra sobre comunicación asertiva y se logró capacitar a 55 trabajadores de mano de obra no calificada de 60 que se tienen.

También el contratista manifiesta que realizo la capacitación a los líderes comunales y presidentes de las JAC el día 15 de julio de 2023, respecto a las funciones del FDLK y la administración local, al cual asistieron 23 personas.

La Interventoría por su parte indica que, se va a realizar una presentación y hay dos pendientes:

- Las prioridades que iniciaron ejecución en el mes de diciembre no van a hacer asfaltadas y se le prometió a la comunidad que serían asfaltadas el 15 de julio de 2023 y no han sido asfaltadas a la fecha.

Los CIV que debían estar ya asfaltados y terminados son las prioridades 28 y 29, se premió al contratista porque en los volantes se planteó la fecha de entrega del 15 de julio, pero sigue sin cumplirse.

El contratista manifiesta que de las 33 prioridades abiertas el único en el cual se debe instalar monoblock de15 cm es la prioridad 29, el contratista manifiesta que la justificación no es válida, pero es la realidad, la interventoría indica que, si es una justificación valida, pero este monoblock está llegando para la siguiente semana.

Además, el contratista indica que el monoblock está llegando la última semana del mes de julio. El 10 de agosto de 2023 se hará la verificación de la instalación del monoblock. El FDLK indica que el contratista tendrá que dar una explicación a la comunidad, y se espera que se cuente con eso 4 segmentos viales con monoblock y asfaltados lo antes posible para que se evidencie el avance.

El componente de gestión de gestión social solicita al contratista que cada vez que se tenga esa información técnica sea socializada con el componente de gestión social, para poder mediar y responder las inconformidades de la comunidad.

La Interventoría indica que se evidencio que hay una caja de inspección, la cual está revotando el agua, no se sabe quién es el responsable por ese daño. El contratista manifiesta que esa queja se ha tratado de solucionar varias veces y se ha hablado con la EAAB, se llevó el vactor a su vivienda para solucionar, pero la propietaria no se encuentra en el predio cuando se va a realizar la visita, y la EAAB no puede realizar ningún arreglo o adecuación sin que la propietaria este presente.

El día sábado 15 de julio de 2023 se intentó solucionar, se hizo un sondeo de 12 m y se evidencio que la tubería se encuentra colmatada, se aclara que esta colmatado el colector principal. La Interventoría manifiesta que las redes están generalizadas y ese taponamiento ha producido también problemas en la prioridad 12 y también se está rebosando todos los posos.

La Interventoría además agrega que en general de que al propietario o dueño del predio no se le puede descargar la responsabilidad de que llame a la EAAB y solucione. La Interventoría y el contratista se acordó que cuando surjan estos temas la responsabilidad es del contratista y se dan los daros al propietario para cuando vaya el vactor haya quien los atienda.

El contratista de obra manifiesta que este problema puede que se presente en varios predios, pero además indica que el tema de contratación del vactor implica un factor económico, ala vactor se le debe pagar por hora laborada, y es un cobro el cual no está dispuesto a cubrir, puesto que el colector estaba colmatado desde antes de iniciar la intervención en las prioridades abiertas a la fecha, es importante que se aclare cómo se debe proceder con el tema. El contratista propone remitir un oficio al FDLK como ciudadano interesado en donde el FDLK apoye la solicitud de las JAC del barrio para que se presente las fallas que tiene el colector de la zona.

El FDLK indica que se puede proyectar un oficio en el cual se indique que la solicitud se realiza en el marco de la nacionalidad de la EAAB, la cual tienen como finalidad mantener las redes, y así se podría surtir el tema, porque finalmente las redes existentes son de la EAAB, el contratista finalmente está construyendo y necesita conectar a un pozo. El contratista deberá enviar la solicitud el estado de los pozos y el colector para que se escale el tema desde el FDLK.

e. Componente SST

-Ingresos en la semana: 6 trabajadores de mano de obra no calificada, 4 ayudantes y 2 oficiales
-Retiros en la semana: 1 ayudante
- Indicador de rotación: 2%
-Ausentismo: 2.03%
-Informe semanal 41: Aprobado
-Informe Mensual 8 (mayo): La interventoría emitirá concepto de aprobación hoy.
-Calificación semanal: 100%

f. Tránsito y transporte

La interventoría indica que, los estados de los CIV a la fecha son:

- ***Etapa 1:*** 22 CIV
- ***Etapa 2*** 10 CIV
- ***Etapa 3:*** 11 CIV

La interventoría además indica que las

- Prioridades 3, 21 y 22 tiene vigencia del PMT hasta el 27 de julio de 2023.
- Prioridades 24 y 25 tienen vigencia de PMT hasta el 3 de agosto de 2023

La Interventoría solicita que los CIV que vayan asfaltando liberarlo de señalización de PMT, con el fin de que quede posibilidad de abrir más CIV, no se gaste más en señalización, calificación y prevención en problemas que puedan surgir. Se debe informar a la SDM para que los de por terminados y no se genere ningún incumplimiento.

El contratista por otra parte que, al terminar actividades de asfalto, se ha concretado con el mismo proveedor del concreto realizar la fabricación de los bolardos. Se planteará la revisión de los mismo de acuerdo a el factor económico con el que se cuente. La interventoría recomienda al contratista elaborar los PMT especial para estas actividades.

VARIOS

Facturación

-Cuenta No. 8 (mayo): El contratista manifiesta que el día de hoy se realizó la atención a las observaciones de la Interventoría del Informe mensual No. 8 (mayo) – Componente Técnico, pendiente a la aprobación de la Interventoría, para radicar la cuenta. La Interventoría indica que se realizara la revisión de la atención a las observaciones y se procede a realizar la revisión del informe de cuenta, anexar el acta y los soportes requeridos. La Interventoría procederá la revisión.

De contar con todos los productos del contratista aprobados, el martes 25 de julio de 2023 la interventoría radicara al FDLK, el acta de recibo parcial No. 8 con el informe de cuenta. El FDLK indica que ese pago ya entra es para el mes de agosto.

-Cuenta No.9 (junio): Como se informó al inicio del comité, esta pre-acta será entregada de acuerdo a las cantidades de acuerdo a lo requerido por la Interventoría, el día 26 de julio de 2023 radicando la V2.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Simulación de acta parcial final con cantidades a la fecha.	XIE S.A - SCLV	26-jul-23
2	Respuesta a la comunicación U233-G1-515-23 Observaciones a Plan Detallado de Trabajo – PDT.	XIE S.A	24-jul-23
3	Mesa de trabajo revisión NP 31 al 37.	XIE S.A - SCLV	24-jul-23
4	Radicación de oficio para EAAB solicitando limpieza de colector colmatado.	XIE S.A	26-jul-23
5	Concepto de la pre-acta de recibo parcial No.8 (mayo).	SCLV	25-jul-23
6	Radicación de la pre-ata de recibo parcial No.9 (junio)	XIE S.A	24-jul-23

Elaborada por: Interventoría – Juan Manuel Alba Rojas
Fecha de la próxima reunión: 27 de julio de 2023 Lugar de la próxima reunión: NA

AGENDA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO

Contratista de Obra XIE S.A – COP -621-22 Grupo 1

COMITÉ DE SEGUIMIENTO No.41

Fecha: 19 de julio de 2023

ORDEN DEL DIA

1.Compromisos				
No	**Asunto**	**Responsable**	**Fecha de compromiso**	**Cumplió SI/NO**
1	Inventario redes secas	Contratista	19-jul-23	SI
2	Simulación de acta parcial final con cantidades a la fecha	Contratista e interventoría	19-jul-23	NO
3	Alcance al NP-31 sumidero justificación técnica y económica	Contratista	19-jul-23	NO
4	Respuesta a la comunicación U233-G1-515-23 *Observaciones a Plan Detallado de Trabajo – PDT*	Contratista	13-jul-23	NO
5	Cantidades de diseño geométrico ajustadas de los 43 CIVs.	Contratista	18-jul-23	SI
6	Respuesta a la comunicación U233-G1-555-23 *Observaciones a NPs 31 al 44*	Contratista	17-jul-23	NO

2. Componentes
A. Técnico
- **Informes semanales junio:** 37 y 38 Observados / 39,40 y 41 sin radicar
- **Informe Mensual 8 (mayo):** Observado
- **Pre-Acta No.10 de recibo parcial No.8 (mayo):** Aprobada
- **Cuenta No. 8 (mayo):** Sin radicar
- **Calificación semanal:** 92% ***Calificación afecta por trabajar sin COI y por deficiencia en los senderos peatonales**
- **Otros:** - Confirmar en qué estado se encuentra el suministro de monoblock y cajas de inspección. - Confirmar cual es el volumen de GCR a instalar el próximo viernes
B. SST
- **Informe semanal 41:** Aprobado
- **Informe Mensual 8 (mayo):** La interventoría emitirá concepto de aprobación hoy.
- **Ingresos en la semana:** 4 ayudantes, 2 oficiales
- **Retiros en la semana:** 1 ayudante
- **Calificación semanal:** 100%

C. Ambiental
- **Informe semanal 41:** Aprobado
- **Informe Mensual 9 (junio):** Aprobado
- **Calificación semanal:** 100%
D. Gestión Social
- **Informe semanal 41:** Aprobado
- **Informe Mensual 9 (junio):** La interventoría emitirá concepto de aprobación hoy.
- **Calificación semanal:**100%
Varios
Obra

Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la Semana
4	8001069	**Calzada:** Se realiza instalación de fresado estabilizado del 4.85m3 K0+003 al K0+030. **Andén oriental:** Se realiza instalación parcial de concreto de 3000psi 11.93m2 del K0+000 al K0+032. **Andén occidental:** Sin actividades.
32	8000979	**Calzada**: Sin actividad. **Andén oriental:** Se realiza instalación parcial de concreto de 3000psi 9.34m2 del K0+000 al K0+031 **Andén occidental:** Se realiza instalación parcial de concreto de 3000psi 18.58m2 del K0+000 al K0+031.
28	8000929	**Calzada:** Se realiza excavación manual en intersección 2.95m3 del K0+000 al K0+005, nivelación y compactación de sub-rasante en intersección 4.92m2 del K0+000 al K0+005. **Andén oriental**: Se realiza instalación parcial de concreto de 3000psi 8.19m2 del K0+000 al K0+060, nivelación e instalación de marcos en cajas de inspección del K0+000 al K0+060. **Andén occidental:** Se realiza instalación parcial de concreto de 3000psi 9.89m2 del K0+000 al K0+060, nivelación e instalación de marcos en cajas de inspección del K0+000 al K0+060.
29	8000996	**Calzada:** Se realiza excavación manual en intersección 3.85m3 del K0+000 al K0+005, nivelación y compactación de sub-rasante en intersección 6.41m2 del K0+055 al K0+060. **Andén oriental:** Se realiza instalación parcial de concreto de 3000psi 2.6m2 del K0+000 al K0+060, nivelación e instalación de marcos en cajas de inspección del K0+000 al K0+060. **Andén occidental:** Se realiza instalación parcial de concreto de 3000psi 7.94m2 del K0+000 al K0+060,

Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la Semana
		nivelación e instalación de marcos en cajas de inspección del K0+000 al K0+060.
24	8000871	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental** Sin actividades.
25	8000923	**Calzada:** Se realiza nivelación parcial de fresado del K0+000 al K0+060. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.
21	8000821	**Calzada:** Se realiza nivelación de fresado estabilizado segunda capa 2.45 m3 del K0+001 al K0+008. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.
22	8000864	**Calzada:** Se realiza nivelación parcial de fresado del K0+000 al K0+060 **Andén oriental**: Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.
3	8000957	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.
13	8000772	**Calzada:** Sin actividad. **Andén occidental:** Se realiza instalación parcial de concreto de 3000psi 8.4m2 del K0+000 al K0+060. **Andén oriental:** Se realiza instalación parcial de concreto de 3000psi 27.33m2 del K0+000 al K0+060.
14	8000814	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Se realiza instalación parcial de concreto de 3000psi 5.33m2 del K0+000 al K0+060. **Andén occidental:** Sin actividad.
17	8000794	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Se realiza instalación de concreto 4000psi 15.62m3 del K0+000 al K0+060. **Andén occidental:** Se realiza instalación de concreto 4000psi 9.3m3 del K0+000 al K0+060.
18	8000839	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Se realiza instalación de concreto 4000psi 5.92m3 del K0+000 al K0+060, instalación parcial de concreto de 3000psi 6.87m2 del K0+000 al K0+060. **Andén occidental:** Se realiza instalación parcial de concreto de 3000psi 2.3m2 del K0+000 al K0+060.


Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la Semana
33	8001041	**Calzada:** Se realiza instalación de base estabilizada 5.72m3 del K0+022 al K0+032 y 3.68m3 del K0+003 al K0+010, nivelación de cargue de pozo 0.11ML. **Andén oriental:** Se realiza remate parcial en fachadas del K0+000 al K0+060. **Andén occidental:** Se realiza remate parcial en fachadas del K0+000 al K0+060.
31	8001058	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Se realiza instalación parcial de concreto de 3000psi 14.37m2 del K0+000 al K0+060, instalación parcial de concreto de 4000psi 6.15m2 del K0+000 al K0+060. **Andén occidental:** Se realiza instalación parcial de concreto de 3000psi 52.77m2 del K0+000 al K0+060, instalación parcial de concreto de 4000psi 60.11m2 del K0+000 al K0+060.
30	8001125	**Calzada:** Se realiza excavación manual para instalación de tubería 12 pulgadas, costado oriente 0.93m3, costado occidente 1.39m3, se realiza instalación de tubería corrugada de 12 pulgadas costado oriente 3.14ML, costado occidente 4.94ML, instalación de arena de peña costado oriente 0.73m3, costado occidente 1.09m3, instalación de geotextil 22.18m2 del K0+000 al K0+005, instalación de geo-celda 22.18m2 del K0+000 al K0+005, instalación de fresado 3.99m3 del K0+000 al K0+005,instalación de base estabilizada 7.13m3 del K0+000 al K0+010. **Andén oriental:** Se realiza instalación parcial de concreto de 3000psi 26.59m2 del K0+000 al K0+060. **Andén occidental:** Se realiza instalación parcial de concreto de 3000psi 25.82m2 del K0+000 al K0+060.
12	8000849	**Calzada:** Instalación de bordillo A-80 costado occidente 28ML del K0+000 al K0+028, costado occidente 18ML del K0+010 al K0+028, excavación parcial para instalación de bordillo A-80 1.89m3 del K0+000 al K0+028. **Andén oriental:** Se realiza instalación de fresado parcial 33.43m3 del K0+000 al K0+060, instalación parcial de geotextil 32m2 del K0+000 al K0+060, excavación manual parcial 2.57m3 del K0+000 al K0+060. **Andén occidental:** Se realiza instalación de fresado parcial 12.55m3 del K0+000 al K0+060, instalación

Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la Semana
		parcial de geotextil 19.42m2 del K0+000 al K0+060, excavación manual parcial 2.33m3 del K0+000 al K0+060, instalación parcial de cajillas de medidor 8und del K0+000 al K0+060, instalación parcial de concreto de 3000psi 52.56m2 del K0+000 al K0+060.
15	8000856	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Se realiza demolición parcial de concreto 31.67m2 del K0+000 al K0+060, se realiza excavación manual parcial 28.19m3 del K0+000 al K0+060.
16	8000907	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.
26	8000988	**Calzada:** Se realiza excavación manual costado occidente para instalación de tubería de 12 pulgadas 1.91m3, costado oriente 1.03m3, se realiza instalación de tubería movistar costado occidente 5.65ML, costado oriente 3.56ML, instalación de arena de peña para recubrimiento de tubería movistar 1.37m3, instalación de geotextil en intersección 15.62m2, instalación de geo- celda 15.62m2, instalación de fresado para lleno de geo-celda 2.81m2, instalación de fresado estabilizado 7.13 m3 del K0+000 al K0+010. **Andén oriental:** Se realiza demolición manual 36.59m2 del K0+000 al K0+060, se realiza excavación manual en anden 32.89m3 del K0+000 al K0+060. **Andén occidental:** Se realiza demolición manual 19.7m2 del K0+000 al K0+060, se realiza excavación manual en anden 18.18m3 del K0+000 al K0+060.
27	8001052	**Calzada:** Se realiza excavación manual en intersección costado oriente 1.02m3, costado occidente 1.72m3, instalación de geotextil en intersección 15.62m2, instalación de geo-celda en intersección 15.62m2, instalación e fresado en intersección para lleno de geo-celda 2.81m3 ,instalación de base estabilizada del 9.77m3 K0+050 al K0+063.30, instalación de tubería corrugada de 12 pulgadas costado occidente 4.20ML, costado oriente 5.20ML, instalación de arena de peña costado occidente 1.03m3, costado oriente 1.37m3. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.

Frentes de obra en la semana del 12 al 18 de julio de 2023:


Frentes de obra: 7

CIV abiertos: 21

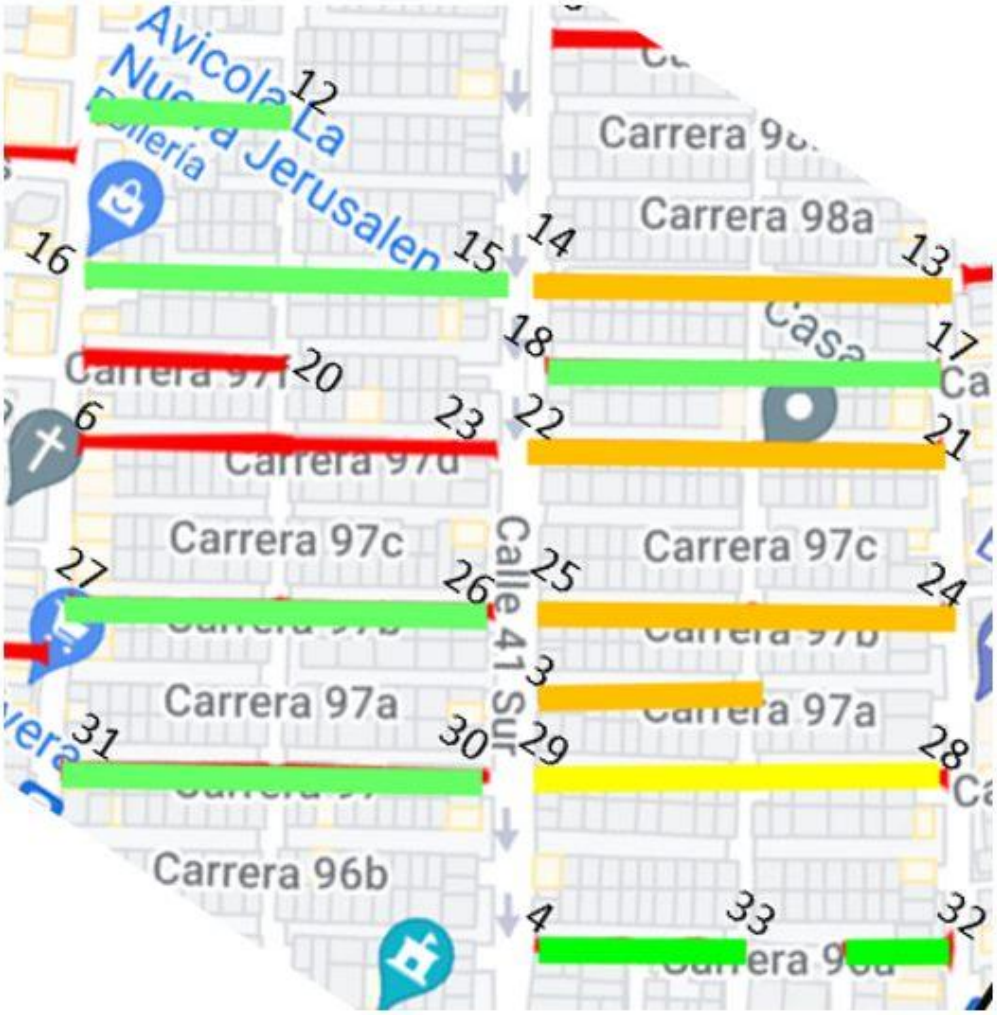


Nomenclatura	
	Frente de obra Activo
	Frente de obra Intermitente
	Frente de obra Inactivo
	Frente de obra sin inicio

AVANCE GRUPO 1

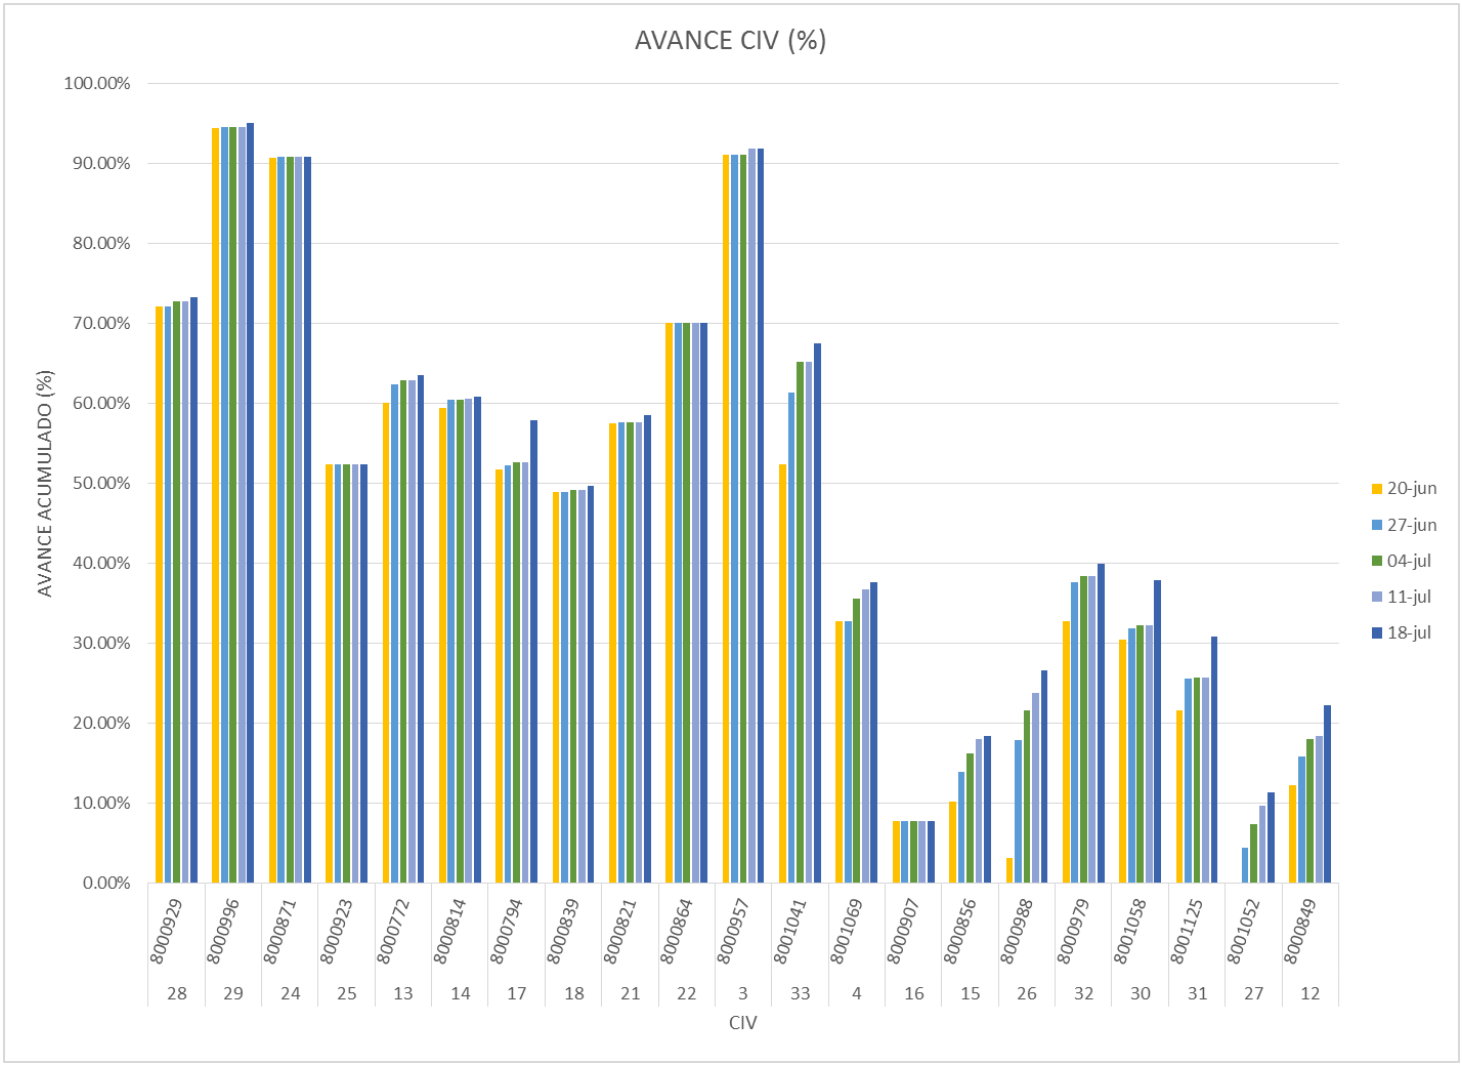

G1	18-jul-23		
	GENERAL	OBRA	FINANCIERO
% PROGRAMADO	77.04%	80.28%	77.04%
% EJECUTADO	32.09%	29.09%	17.52%
% DESVIACIÓN	-44.95%	-51.19%	-59.52%

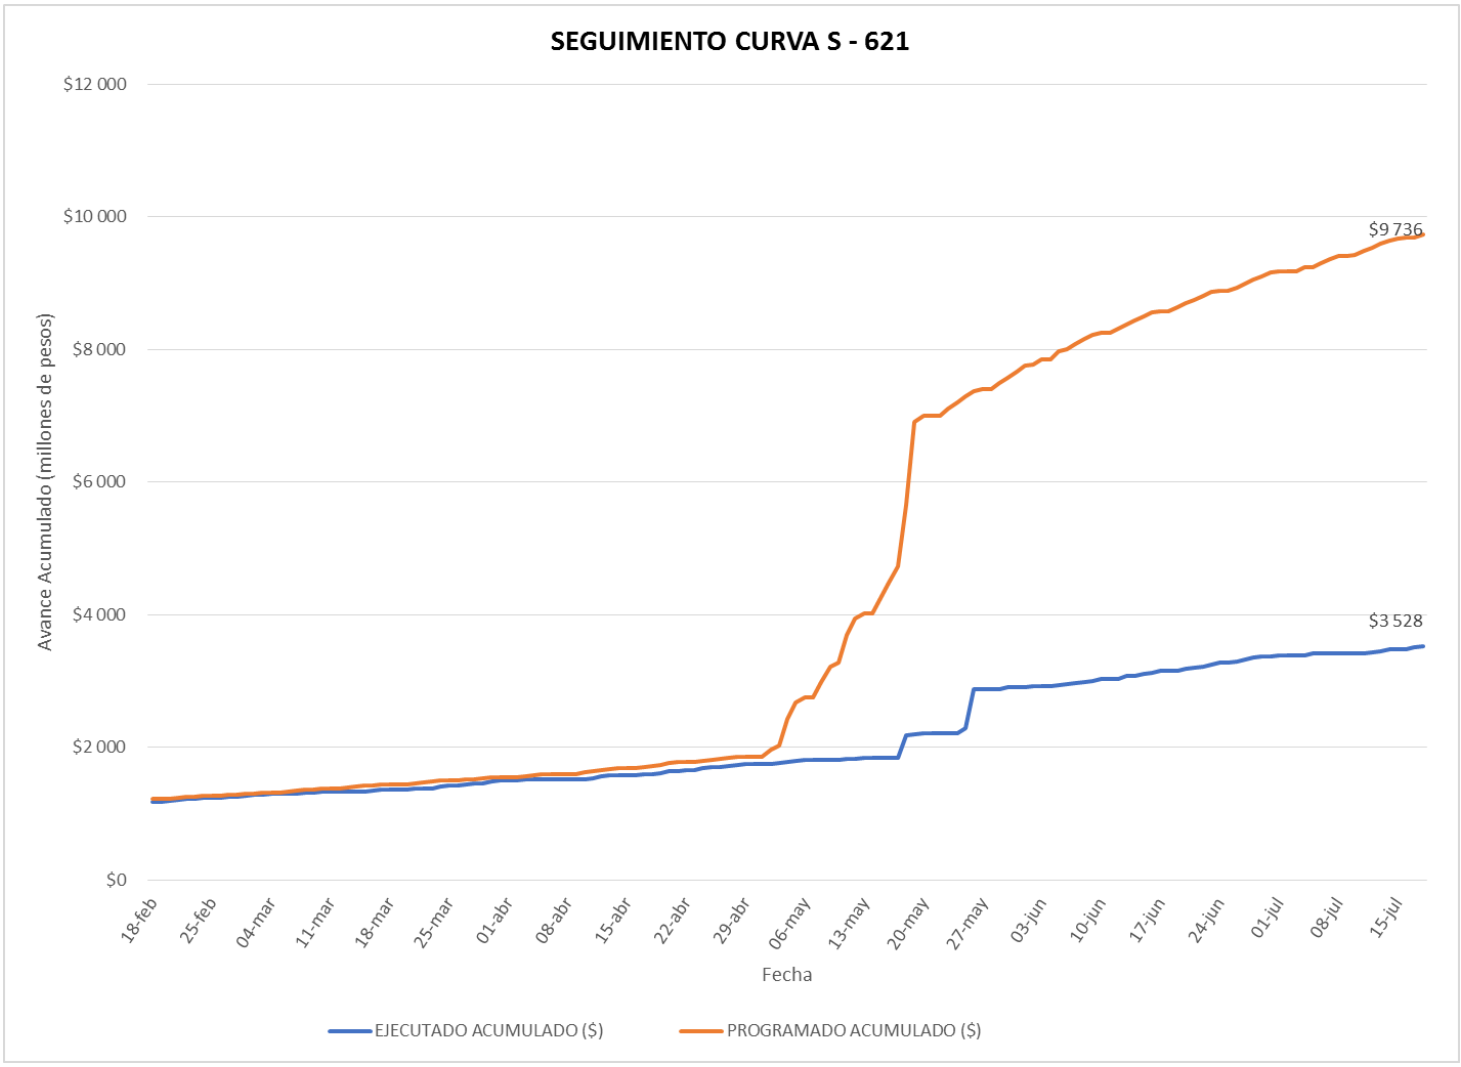

SEGUIMIENTO DIARIO EN MILLONES DE PESOS						
FECHA	**13-jul**	**14-jul**	**15-jul**	**16-jul**	**17-jul**	**18-jul**
PROGRAMADO ACUMULADO ($)	$9 589	$9 637	$9 677	$9 682	$9 691	$9 736
PROGRAMADO ACUMULADO (%)	79.06%	79.46%	79.79%	79.83%	79.91%	80.28%
EJECUTADO ACUMULADO ($)	$3 457	$3 476	$3 486	$3 486	$3 507	$3 528
EJECUTADO ACUMULADO (%)	28.50%	28.66%	28.74%	28.74%	28.92%	29.09%
DESVIACIÓN ($)	$ 6 132	$ 6 161	$ 6 192	$ 6 196	$ 6 184	$ 6 208
DESVIACIÓN (%)	**-50.56%**	**-50.80%**	**-51.05%**	**-51.09%**	**-50.99%**	**-51.19%**

SEGUIMIENTO GRUPO 1 AL 18-JULIO-2023								
P	**CIV**	**VALOR CIV**	**PROG-ACUM ($)**	**PROG-ACUM (%)**	**EJEC-ACUM ($)**	**EJEC-ACUM (%)**	**PESO EJEC PROG (%)**	**ATRASO (%)**
28	8000929	$ 349 737 154.00	$ 286 285 298.00	2.36%	$ 256 340 254.83	2.11%	73.30%	-0.25%
29	8000996	$ 276 918 878.00	$ 242 229 956.95	2.00%	$ 263 249 358.52	2.17%	95.06%	0.17%
24	8000871	$ 282 489 045.00	$ 269 517 473.15	2.22%	$ 256 550 937.78	2.12%	90.82%	-0.11%
25	8000923	$ 398 643 978.00	$ 345 626 779.89	2.85%	$ 208 705 995.46	1.72%	52.35%	-1.13%
13	8000772	$ 298 711 275.00	$ 289 860 253.15	2.39%	$ 189 481 147.08	1.56%	63.43%	-0.83%
14	8000814	$ 428 629 368.00	$ 414 590 745.60	3.42%	$ 260 332 131.06	2.15%	60.74%	-1.27%
17	8000794	$ 365 563 428.00	$ 305 729 990.38	2.52%	$ 211 455 835.02	1.74%	57.84%	-0.78%
18	8000839	$ 444 842 291.00	$ 414 390 409.14	3.42%	$ 220 824 624.34	1.82%	49.64%	-1.60%
21	8000821	$ 395 944 862.00	$ 379 185 734.00	3.13%	$ 231 576 216.77	1.91%	58.49%	-1.22%
22	8000864	$ 474 960 513.00	$ 407 701 220.24	3.36%	$ 332 683 700.61	2.74%	70.04%	-0.62%
3	8000957	$ 346 941 971.00	$ 324 515 767.59	2.68%	$ 318 567 533.03	2.63%	91.82%	-0.05%
33	8001041	$ 164 541 658.00	$ 148 920 206.67	1.23%	$ 111 041 660.81	0.92%	67.49%	-0.31%
4	8001069	$ 183 856 740.00	$ 154 073 695.45	1.27%	$ 69 089 499.53	0.57%	37.58%	-0.70%
16	8000907	$ 378 482 383.00	$ 361 864 228.92	2.98%	$ 29 056 430.62	0.24%	7.68%	-2.74%
15	8000856	$ 318 778 666.00	$ 314 966 117.90	2.60%	$ 58 544 904.26	0.48%	18.37%	-2.11%
26	8000988	$ 312 106 601.00	$ 248 815 938.04	2.05%	$ 82 858 292.62	0.68%	26.55%	-1.37%
32	8000979	$ 384 241 540.00	$ 313 656 771.99	2.59%	$ 66 948 341.53	0.55%	17.42%	-2.03%
30	8001058	$ 167 606 525.00	$ 151 794 191.30	1.25%	$ 131 840 154.49	1.09%	78.66%	-0.16%
31	8001125	$ 347 840 618.00	$ 307 025 458.10	2.53%	$ 108 772 480.07	0.90%	31.27%	-1.63%
27	8001052	$ 394 454 974.00	$ 379 247 233.34	3.13%	$ 51 565 343.18	0.43%	13.07%	-2.70%
12	8000849	$ 353 440 216.00	$ 295 012 954.84	2.43%	$ 68 452 350.65	0.56%	19.37%	-1.87%
8	8002417	$ 436 309 464.00	$ 433 765 201.90	3.58%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-3.58%
9	8002500	$ 341 127 565.00	$ 331 158 979.28	2.73%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-2.73%
27	8001052	$ 455 180 038.00	$ 384 495 380.79	3.17%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-3.17%
12	8000849	$ 307 654 668.00	$ 417 435 434.91	3.44%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-3.44%
23	8000916	$ 389 375 082.00	$ 341 149 570.13	2.81%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-2.81%
5	8000655	$ 464 716 467.00	$ 348 394 631.94	2.87%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-2.87%
40	8011953	$ 462 079 926.00	$ 287 827 654.39	2.37%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-2.37%
10	8011960	$ 492 144 459.00	$ 290 895 810.48	2.40%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-2.40%
35	8000743	$ 769 586 187.00	$ 259 149 707.20	2.14%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-2.14%
7	8000736	$ 492 144 459.00	$ 247 387 219.76	2.04%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-2.04%
2	8001595	$ 338 872 088.69	$ 31 823 371.30	0.26%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-0.26%
39	8000584	$ 443 145 176.00	$ 7 898 674.60	0.07%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-0.07%
TOTALES			**$ 9 736 392 061.32**	**80.28%**	**$ 3 527 937 192.27**	**29.09%**		**-51.19%**
TOTAL DE OBRA			**$ 12 128 504 795.27**					

FECHA EVALUACIÓN			20-jun	27-jun	04-jul	11-jul	18-jul
P	CIV	VALOR TOTAL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV
28	8000929	$ 349 737 154.00	72.03%	72.12%	72.67%	72.77%	73.30%
29	8000996	$ 276 918 878.00	94.42%	94.49%	94.49%	94.49%	95.06%
24	8000871	$ 282 489 045.00	90.72%	90.82%	90.82%	90.82%	90.82%
25	8000923	$ 398 643 978.00	52.35%	52.35%	52.35%	52.35%	52.35%
13	8000772	$ 298 711 275.00	60.05%	62.35%	62.90%	62.90%	63.43%
14	8000814	$ 428 629 368.00	59.42%	60.46%	60.46%	60.52%	60.74%
17	8000794	$ 365 563 428.00	51.70%	52.25%	52.58%	52.58%	57.84%
18	8000839	$ 444 842 291.00	48.82%	48.82%	49.12%	49.14%	49.64%
21	8000821	$ 395 944 862.00	57.50%	57.57%	57.57%	57.57%	58.49%
22	8000864	$ 474 960 513.00	70.04%	70.04%	70.04%	70.04%	70.04%
3	8000957	$ 346 941 971.00	91.09%	91.09%	91.09%	91.82%	91.82%
33	8001041	$ 164 541 658.00	52.30%	61.33%	65.11%	65.11%	67.49%
4	8001069	$ 183 856 740.00	32.66%	32.66%	35.55%	36.65%	37.58%
16	8000907	$ 378 482 383.00	7.68%	7.68%	7.68%	7.68%	7.68%
15	8000856	$ 318 778 666.00	10.19%	13.91%	16.16%	18.01%	18.37%
26	8000988	$ 312 106 601.00	3.06%	17.82%	21.62%	23.78%	26.55%
32	8000979	$ 384 241 540.00	14.25%	16.37%	16.75%	16.75%	17.42%
30	8001058	$ 167 606 525.00	63.00%	65.99%	66.80%	66.80%	78.66%
31	8001125	$ 347 840 618.00	21.95%	25.91%	26.08%	26.14%	31.27%
27	8001052	$ 394 454 974.00	0.00%	5.06%	8.39%	11.12%	13.07%
12	8000849	$ 353 440 216.00	10.67%	13.80%	15.64%	15.97%	19.37%

FECHA EVALUACIÓN			18-jul
P	CV	VALOR TOTAL CIV	%AVANCE DEL CIV
28	8000929	$ 349 737 154.00	0.52%
29	8000996	$ 276 918 878.00	0.57%
24	8000871	$ 282 489 045.00	0.00%
25	8000923	$ 398 643 978.00	0.00%
13	8000772	$ 298 711 275.00	0.53%
14	8000814	$ 428 629 368.00	0.21%
17	8000794	$ 365 563 428.00	5.26%
18	8000839	$ 444 842 291.00	0.51%
21	8000821	$ 395 944 862.00	0.91%
22	8000864	$ 474 960 513.00	0.00%
3	8000957	$ 346 941 971.00	0.00%
33	8001041	$ 164 541 658.00	2.37%
4	8001069	$ 183 856 740.00	0.93%
16	8000907	$ 378 482 383.00	0.00%
15	8000856	$ 318 778 666.00	0.35%
26	8000988	$ 312 106 601.00	2.77%
32	8000979	$ 384 241 540.00	0.68%
30	8001058	$ 167 606 525.00	11.86%
31	8001125	$ 347 840 618.00	5.13%
27	8001052	$ 394 454 974.00	1.96%
12	8000849	$ 353 440 216.00	3.40%
