BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo De Desarrollo Local de Kennedy

FECHA: 20 de abril de 23 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** 62.

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité Integral Nº7 de seguimiento Nº28.

HORA DE INICIO: 5:00 pm **HORA DE FINALIZACIÓN:** 7:00 pm.

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Andrés Mauricio Rojas L).			X						X	FOLK-Infraestructura	andresm.llanos@gobiernobogota.gov.co	3057039773	
Damlo Meneses Tolo			X						X	FOLK-INFRAESTRUCTURA	Damilo.Meneses@gobiernobogota.gov.co	3118988034	
Oswaldo Ladino Chavel			X						X	SCLV-INTERVENTORIA	dir-vialete silcarsa.com.co	3103178077	
Juan Manuel Alba Rojas			X						X	SCLV - INTERVENTORIA	gerencia@alavialidad.com	3107671842	
CAROLINA ROCHA		X								CVK22-DIRECCIÓN	crochad@alegrapco	3506789801	
Ricardo Peña									X	CVK2-	CVK22.director@gmail.com	3208405246	
Fernando A Osma P			X						X	CVK2	fernando.osma@gmail.com	3176963905	
Gladys Sarita Molina P.			X						X	CVK22	saritamolinapila@hotmail.com	3004938576	
Adriana Castro Alba			X						X	CVK22	CVK22ambiental@gmail.com	3103391162	
Carlos David Alarcón B.			X						X	CVK 22.	correspondencia.@gmail.com	3138723913	
Steven Beltran Galvis			X						X	CVK 22	correspondencia@gmail.com	3123181328	

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo De Desarrollo Local de Kennedy

FECHA: 20 de abriel del 2023 **Virtual:** ____ **Presencial:** ____ **(En caso de ser presencial):** ____ 62.

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité Integrao N°7 de seguimento N° 28

HORA DE INICIO: ____ **HORA DE FINALIZACIÓN:** ____

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Luisa Jaimes Rodriguez.			X						X	Interventoria	Socialfdlk.6105@gmail.	3214357623	Luisa Jaimes.
Martha C. Rodriguez H			X						X	Contratista	socialvk@gmail.com	3114883473	
Carlos E Shmn			X						X	Contratista	CVK22551@gmail.com	3148304880	
Sandra Patricia Gonzalez			X						X	Interventoria	sstkennedy@outlook.com	3178935603	
Katerine Samboni Ordoñez										Interventoria	ksamboni@outlook.com	8138896513	
Alba Yolanda Morales Arias			X							Interventoria SCLV	aymar1380@gmail.com	3114404 29	
Jorge Enrique Tamayo Mejía			X							Interventoria Cons. S.C.L.V.	kennedy.financiero@gmail.com	317-4410997	
Pablo Augusto Castillo G			X							Interventoría SCLV	pablo.castillo@lavialidad.com	3117556026	
Angeli Curel Acosta			X							Interventoria SCLV	0233SCLVkennedy@outlook.com	3277401848	
Karen Juleth Penagos Ramirez.			X							Interventoria SCLV	0233sclvkennedy@outlook.com	3143253729	

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

El Fondo de Desarrollo Local de Kennedy (FDLK), dio inicio a la reunión a las 4:00 pm, con la asistencia del Contratista de Obra CONSORCIO VÍAS DE KENNEDY 22 – GRUPO 2 y la Interventoría Consorcio SCLV.

Se realiza presentación de la nueva directora de obra del Contratista Gladys Sarita Molina Pita

Componente social

La Interventoría informa que, el próximo 26 de abril de 2023 se va a realizar el comité FDLK a las 9:00 am en la UPZ 80 y a las 2:00 pm en la UPZ 82. A la fecha se cuentan con 20 PQRSD de las cuales 17 están cerradas y 3 se encuentran abierta. La PQRSD de la señora Blanca Cuestas, de la prioridad 51 y 52, tiene que ver con el acta de exclusión, la peticionaria está solicitando se le informe si estas prioridades van a ser intervenidas, no se le ha podido dar respuesta.

La Interventoría menciona que se le debe comentar a la peticionaria que por presupuesto su CIV no se va a intervenir.

El FDLK solicita el Balance con el descuento de los monoblocks, y espacio público, para saber cuánta plata hace falta para hacer todos los segmentos viales. Desde la Interventoría se informa que, el día de ayer el Contratista radicó el balance y se encuentra en revisión, por lo tanto, para el día lunes se podría tener el dato que solicita el FDLK y dar respuesta a la PQRSD

La Interventoría menciona que, la PQRSD está por vencerse por termino, por lo tanto, el Contratista debe hacer un acta de compromiso, donde se le informe a la peticionaria que se le va a dar respuesta una vez se tenga el Balance del contrato, el FDLK solicita que se apoye con el soporte técnico a las profesionales sociales, para que la respuesta este fundamentada en esos términos.

El señor Leonardo Fonteche de la prioridad 61, presentó una PQRSD donde manifiesta que al interior del predio se esta presentando levantamiento de las baldosas, está solicitud ya se ha aperturado 2 veces. La primera vez, el Contratista le dio la respuesta y se cerró la PQRSD, donde se le informó al peticionario que no había incidencia por parte de la obra, luego, nuevamente abrió una PQRSD con la misma solicitud y la Interventoría realizó el acompañamiento al predio y se verificó que hubo una mala instalación de las baldosas, por lo que se dará está respuesta al peticionario con el soporte del área técnica. Es probable que está solicitud llegue al FLDK puesto que el ciudadano no se encuentra de acuerdo.

Adicional, la Interventoría informa que a la fecha el contrato cuenta con 2 derechos de petición. Uno se encuentra abierto, que corresponde a la prioridad 48-49 donde hay inconformidad por parte de la comunidad por el ancho de la vía, está solicitud está dirigida por el señor Richard Rico, el Contratista se acercó a las prioridades y se realizó una reunión extraordinaria con la comunidad, hubo un consenso y eran unas pocas personas las que no se encontraban de acuerdo, queda pendiente respuesta oficial por parte del contratista.

Actas de vecindad: Se remitió un apremio al Contratista, dado que había actas de vecindad por culminar y observaciones reiterativas, por lo que se realizaron mesas de trabajo con el Contratista y se subsanaron gran

parte de las observaciones y se da aprobación a las actas de vecindad de 26 CIVs. Sin embargo, hay actas pendientes por parte del Contratista y se solicita que para la próxima semana sean radicadas a la Interventoría y así mismo que estas actas de vecindad se comiencen a reportar en la Tera para verificar el registro fílmico y fotográfico.

Vallas móviles: En los recorridos realizados por Interventoría se ha evidenciado que en algunos CIVs no cuentan con vallas dado que están deterioradas o han sido robadas, a lo que el Contratista ha informado que se encuentran en elaboración, pero han pasado aproximadamente 15 días y aún no han llegado las vallas de reemplazo, ahora se van a hacer pendones. El Contratista informa que, hace falta un pendón en Corabastos y el lunes se tendrían instalados en obra.

Informe semanal No. 28: Aprobado
Informe mensual 6: Aprobado
Calificación: 100%

Componente SST
Se presentaron 6 ingresos que corresponden a 4 ayudantes, 1 oficial y 1 operador. A la fecha se tienen 5 personal más de mano de obra no calificada, 4 oficiales, 33 ayudantes, 4 Boal y 5 auxiliares de tráfico.

Calificación mensual marzo: 90%
Calificación semanal: 96%, se afectaron 2 ítems debido a la apertura que hicieron en la prioridad 44, donde iniciaron actividades de excavación sin contar con los insumos necesarios.
El Contratista atendió las observaciones realizadas por el FDLK a los Informes mensuales No. 3 y 4, y ya se encuentran aprobados por la Interventoría. El Informe mensual No. 5 se revisó en mesa de trabajo y se encuentra aprobado, hace falta que el Contratista lo radique de manera oficial para emitir comunicación con aprobación.
Informe mensual 6: En revisión conjunta en mesa de trabajo
Informe semanal 28: Aprobado

Componente Ambiental
Informe semanal 28: Aprobado
Informe mensual 6: Observado, está pendiente certificación de patio IDU y certificación de los monoblocks de ACO, el Contratista va a hacer alcance con la atención de las observaciones
Calificación: 96%

Maquinaria y Equipo
La Interventoría indica que las observaciones realizadas los formatos de marzo fueron subsanados por el Contratista y se encuentran aprobados.

Financiero
La Interventoría informa que se le envío una comunicación al Contratista relacionado con la devolución de la cuenta de cobro, con motivo de los ajustes, a lo que el Contratista manifestó que no se encontraba de acuerdo porque los ajustes eran por el cambio de vigencia, por lo que la Interventoría acepto la recomendación, sin

embardo, en el Contrato se encuentra que existe un segmento particular que seña que, no proceden ajustes cuando el Contratista está en incumplimiento, y en este momento el Contratista se encuentra incumpliendo, por lo que se le hará llegar al Contratista un comunicado informándole está condición, de que se replantea el tema de cambio de vigencia, pero no así el ajuste, debido al incumplimiento.

Tránsito y Transporte

La Interventoría informa que, dentro de los PMTs que se vienen ejecutando, se recibió la solicitud para abrir cuatro (4) prioridades: P68, P69, P70 y P71. Estos PMTs tenían unas observaciones de la SDM y al revisar la nueva versión se evidencia que están presentando en el plano como si estos PMTs fueran solos, pero cuando se tiene mas alrededor, pueden interferir unos con otros y hay que adecuar la señalización, y está fue la observación que se hizo para que fuera corregida.

La Interventoría recomienda que, se coloquen todos los PMTs pedacito por pedacito con toda su señalización, para que cuando vayan a implementar uno nuevo se mire la interferencia que tenga con los otros alrededor.

Adicionalmente, la Interventoría indica que en la SDM ya no hay prorrogas de PMTs, como están solicitando, siempre los PMTs son nuevos o iniciales, que uno se acabe el 31 de marzo y empiece el 1 de abril, es algo diferente. Todos son nuevos con la aclaración de que es algo que viene continuo.

Se estuvo revisando la base de señalización que se entregó de diseño que normalmente el Contratista la apropia, y hay 13 CIVs que no tienen los planos, esto puede pasar porque un plano tiene varios CIVs y solo se hayan incorporando en uno de los CIVs y en los otros no, en el caso que aplique, si es el mismo informe y el mismo plano, se debe subir en todos de igual forma para que siempre el CIV tenga sus informes completos. Cuando se termine un CIV, para poder entregar y ponerlo en funcionamiento, debe estar la señalización, si la señalización no se encuentra no se puede dar el servicio

La Interventoría propone mesa de trabajo con el especialista de tránsito del Contratista para revisar los Informes de señalización de cada CIV. Si llega haber un CIV sin señalización, se debe hacer el diseño y pasar a la SDM para que surta todo el proceso.

Por su parte, el FDLK, solicita se realice toda la verificación dado que, desde la formulación se verificó que todos los segmentos viales contaran con todos los diseños.

Componente Técnico

Frentes de obra activos: 7
Calificación: 85%
Prioridades sin actividad en la semana: P65 y P74

Se dio apertura a la prioridad 44 el 18 de abril de 2023, sin el PMT implementado completamente y sin diseños ajustados, dado que presentan diferencias en las cotas de los empalmes y pendientes variables. En la prioridad 82 se tienen fundidas las losas del espacio público, hacen falta los extremos. En el 81 se tiene el costado oriental fundido. También se vacío concreto en el 61 en un costado

Informes mensuales 5 y 6: Sin radicar
Informes semanales del 18 al 28: Sin radicar

Programación
Se adjunta a la presente acta, los avances de la semana No. 28

Facturación
La Interventoría informa que, se realizó reunión interna, con el fin de determinar los factores que estaban afectado en que los documentos contractuales y de cuentas estaban siendo observados más de 3 veces. La Interventoría manifiesta que, con respecto a las cuentas, se definió que, en el informe de actividades y soportes, cada uno de los componentes debe realizar la revisión de las obligaciones y soportes que le competan. Se recomienda al Contratista que haga esta actividad junto con su par de interventoría, para que no se presenten errores, observaciones o devoluciones. De haber errores en las siguientes cuentas, se procederá con una solicitud de multa para el contratista puesto que se ha socializado sobre el tema en varias ocasiones.
La Interventoría se compromete a realizar la entrega de la cuenta No. 3 de diciembre el lunes 24 de abril de 2023, de contar con todos lo exigido. El FDLK solicita al contratista agregar al cuadro de control financiero la comunicación y fecha de radicación de la misma a la Interventoría. Además, el FDLK solicita al contratista e Interventoría ponerse al día con informes y cuentas, puesto que no se está dando cumplimiento al PAC.

No	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Actas de vecindad pendientes	CVK22	27-abr-23
1	Comunicación al FDLK informando sobre el plan de contingencia y su cumplimiento – Estado de multas	SCLV	26-abr-23
2	Reporte de área aferente para cuantificación de espacio público	CVK22	26-abr-23
3	NPs de espacio público – Balance - Informe de justificación	CVK22-SCLV	26-abr-23
4	Cuentas de diciembre de 2023 ajustadas	SCLV	24-abr-23
5	Instalación de Pendones	CVK22	24-abr-23
6	Alcance de CIVs a intervenir para dar respuesta a PQRS-P50 y 51	CVK22	26-abr-23

Elaborada por: Interventoría – Juan Manuel Alba Rojas
Fecha de la próxima reunión: 27 de abril de 2023 Lugar de la próxima reunión: N/A

AGENDA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO

Contratista de Obra Consorcio Vías de Kennedy – COP -690-22 Grupo 2

COMITÉ INTEGRAL No.7 DE SEGUIMIENTO No.28

Fecha: 20 de abril de 2023

ORDEN DEL DIA

1.Compromisos	
No	**Asunto**
1	NPS – Balance – Acta de Fijación
2	Plan de contingencia – Programación PDT – Flujo de caja
3	Informes semanales actualizados y cargados a la nube
4	Comunicación al FDLK informando sobre el plan de contingencia y su cumplimiento – Estado de multas
5	AIU: Ajuste de impuestos descontando componentes
6	Reporte de área aferente para cuantificación de espacio público
7	NPs de espacio público – Balance - Informe de justificación
8	Radicación de NPs espacio público– Balance - Informe de justificación al FDLK
9	Informe mensual Diciembre 2022 y enero de 2023 ajustados
10	Cuentas Diciembre 2022 y enero de 2023 ajustadas

Convenciones

Radicado	
En elaboración	
En revisión	
Pendiente	

2. Componentes
A. Técnico
- **Informe semanal 28:** Sin Radicar
- **Informe Mensual 6:** Sin Radicar
- **Calificación:** 85%
Obra
B. SST

-	**Informe semanal 28 :** Aprobado
-	**Informe Mensual 6:** En revisión conjunta
-	**Calificación:** 96%
C.	**Ambiental**
-	**Informe semanal 28:** Sin Radicar
-	**Informe Mensual 6:** Observado
-	**Calificación:** 96%
D.	**Gestión Social**
-	**Informe semanal 28 :** Revisión
-	**Informe Mensual 6:** Aprobado
-	**Calificación:** 100%
Especialidades	
Varios	

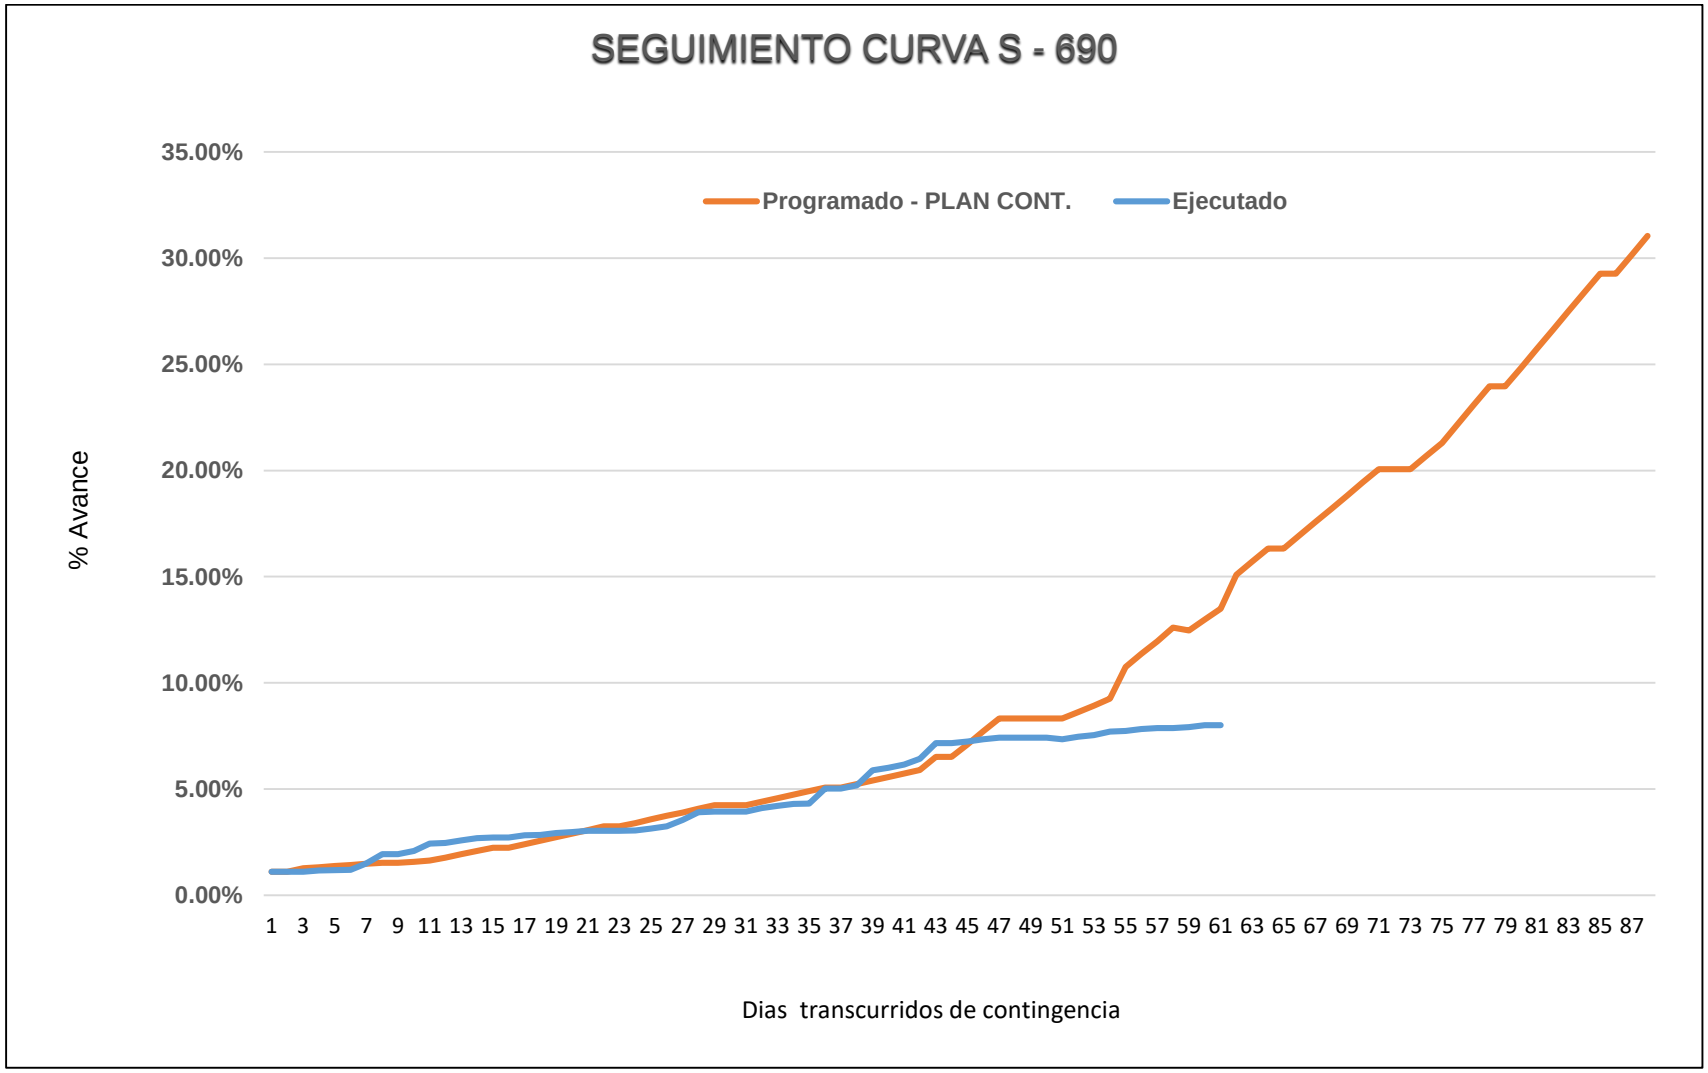
Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la semana
81	8005000	Se realiza fundidas de losa de concreto para espacio público y rampa
82	8005078	Se realiza fundidas de losa de concreto para espacio público y rampa
60	8002162	Excavación a instalación de monoblock
61	8002265	Instalación de bordillos, construcción de cajas de inspección , llenos y compactación en rampas y peatonal
64	8001931	Instalación de fresado estabilizado, bordillo, monoblock
65	8002008	No se realizó actividad en la semana
73	8001148	Excavación manual para monoblock
74	8001184	No se realizó actividad en la semana
75	8001223	Instalación de geotextil, geocelda y fresado
76	8001183	Excavación manual para monoblock
66	8001876	Excavación, instalación de geotextil, geocelda, fresado y estabilizado

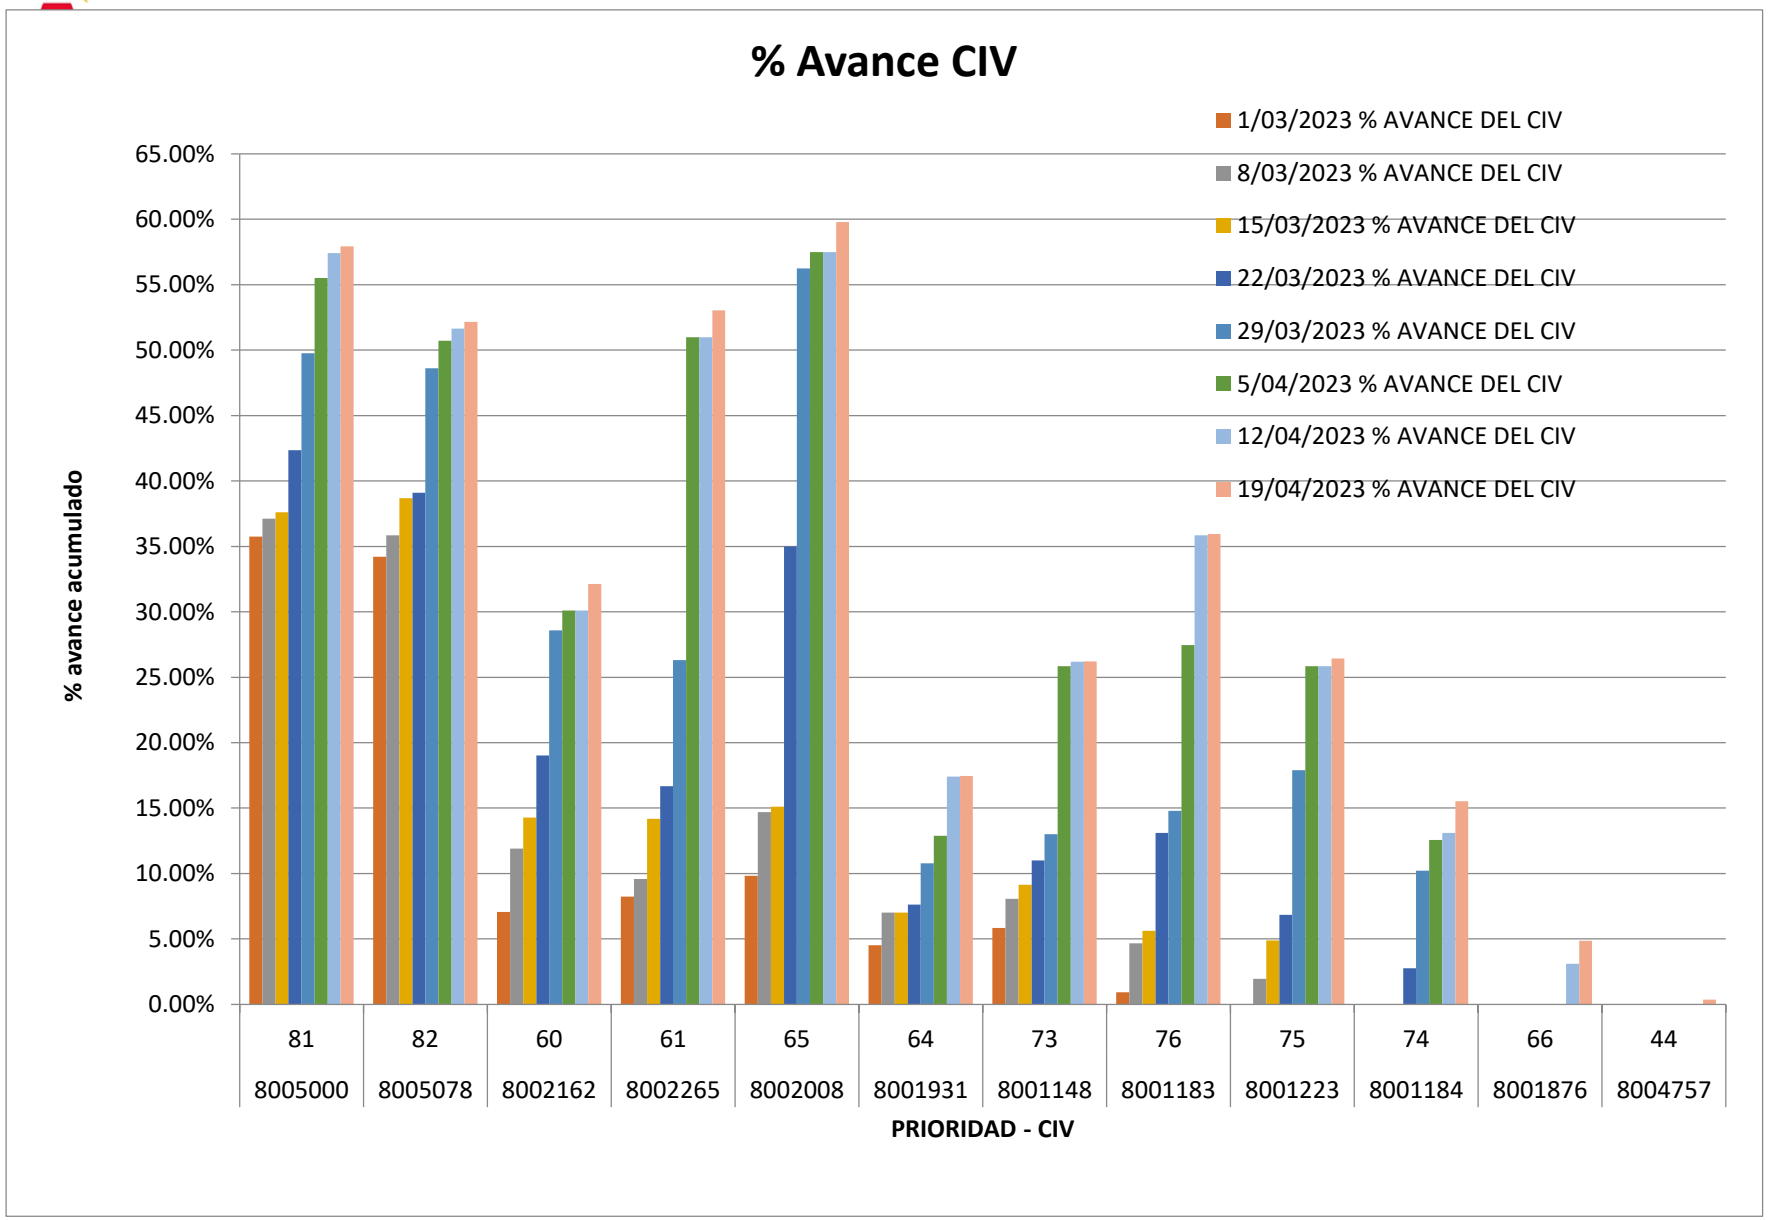
SEGUIMIENTO GRUPO 2 AL 19-ABRIL-2023

PRIORIDAD	CIV	PROGRAMADO ACUMULADO	% PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO
81	8005000	$ 300 505 579	1.73%	$ 210 963 236	1.22%
82	8005078	$ 232 199 619	1.34%	$ 221 992 507	1.28%
60	8002162	$ 158 149 986	0.91%	$ 117 010 376	0.68%
61	8002265	$ 207 085 064	1.19%	$ 220 343 676	1.27%
65	8002008	$ 205 046 519	1.18%	$ 239 937 698	1.38%
64	8001931	$ 302 862 919	1.75%	$ 99 225 055	0.57%
73	8001148	$ 120 795 340	0.70%	$ 84 596 123	0.49%
76	8001183	$ 38 940 151	0.22%	$ 66 623 952	0.38%
75	8001223	$ 38 567 793	0.22%	$ 45 776 532	0.26%
74	8001184	$ -	0.00%	$ 57 547 192	0.33%
44	8004757	$ -	0.00%	$ 938 344	0.01%
66	8001876	$ -	0.00%	$ 13 720 777	0.08%
TOTAL		**$ 1 604 152 970**	**9.26%**	**$ 1 378 675 468**	**7.96%**

SEGUIMIENTO DIARIO EN MILLONES DE PESOS							
FECHA	**13-abr**	**14-abr**	**15-abr**	**16-abr**	**17-abr**	**18-abr**	**19-abr**
PROG ACUM	$ 1 863	$ 1 969	$ 2 073	$ 2 184	$ 2 161	$ 2 249	$ 2 338
% PROG ACUM	10.75%	11.36%	11.96%	12.60%	12.47%	12.98%	13.49%
EJEC ACUMULADO	$ 1 341	$ 1 355	$ 1 364	$ 1 364	$ 1 373	$ 1 386	$ 1 386
% EJEC ACUMULADO	7.74%	7.82%	7.87%	7.87%	7.92%	8.00%	8.00%
DESVIACIÓN	$ 522	$ 613	$ 709	$ 820	$ 789	$ 863	$ 951
% DESVIACIÓN	**-3.01%**	**-3.54%**	**-4.09%**	**-4.73%**	**-4.55%**	**-4.98%**	**-5.49%**

G2	**19-abr-23**		
	GENERAL	**OBRA**	**FINANCIERO**
% PROGRAMADO	14.04%	13.49%	14.04%
% EJECUTADO	8.66%	7.96%	7.22%
% DESVIACIÓN	**-5.38%**	**-5.53%**	**-6.82%**


SEGUIMIENTO CURVA S - 690
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
% Avance
Programado - PLAN CONT.
Ejecutado
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87
Dias transcurridos de contingencia


% Avance CIV
1/03/2023 % AVANCE DEL CIV
8/03/2023 % AVANCE DEL CIV
15/03/2023 % AVANCE DEL CIV
22/03/2023 % AVANCE DEL CIV
29/03/2023 % AVANCE DEL CIV
5/04/2023 % AVANCE DEL CIV
12/04/2023 % AVANCE DEL CIV
19/04/2023 % AVANCE DEL CIV
% avance acumulado
65.00%
60.00%
55.00%
50.00%
45.00%
40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
81 8005000
82 8005078
60 8002162
61 8002265
65 8002008
64 8001931
73 8001148
76 8001183
75 8001223
74 8001184
66 8001876
44 8004757
PRIORIDAD - CIV

CIV	FECHA EVALUACIÓN		1/03/2023	8/03/2023	15/03/2023	22/03/2023	29/03/2023	5/04/2023	12/04/2023	19/04/2023
	PRIORID.	VALOR TOTAL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV
8005000	81	$364 077 458.00	35.75%	37.13%	37.60%	42.36%	49.77%	55.51%	57.43%	57.94%
8005078	82	$425 507 175.00	34.21%	35.84%	38.69%	39.10%	48.62%	50.72%	51.65%	52.17%
8002162	60	$364 209 277.00	7.05%	11.90%	14.27%	19.03%	28.59%	30.10%	30.10%	32.13%
8002265	61	$415 513 194.00	8.24%	9.59%	14.18%	16.68%	26.30%	50.99%	50.99%	53.03%
8002008	65	$401 291 370.00	9.82%	14.68%	15.12%	34.98%	56.25%	57.49%	57.49%	59.79%
8001931	64	$568 211 892.00	4.52%	7.01%	7.01%	7.62%	10.79%	12.87%	17.41%	17.46%
8001148	73	$322 618 893.00	5.84%	8.06%	9.13%	11.01%	13.01%	25.85%	26.20%	26.22%
8001183	76	$185 301 497.00	0.92%	4.68%	5.61%	13.09%	14.79%	27.45%	35.85%	35.95%
8001223	75	$177 019 809.00	0.00%	1.96%	4.89%	6.85%	17.90%	25.83%	25.83%	26.42%
8001184	74	$377 246 206.00	0.00%	0.00%	0.00%	2.76%	10.21%	12.58%	13.11%	15.52%
8001876	66	$323 442 256.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.10%	4.86%
8004757	44	$566 710 811.39	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.36%

GRUPO 2 – CONSORCIO VÍAS KENNEDY 2022 COP-690-22

