BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo De Desarrollo Local de Kennedy

FECHA: 27 de abril 23 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** GUPO2.

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de seguimiento # 29.

HORA DE INICIO: ____ **HORA DE FINALIZACIÓN:** ____

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Juan Manuel Alba Rojas		X								Consorcio SCLV	juan.alba@lacruzidad.com	3107671842.	
ARTURO ZARATE M			X							CONSORCIO SCLV	arturozarate01@yahoo.com	3152786803	
Danilo Meneses Toro			X						X	FDLK-Infraestructura	Danilo.Meneses@gobiernobogota.gov.co	3187880034	
Steven Beltran Galvis			X						X	Residente.2cvk2@gmail.com	Consorcios Vias Kennedy	3123181328	Steven B
Gladys Sarita Molina Pilo		X								consorcio vias kennedy 22	CVK22.director@gmail.com	3004938576	
Andrés Mauricio Rojas L.			X						X	andres.m.llanos@gobiernobogota.gov.co	FDLK-Infraestructura	3059039773	
Ram Somborni										Katerine@Outlook.com	Interventoria.	3138896513	Ram S.
Héctor Maldonado			X							CVK22	Gerencia@cheyrap.co	3005420	
Ricardo Peña Acevedo										CVK22	cvk22.director@gmail.com	3208405546	

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

El Fondo de Desarrollo Local de Kennedy (FDLK), dio inicio a la reunión a las 4:00 pm, con la asistencia del Contratista de Obra CONSORCIO VÍAS DE KENNEDY 22 – GRUPO 2 y la Interventoría Consorcio SCLV.

Tránsito

El especialista de tránsito de la Interventoría informa que, el Contratista radicó los PMT para la continuación de las prioridades 81, 82, 60, 61, 64, 65, 73, 74, 75 y 76. La Interventoría sugiere que para los siguientes PMT que se vayan a radicar, darles un mayor tiempo de implementación para no estar haciendo la renovación si es posible.

Obra

La Interventoría comenta que, lo que se observa en obra con respecto al porcentaje de lo que vale el avance físico, no coincide con la medición.

AVANCE	24-abr-23		
	GENERAL	FISICO	FINANCIERO
% PROGRAMADO	15.59%	16.95%	15.59%
% EJECUTADO	9.79%	9.09%	7.22%
% DESVIACIÓN	-5.80%	-7.86%	-8.37%

FECHA EVALUACIÓN		1-mar	8-mar	15-mar	22-mar	29-mar	5-abr	12-abr	19-abr	26-abr
Prioridad	VALOR TOTAL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV
81	$ 364.077.458,00	35,75%	37,13%	37,60%	42,36%	49,77%	55,51%	57,43%	58,13%	58,13%
82	$ 425.507.175,00	34,21%	35,84%	38,69%	39,10%	48,62%	50,72%	51,65%	54,78%	54,93%
60	$ 364.209.279,11	7,05%	11,90%	14,27%	19,03%	28,59%	30,10%	30,10%	32,13%	45,92%
61	$ 415.513.196,48	8,24%	9,59%	14,18%	16,68%	26,30%	50,99%	50,99%	53,03%	55,67%
65	$ 401.291.370,00	9,82%	14,68%	15,12%	34,98%	56,25%	57,49%	57,49%	59,79%	60,80%
64	$ 568.211.892,00	4,52%	7,01%	7,01%	7,62%	10,79%	12,87%	17,41%	17,46%	24,79%
73	$ 322.618.893,00	5,84%	8,06%	9,13%	11,01%	13,01%	25,85%	26,20%	26,22%	36,08%
76	$ 185.301.495,53	0,92%	4,68%	5,61%	13,09%	14,79%	27,45%	35,85%	35,95%	35,95%
75	$ 177.019.790,30	0,00%	1,96%	4,89%	6,85%	17,90%	25,83%	25,83%	26,42%	26,42%
74	$ 377.246.202,99	0,00%	0,00%	0,00%	2,76%	10,22%	12,58%	13,11%	15,52%	15,55%
70	$ 358.334.979,40	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,62%
66	$ 323.442.256,55	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,79%	4,72%	17,84%
44	$ 566.710.811,39	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,39%	0,54%
62	$ 453.800.624,89	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

En la tabla se relaciona un avance del 58,13% para la P81, pero visualmente, el avance para está prioridad está alrededor del 85.
La Interventoría indica que, la gráfica no es el reflejo de la obra, pero es la que se debe reportar al FDLK
El Contratista debe actualizar el Plan detallado de trabajo – PDT, dado que, si se continua así, no podrán cobrar abril porque presentan atraso.

El Contratista informa que, en cuanto al presupuesto programado, radicaron las cantidades que saben que no se van a ejecutar, entonces, ese valor programado de los primeros CIVs ya está ajustado a lo que realmente se va a ejecutar. El PDT actualizado lo radicarían mañana de acuerdo con las observaciones que se realizaron

La Interventoría informa que los NPs de espacio público (NP-29 y NP-30) se encuentran observados y solicita al Contratista enviar una lista de las longitudes por el no uso del monoblock, es decir, lo que se va a reemplazar por el monoblock y con eso ya se tienen las cantidades definitivas de monoblock.

El FDLK reitera al Contratista que solo se necesita el 25% de grano de caucho y deben tenerlo en cuenta desde ya en el Balance del contrato. Además, solicita que se cierren los CIVs del Barrio El Amparo que se tienen abiertos desde diciembre.

Sumideros

De acuerdo con la reunión con el Acueducto se indicó que el sumidero prefabricado debe ser remplazado por mampostería y en la parte superior debe ir el prefabricado del marco y la rejilla. El contratista manifiesta que está contemplando una mejor solución, y así tener un concepto favorable por parte del proveedor. La idea es que, mañana en la reunión con EAAB sobre inspecciones CCTV, también se toque el tema de sumideros y sustentar la solución de las adecuaciones.

Facturación

Enero

- Informes mensuales y semanales: Aprobados
- Informes mensuales radicados al FDLK: 28 de abril de 2023
- El Contratista radicó hoy la cuenta No. 4
- Fecha revisión Interventoría: 3 de mayo de 2023
- Fecha radicación del Acta No. 6 de pago No. 4 al FDLK: 4 de mayo de 2023

Febrero

- Informes mensuales: La Interventoría informa que falta por aprobación el Informe Técnico, el cual fue radicado ayer, 26 de abril de 2023 y se encuentra en revisión.
- Informes semanales: Aprobados
- Aprobación del Informe mensual No. 5 – Técnico: 5 de mayo de 2023
- Informes mensuales radicados al FDLK: 5 de mayo de 2023
- El Contratista radica la cuenta No. 5 mañana, 28 de abril de 2023
- Fecha revisión Interventoría: 8 de mayo de 2023
- Fecha radicación del Acta No. 7 de pago No. 5 al FDLK: 9 de mayo de 2023

Marzo

- Informe mensual técnico: 2 de mayo de 2023

- Revisión del Informe mensual técnico: 5 de mayo de 2023
- El Contratista radicó hoy los informes semanales de marzo
- El Contratista radica la cuenta No. 6 el 4 de mayo de 2023
- Fecha revisión Interventoría: 8 de mayo de 2023
- Fecha radicación del Acta No. 8 de pago No. 6 al FDLK: 9 de mayo de 2023

No	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Radicación de cuentas e informes de acuerdo con lo pactado	CVK22 SCLV	Ver anexo 1
2	Plan detallado de trabajo actualizado - PDT	CVK22	28-abr-23

Elaborada por: Interventoría – Juan Manuel Alba Rojas

Fecha de la próxima reunión: 4 de mayo de 2023 Lugar de la próxima reunión: N/A

AGENDA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO

Contratista de Obra Consorcio Vías de Kennedy – COP -690-22 Grupo 2

COMITÉ DE SEGUIMIENTO No.29

Fecha: 27 de abril de 2023

ORDEN DEL DIA

1.Compromisos	
No	**Asunto**
1	Comunicación al FDLK informando sobre el plan de contingencia y su cumplimiento – Estado de multas
2	Reporte de área aferente para cuantificación de espacio público
3	NPs de espacio público – Balance - Informe de justificación
4	Cuentas de enero de 2023 ajustadas
5	Instalación de Pendones
6	Alcance a CIV a intervenir para dar respuesta a PQRS

Convenciones

Radicado	
En elaboración	
En revisión	
Pendiente	

2. Componentes
A. Técnico
- **Informe semanal 29:** Sin Radicar
- **Informe Mensual 6:** Sin Radicar
- **Calificación:** 90%
Obra
B. SST
- **Informe semanal 29 :** Aprobado
- **Informe Mensual 6:** En revisión conjunta
- **Calificación:** 100%
C. Ambiental
- **Informe semanal 29:** Aprobado

-	**Informe Mensual 6:** Observado (Soportes, certificados de materiales y RCD)
-	**Calificación:** 100%
D.	**Gestión Social**
-	**Informe semanal 29 :** Aprobado
-	**Informe Mensual 7:** Elaboración
-	**Calificación:** 100%
OBRA	

Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la semana
81	8005000	Sin actividades
82	8005078	Conformación de andén y vaciado de concreto pendiente costado oriental
60	8002162	Excavaciones e instalación de monoblock
61	8002265	Conformación y vaciado de concreto en espacio público
64	8001931	Instalación de monoblock
65	8002008	Instalación de monoblock
73	8001148	Excavación e instalación de monoblock
74	8001184	Excavación para monoblock
75	8001223	Sin actividades
76	8001183	Excavación para monoblock
66	8001876	Instalación de estabilizado arreglo de fallo instalación de monoblock
44	8004757	Excavación mecánica de la calzada





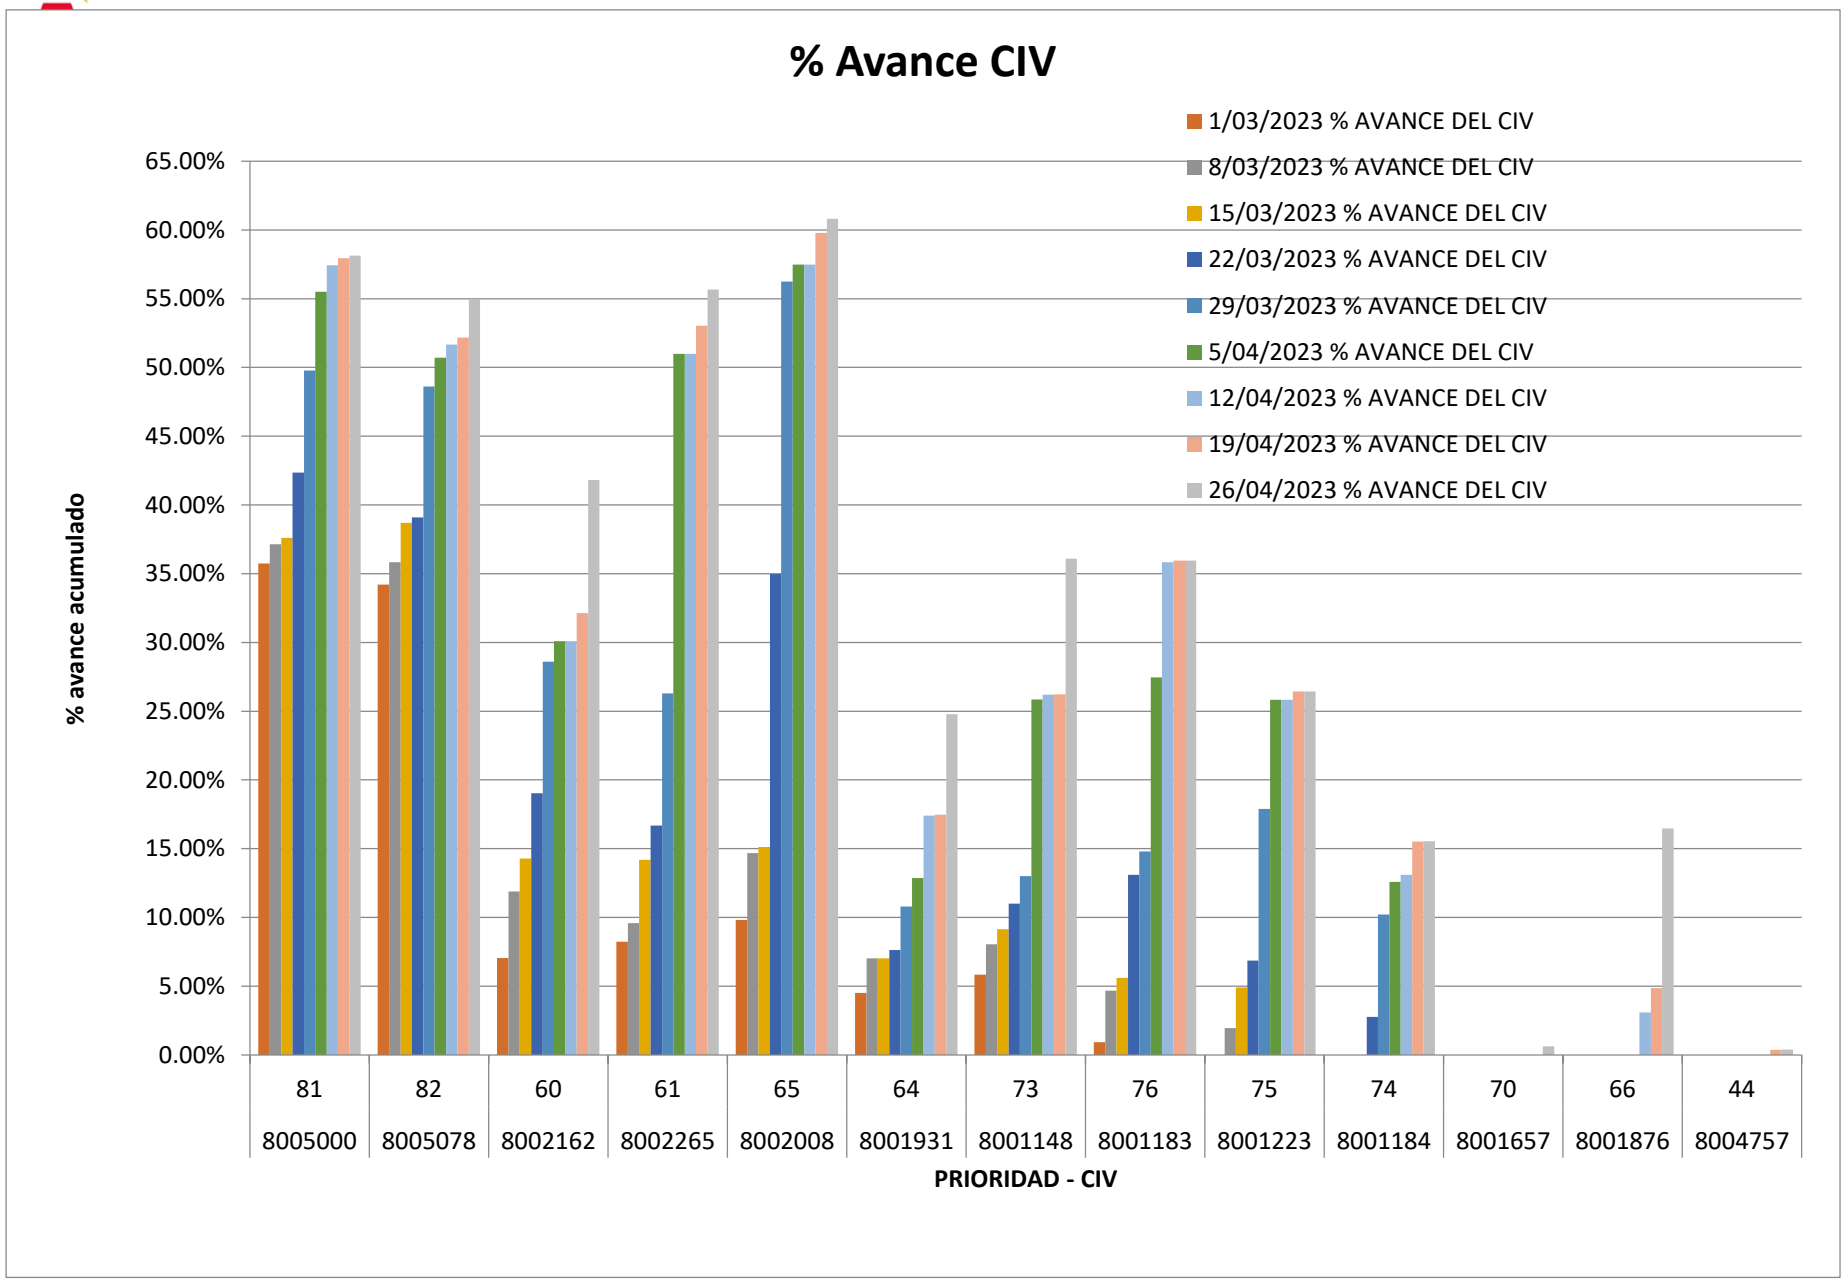


SEGUIMIENTO GRUPO 2 AL 26-ABRIL-2023

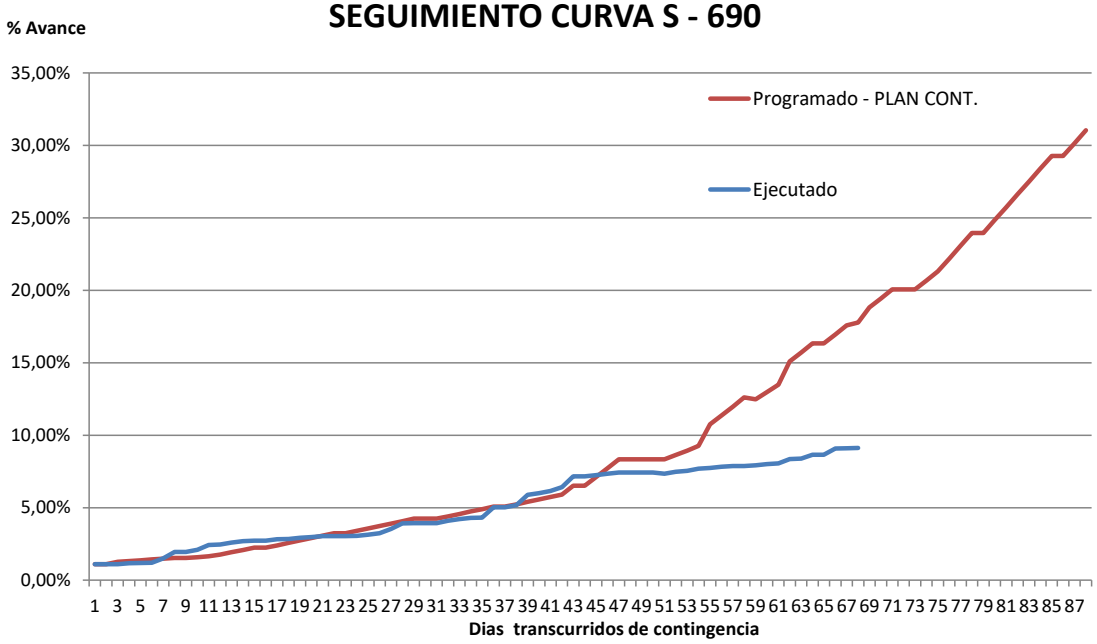
PRIORIDAD	CIV	PROGRAMADO ACUMULADO	% PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO
81	8005000	$ 364 077 459	2.10%	$ 211 629 786	1.22%
82	8005078	$ 425 507 176	2.46%	$ 233 752 161	1.35%
60	8002162	$ 364 209 279	2.10%	$ 167 262 536	0.97%
61	8002265	$ 415 513 196	2.40%	$ 231 316 751	1.33%
65	8002008	$ 387 770 966	2.24%	$ 243 992 975	1.41%
64	8001931	$ 568 211 891	3.28%	$ 140 832 283	0.81%
73	8001148	$ 180 512 561	1.04%	$ 116 413 415	0.67%
76	8001183	$ 75 692 963	0.44%	$ 66 623 952	0.38%
75	8001223	$ 86 361 214	0.50%	$ 46 776 532	0.27%
74	8001184	$ 67 365 393	0.39%	$ 58 655 342	0.34%
70	8001657	$ 53 750 247	0.31%	$ 2 227 848	0.01%
66	8001876	$ -	0.00%	$ 53 282 679	0.31%
44	8004757	$ -	0.00%	$ 2 227 848	0.01%
62	8002055	$ 90 760 125	0.52%	$ -	0.00%
TOTAL		**$ 3 079 732 471**	**17.77%**	**$ 1 574 994 108**	**9.09%**

SEGUIMIENTO DIARIO EN MILLONES DE PESOS					
FECHA	**20-abr**	**21-abr**	**22-abr**	**23-abr**	**24-abr**
PROG ACUM	$ 2 615	$ 2 723	$ 2 830	$ 2 830	$ 2 938
% PROG ACUM	15.09%	15.71%	16.33%	16.33%	16.95%
EJEC ACUMULADO	$ 1 448	$ 1 453	$ 1 499	$ 1 499	$ 1 575
% EJEC ACUMULADO	8.36%	8.39%	8.65%	8.65%	9.09%
DESVIACIÓN	$ 1 167	$ 1 269	$ 1 331	$ 1 331	$ 1 363
% DESVIACIÓN	**-6.73%**	**-7.32%**	**-7.68%**	**-7.68%**	**-7.86%**

G2	**24-abr-23**		
	GENERAL	**OBRA**	**FINANCIERO**
% PROGRAMADO	15.59%	16.95%	15.59%
% EJECUTADO	9.79%	9.09%	7.22%
% DESVIACIÓN	**-5.80%**	**-7.86%**	**-8.37%**


% Avance CIV
1/03/2023 % AVANCE DEL CIV
8/03/2023 % AVANCE DEL CIV
15/03/2023 % AVANCE DEL CIV
22/03/2023 % AVANCE DEL CIV
29/03/2023 % AVANCE DEL CIV
5/04/2023 % AVANCE DEL CIV
12/04/2023 % AVANCE DEL CIV
19/04/2023 % AVANCE DEL CIV
26/04/2023 % AVANCE DEL CIV
% avance acumulado
65.00%
60.00%
55.00%
50.00%
45.00%
40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
81 8005000
82 8005078
60 8002162
61 8002265
65 8002008
64 8001931
73 8001148
76 8001183
75 8001223
74 8001184
70 8001657
66 8001876
44 8004757
PRIORIDAD - CIV

FECHA EVALUACIÓN		1/03/2023	8/03/2023	15/03/2023	22/03/2023	29/03/2023	5/04/2023	12/04/2023	19/04/2023	26/04/2023
PRIORIDAD	VALOR TOTAL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV
81	$364 077 458.00	35.75%	37.13%	37.60%	42.36%	49.77%	55.51%	57.43%	57.94%	58.13%
82	$425 507 175.00	34.21%	35.84%	38.69%	39.10%	48.62%	50.72%	51.65%	52.17%	54.93%
60	$364 209 277.00	7.05%	11.90%	14.27%	19.03%	28.59%	30.10%	30.10%	32.13%	41.81%
61	$415 513 194.00	8.24%	9.59%	14.18%	16.68%	26.30%	50.99%	50.99%	53.03%	55.67%
65	$401 291 370.00	9.82%	14.68%	15.12%	34.98%	56.25%	57.49%	57.49%	59.79%	60.80%
64	$568 211 892.00	4.52%	7.01%	7.01%	7.62%	10.79%	12.87%	17.41%	17.46%	24.79%
73	$322 618 893.00	5.84%	8.06%	9.13%	11.01%	13.01%	25.85%	26.20%	26.22%	36.08%
76	$185 301 497.00	0.92%	4.68%	5.61%	13.09%	14.79%	27.45%	35.85%	35.95%	35.95%
75	$177 019 809.00	0.00%	1.96%	4.89%	6.85%	17.90%	25.83%	25.83%	26.42%	26.42%
74	$377 246 206.00	0.00%	0.00%	0.00%	2.76%	10.21%	12.58%	13.11%	15.52%	15.55%
70	$358 334 979.40	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.62%
66	$323 442 256.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.10%	4.86%	16.47%
44	$ 566 710 811.39	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.36%	0.39%
62	$453 800 624.89	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0


SEGUIMIENTO CURVA S - 690
% Avance
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
Programado - PLAN CONT.
Ejecutado
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87
Dias transcurridos de contingencia

ANEXO 1

FECHAS DE RADICACIÓN INFORMES Y CUENTAS

Responsable	Obligación	Fecha	Cumplio	
			SI	NO
G2	Radicación del INF-MEN-04 Enero a la Interventoría	26-abr-23	x	
G2	Radicación cuenta 04 Enero a la Interventoría	27-abr-23	x	
G1	Radicación del INF-MEN-04 Enero a la Interventoría	28-abr-23		x
INT	Revisión del INF-MEN-04 Enero G1	28-abr-23		
G1	Radicación cuenta 04 Enero a la Interventoría	28-abr-23		x
G2	Radicación cuenta 05 Febrero a la Interventoría	28-abr-23		x
INT	Radicación del INF-MEN-04 Enero al FDLK	2-may-23	x	
INT	Revisión del INF-MEN-04 Enero G2	2-may-23	x	
INT	Aprobación del INF-MEN-04 Enero G1	2-may-23	x	
INT	Aprobación del INF-MEN-04 Enero G2	2-may-23	x	
G2	Radicación del INF-MEN-06 Marzo a la Interventoría	2-may-23		x
INT	Revisión cuenta 04 Enero G1	3-may-23		
INT	Revisión cuenta 04 Enero G2	3-may-23		
INT	Radicación cuenta 04 Enero G1 - FDLK	4-may-23		
INT	Radicación cuenta 04 Enero G2 -FDLK	4-may-23		
G2	Radicación cuenta 06 Marzo a la Interventoría	4-may-23		
G1	Radicación del INF-MEN-05 Febrero a la Interventoría	5-may-23		
G2	Radicación del INF-MEN-05 Febrero a la Interventoría	5-may-23		
INT	Radicación del INF-MEN-05 Febrero al FDLK	5-may-23		
INT	Revisión del INF-MEN-05 Febrero G1	5-may-23		
INT	Revisión del INF-MEN-05 Febrero G2	5-may-23		
INT	Aprobación del INF-MEN-05 Febrero G1	5-may-23		
G1	Radicación cuenta 05 Febrero a la Interventoría	5-may-23		
INT	Revisión del INF-MEN-06 Marzo G2	5-may-23		
INT	Aprobación del INF-MEN-06 Marzo G1	5-may-23		
INT	Aprobación del INF-MEN-05 Febrero G2	8-may-23		
INT	Radicación cuenta 05 Febrero al FDLK	8-may-23		
INT	Revisión cuenta 05 Febrero G2	8-may-23		
INT	Revisión cuenta 06 Marzo G2	8-may-23		
INT	Revisión cuenta 05 Febrero G1	9-may-23		
INT	Radicación cuenta 05 Febrero G2 -FDLK	9-may-23		
INT	Radicación cuenta 06 Marzo G2 -FDLK	9-may-23		
INT	Radicación cuenta 05 Febrero G1 - FDLK	10-may-23		
FDLK	Revisión del INF-MEN-04 Enero			
FDLK	Aprobación del INF-MEN-04 Enero			
INT	Radicación cuenta 04 Enero al FDLK			
FDLK	Revisión cuenta 04 Enero			
FDLK	Aprobación cuenta 04 Enero			
FDLK	Revisión del INF-MEN-05 Febrero			
FDLK	Aprobación del INF-MEN-05 Febrero			
FDLK	Revisión cuenta 05 Febrero			
FDLK	Aprobación cuenta 05 Febrero			
G1	Radicación del INF-MEN-06 Marzo a la Interventoría			
INT	Radicación del INF-MEN-06 Marzo al FDLK			
INT	Revisión del INF-MEN-06 Marzo G1			
FDLK	Revisión del INF-MEN-06 Marzo			
INT	Aprobación del INF-MEN-06 Marzo G2			
FDLK	Aprobación del INF-MEN-06 Marzo			
G1	Radicación cuenta 06 Marzo a la Interventoría			
INT	Radicación cuenta 06 Marzo al FDLK			

INT	Revisión cuenta 06 Marzo G1			
FDLK	Revisión cuenta 06 Marzo			
INT	Radicación cuenta 06 Marzo G1 - FDLK			
FDLK	Aprobación cuenta 06 Marzo			
G1	Radicación del INF-MEN-07 Abril a la Interventoría			
G2	Radicación del INF-MEN-07 Abril a la Interventoría			
INT	Radicación del INF-MEN-07 Abril al FDLK			
INT	Revisión del INF-MEN-07 Abril G1			
INT	Revisión del INF-MEN-07 Abril G2			
FDLK	Revisión del INF-MEN-07 Abril			
INT	Aprobación del INF-MEN-07 Abril G1			
INT	Aprobación del INF-MEN-07 Abril G2			
FDLK	Aprobación del INF-MEN-07 Abril			
G1	Radicación cuenta 07 Abril a la Interventoría			
G2	Radicación cuenta 07 Abril a la Interventoría			
INT	Radicación cuenta 07 Abril al FDLK			
INT	Revisión cuenta 07 Abril G1			
INT	Revisión cuenta 07 Abril G2			
FDLK	Revisión cuenta 07 Abril			
INT	Radicación cuenta 07 Abril G1 - FDLK			
INT	Radicación cuenta 07 Abril G2 -FDLK			
FDLK	Aprobación cuenta 07 Abril			
