BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo De Desarrollo Local de Kennedy

FECHA: 04 de mayo de 2023 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** 02.

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de seguimiento No. 30 CIN-717-2022 / COP 690-2022.

HORA DE INICIO: ____ pm **HORA DE FINALIZACIÓN:** ____

ASISTENTES:

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Danila Meneses Toro			X						X	FDLK - Infraestructura	Danila.meneses@gobierno bogota.gov.co	3118988034	
Andrés Mauricio Rojas Ll.			X						X	FDLK-Infraestructura	andresm.rojas@gobiernobogota.gov.co	3053039778	
Héctor Maldonado Barrios			X						X	CVK22	gerencia@diegroup.co	3188740020	
Ricardo Reuy			X						X	CVK22	CVK22.director@gmail.com	3208485546	
Gladys Sarita Molina P.			X						X	Consorcio Vías Kennedy 22	CVK22.director@gmail.com	3004938576	
Danilo Buitrago			X						X	Consorcio Vías Kennedy 22	CVK22.residente2@gmail.com	3104769300	
Martha C. Rodriguez H			X						X	Consorcio Social Work	CVK22.socialegmail.com	3114883475	
Adriana Casho Alba			X						X	CVK22	CVK22cambienlab@gmail.com	3103391162	
Luisa Jaimes Rodriguez			X						X	Interventoría	Social FDLK.grupo2@gmail.com	3214377623	
Carlos Eduardo Salazar S.			X						X	CVK 22.	CVK22.557@gmail.com	3143308880	
Sandra Gonzalez			X						X	Interventoría		3175855603	

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo De Desarrollo Local de Kennedy

FECHA: 4 de mayo de 2023 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** 62

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comite de Seguimiento # 30 CIN 717 - 2022 / COP - 690 - 22

HORA DE INICIO: ____ **HORA DE FINALIZACIÓN:** ____

ASISTENTES:

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Katerine Samboni Ordoñez			X							Interventoria.	Ksamboni@outlook.com.	3138896513	Kat S.
Alba Yolanda Morales Arias			X							Interventoria SCLV.	aymar1380@gmail.com	3144440424	
Carlos David Alarcon Bermudez			X							CVK 22.	CVK22.correspondencia@gmail.com	3138723913	
ARTURO ZARATE M.			X							SCLV	arturozarateM01@yahoo.com	3152768031	

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	**EVIDENCIA DE REUNIÓN**

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

El Fondo de Desarrollo Local de Kennedy (FDLK), dio inicio a la reunión a las 4:00 pm, con la asistencia del Contratista de Obra CONSORCIO VÍAS DE KENNEDY 22 – GRUPO 2 y la Interventoría Consorcio SCLV.

Componente social
Informe semanal: Aprobado
Informe mensual 7: Observado
A la fecha se cuentan con 24 PQRSD de las cuales 4 se encuentran abiertas, que tienen que ver con afectación del espacio público en la vivienda.
Comité FDLK: 26 de mayo de 2023 a las 8:00 am y 11:00 am.
Se le aclara al Contratista que la reunión de avance se realiza cuando se tenga el 50% de ejecución de obra
Calificación: 100%

Componente ambiental
Informe semanal: Revisión
Informe mensual 7: Sin radicar
Certificación de fresado del contrato 1721 del IDU: 5 de mayo de 2023
Se hizo la solicitud de las aclaraciones de los 3000 m³

Componente SST
Ingresos: 25 trabajadores
Informe semanal: Aprobado
Informe mensual 6: Revisión
Informe mensual 7: En elaboración
Calificación: 100%

El contratista de obra se acogió a las observaciones presentadas en el recorrido realizado, y las atendió de manera inmediata.

La Interventoría recomienda que, cuando se este elaborando la matriz de obligaciones se involucre a cada uno de los componentes, porque cada profesional es quien conoce la ruta donde se da cumplimiento a la obligación, de está manera se evitan reprocesos.

Componente Técnico
Informes semanales 26 al 30: Sin radicar, el Contratista se compromete radicar estos informes a más tardar el 10 de mayo
Informe mensual 5: En revisión
Informe mensual 6 y 7: Sin radicar
Para el lunes 8 de mayo de 2023, el Contratista se compromete a radicar el Informe mensual No. 6 de marzo, además informa que hoy se radicó el acta parcial del mes de marzo para revisión y mañana radicarían el paquete completo de febrero para revisión de la Interventoría.
La cuenta de enero del Contratista quedaría radica hoy en el Fondo.

Obra

Frentes activos: 6

Frentes sin actividad: 2 (P64-P65)

P65: La Interventoría informa que, la pendiente en este segmento quedó muy alta y las casas están enterradas, el manejo que el Contratista le está dando a las casas que quedan enterradas es el mismo de las del desagüe, con la caja y los sifones, pero oficialmente a la Interventoría no han radicado la propuesta con el concepto técnico, tanto en vía como en el espacio público.

Inicialmente estaban instalando el monoblock como se encuentra en el diseño, pero luego se dieron cuenta que se presentaba un quiebre, pero el quiebre hacia un lado no tenia donde descolar el agua, el Contratista quedo de radicar la propuesta, pero, a la fecha no se ha recibido. Por lo anterior, se propone revisar el tema en campo con el Contratista.

La Interventoría solicita que se radique un listado de las cantidades de monoblock a reemplazar por A80, esto es necesario para saber la cantidad real a instalar de monoblock lo cual impacta en la programación y el avance.

La Interventoría solicita a los residentes técnico, presentar un cuadro semáforo, donde se logre evidenciar en qué estado constructivo se encuentra cada una de las prioridades.

Programación

A la fecha el Contratista continua con los atrasos en obra, como se evidencia en los avances para la semana No. 30 (27 de abril al 3 de mayo de 2023), presentados a continuación:

G2	3-may-23		
	GENERAL	OBRA	FINANCIERO
% PROGRAMADO	19.35%	19.91%	19.35%
% EJECUTADO	11.09%	10.39%	7.22%
% DESVIACIÓN	-8.26%	-9.52%	-12.13%

**Se adjunta agenda que contiene plano, cuadro de actividades y avances de obra*

La Interventoría informa que, a la fecha el contratista no ha realizado el ajuste a la programación y solicita que el lunes 8 de mayo de 2023 la radique para su revisión. Adicionalmente, indica que, se está realizando otra actividad con los residentes técnicos e inspectores, revisando las cantidades en campo, con el fin de evidenciar que cantidades no se conciliaron.

El Contratista informa que la otra semana se iniciaran actividades en la prioridad 50 y se finalizan actividades en las prioridades 81 y 82

Segmentos terminados a finales de mayo con señalización: P81-P82-P60-P61-P64-P65

Tránsito y Transporte

La Interventoría informa que hay 6 CIVs a los cuales la señalización se le vence el 30 de junio de 2023 y están sin abrir: P54, P79, P80, P87, P88 y P89. Adicional hay 30 CIVs los cuales no tienen ningún trámite de PMT.

Hay 3 CIVs que están abiertos solo en papeles porque no se están realizando actividades, que son la P48, P49 y P50, en caso que la SDM realice una visita, suspende el PMT para estos segmentos.

En la presente semana se radicaron 4 PMT a la SDM.

Desde el apoyo a la supervisión, en función de los reportes que se han pasado semanalmente, más allá de que estén bien o mal, es obligación del Contratista presentar la programación y obligación de la Interventoría hacer el seguimiento, entonces como están incumpliendo el plan de contingencia salió un oficio solicitándole a la Interventoría que tome acciones al respecto. Adicionalmente, es importante que quede legalizado los NPs de espacio público y que el acta de fijación quede con fecha de abril.

NPs y Balance de mayores y menores

El martes el Contratista radicó la atención de observaciones de los NPs de espacio público y del balance y se encuentra en revisión.

Para el 10 de mayo se deben tener revisadas las cuentas del contratista hasta el mes de marzo.

No	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Certificación de fresado del contrato 1721 del IDU	SCLV	5-may-23
2	Informe mensual No. 6 - Técnico	CVK22	8-may-23
3	Radicación de la cuenta No. 4 del Contratista al FDLK	SCLV	4-may-23
4	Listado de las cantidades de monoblock a reemplazar por A80	CVK22	8-may-23
5	Informes semanales abril	CVK22	10-may-23
6	Programación ajustada	CVK22	8-may-23

Elaborada por: Interventoría – Juan Manuel Alba Rojas
Fecha de la próxima reunión: 11 de mayo de 2023 Lugar de la próxima reunión: N/A

NOTA: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

AGENDA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO

Contratista de Obra Consorcio Vías de Kennedy – COP -690-22 Grupo 2

COMITÉ DE SEGUIMIENTO No.30

Fecha: 4 de mayo de 2023

ORDEN DEL DIA

1.Compromisos	
No	**Asunto**
1	Ajuste a la programación del plan de contingencia
2	NPs de espacio público – Balance - Informe de justificación
3	Radicación de informes y cuentas - Facturación

Convenciones

Radicado	
En elaboración	
En revisión	
Pendiente	

2. Componentes
A. Técnico
- **Informe semanal 26 al 30:** Sin Radicar
- **Informe Mensual 6 y 7:** Sin Radicar
- **Calificación:** 92%
Obra
B. SST
- **Informe semanal 30 :** Aprobado
- **Informe Mensual 6 y 7:** Sin radicar
- **Calificación:** 100%
C. Ambiental
- **Informe semanal 30:** Aprobado
- **Informe Mensual 6:** Aprobado
- **Calificación:** 100%
D. Gestión Social

- **Informe semanal 30 :** Aprobado
- **Informe Mensual 7:** Observado
- **Calificación:** 100%
OBRA



Se cuenta con **6** frentes de obra a la fecha.

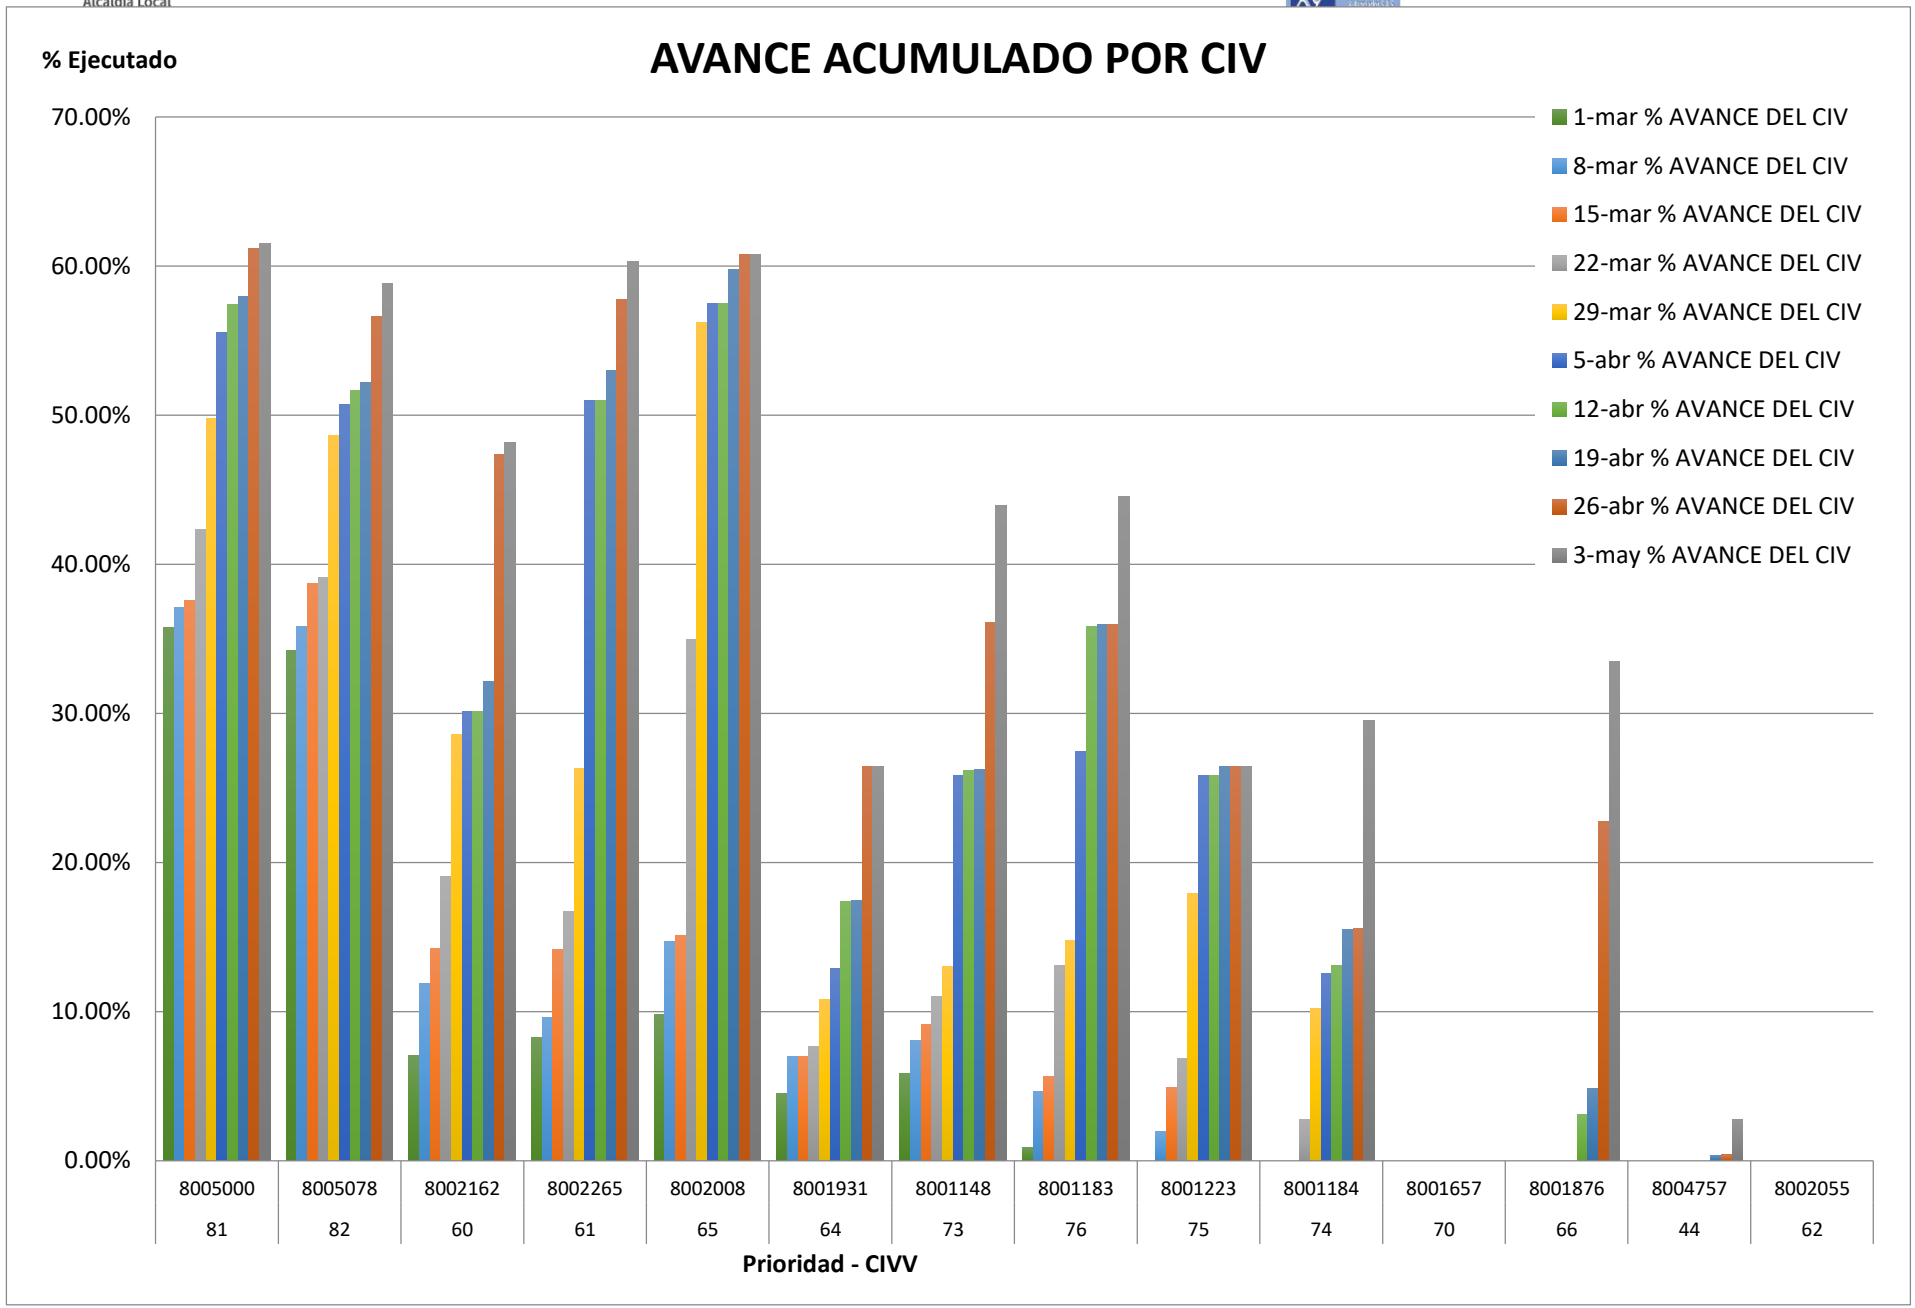
Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la semana
81	8005000	Se realiza conformación de las esquinas de los andenes e intersecciones
82	8005078	Se realiza conformación de las esquinas de los andenes e intersecciones
60	8002162	Se realiza la conformación de espacio público oriental y excavación de andes lado occidental
61	8002265	Se realiza la fundida de anden
64	8001931	No se realizó actividad en la semana
65	8002008	No se realizó actividad en la semana
73	8001148	Se realiza la instalación de monoblock

Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la semana
74	8001184	Se realiza la instalación de monoblock
75	8001223	No se realizó actividad en la semana
76	8001183	Se realiza la instalación de monoblock
66	8001876	Se realiza la instalación de estabilizado y monoblock
44	8004757	Se realiza excavación y mejoramiento de vía por fallo en la subrasante

SEGUIMIENTO GRUPO 1 AL 3-MAYO-2023

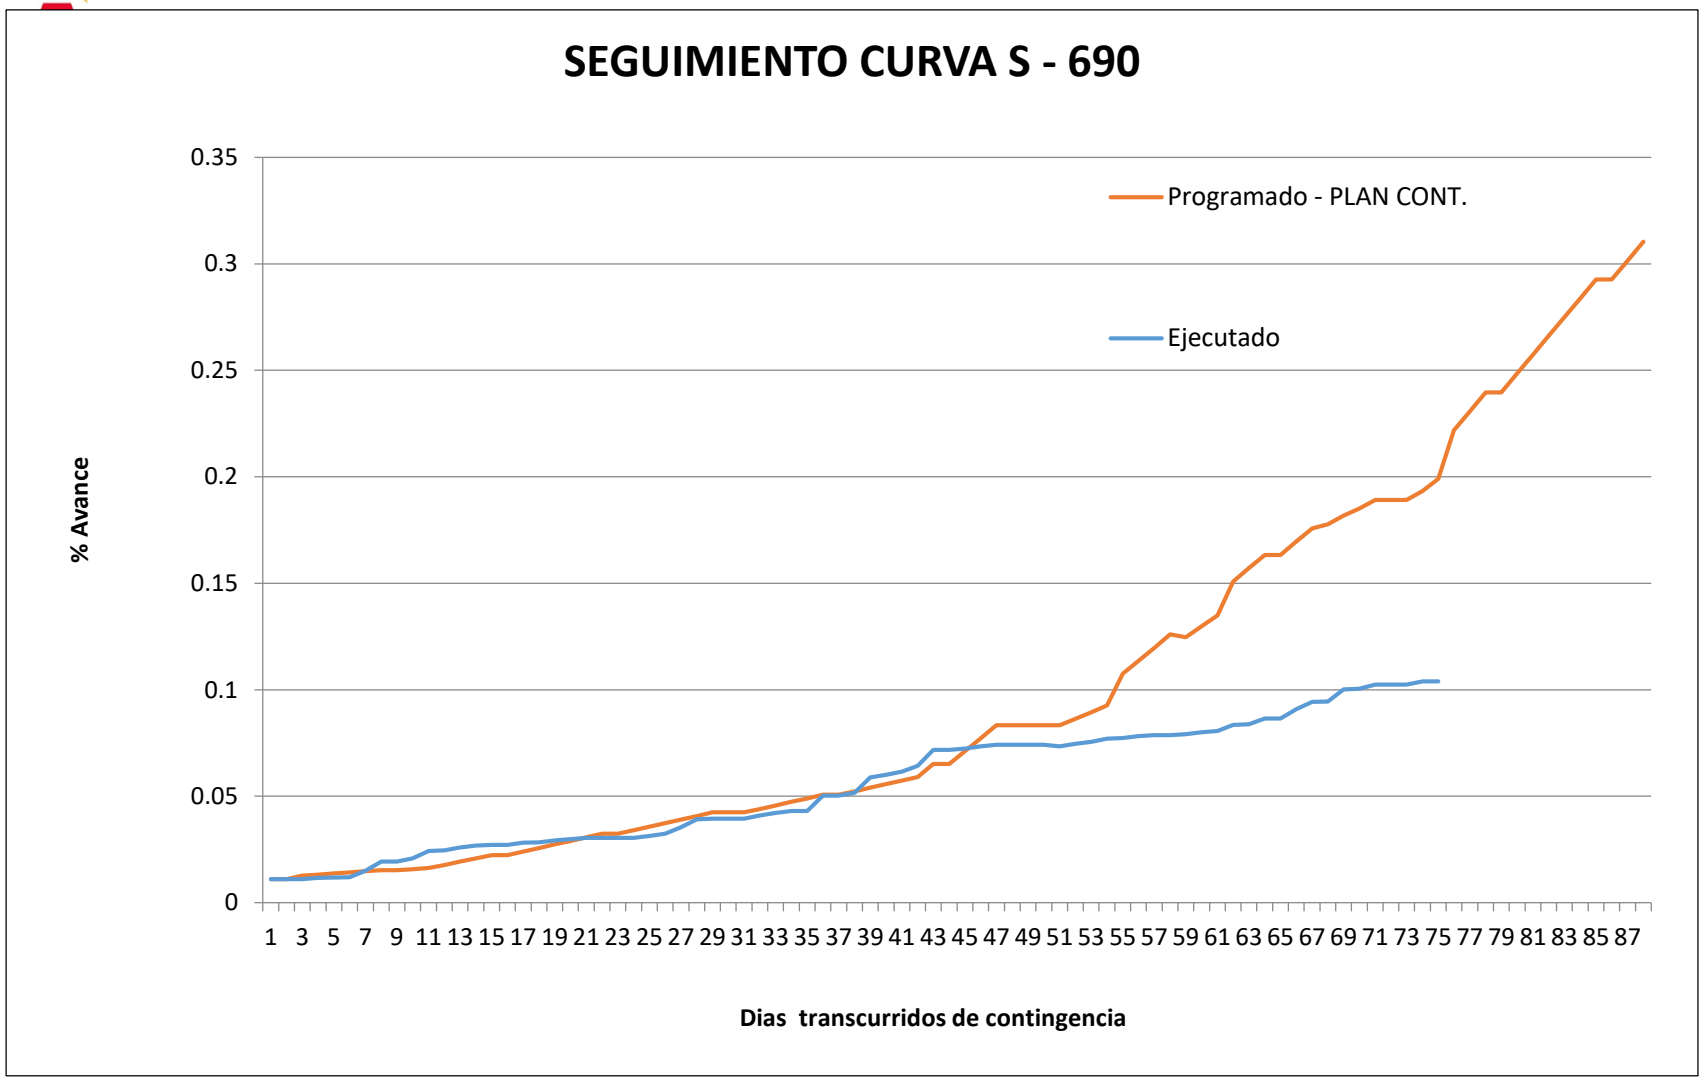
P	INI	FIN	CIV	VALOR CIV	PROG-ACUM	% PROG-ACUM	EJEC-ACUM	% EJEC-ACUM	% PESO EJEC	% ATRASO
81	16-dic	14-abr	8005000	$ 364 077 458	$ 364 077 459	2.10%	$ 223 901 870	1.29%	61.50%	-0.81%
82	3-ene	25-abr	8005078	$ 425 507 175	$ 425 507 176	2.46%	$ 250 352 247	1.44%	58.84%	-1.01%
60	31-dic	25-abr	8002162	$ 364 209 279	$ 364 209 279	2.10%	$ 175 420 593	1.01%	48.16%	-1.09%
61	17-ene	25-abr	8002265	$ 415 513 196	$ 415 513 196	2.40%	$ 250 519 910	1.45%	60.29%	-0.95%
65	31-ene	25-abr	8002008	$ 401 291 370	$ 401 291 370	2.32%	$ 243 992 975	1.41%	60.80%	-0.91%
64	9-feb	26-abr	8001931	$ 568 211 892	$ 568 211 891	3.28%	$ 150 205 923	0.87%	26.43%	-2.41%
73	2-mar	16-may	8001148	$ 322 618 893	$ 208 132 116	1.20%	$ 141 862 437	0.82%	43.97%	-0.38%
76	6-mar	16-may	8001183	$ 185 301 496	$ 106 532 921	0.61%	$ 82 536 672	0.48%	44.54%	-0.14%
75	6-mar	16-may	8001223	$ 177 019 790	$ 94 270 608	0.54%	$ 46 776 532	0.27%	26.42%	-0.27%
74	4-abr	24-may	8001184	$ 377 246 203	$ 134 730 787	0.78%	$ 111 276 248	0.64%	29.50%	-0.14%
70	19-abr	6-jun	8001657	$ 358 334 979	$ 98 542 119	0.57%	$ 0	0.00%	0.00%	-0.57%
66	28-abr	23-may	8001876	$ 323 442 257	$ 48 516 338	0.28%	$ 108 349 158	0.63%	33.50%	0.35%
44	15-jul	26-sep	8004757	$ 566 710 811	$ 0	0.00%	$ 15 611 808	0.09%	2.75%	0.09%
62	19-abr	25-may	8002055	$ 453 800 625	$ 166 393 562	0.96%	$ 0	0.00%	0.00%	-0.96%
68	26-abr	21-jun	8001715	$ 367 573 271	$ 40 841 475	0.24%	$ 0	0.00%	0.00%	-0.24%
71	2-may	6-jun	8001771	$ 390 673 025	$ 13 022 434	0.08%	$ 0	0.00%	0.00%	-0.08%
Total					**$ 3 449 792 732**	**19.91%**	**$ 1 800 806 373**	**10.39%**		-9.52%
Total Obra					**$ 17 330 128 487**					

FECHA EVALUACIÓN			5-abr	12-abr	19-abr	26-abr	3-may
P	CIV	VALOR TOTAL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV
81	8005000	$ 364 077 458.00	55.51%	57.43%	57.94%	61.17%	61.50%
82	8005078	$ 425 507 175.00	50.72%	51.65%	52.17%	56.59%	58.84%
60	8002162	$ 364 209 279.11	30.10%	30.10%	32.13%	47.38%	48.16%
61	8002265	$ 415 513 196.48	50.99%	50.99%	53.03%	57.74%	60.29%
65	8002008	$ 401 291 370.00	57.49%	57.49%	59.79%	60.80%	60.80%
64	8001931	$ 568 211 892.00	12.87%	17.41%	17.46%	26.43%	26.43%
73	8001148	$ 322 618 893.00	25.85%	26.20%	26.22%	36.08%	43.97%
76	8001183	$ 185 301 495.53	27.45%	35.85%	35.95%	35.95%	44.54%
75	8001223	$ 177 019 790.30	25.83%	25.83%	26.42%	26.42%	26.42%
74	8001184	$ 377 246 202.99	12.58%	13.11%	15.52%	15.55%	29.50%
70	8001657	$ 358 334 979.40	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
66	8001876	$ 323 442 256.55	0.00%	3.10%	4.86%	22.77%	33.49%
44	8004757	$ 566 710 811.39	0.00%	0.00%	0.36%	0.39%	2.75%
62	8002055	$ 453 800 624.89	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%


AVANCE ACUMULADO POR CIV
% Ejecutado
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
1-mar % AVANCE DEL CIV
8-mar % AVANCE DEL CIV
15-mar % AVANCE DEL CIV
22-mar % AVANCE DEL CIV
29-mar % AVANCE DEL CIV
5-abr % AVANCE DEL CIV
12-abr % AVANCE DEL CIV
19-abr % AVANCE DEL CIV
26-abr % AVANCE DEL CIV
3-may % AVANCE DEL CIV
8005000 81
8005078 82
8002162 60
8002265 61
8002008 65
8001931 64
8001148 73
8001183 76
8001223 75
8001184 74
8001657 70
8001876 66
8004757 44
8002055 62
Prioridad - CIVV

FECHA EVALUACIÓN			3-may
P	CIV	VALOR TOTAL CIV	% AVANCE SEMANAL
81	8005000	$ 364 077 458.00	0.32%
82	8005078	$ 425 507 175.00	2.25%
60	8002162	$ 364 209 279.11	0.79%
61	8002265	$ 415 513 196.48	2.55%
65	8002008	$ 401 291 370.00	0.00%
64	8001931	$ 568 211 892.00	0.00%
73	8001148	$ 322 618 893.00	7.89%
76	8001183	$ 185 301 495.53	8.59%
75	8001223	$ 177 019 790.30	0.00%
74	8001184	$ 377 246 202.99	13.95%
70	8001657	$ 358 334 979.40	0.00%
66	8001876	$ 323 442 256.55	10.73%
44	8004757	$ 566 710 811.39	2.36%
62	8002055	$ 453 800 624.89	0.00%

G2	3-may-23		
	GENERAL	OBRA	FINANCIERO
% PROGRAMADO	19.35%	19.91%	19.35%
% EJECUTADO	11.09%	10.39%	7.22%
% DESVIACIÓN	-8.26%	-9.52%	-12.13%


SEGUIMIENTO CURVA S - 690
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
% Avance
Programado - PLAN CONT.
Ejecutado
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87
Dias transcurridos de contingencia
