BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

**DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:** Fondo De Desarrollo Local de Kennedy

**FECHA:** 11 de mayo de 2023 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** ____ (62).

**OBJETO DE LA REUNIÓN:** Comité de seguimiento # 31 - FDLK.

**HORA DE INICIO:** 3: pm **HORA DE FINALIZACIÓN:** ____

**ASISTENTES:**

**NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.**

| NOMBRE | CARGO | | | | | TIPO DE VINCULACIÓN | | | | ENTIDAD o DEPENDENCIA | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ASESOR | DIRECTIVO | PROFESIONAL | TÉCNICO/ TECNÓLOGO | AUXILIAR | CARRERA | PROVISIONAL | LIBRE NOMB. | CONTRATISTA | | | | |
| Kaleriro Samboni | | | | | | | | | | Interventoria | Ksamboni@outlook.com | 3138886513 | Kal S |
| Sandra Gonzalez | | | | | | | | | | Interventoria | SSTKennedy@outlook.com | 3178955603 | |
| Luisa Jaimes Rodriguez | | | | | | | | | | interventoria. | socialfdlk.grupo2@gmail.com | 3214357623 | Luisa Jaimes |
| Yanet Claro P. | | | | | | | | | | Interventoria | YanetClaro3@hotmail.com | 3143955825 | Yanet Claro P |
| Adriana Casho Alba | | | X | | | | | | X | Contratista | cvk22.ambiental@gmail.com | 3103371162 | |
| Steven Beltran G | | | X | | | | | | X | contratista | Residentetecnico1cvk22@gmail.com | 3123181328 | Steven B |
| Gladys Santa Molina P | | | X | | | | | | X | Contratista Consorcio Vias Kennedy | 22 Director.cvk22@gmail.com | 3004388576 | |
| Danilo Buitrago | | | X | | | | | | X | Consorcio Vias Kennedy | 22 residente2.cvk22@gmail.com | 3104769300 | |
| Ricardo Reina Q. | | | X | | | | | | X | CVK22 | CVK22.director@gmail.com | 3208485846 | |
| Juan H. Diba R | | | X | | | | | | X | Interventoria | gerencia@claridad.com | 3107671942 | |
| Andrés Mauricio Rojas | | | X | | | | | | X | FDLK-Infraestructura | andresm.llano@gobiernobogota.gov.co | 3057039773 | |

**CONSENTIMIENTO:** El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

**DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:** Fondo De Desarrollo Local de Kennedy

**FECHA:** 11 de mayo de 2023 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** ____ 62

**OBJETO DE LA REUNIÓN:** Comité de seguimiento #31 - FDLK.

**HORA DE INICIO:** 3: pm **HORA DE FINALIZACIÓN:** ____

**ASISTENTES:**

**NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.**

| NOMBRE | CARGO | | | | | TIPO DE VINCULACIÓN | | | | ENTIDAD o DEPENDENCIA | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ASESOR | DIRECTIVO | PROFESIONAL | TÉCNICO/ TECNÓLOGO | AUXILIAR | CARRERA | PROVISIONAL | LIBRE NOMB. | CONTRATISTA | | | | |
| Danilo Meneses Tolo | | | X | | | | | | X | FDLK-Infraestructura | Danilo.meneses@gobiernobogota.gov.co | 3118988034 | |
| ARTURO ZARATE | | | X | | | | | | | SCLV | arturo.zarate.m@yahoo.com | 3152160831 | |
| Karen Juliette Perdomo Ramirez | | | X | | | | | | | SCLV | U233SCLV.outlook@outlook.com | 3143253729 | |
| Angela Curiel Acosta | | | X | | | | | | | SCLV | U233SCLVkennedy@outlook.com | 3227401858 | |
| Carlos Eduardo Salazar | | | X | | | | | | | CVK-22 | CVK.22.SST@gmail.com | 3143205880 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

**CONSENTIMIENTO:** El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

| BOGOTÁ \| SECRETARÍA DE GOBIERNO | **EVIDENCIA DE REUNIÓN** |
|---|---|

**DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:**

El Fondo de Desarrollo Local de Kennedy (FDLK), dio inicio a la reunión a las 3:45 pm, con la asistencia del Contratista de Obra CONSORCIO VÍAS DE KENNEDY 22 – GRUPO 2 y la Interventoría Consorcio SCLV.

***Componente SST***

Personal: Ingresaron 8 trabajadores (6 ayudantes, 1 oficial y operador) y durante la semana no se reportó retiro de personal.
Informe semanal 31: Aprobado
Informe mensual 6: Sin radicar
Obra: El contratista de obra se acogió a las observaciones presentadas en el recorrido realizado, y las atendió de manera inmediata.
**Calificación: 100%**

El Contratista informa que, a la fecha se cuenta con 56 trabajadores de mano de obra no calificada. Por lo anterior y teniendo en cuenta que tienen 12 CIVs abiertos, la Interventoría considera que hace falta personal para atender los requerimientos que en este momento demanda el proyecto.

***Componente Ambiental***

Informe semanal 31: Aprobado
Informe mensual 6: Aprobado
Informe semanal 7: En revisión
***Calificación: 100%***

El día se ayer se asistió a la capacitación realizada por la SDA con relación a RCD, teniendo en cuenta lo anterior, se hizo el cargue al aplicativo web de la SDA hasta el mes de febrero, el mes de marzo se cargó, pero, hace falta el certificado de patio IDU para que genere el radicado. Por otra parte, la Interventoría informa que, semanalmente se revisara el PIN ambiental con los vales que presenta el Contratista.

El Contratista informa que, se hizo alcance a la primera solicitud de fresado de la UMV en relación a unas volquetas dado que se presentaron problemas con la documentación. El FDLK aclara que hoy se radicó a la UMV con el primer oficio y los anexos, es decir, quedo sin el alcance, en caso de que la UMV tenga observaciones de las volquetas, y se deban actualizar, el Contratista debe realizar el mismo procedimiento que se viene trabajando con el IDU. El Contratista informa que, desde el IDU solicitan que las nuevas radicaciones para solicitud de fresado, no se remitan copias de contratos, solo deben ir documentos de volquetas y personal.

***Componente Social***

Informe semanal 31: Aprobado
Informe mensual 7: Aprobado

La Interventoría informa que:

- Se programó una capacitación respecto al clima laboral para el 20 de mayo de 2023 con cada uno de los trabajadores activos a la fecha
- Se hizo entrega de volante de inicio de actividades constructivas en la prioridad 50
- Hay unos tiempos establecidos para informar a la comunidad sobre el cierre de los CIVs para iniciar obras.
- Se hizo actualización de vallas, a la fecha el Contratista reporta 14.28% de avance
- Por parte de la comunidad, se está presentado inconformidad por los frentes que se encuentran inactivos y no se evidencia personal.
- Hace un mes, en el comité FDLK se le informó a la comunidad que para el mes de mayo iban a finalizar las prioridades 81,82,60,61,64,65,73,75,76, por lo anterior, la Interventoría solicita actualizar las fechas para el próximo comité veedor. El Contratista informa que, mañana tienen reunión para la programación del asfalto para poder definir fechas para la instalación del mismo.

Desde la Interventoría se solicita al Contratista que, en la presentación del comité FDLK programado para el 26 de mayo, incluir los próximos CIVs a intervenir.

En cuanto a los inconvenientes presentado en las prioridades P48 y 49, el Contratista informa que se realizó mesa de trabajo con la EAB y se van a hacer reparaciones puntuales a la tubería de estos segmentos.

A la fecha se tienen 4 PQRS abiertas por afectaciones de obra, hay una que se cerró con acta de compromiso en relación con el acta de exclusión, para la cual se necesita el Balance del contrato. El Contratista se compromete a dar respuesta a la PQRSD a mas tardar el 18 de mayo de 2023 de las prioridades 90,91,92 y 93

**Calificación: 100%**
Desde la Interventoría se ha solicitado al Contratista, el registro fílmico y fotográfico de las actas de vecindad, pero no se ha recibido por parte del Contratista, por lo cual, se compromete para el 18 de mayo de 2023 hacer la entrega de la Tera con lo solicitado por la Interventoría.

***Tránsito y Transporte***
La Interventoría informa que, los PMT tienen 2 objetivos, primero indicarles a todos los usuarios de la vía por donde circular de forma segura y segundo estar cubiertos por cualquier accidente que se pueda presentar. Con base en lo anterior, la Interventoría solicita que, cuando se roben la señales, el Contratista debe realizar la respectiva denuncia y un informe con registro fotográfico donde se evidencie la reposición de la señal hurtada, este informe debe quedar consignado en el informe semanal y mensual, para llevar consignada la trazabilidad.

La semana pasada se radicaron a la SDM las prorrogas de las prioridades 68, 69, 70 y 71, las cuales fueron observadas y se atendieron el día de ayer y se espera que salgan aprobadas el día de mañana

***Oficios de incumplimiento***
P60-P61: Señales de senderos peatonal mal ubicadas, el Contratista a la fecha no ha dado respuesta.
P73-P74-P75-P76: Mala implementación de la barricada
La Interventoría recomienda al Contratista que, siempre que llegue un incumplimiento, debe verificar, tomar las acciones y registro fotográfico y dar respuesta a la SDM de manera inmediata.

***Componente Técnico***
Frentes de obra activos: 7
Frentes intermitentes: 3 – P64-P74-P76
Informe semanal 31: Sin radicar
Informe mensual 5: Aprobado
Informe mensual 6: Sin radicar
Cuenta No. 5 – Febrero: Observada
***Calificación: 85%*** (La calificación ha sido afectada por incumplimiento en el PMT). Cada señal que sea robada se debe reponer lo antes posible y dejar evidencia.

***Programación***
A la fecha el Contratista continua con los atrasos en obra, como se evidencia en los avances para la semana No. 31(4 al 10 de mayo de 2023), presentados a continuación:

| G2 | 9-may-23 | | |
|---|---|---|---|
| | GENERAL | OBRA | FINANCIERO |
| % PROGRAMADO | 23.20% | 23.35% | 23.20% |
| % EJECUTADO | 11.47% | 10.77% | 7.22% |
| % DESVIACIÓN | -11.73% | -12.58% | -15.98% |

La Interventoría indica que, a la fecha se ha trabajado en conjunto con el Contratista, en la recolección y validación de cantidades, pero todavía se presentan diferencias, es decir, las cantidades no han sido conciliadas ni aterrizadas de acuerdo con lo ejecutado realmente. El día de mañana, se realizará, la verificación de estas cantidades junto con el contratista.

La Interventoría manifiesta que no puede continuar con los atrasos que presenta el Contratista, y dará respuesta al oficio del FDLK el 12 de mayo de 2023, solicitando la multa al contratista por el incumplimiento al plan de contingencia, pese a que se le ha insistido al Contratista realizar un ajuste a la programación.

| No | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|---|---|
| 1 | Balance Mayores y menores – NPS Esp. Público | CVK22 | 22-may-23 |
| 2 | Radicación ajuste a la programación | CVK22 | 22-may-23 |
| 3 | Respuesta a la PQRSD acta de exclusión | CVK22 | 18-may-23 |
| 4 | Respuesta a oficios de incumplimiento de la SDM | CVK22 | 18-may-23 |
| 5 | Tera de registro fílmico y fotografías de levantamiento de actas de vecindad | CVK22 | 18-may-23 |
| 6 | Listado de las cantidades de monoblock a reemplazar por A80 | CVK22 | 19-may-23 |

Elaborada por: Interventoría – Juan Manuel Alba Rojas
Fecha de la próxima reunión: 18 de mayo de 2023 Lugar de la próxima reunión: N/A

NOTA: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

**AGENDA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO**

**Contratista de Obra Consorcio Vías de Kennedy – COP -690-22 Grupo 2**

**COMITÉ DE SEGUIMIENTO No.31**

**Fecha: 11 de mayo de 2023**

**ORDEN DEL DIA**

| | |
|---|---|
| **1.Compromisos** | |
| **No** | **Asunto** |
| **1** | Balance Mayores y menores – NPS Esp. Público |
| **2** | Radicación de ajuste a la programación del plan de contingencia |
| **3** | Radicación de informes y cuentas – Facturación |
| **2. Componentes** | |
| **A. Técnico** | |
| - **Informe semanal 30 y 31:** Sin Radicar | |
| - **Informe Mensual 6 y 7:** Sin Radicar | |
| - **Calificación:** 85% | |
| **Obra** | |
| **B. SST** | |
| - **Informe semanal 31 :** Aprobado | |
| - **Informe Mensual 6:** En ajustes de mesa de trabajo<br>- **Informe Mensual 7:** Sin radicar | |
| - **Calificación:** 100% | |
| **C. Ambiental** | |
| - **Informe semanal 31:** Sin radicar | |
| - **Informe Mensual 7:** En revisión de interventoría. | |
| - **Calificación:** 100% | |
| **D. Gestión Social** | |
| - **Informe semanal 31 :** Aprobado | |
| - **Informe Mensual 7:** Aprobado | |
| - **Calificación:** 100% | |
| **OBRA** | |




Se cuenta con **7** frentes de obra a la fecha.

| Prioridad | CIV | Actividades desarrolladas en la semana |
|---|---|---|
| 81 | 8005000 | Se realiza conformación de los cruces |
| 82 | 8005078 | Se realiza conformación de los cruces |
| 60 | 8002162 | Se realiza la conformación de espacio público oriental y excavación de andes lado occidental |
| 61 | 8002265 | Se realiza excavación para pozo e instalación de tubería y cargue de pozo |
| 64 | 8001931 | No se realizó actividad en la semana |
| 65 | 8002008 | Se realiza excavación de andes lado occidental |
| 73 | 8001148 | Se realiza excavación para espacio público e instalación de geotextil y fresado costado norte |
| 74 | 8001184 | No se realizó actividad en la semana |
| 75 | 8001223 | Se realiza la instalación de fresado estabilizado |
| 76 | 8001183 | No se realizó actividad en la semana |
| 66 | 8001876 | Se realiza la instalación de estabilizado |


| Prioridad | CIV | Actividades desarrolladas en la semana |
|---|---|---|
| 44 | 8004757 | Se realiza instalación geotextil, geocelda y fresado |


| SEGUIMIENTO GRUPO 1 AL 9-MAYO-2023 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | INI | FIN | CIV | VALOR CIV | PROG-ACUM | % PROG-ACUM | EJEC-ACUM | % EJEC-ACUM | % PESO EJEC | % ATRASO |
| 81 | 16-dic | 14-abr | 8005000 | $ 364 077 458 | $ 364 077 459 | 2.10% | $ 241 811 225 | 1.40% | 66.42% | -0.71% |
| 82 | 3-ene | 25-abr | 8005078 | $ 425 507 175 | $ 425 507 176 | 2.46% | $ 253 583 165 | 1.46% | 59.60% | -0.99% |
| 60 | 31-dic | 25-abr | 8002162 | $ 364 209 279 | $ 364 209 279 | 2.10% | $ 185 009 433 | 1.07% | 50.80% | -1.03% |
| 61 | 17-ene | 25-abr | 8002265 | $ 415 513 196 | $ 415 513 196 | 2.40% | $ 253 097 303 | 1.46% | 60.91% | -0.94% |
| 65 | 31-ene | 25-abr | 8002008 | $ 401 291 370 | $ 401 291 370 | 2.32% | $ 248 903 033 | 1.44% | 62.03% | -0.88% |
| 64 | 9-feb | 26-abr | 8001931 | $ 568 211 892 | $ 568 211 891 | 3.28% | $ 150 205 923 | 0.87% | 26.43% | -2.41% |
| 73 | 2-mar | 16-may | 8001148 | $ 322 618 893 | $ 265 375 504 | 1.53% | $ 143 796 111 | 0.83% | 44.57% | -0.70% |
| 76 | 6-mar | 16-may | 8001183 | $ 185 301 496 | $ 145 917 208 | 0.84% | $ 82 536 672 | 0.48% | 44.54% | -0.37% |
| 75 | 6-mar | 16-may | 8001223 | $ 177 019 790 | $ 135 645 199 | 0.78% | $ 48 761 870 | 0.28% | 27.55% | -0.50% |
| 74 | 4-abr | 24-may | 8001184 | $ 377 246 203 | $ 215 569 259 | 1.24% | $ 122 614 976 | 0.71% | 32.50% | -0.54% |
| 70 | 19-abr | 6-jun | 8001657 | $ 358 334 979 | $ 152 292 366 | 0.88% | $ 0 | 0.00% | 0.00% | -0.88% |
| 66 | 28-abr | 23-may | 8001876 | $ 323 442 257 | $ 145 549 015 | 0.84% | $ 108 349 158 | 0.63% | 33.50% | -0.21% |
| 44 | 15-jul | 26-sep | 8004757 | $ 566 710 811 | $ 0 | 0.00% | $ 26 973 000 | 0.16% | 4.76% | 0.16% |
| 62 | 19-abr | 25-may | 8002055 | $ 453 800 625 | $ 257 153 687 | 1.48% | $ 0 | 0.00% | 0.00% | -1.48% |
| 68 | 26-abr | 21-jun | 8001715 | $ 367 573 271 | $ 89 851 244 | 0.52% | $ 0 | 0.00% | 0.00% | -0.52% |
| 71 | 2-may | 6-jun | 8001771 | $ 390 673 025 | $ 91 157 039 | 0.53% | $ 0 | 0.00% | 0.00% | -0.53% |
| 69 | 26-abr | 21-jun | 8001823 | $ 349 983 722 | $ 9 999 535 | 0.06% | $ 0 | 0.00% | 0.00% | -0.06% |
| **Total** | | | | | **$ 4 047 320 429** | **23.35%** | **$ 1 865 641 869** | **10.77%** | | -12.53% |
| | | | | | **$ 17 330 128 487** | | | | | |

| FECHA EVALUACIÓN | | | 25-abr | 2-may | 9-may |
|---|---|---|---|---|---|
| P | CIV | VALOR TOTAL CIV | % AVANCE DEL CIV | % AVANCE DEL CIV | % AVANCE DEL CIV |
| 81 | 8005000 | $ 364 077 458.00 | 61.17% | 61.50% | 66.42% |
| 82 | 8005078 | $ 425 507 175.00 | 56.59% | 58.84% | 59.60% |
| 60 | 8002162 | $ 364 209 279.11 | 47.38% | 48.16% | 50.80% |
| 61 | 8002265 | $ 415 513 196.48 | 57.74% | 60.29% | 60.91% |
| 65 | 8002008 | $ 401 291 370.00 | 60.80% | 60.80% | 62.03% |
| 64 | 8001931 | $ 568 211 892.00 | 26.43% | 26.43% | 26.43% |
| 73 | 8001148 | $ 322 618 893.00 | 36.08% | 43.97% | 44.57% |
| 76 | 8001183 | $ 185 301 495.53 | 35.95% | 44.54% | 44.54% |

| FECHA EVALUACIÓN | | | 25-abr | 2-may | 9-may |
|---|---|---|---|---|---|
| P | CIV | VALOR TOTAL CIV | % AVANCE DEL CIV | % AVANCE DEL CIV | % AVANCE DEL CIV |
| 75 | 8001223 | $ 177 019 790.30 | 26.42% | 26.42% | 27.55% |
| 74 | 8001184 | $ 377 246 202.99 | 15.55% | 29.50% | 32.50% |
| 70 | 8001657 | $ 358 334 979.40 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 66 | 8001876 | $ 323 442 256.55 | 22.77% | 33.49% | 33.49% |
| 44 | 8004757 | $ 566 710 811.39 | 0.39% | 2.75% | 4.76% |
| 62 | 8002055 | $ 453 800 624.89 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

| FECHA EVALUACIÓN | | | 9-may |
|---|---|---|---|
| P | CIV | VALOR TOTAL CIV | % AVANCE SEMANAL |
| 81 | 8005000 | $ 364 077 458.00 | 4.92% |
| 82 | 8005078 | $ 425 507 175.00 | 0.76% |
| 60 | 8002162 | $ 364 209 279.11 | 2.63% |
| 61 | 8002265 | $ 415 513 196.48 | 0.62% |
| 65 | 8002008 | $ 401 291 370.00 | 1.22% |
| 64 | 8001931 | $ 568 211 892.00 | 0.00% |
| 73 | 8001148 | $ 322 618 893.00 | 0.60% |
| 76 | 8001183 | $ 185 301 495.53 | 0.00% |
| 75 | 8001223 | $ 177 019 790.30 | 1.12% |
| 74 | 8001184 | $ 377 246 202.99 | 3.01% |
| 70 | 8001657 | $ 358 334 979.40 | 0.00% |
| 66 | 8001876 | $ 323 442 256.55 | 0.00% |
| 44 | 8004757 | $ 566 710 811.39 | 2.00% |
| 62 | 8002055 | $ 453 800 624.89 | 0.00% |

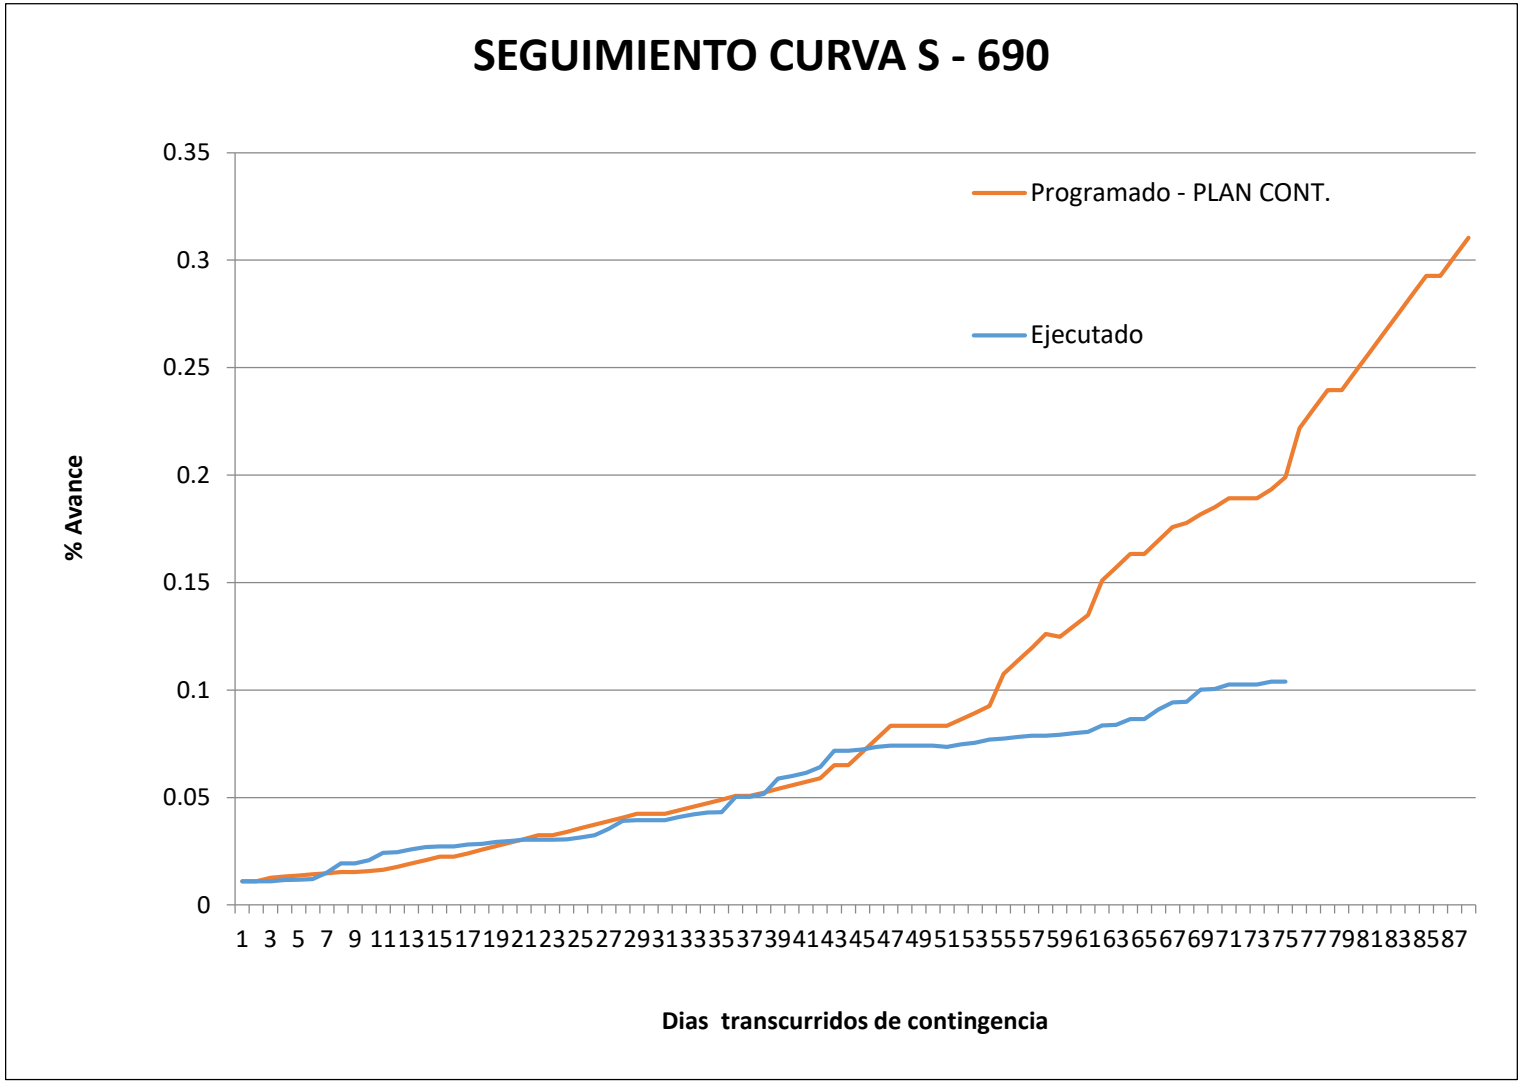
SEGUIMIENTO CURVA S - 690
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
% Avance
Programado - PLAN CONT.
Ejecutado
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87
Dias transcurridos de contingencia

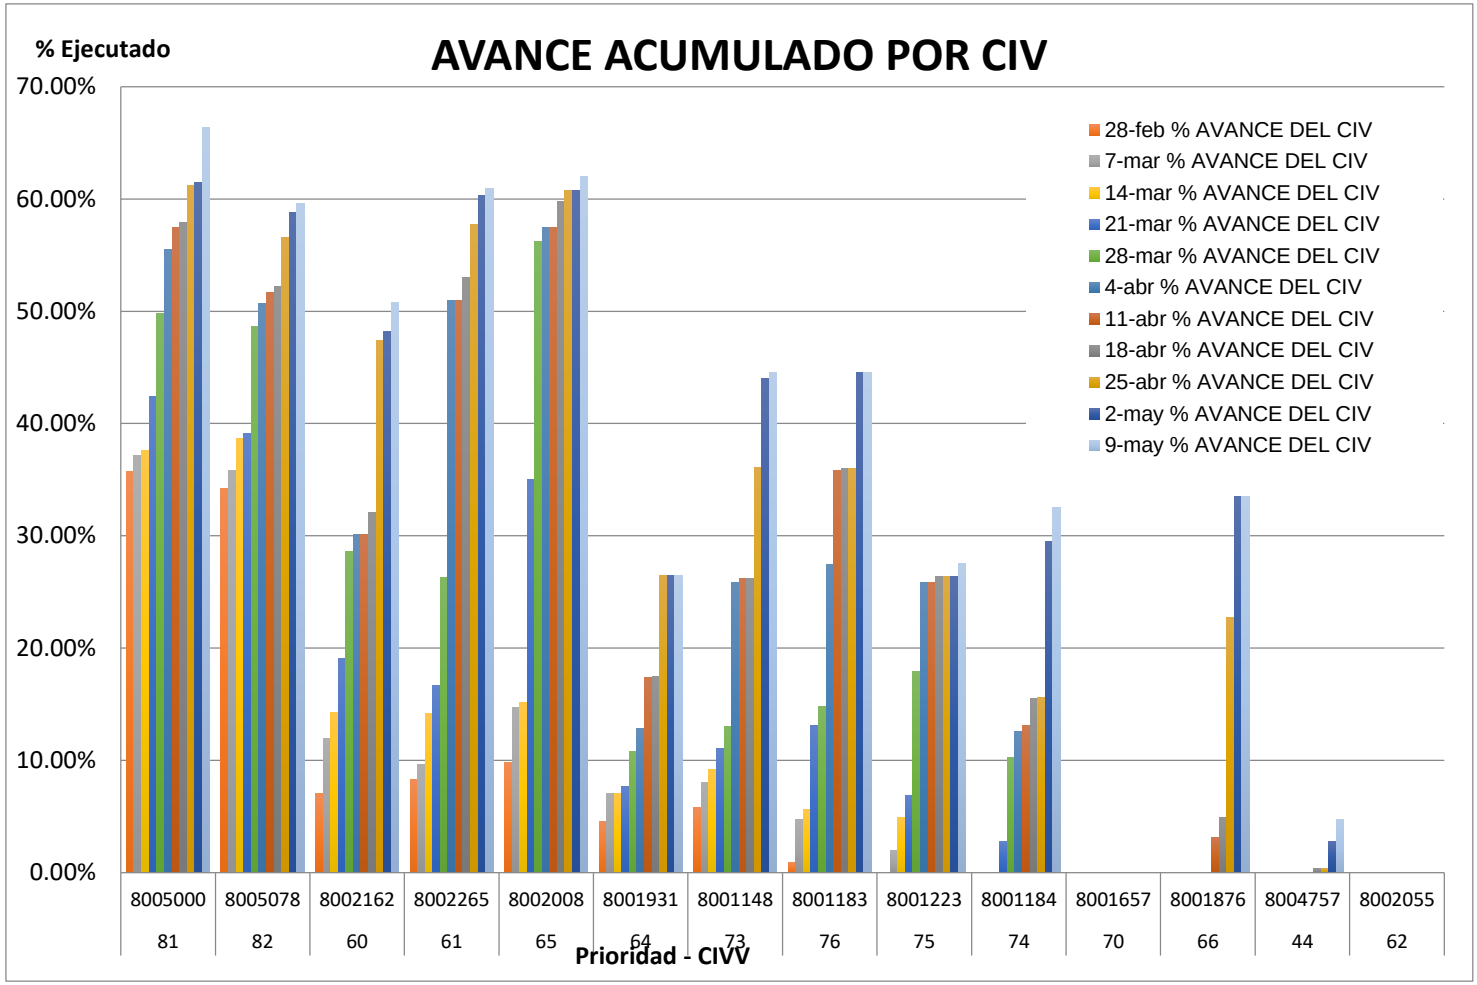


| G2 | CORTE AL 9 DE MAYO DE 2023 | | |
|---|---|---|---|
| | GENERAL | OBRA | FINANCIERO |
| % PROGRAMADO | 23.20% | 23.35% | 23.20% |
| % EJECUTADO | 11.47% | 10.77% | 7.22% |
| % DESVIACIÓN | -11.73% | -12.58% | -15.98% |
