BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo De Desarrollo Local de Kennedy

FECHA: 25 de mayo de 2023 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** (02)

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité Integral No. 8 de seguimiento No. 33

HORA DE INICIO: ____ **HORA DE FINALIZACIÓN:** ____

ASISTENTES:

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Andrés Mauricio Rojas Ll.			X						X	FDLK- Infraestructura	andresm.llanos@gobierno.bogotagov.co	3057039773	
Danilo Meneses Toro			X						X	FDLK- INFRAESTRUCTURA	Danilo.Meneses@gobiernobogota.gov.co	3118988034	
Aida Yolanda Morales Arias			X							Interventoria Cons SCLV	aymg1380@gmail.com	3144440414	
Arturo Zarate M.			X							SCLV INTERV.	arturo [illegible] @yahoo.com	315 [illegible]	
Katerine Samboni Ordoñez			X							Interventoria. SCLV	Ksamboni@outlook.com	3138896513	Katy S.
Carlos David Alarcón Bermudez			X						X	Consorcio Vías Kennedy 22	cvk.correspondencia@gmail.com	3138723978	
Ricardo Pena Q.										CVK 22	cvk.director@gmail.com	3208485576	
Gladys Sarita Molina P			X						X	Consorcio CVK22	CVK.director@gmail.com	3004938576	
Steven Beltran Galvis			X						X	Consorcio CVK22	CVK.Residente1.2@gmail.com	3123181328	
Adriana Castro Alba			X						X	Consorcio CVK22	CVK22ambientalegmail.com	3103391162	
Yanet Claro Penaranda			X							SCLV - interv.	Yanetclaro3@gmail.com	3143955825	

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo De Desarrollo Local de Kennedy

FECHA: 25 de mayo de 2023 **Virtual:** ____ **Presencial:** ____ **(En caso de ser presencial):** ____ (2)

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité Integral No. 8 de seguimiento No. 33

HORA DE INICIO: ____ **HORA DE FINALIZACIÓN:** ____

ASISTENTES:

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Martha C. Rodriguez M.			X						X	socialcvk@gmail.com.	socialcvk@gmail.com	3114883275	
Luisa Jaimes Rodriguez.			X						X	interventoria	socialgrupo2.fdlk@gmal.	3214357623	Luisa Jaimes.
Mario Javier Delgado Camargo			X						X	Interventoria Cons. CSLV	mgja.arq@gmail.com	3132124564	
Carlos Eduardo Salazar Soler			X							CVK22.SST@gmal.com	Residente SST	3148305880	
Sandra P Gonzalez.			X							Interventoría	Res. SST	3178955603	
Juan Manuel Silva R.			X							Interventoria	garcia e la [illegible] 310		
Pablo Castrillo			X							interventoría	pablo.castrillo@lavialidad.com	3117556026	
Carlos Benavides M.			X							Interventoría	maquinariascl@outlook.com	3132110586	
Angeli Cunel Acosta			X							Interventoría	V2335CLV kennedy@outlook.com	3227401898	
Karen Julieth Peñates Ramirez.			X							Interventoria.	V2335CLV kennedy@outlook.com	3143253729	

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

El Fondo de Desarrollo Local de Kennedy (FDLK), dio inicio a la reunión a las 11:30 am, con la asistencia del Contratista de Obra CONSORCIO VÍAS DE KENNEDY 22 – GRUPO 2 y la Interventoría Consorcio SCLV.

Componente Social

La Interventoría informa que:

- Ayer se realizó reunión de simulacro para el comité veedor que se va a realizar mañana y se dejaron algunas recomendaciones en todos los componentes y se está a la espera de que remitan nuevamente la presentación.
- Se tienen 4 PQRSD abiertas, uno de esos es el de la señora Nórida, mañana se hará la visita con el Contratista e Interventoría.
- PQRSD No 26: El ciudadano reporta que se le perdió el polo a tierra, el Contratista ya está realizando la reposición del mismo y dar cierre a la PQRSD
- Afectación en un vidrio en la segunda planta del predio, el Contratista indica que no va a responder por el vidrio dado que, está afectación no se debe a vibraciones de la obra, sino por una piedra. La PQRSD se puede cerrar siempre y cuando se le dé una respuesta al ciudadano, puesto que garantiza que se le brindo atención a pesar de que el ciudadano no se encuentre conforme.
- PQRSD No 28: El ciudadano Edgar Ávila se encuentra inconforme con la rampa de acceso vehicular que se le construyó, dado que la pendiente es muy alta, lo anterior no es posible porque bajarle la pendiente implica darle mayor longitud a la rampa e invadir el espacio público.
- Ayer se realizó actividad de riesgos con jardín infantil niños felices en la prioridad 50.

Informe semanal 33: Aprobado
Informe mensual 7: Revisión en mesa de trabajo
Calificación: 93% (Se afectó la calificación por desinformación a la comunidad, dado que, el Contratista informó que se iban a iniciar actividades en la P69 y espacio público en la P76, lo cual no se cumplió)

El FDLK informa que vía WhatsApp se compartió derecho de petición del ciudadano que solicita que se le arregle todo el piso de la casa, a manera de traslado, para que el Contratista le dé respuesta al peticionario con copia a la supervisión.

Componente SST

Personal: Ingreso de 2 operadores, de los 2 hubo un ingreso-retiro en la misma semana. Al corte del 9 de mayo, de personal de mano de obra no calificada, se tienen 7 auxiliares de tráfico, 27 ayudantes, 4 Boal y 8 oficiales.
Retiros en el mes de abril: 23 retiros, es decir, 40% de personal retirado
Rotación en mayo: 19 personas retiradas que corresponde al 35%

Informe semanal 33: Aprobado
Informe mensual 7: Revisión en mesa de trabajo, hay soportes pendientes de dos subcontratistas (José Mora y Santiago Construcciones). El Contratista indica que se ha intentado comunicar, pero ha sido imposible, por lo

que propone presentar el Informe y dejar el compromiso que tan pronto se solucione el inconveniente con los subcontratistas se presentan los soportes pendientes del personal, a lo cual la Interventoría manifiesta que, en Informes pasado se le permitió al Contratista hacer el compromiso y fue difícil que presentaran los soportes pendientes, sin embargo, se solicita al Contratista enviar un borrador de la comunicación y carta de compromiso a la cual se compromete.
Calificación: 100%

Componente Ambiental
Informe semanal 33: Aprobado
Informe mensual 7: Observado
Calificación: 100%

Se instalaron 270 m³ de material fresado proveniente de patio IDU y el material generado fue de 90 m³. La Interventoría informa que, de acuerdo con la reunión realizada con la SDA, con respecto a la normatividad de aprovechamiento de RCD, no se realizara con el total de volumen generado de material sino con el total del RCD, por lo tanto, el indicador es cero. El día 23 de mayo de 2023 se elevó este concepto al PIGA del FDLK y se está a la espera de una respuesta.

Maquinaria y Equipo
Los formatos del informe mensual No. 7 se encuentran observados y el Contratista indica que mañana, 26 de mayo atenderá las observaciones. El Contratista ingresó maquinaria sin contar con la aprobación por parte de la Interventoría.

Espacio Público
La Interventoría informa que, ayer se recibió el concepto del balance de los bordillos prefabricados a instalar en los CIVs y se encuentra en revisión por el especialista. El Contratista informa que, se implementara bordillo donde se presenten cambios de nivel y se deba implementar un escalón, en las esquinas para los confinamientos y accesos a garajes, se recomienda que la rejilla monoblock no quede en el acceso al predio, sino que quede en hacia un costado.

Redes Húmedas
La Interventoría indica que, en los diseños iniciales en los predios que estuvieran hundidos se debía colocar al frente un conjunto de monoblock y una manija, pero en los diseños no están contemplados todos los predios, por tanto, en el recorrido de ayer se solicitó al Contratista cambiar el sistema de captación dado que se han presentado quejas por parte de la comunidad.

El Contratista no ha remito el concepto técnico de sumidero de acuerdo con la solución propuesta por la EAB, por lo cual se compromete a radicar mañana 26 de mayo de 2023 a la Interventoría. Por otra parte, solo se ha recibido un informe de inspecciones CCTV de las prioridades 75 y 76, el oficio reporta una solución acertada, sin embargo, se tiene que recibir el soporte dado que, el oficio relaciona varias prioridades, pero solo se recibió de la 75 y 76.

Redes Secas

El Contratista aún no ha radicado el Inventario de redes secas, el cual se debe hacer sobre los planos que se entregaron al inicio del contrato.

Componente Técnico

Frentes de obra activos: 5 - 14 CIVs abiertos
7 CIVs sin actividad
Informes semanales de mayo: Sin radicar
Informe mensual 6 y 7: Observados
Cuenta No. 6 – Marzo: En revisión
Calificación: 84%, se afectó la calificación porque iniciaron actividades en la prioridad 68 sin tener totalmente implementado el PMT

Tránsito y Transporte

La Interventoría informa que:

- 17 CIVs cuentan con permiso de PMTs
- En cuanto a la prioridad 68, este contaba con permiso de PMT desde hace 15 días, pero no se había implementado.
- De los 33 CIVs que no se ha solicitado permiso, hay 6 CIVs cuyos diseños de señalización vencen el 30 de junio de 2023.
- En la última publicación de los COI de la SDM, en el COI 20 suspendieron el permiso de las prioridades 48 y 49 *"La SDM suspende autorización del PMT emitido mediante COI 12 PMT para cierre total de calzada para actividades de construcción vía ETAPA 1 de conformidad con lo establecido en el numeral 9.1 acciones por no inicio de actividades…"* notificado al Contratista mediante oficio el 10 de mayo de 2023.
- Mañana, 26 de mayo de 2023, deben salir las aprobaciones de PMT de las prioridades 64,65,66,73,74,75,76 para las etapas 2 y 3.

La Interventoría solicita al Contratista, incluir en los Informes el registro fotográfico, las inconformidades de la comunidad, en caso que se presente, y los oficios remitidos por la SMD. Adicional, se solicita que en los frentes de obra, siempre este el COI y el plano aprobado por la SDM y vigente en el momento.

Programación

A la fecha el Contratista de obra continua con los atrasos en obra, como se evidencia en los avances para la semana No.33 (18 al 24 de mayo de 2023), presentados a continuación:

G2	CORTE AL 23 DE MAYO DE 2023		
	GENERAL	OBRA	FINANCIERO
% PROGRAMADO	46,36%	46,40%	46,36%
% EJECUTADO	15,48%	15,46%	9,52%
% DESVIACIÓN	-30,88%	-30,94%	-36,84%

La evaluación se realizó con la programación inicialmente aprobada por la interventoría. Es evidente que el Contratista presenta atrasos muy elevados física y financieramente, pero frente a lo evidenciado en obra en los recorridos, este no concuerda, puesto que la obra presenta un buen avance.

Por otra parte, la Interventoría indica que, de acuerdo con la reunión realizada con el FDLK y la alcaldesa, se pactaron los siguientes compromisos:

- El contratista debe ponerse al día con el PDT, con el fin de contar con una programación y cronograma real de actividades de obra a ejecutar, antes del 15 de junio de 2023.
- El contratista de obra debe terminar las actividades de obra de los CIVs abiertos a la fecha, a finales del mes de julio e inicios del mes de agosto.
- El Contratista de obra deberá realizar la entrega de un registro fotográfico de cada una de las prioridades (antes y después), para el 15 de junio de 2023.

Por lo anterior, el Contratista informa que, para la próxima semana estarían cerrando las siguientes prioridades 81, 82 y 61.

No	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Plan detallado de trabajo – PDT ajustado	CVK22	31-may-23
2	Atención de observaciones de los formatos MEV de abril	CVK22	26-may-23
3	Radicación del concepto técnico de sumidero de acuerdo con la solución propuesta por la EAB,	CVK22	26-may-23
4	Radicación del inventario de redes secas	CVK22	31-may-23

Elaborada por: Interventoría – Juan Manuel Alba Rojas
Fecha de la próxima reunión: 1 de junio de 2023 Lugar de la próxima reunión: N/A

NOTA: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

AGENDA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO


Contratista de Obra Consorcio Vías de Kennedy – COP -690-22 Grupo 2

COMITÉ DE SEGUIMIENTO No.33 INTEGRAL No.8

Fecha: 25 de mayo de 2023


ORDEN DEL DIA

1.Compromisos	
No	**Asunto**
1	Balance Mayores y menores – NPS Esp. Público
2	Radicación de informes y cuentas – Facturación
2. Componentes	
A. Técnico	
- **Informe semanal 30,31,32 y 33:** Sin Radicar	
- **Informe Mensual 6 y 7:** Observados	
- **Calificación:** 84%	
B. SST	
- **Informe semanal 33 :** Aprobado	
- **Informe Mensual 7:** Revisión mesa de trabajo.	
- **Calificación:** 100%	
C. Ambiental	
- **Informe semanal 33:** Aprobado	
- **Informe Mensual 7:** Revisión atención observaciones	
- **Calificación:** 100%	
D. Gestión Social	
- **Informe semanal 33 :** Aprobado	
- **Informe Mensual 8:** Revisión en mesa de trabajo	
- **Calificación:** 93%	
Especialidades	
Obra	

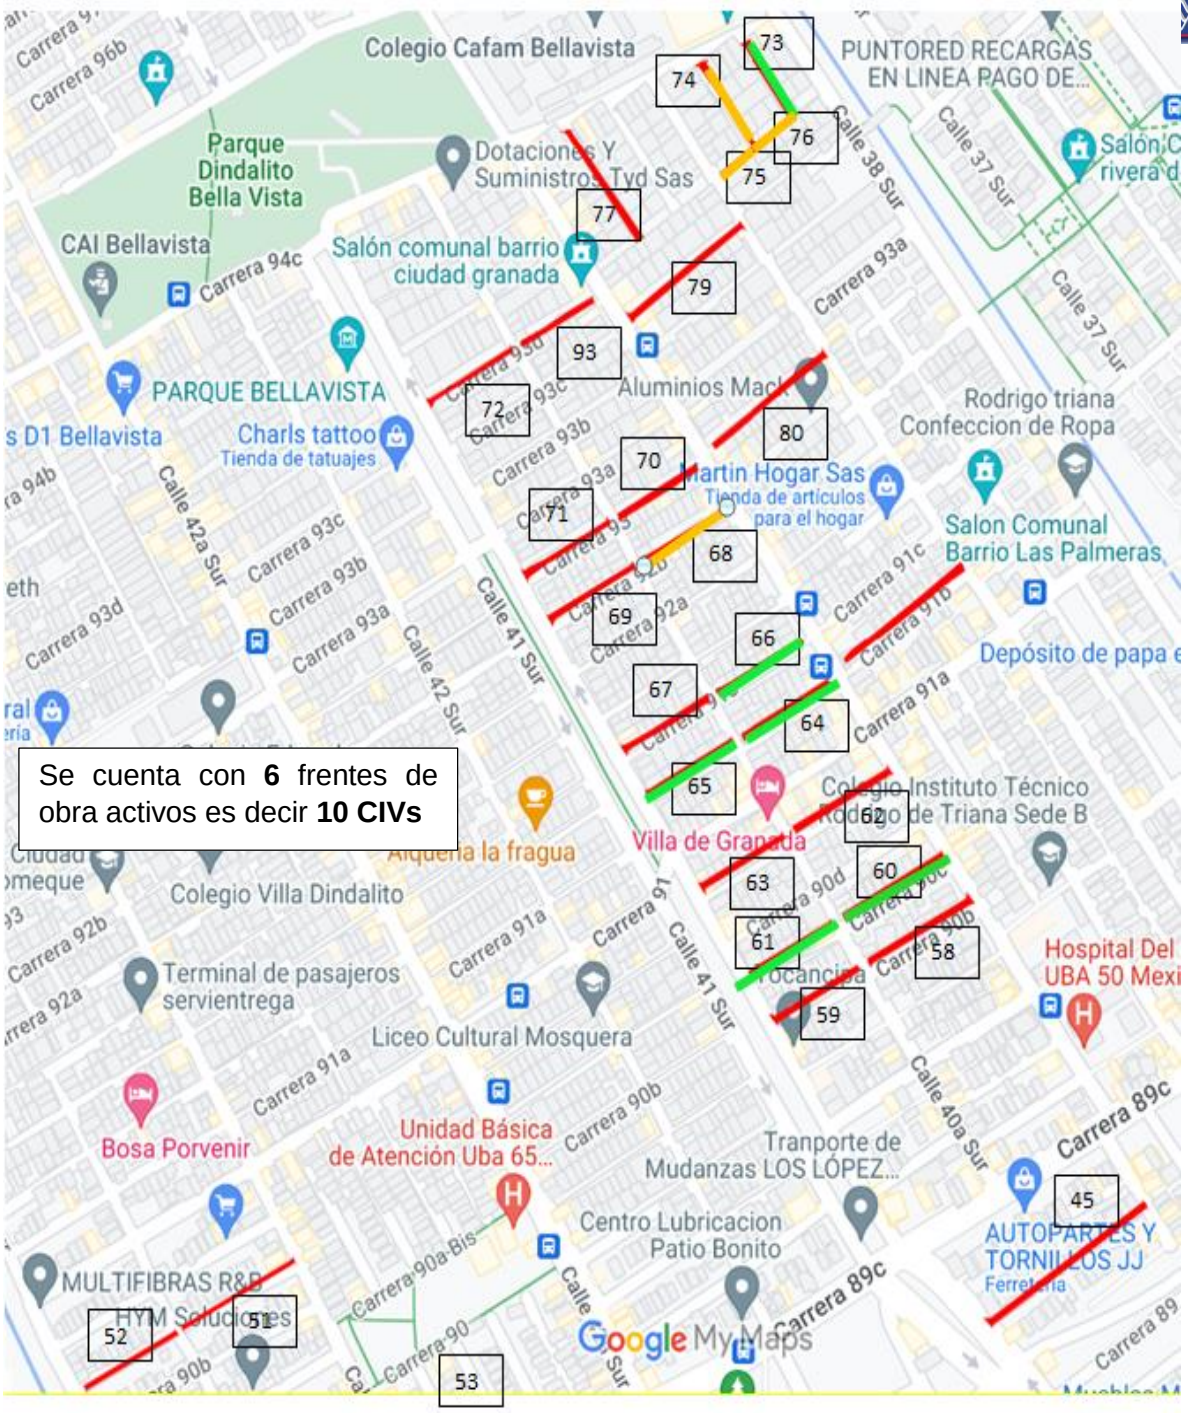

Se cuenta con **6** frentes de obra activos es decir **10 CIVs**

Nomenclatura
Frente de obra Activo
Frente de obra Intermitente
Frente de obra Inactivo
Frente de obra sin inicio

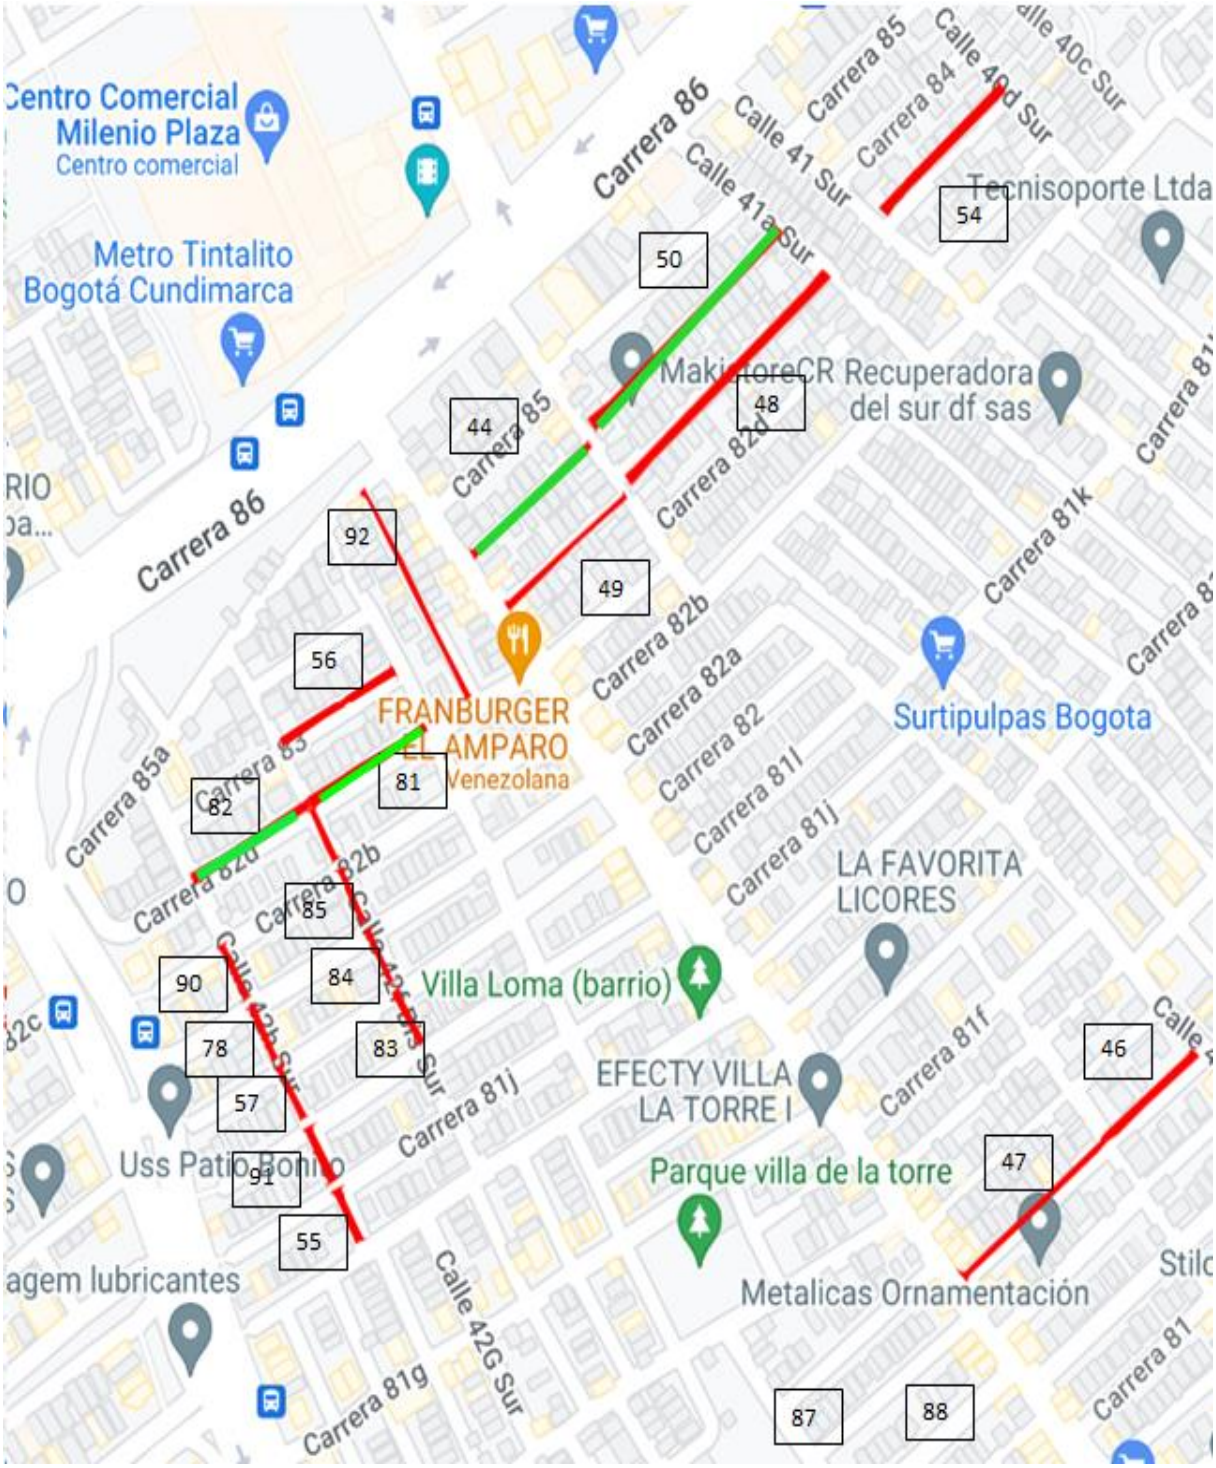

Nomenclatura
Frente de obra Activo
Frente de obra Intermitente
Frente de obra Inactivo
Frente de obra sin inicio

Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la semana
81	8005000	**Calzada:** Se realiza conformación de los cruces y la terminación de cajas **Anden oriental:** Sin actividad **Anden occidental:** Sin actividad
82	8005078	**Calzada:** Sin actividad **Anden oriental:** Conformación cajas **Anden occidental:** Conformación cajas
60	8002162	**Calzada:** Sin actividad **Anden oriental:** Conformación espacio público con fresado y acabados en cajas de inspección. **Anden occidental:** Conformación de cajas de inspección e instalación de tubería
61	8002265	**Calzada:** Cargue de pozo **Anden oriental:** Sin actividad **Anden occidental:** Sin actividad
64	8001931	**Calzada:** Sin actividad **Anden oriental:** Excavación, demolición manual y construcción de cajas de inspección **Anden occidental:** Sin actividad
65	8002008	**Calzada:** Sin actividad **Anden oriental:** Instalación de fresado segunda capa. **Anden occidental:** Instalación de geotextil, instalación de tubería PVC, construcción de cajas de inspección e instalación de fresado segunda capa
73	8001148	**Calzada:** Sin actividad **Anden oriental:** Instalación de fresado segunda capa e instalación de bordillo A-80 **Anden occidental:** Fresado segunda capa e instalación de concreto 3000
74	8001184	**Calzada:** Sin actividad **Anden oriental:** Sin actividad **Anden occidental:** Sin actividad
75	8001223	**Calzada:** Sin actividad **Anden oriental:** Sin actividad **Anden occidental:** Sin actividad
76	8001183	**Calzada:** Sin actividad **Anden oriental:** Sin actividad **Anden occidental:** Sin actividad


Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la semana
66	8001876	**Calzada:** Sin actividad **Anden oriental:** Sin actividad **Anden occidental:** Sin actividad
44	8004757	**Calzada:** Se realiza la instalación de geodren **Anden oriental:** Sin actividad **Anden occidental:** Sin actividad

EVALUACIÓN CON PROGRAMACIÓN INICIAL
GRUPO 2 COP-690-22
SEGUIMIENTO GRUPO 2 AL 23-MAYO-2023

P	CIV	VALOR CIV	PROG-ACUM	% PROG-ACUM	EJEC-ACUM	% EJEC-ACUM	% PESO EJEC	% ATRASO
81	8005000	$ 332 659 677.00	$ 332 659 677	2.13%	$ 327 669 713	1.89%	98.50%	-0.24%
82	8005078	$ 363 234 816.00	$ 363 234 816	2.32%	$ 374 446 315	2.16%	103.09%	-0.16%
60	8002162	$ 320 423 201.00	$ 320 423 201	2.05%	$ 287 112 628	1.66%	89.60%	-0.39%
61	8002265	$ 350 881 664.00	$ 350 881 664	2.24%	$ 340 720 821	1.97%	97.10%	-0.28%
65	8002008	$ 360 097 950.00	$ 360 097 950	2.30%	$ 285 587 925	1.65%	79.31%	-0.65%
64	8001931	$ 376 110 421.00	$ 376 110 421	2.40%	$ 285 396 675	1.65%	75.88%	-0.76%
73	8001148	$ 285 516 827.00	$ 285 516 827	1.82%	$ 239 059 414	1.38%	83.73%	-0.45%
76	8001183	$ 149 125 712.00	$ 149 125 712	0.95%	$ 77 826 628	0.45%	52.19%	-0.50%
75	8001223	$ 144 101 873.00	$ 144 101 873	0.92%	$ 44 684 362	0.26%	31.01%	-0.66%
74	8001184	$ 377 246 202.99	$ 0	0.00%	$ 158 443 405	0.91%	42.00%	0.91%
70	8001657	$ 335 301 222.00	$ 290 605 569	1.86%	$ 0	0.00%	0.00%	-1.86%
66	8001876	$ 317 968 274.00	$ 317 968 274	2.03%	$ 135845747	0.78%	42.72%	-1.25%
44	8004757	$ 544 458 719.00	$ 372 028 643	2.38%	$ 48 614 560	0.28%	8.93%	-2.10%
62	8002055	$ 435 577 970.00	$ 435 577 970	2.78%	$ 0	0.00%	0.00%	-2.78%
68	8001715	$ 353 976 016.00	$ 353 976 016	2.26%	$ 1 740 590	0.01%	0.49%	-2.25%
71	8001771	$ 361 200 702.00	$ 208 701 766	1.33%	$ 0	0.00%	0.00%	-1.33%
69	8001823	$ 338 002 169.00	$ 277 905 383	1.78%	$ 0	0.00%	0.00%	-1.78%
63	8002132	$ 301 442 109.00	$ 301 442 109	1.93%	$ 0	0.00%	0.00%	-1.93%
50	8004663	$ 769 715 226.00	$ 94 059 201	0.60%	$ 72 257 131	0.42%	9.39%	-0.18%
77	8001285	$ 564 387 925.00	$ 75 232 910	0.48%	$ 0	0.00%	0.00%	-0.48%
79	8001390	$ 628 921 781.00	$ 146 727 452	0.94%	$ 0	0.00%	0.00%	-0.94%
92	8004910	$ 456 355 147.00	$ 395 523 006	2.53%	$ 0	0.00%	0.00%	-2.53%
67	8001968	$ 386 404 676.00	$ 257 615 997	1.65%	$ 0	0.00%	0.00%	-1.65%
59	8002331	$ 359 760 050.00	$ 311 804 035	1.99%	$ 0	0.00%	0.00%	-1.99%
58	8002225	$ 369 965 304.00	$ 369 965 304	2.36%	$ 0	0.00%	0.00%	-2.36%


P	CIV	VALOR CIV	PROG-ACUM	% PROG-ACUM	EJEC-ACUM	% EJEC-ACUM	% PESO EJEC	% ATRASO
56	8004997	$ 369 114 616.00	$ 369 114 616	2.36%	$ 0	0.00%	0.00%	-2.36%
	Total		**$ 7 260 400 392**	**46.40%**	**$ 2 679 405 914**	**15.46%**		-30.94%
		TOTAL OBRA	**$ 15 648 180 732**					

G2	CORTE AL 23 DE MAYO DE 2023		
	GENERAL	OBRA	FINANCIERO
% PROGRAMADO	46.36%	46.40%	46.36%
% EJECUTADO	15.48%	15.46%	9.52%
% DESVIACIÓN	-30.88%	-30.94%	-36.84%

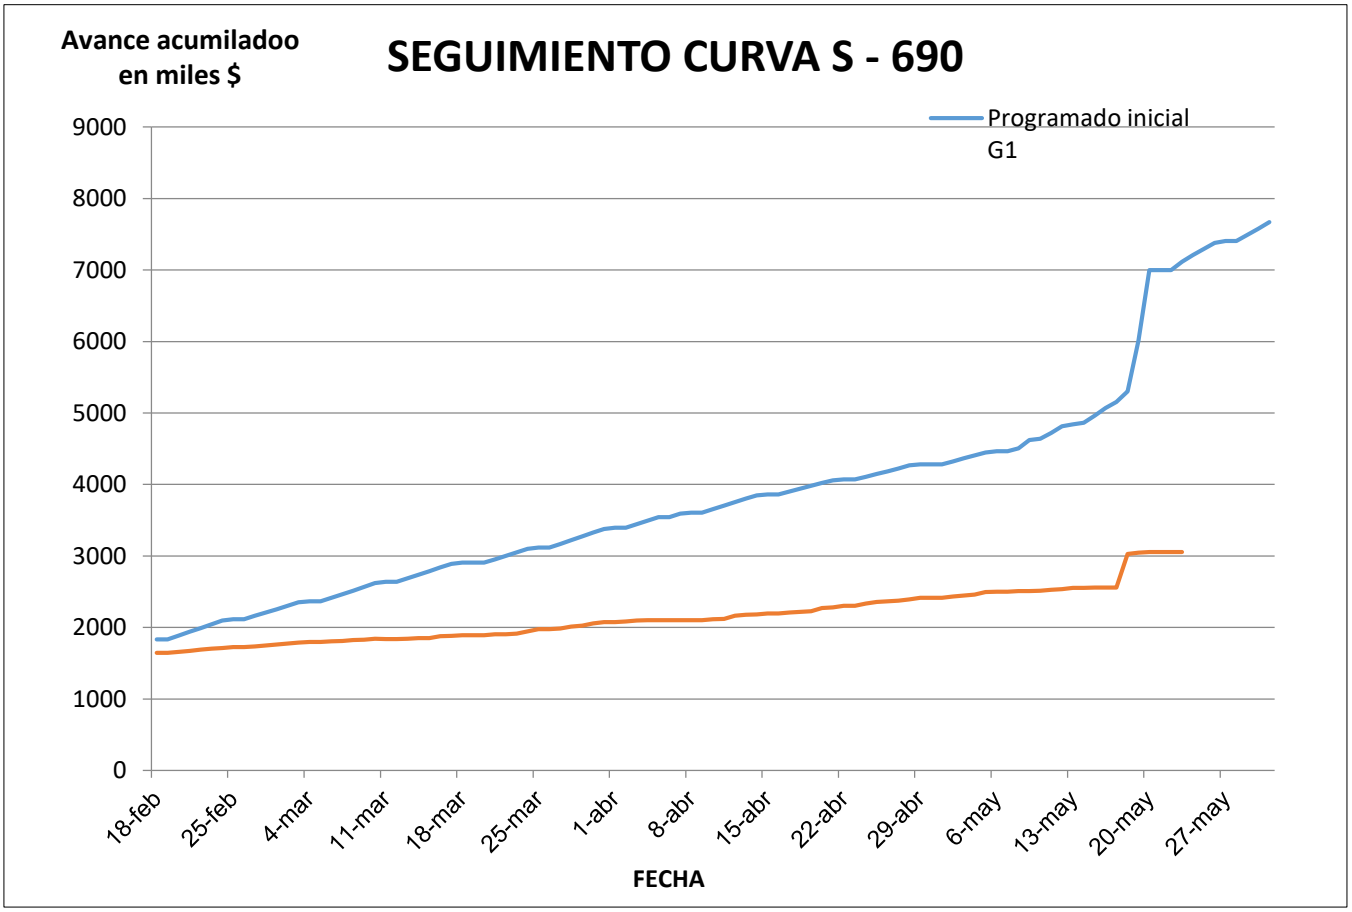

EVALUACIÓN POR CIV GRUPO 2 COP-690-22

FECHA EVALUACIÓN			16-may	23-may
P	CIV	VALOR TOTAL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV
81	8005000	$ 364 077 458.00	90.00%	98.50%
82	8005078	$ 425 507 175.00	88.00%	103.09%
60	8002162	$ 364 209 279.11	78.00%	89.60%
61	8002265	$ 415 513 196.48	82.00%	97.10%
65	8002008	$ 401 291 370.00	70.00%	79.31%
64	8001931	$ 568 211 892.00	50.00%	75.88%
73	8001148	$ 322 618 893.00	71.00%	83.73%
76	8001183	$ 185 301 495.53	42.00%	52.19%
75	8001223	$ 177 019 790.30	25.00%	31.01%
74	8001184	$ 377 246 202.99	42.00%	42.00%
70	8001657	$ 358 334 979.40	0.00%	0.00%
66	8001876	$ 323 442 256.55	42.00%	42.72%
44	8004757	$ 566 710 811.39	8.00%	8.93%
68	8001715	$ 353 976 016.00	0.00%	0.49%
50	8004663	$ 792 856 990.45	7.60%	9.39%

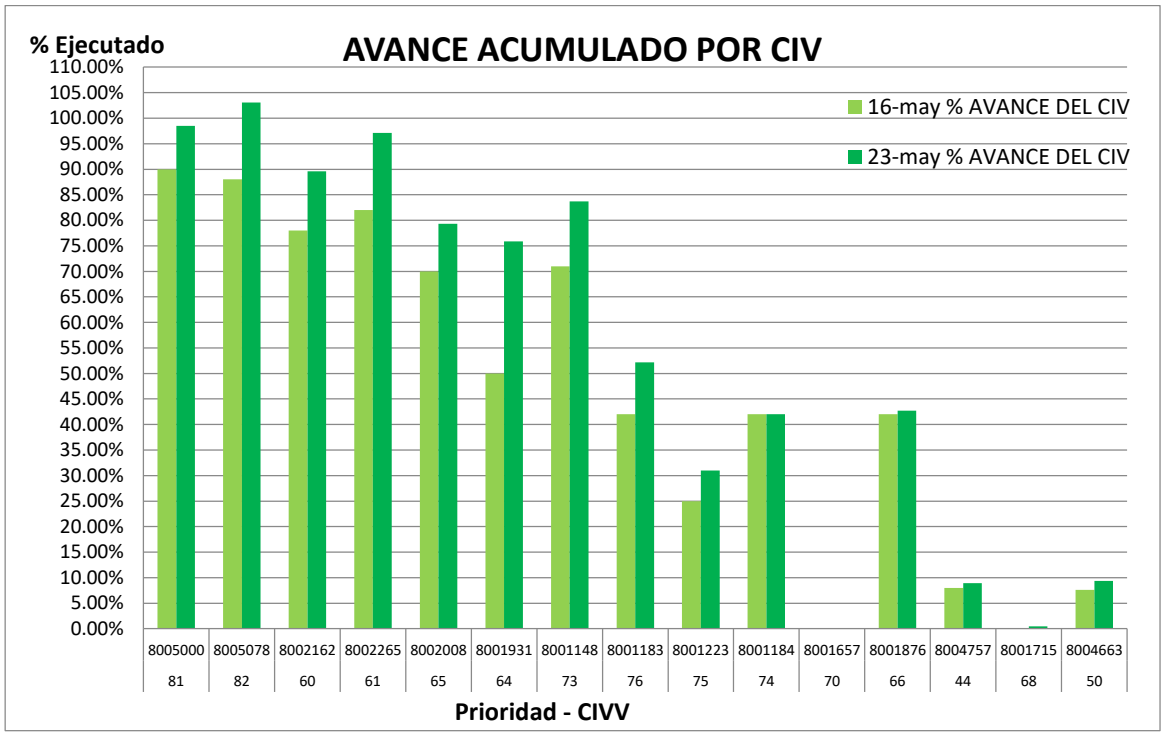

ESTADO SEMANAL DE PROCESO CONSTRUCTIVO

CONTRATISTA DE OBRA GRUPO 2 -CVK22 COP 690-22

PK_ID CALZADA	PK_ID ANDEN	PK_ID ANDEN	44			50			60			61			64			65			66			68			73			74			75			76			81			82		
VIA	ORIENTAL	OCCIDENTAL	VIA (152907)	ORI (23937)	OCC (23938)	VIA (152906)	ORI (23935)	OCC (23936)	VIA (155776)	ORI (29122)	OCC (29123)	VIA(155777)	ORI (29124)	OCC (29125)	VIA (155852)	ORI (29274)	OCC (29275)	VIA (155853)	ORI (29276)	OCC (29277)	VIA (155860)	ORI (29290)	OCC (29291)	VIA (155875)	ORI(29320)	OCC (29321)	VIA(155917)	SUR(92062684)	NOR(92062817)	VIA(155918)	SUR(92062720)	NOR(92062828)	VIA(155893)	ORI(29356)	OCC(29357)	VIA(155892)	ORI(29354)	OCC(29355)	VIA(153026)	ORI(24149)	OCC(92062836)	VIA(153027)	ORI(24151)	OCC(24152)
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO Y CAJAS DE INSPECCION.	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO Y CAJAS DE INSPECCION.																																								
NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.																																								
REDES HIDRAULICAS	GEOTEXTIL	GEOTEXTIL																																								
GEOTEXTIL, GEOCELDA HDPE PERFORADA, RELLENO CON FRESADO SOBRE GEOCELDA	PRIMERA CAPA DE FRESADO	PRIMERA CAPA DE FRESADO																																								
PRIMERA CAPA FRESADO (RAP) ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 3% Y ADITIVO POTENCIALIZADOR (1.3 KG/M3 - SOLID SOIL).	SEGUNDA CAPA DE FRESADO	SEGUNDA CAPA DE FRESADO																																								
CANAL DE DRENAJE PREFABRICADO EN POLYCONCRETO MONOBLOCK.	CONSTRUCCION CAJAS DE INSPECCION, CAJILLAS DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION CAJAS DE INSPECCION, CAJILLAS DE AGUA POTABLE																																								
SEGUNDA CAPA FRESADO (RAP) ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 3% Y ADITIVO POTENCIALIZADOR (1.3 KG/M3 - SOLID SOIL).	BORDILLO PREFABRICADO A80	BORDILLO PREFABRICADO A80																																								
TERCER CAPA FRESADO (RAP) ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 3% Y ADITIVO POTENCIALIZADOR (1.3 KG/M3 - SOLID SOIL).	PISO EN CONCRETO GRIS MR41	PISO EN CONCRETO GRIS MR41																																								
MEZCLA ASFALTICA	CONCRETO DE 3000PSI	CONCRETO DE 3000 PSI																																								

TERMINADO	
EJECUCION	
INTERMITENTE	
SIN INICIAR	
NO APLICA	
