BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo De Desarrollo Local de Kennedy

FECHA: 1 de junio de 2023 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** (62)

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de seguimiento # 34 CIN-777-2022 / COP-690-22.

HORA DE INICIO: 4:10 pm **HORA DE FINALIZACIÓN:** 5:50 pm

ASISTENTES:

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Andrés Mauricio Rojas Llanos			X						X	FDLK-Infraestructura	andresm.llanos@gobiernobogota.gov.co	3057037473	
Danilo Meneses Toro			X						X	FDLK-Infraestructura	danilo.meneses@gobiernobogota.gov.co	3118988034	
Gladys Sorita Molina P.			X						X	CVK22 - Contratista	CVK22.director@gmail.com	3004938576	
Héctor Maldonado Barrios			X						X	CVK22 - Contratista	gerencia@aiegroup.co	3188749030	
Wiso Jaimes Rodriguez			X						X	interventoría	socialgrupo2.FdlK@gmail.com	3214357623	Wiso Jaimes
Danilo Buitrago			X						X	CVK22 - Contratista	CVK22.residente2@gmail.com	3104769300	
Carlos David Alarcón B.			X						X	CVK22 - Contratista	cvk22.corresponden te@gmail.com	3158723493	
Martha C Rodriguez H			X						X	CVK22@social.com	CVK22.social@gmail.com	3114883473	
Yanet Clare Pontaranda			X							SCLV.	Yanet Clare3@Gmail.com	3143955825	
Adriana Castro Alba			X						X	CVK22	CVK22ambiental@gmail.com	3103391162	
Carlos F Salazar			X						X	Consorcio Vías Kennedy	CVK22SST@gmail.com	3143305880	

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo De Desarrollo Local de Kennedy

FECHA: 1 de junio de 2023 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** (02)

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de seguimiento No. 34 CIN-717-2022 / COP-690-2022.

HORA DE INICIO: 4:10 pm **HORA DE FINALIZACIÓN:** 5:50 pm

ASISTENTES:

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Sandra Gonzalez			X							Interventoría	sdtkennedy@outlook.com	3178955603	
Katerine Samboni Ordoñez			X							Interventoría	Ksamboni@outlook.com	3138896538	
Angeli Curiel Acosta			X							Interventoría	v1233scivkennedy@outlook.com	3227401898	
Karen Juliethh Peñates Ramírez			X							Interventoría SCLV	v1233scivkennedy@outlook.com	3143253929	
ARTURO ZARATE			X						X	INTERVENTORIA	arturozarate1985@yahoo.com	3152368031	
Oswaldo Ladino Chaves			X						X	INTERVENTORÍA	dir-viales@silcarra.com.co	3103178077	

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

El Fondo de Desarrollo Local de Kennedy (FDLK), dio inicio a la reunión a las 4:20 pm, con la asistencia del Contratista de Obra CONSORCIO VÍAS DE KENNEDY 22 – GRUPO 2 y la Interventoría Consorcio SCLV.

Recorrido de obra

El día de hoy, la Interventoría realizó recorrido de obra en compañía de la supervisión, se evidencia que hay intervenidos 15 CIVs, el Contratista ha venido abriendo frentes, pero también, es importante que se tomen medidas para cerrar frentes.

Programación

Los avances están en función de la programación inicial aprobada, se le ha solicitado al Contratista actualizar el plan detallado de trabajo, pero a la fecha no se ha cumplido El Contratista se compromete a radicar a la Interventoría el PDT ajustado mañana, 2 de junio de 2023.

G2	CORTE AL 30 DE MAYO DE 2023		
	GENERAL	OBRA	FINANCIERO
% PROGRAMADO	53.73%	54.80%	53.73%
% EJECUTADO	16.55%	16.25%	9.52%
% DESVIACIÓN	-37.18%	-38.55%	-44.21%

Esta semana se dio apertura a las prioridades 68 y 69, por lo que el FDLK solicita que den cierre a las prioridades 81 y 82, las cuales se encuentran abiertas desde diciembre 2022.

Los próximos CIVs a intervenir corresponden a las prioridades ***P70, P71, P48 y P49***, y el Contratista menciona que, se tienen unas contingencias por el tema social, que tiene que ver con los tiempos, se entiende que son 5 días para que la comunidad tenga espacio para sacar los vehículos, sin embargo, el Contratista solicita se acorten esos tiempos e iniciar de forma más inmediata. Por lo anterior, el FDLK recomienda al Contratista no esperar a tener el PMT aprobado por la SDM para informar a la comunidad, sino desde que se está tramitando el PMT avisar a la comunidad.

Compromisos pendientes

A la fecha, la Interventoría manifiesta que ***NO*** se dio cumplimiento a los siguientes compromisos:

- ***Plan detallado de trabajo ajustado:*** El contratista manifiesta que se tiene una programación que ha sido revisada en mesas de trabajo e indican que mañana radican de manera oficial a la Interventoría.
- ***Formatos MEV del mes de abril:*** El Contratista se compromete a entregar el 5 de junio de 2023
- ***Concepto sumidero:*** El Contratista comenta que, en el acta que se hizo con la EAB solicitan soporte del especialista hidráulico con el cálculo de los monoblocks que se tienen, y mañana radicarían a la Interventoría
- ***Inventario de redes secas:*** El Contratista informa que, se hizo inventario en los segmentos que están siendo intervenidos en Corabastos de la red de gas natural. El Contratista el 7 de junio realizar la entrega.

Componente SST

Informe semanal 34: Aprobado

Informe mensual 7: No se encuentra aprobado. Hacen falta soportes de personal. El Contratista radicó una carta de compromiso, donde el tiempo que propone es exagerado, teniendo en cuenta que los soportes que debía entregar corresponden a marzo, por tanto, la Interventoría emitió respuesta ayer solicitando el cambio de fecha al 10 de junio de 2023 y se está a la espera de que el Contratista dé respuesta. El FDLK solicita al Contratista dar celeridad al tema para poder tramitar la cuenta de abril

Calificación: 100%

Personal

- Ingresos: 18 (5 mano de obra no calificada, 5 ayudantes, 2 operadores, 4 oficiales, 1 maestro y 1 Boal)
- Rotación de personal de obra (cuadrillas, maestro, ayudantes y oficiales): 70
- Personal retirado en el mes de mayo: 20
- Ausentismo de la semana No. 34: 0,29%

Componente Ambiental

Informe semanal 34: Aprobado

Informe mensual 7: Aprobado, pendiente de oficio por parte de Interventoría

Informe mensual 8: En revisión en mesa de trabajo

Calificación: 100%

Certificación de UMV

El FDLK indica que, está certificación la debe emitir la Interventoría, certificando lo que el Contratista utilizó e instalo en los CIVs. La UMV no remite un oficio donde certifique que realmente entregó material al Contratista, lo que hace es expedir una resolución al FDLK y el FDLK es el responsable de administrar el fresado. Por lo anterior, el FOCI 06 del IDU se debe adaptar a la UMV para trazabilidad de la Interventoría.

Fresado

El Contratista manifiesta que, en revisiones anteriores del residente ambiental de Interventoría, solicitaba que coincidiera la cantidad reportada en acta instalada con una expansión para lo que es el transporte, se ha venido manejando y no ha pasado nada, pero si se hace un barrido actual de todo el fresado que ha llegado y se ha instalado, el porcentaje de expansión no da exacto, e incluso los desperdicios son mayores. Hay volúmenes que no se están reportando en ningún ítem de pago, como el volumen que se descuenta del monoblock, se realizó un cálculo para un segmento de 70 metros lineales y más o menos se pierden 15 m^3 sueltos de fresado.

El FDLK solicita que se lleve un seguimiento del desperdicio y los sobre tamaños del material de fresado, puesto que, cuando se instala el monoblock hay que atracar con el material de fresado, pero cuando se excava el andén, ese material se retira, es decir que, al momento de reportar la cantidad de fresado en los informes mensuales, este no va cerrar de acuerdo con el material suministrado. Desde la Interventoría se solicita al Contratista dar un soporte técnico de los desperdicios de material de fresado, para justificar la cantidad a cierre de cada mes. La Interventoría además propone, llevar un registro fotográfico para evidenciar donde se presentan casos puntuales de desperdicio. El FDLK recomienda tener un soporte y control del material de fresado y realizar el cálculo

exacto del desperdicio y reportarlo en el informe mensual, para dejar la trazabilidad mes a mes y justificar las razones por las cuales se genera el desperdicio. El Contratista indica que, en el Informe No. 7 quedo desglosado las razones por las que se pueden estar presentando esas diferencias de cantidades y se revisarán los Informes mensuales de enero, febrero marzo y abril, porque las cantidades ya quedaron conciliadas hasta marzo.

Componente Social
Informe mensual 8: Observado
Informe semanal: Aprobado
Calificación: 100%

A la fecha cuenta con 30 PQRSD, de las cuales (4) se encuentran abiertas, dos son de la prioridad 82.
En la P82, se tiene una PQRSD de la señora Nórida Beltrán, el martes 30 de mayo de 2023, la residente social de Interventoría se acercó al predio y la ciudadana manifiesta que cuenta con una posible solución para realizar el ajuste en su espacio público, proponiendo que no sea escalón sino una especie de rampa, dado que, si le dejan el escalón, como el predio es esquinero, al momento de alguien dar el giro, se puede tropezar y se puede caer.



El Contratista informa que, el desnivel del predio es muy grande, la propuesta que presenta la señora no es en ángulo recto sino como en chaflan, para entrar al cajón y poner un sifón, pero la diferencia de nivel es aproximadamente de 11cm, la puerta está a 8 cm por debajo, por lo tanto, la solución no aplicaría.



Predio P82 – Ciudadana Nórida Beltrán

De otra parte, la Interventoría propone hacer una rampa; bajar al nivel de la puerta y sacar hasta la esquina y después si desarrollar una rampa, para que la persona que venga caminando sepa que hay un desnivel y evitar los escalones. El Contratista comenta que revisara está propuesta, pero que se debe tener en cuenta que, esa esquina es el punto alto de todo el segmento y es probable que se le entre el agua al predio. Para el 6 de junio de 2023, el Contratista se compromete a tener una respuesta para la PQRSD y que sea socializada a la ciudadana.

En la segunda PQRSD de la prioridad 82, en el predio del ciudadano ya se fundió la rampa, pero el señor solicita una rampa con mayor desarrollo y al hacerla con mayor desarrollo se invade la franja peatonal, lo cual no se puede hacer, dado que, priva el bien público sobre el privado. Por lo tanto, se hará el cierre de la PQRSD, por medio de un oficio que tendrá como anexo el acta de compromiso firmada por el ciudadano, donde se le explicó todas las posibilidades y se le pidió que revisará antes de fundir y el accedió y, por lo tanto, no se puede hacer la modificación que solicita. El Contratista se compromete a entregar el oficio de respuesta a la PQRSD con todos los soportes adjuntos y el formato del requerimiento el 6 de junio de 2023

Por otra parte, teniendo en cuenta que se va a iniciar el cierre de las prioridades 81 y 82, la Interventoría solicita al Contratista iniciar con los remates en los predios, dado que las fachadas han tenido afectación por la obra, para poder realizar el levantamiento de acta de vecindad de cierre.

Tránsito y Transporte
Informe mensual 8: El Contratista radicó ayer y se encuentra en revisión

Los 2 CIVs que habían cerrado (P48 y P49), se pudieron radicar el viernes 26 de mayo de 2023 y se está a la espera que salga la aprobación hoy en la noche. El viernes, 26 de mayo salió la aprobación para las segundas etapas de las prioridades 64, 65, 66, 73, 74, 75 y 76 y esta semana quedó radicado para la primera etapa la P89.

En un aspecto general, de los 50 CIVs hay 17 que tienen alguna aprobación y tres que están en proceso. Hay 30 CIVs sin ninguna gestión de PMT, de esos 30 hay 5 CIVs cuya señalización la vigencia vence el 30 de junio de 2023. Para la vigencia de la señalización, el Contratista debe solicitar una reunión, no oficial en el que se le plantea el asunto y la SDM dirá haga una carta, solicite una prórroga del vencimiento, es más algo no oficial, simplemente de consulta. Para la próxima semana se debe hacer el acercamiento con la SDM.

Componente técnico
Frentes activos: 7
Frentes inactivos: 2 (P66 y P75).
Informe mensual 7: Observado
Calificación: 91%
Informes semanales del 26 al 33: Observados, el Contratista solicita mesa de trabajo para revisar los porcentajes reportados en los semanales. La mesa de trabajo se realizará el 5 de junio de 2023.
Acta parcial de abril: Observada, el Contratista se encuentra atendiendo e informa que, tienen pendiente definir las cantidades finales del acta de abril para poder actualizar los cuadros y algunos descuentos que no tuvieron en cuenta. El 6 de junio de 2023, el Contratista radica la cuenta de abril con todos los soportes.

Ayer se radicó al FDLK el Balance de mayores y menores del Contratista, se tienen 2 prioridades que no se podrán intervenir que son la P87 y P54. El Contratista indica que. de igual manera, conforme se vayan cerrando CIVs se ajusta el presupuesto y se continua con la actualización, además existe la posibilidad de una tercera exclusión debido a que se han detectado varios NP en espacio público.

Calificación PMT

El Contratista manifiesta que la calificación en las últimas semanas ha sido muy baja, pero que no cuentan con el consolidado para saber que se les está calificando, por lo que la Interventoría indica que, no se ha podido entregar el consolidado semanal porque los inspectores van a buscar las firmas y el Contratista se demora en entregar el paquete firmado, el cual consta de la memoria de cantidades y la calificación del PMT, por lo tanto, para hacer el consolidado semanal es imposible porque no entregan firmados en los tiempos que son.

La Interventoría comenta que, en el comité que se realizó con la SDM, se le dijo al Contratista que las señales que sean robadas se deben reponer en el menor tiempo, y eso repercute en la calificación, pero el Contratista solicita que se le dé un tiempo prudencial para reponer las señales y que no se vea afectada la calificación.

Con respecto a las calificaciones, el FDLK invita a que se socialice el tema con los residentes del Contratista, para que sepan el concepto de Interventoría y tengan la oportunidad de manifestar cualquier duda y se pueda conciliar la calificación.

En cuantos, a los Informes diario de cantidades, el Contratista indica que los ha recibido por parte de la Interventoría, pero las cantidades de excavaciones son cantidades aproximadas y se obtienen de acuerdo con el diseño, igual se han firmado los informes con esas cantidades, pero el problema es que se tomen esas para el acta de cobro. Por su parte, la Interventoría aclara que, para las cantidades diarias, se hace un levantamiento con el topógrafo del Contratista y se saca un promedio en excavación, luego se le informa al Inspector de Interventoría, y en el informe se consigna el promedio que está conciliado con el topógrafo del Contratista.

Informes semanales

El Contratista manifiesta que, si en la cuenta se cambia alguna cantidad, toca cambiar cuenta de cobro, informe mensual e informes semanales, y que por lo tanto se está haciendo un reproceso, dado que después de un mes se deben cambiar los Informes semanales, por lo cual propone que en los semanales solo se consignen actividades realizadas en cada CIV, registro fotográfico, PMT, avance y programado ejecutado, pero no que se consignen cantidades. Por su parte la Interventoría indica que, al Contratista mediante comunicación se le informó cómo debía presentar los Informes semanales, de acuerdo con el apéndice G numeral 1.7.3.

El FDLK, propone que, los Informes semanales se dejen parciales y el cierre con el ultimo semanal y el mensual. Adicionalmente, la memoria en el acta de cobro no viene por semana, sino que viene una sola mensual, entonces lo ideal sería que la conciliación semanal fuera la suma al final, pero si lo que se acuerda en la semana es el reporte en los informes semanales, el ajuste de más o menos luego de una revisión, se hace en la última semana y solo se ajusta el último informe semanal, pero los avances que se registren en la semana no se pueden cambiar, Por otra parte, el Contratista indica que a final de la próxima semana podría comenzar a instalar mezcla en la P73, pero no se tiene la etapa 3 de PMT aprobada por la SDM. y debían haberlo radicado hoy para poder comenzar finalizando la siguiente semana.

La residente social de Interventoría, informa que, en un predio de la P73 la ciudadana había solicitado al Contratista la adecuación del acceso al predio con una rampa, fue un acuerdo que hizo solo el Contratista sin comentarle a la Interventoría, se le construyó la rampa, pero ya no quiere rampa sino un escalón, de ese predio no hay un acta de soporte de la comunidad, y es un tema delicado en caso que la ciudadana presenté una queja en la personería. Por lo anterior, se solicita al Contratista revisar los diseños iniciales del predio, con el fin de verificar si se tenía una rampa o no.



El Contratista manifiesta que, se hará una visita con la profesional social para solicitarle a la ciudadana que, se deje por escrito su inconformidad, pero también que era conocedora de la situación y que pidió que se le hiciera una rampa, para tener un soporte las dos partes. En caso de que la señora no quiera firmar el acta, el FDLK propone levantar un acta entre contratista, Interventoría y Supervisión donde se dé fe de la determinación técnica que se tomó.

No	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Plan detallado de trabajo actualizado - PDT	CVK22	2-jun-23
2	Formatos MEV del mes de abril	CVK22	5-jun-23
3	Concepto sumidero de acuerdo a la solución propuesta por la EAB	CVK22	2-jun-23
4	Inventario de redes secas	CVK22	7-jun-23
6	Respuesta para las PQRSD de la prioridad 82	CVK22	6-jun-23
7	Reunión con la SDM – Vigencia de señalización	CVK22	7-jun-23
8	Cuenta No. 7 – Abril	CVK22	6-jun-23

Elaborada por: Interventoría – Juan Manuel Alba Rojas
Fecha de la próxima reunión: 8 de junio de 2023 Lugar de la próxima reunión: N/A

AGENDA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO

Contratista de Obra Consorcio Vías de Kennedy – COP -690-22 Grupo 2

COMITÉ DE SEGUIMIENTO No.34


Fecha: 1 de junio de 2023

ORDEN DEL DIA

1.Compromisos	
No	**Asunto**
1	Plan detallado de trabajo ajustado
2	FOAC maquinaria y equipo del mes de abril
3	Concepto sumidero de acuerdo a la solución propuesta por la EAB
4	Inventario redes secas
2. Componentes	
A. Técnico	
- **Informe semanal 30 al 34:** En revisión.	
- **Informe Mensual 6:** Aprobado - **Informe Mensual 7:**Observado	
- **Calificación:** 91%	
B. SST	
- **Informe semanal 34 :** Aprobado	
- **Informe Mensual 7:** Revisión mesa de trabajo.	
- **Calificación:** 100%	
C. Ambiental	
- **Informe semanal 34:** Sin radicar	
- **Informe Mensual 7:** Revisión atención observaciones	
- **Calificación:** 100%	
D. Gestión Social	
- **Informe semanal 34 :** Aprobado	
- **Informe Mensual 8:** Observado	
- **Calificación:** 100%	
Varios	
Obra	



Se cuenta con 7 frentes de obra activos. (P75 y P76 inactivos).

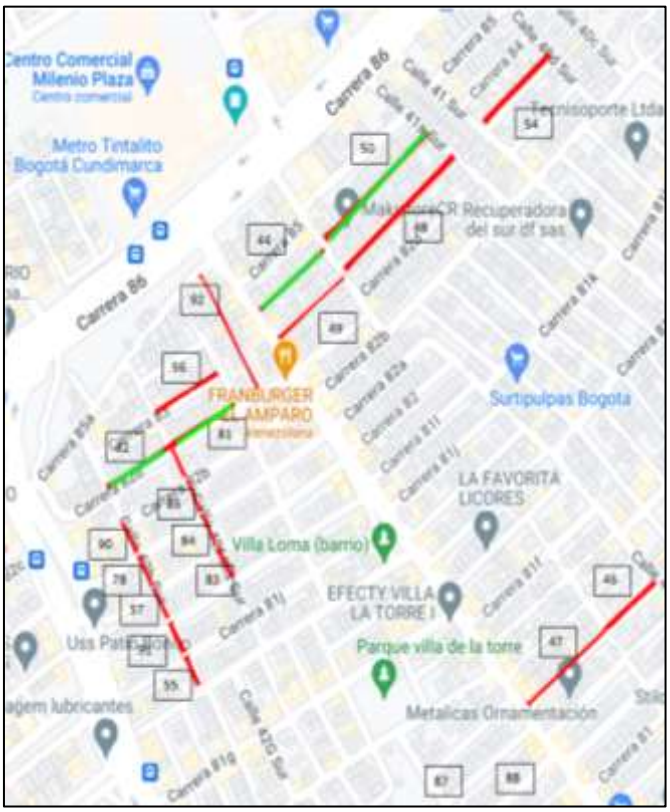

Nomenclatura
Frente de obra Activo
Frente de obra Intermitente
Frente de obra Inactivo
Frente de obra sin inicio

Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la semana
81	8005000	**Calzada:** Sin actividad **Andén oriental:** Terminación cajas **Andén occidental:** Terminación cajas
82	8005078	**Calzada:** Sin actividad **Andén oriental:** Terminación cajas e instalación de concreto. **Andén occidental:** Terminación cajas
60	8002162	**Calzada:** Sin actividad **Andén oriental:** Se realizó la instalación de concreto MR-41 para rampas **Andén occidental:** Se realizó la terminación de cajas e instalación de concreto MR-41 para rampas.
61	8002265	**Calzada:** Terminación con fresado para pozo costado norte **Andén oriental:** Sin actividad **Andén occidental:** Sin actividad
64	8001931	**Calzada:** Sin actividad **Andén oriental:** Sin actividad **Andén occidental:** Sin actividad
65	8002008	**Calzada:** Sin actividad **Andén oriental:** Se realizó la instalación de concreto MR-41 y concreto 3000 **Andén occidental:** Se realizó la instalación de concreto MR-41, concreto 3000 y terminación con fresado .
73	8001148	**Calzada:** Sin actividad **Andén norte:** Se realizó la instalación de concreto MR-41, concreto 3000. **Andén sur:** Se realizó la instalación de concreto MR-41, concreto 3000.
74	8001184	**Calzada:** Sin actividad **Andén norte:** Demolición y excavación. **Andén sur:** Sin actividad.
75	8001223	**Sin actividad**
76	8001183	**Calzada:** Instalación de monoblock V-100 **Andén oriental:** Sin actividad **Andén occidental:** Se realiza excavación y demolición**.**
66	8001876	**Sin actividad**
44	8004757	**Calzada:** Instalación de geotextil, geo celda y fresado con solid soil **Andén oriental:** Sin actividad **Andén occidental:** Sin actividad
50	8004663	**Calzada:** Se realiza excavación e instalación de geotextil, geo celda y fresado **Andén oriental:** Sin actividad **Andén occidental:** Sin actividad
68	8001715	**Calzada:** Excavación**,** demolición e instalación de geotextil, geo celda y fresando. **Andén oriental:** Sin actividad **Andén occidental:** Sin actividad
69	8001823	**Calzada:** inician CIV con excavación mecánica y demolición. **Andén oriental:** Sin actividad **Andén occidental:** Sin actividad.


SEGUIMIENTO GRUPO 2 AL 23-MAYO-2023


P	CIV	VALOR CIV	PROG-ACUM	% PROG-ACUM	EJEC-ACUM	% EJEC-ACUM	% PESO EJEC	% ATRASO
81	8005000	$ 364 077 458.00	$ 493 706 016	2.83%	$ 337 999 863	1.94%	92.84%	-0.89%
82	8005078	$ 425 507 175.00	$ 479 749 662	2.75%	$ 385 231 684	2.21%	90.53%	-0.54%
60	8002162	$ 364 209 279.11	$ 514 640 546	2.95%	$ 298 044 564	1.71%	81.83%	-1.24%
61	8002265	$ 415 513 196.48	$ 460 559 675	2.64%	$ 340 720 821	1.95%	82.00%	-0.69%
65	8002008	$ 401 291 370.00	$ 432 646 968	2.48%	$ 304 477 214	1.75%	75.87%	-0.73%
64	8001931	$ 568 211 892.00	$ 443 114 233	2.54%	$ 285 396 675	1.64%	50.23%	-0.90%
73	8001148	$ 322 618 893.00	$ 338 441 580	1.94%	$ 238 440 809	1.37%	73.91%	-0.57%
76	8001183	$ 185 301 495.53	$ 233 768 926	1.34%	$ 127 873 427	0.73%	44.70%	-0.61%
75	8001223	$ 177 019 790.30	$ 183 177 144	1.05%	$ 44 684 362	0.26%	25.24%	-0.79%
74	8001184	$ 377 246 202.99	$ 0	0.00%	$ 154 635 322	0.89%	44.54%	0.89%
70	8001657	$ 358 334 979.40	$ 394 266 995	2.26%	$ 0	0.00%	0.00%	-2.26%
66	8001876	$ 323 442 256.55	$ 430 902 424	2.47%	133546675.1	0.77%	42.00%	-1.70%
44	8004757	$ 566 710 811.39	$ 326 607 755	1.87%	$ 65 188 025	0.37%	11.50%	-1.50%
62	8002055	$ 497 195 104.00	$ 497 195 104	2.85%	$ 0	0.00%	0.00%	-2.85%
68	8001715	$ 413 456 981.00	$ 413 456 981	2.37%	$ 30 509 878	0.17%	7.38%	-2.20%
71	8001771	$ 361 200 702.00	$ 305 178 936	1.75%	$ 0	0.00%	0.00%	-1.75%
69	8001823	$ 338 002 169.00	$ 423 420 267	2.43%	$ 7 358 283	0.04%	2.18%	-2.38%
63	8002132	$ 301 442 109.00	$ 436 136 056	2.50%	$ 0	0.00%	0.00%	-2.50%
50	8004663	$ 769 715 226.00	$ 168 387 285	0.97%	$ 80 462 820	0.46%	10.45%	-0.50%
77	8001285	$ 564 387 925.00	$ 139 098 326	0.80%	$ 0	0.00%	0.00%	-0.80%
79	8001390	$ 628 921 781.00	$ 197 715 012	1.13%	$ 0	0.00%	0.00%	-1.13%
92	8004910	$ 456 355 147.00	$ 527 840 931	3.03%	$ 0	0.00%	0.00%	-3.03%
67	8001968	$ 386 404 676.00	$ 327 683 557	1.88%	$ 0	0.00%	0.00%	-1.88%
59	8002331	$ 359 760 050.00	$ 424 970 974	2.44%	$ 0	0.00%	0.00%	-2.44%
58	8002225	$ 369 965 304.00	$ 523 363 268	3.00%	$ 0	0.00%	0.00%	-3.00%
56	8004997	$ 369 114 616.00	$ 444 858 777	2.55%	$ 0	0.00%	0.00%	-2.55%
Total			**$ 9 560 887 398**	**54.80%**	**$ 2 834 570 421**	**16.25%**		-38.56%
Total Obra			**$ 15 648 180732**					

FECHA EVALUACIÓN			18-may	23-may	30-may
P	CIV	VALOR TOTAL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV
81	8005000	$ 364 077 458.00	90.00%	90.00%	92.84%
82	8005078	$ 425 507 175.00	88.00%	88.00%	90.53%
60	8002162	$ 364 209 279.11	78.00%	78.83%	81.83%
61	8002265	$ 415 513 196.48	82.00%	82.00%	82.00%
65	8002008	$ 401 291 370.00	70.00%	71.17%	75.87%
64	8001931	$ 568 211 892.00	50.00%	50.23%	50.23%
73	8001148	$ 322 618 893.00	71.00%	72.21%	73.91%
76	8001183	$ 185 301 495.53	42.00%	42.00%	44.70%
75	8001223	$ 177 019 790.30	25.00%	25.00%	25.24%
74	8001184	$ 377 246 202.99	42.00%	44.54%	44.54%
70	8001657	$ 358 334 979.40	0.00%	0.00%	0.00%
66	8001876	$ 323 442 256.55	42.00%	42.00%	42.00%
44	8004757	$ 566 710 811.39	8.00%	8.93%	11.50%
68	8001715	$ 353 976 016.00	0.00%	0.49%	7.38%
50	8004663	$ 792 856 990.45	7.60%	7.60%	10.45%
69	8001823	$ 338 002 169.00	0.00%	0.00%	2.18%

FECHA EVALUACIÓN			30-may
P	CIV	VALOR TOTAL CIV	% AVANCE DEL CIV
81	8005000	$ 364 077 458.00	2.84%
82	8005078	$ 425 507 175.00	2.53%
60	8002162	$ 364 209 279.11	3.00%
61	8002265	$ 415 513 196.48	0.00%
65	8002008	$ 401 291 370.00	4.71%
64	8001931	$ 568 211 892.00	0.00%
73	8001148	$ 322 618 893.00	1.70%
76	8001183	$ 185 301 495.53	2.70%
75	8001223	$ 177 019 790.30	0.24%
74	8001184	$ 377 246 202.99	0.00%
70	8001657	$ 358 334 979.40	0.00%
66	8001876	$ 323 442 256.55	0.00%
44	8004757	$ 566 710 811.39	2.57%
68	8001715	$ 353 976 016.00	6.89%
50	8004663	$ 792 856 990.45	2.85%
69	8001823	$ 338 002 169.00	2.18%

G2	CORTE AL 30 DE MAYO DE 2023		
	GENERAL	OBRA	FINANCIERO
% PROGRAMADO	53.73%	54.80%	53.73%
% EJECUTADO	16.55%	16.25%	9.52%
% DESVIACIÓN	-37.18%	-38.55%	-44.21%

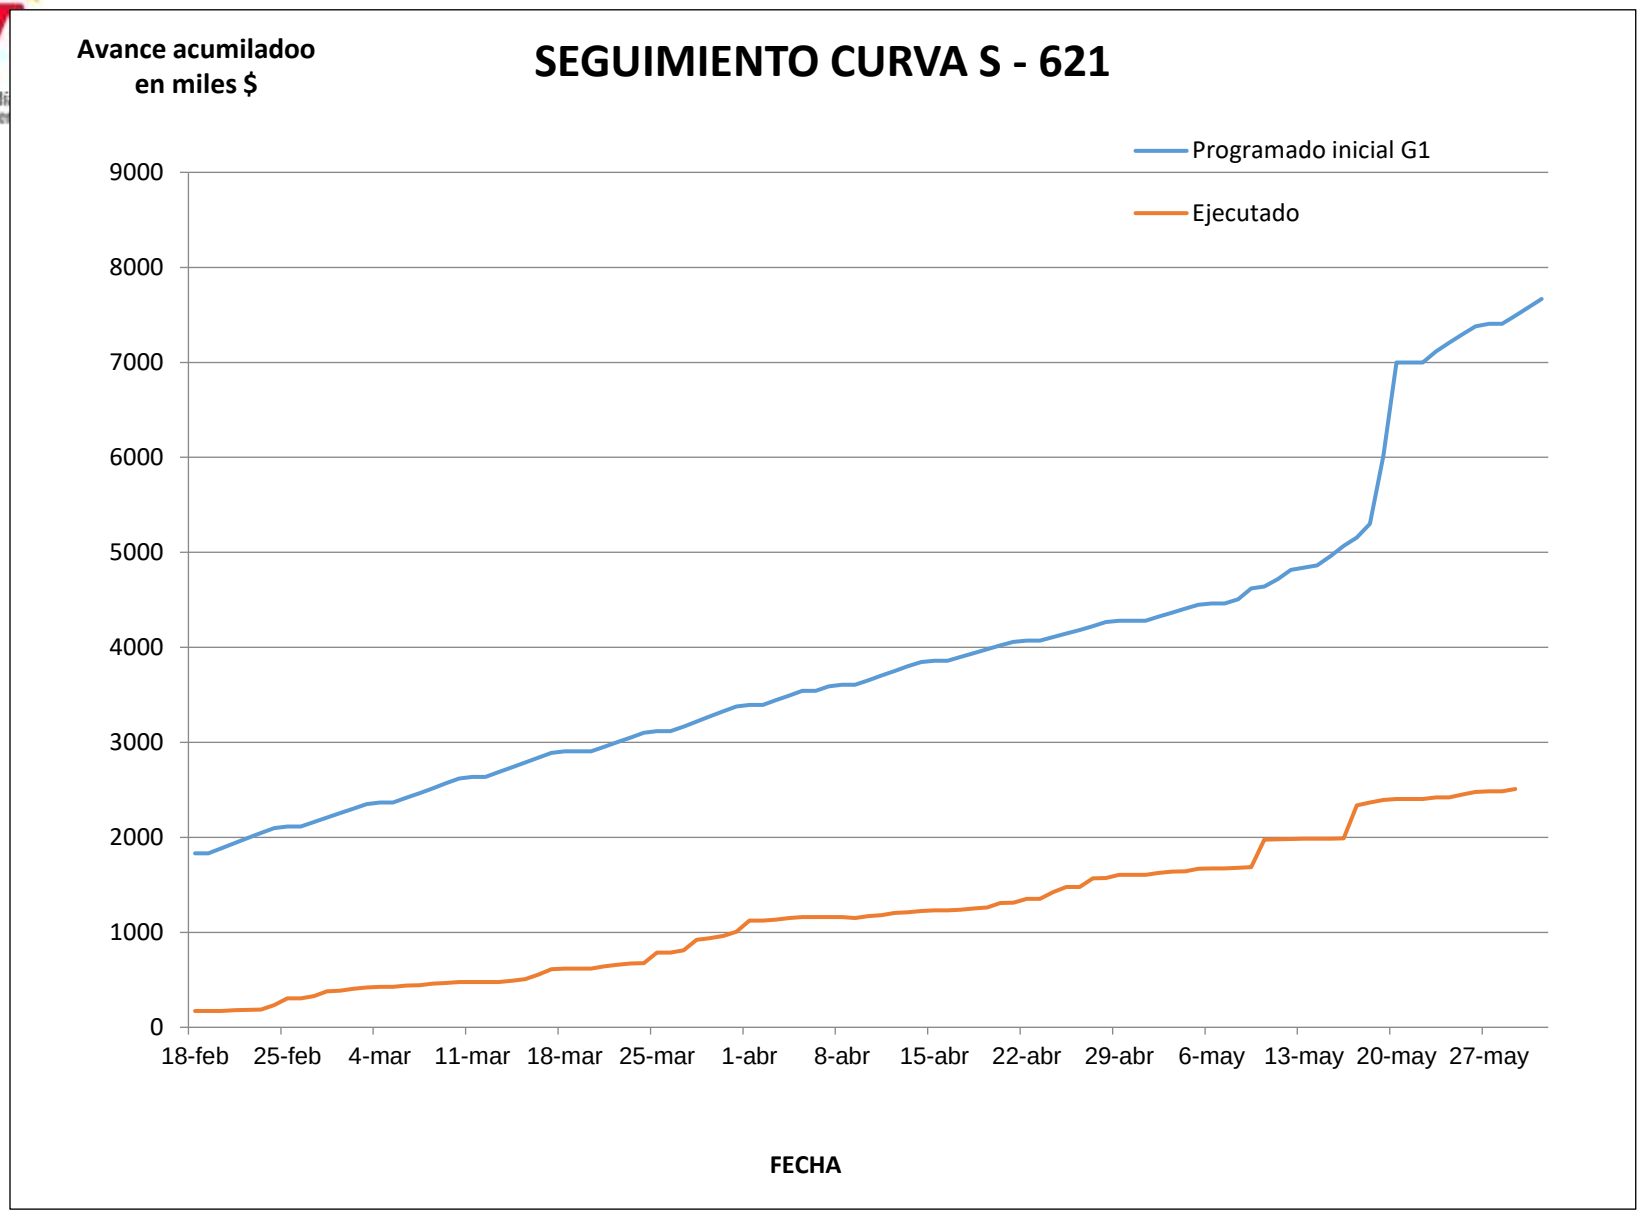

SEGUIMIENTO CURVA S - 621
Avance acumiladoo en miles $
Programado inicial G1
Ejecutado
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
18-feb
25-feb
4-mar
11-mar
18-mar
25-mar
1-abr
8-abr
15-abr
22-abr
29-abr
6-may
13-may
20-may
27-may
FECHA

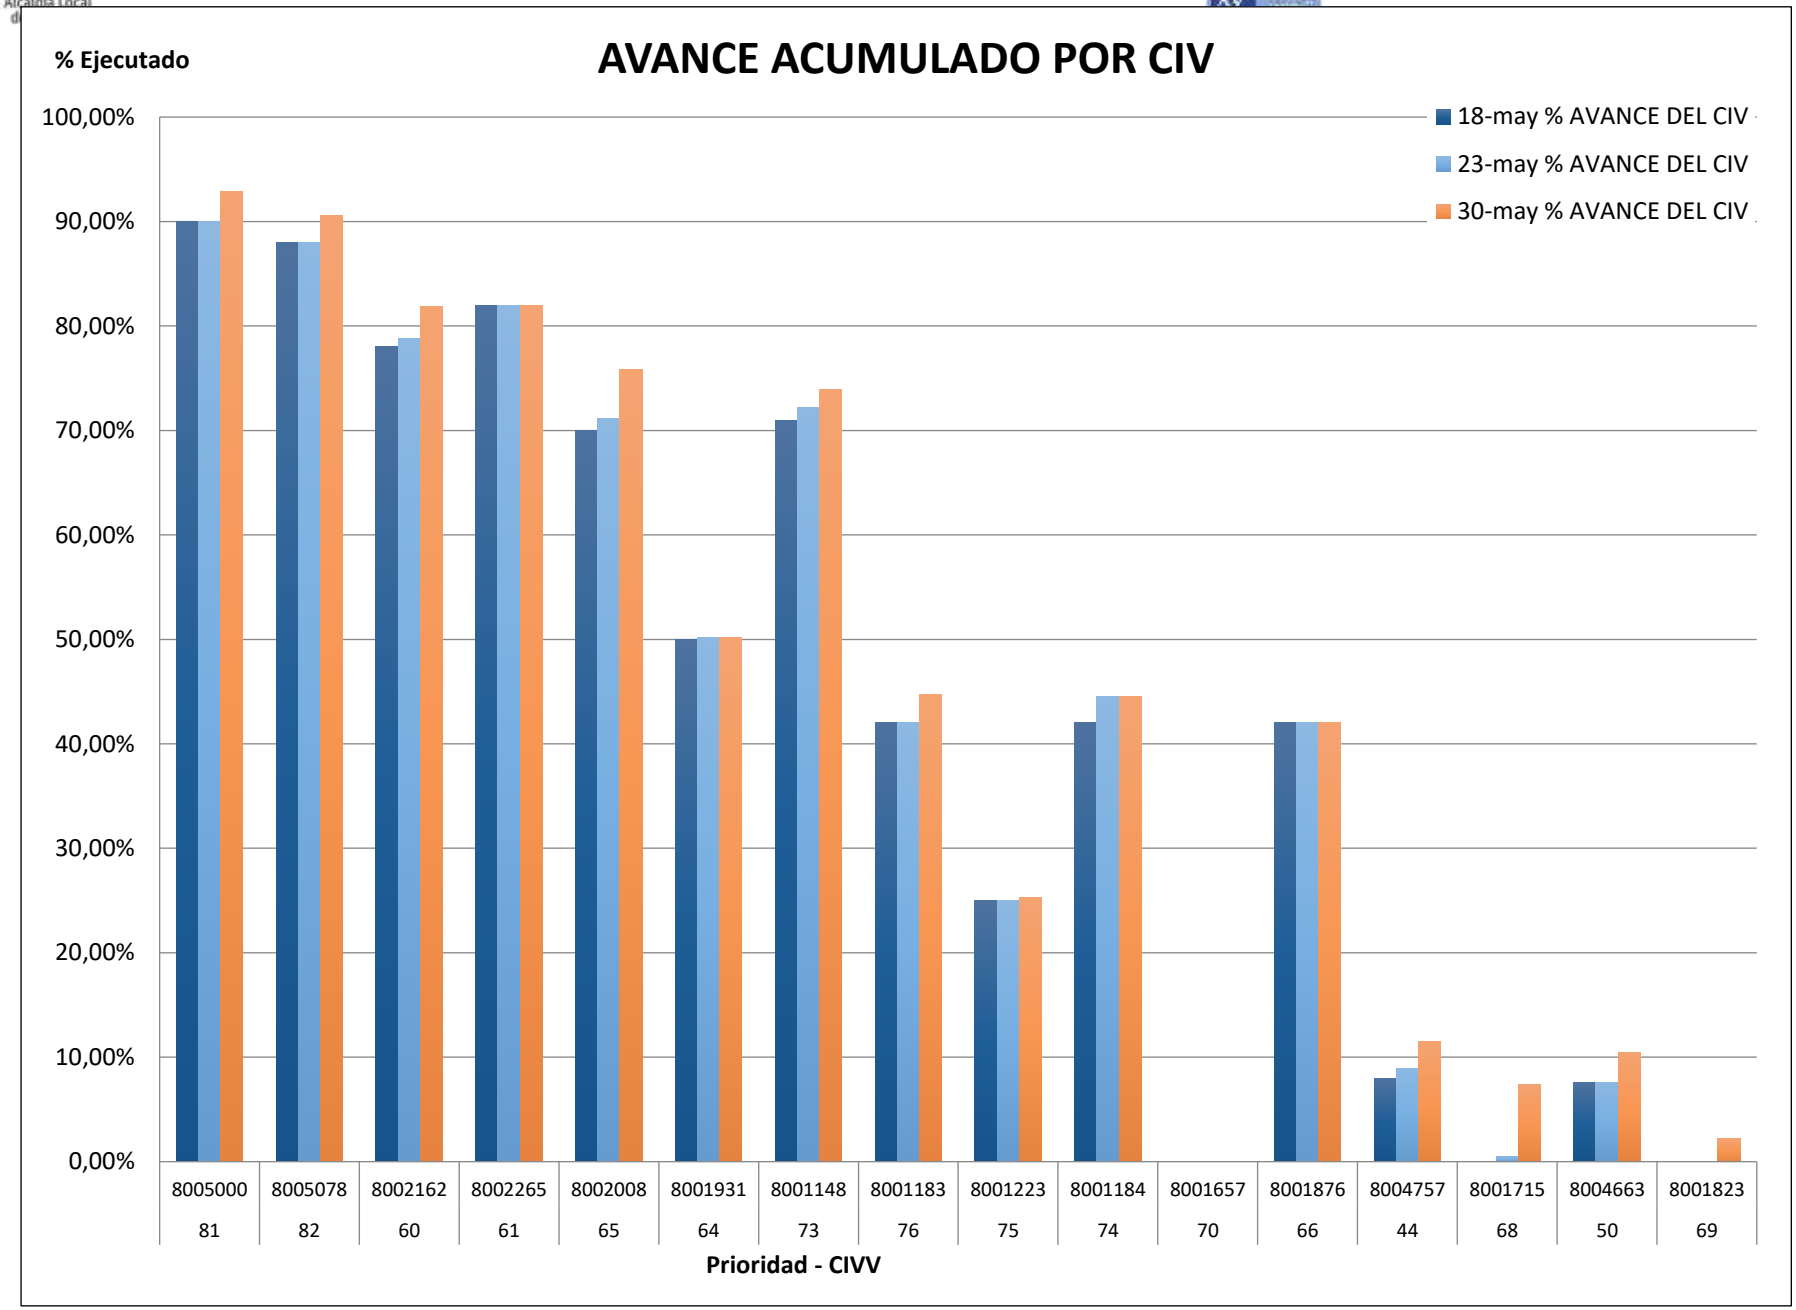
AVANCE ACUMULADO POR CIV
% Ejecutado
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
18-may % AVANCE DEL CIV
23-may % AVANCE DEL CIV
30-may % AVANCE DEL CIV
8005000 81
8005078 82
8002162 60
8002265 61
8002008 65
8001931 64
8001148 73
8001183 76
8001223 75
8001184 74
8001657 70
8001876 66
8004757 44
8001715 68
8004663 50
8001823 69
Prioridad - CIVV

ESTADO SEMANAL DE PROCESO CONSTRUCTIVO

SEMANA 34 (25 AL 31 DE MAYO DE 2023)

CONTRATISTA DE OBRA GRUPO 2-CVK 22 COP 690-22

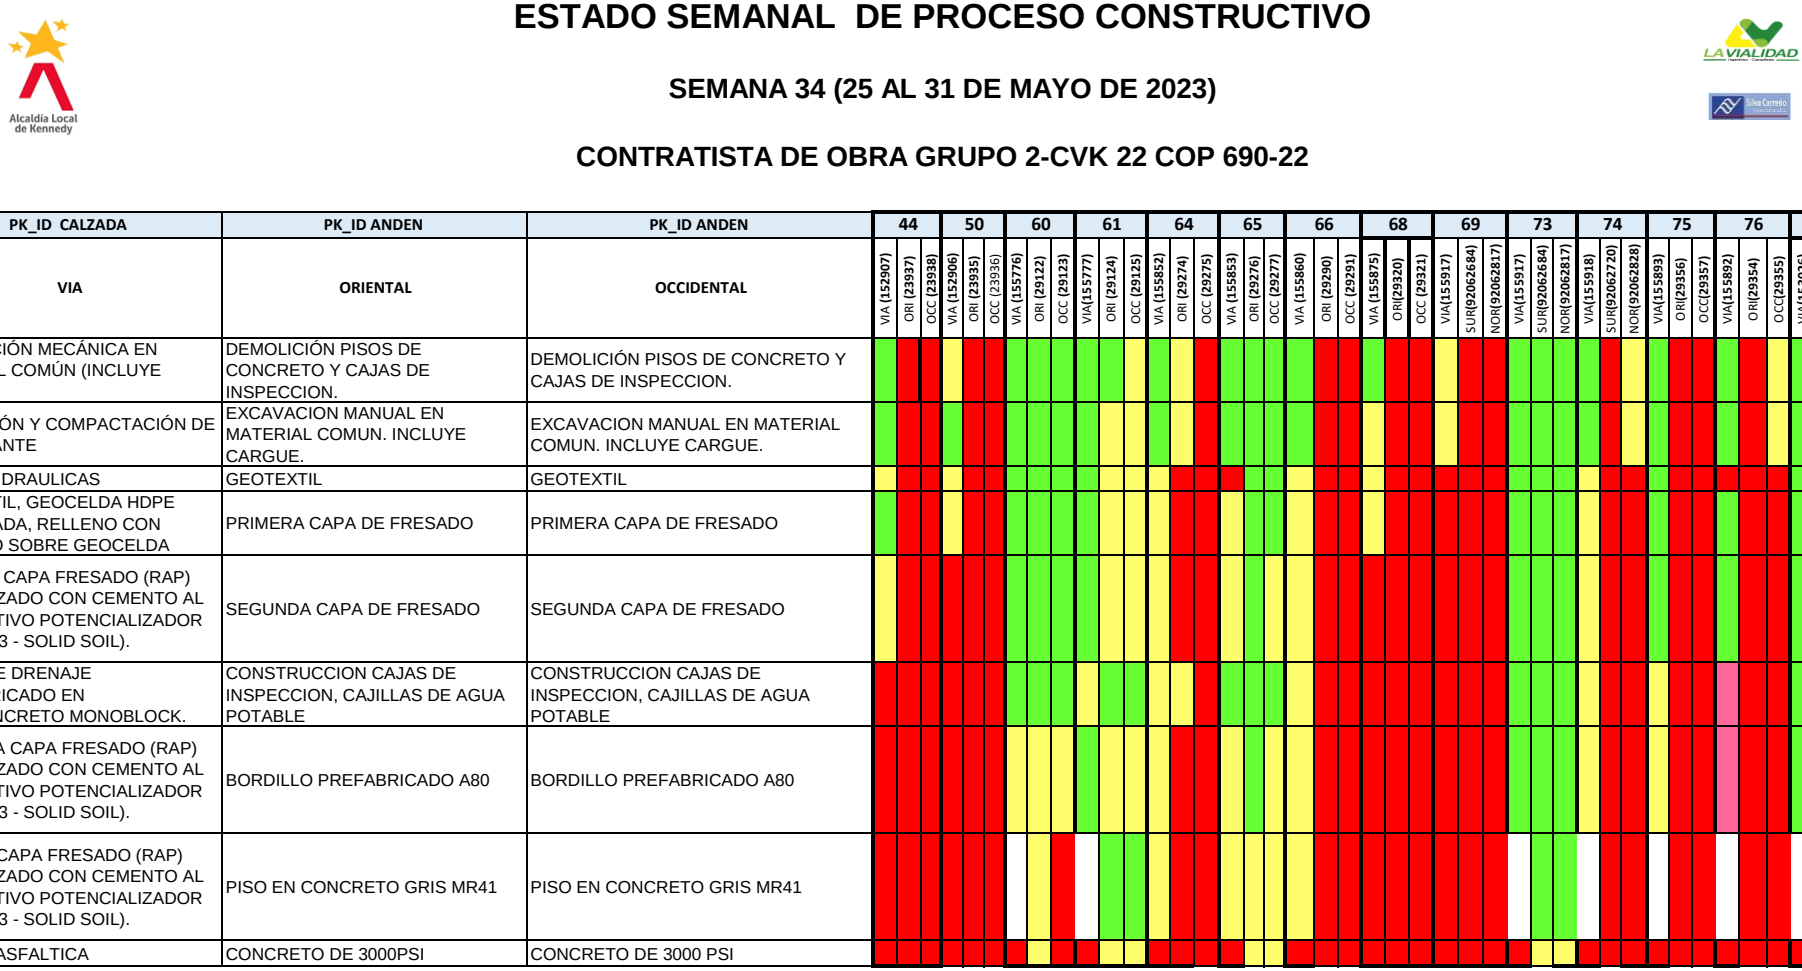

PK_ID CALZADA	PK_ID ANDEN	PK_ID ANDEN	44			50			60			61			64			65			66			68			69			73			74			75			76			81			82		
VIA	ORIENTAL	OCCIDENTAL	VIA (152907)	ORI (23937)	OCC (23938)	VIA (152906)	ORI (23935)	OCC (23936)	VIA (155776)	ORI (29122)	OCC (29123)	VIA(155777)	ORI (29124)	OCC (29125)	VIA (155852)	ORI (29274)	OCC (29275)	VIA (155853)	ORI (29276)	OCC (29277)	VIA (155860)	ORI (29290)	OCC (29291)	VIA (155875)	ORI(29320)	OCC (29321)	VIA(155917)	SUR(92062684)	NOR(92062817)	VIA(155917)	SUR(92062684)	NOR(92062817)	VIA(155918)	SUR(92062720)	NOR(92062828)	VIA(155893)	ORI(29356)	OCC(29357)	VIA(155892)	ORI(29354)	OCC(29355)	VIA(153026)	ORI(24149)	OCC(92062836)	VIA(153027)	ORI(24151)	OCC(24152)
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO Y CAJAS DE INSPECCION.	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO Y CAJAS DE INSPECCION.																																										
NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.																																									
REDES HIDRAULICAS	GEOTEXTIL	GEOTEXTIL																																										
GEOTEXTIL, GEOCELDA HDPE PERFORADA, RELLENO CON FRESADO SOBRE GEOCELDA	PRIMERA CAPA DE FRESADO	PRIMERA CAPA DE FRESADO																																										
PRIMERA CAPA FRESADO (RAP) ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 3% Y ADITIVO POTENCIALIZADOR (1.3 KG/M3 - SOLID SOIL).	SEGUNDA CAPA DE FRESADO	SEGUNDA CAPA DE FRESADO																																										
CANAL DE DRENAJE PREFABRICADO EN POLYCONCRETO MONOBLOCK.	CONSTRUCCION CAJAS DE INSPECCION, CAJILLAS DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION CAJAS DE INSPECCION, CAJILLAS DE AGUA POTABLE																																										
SEGUNDA CAPA FRESADO (RAP) ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 3% Y ADITIVO POTENCIALIZADOR (1.3 KG/M3 - SOLID SOIL).	BORDILLO PREFABRICADO A80	BORDILLO PREFABRICADO A80																																										
TERCER CAPA FRESADO (RAP) ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 3% Y ADITIVO POTENCIALIZADOR (1.3 KG/M3 - SOLID SOIL).	PISO EN CONCRETO GRIS MR41	PISO EN CONCRETO GRIS MR41																																										
MEZCLA ASFALTICA	CONCRETO DE 3000PSI	CONCRETO DE 3000 PSI																																										

TERMINADO	
EJECUCION	
INTERMITENTE	
SIN INICIAR	
NO APLICA	
