BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo De Desarrollo Local de Kennedy

FECHA: 8/Junio/2023. **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** 62

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de Seguimiento No. 35 CIN-717-2022 / COP-690-2022

HORA DE INICIO: 4:35 pm **HORA DE FINALIZACIÓN:** ____

ASISTENTES:

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Andrés Mauricio Rojas Llanos			X						X	FOLK-Infraestructura	andresm.llanos@gobiernobogota.gov.co	3057039773	
Danilo Meneses Toro			X						X	FOLK-Infraestructura	Danilo.Meneses@gobierno bogota.gov.co	3118988034	
Juan Raquel Alba R			X							Interventoria	gerencia@elavidad.com		
ARTURO ZARATE M.			X							INTERVENTORIA	arturozarate1@yahoo.com	3152368031	
Gladys Sanita Molina P			X						X	CVK22	CVK22.director@gmail.com	3004938576	
Steven Galvis			X						X	CVK22	CVK22.Residente1@gmail.com	3231813328	
Carlos David Alarcón B.			X						X	CVK22	CVK22.correspondencia@gmail.com	3138723973	
Adriana Castro Alba			X						X	CVK22	CVK22ambiental@gmail.com	3103371162	
Yaret Claro Penaranda			X							SCLV	Yaretclaro3@gmail.com	3143955825	
Luisa Jaimes Rodriguez			X							SCLV	Socialgrupo2.fdlk@gmail.com	3214357623	
Martha C. Rodriguez			X							CVK22	socialcvk22@gmail.com	3148834175	

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo De Desarrollo Local de Kennedy

FECHA: 08/Junio/2023 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** 02

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de Seguimiento No. 35 CIN-717-2022 / COP-690-2022

HORA DE INICIO: ____ **HORA DE FINALIZACIÓN:** ____

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Katerine Samboni O			X							Interventoria. SCLV	Ksamboni@outlook.com	3138896518	Katy S.
Sandra Gonzalez			X							Interventoria SCLV	sstkennedy@outlook.com	3178955603	
Carlos E. Lozano			X							Consorcio Ulzo Kennedy	CUlzo.sst@gmail.com	3183308880.	
Angeli Carol Acosta			X							Interventoria	U2335CLVkennedy@outlook.com	3227401848	
Raisa Juliett Perales Remirez.			X							Interventoria	U2335CLVkennedy@outlook.com	3143253725	
Alba Yolanda Morales Arias			X							Interventoria	acyma1380@gmail.com	3114440929	

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	**EVIDENCIA DE REUNIÓN**

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se da inicio al comité de seguimiento No. 35 en las instalaciones de la interventoría las 4:35 pm, con la presencia del apoyo a la supervisión FDLK, contratista de obra Grupo 2 Consorcio Vías de Kennedy 22 e Interventoría Consorcio SCLV.

1. Compromisos Pendientes

- ***Plan Detallado de Trabajo actualizado - PDT:*** El Contratista informa que se radicó el 3 de junio de 2023 con la comunicación CE-CVK22-ADM-517, con los recursos actualizados del balance al NP29 y NP30 y desglosado por actividades para poder hacer el seguimiento a cada capítulo del presupuesto, se recibió el 5 de junio de 2023 en la Interventoría.
- ***Inventario de redes secas:*** El Contratista indica que está en elaboración
- ***Respuesta a la PQRS de la P82:*** Hoy se dio respuesta al ciudadano
- ***Solicitud de reunión con la SDM para la revisión de los diseños de señalización y demarcación próximos a vencer:*** El contratista manifiesta que se realizo la solicitud e reunión con la SDM y se está a la espera de una respuesta positiva por parte de la entidad. La Interventoría y FDLK solicita se copien estas solicitudes para saber en qué estado se encuentran.
- ***Cuenta No. 7 – Abril (Completa):*** El Contratista manifiesta que, ayer se radicó el paquete completo, con la salvedad que el Informe del componente SST y técnico no se encuentran aprobados. Para el jueves se radicaría al FDLK

Componente SST

Informe semanal 35: Aprobado
Informe Mensual 7: Observado por planillas y soportes de pago de nóminas. Para el martes el Contratista hace entrega del paquete completo
Calificación: 100%

Componente Ambiental

La Interventoría informa que, el martes se revisando algunos formatos y se han encontrado que algunos están mal diligenciados, por lo tanto, en mayo se harán los ajustes necesarios, entre esos se encuentra el de cantidad de fresado, como las cantidades de abril ya están conciliados se va a verificar cuanto da de remanente.
Informe semanal 35: Aprobado
Informe mensual 7: Aprobado
Informe Mensual 8: Observado
Calificación: 100%

Componente Social

Informe semanal 35: Aprobado
Informe Mensual 8: En revisión
Calificación: 98% *(Se afectó la calificación porque no se entregó el volante informativo de inicio de actividades de espacio público de la P66)*

Se tienen siete (7) PQRSD abiertas, tres son referentes a procedimientos técnicos que se pueden evitar si el área técnica y social están en constante contacto con la comunidad. El Comité veedor está programado para el 30 de junio de 2023 y teniendo en cuenta que van a iniciar con el asfalto en la prioridad 81 y 82 el área social va a iniciar con el cierre de actas de vecindad, de actas de compromiso de suspensión de garajes, iniciar con remates para que la comunidad firme estas actas y se va a remitir a la alcaldía los predios que no hicieron la adecuación de las bajantes.

Tránsito y transporte

La Interventoría informa al contratista que es importante que tenga en cuenta que la etapa de PMT que se califica es la vigente, si no se realiza el cambio, afectara la calificación. Esto para evitar inconvenientes con la SDM.

Hay 4 prioridades a las cuales se le vence el permiso el 15/6/23 (81 82 60 61). Para la prioridad 60 y 61 ya se radicó la prorroga y de la 81 y 82 no se radicó porque es la que se va a terminar en 1 semana.

A la fecha, hay 19 CIVs con permiso vigente, 13 en proceso y 28 sin solicitud de ningún permiso.

Componente técnico

Desde el apoyo a la supervisión se solicita que, en atención al último balance donde se están excluyendo 2 segmentos viales, se radique a la interventoría las razones por las cuales están sobrando estos 2 segmentos viales, es decir, plasmar esas razones técnicas, presupuestales y demás en un oficio para la Interventoría, que la Interventoría revise y de su concepto y si está de acuerdo remitir al FDLK, dado que, se tiene que dejar el soporte al respecto. Se reitera al Contratista que, hasta que no se tenga un acta de exclusión firmada, todos los segmentos viales están incluidos dentro del contrato

Frentes de obra activos: 11 – 17 CIVs

CIVs inactivos: 5 (73, 81, 82, 66, 65)

Se iniciaron actividades en las prioridades 49 y 70

Calificación: 92%

Programación: A la fecha el contratista de obra continua con los atrasos en obra, como se evidencia en los avances para la semana No. 35 (1 al 7 de junio de 2023), presentados a continuación:

G2	CORTE AL 6 DE JUNIO DE 2023		
	GENERAL	OBRA	FINANCIERO
% PROGRAMADO	55,94%	57,10%	55,94%
% EJECUTADO	17,99%	17,69%	9,52%
% DESVIACIÓN	-37,95%	-39,41%	-46,42%

Varios

El FDLK y la interventoría recuerdan al contratista de obra que se citó a audiencia virtual con la alcaldesa el 9 de junio de 2023 a las 8 am. El contratista manifiesta que solicito por medio de un oficio aplazar dicha audiencia puesto que debe prepararse jurídicamente.

La Interventoría informa a todos los presentes que se realizara el comité integral No. 9 de seguimiento No. 36 el 15 de junio de 2023, en el cual deben acudir de manera presencial los residentes y especialistas, sin excepciones.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Inventario de redes secas	CVK22	14-jun-23
2	Solicitud de Reunión con la SDM – Vigencia de señalización	CVK22	Pendiente de confirmación
3	Radicación de cuenta del mes de abril	CVK22	13-jun-23
4	Radicación de cuenta del mes de abril G2 al FDLK	SCLV	15-jun-23

Elaborada por: Interventoría – Juan Manuel Alba Rojas
Fecha de la próxima reunión: 15 de junio de 2023 Lugar de la próxima reunión: NA

AGENDA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO

Contratista de Obra Consorcio Vías de Kennedy – COP -690-22 Grupo 2


COMITÉ DE SEGUIMIENTO No.35


Fecha: 8 de junio de 2023

ORDEN DEL DIA

1.Compromisos				
No	**Asunto**	**Responsable**	**Fecha de compromiso**	**Cumplió SI/NO**
1	Plan detallado de trabajo actualizado - PDT	Contratista	2-jun-23	NO
2	Formatos MEV del mes de abril	Contratista	5-jun-23	SI
3	Concepto sumidero de acuerdo a la solución propuesta por la EAB	Contratista	2-jun-23	SI
4	Inventario de redes secas	Contratista	7-jun-23	NO
5	Respuesta para las PQRSD de la prioridad 82	Contratista	6-jun-23	NO
6	Solicitud de Reunión con la SDM – Vigencia de señalización	Contratista	7-jun-23	NO
7	Cuenta No. 7 – Abril	Contratista	6-jun-23	NO
2. Componentes				
A. Técnico				
- **Informes semanales abril:** En revisión - **Informes semanales mayo:** Observados				
- **Informe Mensual 7:** En revisión - **Informe Mensual 8:** Sin radicar				
- **Calificación:** 9%				
B. SST				
- **Informe semanal 35:** Aprobado				
- **Informe Mensual 7:** Sin radicar				
- **Calificación:** 100%				
C. Ambiental				
- **Informe semanal 35:** Aprobado				
- **Informe Mensual 7:** Aprobado - **Informe Mensual 8:** Observado				

- **Calificación:** 100%
D. Gestión Social
- **Informe semanal 35 :** Aprobado
- **Informe Mensual 8:** En revisión
- **Calificación:** 98%
Varios
Obra

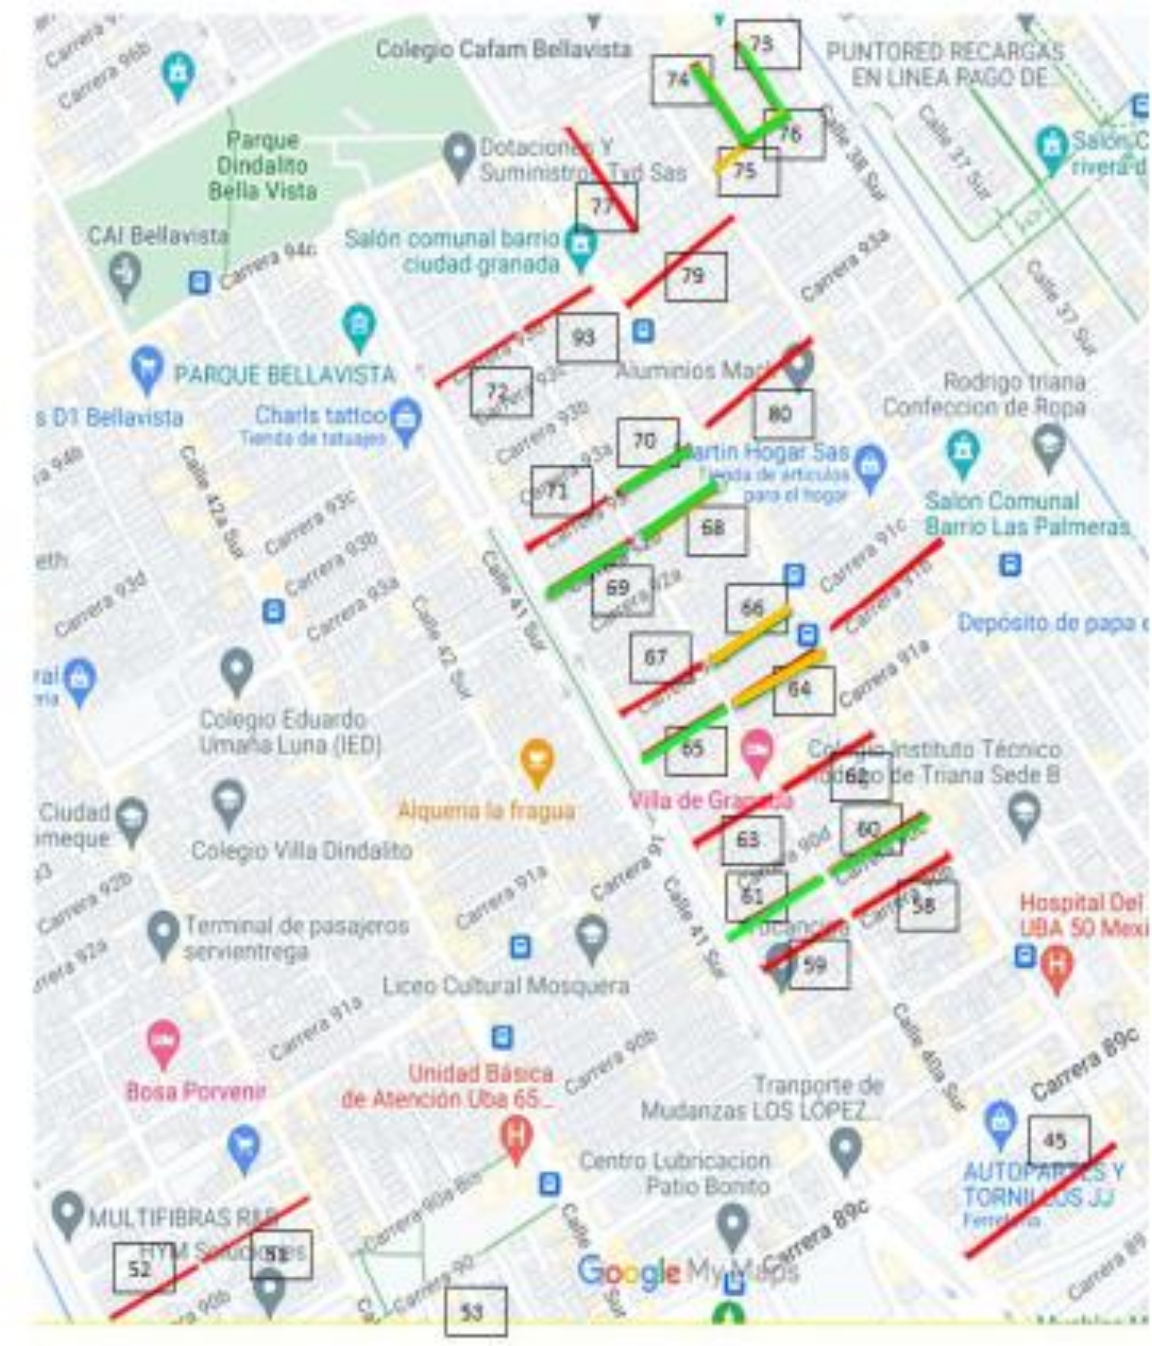

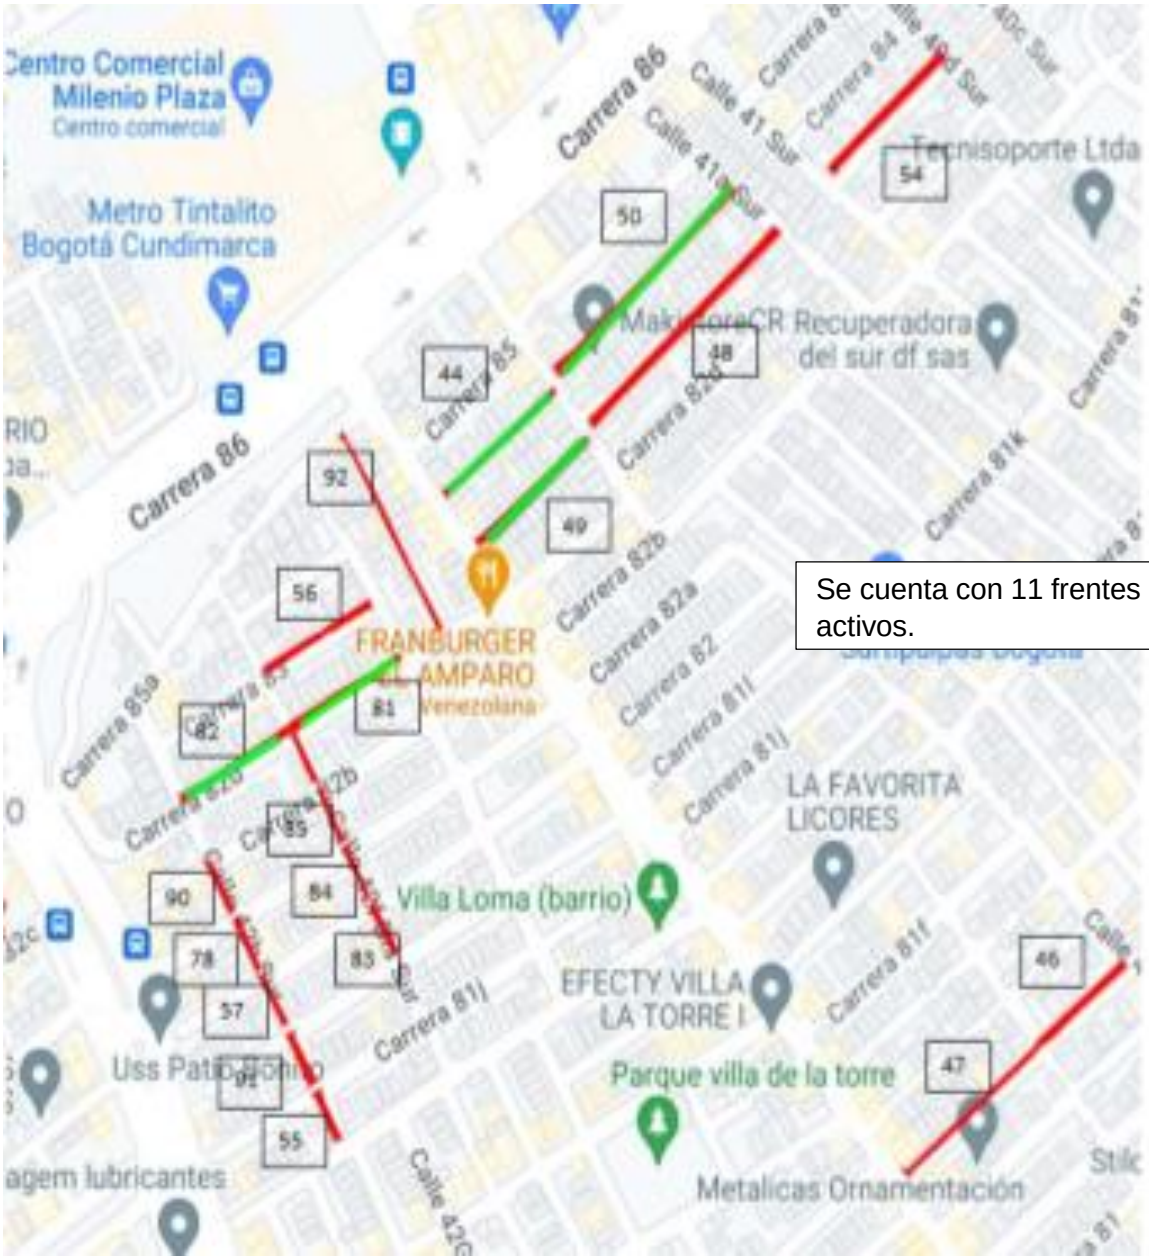

Se cuenta con 11 frentes de obra activos.

Nomenclatura	
	Frente de obra Activo
	Frente de obra Intermitente
	Frente de obra Inactivo
	Frente de obra sin inicio

ESTADO SEMANAL DE PROCESO CONSTRUCTIVO

CONTRATISTA DE OBRA GRUPO 2 -CVK22 COP 690-22

PK_ID CALZADA	PK_ID ANDEN	PK_ID ANDEN	44			50			60			61			64			65			66			68			69			70			49			73			74			75			76			81			82		
VIA	ORIENTAL	OCCIDENTAL	VIA (152907)	ORI (23937)	OCC (23938)	VIA (152906)	ORI (23935)	OCC (23936)	VIA (155776)	ORI (29122)	OCC (29123)	VIA(155777)	ORI (29124)	OCC (29125)	VIA (155852)	ORI (29274)	OCC (29275)	VIA (155853)	ORI (29276)	OCC (29277)	VIA (155860)	ORI (29290)	OCC (29291)	VIA (155875)	ORI(29320)	OCC (29321)	VIA(155917)	SUR(92062684)	NOR(92062817)	VIA(155878)	ORI(29326)	OCC (29327)	VIA(152905)	ORI(23933)	OCC (23934)	VIA(155917)	SUR(92062684)	NOR(92062817)	VIA(155918)	SUR(92062720)	NOR(92062828)	VIA(155893)	ORI(29356)	OCC(29357)	VIA(155892)	ORI(29354)	OCC(29355)	VIA(153026)	ORI(24149)	OCC(92062836)	VIA(153027)	ORI(24151)	OCC(24152)
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO Y CAJAS DE INSPECCION.	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO Y CAJAS DE INSPECCION.																																															
NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.																																														
REDES HIDRAULICAS	GEOTEXTIL	GEOTEXTIL																																														
GEOTEXTIL, GEOCELDA HDPE PERFORADA, RELLENO CON FRESADO SOBRE GEOCELDA	PRIMERA CAPA DE FRESADO	PRIMERA CAPA DE FRESADO																																														
PRIMERA CAPA FRESADO (RAP) ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 3% Y ADITIVO POTENCIALIZADOR (1.3 KG/M3 - SOLID SOIL).	SEGUNDA CAPA DE FRESADO	SEGUNDA CAPA DE FRESADO																																														
CANAL DE DRENAJE PREFABRICADO EN POLYCONCRETO MONOBLOCK.	CONSTRUCCION CAJAS DE INSPECCION, CAJILLAS DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION CAJAS DE INSPECCION, CAJILLAS DE AGUA POTABLE																																													
SEGUNDA CAPA FRESADO (RAP) ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 3% Y ADITIVO POTENCIALIZADOR (1.3 KG/M3 - SOLID SOIL).	BORDILLO PREFABRICADO A80	BORDILLO PREFABRICADO A80																																													
TERCER CAPA FRESADO (RAP) ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 3% Y ADITIVO POTENCIALIZADOR (1.3 KG/M3 - SOLID SOIL).	PISO EN CONCRETO GRIS MR41	PISO EN CONCRETO GRIS MR41																																													
MEZCLA ASFALTICA	CONCRETO DE 3000PSI	CONCRETO DE 3000 PSI																																													

TERMINADO	
EJECUCION	
INTERMITENTE	
SIN INICIAR	
NO APLICA	

Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la semana
81	8005000	**Calzada:** Sin actividad **Andén oriental:** Sin actividad **Andén occidental:** Sin actividad
82	8005078	**Calzada:** Sin actividad **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad
60	8002162	**Calzada:** Sin actividad **Andén oriental:** Se realizó excavación mecánica, instalación geotextil, instalación fresado segunda capa y la instalación de concreto 3000 para espacio público e instalación de bordillo A-80 **Andén occidental:** Se realizó la instalación de concreto 3000 y MR-41 para espacio público e instalación de bordillo A-80
61	8002265	**Calzada:** Sin actividad **Andén oriental:** Se realiza la instalación de monoblock V-20, instalación bordillo A-80 y excavación manual **Andén occidental:** Se realiza la instalación de monoblock V-20, instalación bordillo A-80 y excavación manual
64	8001931	**Calzada:** Sin actividad **Andén oriental:** Se realiza la demolición, excavación manual, instalación de geotextil e instalación de fresado. **Andén occidental:** Sin actividad
65	8002008	**Calzada:** Sin actividad **Andén oriental:** Se realizó la instalación de concreto MR-41**.** **Andén occidental:** Se realizó la instalación de concreto MR-41.
73	8001148	**Calzada:** Sin actividad **Andén norte:** Sin actividad **Andén sur:** Sin actividad
74	8001184	**Calzada:** Sin actividad **Andén norte:** Demolición y excavación. **Andén sur:** Sin actividad
75	8001223	**Calzada:** Sin actividad **Andén oriental:** Sin actividad **Andén occidental:** Sin actividad
76	8001183	**Calzada:** Sin actividad.

Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la semana
		Andén oriental: Sin actividad **Andén occidental:** Se realiza excavación y demolición
66	8001876	**Calzada:** Sin actividad **Andén oriental:** Sin actividad **Andén occidental:** Sin actividad
44	8004757	**Calzada:** Sin actividad **Andén oriental:** Se realiza la instalación de monoblock **Andén occidental:** Se realiza la instalación de monoblock
50	8004663	**Calzada:** Se realiza excavación e instalación de fresado estabilizado **Andén oriental:** Sin actividad **Andén occidental:** Sin actividad
68	8001715	**Calzada:** Excavación, demolición e instalación de geotextil, geo celda y fresando. **Andén oriental:** Sin actividad **Andén occidental:** Sin actividad
69	8001823	**Calzada:** Se realiza excavación e instalación de fresado estabilizado. **Andén oriental**: Sin actividad **Andén occidental:** Sin actividad
70	8001657	**Calzada:** inician CIV con excavación mecánica y demolición. **Andén oriental:** Sin actividad **Andén occidental:** Sin actividad**.**
49	8004816	**Calzada:** inician CIV con excavación mecánica y demolición**.** **Andén oriental:** Sin actividad **Andén occidental:** Sin actividad.

SEGUIMIENTO GRUPO 2 AL 23-MAYO-2023

P	CIV	VALOR CIV	PROG-ACUM	% PROG-ACUM	EJEC-ACUM	% EJEC-ACUM	% PESO EJEC	% ATRASO
81	8005000	$ 364 077 458.00	$ 493 706 016	2.83%	$ 337 999 863	1.94%	92.84%	-0.89%
82	8005078	$ 425 507 175.00	$ 479 749 662	2.75%	$ 385 231 684	2.21%	90.53%	-0.54%
60	8002162	$ 364 209 279.11	$ 514 640 546	2.95%	$ 317 017 580	1.82%	87.04%	-1.13%
61	8002265	$ 415 513 196.48	$ 460 559 675	2.64%	$ 351 893 550	2.02%	84.69%	-0.62%
65	8002008	$ 401 291 370.00	$ 432 646 968	2.48%	$ 317 042 937	1.82%	79.01%	-0.66%
64	8001931	$ 568 211 892.00	$ 443 114 233	2.54%	$ 288 145 196	1.65%	50.71%	-0.89%
73	8001148	$ 322 618 893.00	$ 338 441 580	1.94%	$ 238 440 809	1.37%	73.91%	-0.57%
76	8001183	$ 185 301 495.53	$ 233 768 926	1.34%	$ 129 360 775	0.74%	44.70%	-0.60%

SEGUIMIENTO GRUPO 2 AL 23-MAYO-2023

P	CIV	VALOR CIV	PROG-ACUM	% PROG-ACUM	EJEC-ACUM	% EJEC-ACUM	% PESO EJEC	% ATRASO
75	8001223	$ 177 019 790.30	$ 183 177 144	1.05%	$ 47 207 989	0.27%	26.67%	-0.78%
74	8001184	$ 377 246 202.99	$ 0	0.00%	$ 154 635 322	0.89%	44.54%	0.89%
70	8001657	$ 358 334 979.40	$ 394 266 995	2.26%	$ 6 003 028	0.03%	1.68%	-2.23%
66	8001876	$ 323 442 256.55	$ 430 902 424	2.47%	133546675.1	0.77%	42.00%	-1.70%
44	8004757	$ 566 710 811.39	$ 368 302 362	2.11%	$ 224 344 010	1.29%	39.59%	-0.83%
62	8002055	$ 497 195 104.00	$ 497 195 104	2.85%	$ 0	0.00%	0.00%	-2.85%
68	8001715	$ 413 456 981.00	$ 413 456 981	2.37%	$ 31 668 406	0.18%	7.66%	-2.19%
71	8001771	$ 361 200 702.00	$ 362 399 987	2.08%	$ 0	0.00%	0.00%	-2.08%
69	8001823	$ 338 002 169.00	$ 443 114 233	2.54%	$ 25 015 592	0.14%	7.40%	-2.40%
63	8002132	$ 301 442 109.00	$ 436 136 056	2.50%	$ 0	0.00%	0.00%	-2.50%
50	8004663	$ 769 715 226.00	$ 227 818 092	1.31%	$ 98 913 499	0.57%	12.85%	-0.74%
77	8001285	$ 564 387 925.00	$ 208 647 489	1.20%	$ 0	0.00%	0.00%	-1.20%
79	8001390	$ 628 921 781.00	$ 257 029 516	1.47%	$ 0	0.00%	0.00%	-1.47%
92	8004910	$ 456 355 147.00	$ 546 042 342	3.13%	$ 0	0.00%	0.00%	-3.13%
67	8001968	$ 386 404 676.00	$ 370 424 890	2.12%	$ 0	0.00%	0.00%	-2.12%
59	8002331	$ 359 760 050.00	$ 439 625 145	2.52%	$ 0	0.00%	0.00%	-2.52%
58	8002225	$ 369 965 304.00	$ 523 363 268	3.00%	$ 0	0.00%	0.00%	-3.00%
56	8004997	$ 377 715 860.00	$ 444 858 777	2.55%	$ 0	0.00%	0.00%	-2.55%
80	8001581	$ 585 151 796.00	$ 10 205 583	0.06%	$ 0	0.00%	0.00%	-0.06%
72	8001545	$ 348 837 940.00	$ 8 451 347	0.05%	$ 0	0.00%	0.00%	-0.05%
Total			**$ 9 962 045 341**	**57.10%**	**$ 3 086 466 914**	**17.69%**		-39.41%
Total Obra			**$15.648.180.732**					


FECHA EVALUACIÓN			18-may	23-may	30-may	6-jun
P	CIV	VALOR TOTAL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV
81	8005000	$ 493 706 016.00	90.00%	90.00%	92.84%	92.84%
82	8005078	$ 479 749 662.00	88.00%	88.00%	90.53%	90.53%
60	8002162	$ 514 640 546.00	78.00%	78.83%	81.83%	87.04%
61	8002265	$ 460 559 675.00	82.00%	82.00%	82.00%	84.69%
65	8002008	$ 432 646 968.00	70.00%	71.17%	75.87%	79.01%
64	8001931	$ 443 114 233.00	50.00%	50.23%	50.23%	50.71%
73	8001148	$ 338 441 580.00	71.00%	72.21%	73.91%	73.91%
76	8001183	$ 233 768 926.00	42.00%	42.00%	44.70%	69.81%
75	8001223	$ 183 177 144.00	25.00%	25.00%	25.24%	26.67%
74	8001184	$ 377 246 202.99	42.00%	44.54%	44.54%	44.54%
70	8001657	$ 394 266 995.00	0.00%	0.00%	0.00%	1.68%
66	8001876	$ 430 902 424.00	42.00%	42.00%	42.00%	42.00%


FECHA EVALUACIÓN			18-may	23-may	30-may	6-jun
P	CIV	VALOR TOTAL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV
44	8004757	$ 368 302 362.00	8.00%	8.93%	11.50%	39.59%
68	8001715	$ 497 195 104.00	0.00%	0.49%	7.38%	7.66%
50	8004663	$ 769 715 226.00	7.60%	7.60%	10.45%	12.85%
69	8001823	$ 338 002 169.00	0.00%	0.00%	2.18%	7.40%

FECHA EVALUACIÓN			6-jun
P	CIV	VALOR TOTAL CIV	% AVANCE DEL CIV
81	8005000	$ 364 077 458.00	0.00%
82	8005078	$ 425 507 175.00	0.00%
60	8002162	$ 364 209 279.11	5.21%
61	8002265	$ 415 513 196.48	2.69%
65	8002008	$ 401 291 370.00	3.13%
64	8001931	$ 568 211 892.00	0.48%
73	8001148	$ 322 618 893.00	0.00%
76	8001183	$ 185 301 495.53	25.11%
75	8001223	$ 177 019 790.30	1.43%
74	8001184	$ 377 246 202.99	0.00%
70	8001657	$ 358 334 979.40	1.68%
66	8001876	$ 323 442 256.55	0.00%
44	8004757	$ 566 710 811.39	28.08%
68	8001715	$ 353 976 016.00	0.28%
50	8004663	$ 792 856 990.45	2.40%
69	8001823	$ 338 002 169.00	5.22%

G2	CORTE AL 6 DE JUNIO DE 2023		
	GENERAL	OBRA	FINANCIERO
% PROGRAMADO	55.94%	57.10%	55.94%
% EJECUTADO	17.99%	17.69%	9.52%
% DESVIACIÓN	-37.95%	-39.41%	-46.42%

SEGUIMIENTO CURVA S - 690

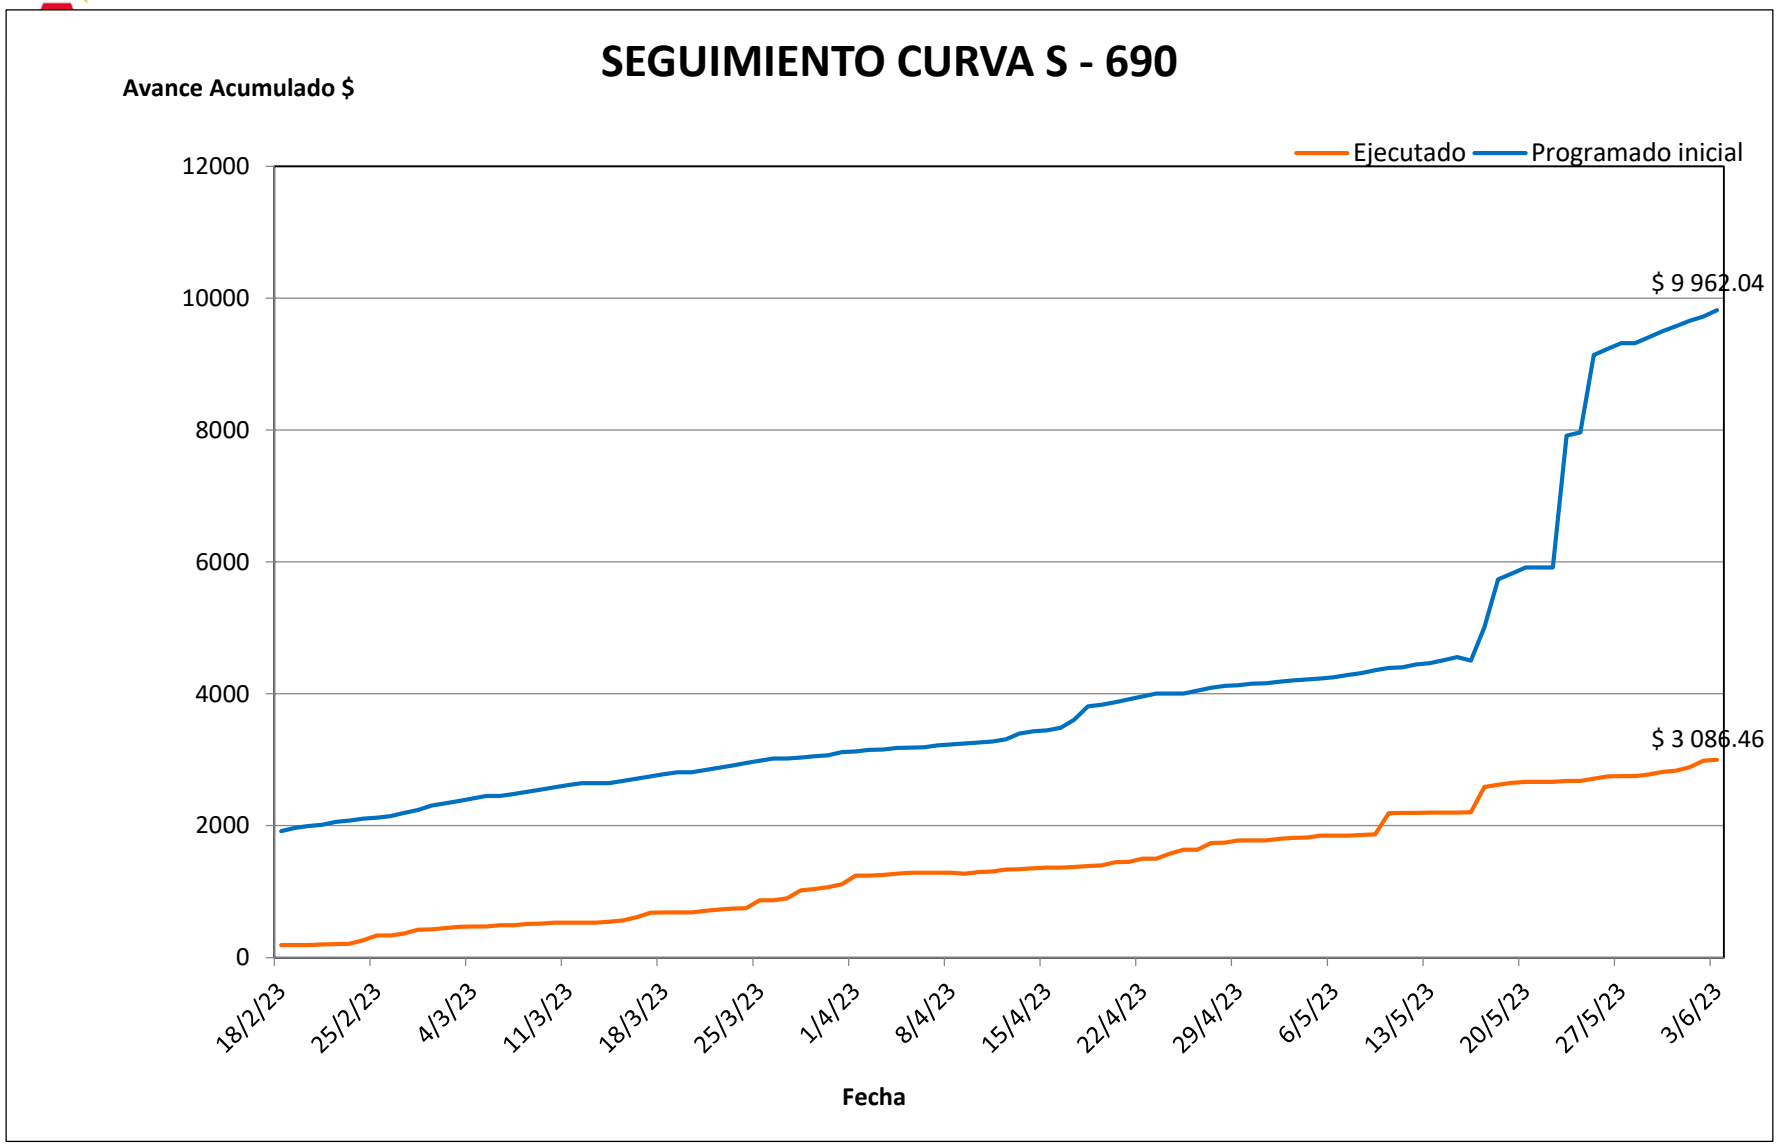

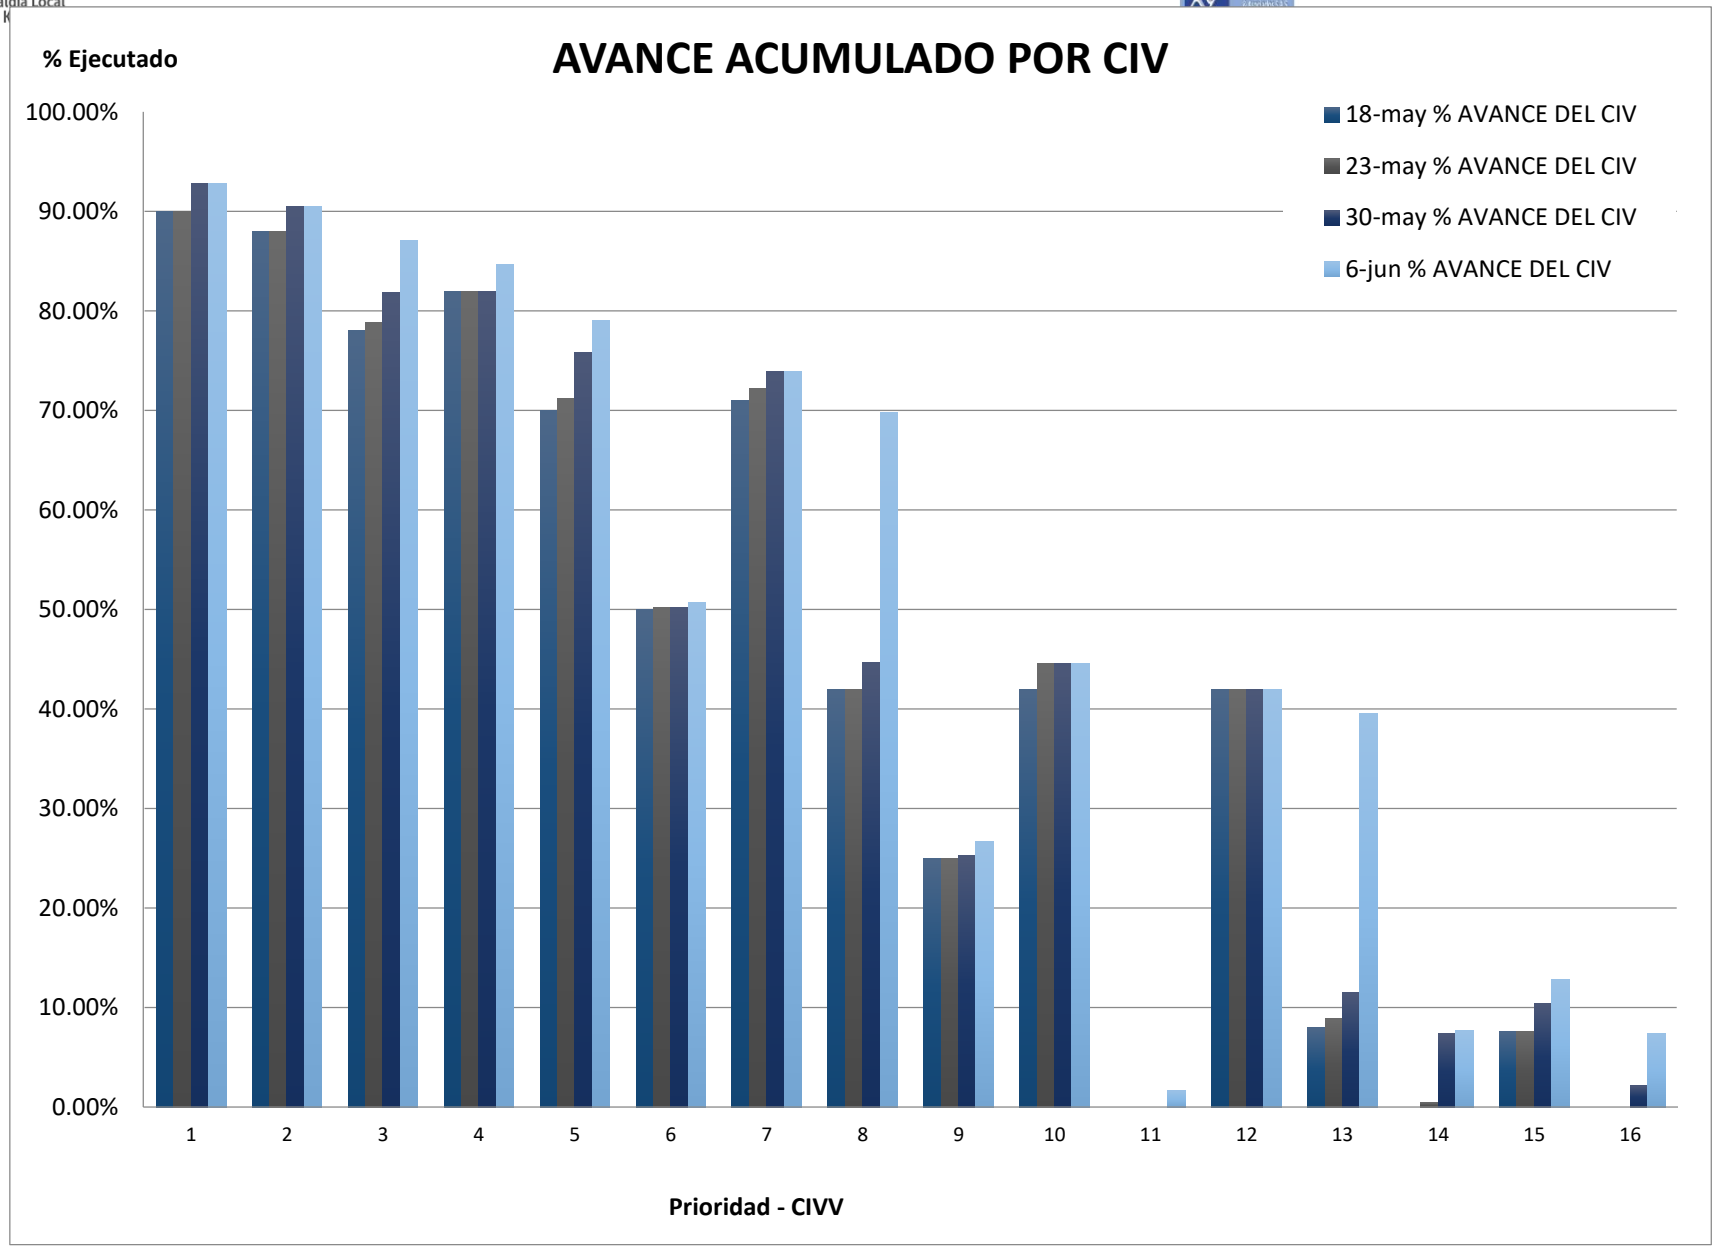
AVANCE ACUMULADO POR CIV
% Ejecutado
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
18-may % AVANCE DEL CIV
23-may % AVANCE DEL CIV
30-may % AVANCE DEL CIV
6-jun % AVANCE DEL CIV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Prioridad - CIVV
