BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo De Desarrollo Local de Kennedy

FECHA: 15 de junio - de 2023 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** ____ (62)

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comite integral No. 9 de seguimiento. No. 36.

HORA DE INICIO: 8:40 am **HORA DE FINALIZACIÓN:** ____

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
STEFAN GONZALEZ			X						X	CVK22	proyectospaiinversiones@	3106197888	
Andrés Mauricio Rojas Ll.			X						X	FDLK-Infraestructura	andresm.llanos@gobiernobogotá.gov.co	305 3034773	
Danilo Meneses Tolo			X						X	FDLK-Infraestructura	Danilo.meneses@gobiernobogotá.gov.co	3118988034	
Juan Manuel Alba R.			X						X	FDLK-Interventoría	gerenciavialidad.co	3107178422	
Oswaldo Ladino Chavez			X						X	FDLK-Interventoría	dirvial@silcarsa.com.co	3103178077	
Alba Yolanda Morales Arias			X							Interventoría-Cons SCLV	ayma1380@gmail.com	3114490479	
ARTURO ZARATE M			X						X	INTERVENTORIA	arturozarate@yahoo.com	3152368081	
ALIRIO CUESTA GARZÓN			X						X	CVK 22	aliriocuesta1@yahoo.com	3158432776	
Eliana C. SALAMANCA RODRIGUEZ			X						X	CVK22	ing.elianasalamanca@gmail.com	3002633307	
Gladys Sarita Molina Pita			X						X	CVK22	cvk22.director@gmail.com	3004938516	
Helbert Danilo Buitrago Ochoa			X						X	CVK22	cvk22.residente2@gmail.com	3104769300	

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo De Desarrollo Local de Kennedy

FECHA: 15 - Junio - 2023 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** (02)

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité Integral No. 9 de seguimiento No. 36.

HORA DE INICIO: 8: 40 am. **HORA DE FINALIZACIÓN:** ____

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Carlos David Navarro Barmudez			X						X	CVK22	cvk22.correspondencia@gmail	3138723913	
Adriana Casho Alba			X						X	CVK22	CVK22.ambientalegmail.com	3103791162	
Yaret Claro Penaranda			X							SCLV	Yaretclaro3@gmail.com	3147455585	
Luisa James Rodriguez.			X						X	SCLV	Socialgrupo2.fdlk@gmail.com	3214357623	
Martha Rodriguez H.			X						X	CVK22	socialcvk@gmail.com	3114883473	
Carlos Eduardo Bohorquez			X							CVK22	CVK22551@gmail.com	3143308880	
Sandra Patricia Gonzalez			X							Interventoria SCLV.	sstkennedy@outlook.com	3178935603	
Carlos Benavides M.			X							Interventoria SCLV	maquinariasclv@outlook.com	3132110586	
Katerine Samboni O			X							Interventoria SCLV	Ksamboni@Outlook.com	3188896515	

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo De Desarrollo Local de Kennedy

FECHA: 15 de junio de 2023 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** ____ (62)

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité integral No. 9 de seguimiento No. 86.

HORA DE INICIO: 8:40 am. **HORA DE FINALIZACIÓN:** ____

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Karen Julieth Perales Ramírez.			X							Interventoría SCLV	vr33sclvkennedy@outlook.com	314 3253124	
Alex Soudoyal Ruzón.			X							~~ESP~~ CONSORCIO VIAS K.	argalex.saudoval@gmail.com	3124780097.	
Alexander Parra Chacón			X							Interventoría SCLV	alexander_parra_ch@hotmail.com	3112395218	

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

El Fondo de Desarrollo Local de Kennedy (FDLK), dio inicio a la reunión a las 8:20 am, con la asistencia del Contratista de Obra CONSORCIO VÍAS DE KENNEDY 22 – GRUPO 2 y la Interventoría Consorcio SCLV.

Componente Ambiental

El Contratista informa que, no se cuenta con suficiente personal Boal dado que, en el presupuesto solo se permiten 2 Boal, lo cual ha afectado las actividades de orden y aseo

La Interventoría informa que:

- Una vez revisado el Informe mensual No. 8, se evidencia que, hay un saldo de 426 m³ de material fresado, es decir, no se tienen vales para justificar su uso.
- Hasta que no se cuente con los vales y los soportes, no se podrá aprobar el Informe mensual No. 8 de mayo. El Contratista debe justificar en el informe en que se usó. Se condicionará y las cantidades deben cerrar en el acta de mayo
- Bolsas de cemento: El Contratista menciona que, CEMEX tiene un stock de bolsas y no cuenta con espacio para seguir recibiendo, sin embargo, la Interventoría solicita que está información sea allegada por CEMEX de manera oficial y presentar una propuesta para solucionar el problema.

Informe semanal 36: Aprobado
Informe mensual 8: En revisión en mesa de trabajo
Calificación: 95% *(Se afectó la calificación porque el plafón no estaba instalado correctamente y ya se le había hecho la observación al Contratista y no atendió)*

Componente SST

Informe semanal 36: Aprobado
Informe mensual 8: En revisión en mesa de trabajo
Calificación: 95%

El Informe mensual No. 7 quedo aprobado, de igual manera, la Interventoría solicita al Contratista que no se presente nuevamente la situación de tener que hacer castas de compromiso para aprobar Informes, dado que, esto repercute en la facturación

Personal

- Ingresos: 5 (2 auxiliares de tráfico, 2 ayudantes y 1 cadenera)
- Personal retirado: 1
- Ausentismo de la semana No. 36: 1,45%

Maquinaria y equipo

La Interventoría informa que, en el contrato en la cláusula indica que, los vehículos que transportan la maquinaria deben tener una póliza civil daños a terceros extracontractual, por lo anterior, se solicita al Contratista confirmar si aplica para este contrato y como se procederá.

Espacio Público y Urbanismo

El Contratista informa que, en el recorrido realizado ayer, se recomendó que en lo posible se respeten los diseños iniciales y tener en cuenta que prevalece el interés general sobre el particular. Adicional indica que, en el Amparo se tiene un caso puntual donde el anden tiene un ancho de 1.20 m y hay un predio que tiene de diferencia de monoblock al predio de 35cm, antes el propietario tenia el acceso al parqueadero, la solución es dejar la rampa al 2% y que el propietario busque la manera de adecuar la entrada del garaje

La Interventoría solicita que se hagan recorridos cada 15 días con los especialistas de espacio público, para dar soluciones puntuales en obra.

Redes secas

El Contratista indica que,
No se cuenta con los planos de VANTI de cada CIV. Conforme se va avanzando se irán actualizando los planos
Se le han entregado dos tramos de VANTI y están pendiente del Inventario por temas de topografía, Se hablo con ETB para realizar una visita a campo por el caso puntual de una cámara en un segmento del Amparo, que si se llega a renivelar queda alta en la calle aledaña perpendicular a la que se está interviniendo.
La Interventoría recomienda realizar recorrido el con los especialistas de redes secas tanto del Contratista como de Interventoría,

Inventario de redes secas: El Contratista indica que se sigue adelantando, pero por el tema de topografía ha sido complicado. Si hay más cámaras ocultas solo se van encontrando conforme va avanzando la obra, por lo que se está haciendo el inventario de las que se tiene una seguridad de que existen.

Por su parte, la Interventoría indica que:

- El Contratista no cumplió con la fecha de entrega del Inventario de redes secas, sin embargo, por lo que ha informado el Contratista, este inventario está estancado, porque se han encontrado unas cajas que evidentemente se encuentran tapadas por los escombros y demás que ha colocado la comunidad, las cuales se han ido encontrando conforme ha ido avanzando a obra.
- Si se va a hacer ese inventario de redes secas debe ser tanto de la información que está en planos más lo que se esté encontrando, dentro de ese inventario debería estar también la información de los planos de gas natural por cada uno de los CIVs.
- Para iniciar obras en un CIV se deberían tener los planos detallados de gas natural de cada segmento, esto con el fin de que cuando vaya a pasar alguna maquina no se presenten afectaciones.
- Siempre se deben tener unos planos básicos para iniciar una intervención de cualquier segmento, por lo tanto, el Contratista debe solicitar a VANTI los planos detallados por CIV y sobre eso debe ir el inventario de redes secas subterráneas y aéreas.
- La Alcaldía hizo la entrega de los planos iniciales y en la etapa de preliminares el Contratista informó lo que había y lo que hacía falta, lo que hacía falta eran los planos de gas natural, se le dio viabilidad para iniciar construcción, pero con la nota que debían hacer la entrega de los planos de gas natural por CIV de acuerdo al cronograma de inicio de obra, pero no han sido remitidos a la Interventoría.

Por lo anterior, se programa mesa de trabajo de especialista de redes secas y directores en obra, para colocarse al día técnicamente para el martes 20 de junio de 2023 a las 8:00 am en obra.

Redes húmedas

El Contratista informa que, en mesa de trabajo realizada la semana pasada, el acueducto recomendó que todas las bajantes se le dejará 6" cuando se tiene monoblock PD100V o PD200V, sin embargo, se hizo la aclaración que, por el tamaño de esa caja de inspección, cuando es ese tipo de monoblock, la bajante de 6" no embona por el diámetro, por lo que se tiene pensado hacer una ampliación a la salida de la bajante de 4" porque es lo que el canal deja, inmediatamente salga del canal hacer una ampliación a buscar la tubería de 6". La Interventoría solicita al Contratista, hacer una adaptación de acuerdo con las recomendaciones de la EAAB para 6" para revisar como quedaría.

Por otra parte, la Interventoría solicita al Contratista remitir la propuesta del sumidero con su respectiva justificación económica, para poder revisar y dar aprobación. El Contratista se compromete a radicar el martes

Tránsito y transporte

La Interventoría informa que:

- Se sigue presentando robos de señales, pero se solicita remitir las acciones que se han tomado al respecto, que se haga la denuncia y un Informe de las acciones que se tomaron incluida la reposición
- El 8 de junio solicitaron la reunión con la SDM para el tema de señalización y se está a la espera de que la SDM responda y fije la fecha.
- De los 50 CIVs, hay 19 con PMT vigente: 10 para construcción de vía, 7 para espacio público y 2 para asfalto (P81-82)
- Hay 11 CIVs en proceso de solicitud de PMT
- Dentro de los 23 CIVs que quedan pendientes de permiso, hay 3 CIVs a los que la señalización vence el 30 de junio de 2023
- A la prioridad 81 y 82, hoy se les vence el permiso.

Pavimentos

El Contratista informa que, se está evaluando la posibilidad de cambiar la mezcla asfáltica MD-13 por MD-10 dado que actualmente el precio es menor pero las características son las mismas. La Interventoría solicita remitir la propuesta del cambio de mezcla asfáltica y la justificación económica, dando otro enfoque al cambio, que no sea por el precio, si van a cambiar la mezcla debe ser por algo técnico más no por precio.

Componente Social

Informe mensual 8: Aprobado
Informe semanal: Aprobado
Calificación: 100%

El Contratista informa que:

- Se tienen seis (6) PQRSD abiertas, dos (2) en la prioridad 65, donde se tiene problemas con el espacio público, fisuras en vidrios y polos a tierra las cuales no se han podido cerrar porque no se han encontrado a los ciudadanos para que firmen la queja.
- El viernes quedaron instaladas todas las vallas informativas en todos los frentes pero algunas fueron robadas.
- El comité FDLK se tiene programado para el 30 de junio de 2023 en las dos UPZ
- Se está haciendo el contacto con la SDA para las capacitaciones que se deben realizar en los colegios de la zona.
- Se tiene pensando adelantar la capacitación de mano de obra no calificada de julio para este mes, teniendo en cuenta todas las actividades sociales que se van a realizar en julio.
- Se ha realizado el seguimiento a las actas de compromiso que se han hecho hasta la fecha.
- Por solicitud de la Interventoría, se está haciendo el barrido de las canales que tienen que quedar adaptadas al espacio público para las adecuaciones de bajantes y remitir a la Alcaldía las que no han realizado la adecuación.

Por su parte, la Interventoría indica que:

- Se tiene una PQRSD por afectación de vidrio, la cual el Contratista iba a cerrar con acta de compromiso, pero por parte de la Interventoría no se aprobó, dado que, si depende del Contratista porque se afectó por la obra, por tanto el Contraista debe reponer el vidrio afectado y se cierra la PQRSD
- Hay 2 PQRSD por espacio público referente a portones, la rampa vehicular que se construyo está obstruyendo la apertura del portón, si bien, por normativa las puertas deben abrir hacia dentro, se verificó y se pudo evidenciar que en muchos frentes los portones abren hacia afuera y no presentan la afectación, son casos muy particulares que se podían prevenir si antes se hubiera hablado con el propietario. Frente a estos predios, hay otros 2 donde si se concilió con el propietari y se pudo ajustar la rampa, por eso es la inconformidad de los ciudadanos que interpusieron la queja. Se solicita al Contratista buscar una solución a este problema, por lo tanto, se programa recorrido de especialistas de espacio público para el martes.
- En el caso de la tienda, se habló con la señora y se va a hacer la solicitud para la demolición de la rampa para fundir el escalón.

Diseño Geométrico

La Interventoría indica que, los diseños ya pasaron la etapa de aprobación, pero el Contratista no ha terminado de entregar los insumos. De acuerdo con las actualizaciones que venían haciendo de la topografía establecieron unas cantidades definitivas de los 50 CIVs y se acordó correr las secciones transversales para poder establecer unas cantidades y que permitiera tener un cronograma y unas cantidades definitivas para esa cuantificación, pero, en la medida que se fueran haciendo los ajustes se entregaran formalmente todas las cantidades. Hace 15 días se solicitó al Contratista actualizar la información de acuerdo con la ultima estructura de pavimentos definitiva y a la fecha no se ha recibido de manera oficial, donde se pedía que se precisaran las cantidades para área de andenes y la vía.

Adicional, la Interventoría informa que con las cantidades ajustadas, se revisará el acta parcial de junio

Componente técnico
Frentes activos: 11 – 19 CIVs
Informes semanales abril: Aprobados
Informes semanales mayo: Observados
Acta parcial de abril: En revisión por parte de la Interventoría
Calificación: 89%

El Contratista indica que, se presentó inconveniente con el retiro de material fresado de patio IDU y UMV, lo cual retraso el lleno de material de todos los tramos, bien sea para espacio público o para vía.

Se tienen retrasos con la entrega de los elementos prefabricados (sumideros, placa fondo, placa cubierta para los pozos), por lo cual, no ha hecho entrega de la prioridad 81 y 82

En cuánto a las tapas cajas de inspección del monoblock, el día de ayer, ACO realizó visita y proponen una platina que va anclada con un tornillo que impide que la levanten e informó que las tapas en polyconcreto no las tienen, se quedo con ACO suministrar las rejillas de tramo 81 y 82 con el sistema de seguridad, se van a instalar y evaluar si duran o no duran, sin embargo, el FDLK no ve viable está solución por lo que recomienda al Contratista averiguar con REFORPLACE.

El FDLK solicita se remita el Balance del contrato para determinar el alcance del misno, esté debe incluir la justificación del porque el presupuesto no está alcanzando. Adicionalmente, solicita que para el próximo comité se tenga definido el tipo de bolardo que se va implementar en cada segmento.

No	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Recorrido con especialista de espacio público y redes secas	CVK22 SCLV	20-jun-23
2	Justificación de volumen de fresado no reportado en informes mensuales AM	CVK22	21-jun-23
3	Carta de CEMEX donde manifieste que no se cuenta con espacio en bodega para recibo de bolsas de cemento.	CVK22	21-jun-23
4	Póliza extracontractual maquinaria y equipo (daños a terceros). Investigar si aplica para el contrato	CVK22	21-jun-23
5	Justificación económica de cambio de sumidero	CVK22	20-jun-23
6	Propuesta urbanística y presupuestal del cambio de bolardo M63	CVK22	21-jun-23
7	Propuesta técnica y presupuestal del cambio de mezcla asfáltica MD13 a MD10	CVK22	21-jun-23
8	Tapas de cajas de inspección monoblock	CVK22	21-jun-23
9	Cantidades actualizadas respecto a los diseños de pavimento y espacio público aprobados.	CVK22	21-jun-23
6	Inventario de redes secas	CVK22	21-jun-23
7	Balance y justificación del total de CIV que van a intervenir.	CVK22	29-jun-23
9	Cuenta 7 – Abril FDLK	CVK22	15-jun-23
10	Plan detallado de trabajo – PDT ajustado	CVK22	21-jun-23

Elaborada por: Interventoría – Juan Manuel Alba Rojas
Fecha de la próxima reunión: 22 de junio de 2023 Lugar de la próxima reunión: N/A

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

AGENDA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO

Contratista de Obra Consorcio Vías de Kennedy – COP -690-22 Grupo 2

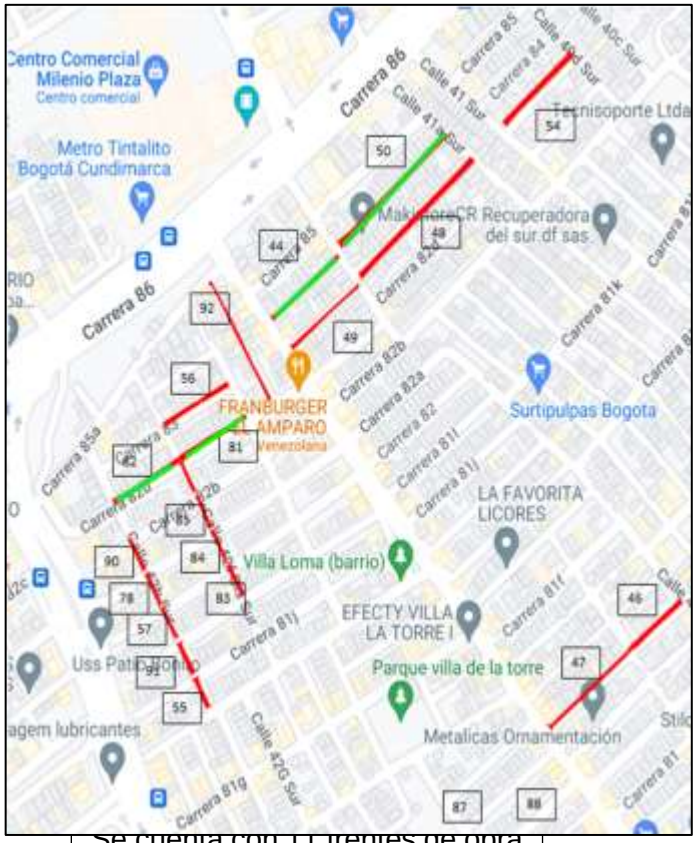
COMITÉ DE SEGUIMIENTO No.36 INTEGRAL No. 9

Fecha: 15 de junio de 2023

ORDEN DEL DIA

1.Compromisos				
No	**Asunto**	**Responsable**	**Fecha de compromiso**	**Cumplió SI/NO**
1	Inventario de redes secas	Contratista	14-jun-23	NO
2	Solicitud de Reunión con la SDM – Vigencia de señalización	Contratista	Pendiente confirmación	
3	Cuenta No. 7 – Abril (Completo)	Contratista	13-jun-23	NO
4	Radicación cuenta de abril G2 al FDLK	Interventoría	15-jun-23	
2. Componentes				
A. Técnico				
- **Informes semanales mayo:** Observados				
- **Informe Mensual 7:** Aprobado - **Informe Mensual 8:** Sin radicar				
- **Calificación:** 89%				
B. SST				
- **Informe semanal 36:** Aprobado				
- **Informe Mensual 7:** Sin radicar				
- **Informe Mensual 8**: Sin radicar				
- **Calificación:** 95%				
C. Ambiental				
- **Informe semanal 36:** Aprobado				
- **Informe Mensual 8:** Observado				
- **Calificación:** 95%				
D. Gestión Social				
- **Informe semanal 36:** Aprobado				
- **Informe Mensual 8:** Aprobado				
- **Calificación:** 100%				
Varios				
Obra				



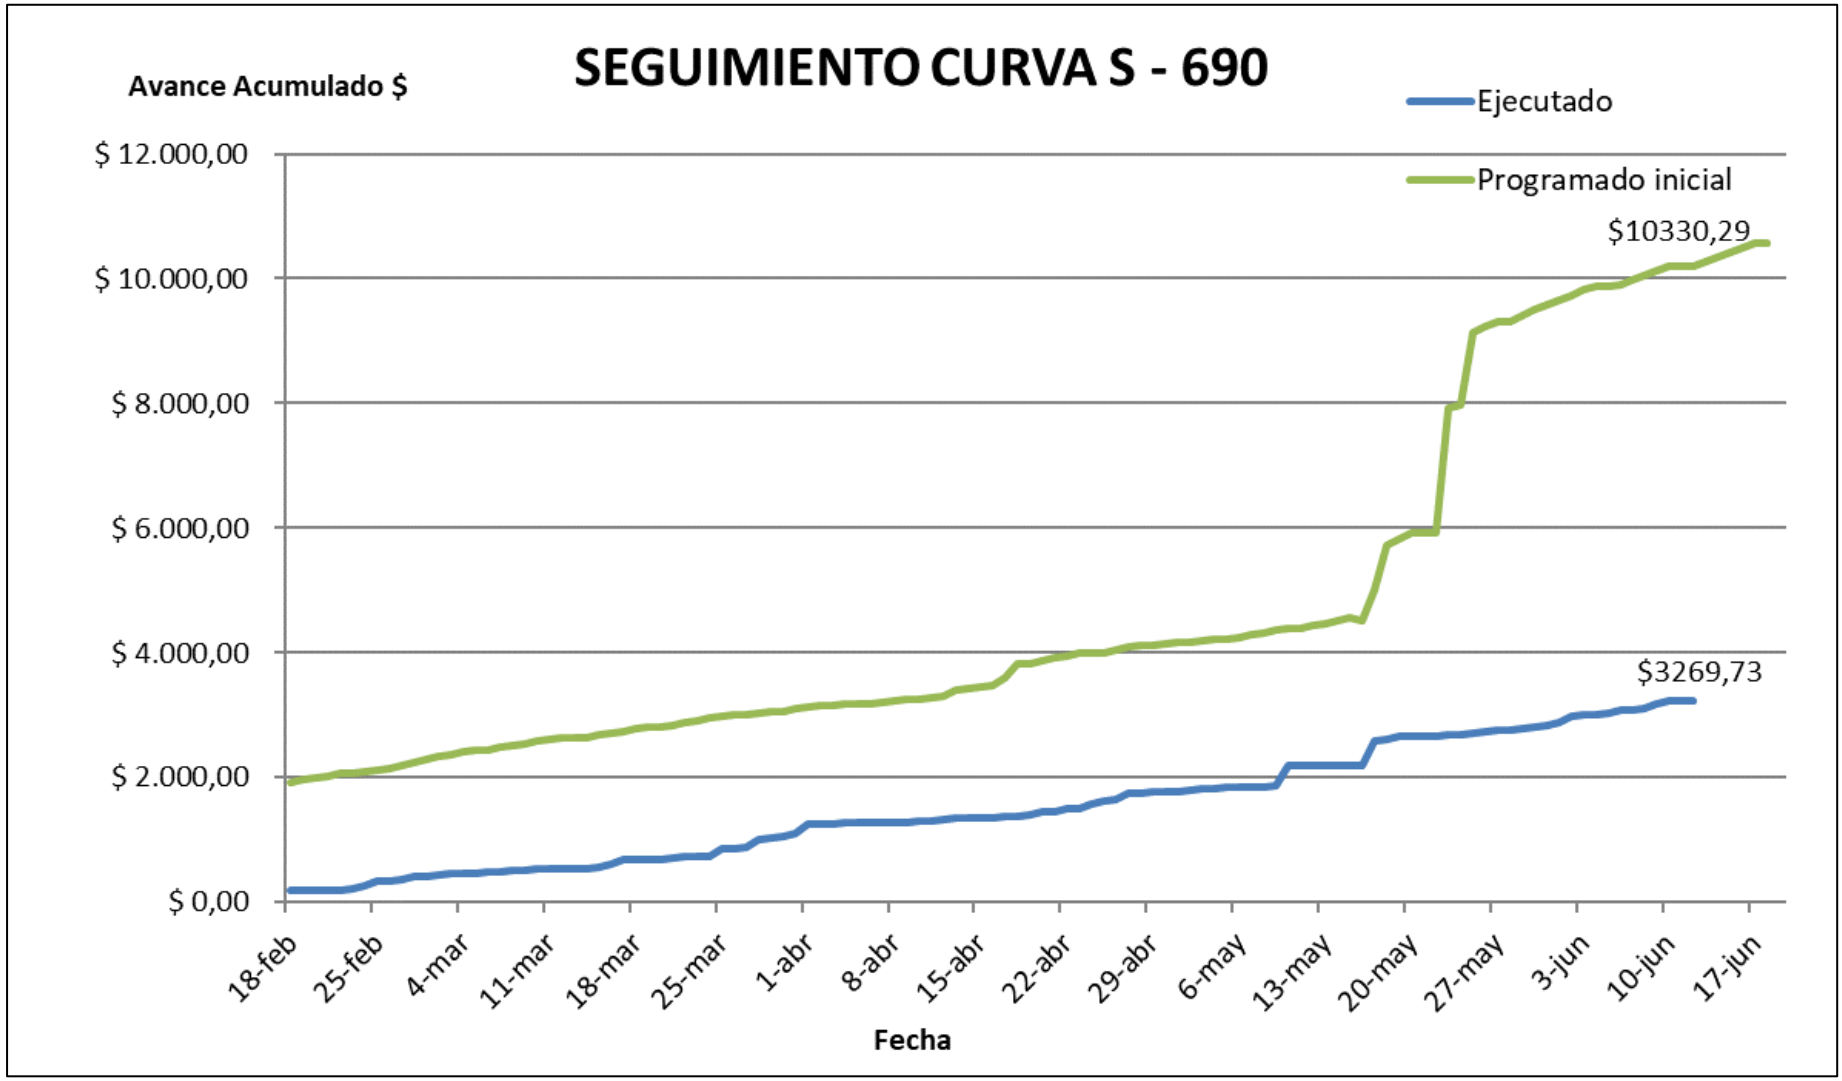


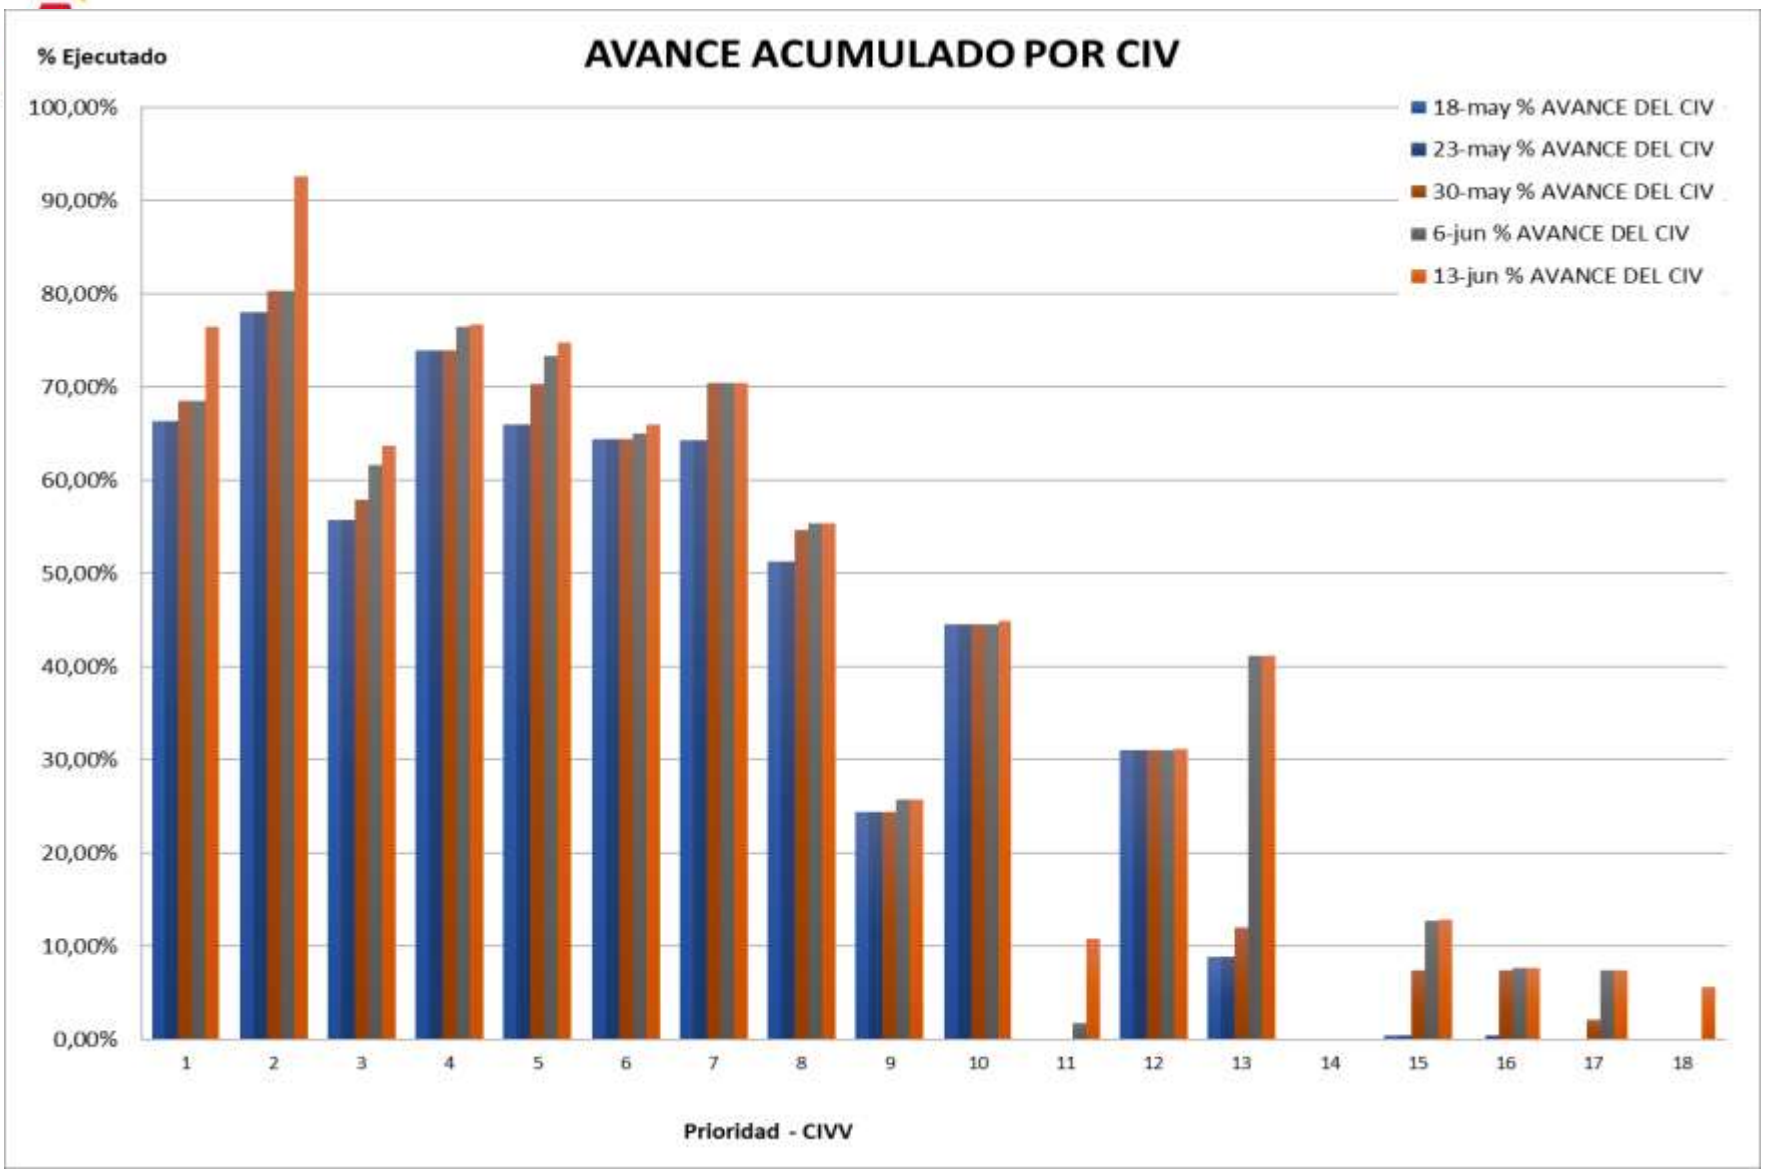
Se cuenta con 11 frentes de obra activos.

Nomenclatura
Frente de obra Activo
Frente de obra Intermitente
Frente de obra Inactivo
Frente de obra sin inicio

Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la semana
81	8005000	**Calzada:** Instalación de asfalto MD-19
82	8005078	**Calzada:** Instalación de asfalto MD-19
60	8002162	Conformación de espacio público e instalación de concreto de 3000 psi y conformación de pozo
61	8002265	Conformación de espacio público
64	8001931	Conformación de espacio público con demolición de concreto, excavación manual y construcción de cajas de inspección.
65	8002008	Instalación de concreto de 3000 psi.
73	8001148	**Calzada:** Sin actividad **Andén norte:** Sin actividad **Andén sur:** Sin actividad
74	8001184	Conformación de espacio público con demolición de concreto y excavación manual.
75	8001223	**Calzada:** Sin actividad **Andén oriental:** Sin actividad **Andén occidental:** Sin actividad
76	8001183	Conformación de espacio público con demolición de concreto y excavación manual.
66	8001876	Conformación de espacio público con demolición de concreto y excavación manual.
44	8004757	Instalación de segunda capa de fresado estabilizado
50	8004663	Instalación de primera capa de fresado estabilizado
68	8001715	Conformación de vía con Geocelda, geotextil y fresado estabilizado
69	8001823	Instalación de monoblock
70	8001657	Excavación mecánica en vía.
49	8004816	Excavación mecánica en vía.
71	8001771	Excavación mecánica en vía.

G2	CORTE AL 13 DE JUNIO DE 2023		
	GENERAL	OBRA	FINANCIERO
% PROGRAMADO	57.95%	59.21%	57.95%
% EJECUTADO	19.16%	18.86%	9.52%
% DESVIACIÓN	-38.79%	-40.35%	-48.43%


SEGUIMIENTO CURVA S - 690
Avance Acumulado $
Ejecutado
Programado inicial
$10330,29
$3269,73
$ 12.000,00
$ 10.000,00
$ 8.000,00
$ 6.000,00
$ 4.000,00
$ 2.000,00
$ 0,00
18-feb
25-feb
4-mar
11-mar
18-mar
25-mar
1-abr
8-abr
15-abr
22-abr
29-abr
6-may
13-may
20-may
27-may
3-jun
10-jun
17-jun
Fecha


AVANCE ACUMULADO POR CIV
% Ejecutado
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
18-may % AVANCE DEL CIV
23-may % AVANCE DEL CIV
30-may % AVANCE DEL CIV
6-jun % AVANCE DEL CIV
13-jun % AVANCE DEL CIV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Prioridad - CIVV

Alcaldía Local de Kennedy

LA VIALIDAD

SEGUIMIENTO GRUPO 2 AL 23-MAYO-2023

P	CIV	VALOR CIV	PROG-ACUM	% PROG-ACUM	EJEC-ACUM	% EJEC-ACUM	% PESO EJEC PROG	% ATRASO
81	8005000	$ 406.555.372,82	$ 493.706.016	2,83%	$ 381.742.134	2,19%	93,90%	-0,64%
82	8005078	$ 470.753.002,23	$ 479.749.662	2,75%	$ 444.106.606	2,55%	94,34%	-0,20%
60	8002162	$ 369.442.918,45	$ 514.640.546	2,95%	$ 329.859.749	1,89%	89,29%	-1,06%
61	8002265	$ 417.794.541,45	$ 460.559.675	2,64%	$ 354.063.171	2,03%	84,75%	-0,61%
65	8002008	$ 372.143.241,85	$ 432.646.968	2,48%	$ 323.602.819	1,85%	86,96%	-0,63%
64	8001931	$ 568.211.892,00	$ 443.114.233	2,54%	$ 292.531.603	1,68%	51,48%	-0,86%
73	8001148	$ 322.618.893,00	$ 338.441.580	1,94%	$ 238.440.809	1,37%	73,91%	-0,57%
76	8001183	$ 185.301.495,53	$ 233.768.926	1,34%	$ 129.360.775	0,74%	69,81%	-0,60%
75	8001223	$ 177.019.790,30	$ 183.177.144	1,05%	$ 47.207.989	0,27%	26,67%	-0,78%
74	8001184	$ 377.246.202,99	$ 0	0,00%	$ 156.735.874	0,90%	41,55%	0,90%
70	8001657	$ 358.334.979,40	$ 394.266.995	2,26%	$ 33.593.787	0,19%	9,37%	-2,07%
66	8001876	$ 323.442.256,55	$ 430.902.424	2,47%	136593319,1	0,78%	42,23%	-1,69%
44	8004757	$ 566.710.811,39	$ 403.047.868	2,31%	$ 224.344.010	1,29%	39,59%	-1,02%
62	8002055	$ 497.195.104,00	$ 497.195.104	2,85%	$ 0	0,00%	0,00%	-2,85%
68	8001715	$ 413.456.981,00	$ 413.456.981	2,37%	$ 31.668.406	0,18%	7,66%	-2,19%
71	8001771	$ 361.200.702,00	$ 410.084.196	2,35%	$ 9.416.829	0,05%	2,61%	-2,30%
69	8001823	$ 338.002.169,00	$ 443.114.233	2,54%	$ 25.015.592	0,14%	7,40%	-2,40%
63	8002132	$ 301.442.109,00	$ 436.136.056	2,50%	$ 0	0,00%	0,00%	-2,50%
50	8004663	$ 769.715.226,00	$ 277.343.764	1,59%	$ 110.329.745	0,63%	14,33%	-0,96%
77	8001285	$ 564.387.925,00	$ 266.605.125	1,53%	$ 0	0,00%	0,00%	-1,53%
79	8001390	$ 628.921.781,00	$ 306.458.269	1,76%	$ 0	0,00%	0,00%	-1,76%
92	8004910	$ 456.355.147,00	$ 546.042.342	3,13%	$ 0	0,00%	0,00%	-3,13%
67	8001968	$ 386.404.676,00	$ 406.042.668	2,33%	$ 0	0,00%	0,00%	-2,33%
59	8002331	$ 359.760.050,00	$ 439.625.145	2,52%	$ 0	0,00%	0,00%	-2,52%
58	8002225	$ 369.965.304,00	$ 523.363.268	3,00%	$ 0	0,00%	0,00%	-3,00%
56	8004997	$ 377.715.860,00	$ 444.858.777	2,55%	$ 0	0,00%	0,00%	-2,55%
80	8001581	$ 585.151.796,00	$ 61.233.502	0,35%	$ 0	0,00%	0,00%	-0,35%
72	8001545	$ 348.837.940,00	$ 50.708.085	0,29%	$ 0	0,00%	0,00%	-0,29%
49	8004816	$ 392.522.451,00	$ 0	0,00%	$ 22.039.807	0,13%	5,61%	0,13%
		Total	**$ 10.330.289.552**	**59,21%**	**$ 3.290.653.023**	**18,86%**		-40,35%
		Total Obra	**$ 17.445.442.250**					

FECHA EVALUACIÓN			18-may	23-may	30-may	6-jun	13-jun
P	CIV	VALOR TOTAL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV
81	8005000	$ 493.706.016,00	66,37%	66,37%	68,46%	68,46%	76,51%
82	8005078	$ 425.507.175,00	78,05%	78,05%	80,30%	80,30%	92,57%
60	8002162	$ 364.209.277,00	55,79%	55,79%	57,91%	61,60%	63,71%

FECHA EVALUACIÓN			18-may	23-may	30-may	6-jun	13-jun
P	CIV	VALOR TOTAL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV
61	8002265	$ 415.513.194,00	73,98%	73,98%	73,98%	76,41%	76,66%
65	8002008	$ 401.291.370,00	66,01%	66,01%	70,38%	73,28%	74,80%
64	8001931	$ 568.211.892,00	64,41%	64,41%	64,41%	65,03%	66,02%
73	8001148	$ 322.618.893,00	64,29%	64,29%	70,45%	70,45%	70,45%
76	8001183	$ 185.301.497,00	51,30%	51,30%	54,70%	55,34%	55,34%
75	8001223	$ 177.019.809,00	24,39%	24,39%	24,39%	25,77%	25,77%
74	8001184	$ 377.246.206,00	44,54%	44,54%	44,54%	44,54%	44,86%
70	8001657	$ 358.334.979,40	0,00%	0,00%	0,00%	1,79%	10,86%
66	8001876	$ 323.442.256,00	30,99%	30,99%	30,99%	30,99%	31,11%
44	8004757	$ 566.710.811,39	8,93%	8,93%	11,97%	41,20%	41,20%
62	8002055	$ 453.800.624,89	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
50	8004663	$ 769.715.226,00	0,42%	0,42%	7,38%	12,72%	12,85%
68	8001715	$ 353.976.016,00	0,00%	0,42%	7,38%	7,66%	7,66%
69	8001823	$ 338.002.169,00	0,00%	0,00%	2,18%	7,40%	7,40%
49	8004816	$ 392.522.451,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,61%

FECHA EVALUACIÓN			13-jun
P	CIV	VALOR TOTAL CIV	% AVANCE DEL CIV
81	8005000	$ 493.706.016,00	12,00%
82	8005078	$ 425.507.175,00	10,14%
60	8002162	$ 364.209.277,00	9,09%
61	8002265	$ 415.513.194,00	0,90%
65	8002008	$ 401.291.370,00	4,05%
64	8001931	$ 568.211.892,00	19,54%
73	8001148	$ 322.618.893,00	4,70%
76	8001183	$ 185.301.497,00	0,00%
75	8001223	$ 177.019.809,00	17,01%
74	8001184	$ 377.246.206,00	9,57%
70	8001657	$ 358.334.979,40	6,60%
66	8001876	$ 323.442.256,00	1,62%
44	8004757	$ 566.710.811,39	2,26%
62	8002055	$ 453.800.624,89	0,00%
68	8001715	$ 769.715.226,00	0,33%
71	8001771	$ 353.976.016,00	1,60%
69	8001823	$ 338.002.169,00	0,29%
63	8002132	$ 392.522.451,00	0,00%
50	8004663	$ 769.715.226,00	0,15%
49	8004816	$ 392.522.451,00	0,60%

ESTADO SEMANAL DE PROCESO CONSTRUCTIVO

CONTRATISTA DE OBRA GRUPO 2 -CVK22 COP 690-22

PK_ID CALZADA	PK_ID ANDEN	PK_ID ANDEN	44			50			60			61			64			65			66			68			69			71			70			49			73			74			75			76			81			82		
VIA	ORIENTAL	OCCIDENTAL	VIA (152907)	ORI (23937)	OCC (23938)	VIA (152906)	ORI (23935)	OCC (23936)	VIA (155776)	ORI (29122)	OCC (29123)	VIA(155777)	ORI (29124)	OCC (29125)	VIA (155852)	ORI (29274)	OCC (29275)	VIA (155853)	ORI (29276)	OCC (29277)	VIA (155860)	ORI (29290)	OCC (29291)	VIA (155875)	ORI(29320)	OCC (29321)	VIA(155917)	SUR(92062684)	NOR(92062817)	VIA(155878)	ORI(155878)	OCC (155878)	VIA(155878)	ORI(29326)	OCC (29327)	VIA(152905)	ORI(23933)	OCC (23934)	VIA(155917)	SUR(92062684)	NOR(92062817)	VIA(155918)	SUR(92062720)	NOR(92062828)	VIA(155893)	ORI(29356)	OCC(29357)	VIA(155892)	ORI(29354)	OCC(29355)	VIA(153026)	ORI(24149)	OCC(92062836)	VIA(153027)	ORI(24151)	OCC(24152)
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO Y CAJAS DE INSPECCION.	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO Y CAJAS DE INSPECCION.																																																	
NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.																																																	
REDES HIDRAULICAS	GEOTEXTIL	GEOTEXTIL																																																	
GEOTEXTIL, GEOCELDA HDPE PERFORADA, RELLENO CON FRESADO SOBRE GEOCELDA	PRIMERA CAPA DE FRESADO	PRIMERA CAPA DE FRESADO																																																
PRIMERA CAPA FRESADO (RAP) ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 3% Y ADITIVO POTENCIALIZADOR (1.3 KG/M3 - SOLID SOIL).	SEGUNDA CAPA DE FRESADO	SEGUNDA CAPA DE FRESADO																																																
CANAL DE DRENAJE PREFABRICADO EN POLYCONCRETO MONOBLOCK.	CONSTRUCCION CAJAS DE INSPECCION, CAJILLAS DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION CAJAS DE INSPECCION, CAJILLAS DE AGUA POTABLE																																																
SEGUNDA CAPA FRESADO (RAP) ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 3% Y ADITIVO POTENCIALIZADOR (1.3 KG/M3 - SOLID SOIL).	BORDILLO PREFABRICADO A80	BORDILLO PREFABRICADO A80																																																
TERCER CAPA FRESADO (RAP) ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 3% Y ADITIVO POTENCIALIZADOR (1.3 KG/M3 - SOLID SOIL).	PISO EN CONCRETO GRIS MR41	PISO EN CONCRETO GRIS MR41																																																
MEZCLA ASFALTICA	CONCRETO DE 3000PSI	CONCRETO DE 3000 PSI																																															

TERMINADO	
EJECUCION	
INTERMITENTE	
SIN INICIAR	
NO APLICA	
