BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo De Desarrollo Local de Kennedy

FECHA: 29- JUN-23 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** FDLK - 62.

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de seguimiento No. 38.

HORA DE INICIO: ____ **HORA DE FINALIZACIÓN:** ____

ASISTENTES:

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Juan Mestrago Rojo			X						X	Interventoría	uzzsclvkennedy@outlook.es	300213306	
Laura Daniela Diaz			X							Interventoria	dlaura0898@gmail.com	3168270141	
Steven Beltran G			X							Contratista	Residente.cuk22@gmail.com	3123181328	Steven B
Héctor Maldonado Barrios			X							Contratista CUK22	gerencia@aiegroup.co	3107490030	
Gladys Sarita Molina Pino			X							Consorcio VK22 - Contratista	CUK22.director@gmail.com	3004938576	
Juan Manuel Alba R			X							Interventoria	gerencia@claridad.co	3107671892	
ARTURO ZARATE			X						X	INTERVENTORIA	ARTURO ZARATE @yahoo.com	3152268037	
Danilo Meneses Toro			X						X	INFRAESTRUCTURA-FDLK	Danilo.meneses@gobiernobogota.gov.co	3118988034	

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	**EVIDENCIA DE REUNIÓN**

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

El Fondo de Desarrollo Local de Kennedy (FDLK), dio inicio a la reunión a las 4:00 pm, con la asistencia del Contratista de Obra CONSORCIO VÍAS DE KENNEDY 22 – GRUPO 2 y la Interventoría Consorcio SCLV.

Programación

La Interventoría manifiesta que no se ve un avance en obra y el Contratista presenta un atraso de 46,86%, por lo que se le solicita incrementar personal y evitar seguir aumentando el atraso.

El Contratista indica que se ha hecho todo el esfuerzo en avanzar en obra, se ha aumentado el rendimiento de la apertura de los frentes de obra y la acometida de las cajas para no seguir aumentando el atraso. Adicionalmente, informa que, con los nuevos frentes que tienen abiertos, se espera que a final de julio se puedan pavimentar. Tienen 21 CIVs abiertos, de los cuales han pavimentado 5, a final de junio se tendría el 50% de los CIVs abiertos pavimentados.
El Contratista propone realizar una reunión para revisar el presupuesto y revisar los nuevos precios no previstos.

Tránsito y Transporte

La Interventoría informa que,

- PMTs aprobados para calzada: 14
- PMTs aprobados para espacio público: 10
- Para la próxima semana, si no hay observaciones de la SDM, se tendrían:
  PMTs aprobados para calzada: 11
  PMTs aprobados para espacio público: 4
  PMTs aprobados para asfalto: 11. (De los 11 se tendrían 5 que ya tienen asfalto)
- Se radicó a la SDM la prórroga por 1 año de los diseños de señalización.

El Contratista informa que, en la UPZ del Amparo se tienen la mayoría de las actas de vecindad, pero hay unos segmentos que aún no se saben si se van a intervenir (P54-87). Por lo anterior el FDLK solicita al Contratista nuevamente el ejercicio de hacer el balance del contrato con los nuevos NPs que están pasando, dado que, es un insumo básico para definir que CIVs se van a excluir y tratarlo con la alcaldesa.

Facturación

El Contratista informa que, el lunes 26 de junio de 2023, se radicó a la Interventoría la preacta correspondiente a mayo, la cual se encuentra en revisión. En cuanto a Informes mensuales, cuentan con aprobación del componente social. Los Informes de los componentes ambiental, SST y Técnico se encuentran en revisión en mesas de trabajo.

Redes secas

El Contratista informa que, para la caja de ETB, se habló con el Ingeniero Benjamín delegado de la ETB, para realizar visita el jueves 6 de julio de 2023 a las 8:30 am en el Amparo e informa el tratamiento que se le debe dar a la misma.

Componente técnico

Frentes de obra abiertos: 12 (20 CIVs)
Frentes de obra activos: 10
Frentes de obra inactivos: 2

El Contratista informa que:

- No se han instalado las tapas metálicas del monoblock en las prioridades 81 y 82
- Se han instalado sumideros y se está a la espera de la aprobación del NP. Por lo anterior, la Interventoría informa que, se está realizando la trazabilidad, dado que la aprobación de este NP debe ir acompañada con todos los antecedentes. En abril se realizó reunión con la EAAB, donde se avaló que al sumidero propuesto se le realizara un hueco al marco, se colocara sobre 4 ladrillos y se colocaran 4 vigas, luego, 3 meses después, el Contratista presenta otra propuesta, de la cual no se tienen soportes y es diferente a la que aprobó el acueducto. Por tanto, como se necesita un soporte para aprobar el NP del sumidero, se solicita al Contratista dar un alcance al NP explicando todos los sucesos y que debido a eso se tiene esta nueva propuesta de sumidero y explicar por qué se va a cambiar el sumidero anterior, aprobado por la EAAB por el presentado en el NP.

No	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Plan detallado de trabajo actualizado - PDT	CVK22	6-jul-23
2	Inventario de redes secas	CVK22	6-jul-23
3	Tapas de cajas de inspección de monoblock	CVK22	6-jul-23
4	Alcance al NP 31- Sumidero con su respectivo soporte	CVK22	6-jul-23
5	Balance del contrato con los NPs aprobados	CVK22	6-jul-23
6	Recorrido con delegado ETB	CVK22	6-jul-23

Elaborada por: Interventoría – Juan Manuel Alba Rojas
Fecha de la próxima reunión: 6 de julio de 2023 Lugar de la próxima reunión: N/A

AGENDA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO

Contratista de Obra Consorcio Vías de Kennedy – COP -690-22 Grupo 2

COMITÉ DE SEGUIMIENTO No.38

Fecha: 29 de junio de 2023

ORDEN DEL DIA

1.Compromisos				
No	**Asunto**	**Responsable**	**Fecha de compromiso**	**Cumplió SI/NO**
1	Inventario de redes secas	Contratista	28-jun-23	NO
2	Solicitud de Reunión con la SDM – Vigencia de señalización	Contratista	23-jun-23	SI
3	Respuesta a la comunicación U233-G2-492-23 *Observaciones a Plan Detallado de Trabajo – PDT.*	Contratista	28-jun-23	NO
4	Justificación de volumen de fresado no reportado en informes mensuales AM*.	Contratista	28-jun-23	NO
5	Carta de CEMEX donde manifieste que no cuenta con espacio en bodega para recibo de bolsas de cemento.	Contratista	28-jun-23	NO
6	Póliza extracontractual maquinaria y equipo (daños a terceros). Investigar si aplica para el contrato.	Contratista	28-jun-23	NO
7	Tapas de cajas de inspección de monoblock	Contratista	21-jun-23	NO
8	Cantidades actualizadas respecto a los diseños de pavimento y espacio público aprobados.	Contratista	23-jun-23	SI
9	Mesa de trabajo en campo especialistas redes secas para concepto de caja ETB.	Contratista e Interventoría.	23-jun-23	Solo asisto la interventoría
10	Balance y justificación del total de CIV que van a intervenir.	Contratista	28-jun-23	NO
11	Simulación de acta parcial final con cantidades a la fecha	Contratista e interventoría	28-jun-23	NO
2. Componentes				
A. Técnico				
- **Informes semanales junio:** Sin radicar				
- **Informe Mensual 8:** En revisión				

-	**Pre-Acta No.10 de recibo parcial No.8 (mayo):** En revisión
-	**Cuenta No. 8 (mayo):** Sin radicar
-	**Calificación:** 85%
B.	**SST**
-	**Informe semanal 38:** Aprobado
-	**Informe Mensual 8**: En revisión
-	**Ingresos en la semana:** 3
-	**Retiros en la semana:** 5
-	**Calificación:** 100%
C.	**Ambiental**
-	**Informe semanal 38:** Aprobado
-	**Informe Mensual 8:** Observado
-	**Calificación:** 100%
D.	**Gestión Social**
-	**Informe semanal 38:** Aprobado
-	**Informe Mensual 8:** Aprobado
-	**Calificación:** 97%
Varios	
Obra	

Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la semana
81	8005000	**Calzada:** Instalación de mezcla asfáltica **Andén oriental:** Terminación cajas **Andén occidental:** Terminación cajas
82	8005078	**Calzada:** Instalación de mezcla asfáltica **Andén oriental:** Terminación cajas **Andén occidental:** Terminación cajas
60	8002162	**Calzada:** Excavación manual para sumideros. **Andén oriental:** Sin actividad **Andén occidental:** Instalación de fresado segunda capa
61	8002265	**Calzada:** Instalación de asfaltó **Andén oriental:** Sin actividad **Andén occidental**: Sin actividad
64	8001931	**Calzada:** Sin actividad **Andén oriental:** Se realiza la demolición, excavación manual e instalación de concreto MR-41. **Andén occidental:** Se realiza la demolición, excavación manual.
65	8002008	**Calzada:** Instalación de asfalto **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad
73	8001148	**Calzada:** Instalación de asfalto.


Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la semana
		Andén norte: Sin actividad **Andén sur:** Sin actividad.
74	8001184	**Calzada:** Sin actividad **Andén norte:** Sin actividad **Andén sur:** Excavación manual, instalación de geotextil, fresado e instalación de asfalto.
75	8001223	**Calzada:** Sin actividad **Andén oriental:** Se inicia con demolición y excavación manual **Andén occidental:** Sin actividad
76	8001183	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Se realiza demolición concreto y excavación manual **Andén occidental:** Se realiza la instalación de concreto MR-41**.**
66	8001876	**Calzada:** Sin actividad **Andén oriental: E**xcavación manual e instalación de fresado e instalación de concreto MR-41. **Andén occidental:** Demolición de cajas de inspección, excavación manual e instalación de fresado.
44	8004757	**Calzada:** Instalación de fresado estabilizado. **Andén oriental:** Sin actividad **Andén occidental: :** Demolición de cajas de inspección, excavación manual e instalación de fresado.
50	8004663	**Calzada:** Se realiza instalación de fresado estabilizado. **Andén oriental:** Sin actividad **Andén occidental:** Sin actividad
68	8001715	**Calzada:** Sin actividad **Andén oriental:** Sin actividad **Andén occidental:** Sin actividad
69	8001823	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Sin actividad **Andén occidental:** Sin actividad
70	8001657	**Calzada:** Se realiza instalación de fresado estabilizado. **Andén oriental:** Sin actividad **Andén occidental:** Sin actividad.
71	8001771	**Calzada:** Se realiza la instalación de fresado estabilizado con cemento y solid soil al 4%. **Anden oriental:** Sin actividad**.** **Anden occidental:** Sin actividad.

Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la semana
49	8004816	**Calzada:** Se realiza la instalación de fresado estabilizado con cemento y solid soil al 4%. **Andén oriental:** Sin actividad **Andén occidental:** Sin actividad.
48	8004699	**Calzada:** Se realiza excavación mecánica y demolición. **Andén oriental:** Sin actividad **Andén occidental:** Sin actividad.
56	8004947	**Calzada:** Se realiza apertura de civ e inicia con excavación mecánica. **Andén oriental:** Sin actividad **Andén occidental:** Sin actividad

SEGUIMIENTO DIARIO EN MILLONES DE PESOS						
FECHA	**22-jun**	**23-jun**	**24-jun**	**25-jun**	**26-jun**	**27-jun**
PROGRAMADO ACUMULADO ($)	$ 10.853	$ 10.930	$ 11.006	$ 11.006	$ 11.083	$ 11.160
PROGRAMADO ACUMULADO (%)	62,21%	62,65%	63,09%	63,09%	63,53%	63,97%
EJECUTADO ACUMULADO ($)	$ 3.446	$ 3.492	$ 3.501	$ 3.501	$ 3.589	$ 3.601
EJECUTADO ACUMULADO (%)	19,75%	20,02%	20,07%	20,07%	20,57%	20,64%
DESVIACIÓN ($)	$ 7.407	$ 7.438	$ 7.505	$ 7.505	$ 7.494	$ 7.559
DESVIACIÓN (%)	**-42,46%**	**-42,63%**	**-43,02%**	**-43,02%**	**-42,96%**	**-43,33%**

G2	27-jun-23		
	GENERAL	OBRA	FINANCIERO
% PROGRAMADO	62,48%	63,97%	62,48%
% EJECUTADO	20,94%	20,64%	9,52%
% DESVIACIÓN	-41,54%	-43,33%	-52,96%


GRUPO 2 – CONSORCIO VÍAS KENNEDY 2022 COP-690-22

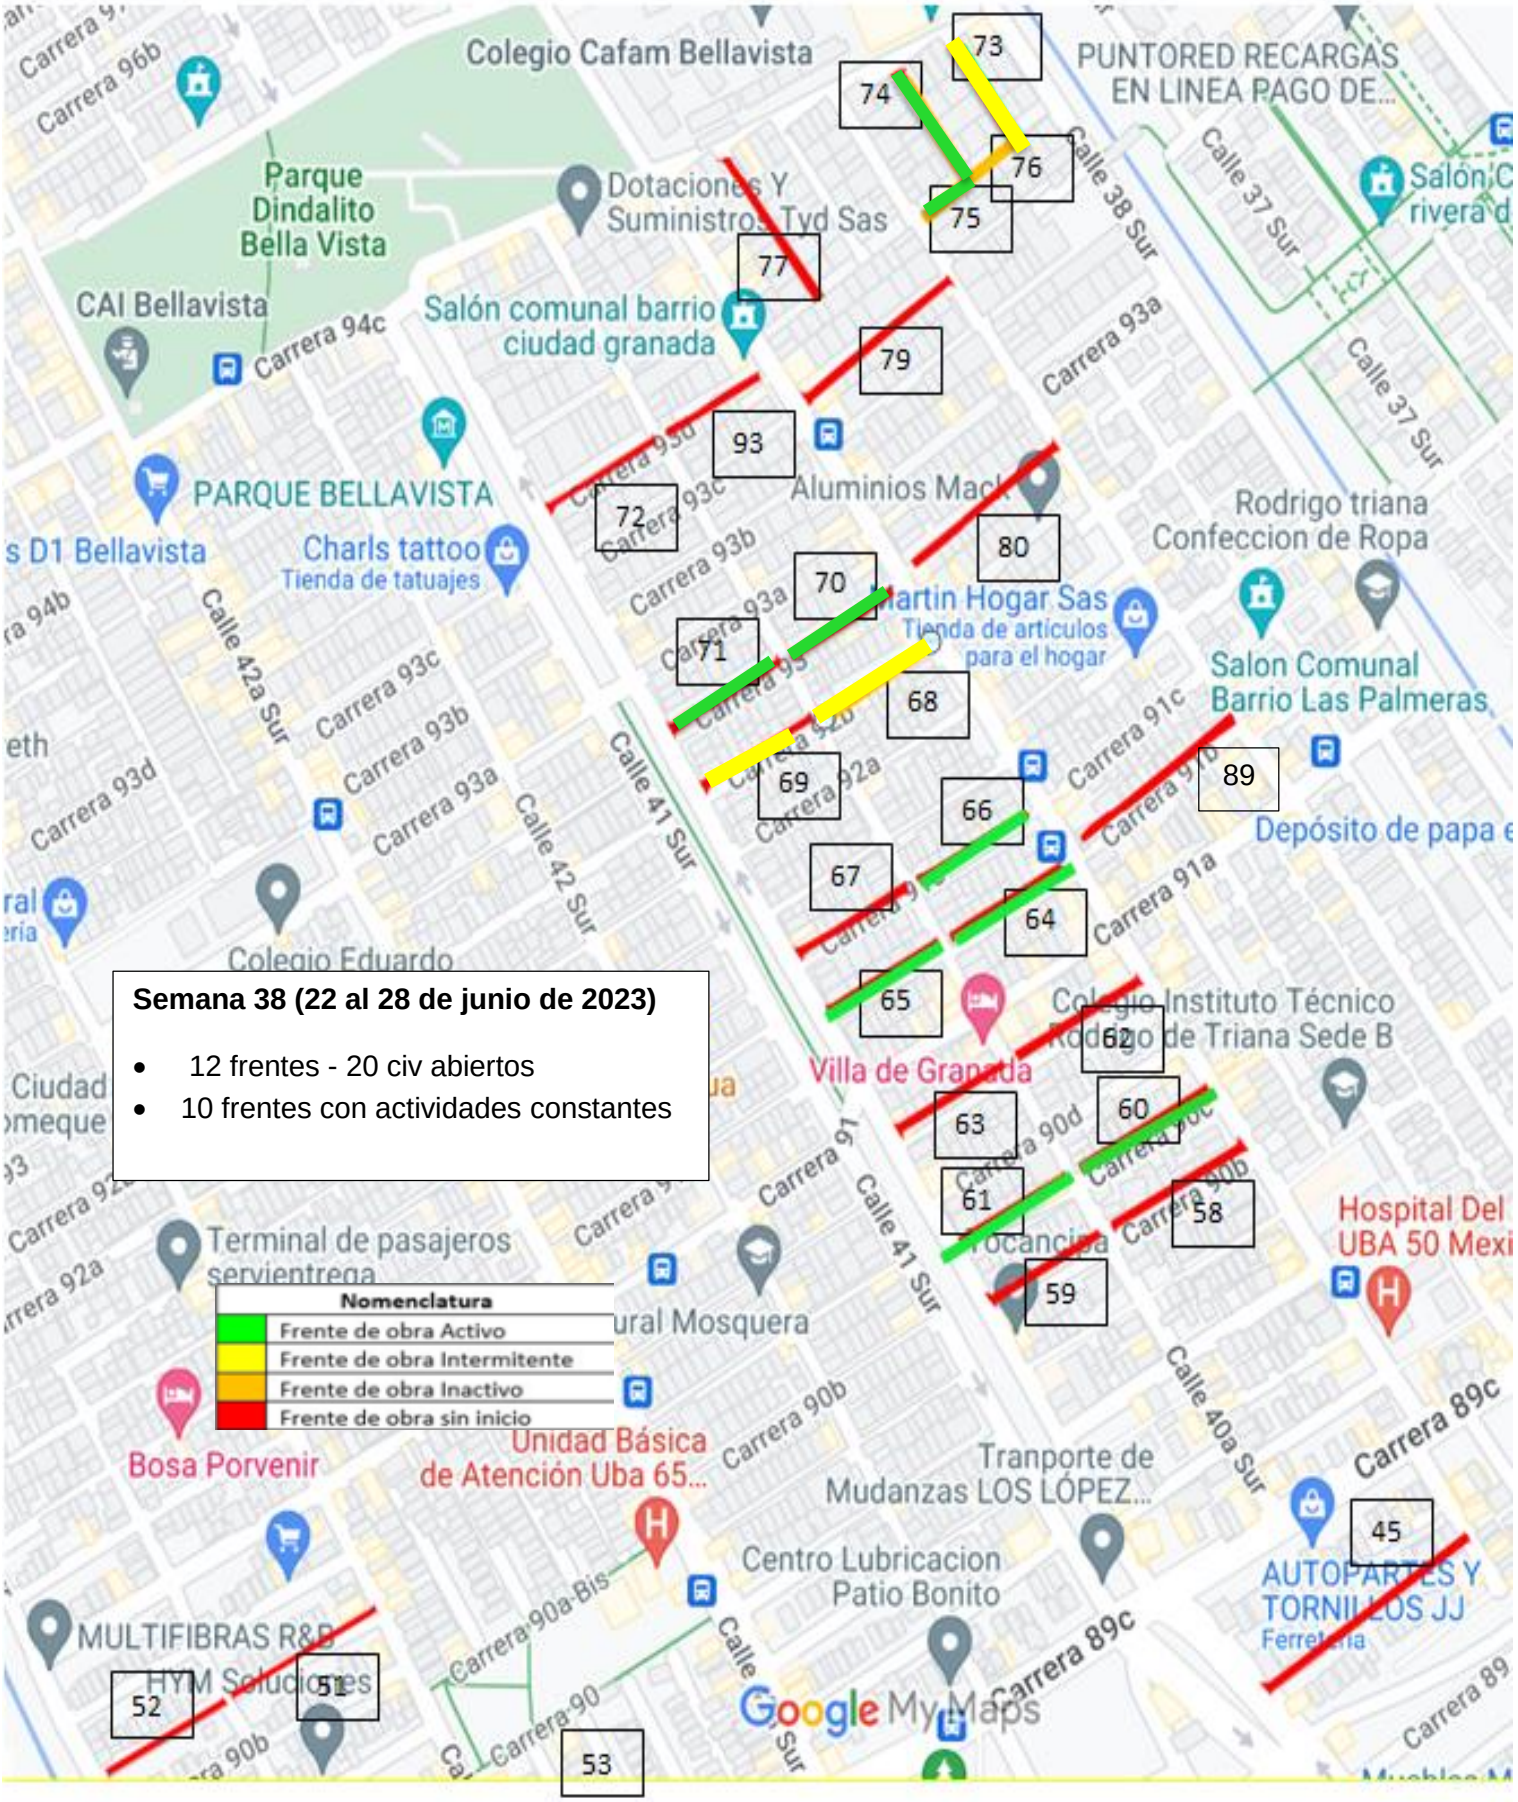

Semana 38 (22 al 28 de junio de 2023)

- 12 frentes - 20 civ abiertos
- 10 frentes con actividades constantes

GRUPO 2 – CONSORCIO VÍAS KENNEDY 2022 COP-690-22

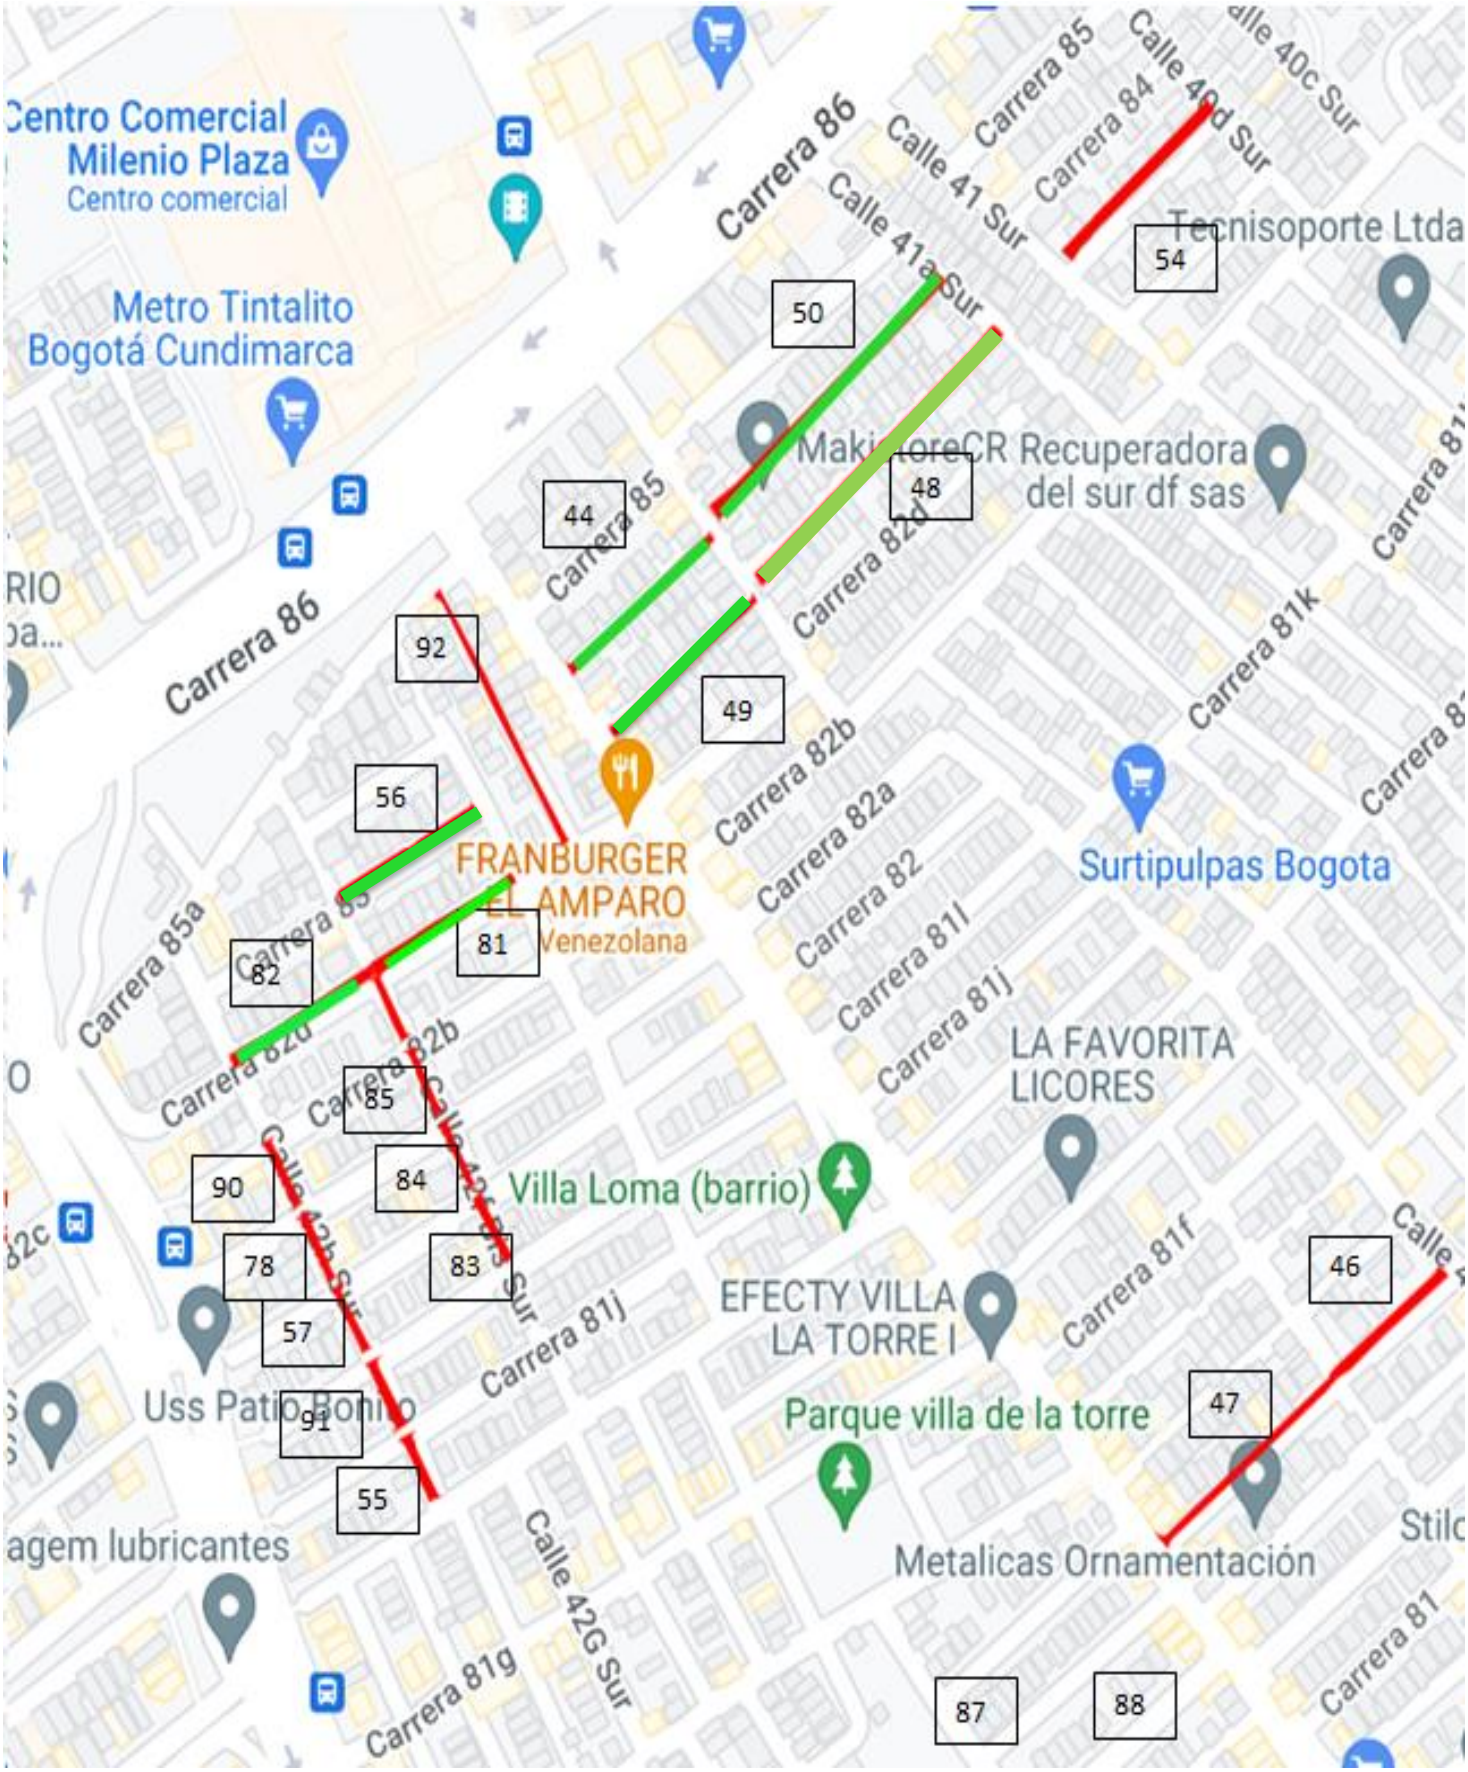


ESTADO SEMANAL DE PROCESO CONSTRUCTIVO

CONTRATISTA DE OBRA GRUPO 2 -CVK22 COP 690-22

PK_ID CALZADA	PK_ID ANDEN	PK_ID ANDEN	44			50			60			61			64			65			66			68			69			71			70			49			73			74			75			76			81			82			48			56		
VIA	ORIENTAL	OCCIDENTAL	VIA (152907)	ORI (23937)	OCC (23938)	VIA (152906)	ORI (23935)	OCC (23936)	VIA (155776)	ORI (29122)	OCC (29123)	VIA(155777)	ORI (29124)	OCC (29125)	VIA (155852)	ORI (29274)	OCC (29275)	VIA (155853)	ORI (29276)	OCC (29277)	VIA (155860)	ORI (29290)	OCC (29291)	VIA (155875)	ORI(29320)	OCC (29321)	VIA(155917)	SUR(92062684)	NOR(92062817)	VIA(155878)	OR(155878)	OCC(155878)	VIA(155878)	ORI(29326)	OCC (29327)	VIA(152905)	ORI(23933)	OCC (23934)	VIA(155917)	SUR(92062684)	NOR(92062817)	VIA(155918)	SUR(92065720)	NOR(92062828)	VIA(155893)	ORI(29356)	OCC(29357)	VIA(155892)	ORI(29354)	OCC(29355)	VIA(153026)	ORI(24149)	OCC(92062836)	VIA(153027)	ORI(24151)	OCC(24152)	VIA(152904)	ORI(23931)	OCC(23932)	VIA(153132)	ORI(24347)	OCC(92062895)
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO Y CAJAS DE INSPECCION.	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO Y CAJAS DE INSPECCION.																																																								
NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.																																																								
REDES HIDRAULICAS	GEOTEXTIL	GEOTEXTIL																																																								
GEOTEXTIL, GEOCELDA HDPE PERFORADA, RELLENO CON FRESADO SOBRE GEOCELDA	PRIMERA CAPA DE FRESADO	PRIMERA CAPA DE FRESADO																																																							
PRIMERA CAPA FRESADO (RAP) ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 3% Y ADITIVO POTENCIALIZADOR (1.3 KG/M3 - SOLID SOIL).	SEGUNDA CAPA DE FRESADO	SEGUNDA CAPA DE FRESADO																																																							
CANAL DE DRENAJE PREFABRICADO EN POLYCONCRETO MONOBLOCK.	CONSTRUCCION CAJAS DE INSPECCION, CAJILLAS DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION CAJAS DE INSPECCION, CAJILLAS DE AGUA POTABLE																																																							
SEGUNDA CAPA FRESADO (RAP) ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 3% Y ADITIVO POTENCIALIZADOR (1.3 KG/M3 - SOLID SOIL).	BORDILLO PREFABRICADO A80	BORDILLO PREFABRICADO A80																																																						
TERCER CAPA FRESADO (RAP) ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 3% Y ADITIVO POTENCIALIZADOR (1.3 KG/M3 - SOLID SOIL).	PISO EN CONCRETO GRIS MR41	PISO EN CONCRETO GRIS MR41																																																					
MEZCLA ASFALTICA	CONCRETO DE 3000PSI	CONCRETO DE 3000 PSI																																																						

TERMINADO	
EJECUCION	
INTERMITENTE	
SIN INICIAR	
NO APLICA	

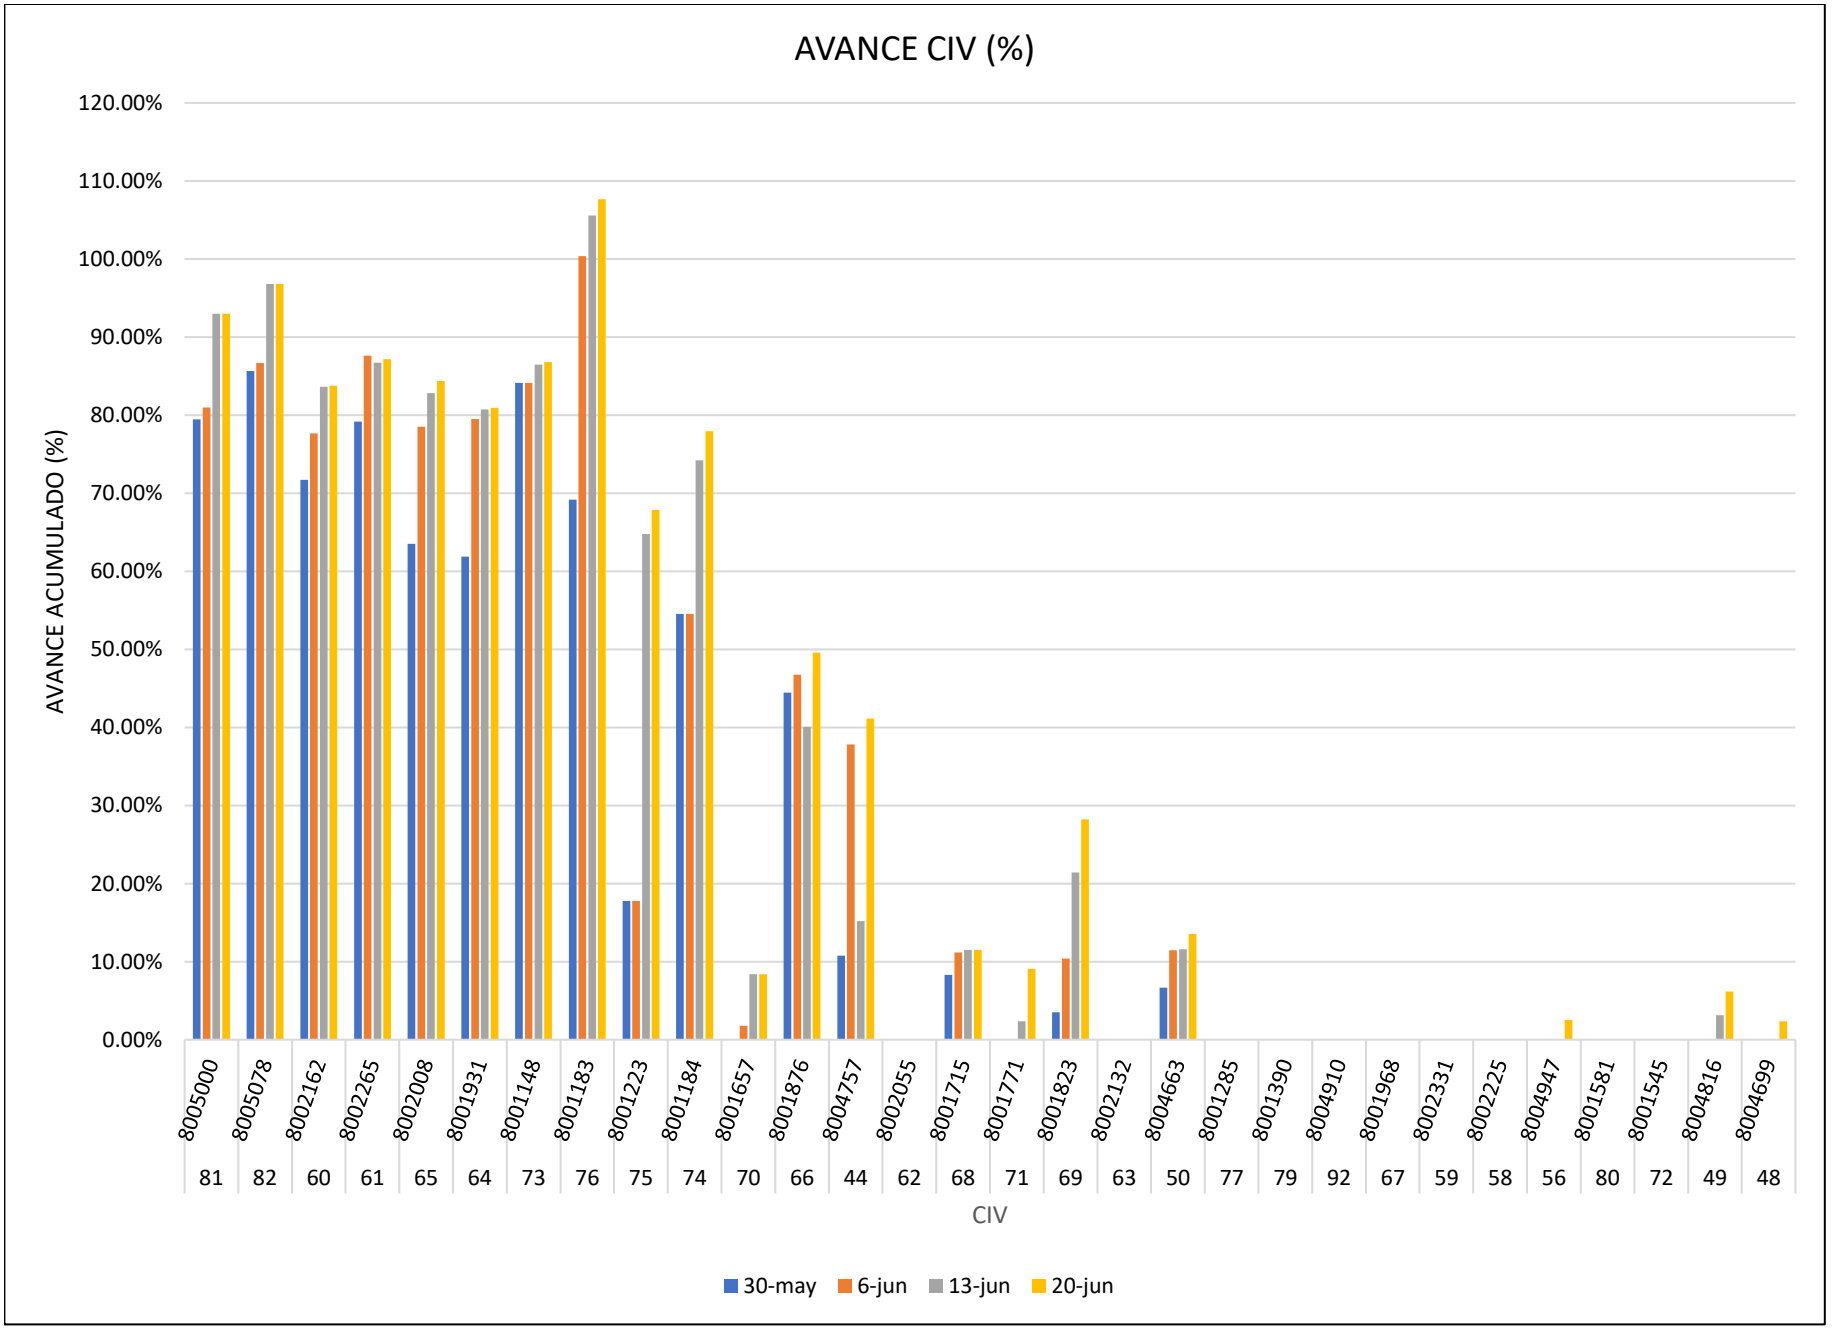
AVANCE CIV (%)
AVANCE ACUMULADO (%)
120.00%
110.00%
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
8005000 8005078 8002162 8002265 8002008 8001931 8001148 8001183 8001223 8001184 8001657 8001876 8004757 8002055 8001715 8001771 8001823 8002132 8004663 8001285 8001390 8004910 8001968 8002331 8002225 8004947 8001581 8001545 8004816 8004699
81 82 60 61 65 64 73 76 75 74 70 66 44 62 68 71 69 63 50 77 79 92 67 59 58 56 80 72 49 48
CIV
30-may
6-jun
13-jun
20-jun
