P69

Actividades: Inician conformacion de espacio publico Demolicion concreto y excavacion mecanica

Personal: Ayudantes 4, Operador 1, Trafico 1,
Equipo: Retro excavadora 1,

Steven D

Sabado 01 Julio 2023
P69 CW: 8001823
cra 92b cll40Asur cll41 sur
Tiempo: Seco
Actividades: Se continua con la conformacion del espacio publico, Demolicion concreto y excavacion manual.
Personal: Oficial 1, Ayudante 2, Operador 1, trafico 1,
Equipo: Retro excavadora 1,

Steven D

Martes 04 Julio 2023
P69 CW: 8001823
cra 92b cll40A sur cll41 sur
Tiempo: Seco
Actividades: Conformacion de espacio publico
Se evidencia excavacion para espacio publico. se solicita al contratista respetar los espesores de diseño en espacio público, ya que si se presenta sobre espesores no se-

tendran en cuenta. para pago,
adicional a esto se evidencia desalinea-
miento del monoblock que ya estaba instalado
en el costado oriental, se solicita. al contra-
tista realizar nuevamente la instalación
del monobbck, ya que fue golpeado. y movido
perdiendo su lineamiento. y así garantizar.
la buena adherencia entre los monoblock
para evitar filtraciones.
Se evidencia el desalineamiento del monoblock
se solicita al momento de arreglar que hacer
volver a entregar los niveles para liberar dicho
monoblock

Oscar Vasquez
Tecnologo

Componente Ambiental y SST: Se realiza recorrido, evi-
denciando actividad de excavacion, por lo mismo se
encuentra un acopio grande de escombros, el per-
sonal se encuentra con dotacion y EPP.

Yaret Claro P.
Res. Ambiental.

Conformacion espacio publico. con excavacion
Personal: Oficial 1, Ayudantes 2, Operador 1, Trafico 1
Equipo: Retroexcavadora

Steven B

Luis
IFTS

Folio No. hoja 15.

P69

Miercoles. 05 Julio 2023

P69 CIV: 8001823

cra 92b cll40A sur cll41sur

Tiempo: seco

Actividades: Conformacion espacio publico

Personal: Oficial 1 Ayudantes 2

Steven B

Jueves 06 Julio 2023

P69 CIV: 8001823

cra 92b cll40A sur cll41sur

Tiempo: seca

Actividades: Conformacion espacio publico, excavacion manual,

Personal: Oficial 1, Ayudantes 3, Inspector 1

Steven D

Viernes 07 Julio 2023

P69 CIV: 8001823

Cra 92b cll40A sur cll41sur

Tiempo: seco


Actividades: Conformacion espacio publico demolicion excavacion

Personalmal: Oficial 1, Ayudantes 2, Operador 1,

Equipo retroexcavadora


Steven D

Folio No. _____

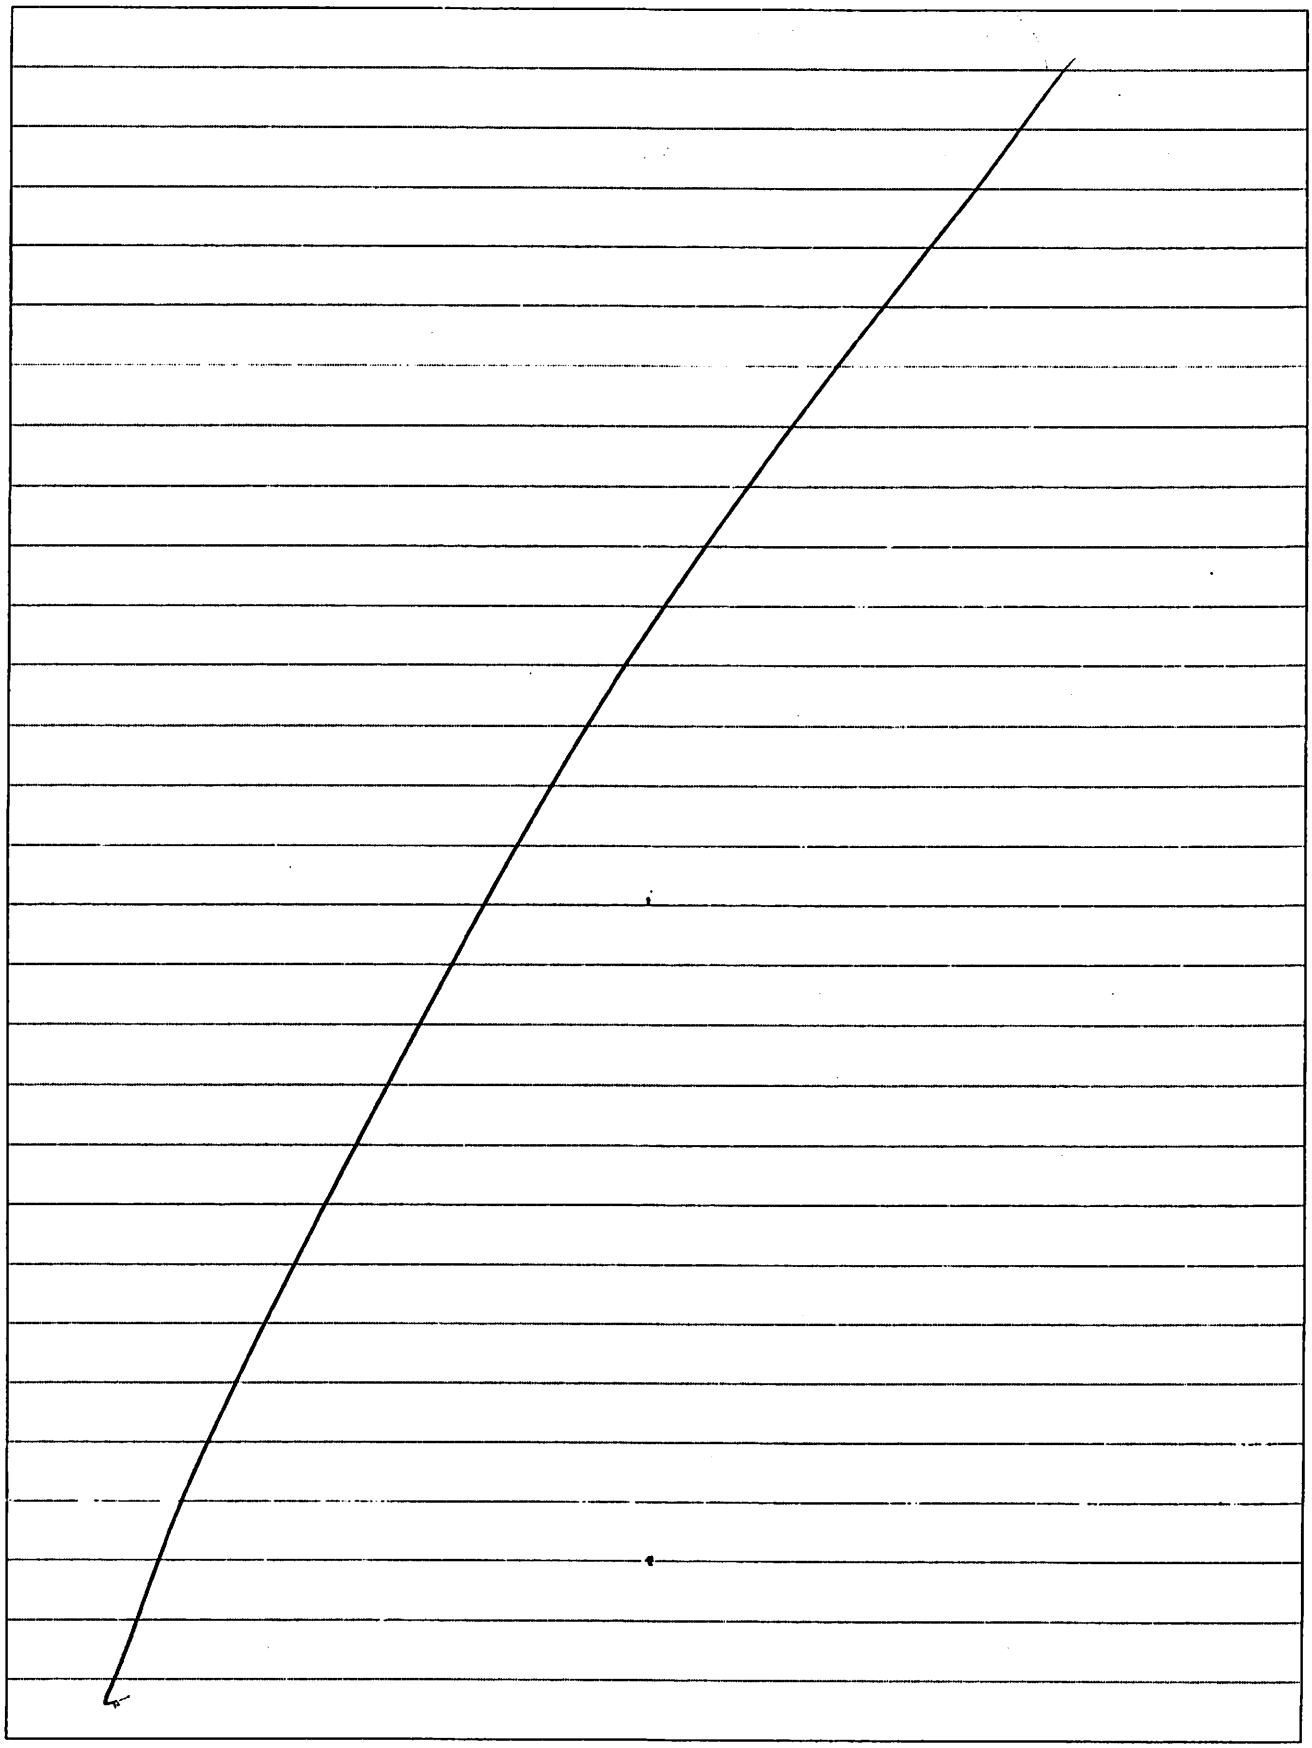

Folio No. hoja 16

P69

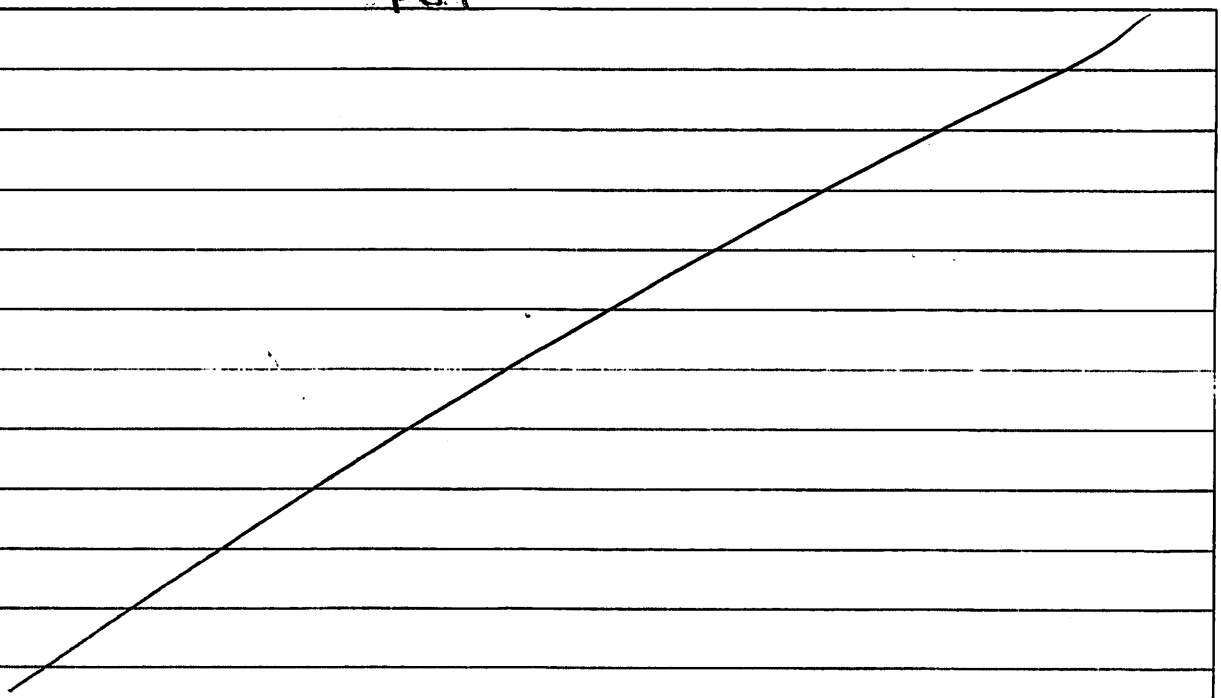

Sabado. 08 Julio 2023
P69 CU: 8001828
cra 92b cll40Asur cll41sur
Tiempo = SECO.
Actividades: Conformacion espacio publico, Excavacion demolicion.
Personal: Oficial 1, Ayudantes 2, operador 1, boal 1,
Equipo = Retroexcavadora

Steven Fajs PTI

Lunes. 10 Julio 2023
P69 CU: 8001828
cra 92b cll40Asur cll41sur
Tiempo = SECO.
Actividades: Conformacion espacio publico, demolicion y construccion de cajas de inspeccion.

PG9

NP-16 = Demoliciones = 1,53

2020 = Construcciones casas = 7

Personal = Inspector 1, Oficial 2, Ayudantes 4, boal 1

Trafica 1.

Steven D PAM S RTI

Martes 11 Julio 2023

PG9 CLV: 8001823

cra 92b cll 40A sur cll 41 sur

Tiempo: Seco

Actividades

Componente SST: Se realiza recorrido evidenciando excavacion y conformación de espacio publico, el personal cuenta con los elementos de protección personal y elementos de identificación visual, el kit de emergencia se encuentra el la prioridad 68

Sandra Gonzalez
Res. SST Intr.

Componente tecnico: Excavacion en espacio publico

« Conformacion de espacio publico y perfilacion a la excavacion.

Personal Ayudantes 2

Steven D PAM S RTI

P69

Miercoles 12. Julio
P69 CIV:8001823
Cra 92b cll40A sur cll41 Sur
Tiempo: Seco
Actividades: Se Realiza demolicion de concreto y excavacion manual en espacio publico

NP-13 = Demolicion concreto = 36,04 m²
4001 = Excavacion manual = 54,43, m³

Personal: Oficial 1, Ayudantes 4, Trafico 1

Jueves 13 Julio 2023
P69 CIV:8001823
Cra 92b Cll 40A sur Cll 41 Sur
Tiempo: seco
Actividades:
- Componente Social: Se realiza recorrido social Por el frente de obra, se verifica adecuación de bajantes, actualización de vallas informativas, no se presentan inquietudes ciudadanas.

Componente SST: Se realiza recorrido evidenciando actividad de conformacion de espacio publico, cuenta con 3 trabajadores, Cuenta con punto ecologico y el kit de emergencia, kit de derrame y pon ecologico son compartidos con las prioridad 69.

Sandra Gonzalez

Componente tecnico: Excavacion en espacio publico

- Conformacion espacio publico costado oriental, perfilacion a excavacion.

Personal: Ayudantes 2.

Steven Ramos

P69

Viernes 14 Julio 2023
P69 CIV: 8001823.
Cra 92b cll40A sur cll41sur
Tiempo: Seco
Actividades: Conformacion espacio publico costado occidental y perfilacion excavacion
Personal = Ayudantes 2

Steven

Sabado 15 Julio 2023.
P69 CIV: 8001823
Cra 92b cll40A sur cll41sur
Tiempo= Seco
Actividades: Conformacion de espacio publico en ambos costados
Personal: Ayudantes 2.

Steven

Lunes 17 Julio 2023
P69 CIV: 8001823
Cra 92b cll40A Sur cll41sur
Tiempo: Seco
Actividades: Conformacion de espacio publico
Personal = Inspectos 1, Oficiales 2, Ayudantes 7, Trafico 1, Boal 1

Steven

Folio No. Hoja 20

P69

Martes 18 Julio 2023

P69 CIV: 8001823

Cra 92b Cll40A Sur Cll41Sur

Tiempo = SECO

Actividades:

Componente SST: Se realiza recorrido de obra, se evidencia actividades de excavación de zanja y construcción de caja el personal porta la dotación de acuerdo al manual de identificación usual. así mismo hacen uso de Epp. este civ. cuenta con punt ecológico, kit de emergencia y kit antiderrame. los cuales estan ubicados en el civ. 68.

Sandra Gonzalez
Res. SST

Componente Ambiental = Se realiza recorrido de obra, evidenciando buena implementación de las medidas ambientales. Yaneth Claro P
Res. Ambiental.

- Se continuan con la conformacion espacio publico

Personal = Oficial 1, Ayudantes 3.

Jhon

P69

Miercoles 19 Julio 2023
P69 CLV: 8001823
Cl9 92b Cll40Asur Cll41sur
Tiempo = Seco
Actividades: Conformacion de espacio publico e instalacion de geotextil y fresado

Personal = Oficial 2, Ayudantes 6, Trafico 1

Sabado 22 Julio 2023
P69 CLV: 8001823
Cl9 92b Cll40Asur Cll41sur
Tiempo = Seco
Actividades: Conformacion espacio publico e instalacion de geotextil y fresado

- Tambien hacen vaciado de concreto 3000 PSI para la construccion placa fondo K0+067 sin item

Personal = Oficial 1, Ayudantes 3, Trafico 1

P69

Lunes 24 Julio 2023
P69 CIV: 8001823
Cra 92b Cll40Asur Cll41Sur
Tiempo: Seco
Actividades: = Demolicion de cajas de inspeccion y. construccion de cajas de inspeccion.

NP-16. = Demolicion = 2,67 m3
2020 - Construccion = 14. (m)

Personal - Inspector 1, Oficiales 2, Ayudantes 4, Trafico 1

*Estas cajas son todas de interno 0,60x0,60 y no se les esta aplicando impermeabilizante

Steven (COM)

Martes 25 Julio 2023
P69 CIV: 8001823
Cra 92b Cll40A sur Cll41Sur
Tiempo: Seco.
Actividades: Conformacion espacio publico en ambos costados, Instalacion de geotextil, fresado y reinstalacion de monoblock V-200

Personal: Oficial 2, Ayudantes 5, Trafico 1

- Se le solita al contratista de no instalar. monoblock que este partido, desportillado

P69

ya que en varias ocasiones se le han hecho estas recomendaciones al contratista y ha hecho caso omiso a esta observacion.

Steven B

Miercoles 26 Julio 2023.

P69 CW: 8001823

Cra 92b cll40Sur cll41sur.

Tiempo: seco.

Actividades, Demolicion concreto anden existente y excavacion manual Espacio publico.

NP-13 : Demolicion :

4001 = Excavacion manual.

Personal = Oficial 2, Ayudantes 3, Trafico 1.

- Continuan con reinstalacion de monoblock - U = 200 se le solicita al contratista de aplicarle el sikaflex al monoblock ya que se evidencia que no se esta haciendo

Steven B

Folio No: hoja 74

P69

Jueves 27 Julio 2023.
P69 CW: 8001823.
cra 92 b cl140A sur cl141 sur
Tiempo: Seco
Actividades: Demolicion concreto Excavacion manual.

NP-13. Demolicion = 54,9
4001 Excavacion manual = 52,7

Personal: Inspector 1, Oficiales 2, Ayudantes 4,
Trafico.

Steven B

Viernes 28 Julio 2023
P69 CW: 8001823
cra 92b cl140A sur cl141 sur
Tiempo: Seco
Actividades: Vaciado de concreto 3000 PSI

NP-30 : Concreto 3000 PSI : 62,35m3

Persona C: Inspector 1, Oficiales 2, Ayudantes 4.
Trafico 1.

- El concreto instalado queda en seguimiento por parte de laboratorio ya que se aplico bastante fluido.
- Se Realiza ensayo Slump cumpliendo parametros requeridos y en presencia interventoria

Steven B

P69

- Se solicita al contratista hacer entrega de los Resultados de densidad para espacio publico, puesto que se evidencia la ausencia de la toma de muestras. Adicional a esto, se solicita la actualizacion del plan de inspeccion de ensayos de acuerdo a las condiciones actuales del contrato para asi poder verificar y garantizar la calidad de la obra realizada.

Sabado 29 Julio 2023.
P69 CW: 8001823
Cra 92b CLL 80A sur CLL 81sur
Tiempo = seco
Actividades: Demolicion de cajas de inspeccion de aguas negras.

NP-16. = Demolicion = 1,56 m^3
2020 = Construccion caja = 1 und

Personal: Inspeccion = 1, Oficiales 3, Ayudantes 3, Trafico 1, Boal 1.

P69

Lunes 31 JULIO 2023
P69 CU: 8001823
cra 92b cll40A sur cll41sur
Tiempo = SECO
Actividades: Conformacion espacio publico e instalacion PE geotextil, fresado

Personal: Oficiales 2, Ayudantes 4, Inspeccion 1, Trafico 1, boal 1.

Steven

Martes 01 JULIO 2023
P69 CU: 8001823
cra 92b cll40Asur cll41sur
Tiempo: SECO
Actividades:

Componente SST- Ambiental = se realiza recorrido de obra se evidencian actividades de conformacion de espacio publico, se evidencia personal haciendo uso de los EPP. asi mismo porta la dotación. este CU cuenta con Kit de emergencia, kit antiderrame y punto ecologico

Sandra Gonzalez
Res. SST

Steven

Yanet Cloro
Res. Ambiental

P69

Folio No. 109 27
