**FORMATO**

**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY**

**ÁREA DE INFRAESTRUCTURA**

**SEMANA No.** 41 (Consecutivo) **DEL** 13 de julio de 2023 (dd/mm/aa) **AL** 19 de julio de 2023 (dd/mm/aa)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No** 717 de 2022 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 621 de 2022 (Número de Contrato)

## 1. DATOS GENERALES

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA**

INV-014 CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 1

**CONTRATISTA** XIE SA **NIT** 830061684-1 (Nombre o razón social de la persona natural o jurídica) (Número de NIT sin dígito de verificación)

**INTERVENTOR** CONSORCIO SCLV **NIT** 900547145 (Nombre o razón social de la persona natural o jurídica) (Número de NIT sin dígito de verificación)

| CONTRATO DE OBRA | | CONTRATO DE INTERVENTORÍA | |
|---|---|---|---|
| Valor inicial | $ 19.627.175.114,00 | Valor inicial | $ 4.897.418.342,00 |
| Valor Adicional 1 | | Valor Adicional 1 | |
| Valor Actualizado | | Valor Actualizado | |
| Plazo Inicial | 12 meses | Plazo Inicial | 12 meses |
| Plazo Prórroga 1 | | Plazo Prorroga 1 | |
| Plazo Actualizado | | Plazo Actualizado | |
| Fecha de Iniciación | 05 de octubre de 2022 | Fecha de Iniciación | 05 de octubre de 2022 |
| Fecha de Terminación Inicial | 04 de octubre de 2023 | Fecha de Terminación Inicial | 04 de octubre de 2023 |
| Fecha de Terminación Actual | | Fecha de Terminación Actual | |
| No. de empleos generados | 30 | No. De empleos generados | 45 |

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA **YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ** (Diligenciar nombre del supervisor del contrato)

PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN **ANDRES MAURICIO ROJAS LLANOS - DANILO MENESES TORO** (Diligenciar el nombre del profesional del Equipo de Apoyo a la supervisión)

## 2. AVANCES DEL CONTRATO

**META FÍSICA PROGRAMADA TOTAL DEL CONTRATO**

**Número de radicado de remisión de parte de interventoría del alcance físico del contrato de obra** **de fecha** (Diligenciar el número del oficio radicado) (dd/mm/aa)

| TIPO DE ELEMENTO | VALOR TOTAL ($) | ÁREA (M2) | km/carril | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| CALZADA CIV | $ 19.627.175.114,00 | 12860,18 | 3,67 | 43 |
| **TOTALES** | **$ 19.627.175.114,00** | **12860,18** | **3,67** | **43** |


**A. AVANCE GENERAL**

**AVANCE FINANCIERO**

| PROGRAMADO | | | EJECUTADO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL CONTRATO** | SEMANAL | ACUMULADO | SEMANAL | ACUMULADO | Atraso /Avance |
| Trabajo Programado | 2,53% | 2,53% | Trabajo Ejecutado | 7,21% | 7,21% | 4,68% |
| Valor del Trabajo Programado | $ | $ 0,00 | Valor del Trabajo Ejecutado | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! |

| OBRA | SEMANAL | ACUMULADO | | SEMANAL | ACUMULADO | Atraso /Avance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obra Programada (%) | 0% | 0% | Obra Ejecutada (%) | 0% | 0% | 0% |
| Obra Programada ($) | $ - | $ - | Obra Ejecutada ($) | $ - | $ - | $ - |

**GRAFICA DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO**




| Semana No. | ACUMULADO FINANCIERO PROGRAMADO | ACUMULADO FINANCIERO EJECUTADO |
|---|---|---|
| 1 | 0,00% | 0,00% |
| 2 | 0,00% | 0,00% |
| 3 | 0,00% | 0,00% |
| 4 | 0,00% | 0,00% |
| 5 | 0,00% | 0,00% |
| 6 | 0,00% | 0,00% |
| 7 | 0,00% | 0,00% |
| 8 | 0,00% | 0,00% |
| 9 | 2,16% | 1,10% |
| 10 | 2,31% | 1,10% |
| 11 | 2,42% | 7,21% |
| 12 | 2,53% | 7,21% |
| 13 | 3,47% | 7,21% |
| 14 | 4,68% | 8,25% |
| 15 | 6,19% | 8,39% |
| 16 | 6,19% | 9,90% |
| 17 | 8,97% | 9,83% |
| 18 | 11,45% | 10,42% |
| 19 | 13,87% | 10,61% |
| 20 | 16,42% | 11,38% |
| 21 | 11,83% | 10,73% |
| 22 | 11,48% | 10,73% |
| 23 | 11,93% | 10,73% |
| 24 | 12,39% | 10,73% |
| 25 | 12,29% | 10,73% |
| 26 | 13,13% | 10,73% |
| 27 | 13,66% | 10,73% |
| 28 | 15,73% | 10,73% |
| 29 | 16,77% | 10,73% |
| 30 | 17,27% | 10,71% |
| 31 | 26,09% | 10,71% |
| 32 | 35,83% | 10,71% |
| 33 | 41,55% | 10,71% |
| 34 | 44,08% | 10,71% |
| 35 | 46,47% | 10,71% |
| 36 | 48,50% | 17,52% |
| 37 | 48,50% | 17,52% |
| 38 | 50,50% | 17,52% |
| 39 | 52,50% | 17,52% |
| 40 | 75,12% | 17,52% |
| 41 | 77,04% | 17,52% |

**Análisis de la Gráfica:**

No se cuenta con cronograma

**AVANCE FISICO**

| PROGRAMADO | | | | EJECUTADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estudios y Diseños Program. (m2) | 0 | 0 | 0% | Estudios y Diseños Ejecutado (m2) | 0 | 0 | 0% |
| **OBRA** | SEMANAL | ACUMULADO | %Pros. Acum. | | SEMANAL | ACUMULADO | % Ejec. Acum. |
| Meta Física Proarmada (m2) | 0 | 0 | 0% | Meta Física Ejecutada (m2) | 0 | 0 | 0% |
| Meta Física Proarmada (Km/carril) | 0 | 0 | 0% | Meta Física Ejecutada (km/carril) | 0 | 0 | 0% |
| Meta Física Proarmada (und) | 0 | 0 | 0% | Meta Física Ejecutada (und) | 0 | 0 | 0% |
| Meta Física Proarmada (km) | 0 | 0 | 0% | Meta Física Ejecutada (km) | 0 | 0 | 0% |
| Meta Física Proarmada (%) | | | | Meta Física Ejecutada (%) | | | |

%Atraso /%Avance

%Atraso /%Avance 0%

**AVANCE PROJECT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Avance Programado (%) | 0% | Avance Ejecutado (%) | 0% |
| Avance Proarmado Mantenimiento oeriódico | 0% | Avance Ejecutado Mantenimiento oeriódico | 0% |
| Avance Proarmado Mantenimiento Rutinario | 0% | Avance Ejecutado Mantenimiento Rutinario | 0% |
| Avance Proarmado Mantenimiento Reconstrucción | 0% | Avance Ejecutado Mantenimiento Reconstrucción | 0% |
| Avance Proarmado Mantenimiento Rehabilitación | 0% | Avance Ejecutado Mantenimiento Rehabilitación | 0% |

%Atraso /%Avance

| | |
|---|---|
| | 0% |
| | 0% |
| | 0% |
| | 0% |
| | 0% |

**B. ESTADO GENERAL DE LOS FRENTES DE TRABAJO EN LA SEMANA**

| No | CIV | PK_ID CALZADA | PK_ID ANDEN 1 (Sur) | PK_ID ANDEN 2 (Norte) | EJE | DESDE | HASTA | IPR | TIPO SUPERF | TIPO DE ELEMENTO | ANCHO CALZADA (m) | LONGITUD (m) | AREA CALZADA (m²) | Estado | INFORMACION DE FRENTES QUE DEBIERON INICIAR Y NO TIENEN ACTIVIDAD DE OBRA: Fecha de inicio programada | Motivos por los cuales no ha iniciado | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8000687 | 156049 | 29664 | 29665 | KR 98B BIS | CL 38C SUR | CL 40 SUR | 46,42 | 6 | CALZADA | 4,2 | 91,12 | 382,89 | Sin iniciar | 16-may-23 | SIN PMT | | |
| 2 | 8001095 | 156010 | 29588 | 29589 | KR 95A | CL 42F SUR | CL 42G SUR | 50,07 | 6 | CALZADA | 3,72 | 76,75 | 285,18 | Sin iniciar | 4-jul-23 | SIN PMT | | |
| 3 | 8000957 | 156201 | 29896 | 29897 | KR 97A | CL 41 SUR | CL 40A SUR | 28,19 | 6 | CALZADA | 4,53 | 67,8 | 307,36 | SIN ACTIVIDADES | 28-mar-23 | | | |
| 4 | 8001069 | 156189 | 29872 | 29873 | KR 96A | CL 41 SUR | CL 40B SUR | 47,61 | 6 | CALZADA | 4,35 | 34,72 | 150,9 | Calzada: Instalación de fresado estabilizado. Andén oriental: Instalación parcial de concreto de 3000psi. Andén occidental: Sin actividades | 24-feb-23 | | | |
| 5 | 8000855 | 156051 | 29668 | 29669 | KR 98C BIS | CL 38C SUR | CL 40 SUR | 47,12 | 6 | CALZADA | 3,86 | 90,24 | 347,99 | Sin iniciar | 10-may-23 | SIN PMT | | |
| 6 | 8000977 | 156215 | 29924 | 29925 | KR 97D | CL 42A SUR | CL 42 SUR | 47,61 | 6 | CALZADA | 5,07 | 65,69 | 333,12 | Sin iniciar | 16-dic-22 | SIN PMT | | |
| 7 | 8000736 | 156045 | 29656 | 29657 | KR 98 | CL 40 SUR | CL 38C SUR | 46,42 | 6 | CALZADA | 4,04 | 93,14 | 376 | Sin iniciar | 21-may-23 | SIN PMT | | |
| 8 | 8000417 | 155940 | 29448 | 29449 | KR 91C | CL 42F SUR | CL 42G SUR | 29,9 | 6 | CALZADA | 2,57 | 88,02 | 226,36 | Sin iniciar | 27-abr-23 | SIN PMT | | |
| 9 | 8002500 | 155941 | 29450 | 29451 | KR 91C | CL 42G SUR | CL 43 SUR | 29,41 | 6 | CALZADA | 2,54 | 69,79 | 177,24 | Sin iniciar | 4-may-23 | SIN PMT | | |
| 10 | 8001990 | 156950 | 30692 | 30693 | KR 98A BIS | CL 42A SUR | CL 42F SUR | 29,9 | 6 | CALZADA | 2,93 | 138,9 | 401,1 | Sin iniciar | 10-may-23 | SIN PMT | | |
| 11 | 8001955 | 156945 | 30972 | 30973 | KR 97A BIS | CL 42A SUR | CL 42F SUR | 29,9 | 1 | CALZADA | 4,38 | 140,7 | 616,78 | Sin iniciar | No se tiene | | | |
| 12 | 8000849 | 156231 | 29956 | 29957 | KR 98B | CL 42 SUR | CL 42A SUR | 47,26 | 6 | CALZADA | 5,07 | 62,44 | 316,88 | Calzada: Instalación de bordillo A-80, excavación para instalación de bordillo A-80. Andén oriental: Instalación de fresado y geotextil, excavación manual. Andén occidental: Instalación de fresado y geotextil, excavación manual, instalación de cajillas de medidor ifund, instalación de concreto de 3000psi. | 21-abr-23 | | | |
| 13 | 8000772 | 156220 | 29934 | 29935 | KR 98 | CL 40 SUR | CL 40A SUR | 46,42 | 6 | CALZADA | 3,54 | 56,87 | 201,43 | Calzada: Sin actividad. Andén occidental: Instalación parcial de concreto de 3000psi. Andén oriental: Instalación parcial de concreto de 3000psi. | 16-ene-23 | | | |
| 14 | 8000814 | 156221 | 29936 | 29937 | KR 98 | CL 40A SUR | CL 41 SUR | 46,42 | 6 | CALZADA | 4,54 | 67,69 | 307,42 | Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Instalación parcial de concreto de 3000psi. Andén occidental: Sin actividad. | 20-ene-23 | | | |
| 15 | 8000856 | 156222 | 29938 | 29939 | KR 98 | CL 41 SUR | CL 42 SUR | 46,42 | 6 | CALZADA | 4,61 | 67,45 | 310,79 | Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Demolición de concreto y se realiza excavación manual parcial. | 9-mar-23 | | | |
| 16 | 8000807 | 156223 | 29940 | 29941 | KR 98 | CL 42 SUR | CL 42A SUR | 47,26 | 6 | CALZADA | 4,61 | 64,09 | 308,44 | SIN ACTIVIDADES | 2-mar-23 | | | |
| 17 | 8000794 | 156216 | 29926 | 29927 | KR 97F | CL 40 SUR | CL 40A SUR | 46,42 | 6 | CALZADA | 3,93 | 58,12 | 228,25 | Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Instalación de concreto 4000psi. Andén occidental: Instalación de concreto 4000psi. | 26-ene-23 | | | |
| 18 | 8000839 | 156217 | 29928 | 29929 | KR 97F | CL 40A SUR | CL 41 SUR | 46,42 | 6 | CALZADA | 3,86 | 67,37 | 260,04 | Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Instalación de concreto 4000psi, instalación parcial de concreto de 3000psi. Andén occidental: Instalación parcial de concreto de 3000psi. | 2-feb-23 | | | |
| 19 | 8000583 | 156052 | 29670 | 29671 | KR 98A BIS | CL 38C SUR | CL 38 SUR | 47,12 | 6 | CALZADA | 4,66 | 80,91 | 376,93 | Sin iniciar | No se tiene | | | |
| 20 | 8000938 | 156219 | 29932 | 29933 | KR 97F | CL 42 SUR | CL 42A SUR | 47,26 | 6 | CALZADA | 4,62 | 64,75 | 299,09 | Sin iniciar | 29-dic-22 | SIN PMT | | |
| 21 | 8000821 | 156212 | 29918 | 29919 | KR 97D | CL 40 SUR | CL 40A SUR | 46,42 | 6 | CALZADA | 4,16 | 59,22 | 246,61 | Calzada: Nivelación de fresado estabilizado segunda capa. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad. | 8-feb-23 | | | |
| 22 | 8000864 | 156213 | 29920 | 29921 | KR 97D | CL 40A SUR | CL 41 SUR | 46,42 | 6 | CALZADA | 4,05 | 67,76 | 274,11 | Calzada: Nivelación parcial de fresado. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad. | 14-feb-23 | | | |
| 23 | 8000916 | 156214 | 29922 | 29923 | KR 97D | CL 41 SUR | CL 42 SUR | 47,26 | 6 | CALZADA | 4,42 | 67,76 | 299,83 | Sin iniciar | 22-dic-23 | SIN IMPLEMENTACIÓN DE PMT | | |
| 24 | 8000871 | 156204 | 29902 | 29903 | KR 97B | CL 40 SUR | CL 40A SUR | 47,1 | 6 | CALZADA | 4,45 | 60,94 | 271,42 | SIN ACTIVIDADES | 4-ene-23 | | | |
| 25 | 8000923 | 156205 | 29904 | 29905 | KR 97B | CL 40A SUR | CL 41 SUR | 46,42 | 6 | CALZADA | 4,92 | 67,68 | 332,77 | Calzada: Nivelación de fresado. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad. | 10-ene-23 | | | |
| 26 | 8000988 | 156206 | 29906 | 29907 | KR 97B | CL 41 SUR | CL 42 SUR | 47,26 | 6 | CALZADA | 4,32 | 68,54 | 295,77 | Calzada: Excavación manual para instalación de tubería de 12", instalación de tubería movistar, de arena de peña para recubrimiento de tubería movistar, de geotextil en intersección, geo-celda, fresado para lleno de geo-celda, fresado estabilizado. Andén oriental: Demolición manual, excavación manual en anden. Andén occidental: Demolición manual y excavación manual en anden. | 15-mar-23 | | | |
| 27 | 8001052 | 156207 | 29908 | 29909 | KR 97B | CL 42 SUR | CL 42A SUR | 47,26 | 6 | CALZADA | 5,12 | 66,41 | 340,23 | Calzada: Excavación manual en intersección, instalación de geotextil, geocelda y fresado para lleno de geocelda en intersección, instalación de base estabilizada, de tubería corrugada de 12", instalación de arena de peña. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad. | 22-mar-23 | | | |
| 28 | 8000929 | 156196 | 29886 | 29887 | KR 97 | CL 40 SUR | CL 40A SUR | 47,95 | 6 | CALZADA | 4,2 | 63,56 | 266,84 | Calzada: Excavación manual en intersección, nivelación y compactación de sub-rasante en intersección. Andén oriental: Instalación de concreto de 3000psi, nivelación e instalación de marcos en cajas de inspección. Andén occidental: Instalación de concreto de 3000psi, nivelación e instalación de marcos en cajas de inspección. | 5-dic-22 | | | |
| 29 | 8000996 | 156197 | 29888 | 29889 | KR 97 | CL 40A SUR | CL 41 SUR | 47,26 | 6 | CALZADA | 4,24 | 67,58 | 286,62 | Calzada: Excavación manual en intersección, nivelación y compactación de sub-rasante en intersección. Andén oriental: Instalación de concreto de 3000psi, nivelación e instalación de marcos en cajas de inspección. Andén occidental: Instalación de concreto de 3000psi, nivelación e instalación de marcos en cajas de inspección. | 12-dic-22 | | | |
| 30 | 8001058 | 156198 | 29890 | 29891 | KR 97 | CL 41 SUR | CL 42 SUR | 47,26 | 6 | CALZADA | 4,12 | 66,8 | 274,89 | Calzada: Excavación manual para instalación de tubería 12", instalación de tubería corrugada de 12", de arena de peña, de geotextil, geo-celda, de fresado y de base estabilizada. Andén oriental: Instalación de concreto de 3000psi. Andén occidental: Instalación de concreto de 3000psi. | 10-abr-23 | | | |
| 31 | 8001125 | 156199 | 29892 | 29893 | KR 97 | CL 42 SUR | CL 42A SUR | 50,91 | 6 | CALZADA | 5,14 | 68,89 | 354,19 | Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Instalación de concreto de 3000psi, instalación parcial de concreto de 4000psi. Andén occidental: Instalación parcial de concreto de 3000psi, instalación parcial de concreto de 4000psi. | 3-abr-23 | | | |
| 32 | 8000979 | 156186 | 29866 | 29867 | KR 96A | CL 40 SUR | CL 40 BIS SUR | 49,66 | 6 | CALZADA | 5,14 | 34,54 | 177,45 | Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Instalación parcial de concreto de 3000psi. Andén occidental: Instalación parcial de concreto de 3000psi. | 15-abr-23 | | | |
| 33 | 8001041 | 156188 | 29870 | 29871 | KR 96A | CL 40A SUR | CL 40B SUR | 48,3 | 6 | CALZADA | 5,11 | 32,2 | 164,5 | Calzada: Instalación de base estabilizada, fresado de cargue de pozo. Andén oriental: Remate parcial en fachadas. Andén occidental: Remate parcial en fachadas. | 20-feb-23 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 8000709 | 156232 | 29958 | 29959 | KR 98C | CL 40 SUR | CL 40A SUR | 46,42 | 6 | CALZADA | 4,09 | 53,43 | 218,4 | Sin iniciar | 10-ago-23 | | | | | |
| 35 | 8000742 | 156233 | 29960 | 29961 | KR 98C | CL 40A SUR | CL 41 SUR | 46,42 | 6 | CALZADA | 4,68 | 67,2 | 314,77 | Sin iniciar | 27-jul-23 | SIN PMT | | | | |
| 36 | 8000619 | 156053 | 29672 | 29673 | KR 99A BIS | CL 40 SUR | CL 38 C SUR | 47,12 | 6 | CALZADA | 4,78 | 90,92 | 434,69 | Sin iniciar | No se tiene programación por CIV | | | | | |
| 37 | 8011974 | 156971 | 31024 | 31025 | CL 42A BIS SUR | KR 94A | KR 95 | 29,9 | 6 | CALZADA | 2,52 | 81,18 | 204,44 | Sin iniciar | No se tiene programación por CIV | | | | | |
| 38 | 8011973 | 156970 | 31022 | 31023 | CL 42A BIS SUR | KR 93C | KR 94A | 29,9 | 6 | CALZADA | 2,18 | 89,41 | 194,58 | Sin iniciar | No se tiene programación por CIV | | | | | |
| 39 | 8000584 | 156058 | 29682 | 29683 | KR 93C BIS | CL 40 SUR | CL 38C SUR | 46,42 | 6 | CALZADA | 3,87 | 85,64 | 331,62 | Sin iniciar | 10-jul-23 | SIN PMT | | | | |
| 40 | 8013353 | 156943 | 30958 | 30959 | KR 96B | CL 42A SUR | CL 42F SUR | 65,55 | 6 | CALZADA | 3,13 | 143,02 | 448,03 | Sin iniciar | 2-may-23 | SIN PMT | | | | |
| 41 | 8011950 | 156942 | 30966 | 30967 | KR 95B | CL 42B SUR | CL 42F SUR | 29,06 | 6 | CALZADA | 3,94 | 81,9 | 322,33 | Sin iniciar | No se tiene programación por CIV | | | | | |
| 42 | 8011949 | 156941 | 30964 | 30965 | KR 95A | CL 42B SUR | CL 42F SUR | 27,35 | 6 | CALZADA | 3,28 | 83,12 | 272,55 | Sin iniciar | No se tiene programación por CIV | | | | | |
| 43 | 8002595 | 155838 | 29246 | 29247 | CL 42B SUR | KR 91 | KR 90A BIS | 33,9 | 6 | CALZADA | 3,04 | 104,89 | 319,35 | Sin iniciar | No se tiene programación por CIV | | | | | |

## 3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

**1. COMPONENTE TÉCNICO:**

**1.1. ACTIVIDADES TECNICAS DE INTERVENTORÍA**

- Calificación diaria del PMT instalado acorde con la aprobación de la SDM, la calificación para el presente periodo es de 91%
- Mesas de trabajo internas con el director de Interventoría para definir los lineamientos de revisión de documentos del contratista. Coordinación con las áreas SST, Social y Ambiental, para la elaboración de los documentos entregados por la Interventoría en el Periodo.
- Elaboración de memorandos para comunicaciones internas y otras dirigidas al Contratista con los productos revisados en el periodo.
- Revisión de los informes diarios de inspección y memorias de cálculo de las cantidades de obra, diligenciamiento de la bitácora.
- Reporte diario de cantidades para el seguimiento de la programación

**1.2 Seguimiento a las actividades del contratista**

La Interventoría realizó el seguimiento de:

- **P4:**Calzada: Instalación de fresado estabilizado. Andén oriental: Instalación parcial de concreto de 3000psi. Andén occidental: Sin actividades
- **P32:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Instalación parcial de concreto de 3000psi. Andén occidental: Instalación parcial de concreto de 3000psi.
- **P33:**Calzada: Instalación de base estabilizada, nivelación de cargue de pozo. Andén oriental: Remate parcial en fachadas. Andén occidental: Remate parcial en fachadas.
- **P28:**Calzada: Excavación manual en intersección, nivelación y compactación de sub-rasante en intersección. Andén oriental: Instalación de concreto de 3000psi, nivelación e instalación de marcos en cajas de inspección. Andén occidental: Instalación de concreto de 3000psi, nivelación e instalación de marcos en cajas de inspección.
- **P29:**Calzada: Excavación manual en intersección, nivelación y compactación de sub-rasante en intersección. Andén oriental: Instalación de concreto de 3000psi, nivelación e instalación de marcos en cajas de inspección. Andén occidental: Instalación de concreto de 3000psi, nivelación e instalación de marcos en cajas de inspección.
- **P24:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental:Sin actividades.
- **P25:**Calzada: Nivelación de fresado. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.
- **P21:**Calzada: Nivelación de fresado estabilizado segunda capa. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.
- **P22:**Calzada: Nivelación parcial de fresado. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
- **P3:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.
- **P13:**Calzada: Sin actividad. Andén occidental: Instalación parcial de concreto de 3000psi.Andén oriental: Instalación parcial de concreto de 3000psi.
- **P14:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Instalación parcial de concreto de 3000psi. Andén occidental: Sin actividad.
- **P17:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Instalación de concreto 4000psi. Andén occidental: Instalación de concreto 4000psi.
- **P18:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Instalación de concreto 4000psi, instalación parcial de concreto de 3000psi. Andén occidental: Instalación parcial de concreto de 3000psi.
- **P30:** Calzada: Excavación manual para instalación de tubería 12", instalación de tubería corrugada de 12", de arena de peña, de geotextil, geo-celda, de fresado y de base estabilizada. Andén oriental: Instalación de concreto de 3000psi. Andén occidental: Instalación de concreto de 3000psi.
- **P31:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Instalación de concreto de 3000psi, instalación parcial de concreto de 4000psi. Andén occidental: Instalación parcial de concreto de 3000psi, instalación parcial de concreto de 4000psi.
- **P12:**Calzada: Instalación de bordillo A-80, excavación para instalación de bordillo A-80. Andén oriental: Instalación de fresado y geotextil, excavación manual. Andén occidental: Instalación de fresado y geotextil, excavación manual, instalación de cajillas de medidor Bund, instalación de concreto de 3000psi.
- **P15:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Demolición de concreto y se realiza excavación manual parcial.
- **P16:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
- **P26:**Calzada: Excavación manual para instalación de tubería de 12", instalación de tubería movistar, de arena de peña para recubrimiento de tubería movistar, de geotextil en intersección, geo- celda, fresado para lleno de geo-celda, fresado estabilizado. Andén oriental: Demolición manual, excavación manual en anden. Andén occidental: Demolición manual y excavación manual en anden.
- **P27:**Calzada: Excavación manual en intersección, instalación de geotextil, geoceldа y fresado para lleno de geoceldа en intersección, instalación de base estabilizada, de tubería corrugada de 12", instalación de arena de peña. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.

**1.3 ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA**

- Presentación del mensual técnico No.8 de la Interventoría correspondiente al periodo 1 al 31 de mayo de 2023.
- Participación del comité de seguimiento interno y del comité de seguimiento No.42.
- Seguimiento de las actividades que ejecute el Contratista en obra, diligenciamiento de bitácora, revisión y aprobación de los informes diarios del inspector. Calificación semanal del PMT.
- Calificación semanal de PMT y evaluación diaria de cantidades
- Revisión del acta parcial de obra No.9 del Contratista.

**2. COMPONENTE AMBIENTAL**

- El 12 de julio, se realiza en el comité interno celebrado en las instalaciones de la Vialidad, de manera virtual donde se manifestó lo encontrado en la obra y sobre el avance en el tema documental sobre los informes semanales y mensual.
- El 18 de julio, se realizó visita de seguimiento ambiental y SST, llevado a cabo en obra, el recorrido y posterior reunión de comité, se realizaron observaciones aluvinas al cerramiento ambiental y senderos peatonales, limpieza de la malla azul de protección en los sumideros y se recalca sobre la calidad en la ejecución y presentación de los informes mensuales a la interventoría.
- Para la presente semana la calificación del componente del contratista fue del 100% en todos los Items de las fichas de seguimiento ambiental y SST.
- En la presente semana se dispuso 60m3 de material de excavación, con el gestor LAMD.
- Para la presente semana no se dispuso material fresado en la obra proveniente del patio IDU y de la UMV
- Se utilizó concreto premezclado para los anderes de la vía, en la semana se utilizaron 54m3.
- Se realiza la revisión del correspondiente informe semanal del contratista, se generan observaciones y una vez subsanadas, se da aprobación mediante correo electrónico a la residente ambiental del contratista.

El Contratista realizó las siguientes actividades:

- Recorrido en los P28, P29, P24, P25, P21, P22, P3, P13, P14, P17, P18, P32, P33, P4, P30, P31, P12, P15, P16, P26, P27 Y ACOPIO para verificar en obra que se esté cumpliendo con lo establecido en el MAO.
- Revisión de los puntos ecológicos instalados en los P28, P29, P24, P25, P21, P22, P3, P13, P14, P17, P18, P32, P33, P4, P30, P31, P12, P15, P16, P26, P27 y se realiza la verificación de cumplimiento con la separación de los residuos en las bolsas.
- Mantenimiento de la malla azul en sumideros.
- Se realiza orden y aseo en los P28, P29, P24, P25, P21, P22, P3, P13, P14, P17, P18, P32, P33, P4, P30, P31, P12, P15, P16, P26, P27 y acopio.
- Inducción ambiental y socialización de política integral.
- Comité de seguimiento.
- Recolección de material escombro.
- Delimitación de senderos peatonales en P28, P29, P24, P25, P21, P22, P3, P13, P14, P17, P18, P32, P33, P4, P30, P31, P12, P15, P16, P26, P27.
- Aprovechamiento de material fresado en los frentes de obra.

**3. COMPONENTE SST**

**3.1. ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA EN MATERIA SST**

**INFORMACIÓN DEL PERSONAL**

| Ingreso | Antiguos | Retiros | TOTAL, PERSONAL ACTIVO EN LA SEMANA REPORTADA: |
|---|---|---|---|
| Consorcio SCLV = 0 | 1. Consorcio SCLV = 22 | 0 | 52 |
| | 2. Silva Carreño y Asociados S.A.S = 10 | | |
| | 3. La Vialidad Limitada = 13 | | |
| | 4. Cansa Ingeniería Ltda = 1 | | |
| | 5. J.V.R Estudios = 1 | | |
| | 6. Geovial Limitada = 5 | | |

**3.2 AUSENTISMO DE PERSONAL**

Durante el desarrollo de las actividades de la semana del 13 de julio de 2023 al 19 de julio de 2023, no se presentó ausentismo del personal de la Interventoría.

**3.3 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA**

- El 13 de julio de 2023 se llevó a cabo recorrido de obra con el FDLK, Interventoría y Contratista, donde se evidenció que el personal que estaba realizando actividades, corresponde al aprobado por la Interventoría, en las diferentes prioridades intervenidas se observaron equipos para la atención de emergencias (Botiquín, extintor y camilla) e información de conformación de brigada de emergencias. Sin embargo se evidencia que hay varias prioridades que están sin actividades de obra.
- El 13 de julio de 2023 se llevó a cabo comité semanal de seguimiento en el FDLK, Interventoría Consorcio SCLV y Contratista XIE SA, donde en el componente SST informó el avance de las actividades realizadas en las prioridades que están siendo intervenidas, revisión del estado del informe mensual N°8, documentos de ingreso de personal calificación mensual semanal, observaciones a informes, ingreso de personal de obra, indicadores de rotación y ausentismo del personal de obra.
- El 18 de julio de 2023 los componentes SST, ambiental, social y técnico de la Interventoría y contratista realizaron recorrido de obra donde se evidenció que el personal que estaba realizando actividades, corresponde al aprobado por la Interventoría.
- Al momento de la visita de obra por parte del componente SST se evidencia lo siguiente:

**P32:**Sin actividades de obra, sendero peatonal definido.
**P33:**Adecuación de sumideros, sendero peatonal definido. Se evidencia que el contratista cuenta con punto ecológico (3 Bolsas), kit para la atención de emergencias (Botiquín, extintor y camilla), punto de hidratación, señalización referente a rutas de emergencia y recomendaciones sobre el uso de EPP. El personal hace uso de sus EPP y elementos de identidad visual.
**P4:**Sin actividades de obra, sendero peatonal definido.
**P28:**Sin actividades de obra, sendero peatonal definido.
**P29:**Adecuación de esquina para espacio público, sendero peatonal definido. Se evidencia punto ecológico, de hidratación, kit de emergencias, señalización a rutas de emergencia y recomendaciones sobre el uso de EPP. El personal hace uso de EPP y elementos de identidad visual.
**P30:** Sin actividades de obra. se solicita al contratista retirar bordillos rotos del sendero peatonal, ajustar platones y limpiar su señalización. Se evidencia punto ecológico (3 Bolsas), de hidratación, kit de emergencias, señalización a rutas de emergencia y recomendaciones sobre el uso de EPP.
**P31:** Actividades de espacio público, se solicita orden y aseo del frente de obra, sendero peatonal definido. Se evidencia señalización a rutas de emergencia y recomendaciones sobre el uso de EPP. El personal hace uso de EPP y elementos de identidad visual, sin embargo se solicitó la reposición de botas de un trabajador.
**P3:** Sin actividades de obra, sendero peatonal definido.
**P24:** Sin actividades de obra, sendero peatonal definido.
**P25:** Sin actividades de obra, sendero peatonal definido.
**P26:** Actividades de espacio público, sendero peatonal definido. Se evidencia punto ecológico (3 Bolsas), de hidratación, kit de emergencias, señalización a rutas de emergencia y recomendaciones sobre el uso de EPP. El personal hace uso de sus EPP y elementos de identidad visual.
**P27:** Sin actividades de obra, sendero peatonal definido.
**P21:** Se evidencia recolección de material con mini cargador y volqueta, también limpieza del frente de obra, sendero peatonal definido
**P22:**Sin actividades de obra, sendero peatonal definido.
**P17:** Adecuación de espacio público para la instalación de concreto, sendero peatonal definido. Se evidencia señalización a rutas de emergencia y recomendaciones sobre el uso de EPP. El personal hace uso de sus EPP y elementos de identidad visual.
**P18:** Actividades de espacio público, sendero peatonal definido. Se evidencia punto ecológico (3 Bolsas), de hidratación, kit de emergencias, señalización a rutas de emergencia y recomendaciones sobre el uso de EPP. El personal hace uso de sus EPP y elementos de identidad visual
**P13:** Terminación de fachadas, sendero peatonal definido. Se evidencia punto ecológico (3 Bolsas), de hidratación, kit de emergencias, señalización a rutas de emergencia y recomendaciones sobre el uso de EPP. El personal hace uso de sus EPP y elementos de identidad visual.
**P14:** Sin actividades de obra, sendero peatonal definido.
**P15:** Actividades de espacio público, sendero peatonal definido. Se evidencia punto ecológico (3 Bolsas), de hidratación, kit de emergencias, señalización a rutas de emergencia y recomendaciones sobre el uso de EPP. El personal hace uso de sus EPP y elementos de identidad visual
**P16:** Sin actividades de obra, sendero peatonal definido.
**P12:** Instalación de concreto, sendero peatonal definido. Se evidencia punto ecológico (3 Bolsas), de hidratación, kit de emergencias, señalización a rutas de emergencia y recomendaciones sobre el uso de EPP. El personal hace uso de sus EPP y elementos de identidad visual.

- Como recomendaciones generales se solicitó al contratista que en las diferentes prioridades intervenidas se haga una recolección del material sobrante que no se esté utilizando. Por lo anterior se realizó comité de seguimiento Ambiental-SST presencial, donde se revisó la gestión SST y las actividades que ejecuto el contratista en la semana y se realizó registro en el formato FOAC 32.
- Durante la semana se revisaron documentos de ingreso del personal de obra, correspondientes a contratos, exámenes médicos ocupacionales de ingreso, certificaciones de afiliación al Sistema General de Seguridad Social Integral (AFP, ARL, CCF, EPS), notificación de riesgos e inducciones.
- El 17 de julio de 2023 la Interventoría como parte de la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo realizó pausas activas con ejercicios cardiovasculares.
- El 17 de julio de 2023 la Interventoría como parte de la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo socializó con el personal información sobre autocuidado "El dedo gordo: soporte del cuerpo", teniendo en cuenta que el dedo gordo del pie es el encargado del desgaste, equilibrio y el soporte del cuerpo a la hora de caminar
- El 19 de julio de 2023 se llevó a cabo comité semanal de seguimiento en el FDLK, Interventoría Consorcio SCLV y Contratista XIE SA, donde en el componente SST informó el avance de las actividades realizadas en las prioridades que están siendo intervenidas, revisión del estado del informe mensual N°8, documentos de ingreso de personal calificación mensual semanal, observaciones a informes, ingreso de personal de obra, indicadores de rotación y ausentismo del personal de obra.
- Durante la semana se realizó seguimiento al uso adecuado de los EPP y elementos de identidad visual del personal de interventoría.

**3.5 ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA EN MATERIA SST**

**INFORMACIÓN DEL PERSONAL**

| Ingreso | | Antiguos | Retiros | PERSONAL ACTIVO EN LA SEMANA REPORTADA |
|---|---|---|---|---|
| XIE S.A = 1 | 1. XIE S.A = 44 | 1. XIE S.A = 1 | 107 | |
| AGL CONSTRUCCION SAS = 1 | 2. NOVA TOPOSMAR S.A.S. = 8 | 2. AGL CONSTRUCCION SAS = 1 | | |
| Redes y sistemas de la construcción EJ S.A.S = 5 | 3. PLANEACIÓN EN INGENIERIA S.A.S = 1 | 3. Redes y sistemas de la construcción EJ S.A.S = 1 | | |
| | 4. JRT DISEÑOS ESTRUCTURALES S.A.S = 1 | | | |
| | 5. DISEÑOS GEOTECNICOS S.A.S = 1 | | | |
| | 6. JOSE ARGEON MORA SERRANO = 12 | | | |
| | 7. R.A.C PETREOS S.A.S = 1 | | | |
| | 8. INPASUELC LTDA = 2 | | | |
| | 9. INGCONDR S.A.S = 7 | | | |
| | 10. Redes y sistemas de la construcción EJ S.A.S = 13 | | | |
| | 11. AGL CONSTRUCCION SAS = 7 | | | |

**3.6 AUSENTISMO DE PERSONAL**

Durante el desarrollo de las actividades de la semana del 13 de julio de 2023 al 19 de julio de 2023, el contratista reportó el ausentismo del siguiente personal:

| Nombre del trabajador | Cargo | Días de ausencia | Motivo |
|---|---|---|---|
| Dagoberto Monroy Palma | Ayudante De Obra | 1 | Permisos no remunerado |
| Sandra Patricia Méndez | Auxiliar De Trafico | 2 | Enfermedad General |
| Luz Adriana Vásquez | Auxiliar De Trafico | 1 | Permisos no remunerado |
| Cristian Davis Ospino Castro | Oficial | 4 | Permisos |

**N° de días de ausencia** = 5
**N° de días de trabajo programados** = 6
**N° Trabajadores en la semana** = 41
**% de ausentismo** = 2,03%
Es así como se evidencia que el 2,03% de los cargos relacionados anteriormente estuvieron asentes en la semana.

**3.7 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA**

- El contratista realizó inducción al personal que ingreso a laborar en el periodo del presente informe donde se presentan las Generalidades sobre el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), Estructura Organizacional - Reglamento Interno de Trabajo - Reglamento de Higiene Industrial - Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo, alcohol, drogas y tabaquismo - Aspectos legales relacionados con la SST. Condiciones de salud y medicina laboral, Higiene y seguridad industrial - Identificación de peligros, Uso de EPP. Matriz de peligros entre otros.
- El contratista hace la notificación de ingreso al personal que ingreso a laborar a los cuales se encuentra expuesto relacionados con su cargo
- El Contratista realizo la entrega de dotación y EPP al personal que ingreso a laborar al contrato COP 621-2022, también realizo la socialización del uso obligatorio durante el desarrollo de las actividades de obra.
- El Contratista mediante comunicación INGE22-621-769 remite el Informe semanal No. 40 del 08 al 12 de julio de 2023 Componente SST. Sin embargo este ya había sido revisado por la Interventoría, teniendo en cuenta que fue insumo para el informe semanal SST del Consorcio SCLV
- El Contratista en cumplimiento del cronograma de actividades SG-SST realizó identificación de sustancias químicas, inspección del Kit de Emergencia, inspección de EPP, capacitación manejo de extintor y equipos de emergencia, capacitación en autocuidado, capacitación acerca de la normatividad de política de prevención de consumo de drogas, sustancias psicoactivas, alcohol y tabaco, horario de trabajo, funciones del personal BOAL
- El Contratista informa la siguiente novedad *"El subcontratista AGL Construcción SAS representante legal Luis Miguel Arroyo el día 14 de julio de 2023 comunica al área SST que el trabajador Brayan David Matute en el cargo de ayudante, se retiró el día 10 de julio de 2023, siendo este su último día laborado".*
De igual manera el Contratista informa la siguiente novedad *"La aprobación por parte del área de maquinaria para el ingreso a obra del trabajador Alfonso Lozano Méndez en el cargo de operador de Mini cargador de la empresa XIE S.A, se dio el día 17 de julio de 2023, por lo anterior, este día ingresa el trabajador"*
- El Contratista realizo cerramiento de áreas de trabajo y elaboración de escalones para garantizar el ingreso a las viviendas y seguimiento y revisión al uso adecuado de la dotación y EPP de todo el personal vinculado al contrato de obra.

**4.COMPONENTE SOCIAL**

**4.1 Programa de Servicio a la Ciudadanía**

- Se evidencia que durante el periodo el contratista, continua con la Atención del punto PAC en el horario de lunes a viernes de 8.00 am a 4.00 pm, así como la línea telefónica y correo electrónico.
- El 12 de julio se realizo el cierre del derecho de petición No 3 interpuesto por el señor Cristian Lombarna a satisfacción del peticionario.
- El 12 de julio se realizó el cierre del derecho de petición No 4 interpuesto por la señora Angelica Gómez a satisfacción de la peticionaria.
- Se realizó recorrido urbano el 13 de julio en las prioridades 28,29,24,25,22,21,13,14, 3, 17,18,4,32, 33, 31, 32 ,12,15,16,26 y 27. Se verificó la actualización de vallas informativas móviles y de los puntos satélites de información. Se recepcionaron las PQRSD Nos 19,20 y 21.
- El 13 julio durante el recorrido urbano, se recepcionó la PQRSD No 19 a la señora María Angela Solar Parra, quien solicita sea arreglada la junta de la rampa y el escalón ya que se encuentra un espacio de aproximadamente de 1.5 cm. Y por fisura que presenta el escalón entre bordillo y el concreto al costado izquierdo de la puerta. Igualmente solicita que, en vez de instalar concreto en el bordillo de acceso al predio, se instale la tableta ya que la propietaria las entrega. Esta PQRSD se encuentra abierta dentro de los días hábiles para dar respuesta.
- El 13 julio durante el recorrido urbano, se recepcionó PQRSD No 20 a la señora Yuslen Ramírez de la prioridad 14 quien se queja sobre la intervención realizad, ya que en su predio la caja de inspección se rebosa, de igual manera comenta que el acueducto ya se acercó en 2 ocasiones, y el día que se acercó el vactor no había nadie en la casa para atender la visita". Solicita que sea arreglada la caja de inspección. Esta PQRSD se encuentra abierta dentro de los días hábiles para dar respuesta.
- El 13 julio se recepcionó la PQRSD No 21 interpuesta por parte del señor Oscar Muñoz, en el punto de atención al ciudadano, quien expreso que por la obra presenta malos olores, peligro en el paso, problema de roedores y se devuelve el fresado por cocina y lavadero, esto sucede que se excavo el espacio público desde el día 24 de junio aproximadamente, en el cual no se evidencia avance de obra". El 19 de julio del 2023 se realizó la instalación de concreto en la rampa vehicular. Esta PQRSD se encuentra abierta dentro de los días hábiles para dar respuesta.
- Se realizó recorrido urbano el 18 de julio en las prioridades 28,29,24,25,22,21,13,14, 3, 17,18,4,32, 33, 31, 32 ,12,15,16,26 y 27. Se verificó la actualización de vallas informativas móviles y de los puntos satélites de información. Se recepcionaron las PQRSD No 22.
- En visita al punto de atención al ciudadano se revisó y firmó soportes de la gestión social y se actualizo la bitácora social.
- El 18 julio durante el recorrido urbano se recepcionó la PQRSD No 22 al señor Néstor Hernández de la prioridad 29 quien solicita "la adecuación de los terminados de la caja de inspección, y el arreglo de la tapa". Esta PQRSD se encuentra abierta dentro de los días hábiles para dar respuesta.

**4.2 Programa de diálogo y participación ciudadana**

- Revisión de la presentación para el comité FDLK No. 7

**4.3 Programa de acompañamiento técnico**

- Levantamiento de 3 actas de compromisos sociales en el tema de afectación de espacio público, en la cual se informó al propietario sobre la afectación en el espacio público y la fecha del arreglo del 12 al 18 de julio.
- Levantamiento de 29 actas de vecindad en la prioridad 43 del tramo de la calle 42 B sur desde la carrera 91 hasta la calle 90 A Bis del 12 al 18 de julio.

**4.4 Programa de cultura ciudadana**

- Se aprobó por parte de la interventoría de la metodología de capacitación a personal de obra en el tema comunicación asertiva.
- Se aprobó por parte de la interventoría de la metodología del taller de reconocimiento de funciones del FDLK.
- Se llevo a cabo la capacitación a personal de obra el 14 de julio en el tema de comunicación asertiva, con la participación de 50 trabajadores
- Se realizó el taller de cultura ciudadana el 15 de julio, en el tema de reconocimiento de funciones del FDLK, en el cual participaron 23 personas de la comunidad, entre miembros del comité FDLK y representantes de juntas de acción comunal.

**4.5 Programa de gobernanza para la movilidad**

- Se cumple con el porcentaje de contratación de mano de obra no calificada de la localidad y de contratación de mujeres de acuerdo a lo requerido por la minuta del contrato.

**4.6 Programa de información para el desarrollo del proyecto**

- El 17 de julio se realizó la reinstalación de volantes informativos en los puntos satélites de información a saber:

Volante # 64 de recomendaciones de espacio público se realizó la entrega predio a predio 37 en las prioridades 26-27
Volante de inicio de obra (propalcote) se instaló 5 en las prioridades 15-16-12-26-27
Volante # 88 de inicio de espacio público se instaló 2 en los puntos satélites de información en las prioridades 26-27 y se realizó la entrega predio a predio
Volante PMT # 1 se instaló 4 en las prioridades /28-29/-3/-/24-25/-/21-22/
Volante PMT # 2 se instaló 4 en las prioridades /17-18/-/13-14/
Volante PMT # 3 se instaló 4 en las prioridades /30-31/
Volante PMT # 4 se instaló 3 en las prioridades /4-32-33/
Volante PMT # 5 se instaló 4 en las prioridades /26-27-15-16/
Volante # 90 recomendaciones de asfalto 100 entregadas predio a predio de las prioridades /22-24-25-3/ y su instalación en los puntos satélites de información
Divulgación del volante # 82 de convocatoria a levantamiento de actas de vecindad a 32 predios de la prioridad 38
El porcentaje de avance de obra es el 28% y faltan 77 dias para terminación de las mismas el cual fue registrado en las vallas informativas móviles.

**4.7 Comités**

- Se realizó el comité de seguimiento social No 40 en el punto de atención al ciudadano, el 18 de julio.
- Se participó en el comité de seguimiento interno No 34 el 12 de julio a través de la plataforma teams a las 2 p.m.

**4.8 Otros**

- Se proyecto memorando 058 de aprobación de actas de vecindad de la prioridad 1, el 12 de julio.
- Se aprobó por parte de la interventoría el informe semanal No 40 versión 1 el 12 de julio.
- Se aprobó por parte de la interventoría del volante No 88 de inicio de espacio público en las prioridades 26,27 el 14 de julio.
- Se proyecto memorando 060 de aprobación al informe mensual social No 9 versión 2 del contratista, el 18 de julio.

**ASPECTOS ADMINISTRATIVOS / LEGALES**

## 4. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES (CAUSAS ATRASO, ETC.)

**OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES:**

## 5. ANEXOS

| | SI | NO |
|---|---|---|
| 1. Cronograma en Ms Project | X | |
| 2. Registro Fotográfico | X | |
| 3. Avance | X | |

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los diecinueve (19) (Día en letras) (Día en números)

días del mes de julio (Mes en letras) de 2023 (Año de firma del informe)

(Nombre y firma) Néstor Manuel Silva Rojas
Director de Interventoría

**FORMATO**

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY**

**ÁREA DE INFRAESTRUCTURA**

**SEMANA No.** 41 **DEL** 13 de julio de 2023 **AL** 19 de julio de 2023

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No** 717 de 2022 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 621 de 2022 (Número de Contrato)

**REGISTRO FOTOGRAFICO**




Descripción Foto 1.

**CIV: No.18- 8000839**
**Localización:** KR 97F entre CL 40a SUR y CL 41 SUR
**Descripción:** : Instalación de concreto de 3000psi en anden




Descripción Foto 2.

**CIV: No.13 - 8000772**
**Localización:** KR 98 entre CL 40 SUR y CL 40A SUR
**Descripción:** Sin actividad




Descripción Foto 3.

**CIV: No.28 - 8000929**
**Localización:** KR 97 entre CL 40 SUR y CL 40A SUR
**Descripción:** Instalación de concreto de 3000psi en anden.




Descripción Foto 4.

**CIV: No.29 - 8000996**
**Localización:**KR 97 entre CL 40A SUR y CL 41 SUR
**Descripción:** Instalación de concreto 3000psi en anden de ambos costados.




Descripción Foto 5.

**CIV: No.25 - 8000923.**
**Localización:** KR 97B entre CL 40A SUR y CL 41 SUR
**Descripción:** Sin actividad




Descripción Foto 6.

**CIV: No.17 - 8000794.**
**Localización:** KR 97F entre CL 40 SUR y CL 40A SUR
**Descripción:** Instalación de concreto de 3000psi en anden ambos costados.




Descripción Foto 7.

**CIV: No.3 - 8000957**
**Localización:** KR 97A entre CL 41 SUR y CL 40A SUR
**Descripción:** Limpieza de sumideros en calzada




Descripción Foto 8.

**CIV: No.14 - 8000794**
**Localización:** KR 97F entre CL 40 SUR y CL 40A SUR
**Descripción:** Sin actividad

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY**

**ÁREA DE INFRAESTRUCTURA**




Descripción Foto 9.

**CIV: No.32 - 8000979.**
**Localización:** KR 97D entre CL 41A SUR y CL 41 SUR
**Descripción:** Instalación de concreto de 3000psi en anden costado oriente.




Descripción Foto 10.

**CIV: No.24 - 8000871.**
**Localización:** KR 97B entre CL 40 SUR y CL 40A SUR
**Descripción:** Sin actividad




Descripción Foto 11.

**CIV: No.27 - 8001052**
**Localización:** KR 97B entre CL 42 SUR Y 42 A SUR
**Descripción:** Instalación de geotextil, geo-celda y fresado parra lleno de geo-celda en calzada




Descripción Foto 12.

**CIV: No.33 - 80001041.**
**Localización:** KR 96A entre CL 40A SUR y CL 40B SUR
**Descripción:** Instalación y compactación de base estabilizada en calzada.




Descripción Foto 13.

**CIV: No.30 - 8001058**
**Localización:** KR 97 entre CL 41 SUR y CL 42 SUR
**Descripción:** Instalación de geo-celda y fresado para lleno de geo-celda en intersección




Descripción Foto 14.

**CIV: No.31 - 8001125.**
**Localización:** KR 97 entre CL 42 SUR y CL 42A SUR
**Descripción:**Instalación parcial de concreto de 4000psi




Descripción Foto 15.

**CIV: No.12 - 8000849**
**Localización:** KR 98B entre CL 42 SUR y CL 42A SUR
**Descripción:** Instalación de concreto de 300psi.




Descripción Foto 16.

**CIV: No.15 - 8000856.**
**Localización:** KR 98 entre CL 41 SUR y CL 42 SUR
**Descripción:** Excavación manual en anden costado occidente

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY**

**ÁREA DE INFRAESTRUCTURA**




Descripción Foto 17.

**CIV: No.21 - 8000821**
**Localización:** KR 97D entre CL 40A SUR y CL 41 SUR
**Descripción:** Sin actividad




Descripción Foto 18.

**CIV: No.4 - 8001069**
**Localización:** KR 96A entre CL 41 SUR y CL 40b SUR
**Descripción:** Instalación de concreto de 3000psi en anden costado oriente.




Descripción Foto 19.

**CIV: No.16 - 8000907**
**Localización:** KR 98 entre CL 42 SUR Y 42 A SUR
**Descripción:** Sin actividad




Descripción Foto 20.

**CIV: No.26 - 8000988**
**Localización:** KR 97B entre CL 41 SUR Y 42 SUR
**Descripción:** Instalación de tubería corrugada de 12 pulgadas por ambos costados de la calzada.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente anexo bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

diecinueve (Día en letras) ( 19 ) (Día en números) días del mes de julio (Mes en que se firma el acta) de 2023 (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) Juan Manuel Alba Rojas

Director de Interventoría.

Nombre de la firma interventora


## CONSORCIO SCLV

NIT 900.547.145-2

## EVALUACIÓN CON PROGRAMACIÓN INICIAL - GRUPO 1

## SEGUIMIENTO AL 18-JULIO-2023


| P | CIV | VALOR CIV | PROG-ACUM ($) | PROG-ACUM (%) | EJEC-ACUM ($) | EJEC-ACUM (%) | PESO EJEC PROG (%) | ATRASO (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 8000929 | $ 349.737.154,00 | $ 286.285.298,00 | 2,36% | $ 248.038.489,35 | 2,05% | 70,92% | -0,32% |
| 29 | 8000996 | $ 276.918.878,00 | $ 242.229.956,95 | 2,00% | $ 247.728.689,93 | 2,04% | 89,46% | 0,05% |
| 24 | 8000871 | $ 282.489.045,00 | $ 269.517.473,15 | 2,22% | $ 253.096.535,66 | 2,09% | 89,60% | -0,14% |
| 25 | 8000923 | $ 398.643.978,00 | $ 345.626.779,89 | 2,85% | $ 208.705.995,46 | 1,72% | 52,35% | -1,13% |
| 13 | 8000772 | $ 298.711.275,00 | $ 289.860.253,15 | 2,39% | $ 189.481.147,08 | 1,56% | 63,43% | -0,83% |
| 14 | 8000814 | $ 428.629.368,00 | $ 414.590.745,60 | 3,42% | $ 260.332.131,06 | 2,15% | 60,74% | -1,27% |
| 17 | 8000794 | $ 365.563.428,00 | $ 305.729.990,38 | 2,52% | $ 211.455.835,02 | 1,74% | 57,84% | -0,78% |
| 18 | 8000839 | $ 444.842.291,00 | $ 414.390.409,14 | 3,42% | $ 220.824.624,34 | 1,82% | 49,64% | -1,60% |
| 21 | 8000821 | $ 395.944.862,00 | $ 379.185.734,00 | 3,13% | $ 231.576.216,77 | 1,91% | 58,49% | -1,22% |
| 22 | 8000864 | $ 474.960.513,00 | $ 407.701.220,24 | 3,36% | $ 332.683.700,61 | 2,74% | 70,04% | -0,62% |
| 3 | 8000957 | $ 346.941.971,00 | $ 324.515.767,59 | 2,68% | $ 318.567.533,03 | 2,63% | 91,82% | -0,05% |
| 33 | 8001041 | $ 164.541.658,00 | $ 148.920.206,67 | 1,23% | $ 111.041.660,81 | 0,92% | 67,49% | -0,31% |
| 4 | 8001069 | $ 183.856.740,00 | $ 154.073.695,45 | 1,27% | $ 69.089.499,53 | 0,57% | 37,58% | -0,70% |
| 16 | 8000907 | $ 378.482.383,00 | $ 361.864.228,92 | 2,98% | $ 29.056.430,62 | 0,24% | 7,68% | -2,74% |
| 15 | 8000856 | $ 318.778.666,00 | $ 314.966.117,90 | 2,60% | $ 58.544.904,26 | 0,48% | 18,37% | -2,11% |
| 26 | 8000988 | $ 312.106.601,00 | $ 248.815.938,04 | 2,05% | $ 82.858.292,62 | 0,68% | 26,55% | -1,37% |
| 32 | 8000979 | $ 384.241.540,00 | $ 313.656.771,99 | 2,59% | $ 66.948.341,53 | 0,55% | 17,42% | -2,03% |
| 30 | 8001058 | $ 167.606.525,00 | $ 151.794.191,30 | 1,25% | $ 131.840.154,49 | 1,09% | 78,66% | -0,16% |
| 31 | 8001125 | $ 347.840.618,00 | $ 307.025.458,10 | 2,53% | $ 108.772.480,07 | 0,90% | 31,27% | -1,63% |
| 27 | 8001052 | $ 394.454.974,00 | $ 379.247.233,34 | 3,13% | $ 51.565.343,18 | 0,43% | 13,07% | -2,70% |
| 12 | 8000849 | $ 353.440.216,00 | $ 295.012.954,84 | 2,43% | $ 68.452.350,65 | 0,56% | 19,37% | -1,87% |
| 8 | 8002417 | $ 436.309.464,00 | $ 433.765.201,90 | 3,58% | $ 0,00 | 0,00% | 0,00% | -3,58% |
| 9 | 8002500 | $ 341.127.565,00 | $ 331.158.979,28 | 2,73% | $ 0,00 | 0,00% | 0,00% | -2,73% |
| 27 | 8001052 | $ 455.180.038,00 | $ 384.495.380,79 | 3,17% | $ 0,00 | 0,00% | 0,00% | -3,17% |
| 12 | 8000849 | $ 307.654.668,00 | $ 417.435.434,91 | 3,44% | $ 0,00 | 0,00% | 0,00% | -3,44% |
| 23 | 8000916 | $ 389.375.082,00 | $ 341.149.570,13 | 2,81% | $ 0,00 | 0,00% | 0,00% | -2,81% |
| 5 | 8000655 | $ 464.716.467,00 | $ 348.394.631,94 | 2,87% | $ 0,00 | 0,00% | 0,00% | -2,87% |
| 40 | 8011953 | $ 462.079.926,00 | $ 287.827.654,39 | 2,37% | $ 0,00 | 0,00% | 0,00% | -2,37% |
| 10 | 8011960 | $ 492.144.459,00 | $ 290.895.810,48 | 2,40% | $ 0,00 | 0,00% | 0,00% | -2,40% |
| 35 | 8000743 | $ 769.586.187,00 | $ 259.149.707,20 | 2,14% | $ 0,00 | 0,00% | 0,00% | -2,14% |
| 7 | 8000736 | $ 492.144.459,00 | $ 247.387.219,76 | 2,04% | $ 0,00 | 0,00% | 0,00% | -2,04% |
| 2 | 8001595 | $ 338.872.088,69 | $ 31.823.371,30 | 0,26% | **$ 0,00** | 0,00% | **0,00%** | -0,26% |
| 39 | 8000584 | $ 443.145.175,39 | $ 0,00 | 0,00% | | | | 0,00% |
| 34 | 8000709 | $ 220.339.030,13 | $ 0,00 | 0,00% | | | | 0,00% |
| 35 | 8000743 | $ 291.903.288,68 | $ 0,00 | 0,00% | | | | 0,00% |
| 39 | 8000584 | $ 443.145.176,00 | $ 7.898.674,60 | 0,07% | $ 0,00 | 0,00% | 0 | -0,07% |
| **TOTALES** | | | **$ 9.736.392.061,32** | **80,28%** | **$ 3.500.660.356,08** | **28,86%** | | **-51,41%** |
| **TOTAL DE OBRA** | | | **$ 12.128.504.795,27** | | | | | |

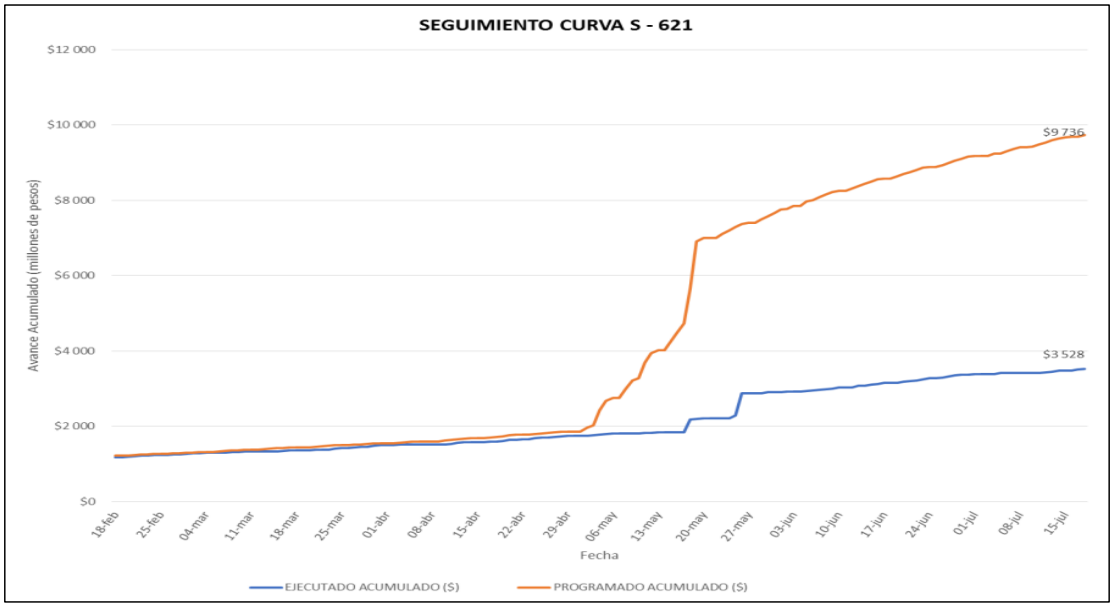


**CONSORCIO SCLV**
**NIT 900.547.145-2**
**EVALUACIÓN POR CIV**

| FECHA EVALUACIÓN | | | 20-jun | 27-jun | 4-jul | 11-jul | 18-jul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | CIV | VALOR TOTAL CIV | % AVANCE DEL CIV | % AVANCE DEL CIV | % AVANCE DEL CIV | % AVANCE DEL CIV | % AVANCE DEL CIV |
| 28 | 8000929 | $ 349.737.154,00 | 69,65% | 69,75% | 70,29% | 70,40% | 70,92% |
| 29 | 8000996 | $ 276.918.878,00 | 88,82% | 88,89% | 88,89% | 88,89% | 89,46% |
| 24 | 8000871 | $ 282.489.045,00 | 89,50% | 89,60% | 89,60% | 89,60% | 89,60% |
| 25 | 8000923 | $ 398.643.978,00 | 52,35% | 52,35% | 52,35% | 52,35% | 52,35% |
| 13 | 8000772 | $ 298.711.275,00 | 60,05% | 62,35% | 62,90% | 62,90% | 63,43% |
| 14 | 8000814 | $ 428.629.368,00 | 59,42% | 60,46% | 60,46% | 60,52% | 60,74% |
| 17 | 8000794 | $ 365.563.428,00 | 51,70% | 52,25% | 52,58% | 52,58% | 57,84% |
| 18 | 8000839 | $ 444.842.291,00 | 48,82% | 48,82% | 49,12% | 49,14% | 49,64% |
| 21 | 8000821 | $ 395.944.862,00 | 57,50% | 57,57% | 57,57% | 57,57% | 58,49% |
| 22 | 8000864 | $ 474.960.513,00 | 70,04% | 70,04% | 70,04% | 70,04% | 70,04% |
| 3 | 8000957 | $ 346.941.971,00 | 91,09% | 91,09% | 91,09% | 91,82% | 91,82% |
| 33 | 8001041 | $ 164.541.658,00 | 52,30% | 61,33% | 65,11% | 65,11% | 67,49% |
| 4 | 8001069 | $ 183.856.740,00 | 32,66% | 32,66% | 35,55% | 36,65% | 37,58% |
| 16 | 8000907 | $ 378.482.383,00 | 7,68% | 7,68% | 7,68% | 7,68% | 7,68% |
| 15 | 8000856 | $ 318.778.666,00 | 10,19% | 13,91% | 16,16% | 18,01% | 18,37% |
| 26 | 8000988 | $ 312.106.601,00 | 3,06% | 17,82% | 21,62% | 23,78% | 26,55% |
| 32 | 8000979 | $ 384.241.540,00 | 14,25% | 16,37% | 16,75% | 16,75% | 17,42% |
| 30 | 8001058 | $ 167.606.525,00 | 63,00% | 65,99% | 66,80% | 66,80% | 78,66% |
| 31 | 8001125 | $ 347.840.618,00 | 21,95% | 25,91% | 26,08% | 26,14% | 31,27% |
| 27 | 8001052 | $ 394.454.974,00 | 0,00% | 5,06% | 8,39% | 11,12% | 13,07% |
| 12 | 8000849 | $ 353.440.216,00 | 10,67% | 13,80% | 15,64% | 15,97% | 19,37% |

| FECHA EVALUACIÓN | | | 18-jul |
|---|---|---|---|
| P | CIV | VALOR TOTAL CIV | %AVANCE DEL CIV |
| 28 | 8000929 | $ 349.737.154,00 | 0,52% |
| 29 | 8000996 | $ 276.918.878,00 | 0,57% |
| 24 | 8000871 | $ 282.489.045,00 | 0,00% |
| 25 | 8000923 | $ 398.643.978,00 | 0,00% |
| 13 | 8000772 | $ 298.711.275,00 | 0,53% |
| 14 | 8000814 | $ 428.629.368,00 | 0,21% |
| 17 | 8000794 | $ 365.563.428,00 | 5,26% |
| 18 | 8000839 | $ 444.842.291,00 | 0,51% |
| 21 | 8000821 | $ 395.944.862,00 | 0,91% |
| 22 | 8000864 | $ 474.960.513,00 | 0,00% |
| 3 | 8000957 | $ 346.941.971,00 | 0,00% |
| 33 | 8001041 | $ 164.541.658,00 | 2,37% |
| 4 | 8001069 | $ 183.856.740,00 | 0,93% |
| 16 | 8000907 | $ 378.482.383,00 | 0,00% |
| 15 | 8000856 | $ 318.778.666,00 | 0,35% |
| 26 | 8000988 | $ 312.106.601,00 | 2,77% |
| 32 | 8000979 | $ 384.241.540,00 | 0,68% |
| 30 | 8001058 | $ 167.606.525,00 | 11,86% |
| 31 | 8001125 | $ 347.840.618,00 | 5,13% |
| 27 | 8001052 | $ 394.454.974,00 | 1,96% |
| 12 | 8000849 | $ 353.440.216,00 | 3,40% |

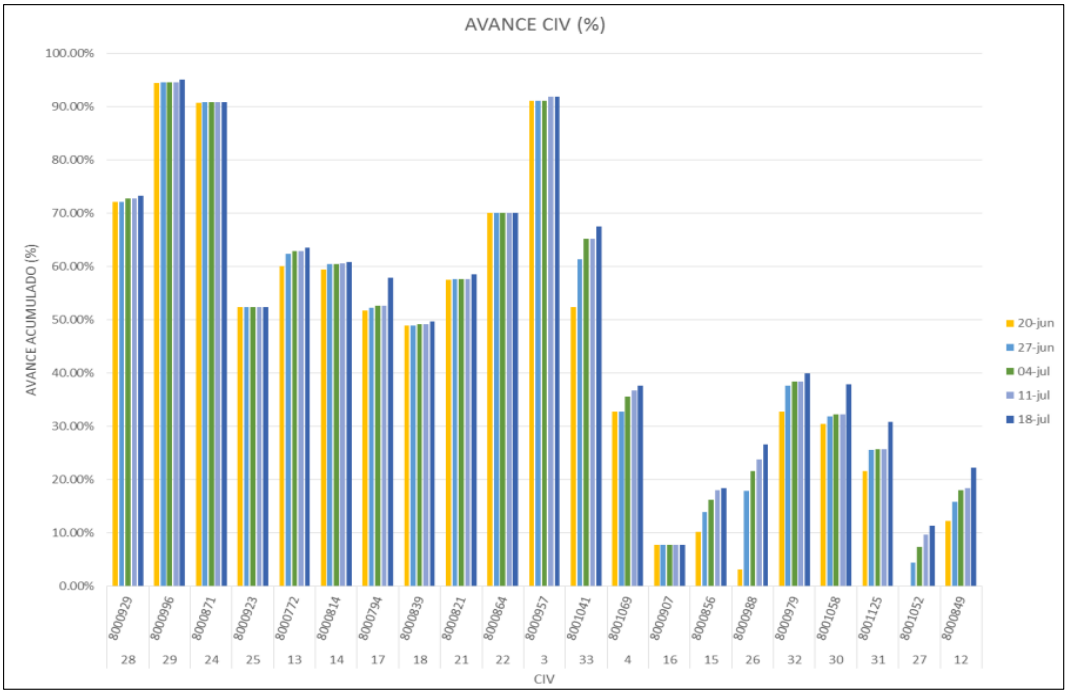
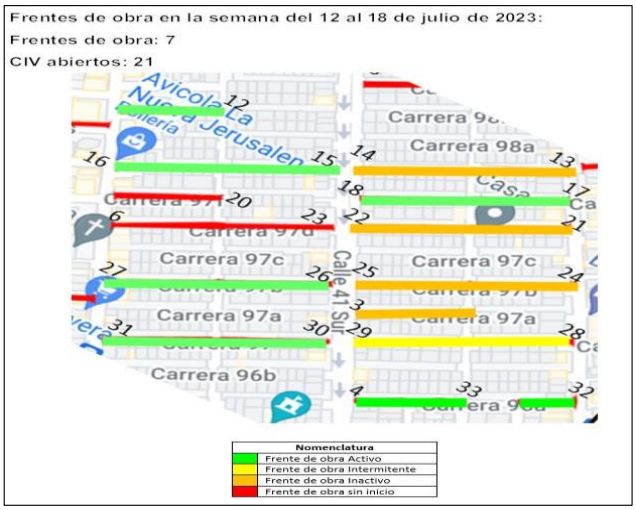
# CONSORCIO SCLV
# NIT. 900.547.145-2

## REPORTE AVANCE SEMANAL
## GRUPO 1 - CONTRATO COP-621-22
## CONTRATISTA XIE S.A.

**Periodo** **13 de julio al 18 de julio de 2023**

| AVANCE | %General | %Físico | %Financiero |
|---|---|---|---|
| %Programado | 77,04% | 80,28% | 77,04% |
| %Ejecutado | 31,86% | 28,86% | 17,52% |
| %Desviación | -45,18% | -51,42% | -59,52% |

# ESTADO SEMANAL DE PROCESO CONSTRUCTIVO

**CONTRATISTA DE OBRA GRUPO 1 -XIE S.A COP 621-22**

| | PK_ID ANDEN | PK_ID ANDEN | 3 | | | 4 | | | 13 | | | 14 | | | 17 | | | 18 | | | 21 | | | 22 | | | 24 | | | 25 | | | 28 | | | 29 | | | 30 | | | 31 | | | 32 | | | 33 | | | 12 | | | 15 | | | 16 | | | 26 | | | 27 | | |
|---|---|---
