FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA No. 42 (Número) **DEL** 20 de julio de 2023 (dd-mm-aa) **AL** 26 de julio de 2023 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 717 de 2022 (Número con 3 dígitos) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 621 de 2022 (Número de contrato)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

AV-014 CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 1

CONTRATISTA XIE SA **NIT** 830061684-1 (Número de Nit sin dígito de verificación)

INTERVENTOR CONSORCIO SCLV (Nombre completo del representante legal) **NIT** 900547145 (Número de Nit sin dígito de verificación)

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Valor inicial	$ 19.627.175.114,00	Valor inicial	$ 4.897.418.342,00
Valor Adicional 1		Valor Adicional 1	
Valor Actualizado		Valor Actualizado	
Plazo inicial	12 meses	Plazo inicial	12 meses
Plazo Prórroga 1		Plazo Prorroga 1	
Plazo Actualizado		Plazo Actualizado	
Fecha de iniciación	05 de octubre de 2022	Fecha de iniciación	05 de octubre de 2022
Fecha de Terminación Inicial	04 de octubre de 2023	Fecha de Terminación Inicial	04 de octubre de 2023
Fecha de Terminación Actual		Fecha de Terminación Actual	
No. de empleos generados	30	No. De empleos generados	45

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ (Nombre completo del supervisor del contrato)

PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN: ANDRES MAURICIO ROJAS LLANOS - DANILO MENESES TORO (Nombre completo del profesional de Apoyo a la supervisión)

2. AVANCES DEL CONTRATO

META FÍSICA PROGRAMADA TOTAL DEL CONTRATO

Número de radicado de remisión de parte de interventoría del alcance físico del contrato de obra (Número de radicado del alcance físico) **de fecha** (dd-mm-aa)


TIPO DE ELEMENTO	VALOR TOTAL ($)	ÁREA (M2)	km/carril	Unidad
CALZADA CIV	$ 19.627.175.114,00	12860,18	3,67	43
TOTALES	$ 19.627.175.114,00	12860,18	3,67	43

A. AVANCE GENERAL

AVANCE FINANCIERO

PROGRAMADO				EJECUTADO			
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO			SEMANAL	ACUMULADO	Atraso /Avance
Trabajo Programado	2,53%	2,53%		Trabajo Ejecutado	7,21%	7,21%	4,68%
Valor del Trabajo Programado	$	$ 0,00		Valor del Trabajo Ejecutado	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
OBRA	SEMANAL	ACUMULADO			SEMANAL	ACUMULADO	Atraso /Avance
Obra Programada (%)	0%	0%		Obra Ejecutada (%)	0%	0%	0%
Obra Programada ($)	$ -	$ -		Obra Ejecutada ($)	$ -	$ -	$ -

GRAFICA DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO



SEMANA No.	ACUMULADO FINANCIERO PROGRAMADO	ACUMULADO FINANCIERO EJECUTADO
1	0,00%	0,00%
2	0,00%	0,00%
3	0,00%	0,00%
4	0,00%	0,00%
5	0,00%	0,00%
6	0,00%	0,00%
7	0,00%	0,00%
8	0,00%	0,00%
9	2,16%	1,10%
10	2,31%	1,10%
11	2,42%	7,21%
12	2,53%	7,21%
13	3,47%	7,21%
14	4,68%	8,25%
15	6,10%	8,39%
16	6,10%	9,00%
17	8,97%	9,63%
18	11,45%	10,42%
19	13,67%	10,61%
20	16,42%	11,38%
21	11,03%	10,73%
22	11,46%	10,73%
23	11,93%	10,73%
24	12,36%	10,73%
25	12,75%	10,73%
26	13,13%	10,73%
27	13,66%	10,73%
28	15,73%	10,73%
29	16,77%	10,73%
30	17,27%	10,71%
31	26,08%	10,71%
32	35,83%	10,71%
33	41,56%	10,71%
34	44,08%	10,71%
35	46,47%	10,71%
36	48,50%	17,52%
37	48,50%	17,52%
38	50,50%	17,52%
39	52,50%	17,52%
40	75,12%	17,52%
41	77,04%	17,52%
42	78,75%	17,52%

AVANCE FISICO

PROGRAMADO				EJECUTADO			
Estudios y Diseños Proceam. (m2)	0	0	0%	Estudios y Diseños Ejecutado (m2)	0	0	0%
OBRA	SEMANAL	ACUMULADO	%Pros. Acum.		SEMANAL	ACUMULADO	% Ejec. Acum.
Meta Física Proporamada (m2)	0	0	0%	Meta Física Ejecutada (m2)	0	0	0%
Meta Física Proporamada (Km/carril)	0	0	0%	Meta Física Ejecutada (Km/carril)	0	0	0%
Meta Física Proporamada (und)	0	0	0%	Meta Física Ejecutada (und)	0	0	0%
Meta Física Proporamada (km)	0	0	0%	Meta Física Ejecutada (km)	0	0	0%
Meta Física Proporamada (%)				Meta Física Ejecutada (%)			

			%Atraso /%Avance
			0%

AVANCE PROJECT

Avance Programado (%)	0%	Avance Ejecutado (%)	0%
Avance Proramado Mantenimiento oneródico	0%	Avance Ejecutado Mantenimiento oneródico	0%
Avance Proramado Mantenimiento Rutinario	0%	Avance Ejecutado Mantenimiento Rutinario	0%
Avance Proramado Mantenimiento Reconstrucción	0%	Avance Ejecutado Mantenimiento Reconstrucción	0%
Avance Proramado Mantenimiento Rehabilitación	0%	Avance Ejecutado Mantenimiento Rehabilitación	0%

%Atraso /%Avance
0%
0%
0%
0%

B. ESTADO GENERAL DE LOS FRENTES DE TRABAJO EN LA SEMANA

No	CIV	PK_ID CALZADA	PK_ID ANDEN 1 (Sur)	PK_ID ANDEN 2 (Norte)	EJE	DESDE	HASTA	IPR	TIPO SUPERF	TIPO DE ELEMENTO	ANCHO CALZADA (m)	LONGITUD (m)	AREA CALZADA (m²)	Estado	INFORMACIÓN DE FRENTES QUE DEBERÓN INICIAR Y NO TIENEN ACTIVIDAD DE OBRA: Fecha de inicio programada	Motivos por los cuales no ha iniciado	Acciones	
1	8000687	158049	29664	29665	KR 98B BIS	CL 39C SUR	CL 40 SUR	46,42	6	CALZADA	4,2	91,12	382,69	Sin iniciar	16-may-23	SIN PMT		
2	8000595	156010	29588	29589	KR 95A	CL 42F SUR	CL 42G SUR	50,07	6	CALZADA	3,72	76,75	285,18	Sin iniciar	4-jul-23			
3	8000957	156201	29896	29897	KR 97A	CL 41 SUR	CL 40A SUR	28,19	6	CALZADA	4,53	67,8	307,36	Calzada: Instalación de cabezal para sumidero 2 un, de emulsión asfáltica, asfalto y grano-caucho. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.	28-mar-23			
4	8001069	156189	29872	29873	KR 96A	CL 41 SUR	CL 40B SUR	47,61	6	CALZADA	4,35	34,72	150,9	SIN ACTIVIDADES	24-feb-23			
5	8000835	156051	29868	29869	KR 98C BIS	CL 39C SUR	CL 40 SUR	47,12	6	CALZADA	3,85	90,24	347,99	Sin iniciar	10-may-23	SIN PMT		
6	8000977	156215	29924	29925	KR 97D	CL 42A SUR	CL 42 SUR	47,61	6	CALZADA	5,07	65,69	333,12	Sin iniciar	16-dic-22	SIN PMT		
7	8000736	156045	29856	29857	KR 98	CL 40 SUR	CL 39C SUR	46,42	6	CALZADA	4,04	93,14	376	Sin iniciar	21-may-23	SIN PMT		
8	8002417	155940	29448	29449	KR 91C	CL 42F SUR	CL 42G SUR	29,9	6	CALZADA	2,57	88,02	226,36	Sin iniciar	27-abr-23	SIN PMT		
9	8002509	155941	29450	29451	KR 91C	CL 42G SUR	CL 43 SUR	29,41	6	CALZADA	2,54	69,79	177,24	Sin iniciar	4-may-23	SIN PMT		
10	8011950	156950	29982	30983	KR 98A BIS	CL 42A SUR	CL 42F SUR	29,9	6	CALZADA	2,93	136,9	401,1	Sin iniciar	21-may-23	SIN PMT		
11	8011955	156945	30972	30973	KR 97A BIS	CL 42A SUR	CL 42F SUR	29,9	1	CALZADA	4,38	140,7	616,78	Sin iniciar	No se tiene			
12	8000849	156231	29956	29957	KR 98B	CL 42 SUR	CL 42A SUR	47,26	6	CALZADA	5,07	62,44	316,88	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Instalación concreto 4000psi para acceso vehicular, y concreto 3000psi para acceso peatonal asent 6". Andén occidental: Instalación de concreto 4000psi para acceso vehicular y de concreto 3000psi para acceso peatonal asentamiento 6"	21-abr-23			
13	8000772	158220	29934	29935	KR 98	CL 40 SUR	CL 40A SUR	46,42	6	CALZADA	3,54	56,87	201,43	Calzada: Instalación de monoblock 200PD. Andén occidental: Demolición y excavación parcial. Andén oriental: Sin actividad.	16-ene-23			
14	8000814	156221	29936	29937	KR 98	CL 40A SUR	CL 41 SUR	46,42	6	CALZADA	4,54	67,69	307,42	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Demolición y excavación de concreto	20-ene-23			
15	8000856	156222	29938	29939	KR 98	CL 41 SUR	CL 42 SUR	46,42	6	CALZADA	4,61	67,45	310,79	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Instalación de geotextil y de fresado. Andén occidental: Demolición de concreto, excavación parcial	9-mar-23			
16	8000807	156223	29940	29941	KR 98	CL 42 SUR	CL 42A SUR	47,26	6	CALZADA	4,81	64,09	308,44	SIN ACTIVIDADES	2-mar-23			
17	8000794	156216	29926	29927	KR 97F	CL 40 SUR	CL 40A SUR	46,42	6	CALZADA	3,93	58,12	228,25	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Remates de fachada parte inferior e instalación marcos cajas de inspección, corte de concreto para dilatación. Andén occidental: Corte de concreto para dilatación.	26-ene-23			
18	8000839	156217	29928	29929	KR 97F	CL 40A SUR	CL 41 SUR	46,42	6	CALZADA	3,86	67,37	260,04	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Corte de concreto para dilatación. Andén occidental: Corte de concreto para dilatación.	2-feb-23			
19	8000583	156052	29870	29871	KR 99A BIS	CL 38C SUR	CL 38 SUR	47,12	6	CALZADA	4,66	80,91	376,93	Sin iniciar	No se tiene			
20	8000838	156219	29932	29933	KR 97F	CL 42 SUR	CL 42A SUR	47,26	6	CALZADA	4,62	64,75	299,09	Sin iniciar	29-dic-22	SIN PMT		
21	8000821	156212	29918	29919	KR 97D	CL 40 SUR	CL 40A SUR	46,42	6	CALZADA	4,16	59,22	246,61	Calzada: Instalación de monoblock 200PD costado occidente. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.	8-feb-23			
22	8000864	156213	29920	29921	KR 97D	CL 40A SUR	CL 41 SUR	46,42	6	CALZADA	4,05	67,76	274,11	Calzada: Aplicación de emulsión asfáltica, instalación de asfalto y de grano-caucho. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.	14-feb-23			
23	8000916	156214	29922	29923	KR 97D	CL 41 SUR	CL 42 SUR	47,26	6	CALZADA	4,42	67,76	299,83	Sin iniciar	22-dic-23	SIN IMPLEMENTACION DE PMT		
24	8000871	156204	29902	29903	KR 97B	CL 40 SUR	CL 40A SUR	47,1	6	CALZADA	4,45	60,94	271,42	Calzada: Aplicación de emulsión asfáltica, instalación de asfalto y grano-caucho. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental Sin actividades	4-ene-23			
25	8000923	156205	29904	29905	KR 97B	CL 40A SUR	CL 41 SUR	46,42	6	CALZADA	4,92	67,68	332,77	Calzada: Aplicación de emulsión asfáltica, instalación de asfalto y grano-caucho. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental Sin actividades	10-ene-23			
26	8000988	156206	29906	29907	KR 97B	CL 41 SUR	CL 42 SUR	47,26	6	CALZADA	4,32	68,54	295,77	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Nivelación y compactación de sub-rasante, instalación de geotextil y fresado, demolición de concreto, excavación manual, demolición y construcción de cajas de inspección Sun. Andén occidental: Nivelación y compactación en sub-rasante, instalación de geotextil y fresado, demolición de concreto, excavación manual, demolición y construcción de cajas de inspección 8 un	15-mar-23			
27	8001052	156207	29908	29909	KR 97B	CL 42 SUR	CL 42A SUR	47,26	6	CALZADA	5,12	66,41	340,23	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Demolición de concreto. Andén occidental: Sin actividad.	22-mar-23			
28	8000929	156196	29886	29887	KR 97	CL 40 SUR	CL 40A SUR	47,95	6	CALZADA	4,2	63,56	266,84	Calzada: Instalación de geo-celda en intersección, de fresado para lleno de geo-celda y de monoblock 200PD. Andén oriental: Instalación de concreto de 4000psi acceso vehicular, acabado en cajas de inspección. Andén occidental: Acabado en cajas de inspección.	5-dic-22			
29	8000996	156197	29888	29889	KR 97	CL 40A SUR	CL 41 SUR	47,26	6	CALZADA	4,24	67,58	286,62	Calzada: Instalación de geo-celda y fresado. Andén oriental: Instalación de concreto 4000psi para acceso vehicular y concreto 3000psi para acceso peatonal. Andén occidental: Instalación de concreto 4000psi para acceso vehicular y concreto 3000psi para acceso peatonal.	12-dic-22			
30	8001059	156198	29890	29891	KR 97	CL 41 SUR	CL 42 SUR	47,26	6	CALZADA	4,12	66,8	274,89	SIN ACTIVIDADES	10-abr-23			
31	8001125	156199	29892	29893	KR 97	CL 42 SUR	CL 42A SUR	50,91	6	CALZADA	5,14	68,89	354,19	Calzada: Excavación de sumidero a pozo, instalación de tubería corrugada de 12 pulgadas, de arena de peña para recubrimiento de tubería, de geo-celda, geotextil y fresado. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin	3-abr-23			
32	8000979	156186	29866	29867	KR 96A	CL 40 SUR	CL 40 BIS SUR	49,66	6	CALZADA	5,14	34,54	177,45	SIN ACTIVIDADES	15-abr-23			
33	8001041	156188	29870	29871	KR 96A	CL 40A SUR	CL 40B SUR	48,3	6	CALZADA	5,11	32,2	164,5	Calzada: Instalación de base estabilizada. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.	20-feb-23			
34	8000709	156232	29958	29959	KR 98C	CL 40 SUR	CL 40A SUR	46,42	6	CALZADA	4,09	53,43	218,4	Sin iniciar	10-ago-23			
35	8000743	156233	29960	29961	KR 98C	CL 40A SUR	CL 41 SUR	46,42	6	CALZADA	4,68	67,2	314,77	Sin iniciar	27-jul-23	SIN PMT		
36	8000619	156053	29672	29673	KR 99A BIS	CL 40 SUR	CL 38 C SUR	47,12	6	CALZADA	4,78	90,92	434,69	Sin iniciar	No se tiene programación por CIV			
37	8011974	156971	31024	31025	CL 42A BIS SUR	KR 94A	KR 95	29,9	6	CALZADA	2,52	81,18	204,44	Sin iniciar	No se tiene programación por CIV			
38	8011973	156970	31022	31023	CL 42A BIS SUR	KR 93C	KR 94A	29,9	6	CALZADA	2,18	89,41	194,58	Sin iniciar	No se tiene programación por CIV			
39	8002594	156958	29982	29983	KR 99C BIS	CL 40 SUR	CL 39C SUR	46,42	6	CALZADA	3,87	85,64	331,62	Sin iniciar	10-jul-23	SIN PMT		
40	8011953	156943	30968	30969	KR 96B	CL 42A SUR	CL 42F SUR	65,55	6	CALZADA	3,13	143,02	448,03	Sin iniciar	2-may-23	SIN PMT		
41	8011950	156942	30966	30967	KR 95B	CL 42B SUR	CL 42F SUR	29,06	6	CALZADA	3,94	81,9	322,33	Sin iniciar	No se tiene programación por CIV			
42	8011949	156941	30964	30965	KR 95A	CL 42B SUR	CL 42F SUR	27,35	6	CALZADA	3,28	83,12	272,55	Sin iniciar	No se tiene programación por CIV			
43	8002595	155838	29246	29247	CL 42B SUR	KR 91	KR 90A BIS	33,9	6	CALZADA	3,04	104,89	319,35	Sin iniciar	No se tiene programación por CIV			

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

1. COMPONENTE TÉCNICO:

1.1. ACTIVIDADES TECNICAS DE INTERVENTORÍA

- Calificación diaria del PMT instalado acorde con la aprobación de la SDM, la calificación para el presente período es de 95%
- Mesas de trabajo internas con el director de Interventoría para definir los lineamientos de revisión de documentos del contratista. Coordinación con las áreas SST, Social y Ambiental, para la elaboración de los documentos entregados por la Interventoría en el Periodo.
- Elaboración de memorandos para comunicaciones internas y otras dirigidas al Contratista con los productos revisados en el periodo.
- Revisión de los informes diarios de inspección y memorias de cálculo de las cantidades de obra, diligenciamiento de la bitácora.
- Reporte diario de cantidades para el seguimiento de la programación
- Revisión y aprobación del informe mensual técnico del contratista No.8 correspondiente al periodo 1 al 31 de mayo de 2023.
- Avance en la elaboración del informe mensual de interventoría No.8 correspondiente al periodo 1 al 31 de mayo de 2023.

1.2 Seguimiento a las actividades del contratista

La Interventoría realizó el seguimiento de:

- **P4:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental Sin actividades.
- **P32:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental Sin actividades.
- **P33:**Calzada: Instalación de base estabilizada. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.
- **P28:** Calzada: Instalación de geo-celda en intersección y de fresado para lleno de geo-celda, instalación de monoblock 200PD. Andén oriental: Instalación de concreto de 4000psi acceso vehicular, acabado en cajas de inspección. Andén occidental: Acabado en cajas de inspección.
- **P29:**Calzada: Instalación de geo-celda y de fresado. Andén oriental: Instalación de concreto 4000psi para acceso vehicular, de concreto 3000psi para acceso peatonal. Andén occidental: Instalación de concreto 4000psi para acceso vehicular y de concreto 3000psi para acceso peatonal.
- **P24:**Calzada: Aplicación de emulsión asfáltica, instalación de asfalto y de grano-caucho. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental Sin actividades
- **P25:**Calzada: Aplicación de emulsión asfáltica, instalación de asfalto y de grano-caucho. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.
- **P21:**Calzada: Instalación de monoblock 200PD costado occidente. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.
- **P22:**Calzada: Aplicación de emulsión asfáltica, instalación de asfalto y de grano-caucho. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.
- **P3:**Calzada: Instalación de cabezal para sumidero 2 unidades, de emulsión asfáltica, de asfalto y de grano-caucho. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.
- **P13:**Calzada: Instalación de monoblock 200PD. Andén occidental: Demolición y excavación parcial. Andén oriental: Sin actividad.
- **P14:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Demolición y excavación de concreto.
- **P17:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Remates de fachada parte inferior e instalación marcos cajas de inspección, corte parcial de concreto para dilatación. Andén occidental: Corte parcial de concreto para dilatación.
- **P18:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Corte parcial de concreto para dilatación. Andén occidental: Corte parcial de concreto para dilatación
- **P30:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.
- **P31:** Calzada: Excavación parcial de sumidero a pozo, instalación de tubería corrugada de 12 pulgadas, instalación de arena de peña para recubrimiento de tubería, instalación de geo-celda, geotextil y fresado. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.
- **P12:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Instalación de concreto 4000psi para acceso vehicular, y de concreto 3000psi para acceso peatonal asentamiento 6". Andén occidental: Instalación de concreto 4000psi para acceso vehicular y de concreto 3000psi para acceso peatonal asentamiento 6"
- **P15:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Instalación parcial de geotextil y de fresado 21,25m3. Andén occidental: Demolición parcial de concreto, excavación parcial.
- **P16:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
- **P26:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Nivelación y compactación de sub-rasante, instalación de geotextil y de fresado, demolición de concreto, excavación parcial manual, demolición y construcción de cajas de inspección 5 un. Andén occidental: Nivelación y compactación en sub-rasante, instalación de geotextil y fresado, demolición de concreto, excavación manual, demolición y construcción de cajas de inspección 8 un
- **P27:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Demolición de concreto. Andén occidental: Sin actividad.

1.3 ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- Continuar la elaboración del mensual técnico No.8 de la Interventoría correspondiente al periodo 1 al 31 de mayo de 2023.
- Participación del comité de seguimiento interno y del comité de seguimiento No.43.
- Seguimiento de las actividades que ejecute el Contratista en obra, diligenciamiento de bitácora, revisión y aprobación de los informes diarios del inspector. Calificación semanal del PMT.
- Calificación semanal de PMT y evaluación diaria de cantidades

2. COMPONENTE AMBIENTAL

- El 19 de julio, se realiza en el comité interno celebrado en las instalaciones de la Vialidad, de manera virtual donde se manifestó lo encontrado en la obra y sobre el avance en el tema documental sobre los informes semanales y mensual.
- El 24 de julio, se realiza el comité de seguimiento ambiental y SST, llevado a cabo en obra, el recorrido y posterior reunión de comité, se realizaron observaciones aluviales al cerramiento ambiental y senderos peatonales, limpieza de la malla azul de protección en los sumideros y se recalca sobre la calidad en la ejecución y presentación de los informes mensuales a la interventoría.
- Para la presente semana la calificación del componente del contratista fue del 100% en todos los ítems de las fichas de seguimiento ambiental y SST.
- En la presente semana se dispuso 60m3 de material de excavación, con el gestor LAMD.
- Para la presente semana no se dispuso material fresado en la obra proveniente del patio IDU y de la UMV
- Se utilizó concreto premezclado para los andenes de la vía, en la semana se utilizaron 12m3.
- Se utilizó asfalto para las diferentes prioridades, en la semana se utilizaron 135m3.
- Se realiza la revisión del correspondiente informe semanal del contratista, se generan observaciones y una vez subsanadas, se da aprobación mediante correo electrónico a la residente ambiental del contratista.

El Contratista realizó las siguientes actividades:

- Recorrido en los P28, P29, P24, P25, P21, P22, P3, P13, P14, P17, P18, P32, P33, P4, P30, P31, P12, P15, P16, P26, P27 Y ACOPIO para verificar en obra que se esté cumpliendo con lo establecido en el MAO.
- Revisión de los puntos ecológicos instalados en los P28, P29, P24, P25, P21, P22, P3, P13, P14, P17, P18, P32, P33, P4, P30, P31, P12, P15, P16, P26, P27 y se realiza la verificación de cumplimiento con la separación de los residuos en las bolsas.
- Mantenimiento de la malla azul en sumideros.
- Se realiza orden y aseo en los P28, P29, P24, P25, P21, P22, P3, P13, P14, P17, P18, P32, P33, P4, P30, P31, P12, P15, P16, P26, P27 y acopio.
- Inducción ambiental y socialización de política integral.
- Comité de seguimiento.
- Recolección de material escombro.
- Delimitación de senderos peatonales en P28, P29, P24, P25, P21, P22, P3, P13, P14, P17, P18, P32, P33, P4, P30, P31, P12, P15, P16, P26, P27.
- Aprovechamiento de material fresado en los frentes de obra.
- Acompañamiento en la instalación de asfalto.
- Identificación de sustancias químicas para actividad de instalación de asfalto.

3. COMPONENTE SST

3.1. ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA EN MATERIA SST

INFORMACIÓN DEL PERSONAL

Ingreso	Antiguos	Retiros	TOTAL, PERSONAL ACTIVO EN LA SEMANA REPORTADA:
Consorcio SCLV = 0	1. Consorcio SCLV = 22 2. Silva Carreño y Asociados S.A.S = 10 3. La Vialidad Limitada = 13 4. Carse Ingeniería Ltda = 1 5. J.V.R Estudios = 1 6. Geovial Limitada = 5	0	52

3.2 AUSENTISMO DE PERSONAL

Durante el desarrollo de las actividades de la semana del 20 de julio de 2023 al 26 de julio de 2023, no se presentó ausentismo del personal de la Interventoría.

3.3 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

- El 25 de julio de 2023 los componentes SST, ambiental, social y técnico de la Interventoría y contratista realizaron recorrido de obra donde se evidenció que el personal que estaba realizando actividades, corresponde al aprobado por la Interventoría.
- Al momento de la visita de obra por parte del componente SST se evidencia lo siguiente:

P32: Sin actividades de obra, sendero peatonal definido.
P33: Sin actividades de obra, sendero peatonal definido.
P4: Sin actividades de obra, sendero peatonal definido.
P28: Adecuación de la intersección entre el P28 y P29 con fresado, monoblock para instalar. El personal hace uso de EPP y elementos de identidad visual.
P29: Sin actividades de obra, sendero peatonal definido. Se evidencia con punto ecológico (3 Bolsas), kit de emergencias, punto de hidratación, señalización a rutas de emergencia y recomendaciones sobre el uso de EPP.
P30: Sin actividades de obra, sendero peatonal definido.
P31: Sin actividades de obra, sendero peatonal definido.
P3: CIV con asfalto y espacio público instalado, se observan los espacios de la rejilla del monoblock con cinta, se solicita mejorar la señalización, PMT y cerramiento retirado
P24: CIV con asfalto y espacio público instalado, se observan los espacios de la rejilla del monoblock con cinta, se solicita mejorar la señalización, PMT y cerramiento retirado.
P25: CIV con asfalto y espacio público instalado, se observan los espacios de la rejilla del monoblock con cinta, se solicita mejorar la señalización, PMT y cerramiento retirado.
P26: Actividades de espacio público, adecuación de andenes. Se evidencia con punto ecológico (3 Bolsas), de hidratación, kit de emergencias, señalización a rutas de emergencia y recomendaciones sobre el uso de EPP. El personal hace uso de EPP y elementos de identidad visual.
P27: Actividades de espacio público, excavación manual en andenes. El personal hace uso de EPP y elementos de identidad visual.
P21: Actividades de remates en fachadas, orden y aseo del frente de obra. El personal hace uso de EPP y elementos de identidad visual.
P22:CIV con asfalto y espacio público instalado, espacios de la rejilla del monoblock con cinta, se solicita mejorar la señalización, PMT y cerramiento retirado. Se evidencia punto ecológico (3 Bolsas), de hidratación, kit de emergencias.
P17: Sin actividades de obra, sendero peatonal definido.
P18: Instalación de marcos y tapas de las cajas de inspección. Se evidencia punto ecológico (3 Bolsas), de hidratación, kit de emergencias, señalización a rutas de emergencia y recomendaciones sobre el uso de EPP. El personal hace uso de EPP y elementos de identidad visual.
P13: Instalación de monoblock. Se evidencia punto ecológico (3 Bolsas), de hidratación, kit de emergencias. El personal hace uso de EPP y elementos de identidad visual.
P14: Sin actividades de obra, sendero peatonal definido.
P15: Relleno con fresado en andenes. Se evidencia punto ecológico (3 Bolsas), de hidratación, kit de emergencias, señalización a rutas de emergencia y recomendaciones sobre el uso de EPP. El personal hace uso de EPP y elementos de identidad visual.
P16: Sin actividades de obra, sendero peatonal definido.
P12: Instalación de concreto en espacio público, sendero peatonal definido. Se evidencia punto ecológico (3 Bolsas), de hidratación, kit de emergencias, señalización a rutas de emergencia y recomendaciones sobre el uso de EPP. El personal hace uso de EPP y elementos de identidad visual..

- Como recomendaciones generales se solicitó al contratista que en las diferentes prioridades intervenidas se haga una recolección del material sobrante que no se esté utilizando. Por lo anterior se realizó comité de seguimiento Ambiental-SST presencial, donde se revisó la gestión SST y las actividades que ejecuto el contratista en la semana y se realizó registro en el formato FOAC 32.
- Se llevó a cabo el seguimiento a las actividades de instalación de asfalto.
- Durante la semana se revisaron documentos de ingreso del personal de obra, correspondientes a contratos, exámenes médicos ocupacionales de ingreso, certificaciones de afiliación al Sistema General de Seguridad Social Integral (AFP, ARL, CCF, EPS), notificación de riesgos e inducciones.
- El 26 de julio de 2023 se llevó a cabo comité interno de interventoría donde en el componente SST se revisó el avance de las actividades realizadas en las prioridades que están siendo intervenidas, calificación de las fichas Ambientales y SST, e informo sobre los resultados del recorrido de obra.
- El 26 de julio de 2023 la Interventoría como parte de la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo realizó pausas activas con ejercicios osteomusculares.
- Durante la semana se realizó seguimiento al uso adecuado de los EPP y elementos de identidad visual del personal de interventoría.

3.5 ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA EN MATERIA SST

INFORMACIÓN DEL PERSONAL

Ingreso	Antiguos	Retiros	PERSONAL ACTIVO EN LA SEMANA REPORTADA	
XIE S.A = 1	1. XIE S.A = 45		1. AGL CONSTRUCCION SAS = 1	111
AGL CONSTRUCCION SAS = 2	2. NOVA TOPOSMAR S.A.S = 8		2. Redes y sistemas de la construcción EJ S.A.S = 2	
Redes y sistemas de la construcción EJ S.A.S = 3	3. PLANEACIÓN EN INGENIERIA S.A.S = 1			
Construcciones Obras Civiles y Transportes SAS = 1	4. JIRT DISEÑOS ESTRUCTURALES S.A.S = 1			
	5. DISEÑOS GEOTECNICOS S.A.S = 1			
	6. JOSE JARGEON MORA SERRANO = 12			
	7. R.A.C PETREOS S.A.S = 1			
	8. INPASUELC LTDA = 2			
	9. INGCONDIR S.A.S = 7			
	10. Redes y sistemas de la construcción EJ S.A.S = 16			
	11. AGL CONSTRUCCION SAS = 7			

3.6 AUSENTISMO DE PERSONAL

Durante el desarrollo de las actividades de la semana del 20 de julio de 2023 al 26 de julio de 2023, el contratista reportó el ausentismo de 10 trabajadores entre oficiales, operadores, auxiliares de tráfico y Boal
De acuerdo con lo anterior el Contratista evaluó el indicador de ausentismo de la semana del 20 de julio de 2023 al 26 de julio de 2023; del personal con cargos maestros, oficiales y ayudantes de obra el cual se relaciona a continuación:

N° de días de ausencia = 11
N° de días de trabajo programados = 5
N° Trabajadores en la semana = 45
% de ausentismo = 4,89%
Es así como se evidencia que el 4,89% de los cargos relacionados anteriormente estuvieron ausentes en la semana.

3.7 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

- El contratista realizó inducción al personal que ingreso a laborar en el periodo del presente informe donde se presentan las Generalidades sobre el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), Estructura Organizacional - Reglamento Interno de Trabajo - Reglamento de Higiene Industrial - Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo, alcohol, drogas y tabaquismo - Aspectos legales relacionados con la SST. Condiciones de salud y medicina laboral, Higiene y seguridad industrial - Identificación de peligros, Uso de EPP, Matriz de peligros entre otros.
- El contratista hace la notificación de riesgos al personal que ingreso a laborar a los cuales se encuentra expuesto relacionados con su cargo
- El Contratista realizo la entrega de dotación y EPP al personal que ingreso a laborar al contrato COP 621-2022, también realizo la socialización del uso obligatorio durante el desarrollo de las actividades de obra.
- El Contratista mediante comunicación KN0OE22-621-812 remite Informe semanal No. 41 del 13 de julio de 2023 al 19 de julio de 2023 Componente SST. Sin embargo este ya había sido revisado por la Interventoría, teniendo en cuenta que fue insumo para el informe semanal SST del Consorcio SCLV
- El Contratista en cumplimiento del cronograma de actividades SG-SST realizó inspección de Infraestructura, capacitación en manejo seguro de herramientas, inspección de herramientas, y reunión mensual COPASST.
- El Contratista realizó inducción al personal que iba a instalar el asfalto, informó sobre el uso obligatorio de EPP y riesgos presentes en la actividad. Adicional a eso realizó acompañamiento en la instalación de asfalto en los frentes de obra.
- El Contratista realizo cerramiento de áreas de trabajo y elaboración de escalones para garantizar el ingreso a las viviendas y seguimiento y revisión al uso adecuado de la dotación y EPP de todo el personal vinculado al contrato de obra.

4.COMPONENTE SOCIAL

4.1 Programa de Servicio a la Ciudadanía

- Se evidencia que durante el periodo el contratista, continua con la Atención del punto PAC en el horario de lunes a viernes de 8.00 am a 4.00 pm, así como la línea telefónica y correo electrónico.
- Se realizó recorrido visual de 24 de las prioridades 28,29,24,25,22,21,13,14, 3, 17,18,4,32, 33, 31, 32 ,12,15,16,26 y 27. Se verificó la actualización de vallas informativas móviles y de los puntos satélites de información.
- El 19 julio se realizó seguimiento a la PQRSD No 21 interpuesta por el señor Oscar Muñoz, en el que se instaló concreto en acceso peatonal, no se dio cierre a la PQRSD porque está pendiente realizar una pestaña en concreto para evitar la filtración de aguas lluvias del predio colindante, teniendo en cuenta que la adecuación de las bajantes hace que se entre agua al predio. Esta PQRSD encuentra abierta dentro de los días hábiles para dar respuesta
- El 20 de julio la empresa de acueducto –EAAB, en horas de la mañana destapo la caja de inspección del predio de la señora Yuseni Ramírez de la prioridad 11, PQRSD No 20 . La gestión social realizo llamadas telefónicas los días 21-24-25 de julio a la señora para solicitar información sobre el proceso y no respondió. El 25 de julio se realiza acercamiento al predio y la señora Sonia Cuellar, vecina del sector, informo que desde que vino el acueducto no se ha vuelto a reboza la caja. Esta PQRSD se encuentra abierta dentro de los días hábiles para dar respuesta
- El 21 de julio se realiza seguimiento a la PQRSD No 22 al señor Néstor Hernández de la prioridad 29, en el que se ejecuto la adecuación de los terminados de la caja de inspección, y el arreglo de la tapa, no se ha realizo el cierre porque no se ubico al peticionario. Esta PQRSD se encuentra abierta dentro de los días hábiles para dar respuesta.
- El 25 julio , se realizo seguimiento a la PQRSD No 19 de la señora María Angela Soler Parra verificandose que se ejecutó el arreglo de la junta de la rampa y el escalón. Y respecto a la fisura que presenta el escalón entre bordillo y el concreto al costado izquierdo de la puerta, se informa a la propietaria que es dilatación del concreto. Igualmente la propietaria entrego las baldosas al maestro encargado y se instalaran la próxima semana. Esta PQRSD se encuentra abierta dentro de los días hábiles para dar respuesta.
- En visita al punto de atención al ciudadano se revisó y firmó soportes de la gestión social y se actualizo la bitácora social.

4.2 Programa de diálogo y participación ciudadana

- Se aprobo por parte de interventoría de la presentación para el comité FDLK No 7.

4.3 Programa de acompañamiento técnico

- Levantamiento de 17 actas de compromisos sociales en el tema de custodia de medidores polo a tierra o cajillas de contador que son entregados al propietario o persona encargada 15-16-26-27 del 19 al 25 de julio.
- Levantamiento de 28 actas de vecindad en la prioridad 38 del tramo de la calle 42 BIS sur desde la carrera 93 C hasta la calle 94 A del 19 al 25 de julio.
- Levantamiento de 19 actas de vecindad en la prioridad 37 del tramo de la calle 42 BIS sur desde la carrera 94 A hasta la calle 95A del 19 al 25 de julio

4.4 Programa de cultura ciudadana

- Se aprobó por parte de la interventoría el acta de capacitación a personal de obra en el tema comunicación asertiva.
- Se aprobó por parte de la interventoría el acta del taller de reconocimiento de funciones del FDLK.

4.5 Programa de gobernanza para la movilidad

- Se cumple con el porcentaje de contratación de mano de obra no calificada de la localidad y de contratación de mujeres de acuerdo a lo requerido por la minuta del contrato.
- Se recibieron 4 hojas de vida en el punto de atencion al ciudadano.

4.6 Programa de información para el desarrollo del proyecto

Durante este periodo se divulgaron las siguientes piezas informativas:
- Instalación de 2 vallas móviles en las prioridades 8-9 el día 25 de julio del 2023
- Se entrego 7 Volantes # 20 de adecuación de bajantes de aguas lluvias.
- Se instalo 1 Volante # 79 de recolección de basuras en el punto satélite de información de la prioridad 26.
- Se instalaron 2 Volantes de inicio de obra (propuesta) en los puntos satélites de información de las prioridades 8 y 9
- Se instalaron 2 volantes # 80 de inicio de malla vial en los puntos satélites de información en las prioridades 8 y 9.
- Se entrego 47 Volantes # 80 de inicio de malla vial, predio a predio en las prioridades 8 y 9
- Se instalaron 2 Volantes # 81 de recolección de basuras en el punto satélite de información de la prioridades 8 y 9.
- Volante PMT # 6 se instaló 1 en las prioridad 20
- Volante PMT # 7 se instaló 1 en la prioridad 8
- Volante PMT # 8 se instaló 1 en la prioridad 9
- Divulgación del volante # 93 de convocatoria a levantamiento de actas de vecindad a 21 predios de la prioridad 38
- Se realizo la instalación de 2 puntos satélites de información: -Carrera 91 B con Calle 42- 33 Sur (Vivienda) Prioridad 8 -Carrera 91 C con Calle 42 G - 59 Sur (Vivienda) Prioridad 9
- El porcentaje de avance de obra es el 32% y faltan 70 días para terminación de las mismas el cual fue registrado en las vallas informativas móviles.

4.7 Comités

- Se realizó el comité de seguimiento social No 41 en el punto de atención al ciudadano, el 25 de julio.
- Se participó en el comité de seguimiento interno No 41 el 19 de julio a través de la plataforma teams a las 2 p.m.

4.8 Otros

- Se aprobó por parte de la interventoría de los volantes Nos 93,94 y 95 de convocatoria a actas de vecindad para las prioridades 2, 43 y 48 el 19 de julio..
- Se aprobó por parte de la interventoría de los volantes Nos 93,94 y 95 de convocatoria a actas de vecindad para las prioridades 37, 41 y 42 el 19 de julio.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS / LEGALES

4. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES (CAUSAS ATRASO, ETC.)

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES:

5. ANEXOS

	SI	NO
1. Cronograma en Ms Project	X	
2. Registro Fotográfico	X	
3. Avance	X	

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los veintiseis (Dia en letras) 26 (Dia en numeros)

días del mes de julio (Mes en letras) de 2023 (Año de firma del informe)

Nombre: Juan Manuel Cifuentes Cifuentes
Director de Interventoría

FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA No. 42 **DEL** 20 de julio de 2023 **AL** 26 de julio de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 717 de 2022 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 621 de 2022 (Número de Contrato)

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripción Foto 1.

CIV: No.18- 8000839
Localización: KR 97F entre CL 40a SUR y CL 41 SUR
Descripción: Corte de concreto para dilatación



Descripción Foto 2.

CIV: No.13 - 8000772
Localización: KR 98 entre CL 40 SUR y CL 40A SUR
Descripción: Instalación de monoblock PD200 en calzada.



Descripción Foto 3.

CIV: No.28 - 8000929
Localización: KR 97 entre CL 40 SUR y CL 40A SUR
Descripción: Instalación de monoblock PD200 en calzada.



Descripción Foto 4.

CIV: No.29 - 8000996
Localización:KR 97 entre CL 40A SUR y CL 41 SUR
Descripción: Sin actividad



Descripción Foto 5.

CIV: No.25 - 8000923.
Localización: KR 97B entre CL 40A SUR y CL 41 SUR
Descripción: Instalación de grano-caucho en calzada



Descripción Foto 6.

CIV: No.17 - 8000794.
Localización: KR 97F entre CL 40 SUR y CL 40A SUR
Descripción: Instalación de monoblock PD200 en calzada..



Descripción Foto 7.

CIV: No.3 - 8000957
Localización: KR 97A entre CL 41 SUR y CL 40A SUR
Descripción: Instalación de grano-caucho en calzada.



Descripción Foto 8.

CIV: No.14 - 8000794
Localización: KR 97F entre CL 40 SUR y CL 40A SUR
Descripción: Actividades en espacio público

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA



Descripción Foto 9.

CIV: No.32 - 8000979.
Localización: KR 97D entre CL 41A SUR y CL 41 SUR
Descripción: Sin actividad



Descripción Foto 10.

CIV: No.24 - 8000871.
Localización: KR 97B entre CL 40 SUR y CL 40A SUR
Descripción: Instalación de asfalto y de grano-caucho



Descripción Foto 11.

CIV: No.27 - 8001052
Localización: KR 97B entre CL 42 SUR Y 42 A SUR
Descripción: Demolición y excavación en anden.



Descripción Foto 12.

CIV: No.33 - 80001041.
Localización: KR 96A entre CL 40A SUR y CL 40B SUR
Descripción: Sin actividad



Descripción Foto 13.

CIV: No.30 - 8001058
Localización: KR 97 entre CL 41 SUR y CL 42 SUR
Descripción: Sin actividad



Descripción Foto 14.

CIV: No.31 - 8001125.
Localización: KR 97 entre CL 42 SUR y CL 42A SUR
Descripción: Instalación de fresado para lleno de geo-celda en intersección.



Descripción Foto 15.

CIV: No.12 - 8000849
Localización: KR 98B entre CL 42 SUR y CL 42A SUR
Descripción: Instalación de concreto de 300psi en andén



Descripción Foto 16.

CIV: No.15 - 8000856.
Localización: KR 98 entre CL 41 SUR y CL 42 SUR
Descripción: Excavación manual en anden

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA



Descripción Foto 17.

CIV: No.21 - 8000821
Localización: KR 97D entre CL 40A SUR y CL 41 SUR
Descripción: Instalación de emulsión asfáltica en calzada.



Descripción Foto 18.

CIV: No.4 - 8001069
Localización: KR 96A entre CL 41 SUR y CL 40b SUR
Descripción: Sin actividad



Descripción Foto 19.

CIV: No.16 - 8000907
Localización: KR 98 entre CL 42 SUR Y 42 A SUR
Descripción: Instalación de geotextil en anden.



Descripción Foto 20.

CIV: No.26 - 8000988
Localización: KR 97B entre CL 41 SUR Y 42 SUR
Descripción: Construcción de cajas de inspección domiciliaria.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente anexo bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

veintiseis (Día en letras) (26) (Día en números) días del mes de julio (Mes en que se firma el acta) de 2023 (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) Juan Manuel Alba Rojas

Director de Interventoría.

Nombre de la firma interventora


CONSORCIO SCLV

NIT 900.547.145-2

EVALUACIÓN CON PROGRAMACIÓN INICIAL - GRUPO 1

SEGUIMIENTO AL 25-JULIO-2023


P	CIV	VALOR CIV	PROG-ACUM ($)	PROG-ACUM (%)	EJEC-ACUM ($)	EJEC-ACUM (%)	PESO EJEC PROG (%)	ATRASO (%)
28	8000929	$ 349.737.154,00	$ 286.285.298,00	2,36%	$ 300.144.396,94	2,47%	85,82%	0,11%
29	8000996	$ 276.918.878,00	$ 242.229.956,95	2,00%	$ 264.937.378,16	2,18%	95,67%	0,19%
24	8000871	$ 282.489.045,00	$ 269.517.473,15	2,22%	$ 284.679.070,17	2,35%	100,78%	0,13%
25	8000923	$ 398.643.978,00	$ 345.626.779,89	2,85%	$ 253.700.358,60	2,09%	63,64%	-0,76%
13	8000772	$ 298.711.275,00	$ 289.860.253,15	2,39%	$ 268.118.682,63	2,21%	89,76%	-0,18%
14	8000814	$ 428.629.368,00	$ 414.590.745,60	3,42%	$ 260.950.194,41	2,15%	60,88%	-1,27%
17	8000794	$ 365.563.428,00	$ 305.729.990,38	2,52%	$ 212.241.939,90	1,75%	58,06%	-0,77%
18	8000839	$ 444.842.291,00	$ 414.390.409,14	3,42%	$ 220.730.067,11	1,82%	49,62%	-1,60%
21	8000821	$ 395.944.862,00	$ 379.185.734,00	3,13%	$ 270.718.763,77	2,23%	68,37%	-0,89%
22	8000864	$ 474.960.513,00	$ 407.701.220,24	3,36%	$ 363.085.927,61	2,99%	76,45%	-0,37%
3	8000957	$ 346.941.971,00	$ 324.515.767,59	2,68%	$ 337.550.165,43	2,78%	97,29%	0,11%
33	8001041	$ 164.541.658,00	$ 148.920.206,67	1,23%	$ 111.414.226,25	0,92%	67,71%	-0,31%
4	8001069	$ 183.856.740,00	$ 154.073.695,45	1,27%	$ 74.896.524,48	0,62%	40,74%	-0,65%
16	8000907	$ 378.482.383,00	$ 361.864.228,92	2,98%	$ 29.056.430,62	0,24%	7,68%	-2,74%
15	8000856	$ 318.778.666,00	$ 314.966.117,90	2,60%	$ 61.972.231,91	0,51%	19,44%	-2,09%
26	8000988	$ 312.106.601,00	$ 248.815.938,04	2,05%	$ 94.122.693,53	0,78%	30,16%	-1,28%
32	8000979	$ 384.241.540,00	$ 313.656.771,99	2,59%	$ 67.002.012,58	0,55%	17,44%	-2,03%
30	8001058	$ 167.606.525,00	$ 151.794.191,30	1,25%	$ 131.948.964,49	1,09%	78,73%	-0,16%
31	8001125	$ 347.840.618,00	$ 307.025.458,10	2,53%	$ 113.734.053,88	0,94%	32,70%	-1,59%
27	8001052	$ 394.454.974,00	$ 379.247.233,34	3,13%	$ 51.932.701,50	0,43%	13,17%	-2,70%
12	8000849	$ 353.440.216,00	$ 295.012.954,84	2,43%	$ 84.686.311,87	0,70%	23,96%	-1,73%
8	8002417	$ 436.309.464,00	$ 433.765.201,90	3,58%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-3,58%
9	8002500	$ 341.127.565,00	$ 331.158.979,28	2,73%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-2,73%
27	8001052	$ 455.180.038,00	$ 384.495.380,79	3,17%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-3,17%
12	8000849	$ 307.654.668,00	$ 417.435.434,91	3,44%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-3,44%
23	8000916	$ 389.375.082,00	$ 341.149.570,13	2,81%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-2,81%
5	8000655	$ 464.716.467,00	$ 381.494.243,74	3,15%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-3,15%
40	8011953	$ 462.079.926,00	$ 311.890.416,49	2,57%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-2,57%
10	8011960	$ 492.144.459,00	$ 318.532.684,07	2,63%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-2,63%
35	8000743	$ 769.586.187,00	$ 286.428.623,75	2,36%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-2,36%
7	8000736	$ 492.144.459,00	$ 276.579.660,22	2,28%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-2,28%
2	8001595	$ 338.872.088,69	$ 56.399.836,26	0,47%	**$ 0,00**	0,00%	**0,00%**	-0,47%
39	8000584	$ 443.145.175,39	$ 0,00	0,00%				0,00%
34	8000709	$ 220.339.030,13	$ 0,00	0,00%				0,00%
35	8000743	$ 291.903.288,68	$ 0,00	0,00%				0,00%
39	8000584	$ 443.145.176,00	$ 37.236.608,81	0,31%	$ 0,00	0,00%	0	-0,31%
TOTALES			**$ 9.931.577.064,99**	**81,89%**	**$ 3.857.623.095,85**	**31,81%**		**-50,08%**
TOTAL DE OBRA			**$ 12.128.504.795,27**					

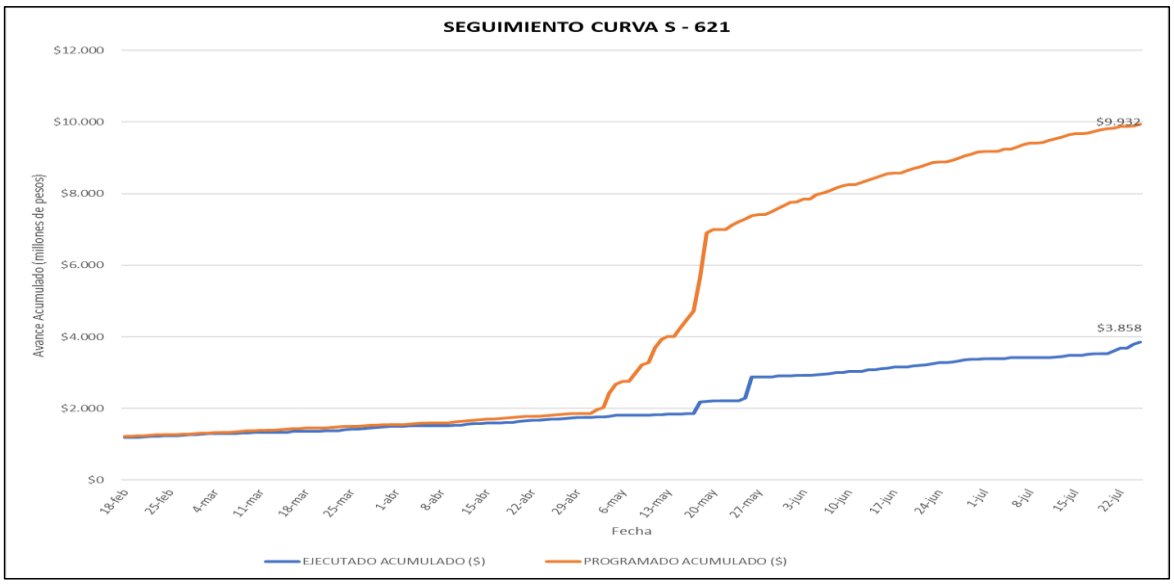

CONSORCIO SCLV
NIT 900.547.145-2
EVALUACIÓN POR CIV

FECHA EVALUACIÓN			27-jun	4-jul	11-jul	18-jul	25-jul
P	CIV	VALOR TOTAL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV
28	8000929	$ 349.737.154,00	72,52%	73,07%	73,17%	73,70%	85,82%
29	8000996	$ 276.918.878,00	93,93%	93,93%	93,93%	94,50%	95,67%
24	8000871	$ 282.489.045,00	89,59%	89,59%	89,59%	89,59%	100,78%
25	8000923	$ 398.643.978,00	55,03%	55,03%	55,03%	55,03%	63,64%
13	8000772	$ 298.711.275,00	61,55%	62,10%	62,10%	62,63%	89,76%
14	8000814	$ 428.629.368,00	60,60%	60,60%	60,66%	60,87%	60,88%
17	8000794	$ 365.563.428,00	52,46%	52,80%	52,80%	58,06%	58,06%
18	8000839	$ 444.842.291,00	48,80%	49,09%	49,11%	49,62%	49,62%
21	8000821	$ 395.944.862,00	57,57%	57,57%	57,57%	58,49%	68,37%
22	8000864	$ 474.960.513,00	69,89%	69,89%	69,89%	69,89%	76,45%
3	8000957	$ 346.941.971,00	87,25%	87,25%	87,98%	87,98%	97,29%
33	8001041	$ 164.541.658,00	61,56%	65,34%	65,34%	67,71%	67,71%
4	8001069	$ 183.856.740,00	35,82%	38,71%	39,81%	40,74%	40,74%
16	8000907	$ 378.482.383,00	7,68%	7,68%	7,68%	7,68%	7,68%
15	8000856	$ 318.778.666,00	13,91%	16,16%	18,01%	18,37%	19,44%
26	8000988	$ 312.106.601,00	17,82%	21,62%	23,78%	26,55%	30,16%
32	8000979	$ 384.241.540,00	16,39%	16,76%	16,76%	17,44%	17,44%
30	8001058	$ 167.606.525,00	66,05%	66,87%	66,87%	78,73%	78,73%
31	8001125	$ 347.840.618,00	26,77%	26,94%	27,00%	32,13%	32,70%
27	8001052	$ 394.454.974,00	5,06%	8,39%	11,12%	13,07%	13,17%
12	8000849	$ 353.440.216,00	13,80%	15,64%	15,97%	19,37%	23,96%

FECHA EVALUACIÓN			25-jul
P	CIV	VALOR TOTAL CIV	%AVANCE DEL CIV
28	8000929	$ 349.737.154,00	12,12%
29	8000996	$ 276.918.878,00	1,17%
24	8000871	$ 282.489.045,00	11,19%
25	8000923	$ 398.643.978,00	8,62%
13	8000772	$ 298.711.275,00	27,13%
14	8000814	$ 428.629.368,00	0,01%
17	8000794	$ 365.563.428,00	0,00%
18	8000839	$ 444.842.291,00	0,00%
21	8000821	$ 395.944.862,00	9,89%
22	8000864	$ 474.960.513,00	6,56%
3	8000957	$ 346.941.971,00	9,31%
33	8001041	$ 164.541.658,00	0,00%
4	8001069	$ 183.856.740,00	0,00%
16	8000907	$ 378.482.383,00	0,00%
15	8000856	$ 318.778.666,00	1,08%
26	8000988	$ 312.106.601,00	3,61%
32	8000979	$ 384.241.540,00	0,00%
30	8001058	$ 167.606.525,00	0,00%
31	8001125	$ 347.840.618,00	0,57%
27	8001052	$ 394.454.974,00	0,09%
12	8000849	$ 353.440.216,00	4,59%

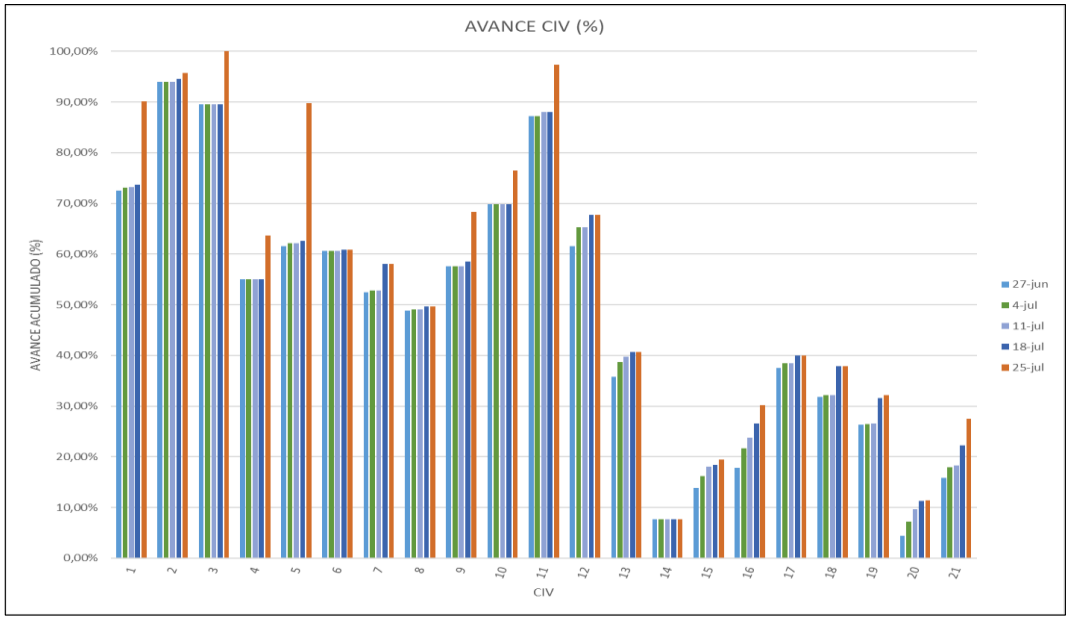





CONSORCIO SCLV
NIT. 900.547.145-2

REPORTE AVANCE SEMANAL
GRUPO 1 - CONTRATO COP-621-22
CONTRATISTA XIE S.A.

Periodo **20 de julio al 25 de julio de 2023**

AVANCE	%General	%Físico	%Financiero
%Programado	78,75%	81,89%	78,75%
%Ejecutado	34,81%	31,81%	17,52%
%Desviación	-43,94%	-50,08%	-61,23%

ESTADO SEMANAL DE PROCESO CONSTRUCTIVO

CONTRATISTA DE OBRA GRUPO 1 -XIE S.A COP 621-22

	PK_ID ANDEN	PK_ID ANDEN	3			4			13			14			17			18			21			22			24			25			28			29			30			31			32			33			12			15			16			26			27		
VIA	**ORIENTAL**	**OCCIDENTAL**	VIA (156201)	ORI (29896)	OCC (29897)	VIA (156189)	ORI (29872)	OCC (29873)	VIA (156220)	ORI (29934)	OCC (29935)	VIA (156221)	ORI (29936)	OCC (29937)	VIA (156216)	ORI (29926)	OCC (29927)	VIA (156217)	ORI (29928)	OCC (29929)	VIA (156212)	ORI (29918)	OCC (29919)	VIA(156213)	ORI(29920)	OCC(29921)	VIA(156204)	ORI(29902)	OCC(29903)	VIA(156205)	ORI(29904)	OCC(29905)	VIA(156196)	ORI(29886)	OCC(29887)	VIA(156197)	ORI(29888)	OCC(29889)	VIA(156198)	ORI(29890)	OCC(29891)	VIA(156199)	ORI(29892)	OCC(29893)	VIA(156186)	ORI(29866)	OCC(29867)	VIA(156188)	ORI(29870)	OCC(29871)	VIA(156231)	ORI(29956)	OCC(29957)	VIA(156222)	ORI(29938)	OCC(29939)	VIA(156223)	ORI(29940)	OCC(29941)	VIA(156206)	ORI(29940)	OCC(29941)	VIA(156207)	ORI(29908)	OCC(29909)
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO Y CAJAS DE INSPECCION.	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO Y CAJAS DE INSPECCION.																																																													
NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.																																																												
REDES HIDRAULICAS	GEOTEXTIL	GEOTEXTIL																																																													
GEOTEXTIL, GEOCELDA HDPE PERFORADA, RELLENO CON FRESADO SOBRE GEOCELDA	PRIMERA CAPA DE FRESADO	PRIMERA CAPA DE FRESADO																																																											
PRIMERA CAPA FRESADO (RAP) ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 3% Y ADITIVO POTENCIALIZADOR (1.3 KG/M3 - SOLID SOIL).	SEGUNDA CAPA DE FRESADO	SEGUNDA CAPA DE FRESADO																																																												
CANAL DE DRENAJE PREFABRICADO EN POLYCONCRETO MONOBLOCK.	CONSTRUCCION CAJAS DE INSPECCION, CAJILLAS DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION CAJAS DE INSPECCION, CAJILLAS DE AGUA POTABLE																																																												
SEGUNDA CAPA FRESADO (RAP) ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 3% Y ADITIVO POTENCIALIZADOR (1.3 KG/M3 - SOLID SOIL).	BORDILLO PREFABRICADO A80	BORDILLO PREFABRICADO A80																																																											
MEZCLA ASFALTICA	CONCRETO DE 3000PSI Y MR41	CONCRETO DE 3000 PSI Y MR41																																																											

TERMINADO	
EJECUCION	
INTERMITENTE	
SIN INICIAR	
NO APLICA	
