FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA No. 39 (Indicar No.) **DEL** 29 de junio de 2023 (Indicar fecha) **AL** 5 de julio de 2023 (Indicar fecha)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No No 717 de 2022 (Indicar No. de contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** COP 690 de 2022 (Indicar No. de contrato)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

INV-014 CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 2.

CONTRATISTA CONSORCIO VIAS DE KENNEDY 22 **NIT** 901.628.933-1 (Escribir el nombre del contratista de obra) (Escribir el No. de identificación)

INTERVENTOR CONSORCIO SCLV **NIT** 900.547.145-2 (Escribir el nombre del interventor) (Escribir el No. de identificación)

CONTRATO DE OBRA	
Valor	$ 19.621.435.784,00
Valor Adicional 1	
Valor Actualizado	
Plazo Inicial	12 meses
Plazo Prórroga 1	
Plazo Actualizado	
Fecha de Iniciación	5 de octubre de 2022
Fecha de Terminación Inicial	4 de octubre de 2023
Fecha de Terminación Actual	
No. de empleos generados	30

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Valor Inicial	$ 4.897.418.342,00
Valor Adicional 1	
Valor Actualizado	
Plazo Inicial	12 meses
Plazo Prórroga 1	
Plazo Actualizado	
Fecha de Iniciación	5 de octubre de 2022
Fecha de Terminación Inicial	4 de octubre de 2023
Fecha de Terminación Actual	
No. De empleos generados	45

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: **YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ** (Escriba el nombre del Supervisor SDH)

PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN: **ANDRES MAURICIO ROJAS LLANOS - DANILO MENESES TORO** (Escriba el nombre del profesional de apoyo a la supervisión)

2. AVANCES DEL CONTRATO

META FÍSICA PROGRAMADA TOTAL DEL CONTRATO

Número de radicado de remisión de parte de interventoría del alcance físico del contrato de obra (Escriba el número de oficio radicado SDH) **de fecha** (Indicar fecha)


TIPO DE ELEMENTO	VALOR TOTAL ($)	ÁREA (M2)	km/carril	Unidad
Calzada CIV	$			
TOTALES	$ 19.621.435.784,00	13224,93	3,78	50
	$ 19.621.435.784,00	13224,93	3,78	50

A. AVANCE GENERAL

AVANCE FINANCIERO

PROGRAMADO			EJECUTADO			
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	Atraso /Avance
Trabajo Programado	2,54%	2,54%	Trabajo Ejecutado	0,00%	0,00%	-2,54%
Valor del Trabajo Programado	$ -	$ 0,00	Valor del Trabajo Ejecutado	$ 0,00	$ 0,00	$ (498.647,00)
FASE PRELIMINAR	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	Atraso /Avance
Fase preliminar Programada (%)	0,12%	0,24%	Fase preliminar Ejecutada (%)	0,12%	0,24%	-0,48%
Fase preliminar Programada ($)	$ 23.971.839,44	$ 47.943.678,88	Fase preliminar Ejecutada ($)	$ 23.971.839,44	$ 47.943.678,88	$ 0,00
OBRA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	Atraso /Avance
Obra Programada (%)	0%	0%	Obra Ejecutada (%)	0%	0%	0%
Obra Programada ($)	$ -	$ -	Obra Ejecutada ($)	$ -	$ -	$ -

GRAFICA DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO



Semana No.	ACUMULADO FINANCIERO	
	PROGRAMADO	EJECUTADO
1	0,06%	0,00%
2	0,06%	0,00%
3	0,06%	0,00%
4	0,00%	0,00%
5	0,00%	0,00%
6	0,00%	0,00%
7	0,00%	0,00%
8	0,00%	0,00%
9	2,06%	7,21%
10	2,13%	7,21%
11	1,73%	7,21%
12	2,58%	7,22%
13	3,48%	7,22%
14	4,60%	8,21%
15	6,07%	8,27%
16	7,67%	8,35%
17	9,67%	8,67%
18	11,53%	8,95%
19	13,68%	9,14%
20	8,43%	10,01%
21	3,05%	7,22%
22	3,87%	7,22%
23	4,77%	7,22%
24	5,53%	7,22%
25	6,43%	7,22%
26	8,68%	7,22%
27	10,18%	7,22%
28	14,04%	7,22%
29	18,03%	7,22%
30	19,35%	7,22%
31	23,23%	7,22%
32	26,73%	9,52%
33	46,38%	9,52%
34	53,73%	9,52%
35	55,94%	9,52%
36	57,95%	9,52%
37	59,95%	9,52%
38	62,48%	9,52%
39		

Análisis de la Gráfica:

No se cuenta con cronograma

AVANCE FISICO

PROGRAMADO				EJECUTADO				
Fase preliminar	SEMANAL	ACUMULADO	%Prog. Acum.		SEMANAL	ACUMULADO	% Ejec. Acum.	%Atraso /%Avance
Fase preliminar programada (m²)	1542,91	3085,82	24%	Fase preliminar Ejecutada (m2)	1542,91	3085,82	25%	0%
Fase preliminar programada (Und)	0	12	24%	Fase preliminar Ejecutada (Und)	0	12	24%	0%
Fase preliminar programada (Km/carril)	0,00171429	0,00342857	0,09%	Fase preliminar Ejecutada (Km/carril)	0,00171429	0,00342857	0,09%	
Estudios y Diseños Proceram. (m2)	0	0	0%	Estudios y Diseños Ejecutado (m2)	0	0	0%	%Atraso /%Avance
OBRA	SEMANAL	ACUMULADO	%Prog. Acum.		SEMANAL	ACUMULADO	% Ejec. Acum.	
Meta Física Proramada (m2)	0	0	0%	Meta Física Ejecutada (m2)	0	0	0%	%Atraso /%Avance
Meta Física Proramada (Km/carril)	0	0	0%	Meta Física Ejecutada (km/carril)	0	0	0%	0%
Meta Física Proramada (und)	0	0	0%	Meta Física Ejecutada (und)	0	0	0%	
Meta Física Proramada (km)	0	0	0%	Meta Física Ejecutada (km)	0	0	0%	
Meta Física Proramada (%)				Meta Física Ejecutada (%)				
AVANCE PROJECT								%Atraso /%Avance
Avance Programado (%)	0%			Avance Ejecutado (%)	0%			0%
Avance Programado Mantenimiento periódico	0%			Avance Ejecutado Mantenimiento periódico	0%			0%
Avance Programado Mantenimiento Rutinario	0%			Avance Ejecutado Mantenimiento Rutinario	0%			0%
Avance Programado Mantenimiento Rehabilitación	0%			Avance Ejecutado Mantenimiento Rehabilitación	0%			0%
Avance Programado Mantenimiento Rehabilitación	0%			Avance Ejecutado Mantenimiento Rehabilitación	0%			0%

B. ESTADO GENERAL DE LOS FRENTES DE TRABAJO EN LA SEMANA

No	CIV	PK_ID CALZADA	PK_ID ANDEN 1	PK_ID ANDEN 2	EJE	DESDE	HASTA	IPR	TIPO SUPERFICIE	TIPO DE ELEMENTO	ANCHO CALZADA (m)	LONGITUD (m)	AREA CALZADA (m²)	ESTADO	INFORMACION DE FRENTES QUE DEBERIAN INICIAR Y NO TIENEN ACTIVIDAD DE OBRA		
															FECHA DE INICIACION PROGRAMADA	MOTIVOS POR LOS CUALES NO SE HA INICIADO	Acciones a seguir
44	8004757	152907	23937	23938	KR 84	CL 42B SUR	CL 42A SUR	33,44	6	CALZADA	3,19	82,04	261,84	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Demolición de cajas de inspección, excavación manual e instalación de tapas.	1-abr-23		
45	8002718	155148	28037	28038	KR 89B	CL 40B SUR	CL 40 SUR	51,58	6	CALZADA	4,38	129,94	569,35	Sin iniciar	8-jul-23	SIN PMT	
46	8005377	152793	23725	23726	KR 81C	CL 42 SUR	CL 41F SUR	29,06	6	CALZADA	3,83	62,8	240,73	Sin iniciar	7-jul-23	SIN PMT	
47	8005506	152794	23727	23728	KR 81C	CL 42 SUR	DG 42A SUR	33,55	6	CALZADA	2,93	100,38	294,44	Sin iniciar	17-jul-23	SIN PMT	
48	8004699	152904	23931	23932	KR 83	CL 42A SUR	CL 41A SUR	52,51	6	CALZADA	4,74	144,13	683,05	SIN ACTIVIDADES	15-jun-23		
49	8004816	152905	23933	23934	KR 83	CL 42B SUR	CL 42A SUR	32,6	6	CALZADA	2,7	82,01	221,4	Calzada: Instalación de fresado estabilizado con cemento y solid sol al 4%. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad	24-jul-23		
59	8004663	152906	23935	23936	KR 84	CL 42A SUR	CL 41A SUR	52,51	6	CALZADA	5,25	136,17	714,24	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Excavación manual para monoblock e instalación monoblock	10-may-23		
51	8002727	155809	29188	29189	KR 90C	CL 42F SUR	CL 42G SUR	28,88	6	CALZADA	2,59	88,19	228,81	Sin iniciar	No se tiene programación		
52	8002795	155810	29190	29191	KR 90C	CL 42G SUR	CL 43 SUR	28,19	6	CALZADA	2,36	72,08	170,02	Sin iniciar	No se tiene programación		
53	8002995	155822	29214	29215	CL 42F BIS SUR	KR 89C	KR 89F	30,14	6	CALZADA	2,63	41,49	109,22	Sin iniciar	No se tiene programación		
54	8004508	152883	23881	23882	KR 83	CL 40D SUR	CL 41 SUR	37,56	6	CALZADA	4,88	88,16	430,2	Sin iniciar	No se tiene programación		
55	8005471	153124	24331	24332	CL 42H SUR	KR 81 I	KR 81J	29,06	6	CALZADA	3,74	27,95	104,45	Sin iniciar	25-jul-23	SIN PMT	
56	8004947	153132	24347	92062895	KR 83	CL 42C SUR	CL 42F BIS SUR	29,79	6	CALZADA	4,24	71,14	301,74	Calzada: Excavación mecánica. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad	25-feb-23		
57	8005351	153126	24335	24336	CL 42H SUR	KR 81L	KR 82	28,19	6	CALZADA	3,45	27,73	95,75	Sin iniciar	18-ago-23	SIN PMT	
58	8002225	155774	29118	29119	KR 90B	CL 40 SUR	CL 40A SUR	33,55	6	CALZADA	4,63	80,45	372,11	Sin iniciar	23-feb-23	SIN PMT	
59	8002331	155775	29120	29121	KR 90B	CL 40A SUR	CL 41 SUR	32,51	6	CALZADA	4,32	66,67	288,2	Sin iniciar	16-mar-23	SIN PMT	
60	8002162	155776	29122	29123	KR 90C	CL 40 SUR	CL 40A SUR	52,62	6	CALZADA	5	79,19	395,73	Calzada: Excavación manual para sumideros. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad	22-dic-22		
61	8002265	155777	29124	29125	KR 90C	CL 40A SUR	CL 41 SUR	51,58	6	CALZADA	4,54	65,92	299,32	SIN ACTIVIDADES	6-ene-23		
62	8002055	155780	29130	29131	KR 91	CL 40 SUR	CL 40A SUR	48,87	6	CALZADA	4,54	76,23	345,98	SIN INICIAR	6-mar-23		
63	8002132	155781	29132	29133	KR 91	CL 40A SUR	CL 41 SUR	63,03	6	CALZADA	4,41	66,53	293,12	SIN INICIAR	No se tiene programación por CIV		
64	8001931	155852	29274	29275	KR 91B	CL 40 SUR	CL 40A SUR	27,35	6	CALZADA	3,93	69,19	272,04	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Vaciado de concreto 3000 psi. Andén occidental: Instalación de geotextil y fresado	21-mar-23		
65	8002008	155853	29276	29277	KR 91B	CL 40A SUR	CL 41 SUR	29,06	6	CALZADA	3,5	67,82	237,35	SIN ACTIVIDADES	28-feb-23		
66	8001876	155860	29290	29291	KR 91C	CL 40 SUR	CL 40A SUR	27,35	6	CALZADA	3,84	67,47	259,4	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Excavación manual e instalación de fresado. Andén occidental: Excavación manual e instalación de fresado e instalación de concreto 3000 psi	9-mar-23		
67	8001968	155861	29292	29293	KR 91C	CL 40A SUR	CL 41 SUR	27,35	6	CALZADA	3,79	66,96	253,67	Sin iniciar	1-abr-23	SIN PMT	
68	8001715	155875	29320	29321	KR 92B	CL 40 SUR	CL 40A SUR	28,19	6	CALZADA	4,15	68,59	284,73	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Demolición concreto y excavación manual	18-mar-23		
69	8001823	155876	29322	29323	KR 92B	CL 40A SUR	CL 41 SUR	27,35	6	CALZADA	4,26	67,66	288,51	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Demolición concreto y excavación manual	8-abr-23		
70	8001657	155878	29326	29327	KR 93	CL 40 SUR	CL 40A SUR	28,19	6	CALZADA	3,87	62,49	241,97	SIN ACTIVIDADES	4-abr-23		
71	8001771	155879	29328	29329	KR 93	CL 40A SUR	CL 41 SUR	27,35	6	CALZADA	4,04	67,46	272,75	SIN ACTIVIDADES	21-abr-23		
72	8001545	155900	29370	29371	KR 93D	CL 40A SUR	CL 41 SUR	48,87	6	CALZADA	3,4	67,15	228,19	Sin iniciar	5-jun-23	SIN PMT	
73	8001148	155917	92062684	92062817	CL 38A SUR	KR 93D	KR 94C	49,32	6	CALZADA	4,21	55,04	231,7	SIN ACTIVIDADES	26-ene-23		
74	8001184	155918	92062720	92062828	CL 38B SUR	KR 93D	KR 94C	50,01	6	CALZADA	4,18	62,56	261,7	Calzada: Sin actividad. Andén norte: Instalación de concreto 3000psi. Andén sur: Excavación manual, instalación de geotextil, fresado e instalación de asfalto.	No se tiene programación por CIV		
75	8001223	155893	29356	29357	KR 93D	CL 38B SUR	CL 38C SUR	49,32	6	CALZADA	3,56	29,93	106,54	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Demolición y excavación manual. Andén occidental: Sin actividad	26-ene-23		
76	8001183	155892	29354	29355	KR 93D	CL 38A SUR	CL 38B SUR	49,32	6	CALZADA	3,92	31,84	124,92	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Demolición concreto y excavación manual. Andén occidental: Sin actividad	24-ene-23		
77	8001285	155920	29410	29411	CL 39A SUR	KR 93D	KR 94C	30,59	6	CALZADA	4,17	84,31	351,16	Sin iniciar	16-may-23	SIN PMT	
78	8005282	153127	24337	24338	CL 42H SUR	KR 82A	KR 82	28,19	6	CALZADA	3,47	27,72	96,23	Sin iniciar	12-sep-23	SIN PMT	
79	8001390	155890	29350	29351	KR 93C	CL 38C SUR	CL 40 SUR	31,4	6	CALZADA	4,09	96,82	395,99	Sin iniciar	6-may-23	SIN PMT	
80	8001581	155877	29324	29325	KR 93	CL 38C SUR	CL 40 SUR	28,54	2	CALZADA	4,06	96,35	391,11	Sin iniciar	6-jun-23	SIN PMT	
81	8005000	153026	24149	92062836	KR 82D	CL 42C SUR	CL 42F BIS SUR	28,95	6	CALZADA	4,3	73,09	314,48	Calzada: Instalación de mezcla asfáltica. Andén oriental: Terminación cajas. Andén occidental: Terminación cajas	16-dic-22		
82	8005078	153027	24151	24152	KR 82D	CL 42F BIS SUR	CL 42H SUR	28,54	6	CALZADA	4,89	72,7	355,66	Calzada: Instalación de mezcla asfáltica. Andén oriental: Terminación cajas. Andén occidental: Terminación cajas	3-ene-23		
83	8005258	153095	24273	24274	CL 42F BIS SUR	KR 81L	KR 82	31,84	6	CALZADA	3,21	27,68	88,78	Sin iniciar	21-jul-23	SIN PMT	
84	8005192	153096	24275	24276	CL 42F BIS SUR	KR 82	KR 82A	50,01	6	CALZADA	2,87	27,86	79,87	Sin iniciar	31-jul-23	SIN PMT	
85	8005126	153097	24277	24278	CL 42F BIS SUR	KR 82A	KR 82B	50,91	6	CALZADA	3,11	27,9	86,74	Sin iniciar	10-ago-23	SIN PMT	
86	8005065	153098	24279	24280	CL 42F BIS SUR	KR 82B	KR 82D	47,26	2	CALZADA	3,53	27,59	97,43	Sin iniciar	19-ago-23	SIN PMT	
87	8013930	902162	902161	902163	CL 42A BIS SUR	KR 80D	KR 80F	29,06	6	CALZADA	3,59	55,42	199,15	Sin iniciar	No se tiene programación por CIV		
88	8006231	152956	24009	24010	CL 42B SUR	KR 80D	KR 80F	28,04	6	CALZADA	4,28	53,74	230,06	Sin iniciar	No se tiene programación por CIV		
89	8001841	155851	29272	29273	KR 91B	CL 38C SUR	CL 40 SUR	28,54	6	CALZADA	4,34	99,91	433,99	Calzada: Apertura de CIV e inicia con excavación mecánica. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad	21-jun-23		
90	8005210	153128	24339	24340	CL 42H SUR	KR 82B	KR 82A	31,84	6	CALZADA	3,23	27,95	90,26	Sin iniciar	No se tiene programación por CIV		
91	8005408	153125	24333	24334	CL 42H SUR	KR 81J	KR 81L	29,06	6	CALZADA	4,1	27,99	114,7	Sin iniciar	No se tiene programación por CIV		
92	8004910	153106	24295	92062924	CL 42B BIS SUR	KR 85A	KR 82D	49,21	6	CALZADA	2,22	112,12	248,59	Sin iniciar	18-mar-23	SIN PMT	
93	8001427	155899	29368	29369	KR 93D	CL 40A SUR	CL 40 SUR	29,06	6	CALZADA	2,95	56,74	167,56	Sin iniciar	16-jun-23	SIN PMT	

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

1.COMPONENTE TECNICO

1.1. Actividades Técnicas de Interventoría

• Se realiza verificación del PMT y del cerramiento del frente de obra.
• Se cuenta con PMT aprobados de los CIV 8004797-8004699-8004818-8004663-8002162-8002265-8001931-2002008-8001876-8001715-8001823-8001657-8001148-8001223-8001184-8001183-8004947-8001841
• Seguimiento en la conformación de espacio público 44-64-66-74-75-76, terminación de cajas 81-82, mejoramiento de vía y excavación mecánica 50-48-49-56.
• Seguimiento a la instalación de fresado estabilizado con cemento y solid soil al 4% -49. Seguimiento a la apertura de CIV 89.

1.2 Seguimiento de las actividades del contratista

• **PB1:** Calzada: Instalación de mezcla asfáltica. Andén oriental: Terminación cajas. Andén occidental: Terminación cajas
• **PB2:** Calzada: Instalación de mezcla asfáltica. Andén oriental: Terminación cajas. Andén occidental: Terminación cajas
• **P60:** Calzada: Excavación manual para sumideros. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
• **P61:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
• **P64:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Vaciado de concreto 3000 psi. Andén occidental: Instalación de geotextil y fresado
• **P65:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
• **P73:** Calzada: Sin actividad. Andén norte: Sin actividad. Andén sur: Sin actividad.
• **P74:** Calzada: Sin actividad. Andén norte: Instalación de concreto 3000psi. Andén sur: Excavación manual, instalación de geotextil, fresado e instalación de asfalto.
• **P75:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Demolición y excavación manual. Andén occidental: Sin actividad
• **P76:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Demolición concreto y excavación manual. Andén occidental: Sin actividad
• **P66:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Excavación manual e instalación de fresado. Andén occidental: Excavación manual e instalación de fresado e instalación de concreto 3000 psi
• **P44:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Demolición de cajas de inspección, excavación manual e instalación de fresado.
• **P50:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Excavación manual para monoblock e instalación monoblock
• **P68:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Demolición concreto y excavación manual
• **P69:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Demolición concreto y excavación manual
• **P70:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
• **P71:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.
• **P49:** Calzada: Instalación de fresado estabilizado con cemento y solid soil al 4%. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
• **P48:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
• **P56:** Calzada: Excavación mecánica. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
• **P89:** Calzada: Apertura de CIV e inicia con excavación mecánica. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad

1.5 Actividades a realizar la siguiente semana

• Excavación mecánica y transporte de material proveniente de excavación.
• Participación del comité de seguimiento semanal y del comité de seguimiento interno
• Nivelación y compactación de la subrasante. Instalación del fresado estabilizado, de sumidero y monoblock
• [illegible]

2. COMPONENTE AMBIENT AL

• La calificación fue de 100 %
• RCD GENERADO. Para este periodo se ha enviado el material al sitio de disposición final "LAMD", proveniente de labores de Excavación, por un total de 825m3.
• Material fresado: De la Unidad de Mantenimiento Vial. UMV, 0 m3, de Patio IDU 0 m3

Se continúan con las actividades en los CIVs de la siguiente manera:
CIV 8004757 (44) - Cargué y retiro de material de excavación Andenes C/Occidental - Lleno Fresado Andén - Demolición caja de inspección - Conformación espacio para Fresado
CIV 8004816 (49) - Excavación manual para instalación Monoblock - Fresado Estabilizado RAP 1a capa - Compactación Fresado Estabilizado RAP 1a capa
CIV 8004663 (50) - Excavación manual e instalación Monoblock
CIV 8004947 (56) - Cargué y retiro de material de excavacion
CIV 8002162 (60) - Excavación para sumidero - Fundida solado de limpieza para instalación sumideros - Instalación base sumidero
CIV 8002265 (61) - Limpieza sumideros
CIV 8001931 (64) - Compactación de fresado en anden capa 1 costado occidental - Demolición y construcción de caja 0.60×0.60, esquina costado oriental - Lleno con fresado en anden 2da capa costado occidental - Conformación de anden costado occidental
CIV 8002008 (65) - Sin actividades
CIV 8001876 (66) - Instalación de marcos de cajas y caja de inspección V100 costado oriental - Compactacion de anden 2da capa costado oriental
CIV 8001715 (68) - Demolición cajas de inspeccion anden - Amejo pañete punta sur costado occidental - Excavación anden - Fundida solidado de limpieza para instalación sumidero - Construcción cajas de inspección - Instalación base sumideros - Corte y Demolición parte inferior sumideros
CIV 8001823 (69) - Chequeo con CCTV tubería 20" pluvial en concreto - Excavación manual para anden oriental - Corte en andén para demolición costado oriental - Excavación de andén costado oriental se encuentra tubería de cobre para alimentación agua potable, la cual se le despiega codo principal - Pañete cajas de inspección - Se le hace entrega del pozo abierta y el contador del agua potable al propietario
CIV 8001657 (70) - Sin actividades

En recorrido realizado el 5 de julio de 2023 en forma conjunta Residente ambiental de Interventoría con el residente ambiental del contratista se evidenció lo siguiente:

• Los frentes de obra se encuentran en buenas condiciones de orden y aseo, es de anotar que varios de los puntos prioritarios se encuentran sin actividades constructivas y otros con actividades de bajo impacto.
• Se cuenta con el Kit de derrames, punto ecológico, y baños fijos y móviles para hombres y mujeres en los CIV actuales.
• El campamento se encuentra en buenas condiciones de orden y aseo.
• Se encuentran realizando acopio para retiro de material de Excavación.
• En la misma visita se evidenció "Ausencia de Personal y de actividades" en algunos CIV´s. En algunos puntos se encuentran realizando actividades de excavación.
• Se realiza el requerimiento de verificar las cantidades de material fresado instalado y conciliado con interventoría para ajustar las tablas respectivas y tener certeza del saldo de material de fresado.

3. COMPONENTE SST

3.1. ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA EN MATERIA SST

INFORMACIÓN DEL PERSONAL

Ingreso	Antiguos	Retiros	TOTAL, PERSONAL ACTIVO EN LA SEMANA REPORTADA:
1. Consorcio SCLV: 0	1. Consorcio SCLV: 21	0	51
	2. Silva Carreño y Asociados S.A.S: 10		
	3. La Vialidad Limitada: 13		
	4. Carse Ingeniería Ltda: 1		
	5. J.V.R Estudios: 1		
	6. Geovial Limitada:5		

3.2 AUSENTISMO DE PERSONAL

Durante el desarrollo de las actividades de la semana del 29 junio de 2023 al 5 de julio de 2023, se presentó ausentismo del personal de la Interventoría que se relaciona a continuación:

Nombre	Cargo	Días de incapacidad	Descripción
José de Calasanz Mosquera	IR Ambiental	1	M545: Incapacidad enfermedad general 05/07/2023 al 06/07/2023

3.3 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

• El 29 de junio de 2023 se realizó recorrido de obra donde se evidenció que el personal corresponde al aprobado por la Interventoría, en las prioridades intervenidas se observaron equipos para la atención de emergencias, e información de conformación de brigada de emergencias.
• El 29 de junio de 2023 se realizó comité de seguimiento semanal presencial, donde el componente SST reportó el avance de las actividades realizadas en las prioridades intervenidas, estado del informe mensual 8, calificación semanal, documentos de ingreso e indicadores de rotación.
• El 4 de julio de 2023 se realizó recorrido de obra por los CIV en ejecución al momento de la visita se evidenció que el personal corresponde al aprobado por la Interventoría, cuenta con la dotación de acuerdo con el manual de identificación visual, hace uso (EPP) para las actividades de obra.
•Al momento de la visita de obra por parte del componente SST se evidencia lo siguiente:

UPZ CORABASTOS:

P81: No se encuentran desarrollando actividades
P82: No se encuentran desarrollando actividades, este CIV junto con el CIV 81 cuenta con unidades sanitarias para uso de los trabajadores, se evidencia punto ecológico, de hidratación, kit de emergencias, el frente de obra se encuentra señalizado referente a rutas de emergencia.
P44: Actividades de demolición y excavación en espacio público y construccion de cajas, el personal porta la dotación de acuerdo con el manual de identificación visual, este CIV cuenta con punto ecológico, de hidratación, kit de emergencias.
P48: No se encuentran desarrollando actividades
P49: Actividades de estabilización en la vía, el personal cuenta con la dotación de acuerdo con el manual de identificación visual así mismo hace uso de los EPP.
P50: No se encuentran desarrollando actividades este CIV cuenta con cartelera informativa y kit de emergencia

UPZ PATIO BONITO:

P60: Actividades de excavación en espacio público este CIV cuenta con cartelera informativa y kit de emergencia.
P61: No se encuentran desarrollando actividades
P64: Excavación espacio público, el personal cuenta la dotación y hacen uso de EPP, se evidencia punto ecológico, de hidratación, unidad sanitaria, cartelera informativa y kit de emergencias y señalización a rutas de emergencia estos elementos son compartido con el CIV 60, 61 y 65.
P65: No se encuentran desarrollando actividades.
P66: Conformación de espacio público este CIV cuenta con kit de emergencia. punto ecológico y kit antiderrame.
P68: Actividades de excavación de espacio publico este CIV cuenta con kit de emergencia punto ecológico y kit antiderrame.
P69: Actividades de excavación de espacio público.
P70: No se encuentran desarrollando actividades.
P71: No se encuentran desarrollando actividades.
P73: No se encuentran desarrollando actividades.
P74: No se encuentran desarrollando actividades, este CIV cuenta con kit de emergencia, cartelera informativa y kit antiderrame estos insumos están compartidos con los CIV 73,75 y 76..
P75: Conformación de espacio público.
P76: Conformación de espacio público

• De acuerdo con lo antes expuesto se realizaron recomendaciones al contratista con el fin de cumplir con los requisitos mínimos en gestión SST y así mismo para apertura a los próximos CIV a ejecutar. Como recomendaciones generales se solicitó al contratista orden y aseo, adicional a esto revisar y garantizar los senderos peatonales y el acceso a las viviendas, esto aplica para todas las prioridades.
• Durante la semana se revisaron documentos de ingreso del personal de obra, correspondientes a contratos, exámenes médicos ocupacionales de ingreso, certificaciones de afiliación al Sistema General de Seguridad Social Integral (AFP, ARL, CCF, EPS), notificación de riesgos e inducciones.
• El 29 de junio de 2023 la Interventoría como parte de la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo realizó pausas activas con ejercicios cohesionadores.
• El 4 de julio de 2023 la Interventoría como parte de la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo socializó información sobre hábitos de vida saludables enfocado al manejo de estrés.
• El 5 de julio de 2023 se llevó a cabo comité interno de interventoría donde en el componente SST se revisó el avance de las actividades realizadas en las prioridades que están siendo intervenidas, calificación de las fichas Ambientales y SST, e informo sobre los resultados del recorrido de obra.
• Durante la semana se realizó seguimiento al uso adecuado de los EPP´y elementos de identidad visual del personal de interventoría

3.4 ACCIDENTALIDAD EN EL PERIODO.

Durante el desarrollo de las actividades de la semana del 29 junio de 2023 al 5 de julio de 2023, no se presentaron accidentes de trabajo (AT) del personal de la Interventoría.

3.5 ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA EN MATERIA SST

INFORMACIÓN DEL PERSONAL

Ingreso	Antiguos	Retiros	PERSONAL ACTIVO EN LA SEMANA REPORTADA:
AIKA HUMANA = 1	1. CVK22 = 9	1. AIKA HUMANA = 2	121
	2. AIKA HUMANA = 76	2. SAM INGENIERIA = 1	
	3. MMAPV SAS = 5		
	4. MR GROUP COL SAS = 1		
	5. SOLTEC PROYECTOS INGENIERÍA SAS = 1		
	6. MABERIK = 1		
	7. WITS = 1		
	8. SOLUCIONES TECMARQ SAS = 1		
	9. V&V CONSTRUCCIONES = 1		
	10. AREVALO Y ARDILA CONSTRUCTORA SAS = 10		
	11. CONSTRUBERNAL = 1		
	12. SAM INGENIERIA = 10		
	13. MAQUINARIA Y SERVICIOS = 1		
	14. GUILLERMO CABALLERO GONZALEZ = 1		
	16. HA CIVILES = 3		
	17. TRANSPORTE Y MAQUINARIA C&C = 1		

3.6 AUSENTISMO DE PERSONAL

Durante el desarrollo de las actividades de la semana del 29 junio de 2023 al 5 de julio de 2023, el contratista reporto ausentismo de doce (12) trabajadores, dos (2) generado por enfermedad general uno (1) por accidente de trabajo, uno (1) por calamidad y ocho (8) que no asistieron
De acuerdo con lo anterior el Contratista evaluó el indicador de ausentismo de la semana del 29 junio de 2023 al 5 de julio de 2023, del personal con cargos maestros, oficiales y ayudantes de obra el cual se relaciona a continuación:
Nº de días de ausencia = 11
Nº de días de trabajo programados = 5
Nº Trabajadores en la semana = 48
% de ausentismo 4,58%

Es así como se evidencia que el 4,58% de los cargos relacionados anteriormente estuvieron ausentes en la semana.

3.7 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

• Durante la semana el contratista incorporo personal.
• Se realizó inducción al personal nuevo, donde se presentan las Generalidades sobre el SG-SST, Estructura Organizacional- Reglamento Interno de Trabajo- de Higiene industrial- Políticas de SST, alcohol, drogas y tabaquismo- Aspectos legales relacionados con SST. Condiciones de Salud y Medicina laboral, Higiene y Seguridad Industrial- Identificación de peligros, Uso de EPP, matriz de peligros entre otros.
• Se hace la notificación de riesgos al personal que ingreso a laborar a los cuales se encuentra expuesto relacionados con cada cargo: Riesgo mecánico, Químico, Locativo, Biológico, Biomecánico, Físico, Eléctrico, de seguridad, Publico y Fenómenos naturales
• Se realizo la entrega de dotación y EPP al personal que ingresó a laborar al contrato COP 693-22, también realizo la socialización del uso obligatorio durante el desarrollo de las actividades de obra
• El personal de obra cuenta con los espacios requeridos para almacenar su ropa durante el horario de trabajo, de igual manera cuentan con baterías sanitarias en óptimas condiciones y en cantidad suficiente de acuerdo con el género. de trabajadores presente en el frente de obra.
• El contratista reporto que se realizaron actividades de orden y aseo en los frentes de obra.
• Se llevo a cabo inspecciones de maquinaria y EPP en los frentes de obra.
• Durante la semana se presento un accidente de trabajo leve.
• El frente de obra cuenta con los espacios requeridos en el apéndice D del MAO, cuenta con espacio de almacenamiento de ropa de cambio de los trabajadores, kit de emergencias y botiquines en cantidad suficiente conforme con el número y el género de los integrantes del frente de obra, se hace el mantenimiento requerido con el fin de mantener en óptimas condiciones.

3.8 ACCIDENTALIDAD EN EL PERIODO

• El Contratista reportó un (1) accidentes de trabajo (AT), durante el desarrollo de las actividades de la semana del 29 junio de 2023 al 5 de julio de 2023 del trabajador que se relaciona a continuación.

4.COMPONENTE SOCIAL

4.1 Programa de Servicio a la Ciudadanía

• En este periodo el PAC es atendido de acuerdo con el horario aprobado previamente por la interventoría; lunes a viernes de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Adicionalmente, el contratista realizó recorridos sociales para atender inquietudes de la comunidad y acercar la atención a la ciudadanía en el área de intervención, los martes y jueves en el horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., lo anterior, para completar 40 horas de atención según lo requerido contractualmente.
• En el corte reportado se atendió el PAC de acuerdo con el horario aprobado por la interventoría. En este periodo no se reportaron solicitudes de veedurías ciudadanas.

PQRSD:

A la fecha el contratista cuenta con 38 PQRSD; de las cuales 32 se encuentran cerradas y 6 en trámite, a continuación, se realiza la trazabilidad por cada una
• PQRSD 23: Pendiente por cierre, de acuerdo a la respuesta por parte de la ciudadana a su requerimiento
• PQRSD 34: El 28/06/2023 contratista inicia con el proceso de ajuste de la rampa de acceso del espacio público, en el momento no se encuentra propietaria, ni persona encargada.
• PQRSD 35: El 28/06/23 el contratista inicia con el proceso de ajuste de la rampa de acceso del espacio público, se le informa a la ciudadana el desarrollo de esta actividad.
• PQRSD 36: Ciudadana solicita en comité veedor N. 6 el 30/06/23 revisión de la bajante de aguas lluvias de su predio.
• PQRSD 37: Ciudadana solicita en comité veedor N. 6 del 30/06/23 revisión inconformidad por la elaboración de la caja de inspección.
• PQRSD 38: Ciudadana solicita en comité veedor N. 6 del 30/06/23 solicita adecuación para el paso peatonal. El 30/6/2023, se realiza seguimiento a predio, donde se evidencia elaboración del paso peatonal de ingreso a predio.

Recorridos Urbanos:

• El 29 de junio y 04 de julio 2023 se realiza recorrido por los frentes de obra activos de las UPZ 80 Corabastos y la UPZ 82 Patio Bonito en los cuales se verifica las vallas informativas de los frentes de obra, seguimiento y gestión de PQRSD abiertas.

4.2 Programa de Diálogo y participación ciudadana

• El 30/06/2023, la gestión social de la interventoría acompaño al contratista en la ejecución del comité FDLK N. 06 contando con la participación de 17 ciudadanos en la UPZ de Corabastos y 44 ciudadanos correspondientes a la UPZ de Patio Bonito

4.3 Programa de acompañamiento técnico

Actas de vecindad:

• Se continua con el proceso de levantamiento y edición de actas de vecindad del CIV 8001581 P. 80. **Total, de actas realizadas en el contrato: 639**
• Se continua con el proceso de levantamiento y edición de actas de acceso vehicular del CIV 8001581 P. 80. **Total, de actas realizadas en el contrato: 379**
• Interventoría emitió comunicado IZ33-G2-527-23: Aprobación de actas de vecindad prioridad 89. Responde comunicación CV- CVK22-ADM-543

Cierres de Actas de Vecindad:

• En este corte (04/07/23) se inicia con el proceso de cierre de actas de acceso vehicular en los CIV 8005000 P. 81 y 8005078 P.82, teniendo en cuenta el cumplimiento de las actividades constructivas en estos tramos.

Actas de compromiso:

• El contratista continúa con la elaboración de actas de compromiso con comunidad referente a novedades puntuales en los frentes de obra, a partir del 4 julio se inicia con la entrega de copias de actas de compromiso de manera presencial como de forma virtual.

4.4 Programa de cultura ciudadana

• Respecto a las acciones de formación a empleados de obra, el día 04/07/2023 se reciben correcciones emitidas vía telefónica por parte de interventoría para su aprobación este mismo día.

4.5 Programa de gobernanza para la movilidad

• A la fecha el contrato cuenta con 69 personas de MONC; de las cuáles 12 de ellos residen en la localidad, 05 de estos trabajadores son mujeres y 07 son hombres, sus cargos dentro de la obra son de auxiliares de tráfico, BOAL y ayudantes de obra. El porcentaje de contratación general a la fecha es de 17.39 % correspondiente a trabajadores residentes en la localidad de Kennedy, de ellos 7,24 % son mujeres.

4.6 Programa de información para el desarrollo del proyecto

Vallas informativas

• Para el periodo reportado, los frentes de obra actuales cuentan con su valla informativa de inicio a fin y cuentan con el porcentaje de obra actual. Los frentes que cuentan con valla informativa son los siguientes: P44, P48, P49, P50, P60, P61, P64, P65, P66, P68, P69, P70, P71, P73, P74, P75, P76, P81, P82
• Por otro lado, el contratista realiza la subsanación de las vallas que han sido hurtadas o se encuentren afectadas con el fin de garantizar la información, se realiza instalación de las vallas informativas de los CIV 8004947 P. 56 y 8001841 P. 89.
• A corte de este periodo el avance de obra se encuentra en el 24.64% con 126 días para finalización de obra, se le notifica a la interventoría en comité de seguimiento, que esta información será actualizada los días de corte de entrega de informe semanal del área técnica.
• En el comité social se llega al acuerdo de dejar 1 valla por CIV (2 por tramo), esto con el fin de mantener informada a la comunidad acerca del % de ejecución y de los días restantes de obra, de acuerdo al cronograma del mismo

Nota aclaratoria: en las prioridades: 81, 82, 64 y 65 se deja valla móvil galvanizada en el centro del tramo ya que en estos sectores se encuentran personal de tráfico que pueden cuidar estos elementos, teniendo en cuenta la inseguridad del sector.

Volantes de información:

• El 28/06/23 se realiza mesa de trabajo junto a interventoría, con el fin de ajustar información de los volantes de bajantes de aguas lluvias volante N. 13 y 14.
• El 28/06/23 se realiza elaboración del volante N. 97 "Recomendación adecuación de cubierta" el cual fue aprobado el día 04/07/23. Además se realiza envío de los volantes N. 98 "Inicio de actividades constructivas CIV 8004910 P. 92" y 99 "Punto de recolección de basuras CIV 8004910 P. 92" para su revisión, sin embargo, de acuerdo a la directriz emitida por parte de la ingeniería Sarita Molina el día 04/07/23, no es posible iniciar aún con las actividades constructivas del CIV 8004910 P. 92 por cuestiones de trámite de PMT, en ese orden de ideas los volantes de esta prioridad tendrían cambio de fecha y se remitirán nuevamente sobre este correo electrónico.
• El 28/06/23 se emita a revisión el volante N. 100 "Volante recomendación sobre la construcción de la malla vial", el cual se encuentra en proceso de aprobación.
• Por otro lado, el 01/07/23 se realiza la distribución de 05 volantes N. 93, levantamiento de actas de vecindad, última visita del CIV 8001581 P. 80
• El 04/07/23 se emita para aprobación los volantes 101,102 y 103 levantamiento de actas de vecindad del CIV 8001285 P.77 (1ra, 2da y 3ra visita), además del volante 104 Construcción de espacio público P.50

Afiches informativos:

• A la fecha de este corte, los afiches informativos del proyecto se encuentran instalados en los PSI y en el PAC, con los datos actualizados de la dirección del nuevo PAC, el día 29/06/23 se realiza actualización del afiche informativo del PSI Villa Loma, por deterioro.

Puntos Satélites de información:

• Esta actividad se realizará una vez se cuenten con la aprobación de los volantes remitidos a la interventoría, como es el caso del Volante N. 13,14 y 100.

4.6 Comités

• Se realizó el comité social N°36, el 4 de julio a las 2:00 pm de manera virtual.
• Se brinda en el comité de seguimiento la calificación semanal la cual es de 97% de cumplimiento, toda vez que hubo desinformación con la comunidad con los volantes de inicio de obra de las prioridades 68 y 69. Adicionalmente se realizaron trabajos nocturnos sin comentar a la comunidad, por falta de información del área técnica, tal como lo cita el apéndice H

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS / LEGALES

No se presentaron

4. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES (CAUSAS ATRASO, ETC.)

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES:

5. ANEXOS

	SI	NO
1. Cronograma en Ms Project	X	
2. Registro Fotográfico	X	
3. Avance	X	

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los CINCO (Día del mes) días del mes de julio (Mes en curso) de 2023 (Año de la fecha del informe)



Director de Interventoría

FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA No. 39 **DEL** 29 de junio de 2023 **AL** 5 de julio de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 717 de 2022 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 690 de 2022 (Número de Contrato)

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripción Foto 1.

CIV: No. 64 - 8001931
Descripción: Vaciado de concreto e instalación de fresado y geotextil



Descripción Foto 2.

CIV: No.74 - 8001184
Descripción: Instalación de concreto



Descripción Foto 3.

CIV: No.60 - 8002162
Descripción: Instalación de sumideros



Descripción Foto 4.

CIV: No.69 - 8001823
Descripción: Instalación de mezcla asfáltica



Descripción Foto 5.

CIV: No.65 - 8002008
Descripción: Sin actividad



Descripción Foto 6.

CIV: No.75 - 8001223
Descripción: Demolición y excavación manual de andén



Descripción Foto 7.

CIV: No.50 - 8004663
Descripción: Excavación manual para instalación de monoblock



Descripción Foto 8.

CIV: No.61 - 8002265
Descripción: Sin actividad

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA



Descripción Foto 9.

CIV: No.44 - 8004757
Descripción: Demolición de cajas de inspección, excavación manual e instalación de fresado.



Descripción Foto 10.

CIV: No.49 - 8004816
Descripción: Instalación de fresado estabilizado con cemento y solid soil al 4%



Descripción Foto 11.

CIV: No.68 - 8001715
Descripción: Excavación manual

Descripción Foto 12

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

cinco (5) días del mes de julio de 2023

(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)


(Firma)

(Nombre) Juan Manuel Alba Rojas

Director de Interventoría.
Nombre de la firma interventora

CONSORCIO SCLV
NIT 900.547.145-2
EVALUACIÓN PROGRAMACIÓN INICIAL - GRUPO 2
SEGUIMIENTO AL 4-JULIO-2023


P	CIV	VALOR CIV	PROG-ACUM ($)	PROG-ACUM (%)	EJEC-ACUM ($)	EJEC-ACUM (%)	PESO EJEC PROG (%)	ATRASO (%)
81	8005000	$ 331.062.908,00	$ 493.706.016,00	2,83%	$ 307.829.014,10	1,76%	92,98%	-1,07%
82	8005078	$ 343.085.920,00	$ 479.749.662,00	2,75%	$ 332.182.707,83	1,90%	96,82%	-0,85%
60	8002162	$ 320.721.252,00	$ 514.640.546,00	2,95%	$ 268.879.408,07	1,54%	83,84%	-1,41%
61	8002265	$ 355.199.128,00	$ 460.559.675,00	2,64%	$ 342.108.113,38	1,96%	96,31%	-0,68%
65	8002008	$ 360.580.405,00	$ 432.646.968,00	2,48%	$ 336.556.828,81	1,93%	93,34%	-0,55%
64	8001931	$ 376.367.569,00	$ 443.114.233,00	2,54%	$ 323.585.893,13	1,85%	85,98%	-0,69%
73	8001148	$ 285.710.532,00	$ 338.441.580,00	1,94%	$ 269.281.829,64	1,54%	94,25%	-0,40%
76	8001183	$ 146.013.903,00	$ 233.768.926,00	1,34%	$ 120.970.675,38	0,69%	82,85%	-0,65%
75	8001223	$ 144.206.710,00	$ 183.177.144,00	1,05%	$ 97.870.154,88	0,56%	67,87%	-0,49%
74	8001184	$ 347.413.004,00	$ 0,00	0,00%	$ 281.327.500,09	1,61%	80,98%	1,61%
70	8001657	$ 342.553.149,00	$ 394.266.995,00	2,26%	$ 32.050.753,20	0,18%	9,36%	-2,08%
66	8001876	$ 318.216.103,00	$ 430.902.424,00	2,47%	$ 169.063.757,16	0,97%	53,13%	-1,50%
44	8004757	$ 544.689.706,00	$ 416.946.070,00	2,39%	$ 224.452.888,05	1,29%	41,21%	-1,10%
68	8001715	$ 351.516.714,00	$ 497.195.104,00	2,85%	$ 4.569.279,05	0,03%	1,30%	-2,82%
71	8001771	$ 361.446.034,00	$ 413.456.981,00	2,37%	$ 101.220.892,84	0,58%	28,00%	-1,79%
69	8001823	$ 341.507.411,00	$ 429.157.879,00	2,46%	$ 55.106.944,93	0,32%	16,14%	-2,14%
50	8004663	$ 770.232.864,00	$ 443.114.233,00	2,54%	$ 115.839.858,28	0,66%	15,04%	-1,88%
56	8004947	$ 377.475.477,00	$ 436.136.056,00	2,50%	$ 17.767.408,26	0,10%	4,71%	-2,40%
49	8004816	$ 479.216.394,00	$ 435.825.915,07	2,50%	$ 106.634.748,57	0,61%	22,25%	-1,89%
48	8004699	$ 983.197.315,00	$ 452.069.559,93	2,59%	$ 37.399.747,75	0,21%	3,80%	-2,38%
89	8001841	$ 580.698.248,00	$ 464.630.278,98	2,66%	$ 13.900.655,57	0,08%	2,39%	-2,58%
79	8001390	$ 629.262.662,00	$ 185.929.646,71	1,07%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-1,07%
62	8002055	$ 443.969.911,00	$ 546.042.342,00	3,13%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-3,13%
63	8002132	$ 301.695.957,00	$ 427.413.335,00	2,45%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-2,45%
58	8002225	$ 370.268.458,00	$ 439.625.145,00	2,52%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-2,52%
59	8002331	$ 360.017.625,00	$ 523.363.268,00	3,00%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-3,00%
67	8001968	$ 386.650.290,00	$ 444.858.777,00	2,55%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-2,55%
92	8004910	$ 456.639.023,00	$ 224.522.841,77	1,29%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-1,29%
80	8001581	$ 584.822.489,00	$ 157.008.980,33	0,90%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-0,90%
72	8001545	$ 348.655.292,00	$ 102.036.453,24	0,58%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-0,58%
93	8001427	$ 321.630.570,00	$ 101.432.785,61	0,58%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-0,58%
TOTALES			**$ 11.545.739.820,64**	**66,18%**	**$ 3.558.599.058,95**	**20,40%**		**-45,79%**
TOTAL DE OBRA			**$ 17.445.442.250,00**					

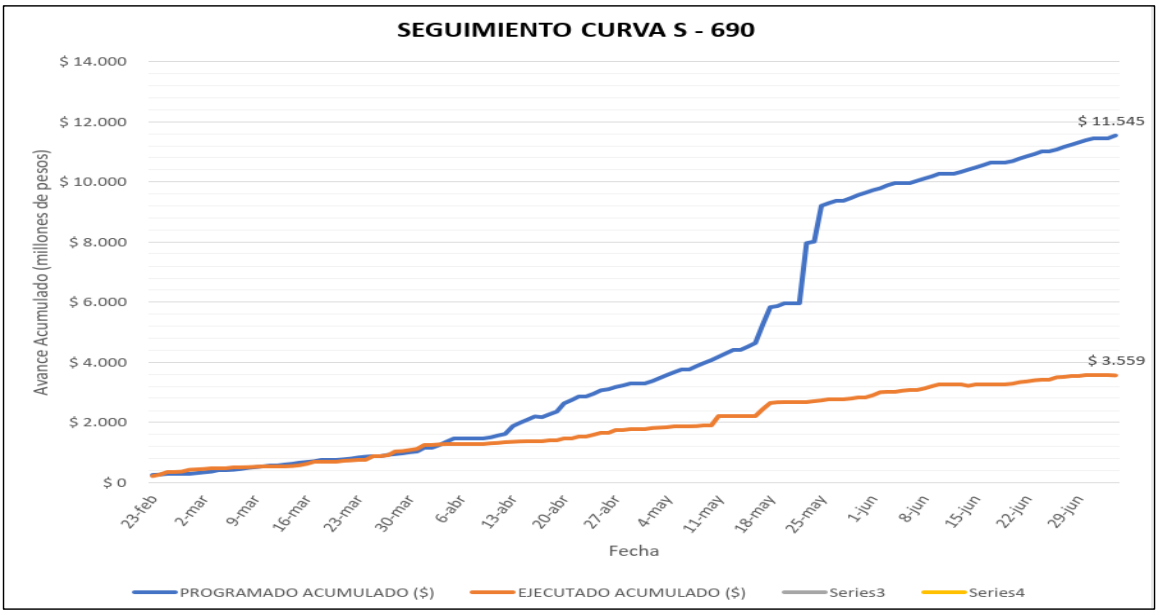


CONSORCIO SCLV
NIT 900.547.145-2
EVALUACIÓN CIV

FECHA EVALUACIÓN			6-jun	13-jun	20-jun	27-jun	4-jul
P	CIV	VALOR TOTAL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV
81	8005000	$ 331.062.908,00	66,37%	76,51%	92,98%	92,98%	92,98%
82	8005078	$ 343.085.920,00	78,05%	92,57%	96,82%	96,82%	96,82%
60	8002162	$ 320.721.252,00	55,79%	63,71%	83,78%	83,84%	83,84%
61	8002265	$ 355.199.128,00	73,98%	76,66%	87,19%	96,31%	96,31%
65	8002008	$ 360.580.405,00	66,01%	74,80%	84,39%	93,34%	93,34%
64	8001931	$ 376.367.569,00	64,41%	66,02%	80,95%	84,23%	85,98%
73	8001148	$ 285.710.532,00	64,29%	70,45%	86,80%	94,25%	94,25%
76	8001183	$ 146.013.903,00	51,30%	55,34%	80,41%	82,47%	82,85%
75	8001223	$ 144.206.710,00	25,77%	25,77%	67,87%	67,87%	67,87%
74	8001184	$ 347.413.004,00	44,54%	44,86%	77,97%	80,98%	80,98%
70	8001657	$ 342.553.149,00	1,79%	10,86%	8,40%	9,36%	9,36%
66	8001876	$ 318.216.103,00	30,99%	31,11%	49,56%	52,05%	53,13%
44	8004757	$ 544.689.706,00	41,20%	41,20%	41,13%	41,13%	41,21%
68	8001715	$ 351.516.714,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,30%
71	8001771	$ 361.446.034,00	0,00%	0,00%	17,91%	28,00%	28,00%
69	8001823	$ 341.507.411,00	0,00%	0,00%	2,52%	16,14%	16,14%
50	8004663	$ 770.232.864,00	7,40%	7,40%	14,48%	15,04%	15,04%
56	8004947	$ 377.475.477,00	12,72%	12,85%	0,18%	0,85%	4,71%
49	8004816	$ 479.216.394,00	7,66%	7,66%	20,87%	21,00%	22,25%
48	8004699	$ 983.197.315,00	7,40%	7,40%	1,47%	2,75%	3,80%
89	8001841	$ 580.698.248,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,39%

FECHA EVALUACIÓN			4-jul
P	CIV	VALOR TOTAL CIV	%AVANCE DEL CIV
81	8005000	$ 331.062.908,00	0,00%
82	8005078	$ 343.085.920,00	0,00%
60	8002162	$ 320.721.252,00	0,00%
61	8002265	$ 355.199.128,00	0,00%
65	8002008	$ 360.580.405,00	0,00%
64	8001931	$ 376.367.569,00	1,75%
73	8001148	$ 285.710.532,00	0,00%
76	8001183	$ 146.013.903,00	0,38%
75	8001223	$ 144.206.710,00	0,00%
74	8001184	$ 347.413.004,00	0,00%
70	8001657	$ 342.553.149,00	0,00%
66	8001876	$ 318.216.103,00	1,08%
44	8004757	$ 544.689.706,00	0,08%
68	8001715	$ 351.516.714,00	1,30%
71	8001771	$ 361.446.034,00	0,00%
69	8001823	$ 341.507.411,00	0,00%
50	8004663	$ 770.232.864,00	0,00%
56	8004947	$ 377.475.477,00	3,85%
49	8004816	$ 479.216.394,00	1,25%
48	8004699	$ 983.197.315,00	1,06%
89	8001841	$ 580.698.248,00	2,39%

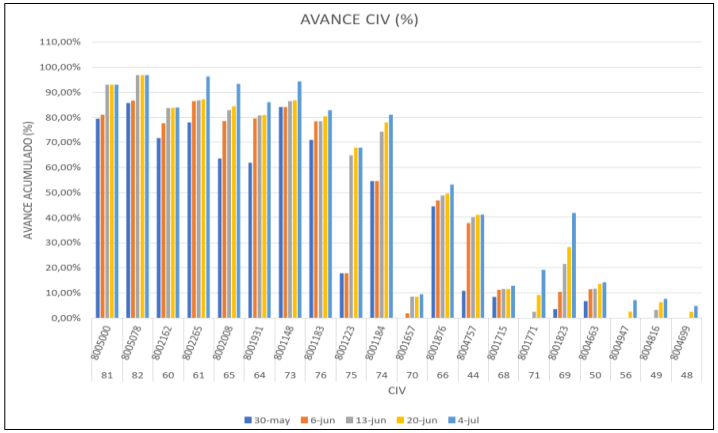



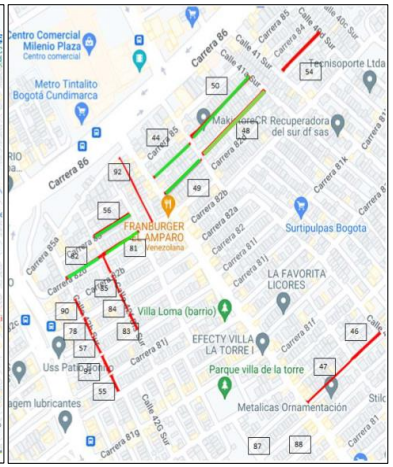

CONSORCIO SCLV
NIT. 900.547.145-2

REPORTE AVANCE SEMANAL
GRUPO 2 - CONTRATO COP-690-22
CONTRATISTA CONSORCIO VÍAS DE KENNEDY 22

Periodo **29 de junio al 4 de julio de 2023**

AVANCE	%General	%Físico	%Financiero
%Programado	64,49%	66,18%	64,49%
%Ejecutado	21,67%	21,37%	9,52%
Atraso(-)/Adelanto(+)	-42,82%	-44,81%	-54,97%

ESTADO SEMANAL DE PROCESO CONSTRUCTIVO

CONTRATISTA DE OBRA GRUPO 2 -CVK22 COP 690-22

| PK_ID CALZADA | PK_ID ANDEN | PK_ID ANDEN | 44 | | | 50 | | | 60 | | | 61 | | | 64 | | | 65 | | | 66 | | | 68 | | | 69 | | | 71 | | | 70 | | | 49 | | | 73 | | | 74 | | | 75 | | | 76 | | | 81 | | | 82 | | | 48 | | 56 | | | 89 | | |
|---|---|---
