FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA No. 40 (Número de la semana) **DEL** 6 de julio de 2023 (Fecha de inicio) **AL** 12 de julio de 2023 (Fecha de fin)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No No 717 de 2022 (Número de la contratación) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** COP 690 de 2022 (Número de la contratación)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

INV-014 CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 2.

CONTRATISTA CONSORCIO VIAS DE KENNEDY 22 **NIT** 901.628.933-1 (Escriba el nombre del contratista) (Escriba el número del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO SCLV **NIT** 900.547.145-2 (Escriba el nombre del interventor) (Escriba el número del interventor)

CONTRATO DE OBRA	
Valor	$ 19.621.435.784,00
Valor Adicional 1	
Valor Actualizado	
Plazo Inicial	12 meses
Plazo Prórroga 1	
Plazo Actualizado	
Fecha de Iniciación	5 de octubre de 2022
Fecha de Terminación Inicial	4 de octubre de 2023
Fecha de Terminación Actual	
No. de empleos generados	30

CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Valor Inicial	$ 4.897.418.342,00
Valor Adicional 1	
Valor Actualizado	
Plazo Inicial	12 meses
Plazo Prorroga 1	
Plazo Actualizado	
Fecha de Iniciación	5 de octubre de 2022
Fecha de Terminación Inicial	4 de octubre de 2023
Fecha de Terminación Actual	
No. De empleos generados	45

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ (Escriba el nombre del Supervisor SDA)

PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN: ANDRES MAURICIO ROJAS LLANOS - DANILO MENESES TORO (Escriba el nombre del profesional del Equipo de apoyo a la supervisión)

2. AVANCES DEL CONTRATO

META FÍSICA PROGRAMADA TOTAL DEL CONTRATO

Número de radicado de remisión de parte de interventoría del alcance físico del contrato de obra (Escriba el número del oficio radicado SDA) **de fecha** (dd/mm/aa)


TIPO DE ELEMENTO	VALOR TOTAL ($)	ÁREA (M2)	km/carril	Unidad
Calzada CIV	$			
TOTALES	$ 19.621.435.784,00	13224,93	3,78	50
		13224,93	3,78	50

A. AVANCE GENERAL

AVANCE FINANCIERO

PROGRAMADO				EJECUTADO				
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO			SEMANAL	ACUMULADO	Atraso /Avance	
Trabajo Programado	2,54%	2,54%		Trabajo Ejecutado	0,00%	0,00%	-2,54%	
Valor del Trabajo Programado	$ -	$ 0,00		Valor del Trabajo Ejecutado	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	
FASE PRELIMINAR	SEMANAL	ACUMULADO			SEMANAL	ACUMULADO	Atraso /Avance	
Fase preliminar Programada (%)	0,12%	0,24%		Fase preliminar Ejecutada (%)	0,12%	0,24%	0,48%	
Fase preliminar Programada ($)	$ 23.972.839,44	$ 47.967.678,89		Fase preliminar Ejecutada ($)	$ 23.972.839,45	$ 47.967.678,89	$ 0,00	
OBRA	SEMANAL	ACUMULADO			SEMANAL	ACUMULADO	Atraso /Avance	
Obra Programada (%)	0%	0%		Obra Ejecutada (%)	0%	0%	0%	
Obra Programada ($)	$ -	$ -		Obra Ejecutada ($)	$ -	$ -	$ -	

GRAFICA DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO



SEMANA No.	ACUMULADO FINANCIERO PROGRAMADO	ACUMULADO FINANCIERO EJECUTADO
1	0,00%	0,00%
2	0,00%	0,00%
3	0,00%	0,00%
4	0,00%	0,00%
5	0,00%	0,00%
6	0,00%	0,00%
7	0,00%	0,00%
8	0,00%	0,00%
9	2,00%	7,21%
10	2,10%	7,21%
11	1,73%	7,21%
12	2,54%	7,22%
13	3,46%	7,23%
14	4,62%	8,21%
15	6,57%	8,27%
16	7,67%	8,35%
17	9,07%	8,57%
18	11,53%	8,95%
19	13,68%	9,14%
20	8,41%	10,01%
21	3,66%	7,23%
22	3,87%	7,22%
23	4,77%	7,22%
24	5,52%	7,22%
25	6,41%	7,22%
26	8,68%	7,22%
27	10,10%	7,22%
28	14,04%	7,22%
29	18,59%	7,22%
30	19,39%	7,22%
31	23,23%	7,22%
32	26,73%	9,52%
33	46,36%	9,52%
34	53,73%	9,52%
35	55,94%	9,52%
36	57,95%	9,52%
37	59,98%	9,52%
38	62,48%	9,52%
39	64,49%	9,52%
40	66,67%	17,78%

Análisis de la Gráfica:

No se cuenta con cronograma

AVANCE FISICO

PROGRAMADO				EJECUTADO				
Fase preliminar	SEMANAL	ACUMULADO	%Prog. Acum.		SEMANAL	ACUMULADO	% Ejec. Acum.	
Fase preliminar programada (m²)	1542,91	3085,82	23%	Fase preliminar Ejecutada (m2)	1542,91	3085,82	23%	%Atraso /%Avance
Fase preliminar programada (Und)	6	12	24%	Fase preliminar Ejecutada (Und)	0	12	24%	0%
Fase preliminar erooarnada (Km/carril)	0,001714286	0,003428571	0,09%	Fase preliminar Ejecutada (Km/carril)	0,001714286	0,003428571	0,09%	%Atraso /%Avance
Estudios y Diseños Prooram. (m2)	0	0	0%	Estudios y Diseños Ejecutado (m2)	0	0	0%	
OBRA	SEMANAL	ACUMULADO	%Prog. Acum.		SEMANAL	ACUMULADO	% Ejec. Acum.	
Meta Física Proorsmada (m2)	0	0	0%	Meta Física Ejecutada (m2)	0	0	0%	%Atraso /%Avance
Meta Física Proorsmada (Km/carril)	0	0	0%	Meta Física Ejecutada (Km/carril)	0	0	0%	
Meta Física Proorsmada (und)	0	0	0%	Meta Física Ejecutada (und)	0	0	0%	0%
Meta Física Proorsmada (km)	0	0	0%	Meta Física Ejecutada (km)	0	0	0%	
Meta Física Proorsmada (%)				Meta Física Ejecutada (%)				
AVANCE PROJECT								%Atraso /%Avance
Avance Programado (%)	0%			Avance Ejecutado (%)	0%			0%
Avance Proorsmado Mantenimiento periódico	0%			Avance Ejecutado Mantenimiento periódico	VIA			0%
Avance Proorsmado Mantenimiento Rutinario	0%			Avance Ejecutado Mantenimiento Rutinario	VIA			0%
Avance Proorsmado Mantenimiento Rerrnstrucción	0%			Avance Ejecutado Mantenimiento Rerrnstrucción	VIA			0%
Avance Proorsmado Mantenimiento Rehabilitación	0%			Avance Ejecutado Mantenimiento Rehabilitación	VIA			0%

B. ESTADO GENERAL DE LOS FRENTES DE TRABAJO EN LA SEMANA

No	CIV	PK_ID CALZADA	PK_ID ANDEN 1	PK_ID ANDEN 2	EJE	DESDE	HASTA	IPR	TIPO SUPERFICIE	TIPO DE ELEMENTO	ANCHO CALZADA (m)	LONGITUD (m)	AREA CALZADA (m²)	ESTADO	INFORMACION DE FRENTES QUE DEBERIAN INICIAR Y NO TIENEN ACTIVIDAD DE OBRA: FECHA DE INICIACION PROGRAMADA	MOTIVOS POR LOS CUALES NO SE HA INICIADO	Acciones a seguir
44	8004757	152907	23937	23938	KR 84	CL 42B SUR	CL 42A SUR	33,44	6	CALZADA	3,19	82,04	261,84	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Demolición de cajas de inspección, excavación manual e instalación de fresado y geotextil.	1-abr-23		
45	8002718	155148	28037	28038	KR 89B	CL 40B SUR	CL 40 SUR	51,58	6	CALZADA	4,38	129,94	569,35	Sin iniciar	9-jul-23	SIN PMT	
46	8005377	152793	23725	23726	KR 81C	CL 42 SUR	CL 41F SUR	29,06	6	CALZADA	3,83	62,8	240,73	Sin iniciar	7-jul-23	SIN PMT	
47	8005508	152784	23727	23728	KR 81C	CL 42 SUR	DG 42A SUR	33,55	6	CALZADA	2,93	100,38	294,44	Sin iniciar	17-jul-23	SIN PMT	
48	8004699	152904	23931	23932	KR 83	CL 42A SUR	CL 41A SUR	52,51	6	CALZADA	4,74	144,13	683,05	SIN ACTIVIDADES	15-jun-23		
49	8004816	152905	23933	23934	KR 83	CL 42B SUR	CL 42A SUR	32,6	6	CALZADA	2,7	82,01	221,4	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Excavación manual e instalación de monoblock.	24-jul-23		
50	8004663	152906	23935	23936	KR 84	CL 42A SUR	CL 41A SUR	52,51	6	CALZADA	5,25	136,17	714,24	Calzada: Excavación y conformación pozo. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Excavación manual para monoblock e instalación monoblock	10-may-23		
51	8002727	155809	29188	29189	KR 90C	CL 42F SUR	CL 42G SUR	28,88	6	CALZADA	2,59	88,19	228,81	Sin iniciar	No se tiene programación		
52	8002795	155810	29190	29191	KR 90C	CL 42G SUR	CL 43 SUR	28,19	6	CALZADA	2,36	72,08	170,02	Sin iniciar	No se tiene programación		
53	8002995	155822	29214	29215	CL 42F BIS SUR	KR 89C	KR 89F	30,14	6	CALZADA	2,63	41,49	109,22	Sin iniciar	No se tiene programación		
54	8004508	152883	23891	23892	KR 83	CL 40D SUR	CL 41 SUR	37,56	6	CALZADA	4,88	88,16	430,2	Sin iniciar	No se tiene programación		
55	8005471	153124	24331	24332	CL 42H SUR	KR 81I	KR 81J	29,06	6	CALZADA	3,74	27,95	104,45	Sin iniciar	25-jul-23	SIN PMT	
56	8004947	153132	24347	92062695	KR 83	CL 42C SUR	CL 42F BIS SUR	29,79	6	CALZADA	4,24	71,14	301,74	SIN ACTIVIDADES	25-feb-23		
57	8005351	153126	24335	24336	CL 42H SUR	KR 81L	KR 82	28,19	6	CALZADA	3,45	27,73	95,75	Sin iniciar	18-ago-23	SIN PMT	
58	8002225	155774	29118	29119	KR 90B	CL 40 SUR	CL 40A SUR	33,55	6	CALZADA	4,83	80,45	372,11	Sin iniciar	23-feb-23	SIN PMT	
59	8002331	155775	29120	29121	KR 90B	CL 40A SUR	CL 41 SUR	32,51	6	CALZADA	4,32	66,67	288,2	Sin iniciar	18-mar-23	SIN PMT	
60	8002162	155776	29122	29123	KR 90C	CL 40 SUR	CL 40A SUR	52,62	6	CALZADA	5	79,19	395,73	Calzada: Terminación de sumideros. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad	22-dic-22		
61	8002265	155777	29124	29125	KR 90C	CL 40A SUR	CL 41 SUR	51,58	6	CALZADA	4,54	65,92	299,32	Calzada: Terminación de sumideros. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad	6-ene-23		
62	8002055	155780	29130	29131	KR 91	CL 40 SUR	CL 40A SUR	48,97	6	CALZADA	4,54	76,23	345,98	SIN INICIAR	4-mar-23		
63	8002132	155781	29132	29133	KR 91	CL 40A SUR	CL 41 SUR	63,03	6	CALZADA	4,41	66,53	293,12	SIN INICIAR	No se tiene programación por CIV		
64	8001931	155852	29274	29275	KR 91B	CL 40 SUR	CL 40A SUR	27,35	6	CALZADA	3,93	69,19	272,04	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Vaciado de concreto MR-41. Andén occidental: Instalación de geotextil y fresado	21-mar-23		
65	8002008	155853	29276	29277	KR 91B	CL 40A SUR	CL 41 SUR	29,06	6	CALZADA	3,5	67,82	237,35	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Terminación esquina sur. Andén occidental: Terminación esquina sur.	28-feb-23		
66	8001876	155860	29290	29291	KR 91C	CL 40 SUR	CL 40A SUR	27,35	6	CALZADA	3,84	67,47	259,4	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Instalación de concreto MR-41. Andén occidental: Instalación de concreto MR-41.	9-mar-23		
67	8001968	155861	29292	29293	KR 91C	CL 40A SUR	CL 41 SUR	27,35	6	CALZADA	3,79	66,96	253,67	Sin iniciar	3-abr-23	SIN PMT	
68	8001715	155875	29320	29321	KR 92B	CL 40 SUR	CL 40A SUR	28,19	6	CALZADA	4,15	68,59	284,73	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Excavación manual para monoblock e instalación de bordillo. Andén occidental: Excavación manual para monoblock e instalación monoblock	18-mar-23		
69	8001823	155876	29322	29323	KR 92B	CL 40A SUR	CL 41 SUR	27,35	6	CALZADA	4,26	67,66	288,51	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Demolición concreto y excavación manual. Andén occidental: Demolición concreto y excavación manual	8-abr-23		
70	8001657	155878	29326	29327	KR 93	CL 40 SUR	CL 40A SUR	28,19	6	CALZADA	3,87	62,49	241,97	SIN ACTIVIDADES	4-abr-23		
71	8001771	155879	29328	29329	KR 93	CL 40A SUR	CL 41 SUR	27,35	6	CALZADA	4,04	67,46	272,75	SIN ACTIVIDADES	21-abr-23		
72	8001545	155900	29370	29371	KR 93D	CL 40A SUR	CL 41 SUR	48,97	6	CALZADA	3,4	67,15	228,19	Sin iniciar	6-jun-23	SIN PMT	
73	8001148	155917	92062684	92062817	CL 38A SUR	KR 93D	KR 94C	49,32	6	CALZADA	4,21	55,04	231,7	SIN ACTIVIDADES	26-ene-23		
74	8001184	155918	92062720	92062828	CL 38B SUR	KR 93D	KR 94C	50,01	6	CALZADA	4,18	62,56	261,7	Calzada: Sin actividad. Andén norte: Sin actividad. Andén sur: Excavación sumideros.			
75	8001223	155893	29356	29357	KR 93D	CL 38B SUR	CL 38C SUR	49,32	6	CALZADA	3,56	29,93	106,54	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Demolición y excavación manual. Andén occidental: Demolición y excavación manual	24-ene-23		
76	8001183	155892	29354	29355	KR 93D	CL 38A SUR	CL 38B SUR	49,32	6	CALZADA	3,92	31,84	124,92	SIN ACTIVIDADES	24-ene-23		
77	8001285	155920	29410	29411	CL 39A SUR	KR 93D	KR 94C	39,59	6	CALZADA	4,17	84,31	351,18	Sin iniciar	26-sep-23	SIN PMT	
78	8005282	153127	24337	24338	CL 42H SUR	KR 82A	KR 82	28,19	6	CALZADA	3,47	27,72	96,23	Sin iniciar	12-sep-23	SIN PMT	
79	8001390	155890	29350	29351	KR 93C	CL 38C SUR	CL 40 SUR	31,4	6	CALZADA	4,09	96,82	395,99	Calzada: Apertura de civ e inicia con excavación mecánica. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad	6-may-23	SIN PMT	
80	8001581	155877	29324	29325	KR 93	CL 38C SUR	CL 40 SUR	28,54	2	CALZADA	4,06	96,35	391,11	Sin iniciar	6-jun-23	SIN PMT	
81	8005000	153026	24149	92062836	KR 82D	CL 42C SUR	CL 42F BIS SUR	28,95	6	CALZADA	4,3	73,09	314,48	Calzada: Terminación de sumideros. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad	16-dic-22		
82	8005078	153027	24151	24152	KR 82D	CL 42F BIS SUR	CL 42H SUR	28,54	6	CALZADA	4,89	72,7	355,66	Calzada: Terminación de sumideros. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad	3-ene-23		
83	8005258	153095	24273	24274	CL 42F BIS SUR	KR 81L	KR 82	31,84	6	CALZADA	3,21	27,68	88,78	Sin iniciar	21-jul-23	SIN PMT	
84	8005192	153096	24275	24276	CL 42F BIS SUR	KR 82	KR 82A	50,91	6	CALZADA	2,87	27,85	79,87	Sin iniciar	31-jul-23	SIN PMT	
85	8005126	153097	24277	24278	CL 42F BIS SUR	KR 82A	KR 82B	50,91	6	CALZADA	3,11	27,9	86,74	Sin iniciar	10-ago-23	SIN PMT	
86	8005065	153098	24279	24280	CL 42F BIS SUR	KR 82B	KR 82D	47,26	2	CALZADA	3,53	27,59	97,43	Sin iniciar	19-ago-23	SIN PMT	
87	8013930	902162	902161	902163	CL 42A BIS SUR	KR 80D	KR 80F	29,06	6	CALZADA	3,59	55,42	199,15	Sin iniciar	No se tiene programación por CIV		
88	8006231	152956	24009	24010	CL 42B SUR	KR 80D	KR 80F	28,04	6	CALZADA	4,28	53,74	230,06	Sin iniciar	No se tiene programación por CIV		
89	8001841	155851	29272	29273	KR 91B	CL 38C SUR	CL 40 SUR	28,54	6	CALZADA	4,34	99,91	433,99	SIN ACTIVIDADES	21-jun-23		
90	8005210	153128	24339	24340	CL 42H SUR	KR 82B	KR 82A	31,84	6	CALZADA	3,23	27,95	90,26	Sin iniciar	No se tiene programación por CIV		
91	8005408	153125	24333	24334	CL 42H SUR	KR 81J	KR 81L	29,06	6	CALZADA	4,1	27,99	114,7	Sin iniciar	No se tiene programación por CIV		
92	8004910	153106	24295	92062924	CL 42B BIS SUR	KR 85A	KR 82D	49,21	6	CALZADA	2,22	112,12	248,59	Sin iniciar	16-mar-23	SIN PMT	
93	8001427	155899	29368	29369	KR 93D	CL 40A SUR	CL 40 SUR	29,06	6	CALZADA	2,95	56,74	167,56	Sin iniciar	16-jun-23	SIN PMT	

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

1.COMPONENTE TECNICO

1.1. Actividades Técnicas de Interventoría

• Se realiza verificación del PMT y del cerramiento del frente de obra.
• Se cuenta con PMT aprobados de los CIV 8004757-8004699-8004616-8004663-8002162-8002285-8001931-2002008-8001876-8001715-8001823-8001657-8001148-8001223-8001184-8001183-8004947 - 8001841 - 8001390
• Seguimiento en la conformación de espacio público:44-64-66-74-75-76, a la instalación de monoblock 64-69, terminación de sumideros 82-60-61, mejoramiento de vía y excavación mecánica 89-79.
• Seguimiento a la instalación de concreto MR-41 y concreto 3000 psi P66-P64. Seguimiento a la apertura de CIV 79

1.2 Seguimiento de las actividades del contratista

• **P81:** Calzada: Terminación de sumideros. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
• **P82:** Calzada: Terminación de sumideros. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
• **P60:** Calzada: Terminación de sumideros. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
• **P61:** Calzada: Terminación de sumideros. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
• **P64:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Vaciado de concreto MR-41. Andén occidental: Instalación de geotextil y fresado
• **P65:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Terminación esquina sur. Andén occidental: Terminación esquina sur.
• **P73:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén sur: Sin actividad
• **P74:** Calzada: Sin actividad. Andén norte: Sin actividad. Andén sur: Excavación sumideros.
• **P75:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Demolición y excavación manual. Andén occidental: Demolición y excavación manual
• **P76:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
• **P66:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Instalación de concreto MR-41. Andén occidental: Instalación de concreto MR-41.
• **P44:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Demolición de cajas de inspección, excavación manual e instalación de fresado y geotextil.
• **P50:** Calzada: Excavación y conformación pozo. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Excavación manual para monoblock e instalación monoblock
• **P68:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Excavación manual para monoblock e instalación de bordillo. Andén occidental: Excavación manual para monoblock e instalación monoblock
• **P69:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Demolición concreto y excavación manual. Andén occidental: Demolición concreto y excavación manual
• **P70:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
• **P71:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
• **P49:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Excavación manual e instalación de monoblock.
• **P48:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
• **P56:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
• **P80:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
• **P78:** Calzada: Apertura de civ e inicia con excavación mecánica. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad

1.5 Actividades a realizar la siguiente semana

2. COMPONENTE AMBIENTAL

• La calificación fue de 100%
• RCD GENERADO: Para este periodo se ha emitado el material al sitio de disposición final "LAMD", proveniente de labores de Excavación, por un total de 300m3.
• Material fresado: De la Unidad de Mantenimiento Vial. UMV, 0 m3, de Patio IDU 210 m3

Se continúan con las actividades en los CIVs de la siguiente manera:
CIV 8004757 (44) - Demolición caja de inspección - Excavacion Andenes - Construcción cajas de inspección - Conformacion fresado espacio público
CIV 8004699 (48) - Sin actividad
CIV 8004616 (49) - Instalación Monoblock C\occidental - Excavacion manual para instalación Monoblock
CIV 8004663 (50) - Excavacion e instalación placa fondo pozo - Construcción pozo pluvial en mamposteria - Por parte del personal de Acueducto se realiza excavacion en andén C\occidental para instalación Acometida agua potable - Construcción Pozo pluvial en mamposteria
CIV 8004947 (56) - Sin actividad
CIV 8002162 (60) - Instalación cabezal sumidero
CIV 8002285 (61) - Corte para instalación cabezal sumidero - Instalación cabezal sumideros
CIV 8001931 (64) - Descargue de concreto MR41 en rampas - Estampado de toperol y tipo adoquin en rampas - Compactacion en anden costado oriental - Instalación de tuberia 3"y codo de 3" - Compactacion de anden 2da capa - Demolición de sumidero - Instalación de cabezal de sumidero - Instalación de contadores - Conformación de anden - Instalación de monoblock - Instalación de bordillo A80 costado occidental
CIV 8002008 (65) - Remate de rampas - Instalación de marco de 0.40×0.40 - Estampado de rampa amejoh - Demolición y excavación andén punta sur - Instalación de geotextil en anden - Lleno con fresado en anden
CIV 8001876 (66) - Descargue de concreto - Vibrado concreto MR-41 - Estampado en rampas - Compactacion en anden oriental - Conformacion de anden - Descargue de concreto de 3000psi en anden - Extendida de concreto en anden - Amejoh de monoblock costado occidental
CIV 8001715 (68) - Construcción cajas inspección andén oriental - Perfilado excavación andén occidental - Compactación con canguro andén oriental - Extendido geotextil - Lleno con fresado andén - Instalación Monoblock - Ataque monoblock 320 - Excavación para instalación bordillo A-80
CIV 8001823 (69) - Construcción cajas de inspección - Demolición cajas inspección andén costado occidental - Excavación para instalación Monoblock - Construcción cajas de inspección andén costado oriental
CIV 8001657 (70-CIV 8001771 (71)- CIV 8001148 (73) - Sin actividad
CIV 8001184 (74) - Vibrado concreto MR-41 - Estampado toperol en rampas
CIV 8001223 (75) - Demolición y construcción de cajas inspección andén costado occidental - Excavación manual andén costado oriental - Lleno alrededor cajas inspección
CIV 8001183 (76) - Instalación marcos cajas de inspección - Compactación con canguro rampas - Instalación monoblock - Estampado toperol en rampas
CIV 8001390 (79) - Se inicia los huecos para instalación de rollizos - Instalación de PMT - Instalación de cerramiento
CIV 8005050 (81) - Sin actividad
CIV 8005078 (82) - Adecuación sumidero Prefabricado para instalación cuerpo superior - Conformacion sumidero Prefabricado para instalación cuerpo superior
CIV 8001841 (99) - Excavacion para pozo y tubería 12" - Concreto solado de limpieza para pozo - Instalación de placa fondo Pozo - Retiro de excavación zanja tuberia 12" - Limpieza de zanja tuberia 12" - Amejlo de tuberia 6" domiciliaria en concreto - Mejoramiento de zanja con fresado por lluvias - Cama de arena para instalación tuberia 12" - Cargue de excavacion tuberia 12" y pozo

En recorrido realizado el 5 de julio de 2023 en forma conjunta Residente ambiental de Interventoría con el residente ambiental del contratista se evidenció lo siguiente:

• Los frentes de obra se encuentran en buenas condiciones de orden y aseo, es de anotar que varios de los puntos prioritarios se encuentran sin actividades constructivas y otros con actividades de bajo impacto.
• Se cuenta con el Kit de derrames, punto ecológico, y bartos fijos y móviles para hombres y mujeres en los CIV actuales.
• El campamento se encuentra en buenas condiciones de orden y aseo.
• Se encuentran realizando acopio para retiro de material de Excavación.
• En la misma visita se evidenció "Ausencia de Personal y de actividades" en algunos CIV´s. En algunos puntos se encuentran realizando actividades de excavación.

3. COMPONENTE SST

3.1. ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA EN MATERIA SST
INFORMACIÓN DEL PERSONAL

Ingreso	Antiguos	Retiros	TOTAL, PERSONAL ACTIVO EN LA SEMANA REPORTADA:
1. Consorcio SCLV: 0	1. Consorcio SCLV: 21 2. Silva Carreño y Asociados S.A.S: 10 3. La Vialidad Limitada: 13 4. Cense Ingeniería Ltda: 1 5. J.V.R Estudios: 1 6. Geovial Limitada:5	0	51

3.2 AUSENTISMO DE PERSONAL

Durante el desarrollo de las actividades de la semana del 6 julio de 2023 al 12 de julio de 2023, se presentó ausentismo del personal de la Interventoria que se relaciona a continuación:

Nombre	Cargo	Días de incapacidad	Descripción
José de Calasanz Mosquera	IR Ambiental	1	MS45: Incapacidad enfermedad general 05/07/2023 al 06/07/2023.
Everth Cossio Moreno	Inspector de Interventoría	2	Calamidad familiar 01/07/2023 al 07/07/2023
Giovanny García Mendivelso	Cadenero 2	1	L508: Incapacidad enfermedad general 12/07/2023 al 12/07/2023.

3.3 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

• El 7 de julio de 2023 se realizó recorrido de obra donde se evidenció que el personal corresponde al aprobado por Interventoría, en las prioridades intervenidas se observaron equipos para atención de emergencias e información de conformación de brigada de emergencias.
• El 7 de julio de 2023 se realizó comité de seguimiento semanal de manera presencial con el PDLK, donde el componente SST reporto el avance de las actividades realizadas en las prioridades, estado del informe mensual 8, observaciones al informe 9, calificación semanal documentos de ingreso e indicadores de rotación del personal de obra.
• El 11 de julio de 2023 los componentes SST, social y ambiental y técnico de la Interventoría realizaron recorrido de obra por los CIV en ejecución al momento de la visita de obra por parte del componente SST se evidenció que el personal que estaba realizando actividades, corresponde al aprobado por la Interventoría, adicional a esto el personal cuenta con la dotación de acuerdo al manual de identificación visual así mismo hace uso de los elementos de Protección Personal (EPP) para las actividades de obra.
•Al momento de la visita de obra por parte del componente SST se evidencia lo siguiente:

UPZ CORABASTOS:
P81: No se encuentran desarrollando actividades
P82: Actividades de terminación de sumideros, este CIV junto con el CIV 81 cuenta con unidades sanitarias, se evidencia punto ecológico, de hidratación, kit de emergencias, el frente de obra cuenta con señalización a rutas de emergencia.
P66: Actividades de conformación de espacio público, el personal porta la dotación de acuerdo con el manual de identificación visual, este CIV cuenta con punto ecológico, punto de hidratación, kit para la atención de emergencias (Botiquín, extintor y camilla.
P48: No se encuentran desarrollando actividades, este CIV cuenta con punto ecológico.
P49: Actividades de excavación e instalación de Monoblok, el personal cuenta con la dotación de acuerdo con el manual de identificación visual así mismo hace uso de los EPP, este CIV cuenta con kit de emergencia, punto ecológico y kit anti derrame.
P50: Actividades de instalación pozos para aguas lluvias, este CIV cuenta con cartelera informativa, bafo portátil y kit de emergencia.
P56: No se cuenta con actividades este CIV cuenta con punto ecológico.

UPZ PATIO BONITO:
P60: Actividades de instalación cabezal para sumideros, este CIV cuenta con cartelera informativa y kit de emergencia.
P61: No se encuentran desarrollando actividades
P64: Actividades de excavación e instalación de Monoblock, el personal cuenta con dotación y hacen uso de los EPP, se evidencia punto ecológico, de hidratación, unidad sanitaria, cartelera informativa, kit de emergencias y señalización a rutas de emergencia estos elementos son compartido con el CIV 60, 61 y 65.
P65: Actividades de fenado y fresado para andenes.
P66: Conformación de espacio público este CIV cuenta con kit de emergencia. punto ecológico y kit antiderrame.
P68: Actividades de instalación de Monoblock y de espacio público, el personal cuenta con dotación de acuerdo al manual de identificación visual, este CIV cuenta con kit de emergencia, punto ecológico y kit antiderrame.
P69: Actividades de excavación y conformación de espacio público.
P70: No se encuentran desarrollando actividades
P71: No se encuentran desarrollando actividades
P73: No se encuentran desarrollando actividades
P74: No se encuentran desarrollando actividades
P75: Conformación de espacio público, este CIV cuenta con kit de emergencia, cartelera informativa y kit anti derrame estos insumos están compartidos con los CIV 73,74 y 76.
P76: No se encuentran desarrollando actividades.
P69: Actividades de excavación para tubería este CIV cuenta con kit de emergencia, carpa vestier, una (1) unidad sanitaria.

• De acuerdo con lo antes expuesto se realizaron recomendaciones al contratista con el fin de cumplir con los requisitos mínimos en gestión SST y así mismo para apertura a los próximos CIV a ejecutar. Como recomendaciones generales se solicitó al contratista orden y aseo, adicional a esto revisar y garantizar los senderos peatonales y el acceso a las viviendas, esto aplica para todas las prioridades.
• Durante la semana se revisaron documentos de ingreso del personal de obra, correspondientes a contratos, exámenes médicos ocupacionales de ingreso, certificaciones de afiliación al Sistema General de Seguridad Social Integral (ARP, ARL, CCF, EPS), notificación de riesgos e inducciones.
• El 10 de julio de 2023 la Interventoría como parte de la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo realizó pausas activas con ejercicios osteomusculares.
• El 10 de julio de 2023 la Interventoría como parte de la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo socializó con el personal información sobre salud visual "ojos sanos del Glaucoma"
• El 11 de julio de 2023 la Interventoría como parte de la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo realizó pausas activas con ejercicios osteomusculares y actividad lúdica.
• El 12 de julio de 2023 se llevó a cabo comité interno de Interventoría donde en el componente SST se revisó el avance de las actividades realizadas en las prioridades que están siendo intervenidas, calificación de las fichas Ambientales y SST, e informo sobre los resultados del recorrido de obra.
• Durante la semana se realizó seguimiento al uso adecuado de los EPP y elementos de identidad visual del personal de interventoría.

3.4 ACCIDENTALIDAD EN EL PERIODO.
Durante el desarrollo de las actividades de la semana del 6 julio de 2023 al 12 de julio de 2023, no se presentaron accidentes de trabajo (AT) del personal de la Interventoría.

3.5 ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA EN MATERIA SST
INFORMACIÓN DEL PERSONAL

Ingreso	Antiguos	Retiros	PERSONAL ACTIVO EN LA SEMANA REPORTADA:
AIKA HUMANA = 1	1. CVK22 = 9 2. AIKA HUMANA = 75 3. MMAPV SAS = 5 4. MR GROUP COL SAS = 1 5. SOLTEC PROYECTOS INGENIERÍA SAS = 1 6. MABERIK = 1 7. WITS = 1 8. SOLUCIONES TECMARQ SAS = 1 9. V&V CONSTRUCCIONES = 1 10. AREVALO Y ARDILA CONSTRUCTORA SAS = 10 11. CONSTRUBERNAL = 1 12. SAM INGENIERIA = 9 13. MAQUINARIA Y SERVICIOS = 1 14. GUILLERMO CABALLERO GONZALEZ = 1 16. HA CIVILES = 3 17. TRANSPORTE Y MAQUINARIA C&C = 1	1. AIKA HUMANA = 2 2. V&V CONSTRUCCIONES = 1 3.TRANSPORTE Y MAQUINARIA C&C = 1	118

3.6 AUSENTISMO DE PERSONAL

Durante el desarrollo de las actividades de la semana del 6 julio de 2023 al 12 de julio de 2023, el contratista reporto ausentismo de ocho (8) trabajadores, cuatro (4) generados por enfermedad general uno (1) por accidente de trabajo, y tres (3) que no asistieron.
De acuerdo con lo anterior el Contratista evaluó el indicador de ausentismo de la semana del 6 julio de 2023 al 12 de julio de 2023, del personal con cargos maestros, oficiales y ayudantes de obra el cual se relaciona a continuación:
N° de días de ausencia = 2
N° de días de trabajo programados = 6
N° Trabajadores en la semana = 47
% de ausentismo 0,71%

Es así como se evidencia que el 0,71% de los cargos relacionados anteriormente estuvieron ausentes en la semana.

3.7 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

• Durante la semana el contratista incorporo personal.
• Se realizó inducción al personal nuevo, donde se presentan las Generalidades sobre el SG-SST, Estructura Organizacional- Reglamento Interno de Trabajo- de Higiene industrial- Políticas del SST, alcohol, drogas y tabaquismo- Aspectos legales relacionados con SST. Condiciones de Salud y Medicina laboral, Higiene y Seguridad Industrial- Identificación de peligros, Uso de EPP, matriz de peligros entre otros.
• Se hace la notificación de riesgos al personal que ingreso a laborar a los cuales se encuentra expuesto relacionados con cada cargo: Riesgo mecánico, Químico, Locativo, Biológico, Biomecánico, Físico, Eléctrico, de seguridad, Público y Fenómenos naturales
• Se realizó la entrega de dotación y EPP al personal que ingresó a laborar al contrato COP 695-22, también realizo la socialización del uso obligatorio durante la ejecución de las obras.
• El personal de obra cuenta con los espacios requeridos para almacenar su ropa durante el horario de trabajo, de igual manera cuentan con baterías sanitarias en óptimas condiciones y en cantidad suficiente de acuerdo con el género. de trabajadores presente en el frente de obra.
• El contratista reporto que se realizaron actividades de orden y aseo en los frentes de obra.
• Se llevo a cabo inspecciones de maquinaria y EPP en los frentes de obra.
• Durante la semana se dio apertura a la prioridad 79 CIV 8001390.

4.COMPONENTE SOCIAL

4.1 Programa de Servicio a la Ciudadanía

• En este periodo el PAC es atendido de acuerdo con el horario aprobado previamente por la interventoría; lunes a viernes de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Adicionalmente, el contratista realizó recorridos sociales para atender inquietudes de la comunidad y acercar la atención a la ciudadanía en el área de intervención, los martes y jueves en el horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., lo anterior, para completar 40 horas de atención según lo requerido contractualmente.
• En el corte reportado se atendió el PAC de acuerdo con el horario aprobado por la interventoría. En este periodo no se reportaron solicitudes de veedurías ciudadanas.

PQRSD:
A la fecha el contratista cuenta con 38 PQRSD; de las cuales 1 se encuentra en trámite, a continuación, se realiza la trazabilidad por cada una
• PQRSD 23: El 07/07/2023, contratista e interventoría realizan acercamiento a predio, con el fin de revisar la cotización realizada por la ciudadana, se evidencia que no es viable para el contratista, al no llegar a acuerdos el director de interventoría, solicita al contratista el cierre de la PQRSD; el 11/07/2023 se realiza envío de la PQRSD para revisión y aprobación por parte de la interventoría.
• PQRSD 34: El 06/07/2023 El contratista realizó la subsanación de acuerdo a lo indicado por parte de los especialistas de espacio público de la interventoría y el contratista, ciudadana manifiesta estar conforme con la adecuación de espacio público y firma a conformidad dando cierre a la queja.
• PQRSD 35: El 06/07/2023 El contratista realizó la subsanación de acuerdo a lo indicado por parte de los especialistas de espacio público, ciudadana manifiesta estar inconforme con la adecuación de espacio público ya que no es posible abrir las dos hojas de la puerta y refiere que elevará la queja a la Alcaldía Local de Kennedy. el 11/07/2023 se realiza envío de la PQRSD para revisión y aprobación por parte de la interventoría
• PQRSD 36: 06/07/23 la residente Social del contratista, se acerca al predio para escuchar a la ciudadana referente a la solicitud realizada el día del corte, ella manifiesta que la indicaron una forma errónea de adecuar la bajante de aguas lluvias, debido a ello, perdió dinero, solicita que el contratista verifique, si la adecuación realizada es adecuada, el contratista manifiesta que se encuentra bien realizada. Luego, el 07/07/2023, en recorrido social en conjunto con interventoría, se realiza acercamiento a predio y se le explica la situación a la ciudadana nuevamente, quién accede a firmar el cierre de la PQRSD.
• PQRSD 37: El 30/06/23 el contratista realizó acercamiento a predio donde le indicó a la ciudadana que ya puede hacer uso de la caja de inspección y realizar actividades cotidianas, con respecto al concreto de la rampa, se informa que este se instalará el 07/06/23 la rampa faltante del predio, pendiente firma por parte de la interventoría. El 7/07/23 contratista realizó la instalación del concreto de la rampa de acceso vehicular faltante en el predio, con esto se da respuesta y cumplimiento a la queja de la ciudadana, quién no se encuentra en el predio para la firma del documento. Luego, el 11/07/2023 se firma el documento a conformidad de la ciudadana, pendiente firma por parte de la interventoría
• PQRSD 38: El 30/6/2023, contratista realizó seguimiento a predio, donde se evidenció elaboración del paso peatonal de ingreso a predio provisional, por otro lado, se encuentra pendiente revisión del punto de acueducto

Recorridos Urbanos:
• El 06 y 11 de julio 2023 se realiza recorrido por los frentes de obra activos de las UPZ 80 Corabastos y la UPZ 82 Patio Bonito en los cuales se verifica las vallas informativas de los frentes de obra, seguimiento y gestión de PQRSD abiertas.

4.2 Programa de Diálogo y participación ciudadana

• El 05/07/2023 contratista remite el acta de reunión de comité veedor, el 07/07/2023 la interventoría remite observaciones, las cuales fueron atendidas por parte del contratista para su aprobación el día 08/07/2023.

4.3 Programa de acompañamiento técnico
Actas de vecindad y rampas vehiculares
• El contratista inicia con el levantamiento de actas de vecindad del CIV 8001285 P. 77
• El día 11/07/2023 el contratista inicia con la entrega de copias de actas de vecindad del CIV 8001390 P. 79 por medio de correo electrónico suministrado por parte de los propietarios al momento de levantar las actas de vecindad
• Interventoría realiza verificación de los predios que están para remates con el fin de realizar seguimiento a los mismos.
Total, de actas realizadas en el contrato: 664

• El contratista inicia con el levantamiento de actas de acceso vehicular CIV 8001285 P. 77
• El 11/07/2023 el contratista inicia con la entrega de copias de actas de acceso vehicular del CIV 8001390 P. 79 por medio de correo electrónico suministrado por parte de los propietarios al momento de levantar las actas de vecindad
• Interventoría solicita en comité de seguimiento entregar lo antes posible las copias de actas de vecindad que fueron aprobadas con el fin de cumplir con los tiempos
Total, de actas realizadas en el contrato: 397

Cierres de Actas de Vecindad:
• El 11/07/2023 el contratista inicia con el cierre de las actas acceso vehicular en el CIV 80022265 P. 61 y 8001148 P. 73.
• El 11/07/2023 el contratista inicia con el cierre de las actas de vecindad en las prioridades 61 y 73. Finaliza con los cierres de las actas de vecindad, sin embargo, evidencia que no fue posible el cierre de 5 actas de la prioridad 81 y 4 actas del 82 por finalización en remates y subsanación de áreas afectadas durante la ejecución de la obra.

Actas de compromiso:
• El 07/07/2022 el contratista realiza notificación a los propietarios de los predios del CIV 8001390 P. 79 acerca de la suspensión de los siguientes 4 meses por ocasión de inicio de obra.
• El 07/07/2023 el contratista realizó la apertura de 23 actas de acceso vehicular del CIV 8001390 P. 79, además de 04 actas de compromiso de adecuación de bajantes de aguas lluvias y 02 actas de compromiso de adecuación de cubierta.

4.4 Programa de cultura ciudadana
• Esta actividad se encuentra en gestión por parte del contratista con la Secretaría de Medio Ambiente y con la Asociación de Recicladores de Bogotá, se enviará metodología para la ejecución de la misma el 28/07/2023.
• El 08/07/2023 el contratista ejecuta la metodología de capacitación MONCL en la UPZ 80 y 82 contó con la participación de 40 trabajadores de mano de obra no calificada.

4.5 Programa de gobernanza para la movilidad
• A la fecha el contrato cuenta con 69 personas de MONC; de las cuales 12 de ellos residen en la localidad, 05 de estos trabajadores son mujeres y 07 son hombres, sus cargos dentro de la obra son de auxiliares de tráfico, BOAL y ayudantes de obra. El porcentaje de contratación general a la fecha es de 17.39 % correspondiente a trabajadores residentes en la localidad de Kennedy, de ellos 7,24 % son mujeres.

4.6 Programa de información para el desarrollo del proyecto
Vallas informativas
• Para el periodo reportado, los frentes de obra actuales cuentan con su valla informativa de inicio a fin y cuentan con el porcentaje de obra actual. Los frentes que cuentan con valla informativa son los siguientes: P44, P48, P49, P50, P60, P61, P64, P65, P66, P68, P69, P70, P71, P73, P74, P75, P76, P81, P82
• El contratista realiza la subsanación de las vallas que han sido hurtadas o se encuentren afectadas con el fin de garantizar la información, se encuentra pendiente instalación de la valla informativa de las prioridades 79 y referente a la prioridad 56 la valla se encuentra en custodia, ya que se instala únicamente cuando hay personal que pueda cuidar de ella, teniendo en cuenta la inseguridad de este sector.
• A corte de este periodo el avance de obra se encuentra en el 25.45% con 122 días para finalización de obra, se le notifica a la interventoría en comité de seguimiento, que esta información será actualizada los días de corte de entrega de informe semanal del área técnica.
• En recorrido de obra del 11/07/2023, se evidencia algunas vallas informativas con datos erróneos, el contratista realizará actualización de esta información.

Volantes de información:
El contratista realizó durante la semana la siguiente gestión social:
• **Volante 75** Recomendaciones sobre E.P. El día 06/07/23 el contratista realiza entrega en la prioridad 50: 38 volantes y el día 11/07/2023: realiza entrega en la prioridad 73: 114 volantes
• **Volante 100** Recomendaciones malla vial: 06/07/2023 el contratista realiza en la entrega prioridad 81:18 volantes y Prioridad 82: 12 volantes, 11/07/2023: realiza entrega en la prioridad 65: 16 volantes, Prioridad 61: 16 volantes
• **Volante 105** Punto recolección 05/07/2023 realiza entrega en la prioridad 79: 26 volantes
• **Volante 105** Construcción malla vial 05/07/2023 realiza entrega en la prioridad 79: 26 volantes
• **Volante 104** Construcción E.P 06/07/2023 realiza entrega en la prioridad 50: 38 volantes
• **Volante 101** Levantamiento A.V 1ra visita 06/07/2023 2023, realiza entrega en la prioridad 77: 22 volantes.
• El 11/07/2023 remiten los volantes N. 107 Volante informativo construcción de espacio público CIV 80016S7-8001771 y Volante 108. Volante informativo construcción de espacio público CIV 8004816, para revisión y aprobación por parte de la interventoría.
• Interventoría en comité social solicita iniciar con el proceso de elaboración del volante de suspensión de servicios públicos y actividades nocturnas.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS / LEGALES
No se presentaron

4. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES (CAUSAS ATRASO, ETC.)

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES:

5. ANEXOS

	SI	NO
1. Cronograma en Ms Project	X	
2. Registro Fotográfico	X	
3. Avance	X	

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

doce (día del mes) 12 (día de vencimiento)

días del mes de julio (Mes en curso) de 2023 (año de firma del informe)

Director de Interventoría

FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA No. 40 **DEL** 6 de julio de 2023 **AL** 12 de julio de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 717 de 2022 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 690 de 2022 (Número de Contrato)

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripción Foto 1.

CIV: No. 64 - 8001931
Descripción: Sin actividad



Descripción Foto 2.

CIV: No.60 - 8002162
Descripción: Conformación de sumideros



Descripción Foto 3.

CIV: No.71 - 8001771
Descripción: Instalación de fresado estabilizado con cemento y solid soil al 4%



Descripción Foto 4.

CIV: No.82 - 8005078
Descripción: Terminación de sumideros



Descripción Foto 5.

CIV: No.66 - 8001876
Descripción: Instalación de concreto de 3000 psi



Descripción Foto 6.

CIV: No.69 - 8001823
Descripción: Demolición concreto y excavación manual espacio público



Descripción Foto 9.

CIV: No.65 - 8002008
Descripción: Sin actividad



Descripción Foto 10.

CIV: No.56 - 8004947
Descripción: Sin actividad



Descripción Foto 11.

CIV: No.50 - 8004663
Descripción: Conformación de pozo



Descripción Foto 12.

CIV: No.49 - 8004816
Descripción: Excavación manual para instalación de monoblock



Descripción Foto 13.

CIV: No.48 - 8004699
Descripción: Sin actividad



Descripción Foto 14.

CIV: No.44 - 8004757
Descripción: Instalación de geotextil en espacio público



Descripción Foto 15.

CIV: No.68 - 8001715
Descripción: Instalación de monoblock y bordillo A-80



Descripción Foto 16.

CIV: No.79 - 8001390
Descripción: Excavación mecánica en vía



Descripción Foto 17.

CIV: No.89 - 8001841
Descripción: Excavación mecánica para instalación de tubería



Descripción Foto 18.

CIV: No.70 - 8001657
Descripción: Sin actividad

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

doce (Día en letras) (12) (Día en números) días del mes de julio (Mes en que se firma el acta) de 2023 (Año de firma del acta)


(Firma)

(Nombre) Juan Manuel Abril Rojas

Director de Interventoría.
Nombre de la firma interventora

CONSORCIO SCLV
NIT 900.547.145-2
EVALUACIÓN PROGRAMACIÓN INICIAL - GRUPO 2
SEGUIMIENTO AL 11-JULIO-2023


P	CIV	VALOR CIV	PROG-ACUM ($)	PROG-ACUM (%)	EJEC-ACUM ($)	EJEC-ACUM (%)	PESO EJEC PROG (%)	ATRASO (%)
81	8005000	$ 331.062.908,00	$ 493.706.016,00	2,83%	$ 307.829.014,10	1,76%	92,98%	-1,07%
82	8005078	$ 343.085.920,00	$ 479.749.662,00	2,75%	$ 332.182.707,83	1,90%	96,82%	-0,85%
60	8002162	$ 320.721.252,00	$ 514.640.546,00	2,95%	$ 268.879.408,07	1,54%	83,84%	-1,41%
61	8002265	$ 355.199.128,00	$ 460.559.675,00	2,64%	$ 342.108.113,38	1,96%	96,31%	-0,68%
65	8002008	$ 360.580.405,00	$ 432.646.968,00	2,48%	$ 337.524.579,03	1,93%	93,61%	-0,55%
64	8001931	$ 376.367.569,00	$ 443.114.233,00	2,54%	$ 328.723.679,84	1,88%	87,34%	-0,66%
73	8001148	$ 285.710.532,00	$ 338.441.580,00	1,94%	$ 269.281.829,64	1,54%	94,25%	-0,40%
76	8001183	$ 146.013.903,00	$ 233.768.926,00	1,34%	$ 124.289.639,38	0,71%	85,12%	-0,63%
75	8001223	$ 144.206.710,00	$ 183.177.144,00	1,05%	$ 98.623.477,79	0,57%	68,39%	-0,48%
74	8001184	$ 347.413.004,00	$ 0,00	0,00%	$ 283.919.995,52	1,63%	81,72%	1,63%
70	8001657	$ 342.553.149,00	$ 394.266.995,00	2,26%	$ 32.050.753,20	0,18%	9,36%	-2,08%
66	8001876	$ 318.216.103,00	$ 430.902.424,00	2,47%	$ 182.541.962,00	1,05%	57,36%	-1,42%
44	8004757	$ 544.689.706,00	$ 416.946.070,00	2,39%	$ 224.452.888,05	1,29%	41,21%	-1,10%
68	8001715	$ 351.516.714,00	$ 413.456.981,00	2,37%	$ 15.551.975,63	0,09%	4,42%	-2,28%
71	8001771	$ 361.446.034,00	$ 429.157.879,00	2,46%	$ 101.220.892,84	0,58%	28,00%	-1,88%
69	8001823	$ 341.507.411,00	$ 443.114.233,00	2,54%	$ 58.093.811,18	0,33%	17,01%	-2,21%
50	8004663	$ 770.232.864,00	$ 485.351.587,23	2,78%	$ 134.335.950,39	0,77%	17,44%	-2,01%
56	8004947	$ 377.475.477,00	$ 444.858.777,00	2,55%	$ 24.817.322,72	0,14%	6,57%	-2,41%
49	8004816	$ 479.216.394,00	$ 0,00	0,00%	$ 161.839.968,37	0,93%	33,77%	0,93%
48	8004699	$ 983.197.315,00	$ 209.345.307,11	1,20%	$ 37.399.747,75	0,21%	3,80%	-0,99%
89	8001841	$ 580.698.248,00	$ 147.538.597,26	0,85%	$ 24.445.841,27	0,14%	4,21%	-0,71%
79	8001390	$ 629.262.662,00	$ 514.059.032,07	2,95%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-2,95%
62	8002055	$ 443.969.911,00	$ 497.195.104,00	2,85%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-2,85%
63	8002132	$ 301.695.957,00	$ 436.136.056,00	2,50%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-2,50%
58	8002225	$ 370.268.458,00	$ 523.363.268,00	3,00%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-3,00%
59	8002331	$ 360.017.625,00	$ 439.625.145,00	2,52%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-2,52%
67	8001968	$ 386.650.290,00	$ 427.413.335,00	2,45%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-2,45%
92	8004910	$ 456.639.023,00	$ 546.042.342,00	3,13%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-3,13%
77	8001285	$ 564.687.707,00	$ 510.027.195,82	2,92%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-2,92%
80	8001581	$ 584.822.489,00	$ 275.550.760,35	1,58%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-1,58%
72	8001545	$ 348.655.292,00	$ 228.186.384,60	1,31%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-1,31%
93	8001427	$ 321.630.570,00	$ 138.478.043,69	0,79%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-0,79%
45	8002718	$ 739.233.204,00	$ 24.174.398,54	0,14%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-0,14%
46	8005377	$ 280.055.154,00	$ 33.669.703,50	0,00193	0	0	0	-0,19%
TOTALES			**$ 11.988.664.369,17**	**68,72%**	$ 3.690.113.557,98	21,15%		**-47,57%**
TOTAL DE OBRA			**$ 17.445.442.250,00**					

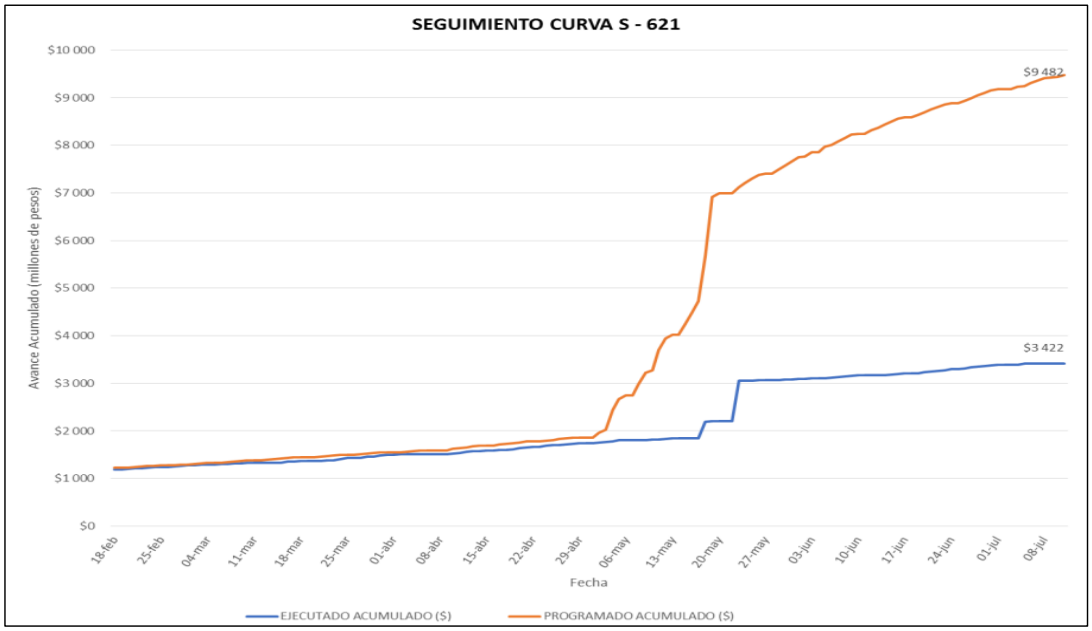



CONSORCIO SCLV
NIT 900.547.145-2
EVALUACIÓN CIV

FECHA EVALUACIÓN			20-jun	27-jun	4-jul	11-jul
P	CIV	VALOR TOTAL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV
81	8005000	$ 331.062.908,00	92,98%	92,98%	92,98%	92,98%
82	8005078	$ 343.085.920,00	96,82%	96,82%	96,82%	96,82%
60	8002162	$ 320.721.252,00	83,78%	83,84%	83,84%	83,84%
61	8002265	$ 355.199.128,00	87,19%	96,31%	96,31%	96,31%
65	8002008	$ 360.580.405,00	84,39%	93,34%	93,34%	93,61%
64	8001931	$ 376.367.569,00	80,95%	84,23%	85,98%	87,34%
73	8001148	$ 285.710.532,00	86,80%	94,25%	94,25%	94,25%
76	8001183	$ 146.013.903,00	80,41%	82,47%	82,85%	85,12%
75	8001223	$ 144.206.710,00	67,87%	67,87%	67,87%	68,39%
74	8001184	$ 347.413.004,00	77,97%	80,98%	80,98%	81,72%
70	8001657	$ 342.553.149,00	8,40%	9,36%	9,36%	9,36%
66	8001876	$ 318.216.103,00	49,56%	52,05%	53,13%	57,36%
44	8004757	$ 544.689.706,00	41,13%	41,13%	41,21%	41,21%
68	8001715	$ 351.516.714,00	0,00%	0,00%	1,30%	4,42%
71	8001771	$ 361.446.034,00	17,91%	28,00%	28,00%	28,00%
69	8001823	$ 341.507.411,00	2,52%	16,14%	16,14%	17,01%
50	8004663	$ 770.232.864,00	14,48%	15,04%	15,04%	17,44%
56	8004947	$ 377.475.477,00	0,18%	0,85%	4,71%	6,57%
49	8004816	$ 479.216.394,00	20,87%	21,00%	22,25%	33,77%
48	8004699	$ 983.197.315,00	1,47%	2,75%	3,80%	3,80%
89	8001841	$ 580.698.248,00	0,00%	0,00%	2,39%	4,21%
79	8001390	$ 443.969.911,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

FECHA EVALUACIÓN			11-jul
P	CIV	VALOR TOTAL CIV	%AVANCE DEL CIV
81	8005000	$ 331.062.908,00	0,00%
82	8005078	$ 343.085.920,00	0,00%
60	8002162	$ 320.721.252,00	0,00%
61	8002265	$ 355.199.128,00	0,00%
65	8002008	$ 360.580.405,00	0,27%
64	8001931	$ 376.367.569,00	1,37%
73	8001148	$ 285.710.532,00	0,00%
76	8001183	$ 146.013.903,00	2,27%
75	8001223	$ 144.206.710,00	0,52%
74	8001184	$ 347.413.004,00	0,75%
70	8001657	$ 342.553.149,00	0,00%
66	8001876	$ 318.216.103,00	4,24%
44	8004757	$ 544.689.706,00	0,00%
68	8001715	$ 351.516.714,00	3,12%
71	8001771	$ 361.446.034,00	0,00%
69	8001823	$ 341.507.411,00	0,87%
50	8004663	$ 770.232.864,00	2,40%
56	8004947	$ 377.475.477,00	1,87%
49	8004816	$ 479.216.394,00	11,52%
48	8004699	$ 983.197.315,00	0,00%
89	8001841	$ 580.698.248,00	1,82%
79	8001390	$ 443.969.911,00	0,00%

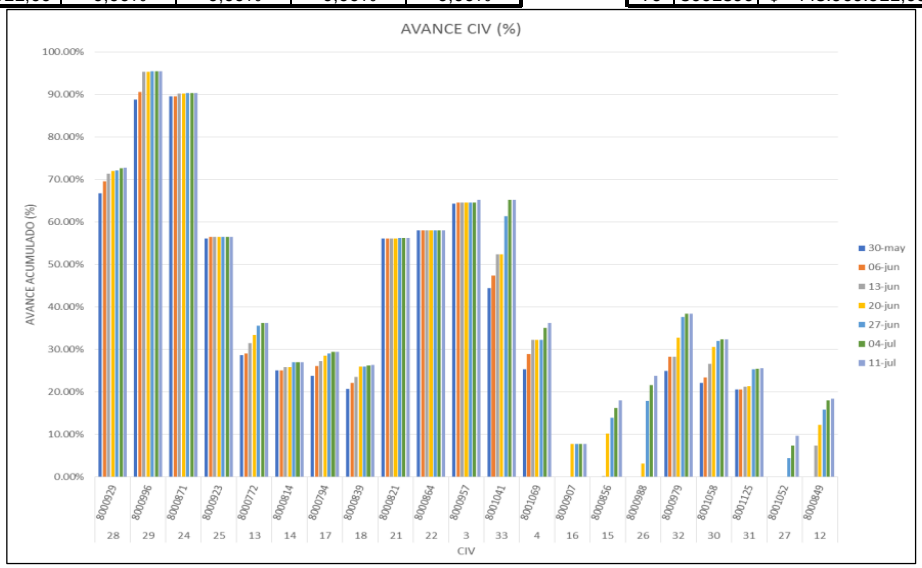

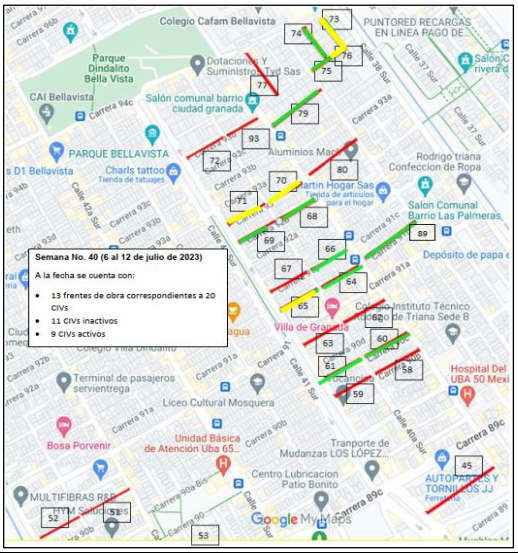

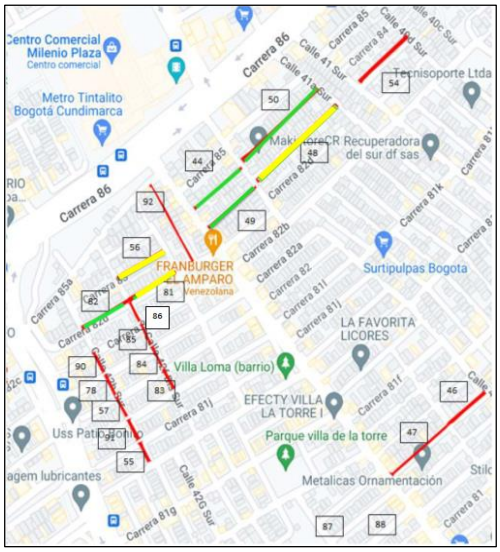

CONSORCIO SCLV
NIT. 900.547.145-2

REPORTE AVANCE SEMANAL
GRUPO 2 - CONTRATO COP-690-22
CONTRATISTA CONSORCIO VÍAS DE KENNEDY 22

Periodo **6 de julio al 11 de julio de 2023**

AVANCE	%General	%Físico	%Financiero
%Programado	66,97%	68,72%	66,97%
%Ejecutado	22,01%	21,71%	17,78%
Atraso(-)/Adelanto(+)	-44,96%	-47,01%	-49,19%

ESTADO SEMANAL DE PROCESO CONSTRUCTIVO

CONTRATISTA DE OBRA GRUPO 2 -CVK22 COP 690-22

| PK_ID CALZADA | PK_ID ANDEN | PK_ID ANDEN | 44 | | | 50 | | | 60 | | | 61 | | | 64 | | | 65 | | | 66 | | | 68 | | | 69 | | | 71 | | | 70 | | | 49 | | | 73 | | | 74 | | | 75 | | | 76 | | | 81 | | | 82 | | | 48 | | | 56 | | | 89 | | | 79 | | |
|---|---|---
